
INFORME DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL - INTERVENTORIA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"

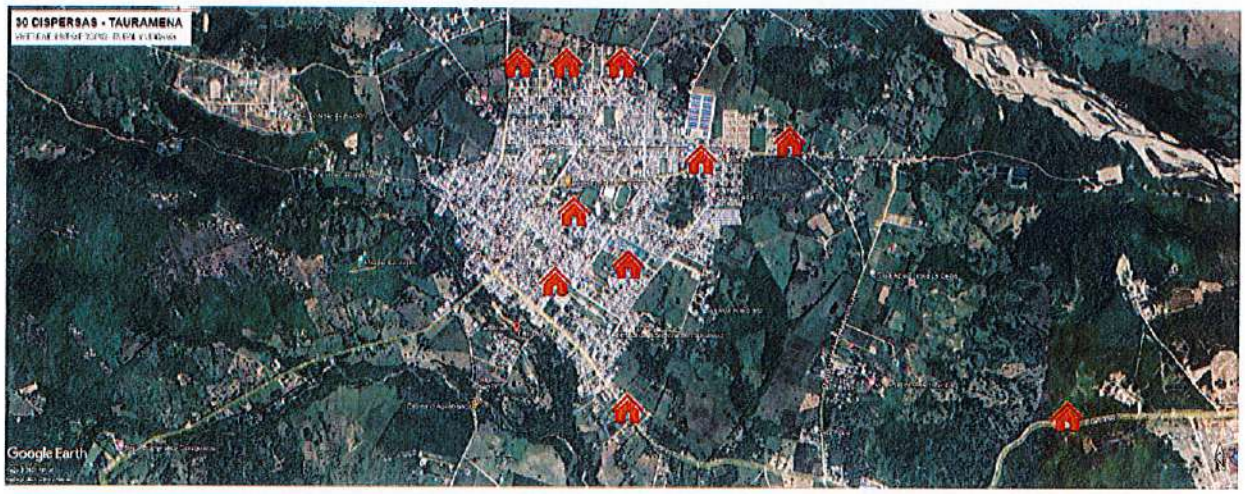

INTERVENTORÍA AL PROCESO IPEMT – OAP – 001 -2023

CONSTRUCTOR ASOCIADO: AS-BUILT S.A.S

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"

TAURAMENA, CASANARE

OCTUBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **4**

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORIA **5**

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA 6

1.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO 7

1.3. GARANTÍAS 7

1.3.1. GARANTÍAS INICIALES 7

1.3.2. GARANTÍAS – ACTA DE INICIO 8

1.3.3. GARANTÍAS – PRORROGA No.1 8

1.3.4. GARANTÍAS – REINICIO + PRORROGA No.2 8

1.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO 9

1.4.1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 9

1.4.2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 10

1.4.3. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 10

1.4.4. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 10

1.5. ANTICIPO Y FORMAS DE PAGO 15

1.5.1. CUENTA CONJUNTA 15

1.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 15

1.5.3. BALANCE FINANCIERO 16

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA **17**

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA 18

2.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO 19

2.3. GARANTÍAS 20

2.3.1. GARANTÍAS INICIALES 20

2.3.2. GARANTÍAS CONTRATO DE MANDATO 21

2.3.3. GARANTÍAS – ACTA DE RECIBO FINAL 33

2.4. LISTA DE BENEFICIARIOS 42

2.4.1. LISTA DE BENEFICIARIOS INICIALES 42

2.4.2. LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA ACTA DE INICIO 43

2.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO 45

2.5.1. DIRECTOR DE OBRA 45

2.5.2. RESIDENTE DE OBRA 45
2.5.3. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 46

2.6. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 50
2.6.1. FIDUCIA 50
2.6.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR VIVIENDA RURAL (20) 50
2.6.3. PLAN DE INVERSIÓN POR VIVIENDA URBANA (10) 51
2.6.4. ANTICIPO DEL BENEFICIARIO OMAR PINZÓN 52
2.6.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 52
2.6.6. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 53
2.6.7. RECIBO DE PAGO 53

2.7. ACTAS PARCIALES 53
2.7.1. CORTE No.2 – FIDUCIA 53
2.7.2. CORTE No.3 – FIDUCIA 55
2.7.3. BALANCE FINANCIERO 57

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OBRA 58

3.1. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 59

3.2. ASPECTO TÉCNICO 60
3.2.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA 60
3.2.2. RE-PROGRAMACIÓN DE OBRA – PRORROGA No.1 62
3.2.3. RE-PROGRAMACIÓN DE OBRA – ACTA DE REINICIO + PRORROGA No.2 62
3.2.4. CERTIFICADOS DE CALIDAD 63
3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 63

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 89

5. ANEXOS 90

INTRODUCCIÓN

El presente informe obedece al control, seguimiento, evaluación y viabilidad realizado desde el 12 de abril de 2024, hasta el 08 de agosto de 2025, en cumplimiento de mis obligaciones contractuales como interventoría contratada contenida en la **CLAUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** (...) 2. Hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos (...) Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones.

La presente interventoría realizo el seguimiento a la ejecución de los veinte nueve (29) contratos de mandatos de obra civil bajo el proceso IPEM – OAP – 001 - 2023, hechos que se pueden evidenciar es este informe.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" garantiza la calidad de servicio y el cumplimiento del contrato en desarrollo, velando por la correcta ejecución para cumplir con las metas trazas, conservando los principios que rigen la contratación estatal, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORIA

Carrera 11 A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO DE CONSULTORÍA:	631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE TAURAMENA, CASANARE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"
NIT:	844.002.476-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 250,559,575.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No.1:	11 DE DICIEMBRE DE 2024 / DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN No.1:	31 DE ENERO DE 2025 /DOS (2) MESES
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1:	26 DE MARZO DE 2025 / DOS (2) MESES
REINICIO No.1:	30 DE MAYO DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE MAYO DE 2025 / DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE AGOSTO DE 2025

1.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Para cada una de las actuaciones que se relacionan a continuación, se realizaron los procedimientos y formatos establecidos por la entidad contratante, en concordancia con el manual de interventoría adoptado por el Municipio de Tauramena y firma por los que en el intervienen.

No.	ACTA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO
1	DE INICIO	12 / 04 / 2024	11 / 12 / 2024	OCHO (8) MESES
2	PRORROGA No.1	N/A	11 / 02 / 2025	DOS (2) MESES
3	SUSPENSIÓN No.1	31 / 01 /2025	30 / 03 / 2025	DOS (2) MESES
4	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1	26 / 03 / 2025	30 / 05 / 2025	DOS (2) MESES
5	REINICIO No.1	30 / 05 /2025	N/A	N/A
6	PRORROGA No.2	30 / 05 /2025	29 / 07 / 2025	DOS (2) MESES

1.3. GARANTÍAS

1.3.1. GARANTÍAS INICIALES

ASEGURA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	POLIZA	605-47-994000104959	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		14 / 12 / 2023		18 / 12 / 23	23 / 03 / 24	$ 25,055,957.50
CUMPLIMIENTO		N/A		N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		N/A		N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A		N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A		N/A	N/A	N/A

INGENARE S.A.S. ingeniería - arquitectura construcción

1.3.2. GARANTÍAS – ACTA DE INICIO

ASEGURA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	POLIZA	605-47-994000105185	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 04 / 2024		29 / 12 / 23	14 / 05 / 25	$ 25,055,957.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 04 / 2024		29 / 12 / 23	14 / 05 / 25	$ 125,279,787.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 04 / 2024		29 / 12 / 23	13 / 12 / 27	$ 12,527,978.75
CALIDAD DEL SERVICIO		16 / 04 / 2024		29 / 08 / 24	29 / 08 / 26	$ 25,055,957.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A		N/A	N/A	N/A
FECHA DE APROBACIÓN		19 / 04 / 2024		N/A	N/A	N/A

1.3.3. GARANTÍAS – PRORROGA No.1

ASEGURA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	POLIZA	605-47-994000105185	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		13 / 12 /2024		29 / 12 / 23	13 / 07 / 25	$ 25,055,957.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		13 / 12 /2024		19 / 12 / 23	13 / 07 /25	$ 125,279,787.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13 / 12 /2024		29 / 12 / 23	11 / 02 / 26	$ 12,527,978.75
CALIDAD DEL SERVICIO		13 / 12 /2024		29 / 08 / 24	29 / 10 / 26	$ 25,055,957.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A		13 / 12 / 24	13 / 02 / 25	N/A
FECHA DE APROBACIÓN		19 / 12 / 2024		N/A	N/A	N/A

1.3.4. GARANTÍAS – REINICIO + PRORROGA No.2

ASEGURA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	POLIZA	605-47-994000105185	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		12 / 06 / 2025		09 / 10 / 25	08 / 12 / 25	$ 25,055,957.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		12 / 06 / 2025		09 / 10 / 25	08 / 12 / 25	$ 125,279,787.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		12 / 06 / 2025		09 / 06 / 25	09 / 08 / 28	$ 12,527,978.75
CALIDAD DEL SERVICIO		12 / 06 / 2025		09 / 08 / 25	09 / 08 / 27	$ 25,055,957.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA		25 / 06 /2025		09 / 06 / 25	09 / 08 / 25	N/A
FECHA DE APROBACIÓN		01 / 07 / 2025		N/A	N/A	N/A

1.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO

"CLAUSULA CUARTA – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la ley 828 de 2003, y Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos) así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), en concordancia con lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, la 797 de 2003, ley 1562 de 2012, decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 2082 de 2016"

A continuación, se relaciona el personal ofertado y presente en la ejecución del contrato de consultoría No. 631 del 29 de diciembre de 2023 para el mes del presente informe:

1.4.1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE:	WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ		DEDICACIÓN:	50.00 %	CEDULA:	17.348.699
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
A25101999-17348699	CONTRATO OPS	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 178,000	$ 0,00	$ 99,100

NOMBRE:	WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ		DEDICACIÓN:	50.00 %	CEDULA:	17.348.699
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
					TOTAL:	$ 527,300

1.4.2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

NOMBRE:	MARIO ENRIQUE FAJARDO ROJAS		DEDICACIÓN:	100.00 %	CEDULA:	74.180.848
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
A25011999-74180848	CONTRATO DE TRABAJO	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
					TOTAL:	$ 440 ,000

1.4.3. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE:	EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN		DEDICACIÓN:	50.00 %	CEDULA:	74.180.496
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
15502008465 BYC	CONTRATO DE TRABAJO	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
					TOTAL:	$ 440,000

1.4.4. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En virtud del artículo octavo del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, el cual reza lo siguiente: " se exonera a las personas naturales empleadoras con más de dos (02) empleados a realizar los aportes de Parafiscales del Sena e ICBF, por los empleados que individualmente devenguen menos de diez (10) S.M.M.L.V y a partir del primero de enero de 2014, los contribuyentes que cumplan las condiciones de este artículo. Estará exonerado de las cotizaciones al regimiento contributivo de Salud, de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente menos de (10) salarios S.M.M.L.V"

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

MES DE ABRIL - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1744357178	2024	ABRIL (4)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
30127789	2024	ABRIL (4)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
29807208	2024	ABRIL (4)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
SUB TOTAL			$ 547,800	$ 247,500	$ 85,000	$ 238,400
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,118,700.00**			

MES DE MAYO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1744357186	2024	MAYO (5)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
30128643	2024	MAYO (5)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
30128643	2024	MAYO (5)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
SUB TOTAL			$ 547,800	$ 247,500	$ 85,000	$ 238,400
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,118,700.00**			

MES DE JUNIO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1744357208	2024	JUNIO (6)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
30361401	2024	JUNIO (6)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
30361401	2024	JUNIO (6)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
SUB TOTAL			$ 547,800	$ 247,500	$ 85,000	$ 238,400
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,118,700.00**			

MES DE JULIO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1744921936	2024	JULIO (7)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
30757214	2024	JULIO (7)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
30757214	2024	JULIO (7)	$ 209,600	$ 163,800	$ 0,00	$ 91.200
SUB TOTAL			$ 549,400	$ 359,300	$ 33,000	$ 239,100
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,180,800.00**			

MES DE AGOSTO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1744921911	2024	AGOSTO (8)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
30806756	2024	AGOSTO (8)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
30806756	2024	AGOSTO (8)	$ 209,600	$ 163,800	$ 0,00	$ 91.200
SUB TOTAL			$ 549,400	$ 359,300	$ 33,000	$ 239,100
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,180,800.00**			

MES DE SEPTIEMBRE - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1745519619	2024	SEPT. (9)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
31257406	2024	SEPT. (9)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
31257406	2024	SEPT. (9)	$ 209,600	$ 163,800	$ 0,00	$ 91.200
SUB TOTAL			$ 549,400	$ 359,300	$ 33,000	$ 239,100
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,180,800.00**			

MES DE OCTUBRE - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1745519619	2024	OCT. (10)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
31257406	2024	OCT. (10)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
31257406	2024	OCT. (10)	$ 209,600	$ 163,800	$ 0,00	$ 91.200
SUB TOTAL			$ 549,400	$ 359,300	$ 33,000	$ 239,100
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,180,800.00**			

MES DE NOVIEMBRE - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
31869580	2024	Nov. (11)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
31869580	2024	Nov. (11)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
7952154073	2024	Nov. (11)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
SUB TOTAL			$ 624,000	$ 266,500	$ 104,000	$ 271,500
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,266,000.00**			

MES DE DICIEMBRE - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
31869580	2024	Dic. (12)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
31869580	2024	Dic. (12)	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
7952154073	2024	Dic. (12)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
SUB TOTAL			$ 624,000	$ 266,500	$ 104,000	$ 271,500
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,266,000.00**			

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

MES DE ENERO - 2025

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
31869580	2025	Enero. (01)	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
31869580	2025	Enero. (01)	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
1746686675	2025	Enero. (01)	$ 227,800	$ 178,000	$ 0,00	$ 99,100
SUB TOTAL			$ 683,400	$ 292,000	$ 114,000	$ 297,300
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,386,700.00**			

MES DE JUNIO - 2025

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
31869580	2025	Junio (06)	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
31869580	2025	Junio (06)	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
1746686675	2025	Junio (06)	$ 227,800	$ 178,000	$ 0,00	$ 99,100
SUB TOTAL			$ 683,400	$ 292,000	$ 114,000	$ 297,300
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,386,700.00**			

MES DE JULIO - 2025

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
34395199	2025	Julio (07)	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
34395199	2025	Julio (07)	$ 227,800	$ 57,000	$ 57,000	$ 99,100
7988856848	2025	Julio (07)	$ 227,800	$ 178,000	$ 0,00	$ 99,100
SUB TOTAL			$ 683,400	$ 292,000	$ 114,000	$ 297,300
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,386,700.00**			

1.5. ANTICIPO Y FORMAS DE PAGO

"CLAUSULA TERCERA – ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: A) ANTICIPO: EL MUNICIPIO girará al **CONTRATISTA** el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, equivalente a la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($125,279,787.00)** en calidad de anticipo previa aprobación de plan de inversión del anticipo por parte del supervisor y una vez cumplan los requerimientos de ejecución del presente contrato"

1.5.1. CUENTA CONJUNTA

"**PARÁGRAFO PRIMERO**: Los recursos entregados por el MUNICIPIO al CONTRATISTA a título de anticipo, serán manejados en una cuenta separada de ahorros a nombre del contrato con domicilio en el Municipio de Tauramena. Estos dineros sólo podrán destinarse para la ejecución del contrato, en virtud de lo consagrado en la cláusula primera del presente contrato, y en ningún caso podrán ser retirados para incluirlos en otras cuentas bancarias"

La empresa INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S identificado (a) con NIT. 844002476, cuenta con una cuenta de ahorro en el banco Bancolombia.

CUENTA DE AHORROS – CONJUNTA			
NOMBRE PRODUCTO	**NÚMERO PRODUCTO**	**FECHA APERTURA**	**ESTADO**
CUENTA DE AHORROS	369-000018-95	2024/01/19	ACTIVA

1.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El plan de inversión del anticipo correspondiente al 50% del contrato de consultoría No. 631 del 2023 fue aprobado bajo los ítems técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, por un valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($125,279,787.00)**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**PORCENTAJE**	**VALOR**
1	VALOR DEL CONTRATO 631 DE 2023	100 %	$ 250,559,575.00
2	VALOR DE ANTICIPO	50 %	$ 125,279,787.00

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
3	VALOR TOTAL EN CALIDAD DE ANTICIPO	50 %	$ 125,279,787.00
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA	48 %	$ 60,134,297.76
2	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA	30 %	$ 37,583,936.10
3	INTERVENTORÍA FINANCIERA	4 %	$ 5,011,191.48
4	INTERVENTORÍA CONTABLE	6 %	$ 7,516,787,.20
5	INTERVENTORÍA JURÍDICA	6 %	$ 7,516,787,.20
6	INTERVENTORÍA AMBIENTAL	6 %	$ 7,516,787,.20
TOTAL, DEL ANTICIPO		100 %	$ 125,279,787.00

1.5.3. BALANCE FINANCIERO

Los pagos realizados a esta interventoría por la entidad contratante (Oficina Asesora de Planeación, Alcaldía de Tauramena, Casanare) correspondieron a la entrega del anticipo y un acta parcial No.1, que se relaciona de la siguiente manera:

BALANCE FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	V. CONTRATADO	ANTICIPO O AMORTIZACIÓN	V. EJECUTADO O POR EJECUTAR	V. PAGADO O APROBADOS PARA PAGO
Valor del contrato	$ 250,559,575.00			
Valor del anticipo (50%)		$ 125,279,787.00		$ 125,279,787.00
Valor acta parcial No.1		$ 125,279,787.00	$ 225,503,617.00	$ 100,223,830.00
Saldo por cobrar			**$ 25,055,958.00**	

A la fecha, la entidad contratante a cancelado a esta interventoría el 90% del valor del contrato, quedando por cancela el 10% del valor de mismo, el cual está sujeto al acta de recibo y liquidación de la interventoría por parte de la entidad.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

PROCESO IPEMT – OAP – 001 - 2023	
PROCESO:	IPEM – OAP – 001 - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE TAURAMENA, CASANARE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	AS-BUILT S.A.S
NIT:	900.198.104-2
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,522,442,371.00
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:	Este contrato de obra se rige bajo la adjudicación individual de diez (10) subsidios de vivienda urbana cada uno por un valor de $ 66,423,928.90); veinte (20) subsidios de vivienda rural cada uno por un valor de ($ 92,910,154.10)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN POR CADA CONTRATO DE MANDATO:	SIETE (7) MESES
NOTA:	Cada una de las viviendas a ejecutar se soporta en un contrato de mandato de obra civil el cual tiene como tiempo de duración de siete (7) meses que comienza a regir a partir del inicio de la ejecución de cada una de las viviendas; por ende, cada vivienda tiene una fecha de inicio y terminación diferente
OBSERVACIÓN:	Bajo los acontecimientos administrativo presentados en el desarrollo de los contratos de mandatos, el número final de subsidios aprobados por la entidad contratante para ejecución correspondió a vente nueve (29); diez (10) urbanos y diecinueve (19) rurales.
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	10 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	07 DE AGOSTO DE 2025

2.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Para cada una de las actuaciones que se relacionan a continuación, se realizaron los procedimientos en concordancia con el manual de interventoría adoptado por el Municipio de Tauramena y firma por los que en el intervienen.

LISTA DE ACTAS DE INICIO SEGÚN BENEFICIARIO				
No.	**BENEFICIARIO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**PLAZO**
1	BENEFICIARIOS DE VIVIENDA URBANA EN SITIO PROPIO			
1.1	SATOBA LÓPEZ ANA LUCIA	24 / 06 / 2024	20 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.2	PINO NOGUERA VIVIANA ANDREA	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.3	CUBIDES RAMIREZ JHOON ALEXANDER	04 / 07 / 2024	20 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.4	YEPES LEDESMA VIVÍA MARÍA	11 / 07 / 2024	06 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
1.5	DAZA CASTILLO RONY FERNANDO	14 / 08 /2024	12 / 03 / 2025	SIETE (7) MESES
1.6	SARMIENTO HERNÁNDEZ WENDY JUYANY	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.7	SALINAS MORALES MARILUZ	25 / 06 / 2024	21 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.8	MONROY POSADA ARLEY ALEXANDER	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.9	RAMIREZ AMÉZQUITA ANGIE MILENA	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.10	PLAZAS BRICEÑO LUIS CARLOS	15 / 07 / 2024	10 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
2	BENEFICIARIOS DE VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO			
2.1	LOZANO RAMIREZ DANIELA LUCIA	24 / 06 / 2024	20 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
2.2	VACA HERRERA BLANCA LIDIA	28 / 10 / 2024	26 / 05 / 2025	SIETE (7) MESES
2.3	PIÑEROS SOLER RONAL	16 / 10 / 2024	14 / 05 / 2025	SIETE (7) MESES
2.4	MORENO SALCEDO CLARIS GICEL	18 / 09 / 2024	16 / 04 / 2025	SIETE (7) MESES
2.5	MENDOZA JOSÉ DULIER	09 / 10 / 2024	07 / 05 / 2025	SIETE (7) MESES
2.6	SOLER SALINAS SOLMAR	23 / 09 / 2024	21 / 04 / 2025	SIETE (7) MESES
2.7	CRIOLLO FLÓREZ TATIANA	09 / 07 / 2024	04 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
2.8	DUARTE ESTUPIÑÁN CATHERINE ALICIA	29 / 07 / 2024	24 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES

LISTA DE ACTAS DE INICIO SEGÚN BENEFICIARIO				
No.	**BENEFICIARIO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**PLAZO**
2.9	ZORRO DAZA OSCAR OSWALDO	22 / 07 / 2024	17 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
2.10	REUTER PIRAGAUTA ALEXIS JAVIER	12 / 08 / 2024	10 / 03 / 2025	SIETE (7) MESES
2.11	CESPEDEZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA	21 / 11 / 2024	19 / 06 / 2025	SIETE (7) MESES
2.12	TARACHE PÉREZ FLORISBEL	17 / 09 / 2024	15 / 04 / 2025	SIETE (7) MESES
2.13	ZORRO CADENA SANDY YASMIN	04 / 10 / 2024	02 / 05 / 2025	SIETE (7) MESES
2.14	ROBLES LUIS ALEJANDRO	10 / 10 / 2024	08 / 05 / 2025	SIETE (7) MESES
2.15	JIMÉNEZ GARCÍA YENY JOHANA	04 / 10 / 2024	02 / 05 / 2025	SIETE (7) MESES
2.16	SOTAQUIRA TORRES ELÍAS	18 / 11 / 2024	16 / 06 / 2025	SIETE (7) MESES
2.17	CISNEROS AMAYA ERIKA YARITZA	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	SIETE (7) MESES
2.18	GÓMEZ MARTÍNEZ ROBINSON	16 / 09 / 2024	14 / 04 / 2025	SIETE (7) MESES
2.19	LÓPEZ PIDIACHE HEIDY NATALIA	13 / 09 / 2024	11 / 04 / 2025	SIETE (7) MESES
2.20	PINZÓN CARDENAS OMAR FAVIO	14 / 06 / 2025	10 / 01 / 2026	SIETE (7) MESES

2.3. GARANTÍAS

2.3.1. GARANTÍAS INICIALES

ASEGURA:	Seguros Mundial	**POLIZA**	COQ-100001713	**VIGENCIA**		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		30 / 11 / 2023		04 / 12 / 23	06 / 03 / 24	$ 252,244,237.10
CUMPLIMIENTO		N/A		N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		N/A		N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A		N/A	N/A	N/A

CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.2. GARANTÍAS CONTRATO DE MANDATO

Teniendo en cuenta la estructuración del proyecto, donde cada uno de los recursos por vivienda rural y vivienda urbana fue asignado a su respectivo beneficiario y que es ejecutado este recurso por el constructor asociado bajo el contrato de mandato de obra civil; cada beneficiario cuenta con su respectiva póliza.

DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	**POLIZA**	COQ-100001995	**VIGENCIA**		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

BLANCA LIDIA VACA HERRERA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	**POLIZA**	COQ-100001996	**VIGENCIA**		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001996	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

RONAL PIÑEROS SOLER – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001997	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

CLARIS GICEL MORENO SALCEDO – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001998	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

JOSÉ DULIER MENDOZA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001999	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

TATIANA CRIOLLO FLÓREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002001	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002002	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002002	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002003	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002004	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002004	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002005	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

FLORISBEL TARACHE PÉREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002006	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

SANDY YASMIN ZORRO CADENA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002007	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

LUIS ALEJANDRO ROBLES – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002008	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002009	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002009	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ELÍAS SOTAQUIRA TORRES – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002010	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ERIKA YARITZA CISNEROS AMAYA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002011	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002012	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002022	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

OMAR FAVIO PINZÓN CARDENAS – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002013	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002013	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002014	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

VIVIANA ANDREA PINO NOGUERA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002028	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002028	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002015	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002016	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

RONY FERNANDO DAZA CASTILLO – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002017	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002018	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

MARILUZ SALINAS MORALES – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002019	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002019	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002027	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002020	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002020	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002021	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

2.3.3. GARANTÍAS – ACTA DE RECIBO FINAL

ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002014	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		04 / 09 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		04 / 09 /24	02 / 12 /24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	04 / 07 /26	$ 3,321,196.45

ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002027	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	04 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002020	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		04 / 09 / 24	04 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002015	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002015	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	11 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002021	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		12 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		12 / 11 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		12 / 11 / 24	12 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

MARILUZ SALINAS MORALES– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002019	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002019	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	05 / 09 / 26	$ 3,321,196.45

RONY FERNANDO DAZA CASTILLO– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002017	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 10 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		01 / 10 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		01 / 10 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		01 / 10 / 24	01 / 10 / 26	$ 3,321,196.45

VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002016	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		11 / 10 / 24	11 / 10 / 26	$ 3,321,196.45

WENDY JURANY SARMIENTO HERNÁNDEZ– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002018	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		31 / 08 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		31 / 08 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		31 / 08 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		31 / 08 / 24	31 / 08 / 26	$ 3,321,196.45

VIVIANA ANDREA PINO NOGUERA– VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002028	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	01 / 08 / 27	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		05 / 09 / 24	05 / 09 / 26	$ 3,321,196.45

CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002002	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002002	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

CLARIS GICEL MORENO SALCEDO– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001998	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001995	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		06 / 11 / 24	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

OSCAR ZORRO DAZA– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002003	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002003	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

SANDY YASMIN ZORRO CADENA– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002003	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002003	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

SOLMAR SOLER SALINAS– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002000	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

TATIANA CRIOLLO FLÓREZ– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002001	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	01 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002001	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 11 / 26	$ 4,645,507.75

FLORISBEL TARACHE– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002006	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		30 / 12 / 2024		01 / 11 / 24	01 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	01 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30 / 12 / 2024		13 / 11 / 24	13 / 11 / 26	$ 4,645,507.75

OMAR FAVIO PINZÓN– VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002006	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		23 / 09 / 2025		30 / 07 / 25	13 / 05 / 26	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		23 / 09 / 2025		30 / 07 / 25	13 / 06 / 26	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		23 / 09 / 2025		30 / 07 / 25	13 / 01 / 29	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		23 / 09 / 2025		30 / 07 / 25	30 / 07 / 27	$ 4,645,507.75

2.4. LISTA DE BENEFICIARIOS

2.4.1. LISTA DE BENEFICIARIOS INICIALES

A continuación, se relación los beneficiarios aprobados bajo la resolución individual del 22 de diciembre del 2023:

LISTA DE BENEFICIARIOS – 30 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ELÍAS SOTAQUIRA TORRES	1.15.916.861	RURAL	1641	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ERIKA YARITZA AMAYA CISNEROS	1.115.916.289	RURAL	1642	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10

LISTA DE BENEFICIARIOS – 30 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OMAR FAVIO PINZÓN CARDENAS	74.845.589	RURAL	1645	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90

2.4.2. LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA ACTA DE INICIO

Luego de dar solución a los inconvenientes administrativos la oficina asesora de planeación actualiza la lista de beneficiarios a veinte nueve (29) quedando de la siguiente manera:

LISTA DE BENEFICIARIOS – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

LISTA DE BENEFICIARIOS – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ERIKA YARITZA AMAYA CISNEROS	1.115.916.289	RURAL	1642	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OMAR FAVIO PINZÓN CARDENAS	74.845.589	RURAL	1645	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90

LISTA DE BENEFICIARIOS – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90

El beneficiario aprobado por parte de la alcaldesa ad hoc LILIANA VALBUENA MONROY, directora de Vivienda Departamental, Gobernación de Casanare; es OMAR FAVIO PINZÓN CARDENAS, el cual cumple con todos los requerimientos presentes para el subsidio.

Esta interventoría realizo la visita al predio, donde pudo corroborar las condiciones exigidas, por lo cual dio viabilidad al constructor asociado para ejecutar el subsidio en la vereda Yaguaros, municipio de Tauramena, Casanare.

2.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.5.1. DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE:	JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ		DEDICACIÓN:	50.00 %	CEDULA:	7.177.872
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
A15282003-7177872	CONTRATO DE TRABAJO	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
					TOTAL:	$ 774,000

2.5.2. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE:	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ		DEDICACIÓN:	100.00 %	CEDULA:	4.615.271
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
19202-171743 CAD	CONTRATO DE TRABAJO	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
					TOTAL:	$ 557,300

2.5.3. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En virtud del artículo octavo del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, el cual reza lo siguiente: " se exonera a las personas naturales empleadoras con más de dos (02) empleados a realizar los aportes de Parafiscales del Sena e ICBF, por los empleados que individualmente devenguen menos de diez (10) S.M.M.L.V y a partir del primero de enero de 2014, los contribuyentes que cumplan las condiciones de este artículo. Estará exonerado de las cotizaciones al regimiento contributivo de Salud, de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente menos de (10) salarios S.M.M.L.V"

MES DE ABRIL - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9466862933	2024	ABRIL (4)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9466862933	2024	ABRIL (4)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
SUB TOTAL			$ 688,000	$ 172,000	$ 172,000	$ 299,300
VALOR TOTAL PAGADO			$ 1,331,300.00			

MES DE MAYO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9468402350	2024	MAYO (5)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9468402350	2024	MAYO (5)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
SUB TOTAL			$ 688,000	$ 172,000	$ 172,000	$ 299,300
VALOR TOTAL PAGADO			$ 1,331,300.00			

MES DE JUNIO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9469870064	2024	JUNIO (6)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9469870064	2024	JUNIO (6)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
SUB TOTAL			$ 688,000	$ 172,000	$ 172,000	$ 299,300
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,331,300.00**			

MES DE JULIO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9471202028	2024	JULIO (7)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9471202028	2024	JULIO (7)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9471202832	2024	JULIO (7)	$ 4,329,600	$ 1,027,400	$ 1,036,300	$ 1,787,100
SUB TOTAL			$ 5,017,600	$ 1,199,400	$ 1,118,300	$ 2,086,400
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 9,421,700.00**			

MES DE AGOSTO - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9473082851	2024	AGOSTO (8)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9473082851	2024	AGOSTO (8)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9472897393	2024	AGOSTO (8)	$ 4,865,700	$ 1,160,100	$ 1,196,800	$ 1,963,300
SUB TOTAL			$ 5,553,700	$ 1,332,100	$ 1,368,800	$ 2,262,600
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 10,517,200.00**			

MES DE SEPTIEMBRE - 2024

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9475243639	2024	SEPT. (9)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9475243639	2024	SEPT. (9)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9475245184	2024	SEPT. (9)	$ 4,787,700	$ 1,185,200	$ 1,211,800	$ 2,022,900
SUB TOTAL			$ 5,475,700	$ 1,357,200	$ 1,383,800	$ 2,322,200
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 10,538,900.00**			

MES DE OCTUBRE - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9475243639	2024	OCT. (10)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9475243639	2024	OCT. (10)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9475245184	2024	OCT. (10)	$ 4,787,700	$ 1,185,200	$ 1,211,800	$ 2,022,900
SUB TOTAL			$ 5,475,700	$ 1,357,200	$ 1,383,800	$ 2,322,200
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 10,538,900.00**			

MES DE NOVIEMBRE - 2024

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9478603604	2024	Nov. (11)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9478603604	2024	Nov. (11)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9478616187	2024	Nov. (11)	$ 3,655,300	$ 890,000	$ 937,200	$ 133,400
SUB TOTAL			$ 4,343,300	$ 1,062,000	$ 1,109,200	$ 432,700
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 6,947,200.00**			

MES DE DICIEMBRE - 2024

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9480051760	2024	Dic. (12)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9480051760	2024	Dic. (12)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9479808961	2024	Dic. (12)	$ 2,794,300	$ 698,700	$ 947,100	$1,007,900
SUB TOTAL			$ 3,482,300	$ 870,7000	$ 1,109,200	$ 1,307,200
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 6,769,400.00**			

MES DE ENERO - 2025

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
94840307	2025	Enero (01)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
94840307	2025	Enero (01)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9481403772	2025	Enero (01)	$ 1,109,700	$ 268,300	$ 268,300	$ 264,600
SUB TOTAL			$ 1,797,700	$ 440,300	$ 440,300	$ 563,900
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 3,324,200.00**			

MES DE JUNIO - 2025

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9488402243	2025	Junio (06)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9488402243	2025	Junio (06)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9488301038	2025	Junio (06)	$ 911,800	$ 203,500	$ 203,500	$ 353,800
SUB TOTAL			$ 1,599,800	$ 375,500	$ 375,500	$ 653,100
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 3,003,900.00**			

MES DE JULIO - 2025

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9490023939	2025	Julio (07)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
9490023939	2025	Julio (07)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9490024583	2025	Julio (07)	$ 319,200	$ 80,000	$ 111,900	$ 139,100
SUB TOTAL			$ 1,007,200	$ 252,000	$ 283,900	$ 438,400
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,981,500.00**			

2.6. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

"CLAUSULA OCTAVA. FORMAS DE PAGO, POR PARTE DEL MUNICIPIO: Para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento del contrato suscrito entre constructor y beneficiario (...) el pago al constructor se realizará de la siguiente forma: Hasta el treinta (30%) en calidad de anticipo. El sesenta (60%) mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra y el diez (10%) restante una vez este ejecutado la totalidad de la vivienda y recibida a satisfacción por el contratante (beneficiario) (...)"

2.6.1. FIDUCIA

Dando cumplimiento a los requisitos, se apertura la cuenta de encaro fiduciario, reservada para el manejo de los recursos destinados a ejecutar la construcción de treinta (30) viviendas nuevas en sitio propio urbano y rural, en el Municipio de Tauramena, en el fondo abierto 1525 de FIDUCENTRAL con Cuenta de Ahorros No. 4563-000555-42 del Banco DAVIVIENDA a nombre de FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL.

CUENTA DE AHORROS			
NOMBRE PRODUCTO	**NÚMERO PRODUCTO**	**FECHA APERTURA**	**ESTADO**
CUENTA DE AHORROS	4563-000555-42	N/A	ACTIVA

2.6.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR VIVIENDA RURAL (20)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
1	APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	100,00 %	$ 92,910,154.10
2	VALOR DEL ANTICIPO	30,00 %	$ 27,873,046.00
3	VALOR TOTAL EN CALIDAD DE ANTICIPO	30,00 %	$ 27,873,046.00

1	COSTOS PERSONAL TÉCNICO EMPRESA	3,91 %	$ 1,089,836.10
2	COMPRA DE MATERIALES	72,00 %	$ 20,068,593.12
3	PAGO MANO DE OBRA	8,00 %	$ 2,229,843.68
4	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA OPERATIVA	6,42 %	$ 1,789,449.55
5	Maquinaria, equipo y vehículos menores	8,82 %	$ 2,458,402.66
6	Gastos operativos y oficina	0,35 %	$ 97,555.66
7	Otros (imprevistos, costos financieros)	0,50 %	$ 139,365.23
TOTAL, DEL ANTICIPO		100 %	$ 27,873,046.00

2.6.3. PLAN DE INVERSIÓN POR VIVIENDA URBANA (10)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
1	APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	100,00 %	$ 66,423,928.90
2	VALOR DEL ANTICIPO	30,00 %	$ 19,927,179.00
3	VALOR TOTAL EN CALIDAD DE ANTICIPO	30,00 %	$ 19,927,179.00

1	COSTOS PERSONAL TÉCNICO EMPRESA	3,91 %	$ 779,152.70
2	COMPRA DE MATERIALES	72,00 %	$ 14,347,568.88
3	PAGO MANO DE OBRA	8,00 %	$ 1,594,174.32
4	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA OPERATIVA	6,42 %	$ 1,279,324.89
5	Maquinaria, equipo y vehículos menores	8,82 %	$ 1,757,577.19
6	Gastos operativos y oficina	0,35 %	$ 69,745.13
7	Otros (imprevistos, costos financieros)	0,50 %	$ 99,635.90

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL, DEL ANTICIPO		100 %	$ 19,927,179.00

2.6.4. ANTICIPO DEL BENEFICIARIO OMAR PINZÓN

Las nuevas condiciones que rigen la ejecución del subsidio de vivienda en lote propio para el beneficiario Omar Favio Pinzón Cardes establecen que no se realizará anticipo del subsidio al constructor asociado, por lo cual el valor total de subsidio será girado al constructor cuando se haya dado acta de terminación y posteriormente acta de recibo y entrega final de la materialización del subsidio de una vivienda rural en lote propio.

2.6.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el período de la presente rendición de cuentas, se han percibido rendimiento de la siguiente manera:

RENDIMIENTOS		
PERIODO	1525002001892	1525002001893
RENDIMIENTOS AÑO 2024	$ 64.118,45	$ 67.903.243,31
RENDIMIENTOS ENERO 2025	$ 6.407,49	$ 1.120.877,97
RENDIMIENTOS FEBRERO 2025	$ 5.720,52	$ 5.201.262,83
RENDIMIENTOS MARZO 2025	$ 6.058,87	$ 537.272,35
RENDIMIENTOS ABRIL 2025	$ 6.316,98	$ 543.682,64
RENDIMIENTOS MAYO 2025	$ 6.561,57	$ 491.014,34
TOTAL, GIRADO	**$ 95.183,88**	**$ 75.797.353,44**

Debido a las nuevas condiciones establecidas por la alcaldesa ad hoc para el contrato de mandato del beneficiario OMAR FAVIO PINZÓN, el constructor asociado realiza el cierre de la fiducia, teniendo en cuenta que el valor total del subsidio será girado al constructor asociado cuando se cuente con acta de recibo y entrega a satisfacción por parte de esta interventoría y el beneficiario.

2.6.6. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

La FIDUCIARIA CENTRAL S.A. certifica el día 29 de agosto del 2025, que la empresa As-BUILT S.A.S. se encuentra a paz y salvo con la fiduciaria.

2.6.7. RECIBO DE PAGO

Se anexan copias de los recibos de pago de cada uno de los pagos realizados por la fiduciaria por concepto de rendimientos financieros.

2.7. ACTAS PARCIALES

El constructor asociado a la fecha de este informe a realizado la solicitud de trámite de dos (2) actas parciales, la cual fue revisada, aprobada y viabilizada para ser girada por la fiducia; las condiciones aprobadas de la parciales (cortes) fueron las siguientes:

2.7.1. CORTE No.2 – FIDUCIA

LISTA DE BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL CORTE No. 2 **(70%)**
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

LISTA DE BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL CORTE No. 2 **(70%)**
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 46,496,750.23
				SUB TOTAL	**$ 464,967,502.30**
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 65,037,107.87
				SUB TOTAL	**$ 650,371,078.70**

TOTAL	**$ 1,115,338,581.00**

LISTA DE BENEFICIARIOS CON AVANCE DEL 90% DE EJECUCIÓN					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL CORTE No. 2 **(60%)**
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 55,746,092.46
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 55,746,092.46
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 55,746,092.46
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 55,746,092.46
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 55,746,092.46
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 55,746,092.46
				SUB TOTAL	**$ 334,476,554.76**

TOTAL	**$ 334,476,554.76**

VALOR TOTAL DEL CORTE No.2 APROBADO	
BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO – DIEZ (10) URBANOS Y DIEZ (10) RURALES	$ 1,115,338,581.00
BENEFICIARIOS CON AVANCE DEL 90% DE EJECUCIÓN – SEIS (6) VIVIENDAS RURALES	$ 334,476,554.76

$ 1,449,815,136.00

El valor del corte No.2 corresponde a MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS. ($ 1,449,815,136.00)

2.7.2. CORTE No.3 – FIDUCIA

LISTA DE BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL CORTE No. 3 **(10%)**
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 9,291,015.00
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 9,291,015.00
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 9,291,015.00
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 9,291,015.00
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 9,291,015.00
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 9,291,015.00
				TOTAL	**$ 55,746,090.00**

LISTA DE BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL CORTE No. 3 **(70%)**
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 65,037,110.00
				TOTAL	**$ 65,037,110.00**

LISTA DE BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL CORTE No. 3 **(100%)**
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
ELÍAS SOTAQUIRA TORRES	1.15.916.861	RURAL	1641	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.00
				TOTAL	**$ 92,910,154.00**

VALOR TOTAL DEL CORTE No.3 APROBADO	
BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO – SEIS (6) VIVIENDAS RURALES – 10%	$ 55,746,090.00

VALOR TOTAL DEL CORTE No.3 APROBADO	
BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO – UNA (1) VIVIENDA RURAL – 70%	$ 65,037,110.00
BENEFICIARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO – UNA (1) VIVIENDA RURAL – 100%	$ 92,910,154.00
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO – ERIKA YARITZA CISNEROS AMAYA	-$ 27,873,046.00
	$ 185,820,308.00

El valor del corte No.3 corresponde a CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS. ($ 185,820,308.00)

2.7.3. BALANCE FINANCIERO

Los pagos viabilizados y realizados por medio de la fiducia al constructor asociado fueron el anticipo de diez (10) viviendas urbanas, dieciocho (18) viviendas rurales, el corte No.2 y el corte No.3.

BALANCE FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	V. CONTRATADO	ANTICIPO O AMORTIZACIÓN	V. EJECUTADO O POR EJECUTAR	V. PAGADO O APROBADOS PARA PAGO
Valor del contrato	$ 2,522,442,371.00			
Valor del anticipo de diez (10) viviendas urbanas (30%) Corte No1:		$ 199,271,790.00		$ 199,271,790.00
Valor del anticipo de dieciocho (18) viviendas rurales (30%) Corte No1:		$ 501,714,828.00		$ 501,714,828.00
Valor del corte No.2:			$ 1,449,815,136.00	$ 1,449,815,136.00
Valor del corte No.3:			$ 213,693,354.00	
Devolución, retiro voluntario del subsidio:			- $ 27,873,046.00	$ 185,820,308.00
Saldo por pagar:			**$ 92,910,154.10**	

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OBRA

Carrera 11 A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

3.1. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

El día 28 de mayo del 2024, el constructor asociado procede a realizar la solicitud de giro del anticipo correspondiente al treinta (30%) del valor del subsidio destinado a cada beneficiario. La solicitud la realiza bajo la nueva lista de beneficiarios aprobada por la oficina asesora de planeación que cuenta con veinte ocho (28) beneficiarios; diez (10) urbanos y diez ocho (18) rurales.

FORMATO DE RELACIÓN DE PAGOS – ENCARGO FIDUCIARIO					
EMPRESA	**NIT**	**V. A GIRAR**	**No. CUENTA**	**TIPO CUENTA**	**ENTIDAD FIN.**
AS BUILT S.A.S	900.198.104-2	$ 700,986,619.00	36980332238	AH	BANCOLOMBIA

LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA GIRO DEL 30% – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL ANTICIPO (30%)
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00

LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA GIRO DEL 30% – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL ANTICIPO (30%)
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
ERIKA YARITZA AMAYA CISNEROS	1.115.916.289	RURAL	1642	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00

3.2. ASPECTO TÉCNICO

3.2.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

SEMANA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
MES DE MAYO				
SEMANA No.1	1.32 %	1.32 %	0.00 %	0.00 %
SEMANA No.2	1.32 %	2.64 %	0.00 %	0.00 %
SEMANA No.3	1.32 %	3.96 %	0.00 %	0.00 %
SEMANA No.4	1.32 %	5.28 %	1.53 %	1.53 %
MES DE JUNIO				
SEMANA No.5	1.97 %	7.25 %	1.86 %	3.39 %
SEMANA No.6	1.97 %	9.22 %	2.47 %	5.86 %
SEMANA No.7	1.97 %	11.19 %	1.24 %	7.10 %
SEMANA No.8	2.00 %	13.19 %	2.19 %	9.29 %
MES DE JULIO				
SEMANA No.9	2.63 %	15.82 %	1.54 %	10.83 %
SEMANA No.10	2.63 %	18.45 %	1.21 %	12.04 %
SEMANA No.11	2.63 %	21.08 %	1.79 %	13.83 %
SEMANA No.12	2.64 %	23.72 %	1.65 %	15.48 %
MES DE AGOSTO				
SEMANA No.13	3.42 %	27.14 %	2.53 %	18.01 %
SEMANA No.14	3.42 %	30.56 %	4.78 %	22.79 %
SEMANA No.15	3.42 %	33.98 %	6.35 %	29.14 %
SEMANA No.16	3.45 %	37.43 %	8.69 %	37.83 %
MES DE SEPTIEMBRE				
SEMANA No.17	3.68 %	41.11 %	3.91 %	41.74 %
SEMANA No.18	3.68 %	44.79 %	6.76 %	48.50 %
SEMANA No.19	3.68 %	48.47 %	5.14 %	53.64 %
SEMANA No.20	3.69 %	52.16 %	3.92 %	57.47 %
MES DE OCTUBRE				
SEMANA No.21	4.60 %	56.76 %	3.79 %	61.26 %
SEMANA No.22	4.60 %	61.36 %	2.17 %	63.43 %
SEMANA No.23	4.60 %	65.96 %	1.52 %	64.95 %
SEMANA No.24	4.62 %	70.58 %	6.70 %	71.65 %
MES DE NOVIEMBRE				

SEMANA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
SEMANA No.25	7.35 %	77.93 %	7.12 %	78.77 %
SEMANA No.26	7.35 %	85.28 %	6.88 %	85.65 %
SEMANA No.27	7.35 %	92.63 %	3.64 %	89.29 %
SEMANA No.28	7.37 %	100.00 %	1.20 %	90.74 %

3.2.2. RE-PROGRAMACIÓN DE OBRA – PRORROGA No.1

Bajo las condiciones iniciales establecidas en el proceso IPEMT – OAP – 001 – 2023, se establen diez (10) beneficiarios urbanos y veinte (20) beneficiarios rurales; sin embargo *(...) "A la fecha por situaciones ajenas a la entidad y al contratista no se han podido adelantar las obras de construcción de subsidio de un beneficiario (...) Por tal motivo, de acuerdo a las determinaciones jurídicas y administrativas que tomara al entidad sobre el beneficiario se debe seguir garantizando las condiciones se seguimiento y control"*

SEMANA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
MES DE DICIEMBRE				
SEMANA No. 29	0.48 %	90.97 %	0.25 %	90.74 %
SEMANA No. 31	0.48 %	91.45 %	0.76 %	91.50 %
SEMANA No. 32	0.48 %	91.93 %	0.43 %	91.93 %
SEMANA No. 33	0.48 %	92.41 %	0.34 %	92.27 %
MES DE ENERO				
SEMANA No. 34	0.48 %	92.89 %	0.04 %	92.31 %
SEMANA No. 35	0.48 %	93.37 %	0.10 %	92.41%
SEMANA No. 36	0.48 %	93.85 %	0.10 %	92.51 %
SEMANA No. 37	0.48 %	94.33 %	0.00 %	92.51 %

3.2.3. RE-PROGRAMACIÓN DE OBRA – ACTA DE REINICIO + PRORROGA No.2

Solventados los inconvenientes administrativos para la ejecución del subsidio del beneficiario Omar Favio Pinzón, se realiza acta de reinicio el día 30 de mayo de 2025, y teniendo en consideración que el contrato de interventoría contaba a esa fecha con diez (10) días vigentes, se solicita la prórroga No.2 por un

periodo de dos (2) meses con la finalidad de realizar el control y seguimiento a la ejecución de la materialización del subsidio del beneficiario. Por estos motivos se realiza la reprogramación del proyecto.

SEMANA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
MES DE JUNIO				
SEMANA No. 38	1.07 %	93.58 %	0.30 %	92.81 %
SEMANA No. 39	0.85 %	94.43 %	0.45 %	93.26 %
SEMANA No. 40	1.00 %	95.43 %	0.32 %	93.58 %
SEMANA No. 41	0.35 %	95.78 %	0.35 %	93.93 %
MES DE JULIO				
SEMANA No. 42	0.69 %	96.47 %	0.26 %	94,19 %
SEMANA No. 43	0.85 %	97.32 %	0.84 %	95,03 %
SEMANA No. 44	1.64 %	98.96 %	0. 50 %	95,53 %
SEMANA No. 45	1.04 %	100.00 %	0.66 %	96,19 %

A la fecha del presente informe, el constructor asociado a materializado veinte nueve (29) subsidios de vivienda, diez (10) corresponde a viviendas urbanas y (19) a viviendas rurales; el subsidio que no fue ejecutado corresponde a la beneficiaria ERIKA YARITZA CISNEROS AMAYA, la cual realizo el retiro voluntario de subsidio el día 04 de febrero del 2025 por medio de oficio remitido a la alcaldía de Tauramena.

Por tal motivo el avance final al cual se le realizó el control y seguimiento es del 96,19 %, el cual corresponde a los veinte nueve (29) subsidios aprobados por la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Tauramena, Casanare.

3.2.4. CERTIFICADOS DE CALIDAD

Durante el periodo, la interventoría verifico la correlación de los certificados de calidad presentados por el contratista vs los insumos dispuestos en cada frente de trabajo.

3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se relaciona un registro fotográfico de las actividades ejecutas por el constructor asociado y la terminación de cada una de las viviendas:

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN



VIVIENDA URBANA – EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchia - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – CONCRETO CICLÓPEO



VIVIENDA URBANA – CONCRETO CICLÓPEO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11 A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – ACERO Y VIGA DE CIMENTACIÓN



VIVIENDA URBANO – ACERO Y VIGA DE CIMENTACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – MAMPOSTERÍA



VIVIENDA URBANO – MAMPOSTERÍA



REGISTRO FOTOGRÁFICO


Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – CUBIERTA Y PAÑETES



VIVIENDA URBANO – CUBIERTA Y PAÑETES

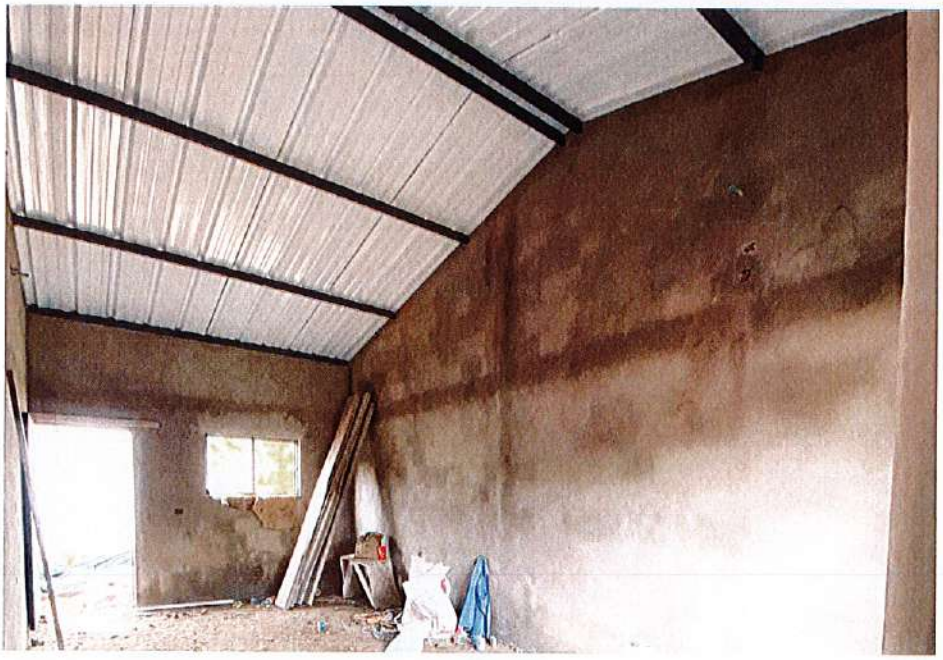

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

VIVIENDA RURAL – PLACA DE CONTRAPISO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	
VIVIENDA URBANO – PLACA DE CONTRAPISO	
	

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – CARPINTERÍA METÁLICA



VIVIENDA URBANO – CARPINTERÍA METÁLICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchia - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – BAÑO



VIVIENDA URBANO – BAÑO



REGISTRO FOTOGRÁFICO


Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

VIVIENDA RURAL – COCINA



VIVIENDA URBANO – COCINA

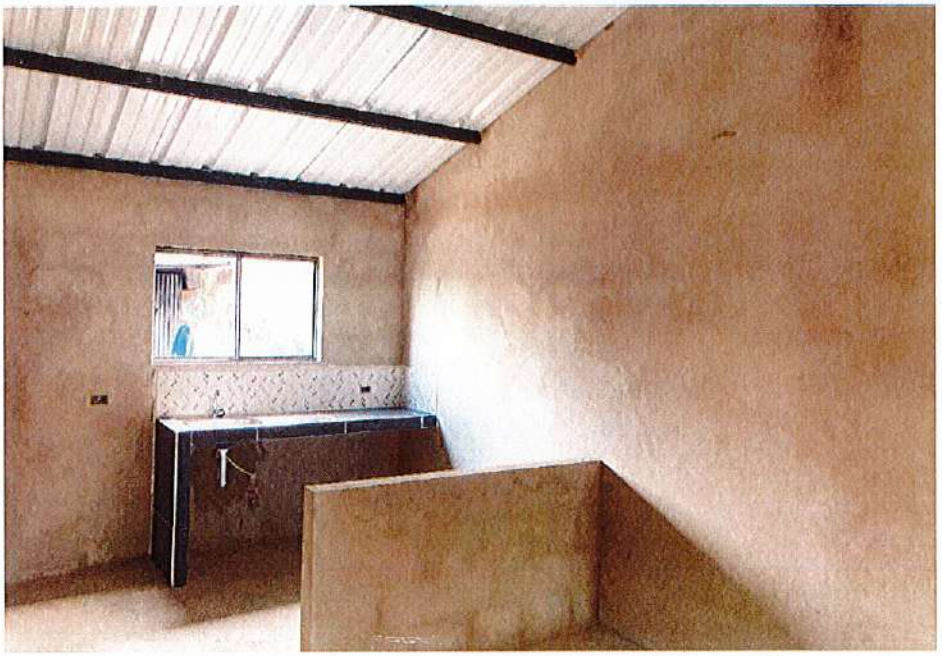

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

VIVIENDA URBANO – FACHADA



VIVIENDA URBANO – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchia - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA URBANO – FACHADA



VIVIENDA URBANO – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA URBANO – FACHADA



VIVIENDA URBANO – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es


NIT: 9140004762

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA URBANO – FACHADA



VIVIENDA URBANO – FACHADA

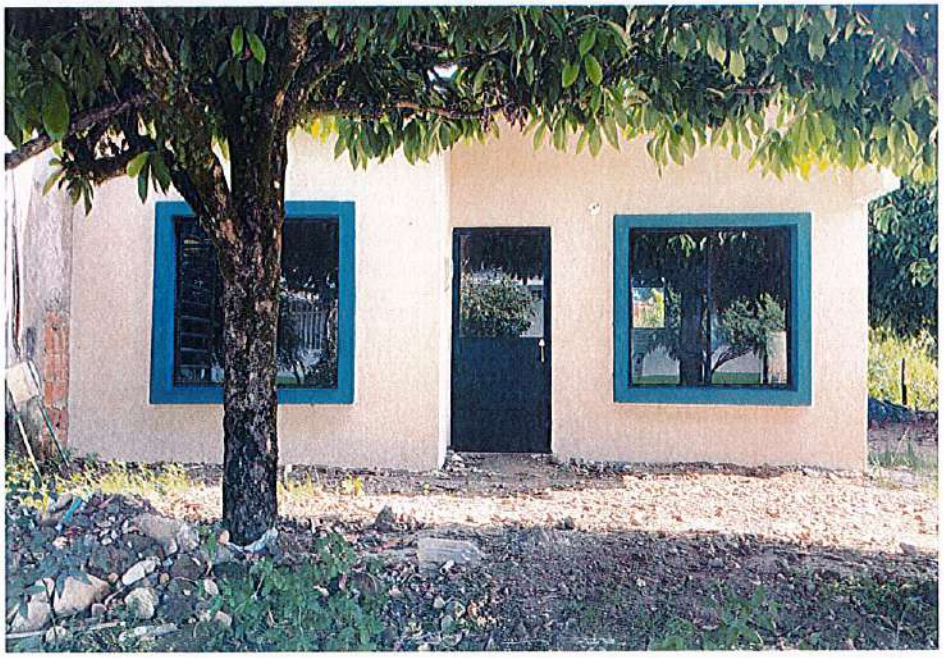


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchia - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9140004762-2

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA URBANO – FACHADA

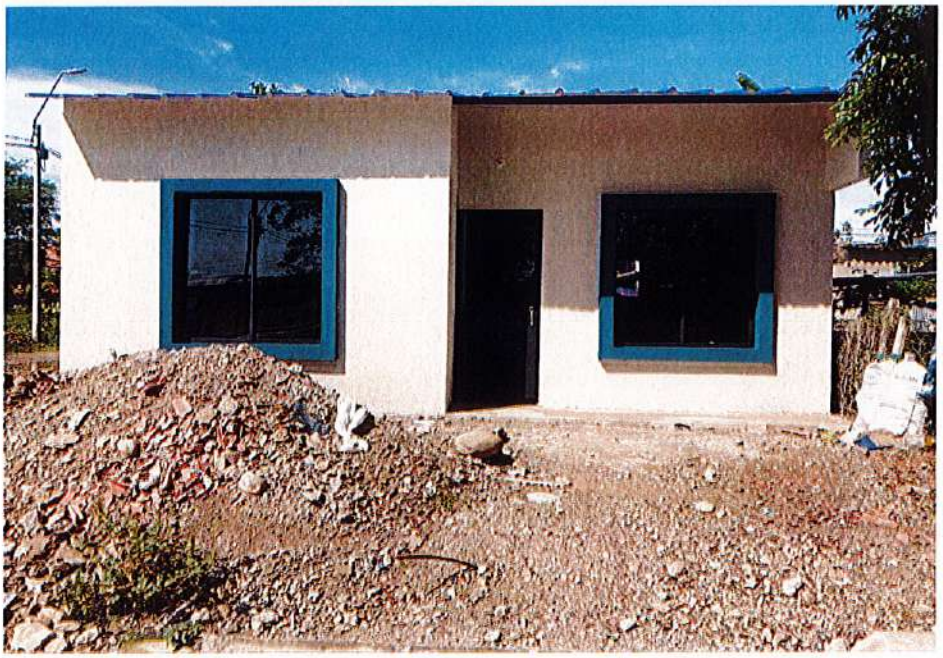

VIVIENDA URBANO – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9140009476-2

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA




REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchia - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA

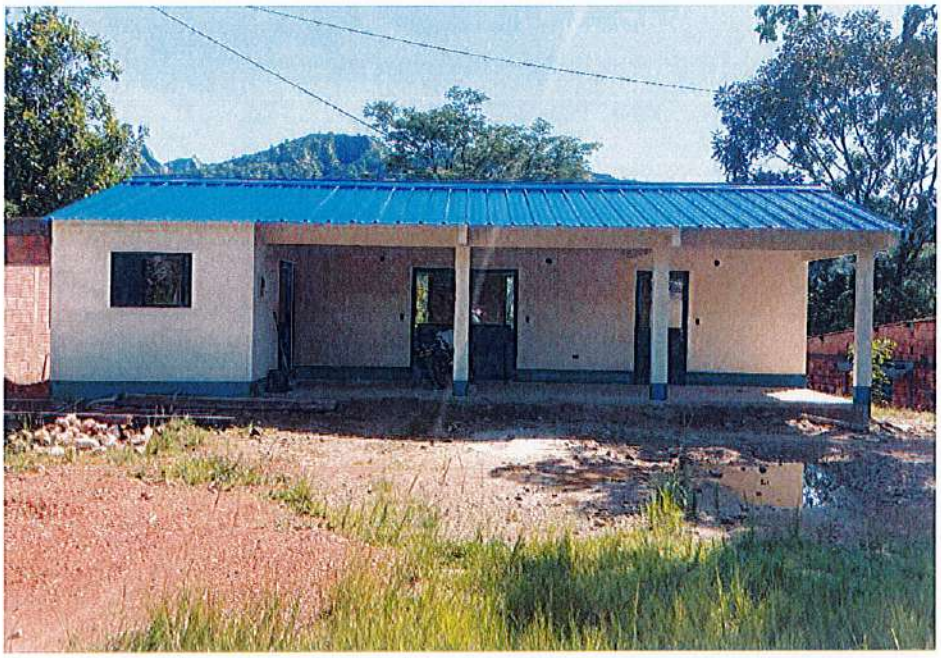

VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11 A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

VIVIENDA RURAL – FACHADA



VIVIENDA RURAL – FACHADA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Carrera 11 A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este informe está basado en la permanente inspección realizada por la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de interventoría adoptado por el Municipio de Tauramena y de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, ley 1474 del 2011 y de las obligaciones contractuales emanadas del contrato de interventoría No. 517 de 2022.

1. El contrato de consultoría No. 631 del 2023 contó con ocho (8) meses iniciales + dos (2) meses de la primera prorroga + dos (2) meses de la segunda prorroga.
2. Cada uno de los contratos de mandato cuenta con su respectiva póliza actualizada con el acta de recibo y entrega al beneficiario.
3. El constructor asociado conto con el personal ofertado, al igual que con el personal requerido para la logística y construcción de cada una de las viviendas.
4. El constructor asociado mantuvo el personal afiliado de inicio a fin de la ejecución de cada vivienda, con sus respectivos pagos de para fiscales y liquidaciones de acuerdo con las condiciones establecidas por el ministerio del trabajo.
5. En el transcurso de la ejecución se realizó el seguimiento al cumplimiento SST y AMBIENTALES por parte del constructor asociado en cada uno de los frentes de trabajo.
6. La entidad contratante notifico que la beneficiaria ERIKA YARITZA CISNEROS realizo el retiro voluntario de su subsidio, por tal motivo el contratista realizo la devolución del anticipo en el corte de fiducia No.3.
7. La lista de beneficiarios aprobados por la entidad contratante para subsidios de vivienda en lote propio fue de: diez (10) beneficiaros en área urbana y diecio nueve (19) en área rural.
8. El constructor asociado a realizado la materialización de cada uno de los veintinueve (29) subsidios aprobados por la entidad contratante.
9. El saldo pendiente a pagar al constructor asociado corresponde a una vivienda rural por un valor de $ 92,910,154.10.
10. Esta interventoría realizo el control y seguimiento de cada uno de los veinte nueve (29) subsidios aprobados por la Oficina Asesora de Planeación para su ejecución.
11. El saldo pendiente a pagar a esta interventoría corresponde al 10% del valor del contrato, lo equivalente a $ 25,055,958.00.

EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN
R.L. INGENARE S.A.S
ELABORO:
ARQ. MARIO ENRIQUE FAJARDO ROJAS.

5. ANEXOS

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT: 9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 46	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1744357178	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			63				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0141270463

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 131,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,500	$ 0	$ 131,800	$ 6,500	$ 138,300
SUBTOTALES:										$ 131,800	$ 6,500	$ 138,300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103,000	$ 0	$ 5,100	$ 0	$ 103,000	$ 5,100	$ 0	$ 108,100
SUBTOTALES:													$ 103,000	$ 5,100	$ 0	$ 108,100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 57,400	$ 57,400	$ 2,900	$ 0	$ 60,300
SUBTOTALES:									$ 57,400	$ 2,900	$ 0	$ 60,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	30127789	E	2024-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	259,700	4,500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30127789	2024-06-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 74188648	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	823.334	131.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	823.334	33.000	COFREM-CCF34	823.334	33.000	823.334	57.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	255.200	S	5439002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	30127789	E	2024-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	259,700	4,500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30127789	2024-06-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
823.334	823.334	823.334	823.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	131.800	0	2.300	0	134.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	131.800	0	2.300	0	134.100
EPS(Administradoras: 1)				1	33.000	0	600	0	33.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	33.000	0	600	0	33.600
ARP(Administradoras: 1)				1	57.400	0	1.000	0	58.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	57.400	0	1.000	0	58.400
CCF(Administradoras: 1)				1	33.000	0	600	0	33.600
COFREM	CCF34	892000146	3	1	33.000	0	600	0	33.600
Gran Total					255.200	0	4.500	0	259.700

9222

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29807208	E	2024-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.610.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29807208	2024-05-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	99.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74814849	ROBERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	99.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	99.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	99.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29807208	E	2024-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.610.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29807208	2024-05-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	832.000	0	0	0	832.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	0	0	416.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 3)				4	208.000	0	0	0	208.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	0	0	104.000

4222

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				4	362.000	0	0	0	362.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	362.000	0	0	0	362.000
CCF(Administradoras: 2)				4	208.000	0	0	0	208.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
COFREM	CCF34	892000146	3	3	156.000	0	0	0	156.000
Gran Total					1.610.000	0	0	0	1.610.000

8222

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1744357186	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			30		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0141276191

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,800	$ 0	$ 208,000	$ 4,800	$ 212,800
SUBTOTALES:										$ 208,000	$ 4,800	$ 212,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 3,700	$ 0	$ 162,500	$ 3,700	$ 0	$ 166,200
SUBTOTALES:													$ 162,500	$ 3,700	$ 0	$ 166,200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500	$ 90,500	$ 2,100	$ 0	$ 92,600
SUBTOTALES:									$ 90,500	$ 2,100	$ 0	$ 92,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,300,000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 17348699	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 471.600

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30128643	E	2024-06-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.415.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30128643	2024-06-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.			
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASANARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
6	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002

2230

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30128643	E	2024-06-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.415.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30128643	2024-06-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	1.248.000	0	0	0	1.248.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	624.000	0	0	0	624.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	624.000	0	0	0	624.000
EPS(Administradoras: 3)				6	312.000	0	0	0	312.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	156.000	0	0	0	156.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				6	543.000	0	0	0	543.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	543.000	0	0	0	543.000
CCF(Administradoras: 2)				6	312.000	0	0	0	312.000
COFREM	CCF34	892000146	3	5	260.000	0	0	0	260.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					2.415.000	0	0	0	2.415.000

223

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1744357208	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0141276054

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 208,000	$ 500	$ 208,500
SUBTOTALES:										$ 208,000	$ 500	$ 208,500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 162,500	$ 400	$ 0	$ 162,900
SUBTOTALES:													$ 162,500	$ 400	$ 0	$ 162,900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500	$ 90,500	$ 300	$ 0	$ 90,800
SUBTOTALES:									$ 90,500	$ 300	$ 0	$ 90,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD							ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,300,000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 17348699	$ 90,500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 462.200

2232

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30757214	E	2024-08-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,617,500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30757214	2024-08-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.A. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74180956	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASANARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
6	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
7	CC 1122652441	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

2233

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30757214	E	2024-08-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.817.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30757214	2024-08-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.456.000	0	0	0	1.456.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	624.000	0	0	0	624.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	832.000	0	0	0	832.000
EPS(Administradoras: 3)				7	364.000	0	0	0	364.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	208.000	0	0	0	208.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				7	633.500	0	0	0	633.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	633.500	0	0	0	633.500
CCF(Administradoras: 2)				7	364.000	0	0	0	364.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
COFREM	CCF34	892000146	3	6	312.000	0	0	0	312.000
Gran Total					2.817.500	0	0	0	2.817.500

2234

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDADMUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCION:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247761
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1744921936	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		10			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		460250

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,600	$ 0	$ 208,000	$ 1,600	$ 209,600
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 1,600**	**$ 209,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 1,300	$ 0	$ 162,500	$ 1,300	$ 0	$ 163,800
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 1,300**	**$ 0**	**$ 163,800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500		$ 90,500	$ 700	$ 0	$ 91,200
SUBTOTALES:										**$ 90,500**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 91,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,300,000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 17348699	$ 90,500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 464.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30806756	E	2024-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.125.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	30806756	2024-09-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Prestaciones	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	A/P	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.			
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASANARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1054374375	LATORRE CUELLAR JUAN DIEGO	1.500.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION 230201	50.000	8.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	50.000	2.000	COFREM-CCF34	50.000	2.000	50.000	3.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	5439002
5	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
6	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F	X															0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	900.000	144.000	0	0	SANITAS-EPS005	900.000	36.000	COFREM-CCF34	900.000	36.000	900.000	62.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	278.700	S	5439001
7	CC 1115917245	RAMIREZ MARTINEZ ERLEY IVAN	1.300.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	43.334	1.800	COFREM-CCF34	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5439001
8	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
10	CC 1122652441	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

2236

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30806756	E	2024-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.125.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	30806756	2024-09-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.093.334	10.093.334	10.093.334	10.093.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	1.615.000	0	0	0	1.615.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	768.000	0	0	0	768.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	839.000	0	0	0	839.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	8.000	0	0	0	8.000
EPS(Administradoras: 4)				10	403.800	0	0	0	403.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	244.000	0	0	0	244.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	1.800	0	0	0	1.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	54.000	0	0	0	54.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				10	702.800	0	0	0	702.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	702.800	0	0	0	702.800
CCF(Administradoras: 2)				10	403.800	0	0	0	403.800
COFREM	CCF34	892000146	3	9	351.800	0	0	0	351.800
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					3.125.400	0	0	0	3.125.400

2234

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247701
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1745519619	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	12109990

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 208,000	$ 800	$ 208,800
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 800**	**$ 208,800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162,500	$ 600	$ 0	$ 163,100
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 163,100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500	$ 90,500	$ 400	$ 0	$ 90,900
SUBTOTALES:									**$ 90,500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 90,900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,300,000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 17348699	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 462,800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31257406	E	2024-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4,154,200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	31257406	2024-10-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74180896	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	PORRERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASANARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1007400660	SALAMANCA ROSAS DUVAN CAMILO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
6	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439001
7	CC 1115917245	RAMIREZ MARTINEZ ERLEY IVAN	1.300.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	650.000	104.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	650.000	26.000	COFREM-CCF34	650.000	26.000	650.000	45.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.500	S	5439001
8	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 1121895437	RUIZ QUIROGA LUIS HERNANDO	1.300.000	F	X															0			20	20	20	20	PROTECCION -230201	866.667	138.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	866.667	34.700	COFREM-CCF34	866.667	34.700	866.667	60.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	268.500	S	5439002
10	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
11	CC 1122652441	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

2234

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31257406	E	2024-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.154.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	31257406	2024-10-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.416.667	13.416.667	13.416.667	13.416.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	2.146.700	0	0	0	2.146.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	138.700	0	0	0	138.700
PORVENIR	230301	800224808	8	5	936.000	0	0	0	936.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.072.000	0	0	0	1.072.000
EPS(Administradoras: 5)				11	536.700	0	0	0	536.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	26.000	0	0	0	26.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	34.700	0	0	0	34.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	268.000	0	0	0	268.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	156.000	0	0	0	156.000
ARP(Administradoras: 1)				11	934.100	0	0	0	934.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	934.100	0	0	0	934.100
CCF(Administradoras: 2)				11	536.700	0	0	0	536.700
COFREM	CCF34	892000146	3	10	484.700	0	0	0	484.700
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					4.154.200	0	0	0	4.154.200

0722

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 46	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1744921911	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			460252

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 90,500
SUBTOTALES:									**$ 90,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90,500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31546696	E	2024-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.489.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	31546696	2024-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1007400660	SALAMANCA ROSAS DUVAN CAMILO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
6	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439001
7	CC 1115917245	RAMIREZ MARTINEZ ERLEY IVAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
8	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 1121895437	RUIZ QUIROGA LUIS HERNANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
10	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
11	CC 1122652641	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

2022

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31546696	E	2024-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.489.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	31546696	2024-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	2.320.000	0	0	0	2.320.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.040.000	0	0	0	1.040.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.072.000	0	0	0	1.072.000
EPS(Administradoras: 5)				11	580.000	0	0	0	580.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	268.000	0	0	0	268.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	156.000	0	0	0	156.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				11	1.009.400	0	0	0	1.009.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	1.009.400	0	0	0	1.009.400
CCF(Administradoras: 2)				11	580.000	0	0	0	580.000
COFREM	CCF34	892000146	3	10	528.000	0	0	0	528.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					4.489.400	0	0	0	4.489.400

22413

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 46	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1745795136	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			474748

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 90,500	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 90,500
SUBTOTALES:										**$ 90,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,300,000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 17348699	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 461.000

Planilla Pagada

2244

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31869580	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4,856,000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	31869580	2024-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASANARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1007400660	SALAMANCA ROSAS DUVAN CAMILO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
6	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439001
7	CC 1115917245	RAMIREZ MARTINEZ ERLEY IVAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
8	CC 1121874698	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 1121895437	RUIZ QUIROGA LUIS HERNANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
10	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
11	CC 1122651942	ROBAYO JARA LAURA ANDREA	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	SANITAS-EPS005	433.334	17.400	COFREM-CCF34	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5439002
12	CC 1122652441	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
13	CC 1152465699	LOPEZ MARTINEZ MAIRA YURANY	2.500.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	750.000	120.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	750.000	30.000	COFREM-CCF34	750.000	30.000	750.000	52.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	232.200	S	5439002

5422

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31869580	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4,856,000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	31869580	2024-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15,683,334	15,683,334	15,683,334	15,683,334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	2.509.400	0	0	0	2.509.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.072.000	0	0	0	1.072.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.229.400	0	0	0	1.229.400
EPS(Administradoras: 5)				13	627.400	0	0	0	627.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	186.000	0	0	0	186.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	285.400	0	0	0	285.400
ARP(Administradoras: 1)				13	1.091.800	0	0	0	1.091.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	13	1.091.800	0	0	0	1.091.800
CCF(Administradoras: 2)				13	627.400	0	0	0	627.400
COFREM	CCF34	892000146	3	12	575.400	0	0	0	575.400
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					4.856.000	0	0	0	4.856.000

9122

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 46	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79521540 73	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1105602551

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 90,500
SUBTOTALES:									**$ 90,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247701
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7952187877	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1164855019

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90,500	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 90,500
SUBTOTALES:									**$ 90,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,300,000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 17348699	$ 90,500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 461.000

Planilla Pagada

2248

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1746686675	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	37670586

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										**$ 227,800**	**$ 0**	**$ 227,800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													**$ 178,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99,100	$ 99,100	$ 0	$ 0	$ 99,100
SUBTOTALES:									**$ 99,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34020340	E	2025-07-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.435.900	3.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	34020340	2025-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
2	CC 74180848	PAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFACASANARE-CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
4	CC 1006821145	VASQUEZ REY JOHAN JEFREY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
5	CC 1007600660	SALAMANCA ROSAS DUVAN CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
6	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
7	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439001
8	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
9	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
10	CC 1122651942	ROBAYO JARA LAURA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002

0522

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34020340	E	2025-07-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.435.900	3.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	34020340	2025-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.311.500	14.311.500	14.311.500	14.311.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				10	2.290.200	0	1.600	0	2.291.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.139.000	0	800	0	1.139.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.151.200	0	800	0	1.152.000
EPS(Administradoras: 4)				10	573.000	0	600	0	573.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	100	0	57.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	171.000	0	200	0	171.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	57.000	0	100	0	57.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	288.000	0	200	0	288.200
ARP(Administradoras: 1)				10	996.300	0	700	0	997.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	996.300	0	700	0	997.000
CCF(Administradoras: 2)				10	573.000	0	500	0	573.500
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	57.000	0	100	0	57.100
COFREM	CCF34	892000146	3	9	516.000	0	400	0	516.400
Gran Total					4.432.500	0	3.400	0	4.435.900

2251

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7979912182	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO	2025
DIAS DE MORA:		70			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1612846752

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,100	$ 0	$ 227,800	$ 10,100	$ 237,900
SUBTOTALES:										**$ 227,800**	**$ 10,100**	**$ 237,900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 7,900	$ 0	$ 178,000	$ 7,900	$ 0	$ 185,900
SUBTOTALES:													**$ 178,000**	**$ 7,900**	**$ 0**	**$ 185,900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99,100	$ 99,100	$ 4,400	$ 0	$ 103,500
SUBTOTALES:									**$ 99,100**	**$ 4,400**	**$ 0**	**$ 103,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																										PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO, SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,423,500			NO	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	$ 0																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002478	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34395199	E	2025-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.564.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	34395199	2025-08-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD						CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFACASANARE-CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
4	CC 1006821145	VASQUEZ REY JOHAN JEFREY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
5	CC 1007400660	SALAMANCA ROSAS DUVAN CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
6	CC 1054682366	CIPAGAUTA BOHORQUEZ DANIEL FELIPE	1.423.500	F	X															0			9	9	9	9	COLPENSION ES-25-14	427.050	68.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	427.050	17.100	COFREM-CCF34	427.050	17.100	427.050	29.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.400	S	5439002
7	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
8	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439001
9	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
10	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002
11	CC 1122651942	ROSAYO JARA LAURA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439002

2253

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34395199	E	2025-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.564.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	34395199	2025-08-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.738.550	14.738.550	14.738.550	14.738.550	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				11	2.358.600	0	0	0	2.358.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.139.000	0	0	0	1.139.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.219.600	0	0	0	1.219.600
EPS(Administradoras: 5)				11	590.100	0	0	0	590.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	17.100	0	0	0	17.100
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	171.000	0	0	0	171.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	288.000	0	0	0	288.000
ARP(Administradoras: 1)				11	1.026.100	0	0	0	1.026.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	1.026.100	0	0	0	1.026.100
CCF(Administradoras: 2)				11	590.100	0	0	0	590.100
COFREM	CCF34	892000146	3	10	533.100	0	0	0	533.100
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					4.564.900	0	0	0	4.564.900

2254

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17346899
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 48	TELÉFONO:	6247701
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7988856848	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DIAS DE MORA:			36				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1817462623

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,200	$ 0	$ 227,800	$ 5,200	$ 233,000
SUBTOTALES:										**$ 227,800**	**$ 5,200**	**$ 233,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 4,100	$ 0	$ 178,000	$ 4,100	$ 0	$ 182,100
SUBTOTALES:													**$ 178,000**	**$ 4,100**	**$ 0**	**$ 182,100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99,100	$ 99,100	$ 2,300	$ 0	$ 101,400
SUBTOTALES:									**$ 99,100**	**$ 2,300**	**$ 0**	**$ 101,400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17346899	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,423,500			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	17346899	$ 99,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 516,500

Planilla Pagada

5522

CONTROL TÉCNICO – LABORATORIOS

Carrera 11 A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 27-jul.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-001	Diagonal 8 No. 3 - 7A - 16 - Barrio Primavera	CICLOPEO	25-jun-2024	01	7	02-jul-2024	10,1	12,42	22874	1842					N/P	TIPO-2
				01	7	02-jul-2024	10,1	12,42	23652	1905	1873	12,9	61,6			TIPO-2
				01	14	09-jul-2024	10,1	12,42	27903	2247						TIPO-2
				01	14	09-jul-2024	10,1	12,42	28462	2292	2269	15,7	74,6			TIPO-2
				01	28	23-jul-2024	10,1	12,42	36226	2917						TIPO-2
				01	28	23-jul-2024	10,1	12,42	39949	3217	3067	21,2	100,8			TIPO-3
M-002	Calle 7 No. 6A - 48 - Barrio Villa Ester	VIGA AMARRE	28-jun-2024	02	7	05-jul-2024	10,1	12,42	24542	1976					N/P	TIPO-2
				02	7	05-jul-2024	10,1	12,42	25742	2073	2025	14,0	66,5			TIPO-2
				02	14	12-jul-2024	10,1	12,42	29144	2347						TIPO-2
				02	14	12-jul-2024	10,1	12,42	28984	2334	2340	16,1	76,9			TIPO-2
				02	28	26-jul-2024	10,1	12,42	38820	3126						TIPO-2
				02	28	26-jul-2024	10,1	12,42	37676	3034	3080	21,3	101,2			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

t522

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 27-jul.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-003	Calle 15 No. 1A - 55 Barrio Primavera	VIGA AMARRE	28-jun-2024	03	7	05-jul-2024	10,1	12,42	24310	1958						TIPO-2
				03	7	05-jul-2024	10,1	12,42	25580	2060	2009	13,9	66,0			TIPO-2
				03	14	12-jul-2024	10,1	12,42	27620	2224						TIPO-3
				03	14	12-jul-2024	10,1	12,42	27980	2253	2239	15,4	73,6		N/P	TIPO-3
				03	28	26-jul-2024	10,1	12,42	38722	3118						TIPO-3
				03	28	26-jul-2024	10,1	12,42	39958	3218	3168	21,9	104,1			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

8222


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 29-jul.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
				04	7	08-jul-2024	10,1	12,42	34215	2755						TIPO-2
				04	7	08-jul-2024	10,1	12,42	36540	2942	2849	19,7	93,6			TIPO-3
				04	14	15-jul-2024	10,1	12,42	47919	3859						TIPO-3
M-004	Calle 20 No 14A - 26 - B/ Libertadores Alto	COLUMNETAS	01-jul-2024	04	14	15-jul-2024	10,1	12,42	48017	3867	3863	26,7	126,9		N/P	TIPO-3
				04	28	29-jul-2024	10,1	12,42	50129	4037						TIPO-2
				04	28	29-jul-2024	10,1	12,42	52288	4211	4124	28,5	135,5			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

bs22

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 30-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-005	Diagonal 8 No. 3 - 7A - 16 - Barrio Primavera	COLUMNETA	3-ago-2024	05	7	8-ago-2024	10,1	12,42	24315	1958						TIPO-2
				05	7	8-ago-2024	10,1	12,42	22276	1794	1876	12,9	61,6			TIPO-2
				05	14	15-ago-2024	10,1	12,42	28213	2272						TIPO-3
				05	14	15-ago-2024	10,1	12,42	29646	2387	2330	16,1	76,5		N/P	TIPO-3
				05	28	29-ago-2024	10,1	12,42	38420	3094						TIPO-2
				05	28	29-ago-2024	10,1	12,42	39180	3155	3124	21,6	102,7			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joselbarra08@gmail.com

0922

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 01-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-006	Calle 21 No. 13 - 05 - B/ Libertadores Alto	VIGA AMARRE	03-jul-2024	06	7	10-jul-2024	10,1	12,42	22858	1841						TIPO-2
				06	7	10-jul-2024	10,1	12,42	23652	1905	1873	12,9	61,5			TIPO-2
				06	14	17-jul-2024	10,1	12,42	28942	2331						TIPO-2
				06	14	17-jul-2024	10,1	12,42	31624	2547	2439	16,8	80,1		N/P	TIPO-2
				06	28	31-jul-2024	10,1	12,42	37652	3032						TIPO-3
				06	28	31-jul-2024	10,1	12,42	38264	3081	3057	21,1	100,4			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

1922

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S. NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 02-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-007	VEREDA CABAÑAS	CICLOPEO	04-jul-2024	07	7	11-jul-2024	10,1	12,42	23101	1860						TIPO-2
				07	7	11-jul-2024	10,1	12,42	22859	1841	1850	12,8	60,8			TIPO-2
				07	14	18-jul-2024	10,1	12,42	29635	2386						TIPO-3
				07	14	18-jul-2024	10,1	12,42	29414	2369	2377	16,4	78,1		N/P	TIPO-3
				07	28	01-ago-2024	10,1	12,42	37845	3048						TIPO-2
				07	28	01-ago-2024	10,1	12,42	37942	3055	3051	21,1	100,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joselbarra08@gmail.com

2222

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 06-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-008	Calle 15 No. 1A - 55 Barrio Primavera	VIGA AEREA	08-jul-2024	08	7	15-jul-2024	10,1	12,42	23857	1921						TIPO-2
				08	7	15-jul-2024	10,1	12,42	21896	1763	1842	12,7	60,5			TIPO-2
				08	14	22-jul-2024	10,1	12,42	28565	2300						TIPO-3
				08	14	22-jul-2024	10,1	12,42	26974	2172	2236	15,4	73,5		N/P	TIPO-3
				08	28	05-ago-2024	10,1	12,42	37426	3014						TIPO-3
				08	28	05-ago-2024	10,1	12,42	38842	3128	3071	21,2	100,9			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2263


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 06-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-009	Calle 7 No. 6A - 48 - Barrio Villa Ester	COLUMNETAS	08-jul-2024	09	7	15-jul-2024	10,1	12,42	22874	1842						TIPO-2
				09	7	15-jul-2024	10,1	12,42	23652	1905	1873	12,9	61,6			TIPO-2
				09	14	22-jul-2024	10,1	12,42	27903	2247						TIPO-2
				09	14	22-jul-2024	10,1	12,42	28462	2292	2269	15,7	74,6		N/P	TIPO-2
				09	28	05-ago-2024	10,1	12,42	36226	2917						TIPO-2
				09	28	05-ago-2024	10,1	12,42	39949	3217	3067	21,2	100,8			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2269

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.537-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 8-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-010	Carrera 9 No. 7A - 16 - Barrio Palmarito	CICLOPEO	09-jul-2024	010	7	16-jul-2024	10,1	12,42	26874	2164						TIPO-2
				010	7	16-jul-2024	10,1	12,42	27652	2227	2195	15,1	72,1			TIPO-2
				010	14	23-jul-2024	10,1	12,42	32874	2647						TIPO-3
				010	14	23-jul-2024	10,1	12,42	34624	2788	2718	18,8	89,3		N/P	TIPO-3
				010	28	6-ago-2024	10,1	12,42	43832	3530						TIPO-2
				010	28	6-ago-2024	10,1	12,42	44420	3577	3553	24,5	116,8			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

922

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 7-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-011	Calle 5 No. 5B - 20 - Barrio Gaván	VIGA AMARRE	10-jul-2024	011	7	17-jul-2024	10,1	12,42	29842	2403						TIPO-2
				011	7	17-jul-2024	10,1	12,42	30652	2468	2436	16,8	80,0			TIPO-2
				011	14	24-jul-2024	10,1	12,42	43652	3515					N/P	TIPO-3
				011	14	24-jul-2024	10,1	12,42	44874	3614	3564	24,6	117,1			TIPO-3
				011	28	7-ago-2024	10,1	12,42	59328	4777						TIPO-2
				011	28	7-ago-2024	10,1	12,42	61909	4985	4881	33,7	160,4			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

9922


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 12-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-012	Calle 21 No. 13 - 05 - B/ Libertadores Alto	COLUMNETAS	15-jul-2024	012	7	22-jul-2024	10,1	12,42	23874	1922					N/P	TIPO-2
				012	7	22-jul-2024	10,1	12,42	22542	1815	1869	12,9	61,4			TIPO-2
				012	14	29-jul-2024	10,1	12,42	27452	2211						TIPO-2
				012	14	29-jul-2024	10,1	12,42	26874	2164	2187	15,1	71,9			TIPO-2
				012	28	12-ago-2024	10,1	12,42	39210	3157						TIPO-2
				012	28	12-ago-2024	10,1	12,42	37350	3008	3083	21,3	101,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2269

IBARRA INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 14-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-013	VEREDA CABAÑAS	DINTEL COLUMNETA	16-jul-2024	013	7	23-jul-2024	10,1	12,42	24984	2012					N/P	TIPO-3
				013	7	23-jul-2024	10,1	12,42	24264	1954	1983	13,7	65,2			TIPO-3
				013	14	30-jul-2024	10,1	12,42	28746	2315						TIPO-2
				013	14	30-jul-2024	10,1	12,42	29124	2345	2330	16,1	76,6			TIPO-2
				013	28	13-ago-2024	10,1	12,42	46120	3714						TIPO-2
				013	28	13-ago-2024	10,1	12,42	46106	3713	3713	25,6	122,0			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

8922

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 15-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-014	Carrera 9 No. 7A - 16 - Barrio Palmarito	DINTEL COLUMNETA	17-jul-2024	014	7	24-jul-2024	10,1	12,42	23542	1896						TIPO-3
				014	7	24-jul-2024	10,1	12,42	22874	1842	1869	12,9	61,4			TIPO-3
				014	14	31-jul-2024	10,1	12,42	27313	2199						TIPO-3
				014	14	31-jul-2024	10,1	12,42	28235	2274	2237	15,4	73,5		N/P	TIPO-3
				014	28	14-ago-2024	10,1	12,42	37530	3022						TIPO-2
				014	28	14-ago-2024	10,1	12,42	39839	3208	3115	21,5	102,4			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

1922

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S. NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 16-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-015	Calle 20 No. 10 - 24 - B/ Libertadores Bajo	CICLOPEO	18-jul-2024	015	7	25-jul-2024	10,1	12,42	23613	1901						TIPO-3
				015	7	25-jul-2024	10,1	12,42	25378	2044	1973	13,6	64,8			TIPO-3
				015	14	01-ago-2024	10,1	12,42	28846	2323						TIPO-3
				015	14	01-ago-2024	10,1	12,42	30984	2495	2409	16,6	79,2		N/P	TIPO-3
				015	28	15-ago-2024	10,1	12,42	37842	3047						TIPO-3
				015	28	15-ago-2024	10,1	12,42	38684	3115	3081	21,3	101,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2270

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 16-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-016	Carrera 11 No. 21 - 21 - B/ Libertadores Bajo	CICLOPEO	18-jul-2024	016	7	25-jul-2024	10,1	12,42	20680	1665					N/P	TIPO-3
				016	7	25-jul-2024	10,1	12,42	22420	1805	1735	12,0	57,0			TIPO-3
				016	14	1-ago-2024	10,1	12,42	26654	2146						TIPO-3
				016	14	1-ago-2024	10,1	12,42	28874	2325	2236	15,4	73,5			TIPO-3
				016	28	15-ago-2024	10,1	12,42	37846	3048						TIPO-3
				016	28	15-ago-2024	10,1	12,42	38984	3139	3093	21,3	101,6			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IE22

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 17-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-017	VEREDA AGUABLANCA	VIGA AMARRE	19-jul-2024	017	7	26-jul-2024	10,1	12,42	24213	1950						TIPO-2
				017	7	26-jul-2024	10,1	12,42	26968	2172	2061	14,2	67,7			TIPO-2
				017	14	2-ago-2024	10,1	12,42	28234	2274					N/P	TIPO-2
				017	14	2-ago-2024	10,1	12,42	29654	2388	2331	16,1	76,6			TIPO-2
				017	28	16-ago-2024	10,1	12,42	38846	3128						TIPO-3
				017	28	16-ago-2024	10,1	12,42	39984	3220	3174	21,9	104,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2422

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 18-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-018	Calle 20 No 14A - 26 - B/ Libertadores Alto	VIGA CINTA	20-jul-2024	018	7	27-jul-2024	10,1	12,42	25609	2062						TIPO-3
				018	7	27-jul-2024	10,1	12,42	27828	2241	2152	14,8	70,7			TIPO-3
				018	14	3-ago-2024	10,1	12,42	30102	2424						TIPO-3
				018	14	3-ago-2024	10,1	12,42	32346	2605	2514	17,3	82,6		N/P	TIPO-3
				018	28	17-ago-2024	10,1	12,42	38984	3139						TIPO-3
				018	28	17-ago-2024	10,1	12,42	39123	3150	3145	21,7	103,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

223

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 30-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-01S	Calle 20 No 14A - 26 - B/ Libertadores Alto	PLACA PISO	1-ago-2024	019	7	8-ago-2024	10,1	12,42	25228	2032						TIPO-3
				019	7	8-ago-2024	10,1	12,42	24836	2000	2016	13,9	66,2			TIPO-2
				019	14	15-ago-2024	10,1	12,42	27845	2242						TIPO-3
				019	14	15-ago-2024	10,1	12,42	28984	2334	2288	15,8	75,2		N/P	TIPO-3
				019	28	29-ago-2024	10,1	12,42	38652	3112						TIPO-3
				019	28	29-ago-2024	10,1	12,42	40874	3291	3202	22,1	105,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

22-34

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 30-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-020	Diagonal 8 No. 3 - 7A - 16 - Barrio Primavera	PLACA PISO	1-ago-2024	020	7	8-ago-2024	10,1	12,42	23210	1869						TIPO-3
				020	7	8-ago-2024	10,1	12,42	25649	2065	1967	13,6	64,6			TIPO-2
				020	14	15-ago-2024	10,1	12,42	27426	2209					N/P	TIPO-2
				020	14	15-ago-2024	10,1	12,42	27874	2245	2227	15,4	73,2			TIPO-2
				020	28	29-ago-2024	10,1	12,42	37842	3047						TIPO-3
				020	28	29-ago-2024	10,1	12,42	37988	3059	3053	21,1	100,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2225


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 31-ago.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-021	Calle 20 No. 10 - 24 - B/ Libertadores Bajo	DINTELES	2-ago-2024	021	7	9-ago-2024	10,1	12,42	28446	2291					N/P	TIPO-2
				021	7	9-ago-2024	10,1	12,42	30615	2465	2378	16,4	78,1			TIPO-2
				021	14	16-ago-2024	10,1	12,42	30652	2468						TIPO-2
				021	14	16-ago-2024	10,1	12,42	30984	2495	2482	17,1	81,5			TIPO-2
				021	28	30-ago-2024	10,1	12,42	39654	3193						TIPO-3
				021	28	30-ago-2024	10,1	12,42	40984	3300	3247	22,4	106,7			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

9222

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 1-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-022	VEREDA CABAÑAS	VIGA AMARRE	3-ago-2024	022	7	10-ago-2024	10,1	12,42	23926	1927						TIPO-2
				022	7	10-ago-2024	10,1	12,42	26356	2122	2025	14,0	66,5			TIPO-3
				022	14	17-ago-2024	10,1	12,42	27562	2219					N/P	TIPO-2
				022	14	17-ago-2024	10,1	12,42	28874	2325	2272	15,7	74,7			TIPO-2
				022	28	31-ago-2024	10,1	12,42	37879	3050						TIPO-2
				022	28	31-ago-2024	10,1	12,42	39205	3157	3104	21,4	102,0			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

4622


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 2-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-023	VEREDA CABAÑAS	CICLOPEO	4-ago-2024	023	7	11-ago-2024	10,1	12,42	22231	1790					N/P	TIPO-2
				023	7	11-ago-2024	10,1	12,42	24240	1952	1871	12,9	61,5			TIPO-3
				023	14	18-ago-2024	10,1	12,42	27612	2223						TIPO-2
				023	14	18-ago-2024	10,1	12,42	29412	2368	2296	15,8	75,4			TIPO-2
				023	28	1-sep-2024	10,1	12,42	38246	3080						TIPO-2
				023	28	1-sep-2024	10,1	12,42	40874	3291	3186	22,0	104,7			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

8222


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 8-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-024	Carrera 11 No. 21 - 21 - B/ Libertadores Bajo	COLUMNETA DINTEL	10-ago-2024	024	7	17-ago-2024	10,1	12,42	26290	2117						TIPO-2
				024	7	17-ago-2024	10,1	12,42	29236	2354	2236	15,4	73,5		N/P	TIPO-2
				024	14	24-ago-2024	10,1	12,42	34220	2756						TIPO-2
				024	14	24-ago-2024	10,1	12,42	35615	2868	2812	19,4	92,4			TIPO-2
				024	28	7-sep-2024	10,1	12,42	38842	3128						
				024	28	7-sep-2024	10,1	12,42	37042	2983	3055	21,1	100,4			

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

9422

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 10-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-025	VEREDA AGUABLANCA	COLUMNETA DINTEL	12-ago-2024	025	7	19-ago-2024	10,1	12,42	23986	1931					N/P	TIPO-2
				025	7	19-ago-2024	10,1	12,42	25412	2046	1989	13,7	65,4			TIPO-2
				025	14	26-ago-2024	10,1	12,42	29629	2386						TIPO-3
				025	14	26-ago-2024	10,1	12,42	30906	2489	2437	16,8	80,1			TIPO-2
				025	28	9-sep-2024	10,1	12,42	38652	3112						TIPO-3
				025	28	9-sep-2024	10,1	12,42	40874	3291	3202	22,1	105,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

280

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 15-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-026	Calle 7 No. 6A - 48 - Barrio Villa Ester	PLACA PISO	17-ago-2024	026	7	24-ago-2024	10,1	12,42	24995	2013						TIPO-2
				026	7	24-ago-2024	10,1	12,42	22115	1781	1897	13,1	62,3			TIPO-3
				026	14	31-ago-2024	10,1	12,42	28412	2288					N/P	TIPO-2
				026	14	31-ago-2024	10,1	12,42	30660	2469	2378	16,4	78,1			TIPO-2
				026	28	14-sep-2024	10,1	12,42	38426	3094						TIPO-2
				026	28	14-sep-2024	10,1	12,42	40126	3231	3163	21,8	103,9			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

1822

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
NIT. 901.032.837-3	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 16-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-027	Carrera 9 No. 7A - 16 - Barrio Palmarito	PLACA PISO	18-ago-2024	027	7	25-ago-2024	10,1	12,42	24276	1955						TIPO-2
				027	7	25-ago-2024	10,1	12,42	26540	2137	2046	14,1	67,2			TIPO-3
				027	14	1-sep-2024	10,1	12,42	29312	2360						TIPO-2
				027	14	1-sep-2024	10,1	12,42	31535	2539	2450	16,9	80,5		N/P	TIPO-2
				027	28	15-sep-2024	10,1	12,42	36652	2951						TIPO-2
				027	28	15-sep-2024	10,1	12,42	39026	3143	3047	21,0	100,1			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joseibarra08@gmail.com

2822

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S. NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 17-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-026	Calle 21 No. 13 - 05 - B/ Libertadores Alto	VIGA CINTA	19-ago-2024	028	7	26-ago-2024	10,1	12,42	23223	1870					N/P	TIPO-2
				028	7	26-ago-2024	10,1	12,42	25627	2064	1967	13,6	64,6			TIPO-3
				028	14	2-sep-2024	10,1	12,42	29473	2373						TIPO-2
				028	14	2-sep-2024	10,1	12,42	30797	2480	2427	16,7	79,7			TIPO-3
				028	28	16-sep-2024	10,1	12,42	38654	3113						TIPO-3
				028	28	16-sep-2024	10,1	12,42	39984	3220	3166	21,8	104,0			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2283

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 15-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
				029	7	27-ago-2024	10,1	12,42	23930	1927						TIPO-3
				029	7	27-ago-2024	10,1	12,42	25037	2016	1972	13,6	64,8			TIPO-2
				029	14	3-sep-2024	10,1	12,42	28223	2273						TIPO-3
M-029	VEREDA CABAÑAS	COLUMNAS	20-ago-2024	029	14	3-sep-2024	10,1	12,42	27635	2225	2249	15,5	73,9		N/P	TIPO-3
				029	28	14-sep-2024	10,1	12,42	38742	3120						TIPO-3
				029	28	14-sep-2024	10,1	12,42	39246	3160	3140	21,7	103,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2284

IBARRA INGENIERÍA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 18-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-030	VEREDA CABAÑAS	DINTELES	20-ago-2024	030	7	28-ago-2024	10,1	12,42	23096	1860						TIPO-2
				030	7	28-ago-2024	10,1	12,42	25928	2088	1974	13,6	64,9			TIPO-2
				030	14	4-sep-2024	10,1	12,42	26342	2121						TIPO-3
				030	14	4-sep-2024	10,1	12,42	28774	2317	2219	15,3	72,9		N/P	TIPO-2
				030	28	18-sep-2024	10,1	12,42	40642	3273						TIPO-3
				030	28	18-sep-2024	10,1	12,42	38874	3130	3202	22,1	105,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2285

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.537-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 19-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-031	Calle 15 No. 1A - 55 Barrio Primavera	COLUMNAS DINTELES	21-ago-2024	031	7	28-ago-2024	10,1	12,42	24127	1943					N/P	TIPO-3
				031	7	28-ago-2024	10,1	12,42	22229	1790	1866	12,9	61,3			TIPO-3
				031	14	4-sep-2024	10,1	12,42	27506	2215						TIPO-2
				031	14	4-sep-2024	10,1	12,42	29467	2373	2294	15,8	75,4			TIPO-3
				031	28	18-sep-2024	10,1	12,42	38462	3097						TIPO-3
				031	28	18-sep-2024	10,1	12,42	37874	3050	3074	21,2	101,0			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

9822


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 20-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-032	VEREDA ACEITE ALTO	VIGA AMARRE	22-ago-2024	032	7	29-ago-2024	10,1	12,42	25353	2042					N/P	TIPO-2
				032	7	29-ago-2024	10,1	12,42	23704	1909	1975	13,6	64,9			TIPO-3
				032	14	5-sep-2024	10,1	12,42	28560	2300						TIPO-2
				032	14	5-sep-2024	10,1	12,42	29929	2410	2355	16,2	77,4			TIPO-3
				032	28	19-sep-2024	10,1	12,42	40352	3249						TIPO-3
				032	28	19-sep-2024	10,1	12,42	39728	3199	3224	22,2	105,9			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joselbarra08@gmail.com


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 21-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-033	Calle 8E No. 6 - 03 - Barrio Colinas	COLUMNAS	23-ago-2024	033	7	30-ago-2024	10,1	12,42	38890	3132						TIPO-3
				033	7	30-ago-2024	10,1	12,42	40262	3242	3187	22,0	104,7			TIPO-3
				033	14	6-sep-2024	10,1	12,42	42374	3412					N/P	TIPO-2
				033	14	6-sep-2024	10,1	12,42	42532	3425	3419	23,6	112,3			TIPO-2
				033	28	20-sep-2024	10,1	12,42	44864	3613						TIPO-2
				033	28	20-sep-2024	10,1	12,42	45152	3636	3624	25,0	119,1			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2288

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 2-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
				034	7	10-sep-2024	10,1	12,42	28965	2332						TIPO-2
				034	7	10-sep-2024	10,1	12,42	27844	2242	2287	15,8	75,2			TIPO-3
				034	14	17-sep-2024	10,1	12,42	32620	2627						TIPO-2
M-034	Calle 20 No. 10 - 24 - B/ Libertadores Bajo	VIGA CINTA	3-sep-2024	034	14	17-sep-2024	10,1	12,42	29635	2386	2507	17,3	82,4		N/P	TIPO-3
				034	28	1-oct-2024	10,1	12,42	38262	3081						TIPO-3
				034	28	1-oct-2024	10,1	12,42	38699	3116	3099	21,4	101,8			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2284

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 4-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-035	VEREDA CABAÑAS	V.CINTA PLACA TANQUE	5-sep-2024	035	7	12-sep-2024	10,1	12,42	26859	2163						TIPO-3
				035	7	12-sep-2024	10,1	12,42	28121	2264	2214	15,3	72,7			TIPO-2
				035	14	19-sep-2024	10,1	12,42	31635	2547						TIPO-3
				035	14	19-sep-2024	10,1	12,42	29685	2390	2469	17,0	81,1		N/P	TIPO-2
				035	28	3-oct-2024	10,1	12,42	37854	3048						TIPO-3
				035	28	3-oct-2024	10,1	12,42	38214	3077	3063	21,1	100,6			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2290

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 9-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-036	VEREDA CABAÑAS	PLACA PISO	10-sep-2024	036	7	17-sep-2024	10,1	12,42	28635	2306						TIPO-2
				036	7	17-sep-2024	10,1	12,42	27454	2211	2258	15,6	74,2			TIPO-3
				036	14	24-sep-2024	10,1	12,42	30685	2471					N/P	TIPO-2
				036	14	24-sep-2024	10,1	12,42	31202	2513	2492	17,2	81,9			TIPO-3
				036	28	8-oct-2024	10,1	12,42	38256	3081						TIPO-3
				036	28	8-oct-2024	10,1	12,42	39265	3162	3121	21,5	102,6			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

1922


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 17-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-037	VEREDA AGUABLANCA	CICLOPEO	18-sep-2024	037	7	25-sep-2024	10,1	12,42	27968	2252	2248	15,5	73,9		N/P	TIPO-3
				037	7	25-sep-2024	10,1	12,42	27858	2243						TIPO-2
				037	14	2-oct-2024	10,1	12,42	31414	2530	2495	17,2	82,0			TIPO-2
				037	14	2-oct-2024	10,1	12,42	30565	2461						TIPO-2
				037	28	16-oct-2024	10,1	12,42	38254	3080	3090	21,3	101,5			TIPO-3
				037	28	16-oct-2024	10,1	12,42	38500	3100						TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2822

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 18-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-038	VEREDA ACEITE ALTO	COLUMNAS DINTELES	19-sep-2024	038	7	26-sep-2024	10,1	12,42	29658	2388						TIPO-3
				038	7	26-sep-2024	10,1	12,42	28551	2299	2344	16,2	77,0			TIPO-2
				038	14	3-oct-2024	10,1	12,42	30636	2467						TIPO-3
				038	14	3-oct-2024	10,1	12,42	31214	2514	2490	17,2	81,8		N/P	TIPO-2
				038	28	17-oct-2024	10,1	12,42	37985	3059						TIPO-3
				038	28	17-oct-2024	10,1	12,42	38021	3062	3060	21,1	100,6			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 17-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
				039	7	25-sep-2024	10,1	12,42	28650	2307						TIPO-3
				039	7	25-sep-2024	10,1	12,42	27141	2186	2246	15,5	73,8			TIPO-2
M-039	Calle 8E No. 6 - 03 - Barrio Colinas	VIGA AEREA PLACA TANQUE	18-sep-2024	039	14	2-oct-2024	10,1	12,42	29698	2391					N/P	TIPO-2
				039	14	2-oct-2024	10,1	12,42	30859	2485	2438	16,8	80,1			TIPO-2
				039	28	16-oct-2024	10,1	12,42	38559	3105						TIPO-3
				039	28	16-oct-2024	10,1	12,42	39121	3150	3128	21,6	102,8			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2294

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 23-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-040	Calle 5 No. 5B - 20 - Barrio Gaván	PLACA PISO	24-sep-2024	040	7	1-oct-2024	10,1	12,42	27968	2252						TIPO-2
				040	7	1-oct-2024	10,1	12,42	28121	2264	2258	15,6	74,2			TIPO-3
				040	14	8-oct-2024	10,1	12,42	31550	2541					N/P	TIPO-2
				040	14	8-oct-2024	10,1	12,42	30265	2437	2489	17,2	81,8			TIPO-3
				040	28	22-oct-2024	10,1	12,42	39414	3174						TIPO-3
				040	28	22-oct-2024	10,1	12,42	38685	3115	3145	21,7	103,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

Sb22


IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 18-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-041	VEREDA CABAÑAS	VIGA CINTA	20-sep-2024	041	7	27-sep-2024	10,1	12,42	28540	2298						TIPO-2
				041	7	27-sep-2024	10,1	12,42	27635	2225	2262	15,6	74,3			TIPO-3
				041	14	4-oct-2024	10,1	12,42	30625	2466					N/P	TIPO-3
				041	14	4-oct-2024	10,1	12,42	31028	2499	2482	17,1	81,6			TIPO-2
				041	28	18-oct-2024	10,1	12,42	38747	3120						TIPO-3
				041	28	18-oct-2024	10,1	12,42	39121	3150	3135	21,6	103,0			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joseibarra08@gmail.com

2296

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 20-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-042	VEREDA AGUABLANCA	VIGA CINTA PLACA TANQUE	21-sep-2024	042	7	28-sep-2024	10,1	12,42	29610	2384						TIPO-3
				042	7	28-sep-2024	10,1	12,42	28565	2300	2342	16,2	77,0			TIPO-2
				042	14	5-oct-2024	10,1	12,42	31454	2533					N/P	TIPO-2
				042	14	5-oct-2024	10,1	12,42	31202	2513	2523	17,4	82,9			TIPO-3
				042	28	19-oct-2024	10,1	12,42	39021	3142						TIPO-3
				042	28	19-oct-2024	10,1	12,42	38110	3069	3106	21,4	102,0			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

tb22

IBARRA INGENIERÍA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 22-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-043	VEREDA AGUABLANCA	COLUMNAS DINTELES	23-sep-2024	043	7	30-sep-2024	10,1	12,42	28141	2266						TIPO-2
				043	7	30-sep-2024	10,1	12,42	27968	2252	2259	15,6	74,2			TIPO-3
				043	14	7-oct-2024	10,1	12,42	31526	2539					N/P	TIPO-3
				043	14	7-oct-2024	10,1	12,42	30598	2464	2501	17,3	82,2			TIPO-2
				043	28	21-oct-2024	10,1	12,42	37590	3027						TIPO-3
				043	28	21-oct-2024	10,1	12,42	38782	3123	3075	21,2	101,0			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 26-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-044	VEREDA CABAÑAS	PLACA PISO	27-sep-2024	044	7	4-oct-2024	10,1	12,42	29314	2361						TIPO-3
				044	7	4-oct-2024	10,1	12,42	27411	2207	2284	15,8	75,0			TIPO-2
				044	14	11-oct-2024	10,1	12,42	30525	2458					N/P	TIPO-3
				044	14	11-oct-2024	10,1	12,42	29985	2415	2436	16,8	80,1			TIPO-2
				044	28	25-oct-2024	10,1	12,42	37414	3013						TIPO-3
				044	28	25-oct-2024	10,1	12,42	39214	3158	3085	21,3	101,4			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

bb22

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 29-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-045	VEREDA ACEITE ALTO	VIGA CINTA	30-sep-2024	045	7	7-oct-2024	10,1	12,42	28141	2266						TIPO-2
				045	7	7-oct-2024	10,1	12,42	29655	2388	2327	16,1	76,5			TIPO-2
				045	14	14-oct-2024	10,1	12,42	31474	2534						TIPO-3
				045	14	14-oct-2024	10,1	12,42	30856	2485	2510	17,3	82,5		N/P	TIPO-3
				045	28	28-oct-2024	10,1	12,42	38787	3123						TIPO-3
				045	28	28-oct-2024	10,1	12,42	37458	3016	3070	21,2	100,9			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2300

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT S.A.S
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 22-dic-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-001	Benef. Sandra Cespedes Vereda Vigia	CICLOPEO	23-nov-2024	01	7	30-nov-2024	10,1	12,42	22874	1842						TIPO-2
				01	7	30-nov-2024	10,1	12,42	23652	1905	1873	12,9	61,6			TIPO-2
				01	14	07-dic-2024	10,1	12,42	27903	2247						TIPO-2
				01	14	07-dic-2024	10,1	12,42	28462	2292	2269	15,7	74,6		N/P	TIPO-2
				01	28	21-dic-2024	10,1	12,42	36226	2917						TIPO-2
				01	28	21-dic-2024	10,1	12,42	39949	3217	3067	21,2	100,8			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo: Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

1032

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S. NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 26-dic.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-002	Benef. Sandra Cespedes Vereda Vigia	VIGA AMARRE	27-nov-2024	002	7	04-dic-2024	10,1	12,42	26874	2164						TIPO-2
				002	7	04-dic-2024	10,1	12,42	27652	2227	2195	15,1	72,1			TIPO-2
				002	14	11-dic-2024	10,1	12,42	32874	2647						TIPO-3
				002	14	11-dic-2024	10,1	12,42	34624	2788	2718	18,8	89,3		N/P	TIPO-3
				002	28	25-dic-2024	10,1	12,42	43832	3530						TIPO-2
				002	28	25-dic-2024	10,1	12,42	44420	3577	3553	24,5	116,8			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
	Fecha de Emision - 18/09/2017

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS
NIT. 901.032.637-3


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 8-ene.-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-003	Benef. Sandra Cespedes Vereda Vigia	COLUMNAS	10-dic-2024	003	7	17-dic-2024	10,1	12,42	29842	2403						TIPO-2
				003	7	17-dic-2024	10,1	12,42	30652	2468	2436	16,8	80,0			TIPO-2
				003	14	24-dic-2024	10,1	12,42	43652	3515					N/P	TIPO-3
				003	14	24-dic-2024	10,1	12,42	44874	3614	3564	24,6	117,1			TIPO-3
				003	28	7-ene-2025	10,1	12,42	59328	4777						TIPO-2
				003	28	7-ene-2025	10,1	12,42	61909	4985	4881	33,7	160,4			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joseibarra08@gmail.com

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 12-ene.-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-004	Benef. Sandra Cespedes Vereda Vigia	VIGA AEREA DINTELES	13-dic-2024	004	7	20-dic-2024	10,1	12,42	23874	1922						TIPO-2
				004	7	20-dic-2024	10,1	12,42	22542	1815	1869	12,9	61,4			TIPO-2
				004	14	27-dic-2024	10,1	12,42	27452	2211						TIPO-2
				004	14	27-dic-2024	10,1	12,42	26874	2164	2187	15,1	71,9		N/P	TIPO-2
				004	28	10-ene-2025	10,1	12,42	39210	3157						TIPO-2
				004	28	10-ene-2025	10,1	12,42	37350	3008	3083	21,3	101,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joseibarra08@gmail.com

2304

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 21-ene.-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-005	Benef. Sandra Cespedes Vereda Vigia	VIGA CINTA PLACA TANQUE	23-dic-2024	005	7	30-dic-2024	10,1	12,42	24984	2012						TIPO-3
				005	7	30-dic-2024	10,1	12,42	24264	1954	1983	13,7	65,2			TIPO-3
				005	14	06-ene-2025	10,1	12,42	28746	2315						TIPO-2
				005	14	06-ene-2025	10,1	12,42	29124	2345	2330	16,1	76,6		N/P	TIPO-2
				005	28	20-ene-2025	10,1	12,42	46120	3714						TIPO-2
				005	28	20-ene-2025	10,1	12,42	46106	3713	3713	25,6	122,0			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

250

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 04-feb.-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-006	Benef. Sandra Cespedes Vereda Vigia	PLACA PISO	06-ene-2025	006	7	13-ene-2025	10,1	12,42	23542	1896						TIPO-3
				006	7	13-ene-2025	10,1	12,42	22874	1842	1869	12,9	61,4			TIPO-3
				006	14	20-ene-2025	10,1	12,42	27313	2199					N/P	TIPO-3
				006	14	20-ene-2025	10,1	12,42	28235	2274	2237	15,4	73,5			TIPO-3
				006	28	03-feb-2025	10,1	12,42	37530	3022						TIPO-2
				006	28	03-feb-2025	10,1	12,42	39839	3208	3115	21,5	102,4			TIPO-2

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO SAS NIT. 901.052.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 16-jul-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-007	Omar Favio Pinzón, Vereda Jagüito	CICLOPEO	18-jun-2025	007	7	25-jun-2025	10,1	12,42	23613	1901						TIPO-3
				007	7	25-jun-2025	10,1	12,42	25378	2044	1973	13,6	64,8			TIPO-3
				007	14	02-jul-2025	10,1	12,42	28846	2323					N/P	TIPO-3
				007	14	02-jul-2025	10,1	12,42	30984	2495	2409	16,6	79,2			TIPO-3
				007	28	16-jul-2025	10,1	12,42	37842	3047						TIPO-3
				007	28	16-jul-2025	10,1	12,42	38684	3115	3081	21,3	101,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joselbarra08@gmail.com

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 20 jul.-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-008	Omar Favio Pinzón, Vereda Jagüito	VIGA AMARRE	21-jun-2025	008	7	28-jun-2025	10,1	12,42	20680	1665						TIPO-3
				008	7	28-jun-2025	10,1	12,42	22420	1805	1735	12,0	57,0			TIPO-3
				008	14	5-jul-2025	10,1	12,42	26654	2146						TIPO-3
				008	14	5-jul-2025	10,1	12,42	28874	2325	2236	15,4	73,5		N/P	TIPO-3
				008	28	19-jul-2025	10,1	12,42	37846	3048						TIPO-3
				008	28	19-jul-2025	10,1	12,42	38984	3139	3093	21,3	101,6			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA X PLANTA
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 26-jul-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-009	Omar Favio Pinzòn, Vereda Jagüito	COLUMNAS	27-jun-2025	009	7	4-jul-2025	10,1	12,42	24213	1950						TIPO-2
				009	7	4-jul-2025	10,1	12,42	26968	2172	2061	14,2	67,7		N/P	TIPO-2
				009	14	11-jul-2025	10,1	12,42	28234	2274						TIPO-2
				009	14	11-jul-2025	10,1	12,42	29654	2388	2331	16,1	76,6			TIPO-2
				009	28	25-jul-2025	10,1	12,42	38846	3128						TIPO-3
				009	28	25-jul-2025	10,1	12,42	39984	3220	3174	21,9	104,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

2309

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
	Fecha de Emision - 18/09/2017

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S
NIT. 901.032.837-3


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 30-jul-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-010	Omar Favio Pinzón, Vereda Jagüito	VIGA AEREA DINTELES	1-jul-2025	010	7	8-jul-2024	10,1	12,42	25609	2062						TIPO-3
				010	7	8-jul-2024	10,1	12,42	27828	2241	2152	14,8	70,7			TIPO-3
				010	14	15-jul-2025	10,1	12,42	30102	2424						TIPO-3
				010	14	15-jul-2025	10,1	12,42	32346	2605	2514	17,3	82,6		N/P	TIPO-3
				010	28	29-jul-2025	10,1	12,42	38984	3139						TIPO-3
				010	28	29-jul-2025	10,1	12,42	39123	3150	3145	21,7	103,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

012

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.637-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F'c: 3000 PSI
F'c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 15-ago-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-011	Omar Favio Pinzón. Vereda Jagüito	VIGA CINTA PLACA TANQUE	17-jul-2025	011	7	24-jul-2025	10,1	12,42	25228	2032						TIPO-3
				011	7	24-jul-2025	10,1	12,42	24836	2000	2016	13,9	66,2			TIPO-2
				011	14	31-jul-2025	10,1	12,42	27845	2242						TIPO-3
				011	14	31-jul-2025	10,1	12,42	28984	2334	2288	15,8	75,2		N/P	TIPO-3
				011	28	14-ago-2025	10,1	12,42	38652	3112						TIPO-3
				011	28	14-ago-2025	10,1	12,42	40874	3291	3202	22,1	105,2			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO PLANTA
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra


IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EMPRESA : ASBUILT LTDA
F´c: 3000 PSI
F´c: 21,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 30-ago.-2025

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R´ PSI	R´PROMEDIO PSI	R´PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-012	Omar Favio Pinzón. Vereda Jagüito	PLACA PISO	25-jul-2025	012	7	1-ago-2025	10,1	12,42	23210	1869						TIPO-3
				012	7	1-ago-2025	10,1	12,42	25649	2065	1967	13,6	64,6			TIPO-2
				012	14	8-ago-2025	10,1	12,42	27426	2209						TIPO-2
				012	14	8-ago-2025	10,1	12,42	27874	2245	2227	15,4	73,2		N/P	TIPO-2
				012	28	22-ago-2025	10,1	12,42	37842	3047						TIPO-3
				012	28	22-ago-2025	10,1	12,42	37988	3059	3053	21,1	100,3			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO
MARCA: R&R
SERIE: 301-170115

TIPO DE FALLA 

OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

SEDE TAURAMENA: KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-81 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
TEL: 86257109 - 86333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - EMAIL: joselbarra08@gmail.com

CONTROL TÉCNICO – CERTIFICADOS DE CALIDAD

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

2314

ARGOS


Reporte de calidad

1/01/2025 | 31/01/2025 | Planta Yumbo | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4960 cm2/g	5.4 %	156 min	260 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
8.1 MPa	18.3 MPa	24.2 MPa	30.4 MPa

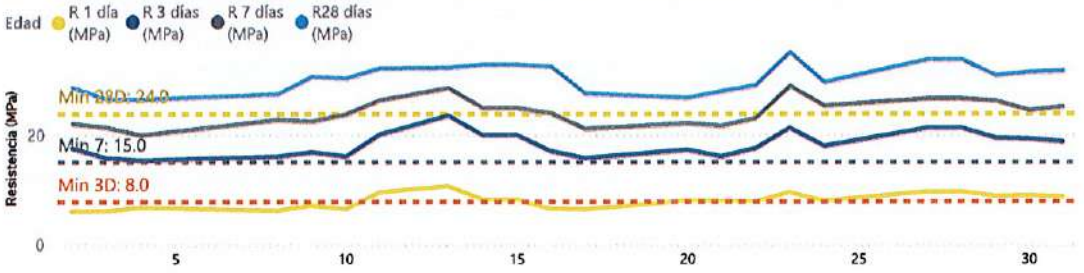


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2,93 g/m3	4,4 %	0,037 %	0,002 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	SO3
10.38 %	2.28 %

Equivalente alcalino
0.40 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
2/01/2025	4940	6.7	185	300	6.2	17.5	22.0	28.6
3/01/2025	5205	5.4	150	270	6.3	15.7	21.3	26.5
4/01/2025	5230	5.1	156	255	6.9	15.3	19.9	26.4
8/01/2025	4870	6.1	169	270	6.4	16.0	22.7	27.4
9/01/2025	5035	5.4	155	255	7.3	16.8	22.4	30.6
10/01/2025	4995	5.3	158	270	6.6	16.0	23.7	30.3
11/01/2025	4830	4.5	158	255	9.7	20.0	26.3	32.1
13/01/2025	5245	3.7	150	255	10.8	23.5	28.5	32.2
14/01/2025	5055	4.5	153	255	8.4	19.9	24.9	32.8
15/01/2025	4915	4.5	164	270	8.4	19.9	24.9	32.8
16/01/2025	4950	6.0	176	285	6.7	17.0	23.9	32.4
17/01/2025	5260	4.8	170	270	6.6	15.7	21.1	27.5
20/01/2025	5265	5.0	155	255	8.2	17.2	22.1	26.7
21/01/2025	5050	4.8	150	255	8.1	16.0	21.6	27.9
22/01/2025	4745	5.6	155	255	8.0	17.5	23.0	29.0
23/01/2025	4103	4.4	148	255	9.7	21.2	28.9	35.0
24/01/2025	5040	5.7	138	240	8.1	17.9	25.3	29.6
27/01/2025	4615	5.8	150	255	9.8	21.2	26.6	33.7
28/01/2025	4970	7.4	146	255	9.8	21.2	26.6	33.7
29/01/2025	5045	6.4	157	255	9.0	19.4	26.2	30.8
30/01/2025	5000	6.7	152	255	9.1	19.2	24.4	31.4
31/01/2025	4750	5.9	143	240	8.9	18.7	25.1	31.6

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.
* Los resultados suministrados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

2315

ARGOS


Reporte de calidad

1/05/2025 | 31/05/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4902 cm2/g	6.3 %	184 min	291 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
4.7 MPa	11.0 MPa	15.8 MPa	27.4 MPa

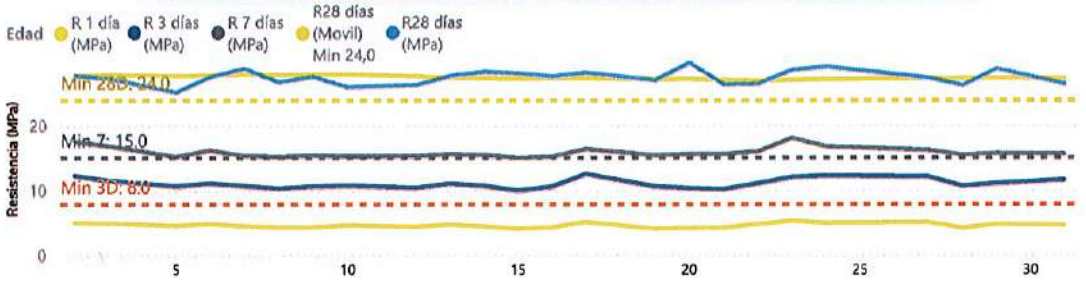


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2,95 g/m3	6,6 %	-0,006 %	0,003 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición

9.32 %

Equivalente alcalino

0.69 %

SO3

2.04 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
2/05/2025	4560	6.2	171	285	5.2	12.2	17.5	27.7
3/05/2025	5030	4.9	184	285	5.0	11.5	16.8	27.2
5/05/2025	5030	6.6	183	300	4.7	10.6	15.1	25.1
6/05/2025	4912	7.6	183	300	5.0	11.0	16.2	27.5
7/05/2025	4937	5.8	199	315	4.7	10.7	15.3	28.8
8/05/2025	4970	6.6	183	300	4.5	10.3	15.2	26.7
9/05/2025	4850	5.8	183	300	4.4	10.5	15.3	27.6
10/05/2025	6210	6.5	183	300	4.7	10.7	15.2	25.9
12/05/2025	4915	6.4	188	285	4.6	10.4	15.3	26.2
13/05/2025	5029	5.7	188	285	4.9	11.0	15.5	27.6
14/05/2025	5063	5.0	182	285	4.6	10.6	15.4	28.3
15/05/2025	4860	5.4	192	285	4.2	9.9	15.0	28.1
16/05/2025	4960	5.8	168	285	4.4	10.5	15.2	27.6
17/05/2025	4650	6.7	174	285	5.2	12.5	16.3	28.2
19/05/2025	4945	6.8	196	300	4.2	10.5	15.4	27.0
20/05/2025	4795	7.4	180	285	4.3	10.2	15.5	29.6
21/05/2025	4819	6.6	180	285	4.4	10.1	15.5	26.3
22/05/2025	4705	6.5	180	285	4.9	11.0	15.9	26.4
23/05/2025	4742	6.5	180	285	5.4	12.0	18.0	28.6
24/05/2025	4707	6.5	197	300	5.1	12.2	16.7	29.0
27/05/2025	4663	5.8	187	285	5.2	12.0	16.1	27.3
28/05/2025	4580	6.8	187	285	4.3	10.6	15.4	26.1
29/05/2025	4700	5.7	188	285	4.9	11.0	15.7	28.7
31/05/2025	5006	6.5	182	285	4.7	11.5	15.5	26.3

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

2316

ARGOS


Reporte de calidad

1/06/2025 | 30/06/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4804 cm2/g	6.0 %	185 min	284 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
5.6 MPa	12.6 MPa	17.1 MPa	27.9 MPa

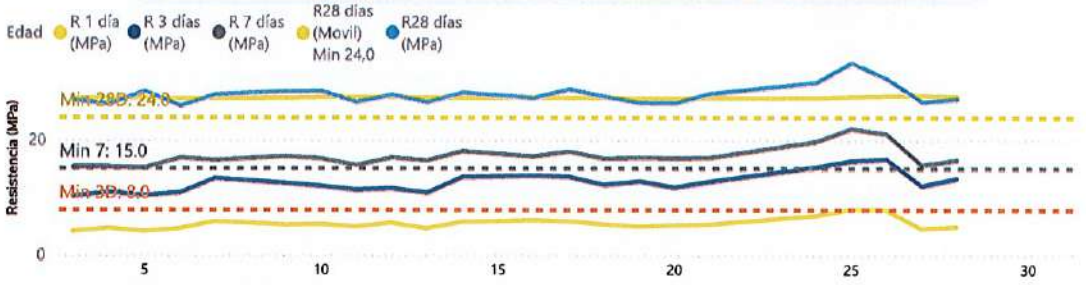


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2,95 g/cm3	6,8 %	0,013 %	0,005 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	SO3
8.16 %	2.09 %

Equivalente alcalino
0.70 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
3/06/2025	4973	6.9	195	300	4.2	10.1	15.3	26.9
4/06/2025	4760	6.2	195	300	4.8	10.8	15.3	26.2
5/06/2025	4940	6.1	195	300	4.2	10.3	15.1	28.4
6/06/2025	4773	6.7	186	285	4.7	10.7	16.8	25.9
7/06/2025	4943	5.2	184	285	6.0	13.3	16.4	27.9
9/06/2025	4868	6.0	180	285	5.4	12.4	17.1	28.4
10/06/2025	4743	6.3	180	285	5.5	11.9	16.7	28.5
11/06/2025	4772	6.6	190	285	5.1	11.2	15.6	26.6
12/06/2025	5075	4.6	177	270	5.7	11.5	16.9	27.8
13/06/2025	4645	7.3	177	270	4.8	10.8	16.4	26.5
14/06/2025	4810	5.6	183	285	5.9	13.5	18.0	28.2
16/06/2025	4717	6.1	184	285	6.2	13.8	17.1	27.3
17/06/2025	4793	6.8	193	285	6.0	13.6	18.0	28.8
18/06/2025	4733	6.2	193	285	5.5	12.2	16.7	27.5
19/06/2025	4773	5.3	184	285	5.1	12.8	16.9	26.4
20/06/2025	4627	6.4	184	285	5.4	11.7	16.8	26.4
21/06/2025	4690	6.2	181	285	5.5	12.7	16.9	28.0
24/06/2025	4783	5.7	181	285	7.0	15.2	19.7	29.9
25/06/2025	5105	4.4	180	270	8.1	16.3	21.9	33.3
26/06/2025	4833	4.3	180	270	8.0	16.6	21.0	30.6
27/06/2025	4567	6.6	184	285	4.8	12.0	15.6	26.6
28/06/2025	4758	6.9	185	285	5.1	13.3	16.5	27.1

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.
* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

2317

ARGOS


Reporte de calidad

1/07/2025 | 31/07/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4758 cm2/g	5.8 %	170 min	271 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
5.8 MPa	13.0 MPa	17.7 MPa	28.8 MPa

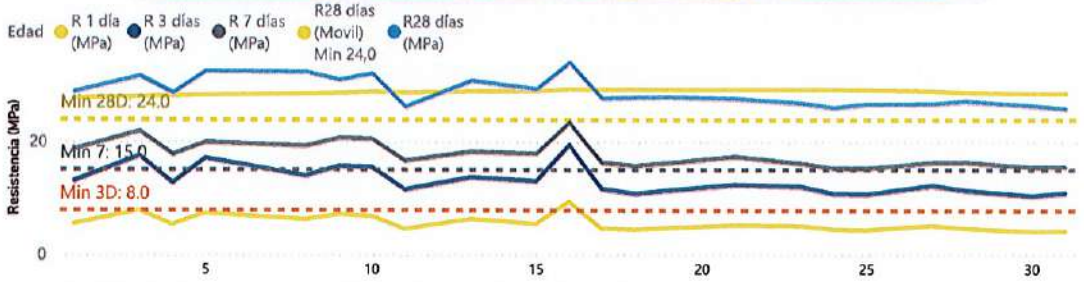


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2,96 g/cm3	6,8 %	0,014 %	0,006 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	SO3
8.54 %	2.05 %

Equivalente alcalino
0.67 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/07/2025	4760	5.7	173	270	5.6	13.0	18.6	28.8
3/07/2025	4661	6.9	171	270	8.0	17.5	21.8	31.6
4/07/2025	4670	6.3	171	270	5.5	12.7	17.8	28.6
5/07/2025	4785	4.6	171	270	7.6	17.0	19.9	32.5
8/07/2025	4862	5.1	171	270	6.4	13.9	19.2	32.3
9/07/2025	4603	5.2	171	270	7.3	15.6	20.7	30.9
10/07/2025	4855	3.9	166	255	7.0	15.4	20.4	32.0
11/07/2025	4802	5.2	156	270	4.7	11.5	16.6	26.1
13/07/2025	4952	4.9	151	255	6.5	13.6	18.2	30.7
15/07/2025	4713	5.8	151	255	5.6	12.9	17.8	29.3
16/07/2025	4747	5.0	166	270	9.5	19.4	23.3	34.0
17/07/2025	4708	5.8	166	270	4.8	11.6	16.3	27.6
18/07/2025	4688	6.6	166	270	4.6	10.7	15.7	27.8
19/07/2025	4573	6.4	168	270	4.9	11.3	16.2	27.9
21/07/2025	4640	5.9	152	255	5.4	12.3	17.3	27.6
23/07/2025	4850	6.5	168	270	5.3	12.0	16.1	26.8
24/07/2025	4893	6.0	173	285	4.6	10.7	15.2	26.0
25/07/2025	4843	7.3	186	285	4.5	10.6	15.2	26.6
27/07/2025	4718	7.1	186	285	5.3	12.2	16.3	26.7
28/07/2025	5090	5.3	186	285	4.8	11.3	16.3	27.1
30/07/2025	4550	6.3	186	285	4.3	10.4	15.4	26.3
31/07/2025	4710	5.6	186	285	4.3	10.8	15.5	25.8

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.
* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1660 V:0

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

TUBERÍA CONDUIT NO METÁLICA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado por:

TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S

NIT: 900.555.485-5

Km 2.3 variante Madrid Puente Piedra Parque Industrial Santa Cruz bodega 3A, Madrid (Colombia)

Es conforme con los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 y sus modificaciones, expedida por el Ministerio de Minas y Energía (MINENERGIA) Artículo 20, numeral 20.6.1.1 TUBOS O TUBERÍAS - Requisitos de producto.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

Fecha de aprobación:	3 de mayo de 2023
Fecha del primer seguimiento:	Antes del 2 de mayo de 2024
Fecha del segundo seguimiento:	Antes del 3 de mayo de 2025
Fecha de vencimiento:	2 de mayo de 2026

Autorizado por

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit telefónico eléctrico ½" TL x 3m	FCD0021
2	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit telefónico eléctrico ¾" TL x 3m	FCD0022
3	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit telefónico eléctrico 1" TL x 3m	FCD0023
4	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit telefónico eléctrico 1 ¼" TL x 3m	FCD0024
5	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit telefónico eléctrico 1 ½" TL x 3m	FCD0025
6	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit telefónico eléctrico 2" TL x 3m	FCD0026
7	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit SCH 40 ½"	FCD0027
8	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit SCH 40 ¾"	FCD0028
9	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit SCH 40 1"	FCD0029
10	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit SCH 40 1 ¼"	FCD0030
11	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit SCH 40 1½"	FCD0031
12	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Conduit SCH 40 2"	FCD0032
13	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 2" DB x 3m	FDT001
14	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 3" DB x 3m	FDT002
15	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 4" DB x 3m	FDT003
16	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 3" EB x 3m	FDT006
17	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 4" EB x 3m	FDT007
18	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 2" DB x 6m	FDT008
19	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 3" DB x 6m	FDT009
20	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 4" DB x 6m	FDT010
21	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 3" EB x 6m	FDT011
22	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 4" EB x 6m	FDT012
23	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 6" EB x 6m	FDT013
24	Tubo no metálico para instalaciones eléctricas	Tubo Ducto telefónico 6" DB x 6m	FDT014

****

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

PazdelRio
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 12.07.2025
HORA: 17:48:31
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6110777 - BARRA CORR END (M) N.3X6m NTC 2289 G60
CLIENTE: 5153358 / SODIMAC COLOMBIA-YOPAL
DIRECCIÓN: CL 24 ENTRE CR 34 37

REPORTE: 74.555
ORDEN DE ENTREGA: 8091250356
PLACA: XIE399

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Al	V	CEq	Rm (MPa)	Fl (MPa)	R/F	Al (%)	Doblado	Diametro	Esp.Pared	Alt. Res.	Anc.Vena
												%			Fl/Rm			Pg	mm	mm²	mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420	1,05	14,00		0,327		0,38	
Máximo:	0,34	1,50	0,035	0,035	0,50							0,550		540				0,394		0,70		2,50
6110777	0,30	0,97	0,014	0,013	0,15	0,1006	0,1645	0,0[illegible]			0,01	0,471	655,44	441,16	1,41	15,44	B	0,351	6,04	0,60	2,35
6110777	0,29	0,97	0,019	0,020	0,19	0,1000	0,1563	0,0[illegible]			0,000	0,465	658,69	458,49	1,45	15,20	B	0,347	6,02	0,54	2,45

[illegible] - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F Al(%) - ELONGACIÓN (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin previa autorización de Aceros Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

2320

2321

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS

Fabricado por **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, en la
Kilómetro 1,5 Vía Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,
identificada con **número de NIT 900.555.485-5**

Manufactured by **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, in the
Kilómetro 1,5 Vía Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,
identified with **NIT number 900.555.485-5**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 979 (2006)

Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC rígido)
para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico
Plastics. Unplsticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
pipes and bends for conduits housing and protecting

SECTOR ICS 20.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-CER733981
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2019-12-11	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-12-10

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ISO/IEC 17065

ES-I-PD-04-F-001 Versión 3

2322

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN

Fabricado por **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, en la
Kilómetro 1,5 Vía Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,
identificada con **número de NIT 900.555.485-5**

Manufactured by **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, in the
Kilómetro 1,5 Vía Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,
identified with **NIT number 900.555.485-5**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC)
clasificados según la presión (serie RDE).
Plastics. Poly(vinyl chloride)
(PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS 20.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-CER733976
Certificate

Fecha de Aprobación:	2019-12-11	**Fecha Última Modificación:**	
Approval Date:		Last Modification Date:	
Fecha de Renovación:		**Fecha de Vencimiento:**	2022-12-10
Renewal Date:		Expiration Date:	

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED

ES-I-PD-04-F-001 Versión 3

2323

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO

Fabricado por **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, en la
Kilómetro 1,5 Via Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,
identificada con **número de NIT 900.555.485-5**

Manufactured by **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, in the
Kilómetro 1,5 Via Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,
identified with **NIT number 900.555.485-5**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1087 (2016)

Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC)
rígido para uso sanitarioaguas lluvias y ventilación
Poly (vinyl chloride) (PVC)
waste and vent pipe

SECTOR ICS 20.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado **CSC-CER733979**
Certificate

Fecha de Aprobación:	2019-12-11	**Fecha Última Modificación:**	
Approval Date:		Last Modification Date:	
Fecha de Renovación:		**Fecha de Vencimiento:**	2022-12-10
Renewal Date:		Expiration Date:	

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ISO/IEC 17065

ES-I-PD-04-F-001 Versión 3

CONTROL JURÍDICO – PÓLIZAS ACTA DE RECIBO FINAL

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:49:23 -05:00

Código de Seguridad: qgnumfS6GWKA3JD1qQeNw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-3317-P-05-PPSUS2000000065-D001

No. PÓLIZA	COQ-100002014	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005667	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	SOTABA LOPEZ, ANA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.913.493
DIRECCIÓN	CL 7 13 02	TELÉFONO	3132014400
BENEFICIARIO	SOTABA LOPEZ, ANA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.913.493
DIRECCIÓN	CL 7 13 02	TELÉFONO	3132014400

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECA 04/09/2024 DEL CONTRATO NO. 20. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 20 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 04/07/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMA - ACP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002014	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005667	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

.....

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2327

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002014** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **SOTABA LOPEZ, ANA LUCIA / SOTABA LOPEZ, ANA LUCIA** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2328

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:53:03 -05:00

Código de Seguridad: 1uM/3HqsdOwC2RcKv2U2nQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-1317-P-08-PPSUS2R000000065-D001

No. PÓLIZA	COQ-100002027	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005669	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	MONROY POSADA, ARLEY ALEXANDER	No. DOC. IDENTIDAD	86.047.597
DIRECCIÓN	DG 8 3 55	TELÉFONO	3134651808
BENEFICIARIO	MONROY POSADA, ARLEY ALEXANDER	No. DOC. IDENTIDAD	86.047.597
DIRECCIÓN	DG 8 3 55	TELÉFONO	3134651808

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 04/09/224 DEL CONTRATO NO. 27. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 27 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,98	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 04/07/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,58	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGS - 2019

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002027	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005669	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2330

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002027** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **MONROY POSADA, ARLEY ALEXANDER / MONROY POSADA, ARLEY ALEXANDER** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:55:09 -05:00

Código de Seguridad: Hp2hU6Rcug4849xfSvAywg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-03-PPSUS2R000000065-0001

No. PÓLIZA	COQ-100002020	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005670	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	RAMIREZ AMEZQUITA, ANGIE MILENA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.918.987
DIRECCIÓN	CL 15A 1A 55	TELÉFONO	3124723730
BENEFICIARIO	RAMIREZ AMEZQUITA, ANGIE MILENA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.918.987
DIRECCIÓN	CL 15A 1A 55	TELÉFONO	3124723730

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXOSE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONSTANCIA DE ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 04/09/2024 DEL CONTRATO NO. 28. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 28 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 04/07/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002020	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005670	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002020** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **RAMIREZ AMEZQUITA, ANGIE MILENA / RAMIREZ AMEZQUITA, ANGIE MILENA** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:38:45 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN • AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 3P5dYrIME4SKLk17+VoIsg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000065-0001

No. PÓLIZA	COQ-100002002	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005664	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	DUARTE ESTUPIÑAN, CATHERINE ALICIA	No. DOC. IDENTIDAD	1.118.548.407
DIRECCIÓN	CLL 12 N 10-25	TELÉFONO	3108171265
BENEFICIARIO	DUARTE ESTUPIÑAN, CATHERINE ALICIA	No. DOC. IDENTIDAD	1.118.548.407
DIRECCIÓN	CLL 12 N 10-25	TELÉFONO	3108171265

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDAL DE SEGUROS TIEN CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTARTO NO. 8. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.8 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/07/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - 2PF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002002	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005664	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

.....

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002002** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **DUARTE ESTUPIÑAN, CATHERINE ALICIA / DUARTE ESTUPIÑAN, CATHERINE ALICIA** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:35:57 -05:00

Código de Seguridad: 4R11y/KCdgozR1dQfDsZgA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-3317-P-05-PPSUS2000000065-0001

No. PÓLIZA	COQ-100001998	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005663	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	MORENO SALCEDO, CLARIS GICEL	No. DOC. IDENTIDAD	1.006.415.828
DIRECCIÓN	VDA YAGUAROS	TELÉFONO	3105861535
BENEFICIARIO	MORENO SALCEDO, CLARIS GICEL	No. DOC. IDENTIDAD	1.006.415.828
DIRECCIÓN	VDA YAGUAROS	TELÉFONO	3105861535

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE ELPRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINALDE FECHA 13/11/2024 DEL CONTRATO NO. 4. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/07/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAZA - 295

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

2338

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001998	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005663	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

.....

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

2339

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100001998** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **MORENO SALCEDO, CLARIS GICEL / MORENO SALCEDO, CLARIS GICEL** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2340

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:30:35 -05:00

Código de Seguridad: YgnfdGxx2c17vWJ3F5nypQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851270 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D002

No. PÓLIZA	COQ-100001995	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005662	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	LOZANO RAMIREZ, DANIELA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	1.019.143.766
DIRECCIÓN	CRA 16 # 36-35 CASA BLANCA	TELÉFONO	3152722275
BENEFICIARIO	LOZANO RAMIREZ, DANIELA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	1.019.143.766
DIRECCIÓN	CRA 16 # 36-35 CASA BLANCA	TELÉFONO	3152722275

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTRATO NO.1 NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1 DE FECHA 27/12/2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 06/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/07/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMES - ACPI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001995	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005662	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2342

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza COQ-100001995 y endoso, 1 cuyo afianzado es: AS BUILT SAS Asegurado o Beneficiario: LOZANO RAMIREZ, DANIELA LUCIA / LOZANO RAMIREZ, DANIELA LUCIA , expedida por la Compañía en 30/12/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los 30 días del mes DICIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:43:19 -05:00

Código de Seguridad: IxqufuAdnLTPMvWqEukqLW==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000065-0001

No. PÓLIZA	COQ-100002006	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005666	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	TARACHE PEREZ, FLORISBEL	No. DOC. IDENTIDAD	1.124.990.360
DIRECCIÓN	VDA ACEITE ALTO	TELÉFONO	3212142368
BENEFICIARIO	TARACHE PEREZ, FLORISBEL	No. DOC. IDENTIDAD	1.124.990.360
DIRECCIÓN	VDA ACEITE ALTO	TELÉFONO	3212142368

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJACONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTRATO NO. 12. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.12 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/07/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PICA - CPF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002006	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005666	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2345

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA&APF Asociación Panamericana de Bancos Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002006** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **TARACHE PEREZ, FLORISBEL / TARACHE PEREZ, FLORISBEL** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2346

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:51:26 -05:00

Código de Seguridad: 4cJBeS0VmpsnuBm153B2RQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-3317-P-03-PPSUS2R000000065-0001

No. PÓLIZA	CQQ-100002015	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005668	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	CUBIDES RAMIREZ, JHOON ALEXANDER	No. DOC. IDENTIDAD	7.232.276
DIRECCIÓN	VRDA GUIRA	TELÉFONO	3112828659
BENEFICIARIO	CUBIDES RAMIREZ, JHOON ALEXANDER	No. DOC. IDENTIDAD	7.232.276
DIRECCIÓN	VRDA GUIRA	TELÉFONO	3112828659

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRSENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL FECHA 11/10/2024 DEL CONTRATO NO. 22. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 22 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 31/07/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - ASP

2347

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002015	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	68000568	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ABF

2348

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002015** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **CUBIDES RAMIREZ, JHOON ALEXANDER / CUBIDES RAMIREZ, JHOON ALEXANDER** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:56:55 -05:00

Código de Seguridad: DrhkgrNTu1rv3dT2WdXsw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-3317-P-85-PPSUS2R000000065-D001

No. PÓLIZA	COQ-100002021	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005671	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	PLAZAS BRICEÑO, LUIS CARLOS	No. DOC. IDENTIDAD	1.077.920.572
DIRECCIÓN	CL 18 10A 51	TELÉFONO	3102635099
BENEFICIARIO	PLAZAS BRICEÑO, LUIS CARLOS	No. DOC. IDENTIDAD	1.077.920.572
DIRECCIÓN	CL 18 10A 51	TELÉFONO	3102635099

OBJETO DE CONTRATO

***MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 12/11/2024 DEL CONTRATO NO. 29. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 29 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 12/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/11/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/11/2024	24:00 Horas Del 12/07/2026	0,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 29.890.768,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

2350

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002021	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005671	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2351

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Plazas Fuertes en Sitio y Asociados

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002021** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **PLAZAS BRICEÑO, LUIS CARLOS / PLAZAS BRICEÑO, LUIS CARLOS** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los 30 días del mes DICIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2352

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:13:31 -05:00

Código de Seguridad: eoQs18CaRfSaF/TuLZHDTQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000063-D002

No. PÓLIZA	COQ-100002019	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005674	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	SALINAS MORALES, MARILUZ	No. DOC. IDENTIDAD	1.010.181.944
DIRECCIÓN	VRDA GUIRA	TELÉFONO	3212482570
BENEFICIARIO	SALINAS MORALES, MARILUZ	No. DOC. IDENTIDAD	1.010.181.944
DIRECCIÓN	VRDA GUIRA	TELÉFONO	3212482570

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 05/09/2024 DEL CONTRATO NO. 26. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.26 DE FECHA 27/12/2029, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 05/09/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002019	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005574	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002019** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **SALINAS MORALES, MARILUZ / SALINAS MORALES, MARILUZ** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los 30 días del mes DICIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:41:00 -05:00

Código de Seguridad: uq/xpZnnO4XaRkMz724KzW==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D001

No. PÓLIZA	COQ-100002003	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005665	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	ZORRO DAZA, OSCAR	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.914.089
DIRECCIÓN	MZ 49 CASA 25	TELÉFONO	3132943481
BENEFICIARIO	ZORRO DAZA, OSCAR	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.914.089
DIRECCIÓN	MZ 49 CASA 25	TELÉFONO	3132943481

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL SE SEGURSO TIENE CONOCIMIENTO DEL ACT DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024DEL CONTRATO NO. 9 NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES,
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 9 DE FECHA 27/12/2023 , CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/07/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCA - ASIF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002003	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005665	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2357

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002003** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **ZORRO DAZA, OSCAR / ZORRO DAZA, OSCAR** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2358

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 11:50:21 -05:00

Código de Seguridad: pVHVqFbkHZTZDKt4dlks2A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000865-0001

No. PÓLIZA	CCQ-100002012	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005658	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	GOMEZ MARTINEZ, ROBINSON	No. DOC. IDENTIDAD	74.845.359
DIRECCIÓN	CL 8 10 21	TELÉFONO	3226693956
BENEFICIARIO	GOMEZ MARTINEZ, ROBINSON	No. DOC. IDENTIDAD	74.845.359
DIRECCIÓN	CL 8 10 21	TELÉFONO	3226693956

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FIAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTRATO NO. 18. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 18 DE FECHA 27/12/2023 , CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO, CANTIDADES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/11/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMES - SIPF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100082012	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005658	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA
APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002012** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **GOMEZ MARTINEZ, ROBINSON / GOMEZ MARTINEZ, ROBINSON** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

7361

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 12:00:23 -05:00

Código de Seguridad: 6JQLALV1sL6AM4jNvu2fMw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. CB - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-3317-P-01-PPSUS2R000000063-0001

No. PÓLIZA	COQ-100002017	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005661	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	DAZA CASTILLO, RONY FERNANDO	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.911.782
DIRECCIÓN	CL 8 E 27 03	TELÉFONO	3229046998
BENEFICIARIO	DAZA CASTILLO, RONY FERNANDO	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.911.782
DIRECCIÓN	CL 8 E 27 03	TELÉFONO	3229046998

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONTANCIA QUE LA COMPAÑA MUNDIAL DESEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL CT DE RECIBO FINAL DE FECHA 1/10/2024 DEL CONTRATO NO. 24. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 24 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/10/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/10/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/10/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 01/10/2024	24:00 Horas Del 01/10/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAZA - ACPI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002017	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005661	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2363

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA&APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza COQ-100002017 y endoso, 1 cuyo afianzado es: AS BUILT SAS Asegurado o Beneficiario: DAZA CASTILLO, RONY FERNANDO / DAZA CASTILLO, RONY FERNANDO , expedida por la Compañía en 30/12/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los 30 días del mes DICIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2364

seguros mundial
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 11:48:30 -05:00

Código de Seguridad: ZxUWYdVthByKWBJJ7PByRA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-0001

No. PÓLIZA	COQ-100002007	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005657	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	ZORRO CADENA, SANDY YASMIN	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.910.985
DIRECCIÓN	VDA CABAÑAS	TELÉFONO	3177566423
BENEFICIARIO	ZORRO CADENA, SANDY YASMIN	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.910.985
DIRECCIÓN	VDA CABAÑAS	TELÉFONO	3177566423

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIA DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTARO NO. 13. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.13 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/11/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - 2019

2365

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002007	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005657	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2366

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002007** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **ZORRO CADENA, SANDY YASMIN / ZORRO CADENA, SANDY YASMIN** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los 30 días del mes DICIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2367

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 11:35:54 -05:00

Código de Seguridad: ZTyBN8E91WTqhOL+3rr1JA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 05-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000965-0001

No. PÓLIZA	COQ-100082000	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005655	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	SOLER SALINAS, SOLMAR	No. DOC. IDENTIDAD	74.856.542
DIRECCIÓN	VDA CHITAMENA	TELÉFONO	3144657516
BENEFICIARIO	SOLER SALINAS, SOLMAR	No. DOC. IDENTIDAD	74.856.542
DIRECCIÓN	VDA CHITAMENA	TELÉFONO	3144657516

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTRATO NO. 6. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.6 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/11/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA VIGILADA - SIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002000	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005655	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AFF

2369

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 600.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002000** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **SOLER SALINAS, SOLMAR / SOLER SALINAS, SOLMAR** , expedida por la Compañía en **30/12/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2370

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 11:43:05 -05:00

Código de Seguridad: cC43Z3n+V+0LPY013+eNVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-3317-P-01-PPSUS2R000000065-D002

No. PÓLIZA	COQ-100002001	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680005656	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/11/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	CRIOLLO FLOREZ, TATIANA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.918.424
DIRECCIÓN	CLL 1 B 3A-33	TELÉFONO	3202233645
BENEFICIARIO	CRIOLLO FLOREZ, TATIANA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.918.424
DIRECCIÓN	CLL 1 B 3A-33	TELÉFONO	3202233645

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIA DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/11/2024 DEL CONTRATO NO. 7. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.07 DE FECHA 27/12/2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,41	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 01/12/2024	27.873.046,23	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,71	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 13/11/2026	4.645.507,71	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,06	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ACIF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002001	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680005656	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/11/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2372

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Aseguradores en Seguros de Garantía

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002001** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **CRIOLLO FLOREZ, TATIANA / CRIOLLO FLOREZ, TATIANA** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2373

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 11:56:07 -05:00

Código de Seguridad: kZ91/MJcuKdeI/4P2CqpKg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-1317-P-03-PPSUS2R000000065-D001

No. PÓLIZA	COQ-100002016	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005660	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449866
ASEGURADO	YEPES LEDESMA, VIVIANA MARIA	No. DOC. IDENTIDAD	33.625.226
DIRECCIÓN	CR 11 21 12	TELÉFONO	3118636798
BENEFICIARIO	YEPES LEDESMA, VIVIANA MARIA	No. DOC. IDENTIDAD	33.625.226
DIRECCIÓN	CR 11 21 12	TELÉFONO	3118636798

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 11/10/2024 DEL CONTRATO NO. 23. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 23 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 11/10/2025	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAZA - SDF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002016	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005660	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

2375

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002016** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **YEPES LEDESMA, VIVIANA MARIA / YEPES LEDESMA, VIVIANA MARIA** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

2376

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN · AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 14:10:29 -05:00

Código de Seguridad: dBUHGnP1UNu6+hkLv9118Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-03-PPSU52R000000365-D001

No. PÓLIZA	COQ-100002018	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005673	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449866
ASEGURADO	SARMIENTO HERNANDEZ, WENDY JURANY	No. DOC. IDENTIDAD	1.024.532.837
DIRECCIÓN	CARRERA 2 N. 16 A - 3	TELÉFONO	3144272970
BENEFICIARIO	SARMIENTO HERNANDEZ, WENDY JURANY	No. DOC. IDENTIDAD	1.024.532.837
DIRECCIÓN	CARRERA 2 N. 16 A - 3	TELÉFONO	3144272970

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PREENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 31/08/2024 DEL CONTRATO NO.25. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.25 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA URBANAA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/08/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,90	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 31/08/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	19.927.178,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/08/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/08/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	3.321.196,45	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA VIGILADA - SIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002018	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680005673	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

2378

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza COQ-100002018 y endoso, 1 cuyo afianzado es: AS BUILT SAS Asegurado o Beneficiario: SARMIENTO HERNANDEZ, WENDY JURANY / SARMIENTO HERNANDEZ, WENDY JURANY , expedida por la Compañía en 30/12/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los 30 días del mes DICIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.23 11:37:17 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D001

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fD0kyO1SeIwd92wrsVs3bA==

No. PÓLIZA	COQ-100002013	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680011020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2025	24:00 Horas Del	13/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3142957109
ASEGURADO	PINZON CARDENAS, OMAR FAVIO	No. DOC. IDENTIDAD	74.845.589
DIRECCIÓN	VDA JAGUITO	TELÉFONO	3184146478
BENEFICIARIO	PINZON CARDENAS, OMAR FAVIO	No. DOC. IDENTIDAD	74.845.589
DIRECCIÓN	VDA JAGUITO	TELÉFONO	3184146478

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARAO DE ESTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE FECHA 30/07/2025.

TODO LO DEMAS NO SE MODIFICA, CONTINUA VIGENTE.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.19 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES

EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL AREA DE INTERVENCION QUE DEBERAN SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/07/2025	24:00 Horas Del 13/05/2026	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 30/07/2025	24:00 Horas Del 13/06/2026	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/07/2025	24:00 Horas Del 13/01/2029	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/07/2025	24:00 Horas Del 30/07/2027	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ *INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA* PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002013	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680011020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2025	24:00 Horas Del	13/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APF

2381

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100002013** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **AS BUILT SAS** Asegurado o Beneficiario: **PINZON CARDENAS, OMAR FAVIO / PINZON CARDENAS, OMAR FAVIO ,** expedida por la Compañía en **23/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **23** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

2382

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 11:54:07 -05:00

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: MLrvtoBBTXLuzIplKg5tFQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-0001

No. PÓLIZA	COQ-100002028	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680005659	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3203449066
ASEGURADO	PINO NOGUERA, VIVIANA ANDREA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.918.084
DIRECCIÓN	CLL 5A N 8-26	TELÉFONO	3165180274
BENEFICIARIO	PINO NOGUERA, VIVIANA ANDREA	No. DOC. IDENTIDAD	1.115.918.084
DIRECCIÓN	CLL 5A N 8-26	TELÉFONO	3165180274

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL RESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 5/09/2024 DEL CONTRATO NO. 21. NOTA. SE ACLARA QUE EL AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA Y CUMPLE EN TODAS SUS PARTES CON EL AMPARO SOLICITADO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 21 DE FECHA 27/12/2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	6.642.392,80	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 01/12/2024	19.927.178,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 01/08/2027	3.321.196,40	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/09/2024	24:00 Horas Del 05/09/2026	3.321.196,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.211.964,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMES - 2PF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002028	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680005659	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	01/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

2384

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.16 16:38:36 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zbConZPOnmFCqO26Yw6qOQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001996	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011472	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3142957109
ASEGURADO	VACA HERRERA, BLANCA LIDIA	No. DOC. IDENTIDAD	23.467.403
DIRECCIÓN	VRDA IQUIA	TELÉFONO	3224343260
BENEFICIARIO	VACA HERRERA, BLANCA LIDIA	No. DOC. IDENTIDAD	23.467.403
DIRECCIÓN	VRDA IQUIA	TELÉFONO	3224343260

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARAO DE ESTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE FECHA 27/12/2024.
TODO LO DEMAS NO SE MODIFICA, CONTINUA VIGENTE.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2 DE FECHA 27/12/2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 06/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/12/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/12/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASIF

2385

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.16 17:38:50 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: vtWFnUtBHfcf4OsGl3utkg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001999	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3142957109
ASEGURADO	MENDOZA, JOSE DULIER	No. DOC. IDENTIDAD	74.856.266
DIRECCIÓN	VEREDA LAS DELICIAS	TELÉFONO	3132873213
BENEFICIARIO	MENDOZA, JOSE DULIER	No. DOC. IDENTIDAD	74.856.266
DIRECCIÓN	VEREDA LAS DELICIAS	TELÉFONO	3132873213

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARAO DE ESTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE FECHA 27/12/2024.
TODO LO DEMAS NO SE MODIFICA, CONTINUA VIGENTE.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.5 DE FECHA 27/12/2023, CUYO OBJETO ES
EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA (1) "VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, DETERMINADAS EN EL ACTA DE INTERVENCION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL BENEFICIARIO CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TAURAMENA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/12/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/12/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS; EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

2386

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.16 17:37:20 -05:00

NIT 860 037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ZjFVEXb0g1X8l0lmMf1L9A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001997	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011475	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2023	24:00 Horas Del	27/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	AS BUILT SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.104-2
DIRECCIÓN	CLL 8A 14 48	TELÉFONO	3142957109
ASEGURADO	PIÑEROS SOLER, RONAL	No. DOC. IDENTIDAD	9.630.122
DIRECCIÓN	VDA VILLA ROSA	TELÉFONO	3115356007
BENEFICIARIO	PIÑEROS SOLER, RONAL	No. DOC. IDENTIDAD	9.630.122
DIRECCIÓN	VDA VILLA ROSA	TELÉFONO	3115356007

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARAO DE ESTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE FECHA 27/12/2024.
TODO LO DEMAS NO SE MODIFICA, CONTINUA VIGENTE.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.3 , DE FECHA 27/12/2023 CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/11/2024	24:00 Horas Del 01/11/2024	9.291.015,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/12/2024	24:00 Horas Del 02/12/2024	27.873.046,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/07/2027	4.645.507,75	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/12/2026	4.645.507,75	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 46.455.077,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - 4PF
