INFORME DE AVANCE DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR**						
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00	Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00						
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00						
Plazo de Ejecución:	14 MESES Y 24 DIAS	Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1	31/03/2025
Fecha de Inicio:	6/11/2024	Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2	31/12/2025
Vencimiento:	31/12/2025					Plazo Actualizado	14 MESES Y 24 DIAS
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEG	Desde 16/10/2024	Hasta	30/06/2026	$ 2.791.730.311,00			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	11	Período comprendido entre el	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	y el	9 DE OCTUBRE DEL 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:	033-2025
Contratista:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025	Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025
Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025	Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025
Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES	Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES
Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025	Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025
Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES	Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES
Valor Inicial:	$ 518,496,955	Valor Inicial:	$ 13,358,523,629,68
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:	$ 518,496,955	Valor Actualizado:	$ 13,358,523,629,68
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Valor por pagar:	$ 518,496,955	Valor por pagar:	$ 13,358,523,629,68
Nombre Supervisor:	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	10/08/2026	51.849.695,50
RIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	31/03/2025	10/02/2029	51.849.696,50
CALIDAD DEL SERVICIO	8/09/2025	8/09/2030	51.849.697,50
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-1014-68251

CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025

CONCEPTO	N° POLIZAS	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	2.671.704.725,94
PRESTACIONES SOCIALES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2026	667.926.181,48
ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	4.007.557.088,90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	2.671.704.725,94
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	NB - 100095284	10/03/2025	7/02/2026	771.750.000,00
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL				

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

CONTRATO DE OBRA Nº

a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.

CONCEPTO		FECHA DE PAGO	VALOR

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	22,70%	38,24%	60,94%
% Ejecutado	21,65%	27,25%	48,90%
Diferencia	1,05%	10,99%	12,04%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. Actividades preliminares de localización y replanteo:
El contratista continua con las labores de localización y replanteo del área de intervención, utilizando para ello equipos topográficos especializados, asegurando el correcto posicionamiento del proyecto conforme a los planos técnicos aprobados.

2.Instalación de relleno seleccionado en la zona de parque infantil y de juegos biosaludables: consiste en la colocación de un material granular limpio, libre de piedras, escombros y elementos cortantes, previamente compactado y nivelado, con el fin de generar una base uniforme, estable y segura que facilite la correcta instalación de los elementos de juego, mejore el drenaje y garantice la seguridad de los usuarios.

3 .fundida de solado para vigas de cimentación de cerramiento perimetral consiste en la colocación de una capa de concreto, generalmente pobre o de limpieza, sobre el terreno previamente nivelado y compactado, con el fin de crear una superficie firme, nivelada y libre de impurezas donde se instalarán las vigas de cimentación que soportarán el cerramiento perimetral.

4. armado de acero de refuerzo para cerramiento perimetral, vigas superiores y columnas de gradería: consiste en la colocación y amarre de barras de acero corrugado conforme a los planos estructurales, con el fin de garantizar la resistencia y estabilidad de la estructura. Este proceso incluye el corte, doblado y posicionamiento del acero, asegurando el recubrimiento de concreto necesario y la correcta disposición de traslapes y anclajes para soportar las cargas previstas.

5. Armado de plataformas de graderías: consiste en el montaje y ensamblaje de la estructura base de las graderías, mediante la instalación de elementos metálicos o de concreto, garantizando estabilidad, nivelación y cumplimiento de las normas técnicas vigentes.

6. Instalación de piso en loseta de cemento: consiste en la preparación de la superficie, colocación y nivelación de las losetas de cemento mediante el uso de mortero de pega adecuado. Incluye el alineado, rejuntado y limpieza final para asegurar una superficie uniforme y resistente. Todo el proceso se realiza conforme a las especificaciones técnicas y normas de calidad vigentes.

7. Construcción de cárcamo de aguas lluvias: consiste en la ejecución de una estructura de concreto reforzado destinada a la recolección, almacenamiento y bombeo de aguas pluviales. Incluye la excavación, conformación de base, armado, fundida de muros y losa, así como la instalación de tuberías, válvulas y accesorios hidráulicos, garantizando hermeticidad, resistencia estructural y cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

8. Fundida del fondo del tanque de almacenamiento: consiste en la preparación, nivelación y vaciado de la losa base en concreto reforzado que conforma el fondo del tanque. Incluye la colocación de formaletas, acero de refuerzo y control de espesores, garantizando una superficie impermeable, resistente y construida conforme a las especificaciones estructurales y normas técnicas vigentes.


9. suministro de tubería sanitaria de 4" y 6": consiste en la adquisición y entrega de tuberías de PVC (u otro material especificado) de diámetros nominales 4 y 6 pulgadas, diseñadas para la conducción de aguas residuales o pluviales. Esta actividad incluye la selección, transporte y disposición en sitio del material, garantizando que cumpla con las especificaciones técnicas y normas de calidad exigidas para instalaciones sanitarias.

10. Construcción de manholes para red sanitaria: Consiste en la ejecución de cámaras de inspección (manholes) construidas en concreto reforzado u otro material especificado, destinadas al acceso, inspección, ventilación y mantenimiento de la red sanitaria. Esta actividad incluye la excavación, conformación de la base, armado y fundida de los elementos estructurales (base, fuste y tapa), así como la instalación de accesorios internos como escalones metálicos o de polímero, marcos y tapas de fundición. Además, contempla la conexión hermética de las tuberías de ingreso y salida, la impermeabilización y limpieza final del pozo, garantizando su estabilidad, durabilidad y el cumplimiento de las normas técnicas NTC e INVIAS aplicables para sistemas de alcantarillado sanitario.

11. construcción de registros eléctricos SB300 consiste en la instalación de cajas o cámaras de inspección subterráneas, de aproximadamente 300 mm de diámetro, utilizadas para alojar, proteger y facilitar el acceso a empalmes, derivaciones o conexiones de redes eléctricas. Estas estructuras permiten realizar mantenimientos, reparaciones y ampliaciones del sistema sin necesidad de excavar nuevamente, garantizando la seguridad y organización del tendido eléctrico.

12. Plan de Gestión Integral de Obras : En términos generales, es una actividad o instrumento de planificación que define cómo se van a organizar, ejecutar y supervisar las obras de infraestructura o proyectos constructivos.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

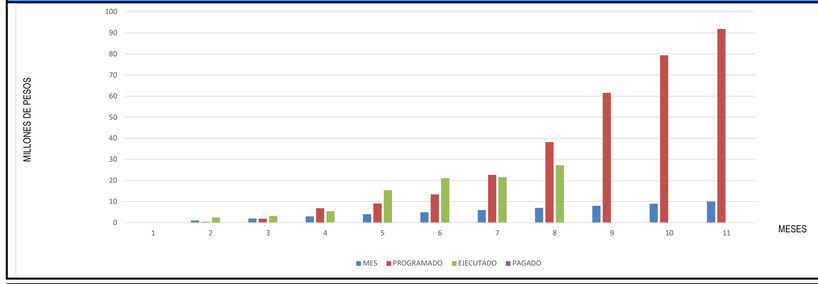

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En el presente informe se evalua el avance de obra de acuerdo a la reprogramación presentada por el Contratista mediante oficio OF_CEDUSD_N.016 radicado el 02 de septiembre del presente año, teniendo en cuenta el plan de choque que propone el Contratista según los ajustes que surgieron en los diseños hidrosanitarios y eléctrico. Durante la ejecución de las labores en el mes del presente informe, Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el septimo mes de ejecución, se lleva un atraso del 10,99%, que se muestra en mayor proporción en el capítulo 8. Carpintería metálica. Por lo anterior la Interventoría recomienda al Contratista dar celeridad a las actividades que preceden a éste capítulo y cumplir con lo dispueto en la programación. El Contratista presentó afiliaciones del personal ingresado en el mes de septiembre, quedando pendiente la entrega de las planillas de seguridad social del mes de Septiembre-Octubre 2025.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		32
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría		4	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra		7	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora		18	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Elaborado: 10/10/2025
Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeacion e infraestructura	Total de Páginas: 3

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página 1 de 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	Director de obra:	JEISON ALEXANDER ZEQUEDA SANJUAN
Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	10/10/2025		

FOTOGRAFÍA Nº 1



Las imágenes muestran el proceso de excavación de los tanques ejecutado en sitio, incluyendo el replanteo del área, retiro de material vegetal, excavación mecánica y manual hasta la cota de diseño. Se evidencia el cumplimiento en las dimensiones, niveles y taludes, conforme a las especificaciones técnicas y planos constructivos del proyecto.

FOTOGRAFÍA Nº 2




Las imágenes muestran el proceso de armado de acero del tanque de rehúso realizado en sitio, que incluye el corte, doblado y amarre de varillas según planos estructurales, garantizando la correcta disposición del refuerzo en muros, losa y base del tanque. Se evidencia el cumplimiento en separaciones, anclajes y alineación, conforme a las especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes.

FOTOGRAFÍA Nº 3



Las imágenes muestran el proceso de fundida del fondo del tanque de almacenamiento realizado en sitio, que incluye la colocación del acero de refuerzo, formaletas y vaciado del concreto según el diseño estructural. Se evidencia el cumplimiento en la nivelación, compactación y acabado superficial, garantizando la resistencia y estanqueidad de la estructura conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

FOTOGRAFÍA Nº 4

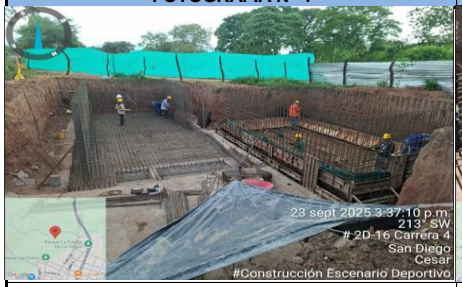

La imágen muestra el proceso de armado de acero de refuerzo de los tanques, que comprende el corte, doblado, amarre y disposición del acero en muros, losas y bases conforme a los planos estructurales. Se evidencia el cumplimiento en separaciones, anclajes y alineación del refuerzo, garantizando la resistencia estructural y la calidad del proceso constructivo según las especificaciones técnicas del proyecto.

FOTOGRAFÍA Nº 5



La imágen muestra el proceso de encofrado del fondo del cuarto de máquinas, que incluye la instalación y ajuste de formaletas de madera o metálicas para contener el concreto durante la fundida. Se evidencia el correcto alineamiento, nivelación y rigidez del encofrado, asegurando la precisión dimensional y la calidad estructural conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

FOTOGRAFÍA Nº 6



Se aprecia la limpieza de los tanques inundados por aguas lluvias, realizada de manera espontánea ante la contingencia presentada en obra. Las labores incluyeron la extracción de agua, retiro de sedimentos y saneamiento del área afectada, garantizando la seguridad del personal, la preservación de la estructura y la continuidad de las actividades constructivas conforme a las buenas prácticas técnicas del proyecto.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO:	**Fecha: 19/11/2021**
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	jueves, 9 de octubre de 2025	**MES No.**	7	INFORME DEL	10/09/2025	AL	9/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA			**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**			
CONTRATO No.:	004 DE 2024		CONTRATO No.:	033 DE 2025		
PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00		PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00		
FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2025		FECHA DE INICIO:	lunes, 10 de marzo de 2025		
SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A		SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A		
PRÓRROGA No. 1 :	30 abril de 2025		PRÓRROGA No. 1:	30 abril de 2025		
REINICIO No. Y FECHA:	N/A		REINICIO No. Y FECHA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 de febrero de 2026		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 de febrero de 2026		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS):	336,00		PLAZO ACTUALIZADO:	336,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	213	EQUIVALE AL: 63%	PLAZO TRANSCURRIDO:	213	EQUIVALE AL:	63%
VALOR INICIAL :	$ 518.496.955,00		VALOR INICIAL :	$ 13.358.523.629,68		
VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A		VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A		
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -		VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -		
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -		VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 518.496.955,00		VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	$ -		VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 518.496.955,0		VALOR POR PAGAR:	$ 13.358.523.629,68		
INTERVENTOR O CONSULTOR:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25		CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	27/12/2024	27/12/2025	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	28/01/2025	28/01/2026	$ 2.671.704.725,94
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	27/12/2024	27/06/2028	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	28/01/2025	28/07/2028	$ 667.926.181,48
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	27/06/2025	27/06/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2030	$ 4.007.557.088,90
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2027	$ 2.671.704.725,94
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	28/01/2025	28/07/2025	$ 771.750.000,00

2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025		**SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025**	
SUSPENSIÓN No.:	DE FECHA:	SUSPENSIÓN NO.:	DE FECHA:
PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025	PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025
MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 11/03/2025	MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 13-03-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					**CONTRATO DE OBRA**				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	31/03/2025	10/08/2026	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	$ 2.671.704.725,94
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	31/03/2025	10/02/2029	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2029	$ 667.926.181,48
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	8/09/2025	8/09/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	$ 4.007.557.088,90
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	$ 2.671.704.725,94
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	10/03/2025	7/02/2026	$ 771.750.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONCEPTO	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**
TOTAL PAGADO				**TOTAL PAGADO**			

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1. El contratista continúa con las actividades preliminares de localización y replanteo con equipos topográficos
2. Instalación de relleno seleccionado en cancha
3. Solado de viga de cimiento de cerramiento y solado de taques y cuarto de máquinas
4. Armado de acero de refuerzo de cerramiento perimetral, vigas de superiores y losas de graderias.
5. Armado de plataformad de graderias
5. Instalación de piso en loseta de cemento
6. Construcción de Cárcamo de aguas lluvias
7. Fundida del fondo del taque de almacenamiento
8. instalación de red sanitaria de 6" y conexión con el punto de descarga
9. Construcción de manholes para red sanitaria
10. Instalación de Transformador y protecciones, retenida, puesta a tierra y tendidode cables.
11. PGIO

4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	**ACUMULADO**		**% DE AVANCE OBRA EJECUTADO**			**ACUMULADO**		**% DE ATRASO ACUMLADO**	
	38,24%					**27,25%**		**10,99%**	
CAPITULOS	**INICIO**	**FIN**	**DURACIÓN (DIAS)**	**% TOTAL**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**% ATRASO**	**FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO**	**DÍAS DE ATRASO**
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 10 de marzo de 2025	miércoles, 5 de noviembre de 2025	240	0,76%	**0,66%**	0,66%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	domingo, 30 de marzo de 2025	domingo, 4 de enero de 2026	280	13,05%	**10,94%**	9,77%	1,17%	EN EJECUCIÓN	0
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	miércoles, 9 de abril de 2025	domingo, 1 de febrero de 2026	298	17,59%	**9,18%**	6,35%	2,83%	EN EJECUCIÓN	0
MAMPOSTERIA	jueves, 21 de agosto de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	166	0,60%	**0,16%**	0,23%	-0,07%	EN EJECUCIÓN	0
CARPINTERIA METALICA	martes, 8 de julio de 2025	domingo, 25 de enero de 2026	201	19,76%	**5,64%**	6,54%	-0,90%	EN EJECUCIÓN	0
OBRAS DE URBANISMO	martes, 29 de julio de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	189	12,10%	**0,84%**	0,66%	0,18%	NO HA INICIADO	0
ACABADOS	lunes, 6 de octubre de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	120	2,30%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	viernes, 9 de mayo de 2025	domingo, 11 de enero de 2026	247	20,73%	**8,02%**	0,39%	7,63%	EN EJECUCIÓN	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	miércoles, 30 de abril de 2025	domingo, 18 de enero de 2026	263	10,50%	**1,33%**	1,32%	0,02%	EN EJECUCIÓN	0
CERTIFICACION Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS	miércoles, 26 de noviembre de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	69	0,31%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	lunes, 10 de marzo de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	330	2,31%	**1,47%**	1,34%	0,13%	EN EJECUCIÓN	0
TOTAL				**100,00%**	**38,24%**	**27,25%**	**10,99%**		0

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN		**ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO**
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2026	Las actividades que marcar atraso en el presente informe se encuentra mayormente en el capítulo 8 SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, y en menor proporción en el capítulo 3. Estructuras en concreto y 2. Movimiento de tierras. Se solicita al Contratista emplear jornadas extendidas para superar el atraso presentado y disponer en obra los recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto
ATRASO (DIAS):	37	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2026	

OBSERVACIONES:


En el presente informe se evalua el avance de obra de acuerdo a la reprogramación presentada por el Contratista mediante oficio OF_CEDUSD_N.016 radicado el 02 de septiembre del presente año, teniendo en cuenta el plan de choque que propone el Contratista según los ajustes que surgieron en los diseños hidrosanitarios y eléctrico. Durante la ejecución de las labores en el mes del presente informe, Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el septimo mes de ejecución, se lleva un atraso del 10,99%, que se muestra en mayor proporción en el capitulo 8. Carpintería metálica. Por lo anterior la Interventoría recomienda al Contratista dar celeridad a las actividades que preceden a éste capítulo y cumplir con lo dispuesto en la programación. El Contratista presentó afiliaciones del personal ingresado en el mes de septiembre, quedanod endiente la entrega de las plnaillas de seguridad socialdel mes de Septiembre-Octubre 2025.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO: **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**	**Fecha: 19/11/2021**

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	jueves, 9 de octubre de 2025	**MES No.**	7	INFORME DEL	10/09/2025	AL	9/10/2025

***** INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERA, TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DILIGENCIADOS EN CASO DE NO TENER OBSERVACIONES, INDICARLO O COLOCA N/A SEGÚN SEA EL CASO.**

CURVA DE AVANCE

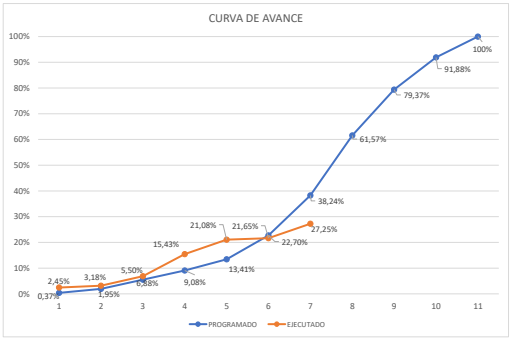

5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

a. CRONOGRAMA:

A la fecha el contratista presenta un atraso en el cronograma de obra del 10,99%.

b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ha ejecutado las actividades con personal capacitado y tecnicamente bien ejecutados. El Contratista no ha realizado la entrega de los resultados de laboratorio del concreto

c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En lo correspondiente a la parte administrativa del contrato, el contratista no realizó la entrega de la seguridad social de los empleados administrativos y mano de obra no calificada.

d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:

El contratista cuenta con la disponibilidad del recurso humano neceario para la ejecucion del contrato y sin embargo se evidencia que requiere mayor fluidez en los suministros de materiales del sistema de riego e hidrosanitarios necesarios para el correcto desarrollo del contrato dentro de las actividades según la programación.

e. EJECUCIÓN FINANCIERA:

A la fecha no se registra avance financiero del contrato

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se evidencia que los trabajadores no cuentan con dotación completa, no realizan el uso correcto de los EPPs y realizan labores que generan riesgos sin la debida precausión, sin portar los elementos para prevenir accidentes, como barbuquejos, cascos, guantes, arnes de seguridad, línea de vida, botas de seguridad y protectores auditivos. Por lo anterior la Interventoría mediante oficio CISD026 del 03 de octubre del 2025, solicitó al Contratista tomar acciones correctivas para las labores de trabajo desarrolladas en la obra, siendo éste un incumplimiento en las condiciones de Seguridad Integral y un incumplimiento al contrato de obra.

No. DE INCIDENTES:	**0**	**No. ACCIDENTES:**	**1**

FECHA Y REPORTE DE EVENTOS

El día 02 de Octubre se presentó accidente de trabajo, siendo las 10:54 am el trabajador Evelio López se encontraba trasladando unas chazas de madera, y una chaza resvala de sus manos y cae sobre sus pies, generando una fractura el pie. En el Hospital de dan traslado a Valledupar para valoración con ortopedista, donde le inmobilizan el pie y le generan incapacidad por 30 días.

g. ASPECTO AMBIENTAL:

El Contratista realizó la entrega del Informe del PGIO de los meses de Julio a Agosto de 2025 el día 17-09-2025. Se le solicito al contratista la entrega del informe mensual del PGIO CISD023 del 4-09-2025 y a la fecha de entrega del presente informe (14-10-2025) no ha sido entregado.

h. ASPECTO SOCIAL:

El Contratista realizó la entrega de las actas de vecindad el día 18 de junio de 2025 vía correo eléctronico.

i. ASPECTO JURIDICO:

Se encuentra pendiente la aprobación por parte del Municipio de las pólizas de obra e interventoría, de acuerdo al Adicional No. 01

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Entregar el Informe mensual del PGIO del mes de Septiembre 2025	Contratista	

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha se identificó actividades no previstas en el capítulo eléctrico, por cambio de luminarias en zonas duras del parque. La Interventoría continúa a la espera de la entrega del ajuste al diseño, APUs y balance del presupuesto, así como también acta modificatoria donde se realice el balance de mayores y menores cantidades.

8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR

Nota: (Relacionar todo el personal y recursos utilizados durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal y recursos efectivamente utilizados. Adjuntar los debidos soportes para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD
		JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
		HILLARY CARRILLO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	1
		LUIS FELIPE VEGA PEDROZO	PROFESIONAL SST	1
		JOSE JAIRO BRITO BRITO	TOPOGRAFO	1
		MARIO CUJIA BARRERA	CADENERO	1
		MICHELLE MURGAS	APOYO SST	1

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

La Interventoría evidencia en el registro de avance del proyecto un atraso superior al 10%, evidenciando que el Contratista no está cumpliendo con la reprogramación entregada con el plan de choque, y no está llevando a cabo las jornadas extendidas de trabajo para cumplir con el avance programado.

10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San Diego - Cesar, a los 9 días del mes de Octubre de 2025

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR

NOMBRE: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR ALCALDIA : LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO

CARGO SUPERVISOR ALCALDIA : SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Deporte	PROCESO:	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 7	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN DE TANQUES



COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE DE TANQUES



COLOCACIÓN DE SOLADO EN TANQUES



ARMADO DE ACERO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO



ARMADO DE ACERO DEL TANQUE DE REHUSO



FUNDIDA DE FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO



REVISIÓN DE INTERVENTORÍA



REVISIÓN DE VERTICALIDAD DE LA FORMALETA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE TANQUES



REVISIÓN DE INTERVENTORÍA



ENCOFRADO DE FONDO DEL CUARTO DE MÁQUINAS



LIMPIEZA DE TANQUES INUNDADOS POR LAS AGUAS LLUVIAS

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 7	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
EXTENSIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN CANCHA	CHARLA DE SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO	ARMADO DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS
		
CONEXIÓN DE AGUAS SANITARIAS	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" PARA CONECTAR AL PUNTO DE DESCARGA	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6 SANITARIA CORRUGADA
		
FUNDIDA DEL FONDO DE MANHOLE	FUNDIDA DE MANHOLE	EXCAVACIÓN DE RED ELÉCTRICA
		
TENDIDO DE CABLES EN POSTES INSTALADOS	INSTALACIÓN DE LOSETA EN CONCRETO	INSTALACIÓN DE LOSETA EN CONCRETO

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URB
CR 9 # 2 C - 71 BR CENTRO
SAN DIEGO - CESAR

EVD200670

CUENTA No. 900-88467-7
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	13,978,944,663.79
+ 30 CREDITOS	24,657,534.30
- 1 DEBITOS	20,292,839.00
SALDO ACTUAL	13,983,309,359.09
SALDO PROMEDIO	13,977,708,970.80

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A731283	0.00	821,917.81	13,979,766,581.60
03	INTERESES LIQUIDADOS	A563472	0.00	821,917.81	13,980,588,499.41
04	INTERESES LIQUIDADOS	A546017	0.00	821,917.81	13,981,410,417.22
05	INTERESES LIQUIDADOS	A273075	0.00	821,917.81	13,982,232,335.03
08	INTERESES LIQUIDADOS	A308705	0.00	821,917.81	13,983,054,252.84
08	INTERESES LIQUIDADOS	A308823	0.00	821,917.81	13,983,876,170.65
08	INTERESES LIQUIDADOS	A308535	0.00	821,917.81	13,984,698,088.46
09	INTERESES LIQUIDADOS	A736529	0.00	821,917.81	13,985,520,006.27
10	INTERESES LIQUIDADOS	A346945	0.00	821,917.81	13,986,341,924.08
11	INTERESES LIQUIDADOS	A122331	0.00	821,917.81	13,987,163,841.89
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A802743	20,292,839.00	0.00	13,966,871,002.89
12	INTERESES LIQUIDADOS	A799536	0.00	821,917.81	13,967,692,920.70
15	INTERESES LIQUIDADOS	A768658	0.00	821,917.81	13,968,514,838.51
15	INTERESES LIQUIDADOS	A768090	0.00	821,917.81	13,969,336,756.32
15	INTERESES LIQUIDADOS	A768106	0.00	821,917.81	13,970,158,674.13
16	INTERESES LIQUIDADOS	A095121	0.00	821,917.81	13,970,980,591.94
17	INTERESES LIQUIDADOS	A841793	0.00	821,917.81	13,971,802,509.75
18	INTERESES LIQUIDADOS	A626988	0.00	821,917.81	13,972,624,427.56
19	INTERESES LIQUIDADOS	A182134	0.00	821,917.81	13,973,446,345.37
22	INTERESES LIQUIDADOS	A254960	0.00	821,917.81	13,974,268,263.18
22	INTERESES LIQUIDADOS	A254904	0.00	821,917.81	13,975,090,180.99
22	INTERESES LIQUIDADOS	A254936	0.00	821,917.81	13,975,912,098.80
23	INTERESES LIQUIDADOS	A025611	0.00	821,917.81	13,976,734,016.61
24	INTERESES LIQUIDADOS	A761052	0.00	821,917.81	13,977,555,934.42
25	INTERESES LIQUIDADOS	A481153	0.00	821,917.81	13,978,377,852.23
26	INTERESES LIQUIDADOS	A460829	0.00	821,917.81	13,979,199,770.04
29	INTERESES LIQUIDADOS	A509605	0.00	821,917.81	13,980,021,687.85
29	INTERESES LIQUIDADOS	A508966	0.00	821,917.81	13,980,843,605.66
29	INTERESES LIQUIDADOS	A509030	0.00	821,917.81	13,981,665,523.47
30	INTERESES LIQUIDADOS	A749115	0.00	821,917.81	13,982,487,441.28
30	INTERESES LIQUIDADOS	A818240	0.00	821,917.81	13,983,309,359.09

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028560-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO
MOVIMIENTO DEL LIBRO DE BANCOS

CUENTA N°:	900-88467-7 - CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO
BANCO:	OCCIDENTE

MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha	Comp	item	tipo	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
31/08/2025				Saldo que viene a 31 de Agosto 2025	0	0	13.978.944.663,79
19/08/2025				Devolucion de Rendimientos Financieros		20.292.839,00	20.292.839,00
30/09/2025			NT	intereses	24.657.534,30		24.657.534,30
SALDO A FIN DE MES					**24.657.534,30**	**20.292.839,00**	**13.983.309.359,09**

Contador
Tp : 340495-T

CONVENIO COID-846-2024 - MIN DEPORTE

NIT. 800086623

CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE -2025

BANCO: **BANCO DE OCCIDENTE** CUENTA CORRIENTE: 900000-88457-7 VALOR A CONCILIAR: (0,00)

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	13.978.944.663,79	SALDO ANTERIOR LIBROS:	13.978.944.663,79
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	13.983.309.359,09	SALDO ACTUAL LIBROS:	13.983.309.359,09
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	13.983.309.359,09	SALDO CONCILIADO LIBROS:	13.987.674.054,39

Abonos del banco no contabilizados en libros			Cargos del banco no contabilizados en libros		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
30-sep	ABONO INTERES	24.657.534,30	12-sep	PAGO DE INTERESES DE AGOSTO	20.292.839,00
				Iva en Transaciones	
				Comis Recaudos Caja Nacional	
				Cuota de manejo	
				Retenciones	
				Gravamen Movimiento Financier	
				Debito por rechazo	
TOTAL: (1)		24.657.534,30	TOTAL: (2)		20.292.839,00

Abonos no registrados por el banco			Cargos no registrados por el banco		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		0,00	TOTAL: (4)		0,00

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	13.983.309.359,09	Saldo según Extracto	13.983.309.359,09
+ Total (1)	24.657.534,30	- Total (1)	(24.657.534,30)
- Total (2)	(20.292.839,00)	+ Total (2)	20.292.839,00
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	**13.987.674.054,39**	**Saldo en Libros**	**13.978.944.663,79**

8.729.390,60

LUIS FELIPE SOCARRAS BARROS
CONTADOR

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE SAN DIEGO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800096623
Generado por: ELVIA ELENA SOTO ISEDA

A continuación el detalle de: **Transacciones Autorizadas - Autorizar**

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✔ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
No. Producto	*****4677
Valor a Pagar	$24,657,535.00
Factura	97509
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
Fecha Transacción	2025/10/15

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
Generado por: **MADELCY MEJIA VIDES**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS GENERADOS
Factura	97509
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$24,657,535.00
Fecha Transacción	2025/10/15
Estado	Transacción pendiente por ser autorizada.
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
Nro. Producto	*****4677

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

AXA COLPATRIA

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: **NUEVA E.P.S. S.A.**	CÓDIGO EPS: **EPS037**	ARL A LA QUE ESTA AFILIADO: **COLPATRIA**	CÓDIGO ARL: **4**
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO: **PORVENIR**	SEGURO SOCIAL: SI [ ] NO [X]	CUAL? **PORVENIR**	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL: **003**

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: (1) EMPLEADOR [ ] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]

SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: **Construcción de edificios residenciales, incluye la construcción de todo tipo de edificios residenciales, casas y edificios, montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas, construcciones prefabricadas, reforma o** — CÓDIGO: **5411101**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT [ ] CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **1065593022**	
DIRECCIÓN: **CLL 26 BIS NO 39 B 32**	TELÉFONO: **3164861310**	FAX: **0**	DEPARTAMENTO: **CESAR** — CÓDIGO: **20**
CORREO ELECTRÓNICO (MAIL): **DANIUSKALARA@GMAIL.COM**	MUNICIPIO: **VALLEDUPAR**	CÓDIGO: **20001**	ZONA: U [X] R [ ]
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: **NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO**	¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI [ ] NO [X]		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: **Construcción de edificios residenciales, incluye la construcción de todo tipo de edificios residenciales, casas y edificios, montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas, construcciones prefabricadas, reforma o renovación de estructuras reside**	CÓDIGO: **5411101**		
DIRECCIÓN: **SAN DIEGO**	TELÉFONO: **6055610576**	FAX: **6055610576**	
DEPARTAMENTO: **CESAR**	CÓDIGO: **20**	MUNICIPIO: **SAN DIEGO**	CÓDIGO: **20750** — ZONA: U [X] R [ ]

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ] — CARGO: **AYUDANTE DE OBRA**

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para Independiente): — CÓDIGO: **0**

NOMBRE COMPLETO: **EVELIO LOPEZ**	FECHA DE NACIMIENTO: **09/11/1970**	SEXO: M [X] F [ ]	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **77038026**	TELÉFONO: **3164861310**	FAX:
DIRECCIÓN: **SAN DIEGO**	DEPARTAMENTO: **CESAR** — CÓDIGO: **20**	MUNICIPIO: **SAN DIEGO** — CÓDIGO: **20750**	ZONA: U [X] R [ ]
OCUPACION HABITUAL: **Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines**	CÓDIGO: **000712**	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **23 días - 000 meses**	
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: **10/09/2025**	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL): **1423500.00**	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]	

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: **02/10/2025**	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS): **11:00**	DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: **Jueves**	JORNADA EN QUE SUCEDE: (1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? (1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **PRESENCIAL**	¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA? (1) SI [ ] (2) NO [X]	
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)	CÓDIGO	TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE: **04 horas - 00 minutos**	

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VilOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR? (1) SI [ ] (2) NO [X]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE: **CESAR**	CÓDIGO: **20**	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE: **SAN DIEGO**	CÓDIGO: **20750**
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA [X] (2) FUERA DE LA EMPRESA [ ]			

INDIQUE CUAL SITIO:
- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [X] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [ ] (9) OTRO:

TIPO DE LESIÓN:
- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [ ] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclución o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [X] (55) GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:
- [ ] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [ ] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TORAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [X] (5.56) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):
- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [X] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [ ] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (44) RADIACIONES
- [ ] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:
- [ ] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [X] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [ ] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO:

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

SIENDO LAS 11: 00 AM ME ENCONTRABA REALIZANDO LAS ACIVIDADES HABITUALES COLOCANDO UNAS CHAZAS SE ME CAYO UNA DE ESTAS GOLPENADO DIRECTAMENTE EL PIE DERECHO, SENTI UN FURTE DOLOR SOBRE TODO EN LA REGION DEL DEDO MIÑIQUE O QUINTO DEDO.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE — HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI [X] NO [ ]

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
CARLOS EDUARDO NOCHE MEJIA	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	**1062403583**	**AYUDANTE DE OBRA**
	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
HILMELDA KARINA AMAYA ALARZA	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	**1120749698**	**SISO**

FIRMA o SELLO:

AXA COLPATRIA reinventando los seguros — SEGUROS DE VIDA ARL

02/10/2025

RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. **20250067735**

FECHA DE RECEPCIÓN: **02/10/2025**

AXA COLPATRIA ARL

Septiembre 09 de 2025 - Martes

- Estado del tiempo: Nublado
- Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) operador, (2) oficiales, (1) volquetero, (8) Ayudantes, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Ing. Ambiental.
- Personal eléctrico: (2) oficiales
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topografo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) Volquera, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (4) Mezcladoras, (1) canguro, (1) Rana, (1) vibrador de concreto,
- Actividades: * Desencofrado de vigas de gradiva.
  * Limpieza de charcas.
  * Instalación de tubería para puntos de iluminación en zona del parque infantil.
  * Continua excavación de rangues con retro excavadora y retiro y disposición interno en obra para rellenar excavación en la anterior ubicación del rangue.

Interventoria

Septiembre 10 de 2025 - Miercoles

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Ambiental, (1) cadenero, (1) topógrafo, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) operador, (1) SISO, (1) Aux SISO, (2) oficiales, (1) volquetero, (8) Ayudantes,
- Personal eléctrico: (2) oficiales
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de Topografia, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (4) mezcladoras, (1) Rana, (1) canguro, (1) volquera, (1) vibrador de concreto

- Actividades: * Se realiza instalación de tubería eléctrica para acometida de luminarias en zona de parque infantil.
  * Se realizan perforaciones en viga de cimiento de cerramiento para construcción de muro de contención perimetral en concha.
  * Armado de plataformas para vigas diagonales de gradería.
  * Extensión de relleno sobre la concha con motoniveladora

V°B° Interventoría

Septiembre 11 de 2025 - Jueves

- Estado del tiempo: Soleado. lluvia intensa de 9:45pm a 11:30pm.
- Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1) Ing) (1) topografo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) oficial, (2) Ayudantes, (6) operadores, (1) conductor volquera,
- Personal eléctrico: (1) Ing. eléctrico, (2) oficiales
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Aux. SISO, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (2) minicargador, (1) mini excavadora, (4) mezcladoras, (1) Rana, (1) compresor, (1) volqueta, (1) Vibrador de concreto.
- Actividades: * Se realiza nivelación y compactación con rana en tanques sobrantes.
  * Fundida de solado de tanque de almacenamiento.
  * Instalación de transformador del proyecto.
  * Continua perforaciones en viga de cimiento de cerramiento para construcción de muro de contención permanente de la concha.
  * Se realiza reparación de 2 minicargadores en obra durante la mañana, quedando operativos en la tarde.

V°B° Interventoría

Septiembre 12 de 2025 - viernes.
- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora inicio: 9:00 Am. - Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1) topografo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) Ing civil., (1) cond. volqueta, (1) maestro, (3) Ayudantes, (1) Ing. Ambiental, (1) social.
- personal electrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) miniexcavadora, (1) volquete, (4) mezcladoras, (2) minicargadores, (1) Rana, (1) canguro, (1) vibrador de concreto, (1) vibrocompactador.
- Actividades: * continua fundida de solado en tanques, donde se construirá el desarenador.
* se continua perforaciones de viga de cerramiento perimetral para construcción de muro de contención en cerramiento perimetral de la cancha.
* se presenta daño persistente en 1 minicargador por sobrecalentamiento. Queda operativo en la tarde.

Interventoria.

Septiembre 13 de 2025 - sabado.
- Estado del tiempo: soleado, tarde nublada
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 12:00pm
- Personal obra: (1) topografo, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) Maestro, (10) Ayudantes, (2) oficiales.
- Personal Eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (4) mezcladoras, (1) miniexcavadora, (1) canguro, (1) Rana, (1) vibrador de concreto, (1) vibrocompactador.
- Actividades: * Fundida de solado de cuarto de maquinas de los tanques.
* Continua perforaciones en viga de cerramiento perimetral

Powered by CamScanner

para construcción de muro de contención.
* nivelación de relleno seleccionado en cancha. con motoniveladora.
* Se realiza compactación de Relleno seleccionado en cancha.

V°B° Interventoría

Septiembre 14 de 2025 - Domingo.
No se realizan labores.
Estado del tiempo: mañana soleado, tarde nublada.

V°B° Interventoría

Septiembre 15 de 2025 - Lunes.
Estado del tiempo: mañana soleado, tarde nublada.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) Maestro, (2) operadores, (1) Almacenista, (1) SISO, (5) oficiales, (8) Ayudantes,
- Personal Eléctrico: (2) oficiales, (1) Ing. eléctrico.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) SISO, (1) Topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (4) mezcladoras, (1) miniexcavadora, (1) cargador, (1) rana, (1) vibrador de concreto, (1) vibrocompactador, (2) minicargadores
- Actividades: * Fundida de solado de tanque desarenador
* Armado de acero de refuerzo en tanque de almacenamiento
* Continua perforación de viga de cerramiento para muro de contención.
* Adecuación de cubierta en casera de campamento tipo oficina.
* Nivelación de relleno seleccionado en cancha

con motoniveladora.

- Se realiza recorrido en zona de conexión de red sanitaria y se replantea el trazado teniendo en cuenta el predio existente y futura construcción de vivienda del Sr. Martín Padilla.

V°B°
Interventoría

Septiembre 16 de 2025 - Martes.

- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublada
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) maestro, (4) oficiales, (8) ayudantes.
- Personal Eléctrico: (2) oficiales, (1) Ing eléctrico.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) miniexcavadora, (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (2) minicargadores, (2) Reina, (1) canguro, (1) vibrocompactador, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto
- Actividades: * Se realiza excavación de red sanitaria en punto de descarga, hacia el proyecto. se realiza empalme de tubería hacia el manhole a una profundidad de 1.50 m. en tubería de 8".
  * Continua armado de acero de refuerzo del tanque de almacenamiento.
  * Continua adecuación de caseta provisional como campamento.
  * Continua perforación de viga de cerramiento para muro de contención.
  * Ingresa acero de muro de cerramiento y formaleta para la construcción de manhole.

V°B°
Interventoría

Septiembre 17 de 2025 - Miercoles.

- Estado del tiempo: Mañana soleando
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1)Topografo, (1) SISO, (1)Aux SISO, (1)cadenero, (1)Almacenista, (1) maestro, (2)operadores, (7) oficiales, (8)Ayudantes, (1)conductor.
- Personal eléctrico: (2) oficiales
- Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1) coordinador, (1)SISO, (1)Topógrafo, (1)cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1)Retroexcavadora, (1)motoniveladora, (1)vibrocompactador, (1)miniexcavadora, (2)minicargador, (2) lanza, (1) canguro, (4)mezcladoras, (1)vibrador de concreto.
- Actividades: * Ingresa acero de refuerzo del tanque
  * Continua Instalación de tubería sanitaria de 6" del punto de descarga hacia el proyecto.
  * Continua perforación para anclajes en la viga de cimiento del cerramiento perimetral de cancha
  * continua armado de acero de refuerzo del tanque de almacenamiento e inicia armado de acero del tanque desarenador.
  * los electricos realizan traslado del material eléctrico acopiado junto a casa existente en el proyecto, hacia la parte de atrás del cuarto eléctrico.

V°B° Interventoria

Septiembre 18 de 2025 - Jueves.

- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1)Ing. Ambiental, (1)topografo, (1)cadenero, (1)SISO, (1)Aux SISO, (1)Almacenista, (2)operadores, (1)maestro, (7)oficiales, (8)Ayudantes,
- Personal interventoria: (1)Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1)topografo, (1)cadenero.

Powered by CamScanner

- Equipos: Equipo de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) miniexcavadora, (2) minicargadores, (1) Rana (2) canguro, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora
- Actividades: * Continua excavación e instalación de tubería sanitaria de 6" corrugada. hacia graderas.
  * Continua armado de acero de refuerzo de tanque con desarenador.
  * Instalación de formaleta en base del tanque de abastecimiento.
  * Ingresan 50 bultos de cemento.
  * Llego epóxico con pistola de inyección para anclajes del muro de contención.
  * Limpieza y adecuación de excavación para construcción de manholes.
  * Instalación de acero de refuerzo con epoxico en viga cimiento de cerramiento.

V°B°
Interventoría

Septiembre 19 de 2025 - viernes

- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora: 7:00 Am * Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (2) operadores, (1) topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (8) ayudantes, (7) oficiales
- Personal eléctrico: (1) oficial, (4) operadores de carro canasta.
- Interventoría: (1) Ing Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
- Equipos: (1) motoniveladora, Equipos de topografía, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) miniexcavadora, (1) Retroexcavadora, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) canguro,
- Actividades: * Armado de acero de refuerzo de tanque desarenador.
  * Armado de carpintería para fundida de tanque
  * Encofrado y fundida de manholes de red sanitaria de Ø 6".

Powered by CamScanner

* Tendido de la red de media tensión en 3 postes en la parte extrema del proyecto.
* Nivelación de relleno seleccionado en cancha
* Continua perforación para anclajes en muro de cerramiento.

V°B°
Interventoría

Septiembre 20 de 2025 - Sábado.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicial: 7:00 Am. - Hora final: 3:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Ambiental, (1) topografo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) Maestro, (1) conductor, (8) Ayudantes, (4) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) mini excavadora, (2) mini cargador, (1) retroexcavadora, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) lana, (2) canguros.
- Actividades: * Continua armado de acero de refuerzo del tanque desarenador.
* Continua construcción de manhole de red sanitaria de 6".
* Se realiza fundida de 1 manhole de 1.5m de altura. Posterior a la fundida se presenta fallas en segura de la formaleta. Y se procede con la limpieza.
* Ingresa piso en losera de cemento.
* Ingresa hierro fulante del tanque subterraneo. (Acero de refuerzo figurado).

V°B°
Interventoría

Septiembre 21 de 2025 - Domingo
- Estado del tiempo: Mañana soleado. PM de nublado.

No se realizan labores.

V°B°
Interventoría

Septiembre 22 de 2025 - Lunes.
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 pm.

Personal obra: (1)topógrafo (1)cadenero, (1)SISO, (1)Ax SISO, (1)Almacenista, (1)operador, (1)maestro, (5)oficiales, (6)Ayudantes.
- Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1)topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: (1) Motoniveladora, Equipos de topografía, (1) vibrador de concreto, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) Rana, (2) canguro, (4) mezcladoras, (1) Retroexcavadora, (1) volqueta. (1) miniexcavadora
- Actividades: * Continua acero de refuerzo del tanque subterráneo
  * Armado de formaleta del manhole de tubería sanitaria 6".
  * Ingresa piso en losera.
  * Fundida de manhole a 100m de la alcantarilla caja del proyecto.

V°B°
Interventoría

Septiembre 23 de 2025 - Martes
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00Am
- Hora final: 5:00pm
- personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Ing Ambiental, (2)SISO, (1)maestro, (1)operador, (8)oficiales, (9)Ayudantes, (1)topógrafo (1)cadenero
- personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero.

Equipos: Equipos de topografía, (1) minicargador, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora,

Powered by CamScanner

(1) vibrocompactador, (1) vibrador de concreto, (4) mezcladoras, (1) Rana, (2) canguro, (1) mini retroexcavadora, (1) cortadora.

•Actividades: * Desencofrado de manhole fundido el día de ayer.
* Fundida de manhole en acometida sanitaria de 6".
* Trazado de gruderas en SUPERT en vigas diagonales superiores.
* Ingreso piso en losera de cemento.
* Continua armado de acero y colocación de formaleta en tanque de almacenamiento.
* Armado de acero de refuerzo en tanque desarenador.
* Instalación de acero para muro de contención sobre viga de cerramiento perimetral.

V°B°
Interventoría.

Septiembre 24 de 2025 - Miercoles

•Estado del tiempo: soleado.

•Hora inicio: 7:00am. •Hora final: 5:00pm

•Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) operador, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Maestro, (8) oficiales, (9) Ayudantes.

•Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.

-Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) mini excavadora, (1) vibrocompactador, (1) vibrador de concreto, (4) mezcladoras, (1) Rana, (2) canguro, (1) cortadora.

•Actividades: * Continua armado de acero de refuerzo del tanque desarenador.
* Instalación de acero de refuerzo en vigas de cerramiento de cerramiento perimetral para muro.
* Encofrado de manhole y fundida de la acometida sanitaria de 6".
* Fundida de placa de fondo del tanque de 30 cm de espesor y 50cm de muro. Se realiza vibrado del concreto, se toman 4 cilindros de muestra del concreto

Premezclado.

Ing V°B°
Interventoría.

Septiembre 25 de 2025 - jueves.
- Estado del tiempo: parcialmente nublado.
- Hora inicio: 7:00AM. - Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (1) Maestro, (8) oficiales, (9) Ayudantes.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Minicargador, (1) Miniexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) Bana, (1) Cranguro, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora.
- Actividades: * Continua armado de acero de refuerzo de tanque de Rehuso. e instalación de formaleta de la base.
  * desencofrado de base del tanque de almacenamiento.
  * Trazado del tanque cuarto de bombas
  * Instalación de acero de refuerzo de muro de contención sobre viga perimetral de concha.
  * Acople del tubo de acometida sanitaria de 6" al manhole.

Ing V°B°
Interventoría.

Septiembre 26 de 2025 - viernes.
- Estado del tiempo: parcialmente nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final:
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) Cadenero, (1) operador, (1) Maestro, (8) oficiales, (9) Ayudantes
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.

Powered by CamScanner

- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini excavadora, (4) mezcladoras (2) canguros, (1) rana, (1) vibrador de concreto, (1) compactadora.
- Actividades: * Continua armado del acero de refuerzo del tanque de rehuso.
  * Fundida de tapa de manhole ubicado a 100 m de la última caja de registro del proyecto.
  * Excavación de espacio para bomba de succión en cuarto de máquinas.
  * Instalación de formaleta en muros del tanque de almacenamiento.
  * Se realiza comité de seguimiento con la alcaldía.
  * trazado de gaviones en SuperT, con manguera de nivel.

V°B°
INTERVENTORÍA


Septiembre 27 de 2025 - sábado.

- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am
- Hora final: 12:00 pm
- personal obra: (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (1) Maestro, (8) oficiales, (9) Ayudantes.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) Cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Minicargador, (1) Miniexcavadora, (4) mezcladoras, (2) canguros, (1) Rana, (1) vibrador de concreto, (1) compactadora.
- Actividades: * Continua armado de acero de refuerzo del tanque de abastecimiento. (rehuso).
  * Fundida de tapa) de manhole de tubería de 6".
  * Instalación de formaleta de muros del tanque de almacenamiento.

V°B°
INTERVENTORÍA.


Powered by CamScanner

Septiembre 28 de 2025= Domingo.
-Estado del tiempo: Nublado.
No se realizaron labores.



V°B°
Interventoría

Septiembre 29 de 2025- Lunes.
°Estado del tiempo: Soleado.
°Hora inicio: 7:00 Am. °Hora final: 5:00 pm
°Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Ing. Ambiental, (1) SISO, (1)Aux siso, (1)Almacenista, (1)operador, (1) topógrafo, (1)cadenero, (1) Maestro (7) oficiales, (9) Ayudantes.,
°Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)coordinador, (1) topógrafo, (1)cadenero.
-Equipos: (1)retroexcavadora, Equipos de topografía, (1) minicargador, (1)miniexcavadora, (1)vibrocompactador, (4)mezcladoras, (1) Rana, (2)canguros, (1)vibrador de concreto, (1)Motoniveladora. (1) compactadora
-Actividades: * Continua armado de acero de refuerzo del tanque de reboso
* Inicia armado de acero de refuerzo del cuarto de maquinas
* Fundida de tapas de manholes en obra, con acero de refuerzo y lámina en el borde.
* Inicia excavación de zanjas en zonas duras del parque biosaludable



V°B°
Interventoría

Septiembre 30 de 2025 - Martes
°Estado del tiempo: nublado. lluvia leve 5:00Am a 6:00Am.
° Hora inicio: 7:00 Am. ° Hora final: 5:00 pm.
°Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) Cadenero, (1) operador, (1) Maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes.
°Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador,

Powered by CamScanner

(1) Topógrafo, (1) cadenero.

- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (4) Mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) cunguras, (1) corrugadora.
- Actividades: * Continua excavación de cárcamo en zonas duras del parque biosaludable.
  * Continua armado de acero de refuerzo de cuarto de máquinas, e instalación de formaleta de la base. Instalación de cinta pvc.
  * armado de plataforma y demarcación de gradas en el segundo nivel de las gradas.
  * Ingresa piso en losera.

V°B°
Interventoría.

Octubre 01 de 2025 - Miercoles.

- Estado del tiempo: Nublado
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (2) operador, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Maestro, (6) oficiales, (8) Ayudantes, (4) oficiales de losera.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) siso, (1) Coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (5) Mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) cunguras, (1) corrugadora
- Actividades: * Continua excavación de cárcamo en zonas duras del parque biosaludable.
  * Armado de escalas de gradenas, instalación de soportes, madera para guardia y SUPORT.
  * Continua armado de acero de refuerzo del tanque de reburso
  * Inicia instalación de piso en losera en parque biosaludable.
  * Se realiza instalación de malla en forma de U en cárcamo en zona de parque biosaludable y se funde el fondo del cárcamo.
  * Se realiza excavación de viga de cimiento del

cerramiento perimetral de la cancha frente a parque biosaludable
*Ingresa piso en losera para acopio.



C/m V°B°
Interventoría.

Octubre 02 de 2025- Jueves.
*Estado del tiempo: nublado.
*Hora inicio: 7:00 Am. *Hora final: 5:00 pm
*personal obra: (1) Ing. ambiental, (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) Operadores, (4) oficiales, (9) Ayudantes, (2) oficiales losera, (2) Ayudantes losera, (1) conductor.
*Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
-Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) mini excavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) Volqueta, (2) canguros, (1) compactadora, (5) mezcladoras, (1) vibrador de concreto.
*Actividades: * Nivelación de excavación para viga de cimentación de cerramiento.
* Continua instalación de losera en concreto.
* Continua armado de plataforma para gradería.
* Instalación de formaleta para muro del escenario en zonas de juegos biosaludables.
* A las 10:54 Am ocurre un accidente laboral, el trabajador Evelio Lopez se encontraba realizando el traslado de formaleta (metálica) de madera (chazos). y al momento de bajarla al punto de acopio se le resbaló de las manos y le cae la formaleta sobre el pie derecho. El trabajador notifica a el área de seguridad de la obra, se procede a realizar el reporte a la ARL AXA colpatria y se ingresa al trabajador al hospital de San Diego. Al trabajador le realizan placa en el pie, donde se evidencia una fractura y el Hospital notifica a la ARL que requiere valoración con especialista en

ocupeda para definir el paso a seguir, y solicita la ambulancia a la ARL.

- Se realiza colocación de solado a viga de cimiento de cerramiento frente a parque biosaludable.

Ing. V°B°
Interventoría.

Octubre 03 de 2025 - viernes.

- Estado del tiempo: soleado, tarde lluvia intensa 3:30pm a 5:00pm
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final:
- Personal obra: (1)SISO, (1)Aux SSO, (1)Almacenista, (1)Maestro, (1)topografo, (1)cadenero, (2)operadores, (4)oficiales, (9)Ayudantes, (2)of. losera, (2)Ay. losera.
- Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)coordinador, (1)topógrafo (1)cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1)Retroexcavadora, (1)Motoniveladora, (1)vibrocompactador, (1)Minicargador, (1)miniexcavadora, (1)vibrador de concreto, (5)mezcladoras, (1)Pana, (2)canguros, (1)cortadora
- Actividades: * Continua armado de plataforma para graderias.
  * Continua instalación de losera en zona de parque biosaludable.
  * Instalación de formaleta en cárcamo en zona de parque biosaludable.
  * Excavación para rubera de cerramiento perimetral. y se realiza instalación de rubera.

  Se presenta fuerte aguacero continuo por dos horas aproximadamente, se presenta inundación de la excavación de los parques.

Ing. V°B°
Interventoría

Octubre 04 de 2025 - sábado.

- Estado del tiempo: soleado
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 4:00Pm
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1) topógrafo, (1)cadenero, (1)Almacenista,

Powered by CamScanner

(2)Operador, (1)Maestro, (2)Ayudantes, (2) of. losera, (2) Ay. losera. (1)Ing. Ambiental.
Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Miniexcavadora, (1) Minicargador, (1) Vibrador de concreto, (5) mezcladoras, (1) Rana, (1) motobomba (2) canguros, (1) cortadora, (1) planta, (1) bomba sumergible, (1) Hidrolavadora
- Actividades: * Continuan labores de instalación de losera en parque Biosaludable.
* Se realiza limpieza del tanque subterraneo (los 3 tanques)., evacuando el agua lluvia del día anterior. Se utilizó 2 bombas para el retiro de las aguas.
Debido al estado de inundación y barro en obra no se realizan más labores aparte de las mencionadas anteriormente.

V°B°
Interventoría

Octubre 05 de 2025 - Domingo.
- Estado del tiempo: Soleado
- Hora inicio: 7:00 Am - Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (2) ayudantes. (1) Ing. Ambiental.
- Personal Interventoría: (1) coordinador.
- Equipos: (1) planta eléctrica, (1) hidrolavadora, (1) motobomba, (1) bomba sumergible
- Actividades: * Se realizan labores de limpieza de los tanques de almacenamiento, cuarto de máquinas, y tanque de rebose para retirar el barro

V°B°
Interventoría

Powered by CamScanner

Octubre 06 de 2025 - Lunes

- Estado del tiempo: soleado, tarde nublado
- Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 5:00Pm
- Personal obra: (1) Ing. Ambiental, (1) Ing. Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) Aux. SISO, (1) maestro, (4) oficiales, (5) Ayudantes, (2) of. Losera, (1) Ay. losera, (2) operadores.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topografo, (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografía, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (1) planta eléctrica, (1) motobomba, (1) hidrolavadora, (1) bomba sumergible, (5) mezcladoras, (2) cunetas.
- Actividades: * Continua instalación de losera en parque bioseludable,
  * Continua construcción de gradenas
  * Limpieza de tanques, y cuarto de máquinas
  * Adecuación de terreno en la cancha.

Ing V°B°
Interventoría

Octubre 07 de 2025 - Martes

- Estado del tiempo: soleado, tarde nublada: lluvia leve 3:00Pm a 4:00Pm
- Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 7:00Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Maestro, (6) oficiales, (7) Ayudantes, (1) Cond. Volqueta.
- Personal Interventoría: (1) Ing Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topografo, (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografía, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) retroexcavadora, (1) miniexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (5) mezcladoras, (1) cortadora, (2) cunetas, (1) planta eléctrica, (1) motobomba, (1) hidrolavadora.
- Actividades: * Continua instalación de losera en parque bioseludable.

* Continua limpieza de fondo cuarto eléctrico y se realiza fundida de la base del cuarto de máquinas..
* Armado de plataforma de graderas.
* Ingreso de relleno seleccionado en concha.

V°B°
Interventoría.

Octubre 08 de 2025 - Miercoles.
- Estado del tiempo: soleado
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) Maestro, (6) Ayudantes, (6) oficiales, (2) of. losera, (2) Ay. losera,
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (1) Retroexcavadora, (1) Rana, (2) volquetas, (1) vibrador de concreto, (5) mezcladoras, (1) cortadora, (2) canguros.
- Actividades: * Continua instalación de losera en parque Biosaludable
* Armado de plataforma de graderas.
* Limpieza de barro en tanque de almacenamiento.
* Desencofrado de cuarto de máquinas.
* Instalación de formaleta en tanque de reboso.
* Ingreso cuarto de refuerzo de graderas.
* Ingreso de 2 viajes de relleno seleccionado en concha.

V°B°
Interventoría

Octubre 09 de 2025 - Jueves.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux Siso, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) Maestro, (6) oficiales, (6) Ayudantes, (2) of. losera, (2) Ay. losera.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografia, (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (2) volqueras, (1) lana, (1) vibrador de concreto, (2) canguros, (1) cortadora, (5) mezcladoras.
- Actividades: * Continua instalación de losera en parque biosaludable.
  * Armado de plataforma de graderias.
  * Limpieza de barro en parque de refuerzo.
  * Instalación de formaleta en parque de almacenamiento
  * Armado de carpintera para parque de refuerzo.
  * Figurado e instalación de acero de refuerzo en graderias.
  * Ingresa rieles de 10cmx15 para bordillos

Vo Bo
Interventoria.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1082249527
Nombre:	ANDRES DAVID BOLAÑOS MARTINEZ
Fecha Ingreso:	16/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	15/09/2025 04:55:15 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	19592696
Nombre:	ANDRES JOSE BOLAÑOS PARODIS
Fecha Ingreso:	13/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/09/2025 04:28:39 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1062403583
Nombre:	CARLOS EDUARDO NOCHES MEJIA
Fecha Ingreso:	15/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	14/09/2025 05:21:49 p. m.

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

El usuario mencionado a continuación registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales. La información aquí proporcionada es verídica y se registra conforme a los datos suministrados.

Datos del empleador			
Nombres y apellidos o Razón Social	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO (DECRETO 1563/16)		
Tipo de documento de identificación	NI	**Número de documento de identificación**	899999998
Datos del trabajador			
Tipo documento y número de identificación	CC 12490853	**Nombres y apellidos**	DIDIER ALFONSO ARNEDO MADRID
Fecha de afiliación	2025-01-08	**Estado de afiliación**	**Activo**
Fecha de inicio cobertura	2025-01-08	**Tipo de vinculación**	Independiente
Clase de riesgo	5	**Fecha de retiro**	

Esta certificación se expide a los 12 días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **FLOREZ PUPO DIEGO ALBERTO,** identificado con **CC** No**. 1192778582,** registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
CRH-SST IPS E.U **NIT 900344013**	**Fecha de inicio de cobertura: 09/09/2025** **Estado Afiliación: ACTIVA** **Fecha de inicio de Contrato: 08/09/2025** **Fecha fin de Contrato: 30/12/2025** **Tipo Vinculación: INDEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 3**

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad para continuar con la cobertura.

Esta certificación se expide en la ciudad de Valledupar, a los 12 días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
A.M.G.G

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	7572859
Nombre:	ERNEY DE JESUS CAMACHO GONZALEZ
Fecha Ingreso:	13/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/09/2025 04:34:24 p. m.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 399891 correspondiente a la empresa Navarro Gonzalez Jeison Gustavo.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
LUIS DIEGO NUÑEZ HERRERA	C.C.	1,007,588,995	08/09/2025
JUAN CARLOS MUÑOZ TORREGROSA	C.C.	1,007,589,005	08/09/2025

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 01:50:45 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1065836824
Nombre:	OSNAIDER PAEZ GOMEZ
Fecha Ingreso:	13/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/09/2025 04:39:23 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	77176473
Nombre:	ARMANDO VILLALOBOS
Fecha Ingreso:	01/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	30/09/2025 07:41:32 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1124023685
Nombre:	EDUARDO YESID RUA PEREZ
Fecha Ingreso:	01/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	30/09/2025 07:36:48 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1065562392
Nombre:	GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS
Fecha Ingreso:	01/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	30/09/2025 07:25:43 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1065630304
Nombre:	GUSTAVO ALBERTO GOMEZ PALMERA
Fecha Ingreso:	01/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	30/09/2025 07:30:04 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1002996205
Nombre:	JEAN CARLOS AYOLA AMAYA
Fecha Ingreso:	10/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	09/10/2025 06:57:26 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1065566985
Nombre:	KEVIN DAVID VILLALOBOS ARRIETA
Fecha Ingreso:	07/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	06/10/2025 06:09:07 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1065566985
Nombre:	KEVIN DAVID VILLALOBOS ARRIETA
Fecha Ingreso:	07/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	06/10/2025 06:09:07 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1002996205
Nombre:	JEAN CARLOS AYOLA AMAYA
Fecha Ingreso:	10/10/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	09/10/2025 06:57:26 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	9728795
Nombre:	LUIS ENRIQUE PEREZ TORRES
Fecha Ingreso:	16/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	15/09/2025 04:58:47 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1065630788
Nombre:	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ ANAYA
Fecha Ingreso:	23/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	22/09/2025 06:12:42 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	CC
Número de documento:	1065593022
Número Afiliación:	399891
Razón social:	NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72192977
Nombre:	WILMAN ENRIQUE DE LEON DE LA ASUNCION
Fecha Ingreso:	23/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	22/09/2025 06:03:24 p. m.

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Comité de Seguimiento del Contrato "Construcción de Escenario deportivo"	
Citada por: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 26 de Septiembre de 2025
	Hora inicio: 9:20 am **Hora terminación**: 10:30 am
	Lugar: Obra

PARTICIPANTES		
No.	**Nombre**	**Cargo**
1	Hillary Carrillo Reyes	Coordinadora de Interventoría
2	Jeison Serna Castillejo	Ing. Ambiental - Contratista
3	Ingrid Murgas Calderon	Ing. Apoyo Sec. Planeación E Infraestructura.
4	Luis Eduardo Arzuaga Orozco	Secretario de Planeación e Infraestructura
6	Jose Carlos Aroca	Ingeniero Civil Residente de Obra
7	Andres Felipe Mendoza	Ingeniero Apoyo Sec. Planeación E Infraestructura
8		
9		
10		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:20 am del día 26 de Septiembre de 2025, se da inicio al comité de seguimiento realizando una inspección de obras adelantadas, se observa el avance de losa de fondo del tanque de almacenamiento de agua, armado de acero del tanque de rehuso; Luego de chequear los niveles de cancha se observó que se requiere un muro de contención sobre viga de cimentación perimetral, para esto se requiere que se presente diseño del mismo, se están armando las tapas de los manholes de la red sanitaria de descarga, se indica que se culminó la instalación de la red sanitaria; De acuerdo al compromiso del acta anterior de presentar el **plan de choque** fue entregado con el ajuste del cronograma, el día 2 de Septiembre.

Por parte de interventoría, expresa que el porcentaje programado de acuerdo a la reprogramación presentada del 27 de septiembre es de **32,23%** contra un **24,83%** de avance ejecutado, se informa que para los concretos adelantados, se están tomando muestras de concretos por parte de la interventoría y la obra, se solicita certificado de calidad de loseta por parte del secretario de planeación, la instalación de loseta esta en atraso debido a que tiene 22 dias de haberse programado, el contratista informa que está culminando detalles de nivelación, y contar con más losetas acopiadas para dar inicio a esta actividad la próxima semana, la actividad Geodren planar, geotextil y canal perimetral son actividades que están programadas para dar inicio el 6 de septiembre y se tiene propuestas para inició en quince (15) días, debido a que están en temas de alistamiento de la cancha.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

- **CONTRATISTA:** presentar el **Diseño de muro de contención sobre la viga perimetral de la cancha**. (10 de Octubre). Se entregará Apu nuevos acompañado del acta parcial que presentará, previa revisión por parte de interventoría.

- **INTERVENTORIA:** Motivar el cumplimiento de manera minuciosa semana a semana de la reprogramación, e informar mediante informe semanal y correo las actividades en atraso y las medidas tomadas para conminar a que se cumplan. (De inmediato). Revisar apu, una vez vallan entregando para revisión.
