SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO **JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO 3582 - 2023** **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO, MUNICIPIO DE PINILLOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".** **JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE MONTECELIO 4665 -2023** **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MONTECELIO, MUNICIPIO DE PINILLOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
Periodo:	Febrero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	056 del 22 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pinillos del departamento de Bolívar, en el Corregimiento del Líbano, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR0+000 que se encuentra a 10.03 Km de Puerto Pinillos, y el punto de finalización de la intervención es el PR 3+390 en el corregimiento del Líbano, Municipio de Pinillos.

- **LONGITUD TOTAL DEL A INTERVENIR:** 378 ML

- **UBICACIÓN:**

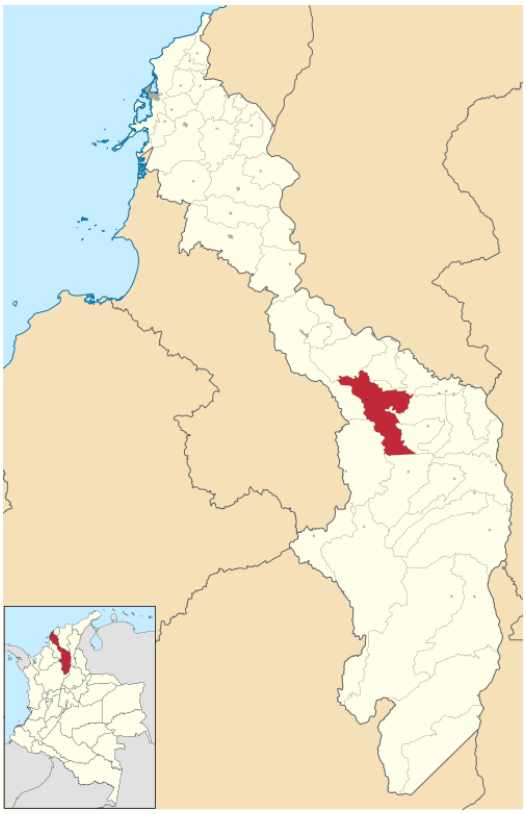


Ilustración 1. Ubicación de Municipio Pinillos con respecto al departamento de Bolivar.



Ilustración 2. Localización del proyecto JAC DEL LIBANO.



Ilustración 3. Localización del proyecto JAC DEL MONTECELIO.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO – 3582 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO

CONTRATO DE OBRA	3582 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO	NIT:	800063547-9
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES MANUEL VASQUEZ MUÑOZ		
NÚMERO DE CONTACTO	3205911379		
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO, MUNICIPIO DE PINILLOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
VALOR INICIAL	$ 197.409.649,00		
FECHA DE INICIO	18 de diciembre de 2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN	29/12/2023		
REANUDACIÓN	18/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN	20/01/2024		

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	30/04/2024

CONVENIO – 4665 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO

CONTRATO DE OBRA	4665 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO	NIT:	901659766-0
REPRESENTANTE LEGAL	VIVIANA VILA CASTILLEJO		
NÚMERO DE CONTACTO	3136763633		
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO, MUNICIPIO DE PINILLOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
VALOR INICIAL	$ 200.235.028,00		
FECHA DE INICIO	21/02/2024		
PLAZO INICIAL:	20/06/2024		
SUSPENSIÓN	N/A		
REANUDACIÓN	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN	20/06/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO – 3582 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1164423	10	NACIÓN	$ 197.409.649,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES				$ 0,00	$ 0,00

CONVENIO – 4665 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1385123	10	NACIÓN	$ 200.235.028,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES				$ 0,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

CONVENIO – 3582 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 143.046.044,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	$ 0	0%

CONVENIO – 4665 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 145.604.437,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	$ 0	0%

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado avances financieros.

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

CONVENIO – 3582 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO

Meta física programada:	**0 %**
Meta física ejecutada:	**0 %**

CONVENIO – 4665 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO

Meta física programada:	**0 %**
Meta física ejecutada:	**0 %**

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

A la fecha del presente informe, no se han tramitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONVENIO – 3582 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL LIBANO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Cumplimiento	20	$ 40.047.006,00	NB-100299028	21/01/2024	31/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5	$ 10.011.752,00	NB-100299028	21/01/2024	31/07/2027
Estabilidad de la Obra	30	$ 60.070.509,00	NB-100299028	31/07/2024	31/07/2029

Garantías de RCE

Seguro	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil	$ 260.000.000,00	NB-100070316	29/09/2023	30/06/2024

Extracontractual (RCE)				

CONVENIO – 4665 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL MONTECELIO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Cumplimiento	30	$ 40.047.006,00	NB-100299028	21/12/2024	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20	$ 10.011.752,00	NB-100299028	02/12/2024	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	10	$ 60.070.509,00	NB-100299028	31/12/2024	31/12/2028

Garantías de RCE

Seguro	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232.000.000,00	NB-100074054	02/12/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4961-2023		
CONTRATISTA:	G & G INGENIEROS SAS	NIT:	800208226-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	G & G INGENIEROS SAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL GAMARRA TORRES		
NÚMERO DE CONTACTO	3135221107 – 3215376805		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.783.175,00		
VALOR ADICIONAL	$ 35.000.000,00		
VALOR ACUMULADO	$ 105.783.175,00		
DIRRECIÓN	CL 12, 16 – 02 BRR ONCE DE NOVIEMBRE, CIÉNAGA DE ORO		
FECHA DE INICIO	22/12/2023		

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30/04/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1392223	10	NACION		$ 70.783.175,00	$ 0,00	$ 70.783.175,00
		NACION		$35.000.000,00	$ 0,00	$35.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	$	$	$	$

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada	$ 0	0 %
Total, inversión ejecutada	$ 0	0 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

29/12/2023	1		29/12/2023 hasta 18/01/2024	20/01/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.7**	**Vigencia**	
Cumplimiento	10	$ 10.578.317,40	CG-1050753	22/12/2023	30/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20	$ 21.156.634,80	CG-1050753	22/12/2023	30/06/2027
Calidad del Servicio	30	$ 31.734.952,20	CG-1050753	22/12/2023	30/06/205

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO


3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 ASPECTOS LEGALES.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Resolución 056 del 22 de diciembre de 2023
Supervisor del contrato 4961 de 2023
