**SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO<br><br>**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.**<br><br>**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**<br><br>**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.**<br><br>**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**<br><br>**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.**<br><br>**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATICO ALTO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** |
| **Periodo:** | Junio de 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 055 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

El municipio de Cantagallo se encuentra ubicado al sur del departamento de Bolívar. A 680 km de Cartagena de Indias. Cuenta con una superficie total de 869 km². El municipio de Cantagallo limita por el norte con el municipio de San Pablo, por el sur con el departamento de Antioquia y por el oriente con el departamento de Santander. En la siguiente imagen se registra la ubicación del municipio de Cantagallo y la localización de las rutas de acceso a las veredas.

- **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 350 ML

- **UBICACIÓN:**



**Ilustración 1.** Ubicación de Municipio Cantagallos con respecto al departamento de Bolívar.

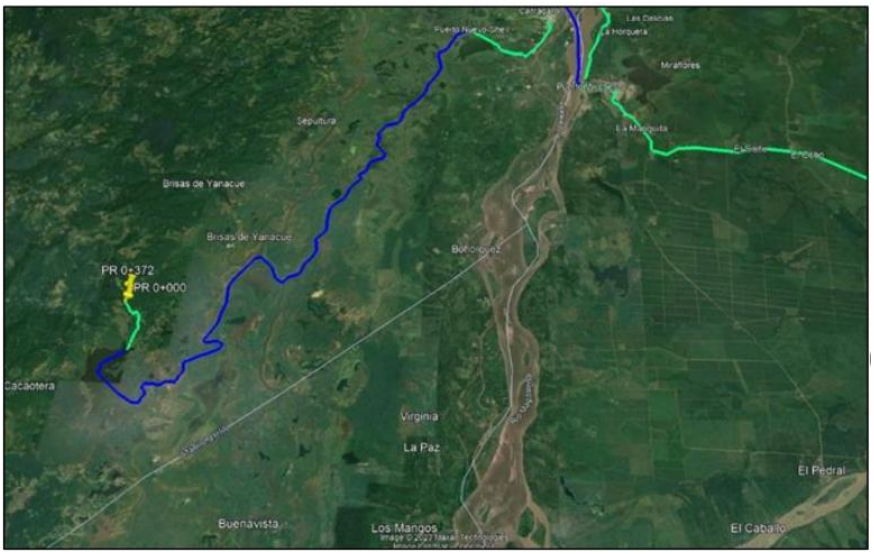



**Ilustración 2.** Localización de vía a intervenir – El Cagui

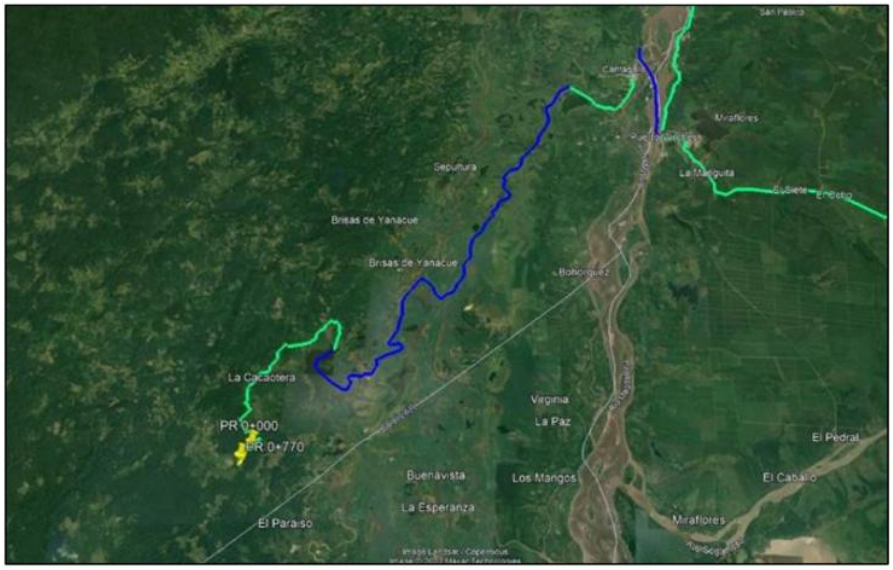



**Ilustración 3.** Localización de vía a intervenir – La Esperanza

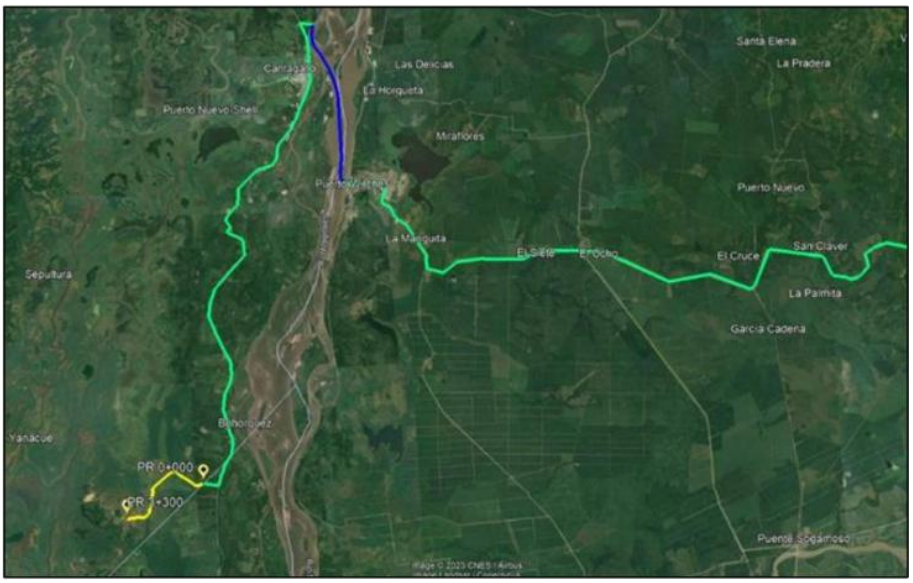



**Ilustración 4.** Localización de vía a intervenir – Patio Alto

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

**1.1. INFORMACIÓN GENERAL**

**CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | 4144 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI. | NIT: | 901.680.783-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI. | | |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 de diciembre de 2023 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 200.684.084,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **SUSPENSIÓN No.1** | 29/12/2023 hasta 17/01/2024 | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA No. 1** | 18/01/2024 hasta 30/04/2024 |
| **PRÓRROGA No. 2** | 01/05/2024 hasta 30/06/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/06/2024 |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | 4463 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO<br>. | NIT: | 901.464.207-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO | | |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 18 de diciembre de 2023 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 198.379.487,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **SUSPENSIÓN No.1** | 29/12/2023 hasta 17/01/2024 | | |
| **PRÓRROGA No. 1** | 18/01/2024 hasta 30/04/2024 | | |
| **PRÓRROGA No. 2** | 01/05/2024 hasta 30/06/2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/06/2024 | | |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | 4148 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA | NIT: | 901.464.207-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 de diciembre de 2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 199.681.382,00 |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| **SUSPENSIÓN No.1** | 29/12/2023 hasta 17/01/2024 |
| **PRÓRROGA No. 1** | 18/01/2024 hasta 30/04/2024 |
| **PRÓRROGA No. 2** | 01/05/2024 hasta 30/06/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/06/2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

**CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.**

| REGISTRO | RECURSO | FUENTE | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231523 | 10 | NACIÓN | $ 200.684.084,00 | $ 48.470.908,19 | $ 152.213.175,81 |
| | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 48.470.908,19 | $ 152.213.175,81 |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.**

| REGISTRO | RECURSO | FUENTE | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231523 | 10 | NACIÓN | $ 198.379.487,00 | $ 21.966.324,00 | $ 176.413.163,00 |
| | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 21.966.324,00 | $ 176.413.163,00 |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.**

| REGISTRO | RECURSO | FUENTE | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231523 | 10 | NACIÓN | $ 199.681.382,00 | $ 53.765.462,80 | $ 145.915.919,20 |
| | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 53.765.462,80 | $ 145.915.919,20 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR ACTAS | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

**CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.**

| ÍTEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.684.084,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.470.908,19 | 24,27 % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 48.470.908,19 | 24,27 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | $ 0 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA) | $ 48.470.908,19 | 24,27 % |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.**

| ÍTEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 198.379.487,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 21.966.324,00 | 11,07 % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 21.966.324,00 | 11,07 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | $ 0 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA) | $ 21.966.324,00 | 11,07 % |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.**

| ÍTEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 199.681.382,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 53.765.462,80 | 26,93 % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 53.765.462,80 | 26,93 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.) | $ 0 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA) | $ 53.765.462,80 | 26,93 % |

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares para el inicio de la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no hay avances financieros.

### 1.4.2. ANTICIPO.

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

**CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.**

| | |
|---|---|
| **Meta física programada:** | **24,27 %** |
| **Meta física ejecutada:** | **24,27 %** |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.**

| | |
|---|---|
| **Meta física programada:** | **11,07 %** |
| **Meta física ejecutada:** | **11,07 %** |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.**

| | |
|---|---|
| **Meta física programada:** | **26,93 %** |
| **Meta física ejecutada:** | **26,93 %** |

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado adiciones, prórrogas y/o modificaciones.

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **% Amparo** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| Cumplimiento | 20% | $ 40.136.817,00 | NB-100291966 | 31/12/2023 | 01/05/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 5% | $ 10.034.205,00 | NB-100291966 | 31/12/2023 | 30/06/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 30% | $ 60.205.226,00 | NB-100291966 | 30/06/2024 | 30/06/2029 |

**Garantías de RCE**

| Amparos | % Asegurado | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10% | $ 232.000.000,00 | NB-100071760 | 26/10/2023 | 30/06/2024 |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **% Amparo** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| Cumplimiento | 20% | $ 39.675.898,00 | NB-100294537 | 16/11/2023 | 31/12/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, | 5% | $ 9.918.975,00 | NB-100294537 | 16/11/2023 | 31/12/2026 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **% Amparo** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | | | | | |
| Estabilidad de la Obra | 30% | $ 59.513.847,00 | NB-100294537 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantías de RCE**

| Amparos | % Asegurado | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10% | $ 232.000.000,00 | NB-100071760 | 16/11/2023 | 31/12/2023 |

**CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **% Amparo** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| Cumplimiento | 20% | $ 39.936.277,00 | NB-100294537 | 27/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 5% | $ 9.984.070,00 | NB-100294537 | 27/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 30% | $ 59.904415,00 | NB-100294537 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantías de RCE**

| Amparos | | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia |
|---|---|---|---|---|

| | % Asegurado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10% | $ 232.000.000,00 | NB-100074290 | 27/10/2023 | 31/12/2023 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| FECHA | OFICIO No. | ASUNTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | ASUNTO |
|---|---|---|
| | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | 4978 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCCIONES HERCAR SAS | NIT: | 900.361.789-5 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 de diciembre de 2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 85.339.804,00 INCLUIDO IVA |
| **ADICIÓN 1:** | $ 30.660.196,00 INCLUIDO IVA |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| **SUSPENSIÓN No.1** | 29/12/2023 hasta 17/01/2024 |
| **PRÓRROGA No. 1** | 18/01/2024 hasta 30/04/2024 |
| **PRÓRROGA No. 2** | 01/05/2024 hasta 30/06/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/06/2024 |

**2.1. INFORMACION GENERAL**

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO No. | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392123 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 85.339.804,00 | $ 85.339.804,00 | $ 0,00 |
| 1392124 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-03 | $ 30.660.196,00 | $ 28.530.106,00 | $ 23.841.045,00 |
| TOTAL | | | | $ 116.000.000,00 | $ 113.869.910,00 | $ 2.130.090,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 4 | $ 18.244.500,00 | $ 3.466.455,00 | $ 0 | $ 21.710.955,00 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

**2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | | |
|---|---|---|
| Total, inversión programada | $ 21.710.955,00 | 18,71 % |

| | | |
|---|---|---|
| Total, inversión ejecutada | $ 21.710.955,00 | 18,71 % |

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: UNICA<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **% Amparo** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| Cumplimiento | 10% | $ 11.600.000,00 | CG-1050764 | 29/04/2024 | 30/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 20% | $ 23.200.000,00 | CG-1050764 | 24/04/2024 | 30/06/2024 |
| Calidad del Servicio | 30% | $ 34.800.000,00 | CG-1050764 | 30/06/2024 | 30/06/2025 |

### 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

### 2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

### 3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha ó periodo del presente informe, no se presentan aspectos legales.

Cordialmente,

**ARNULFO ARIAS SAENZ**
**Resolución 055 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023**
**Supervisor del contrato 4978 de 2023**
