SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.** **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.** **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.** **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATICO ALTO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**
Periodo:	Julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	055 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

El municipio de Cantagallo se encuentra ubicado al sur del departamento de Bolívar. A 680 km de Cartagena de Indias. Cuenta con una superficie total de 869 km². El municipio de Cantagallo limita por el norte con el municipio de San Pablo, por el sur con el departamento de Antioquia y por el oriente con el departamento de Santander. En la siguiente imagen se registra la ubicación del municipio de Cantagallo y la localización de las rutas de acceso a las veredas.

- **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 350 ML

- **UBICACIÓN:**



Ilustración 1. Ubicación de Municipio Cantagallos con respecto al departamento de Bolívar.

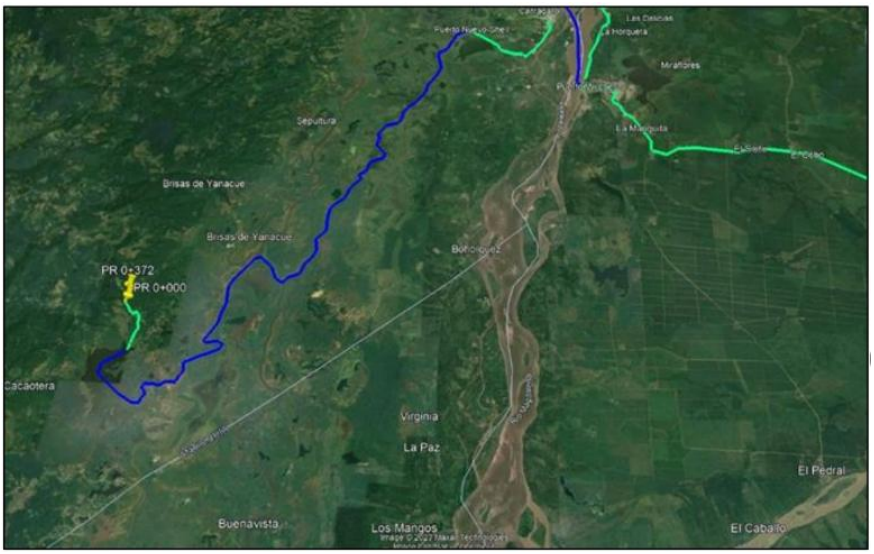


Ilustración 2. Localización de vía a intervenir – El Cagui

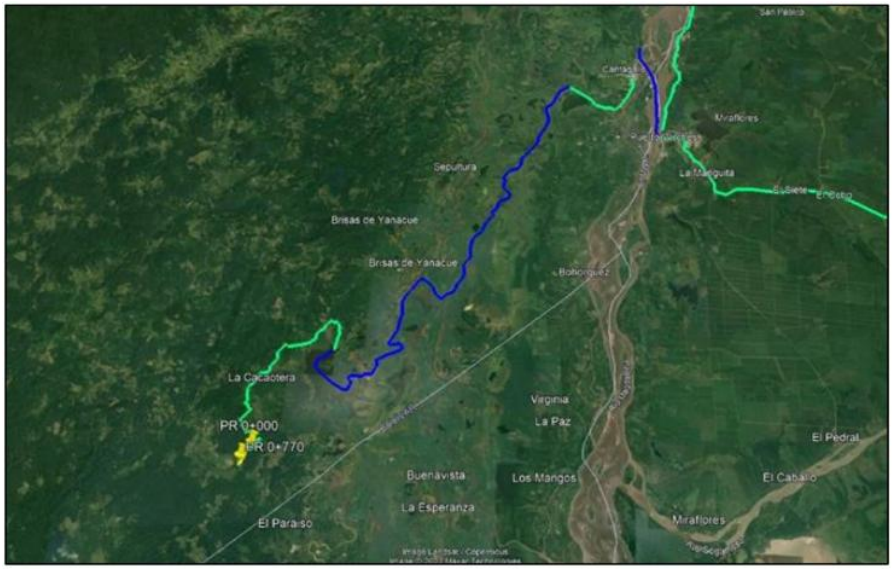


Ilustración 3. Localización de vía a intervenir – La Esperanza

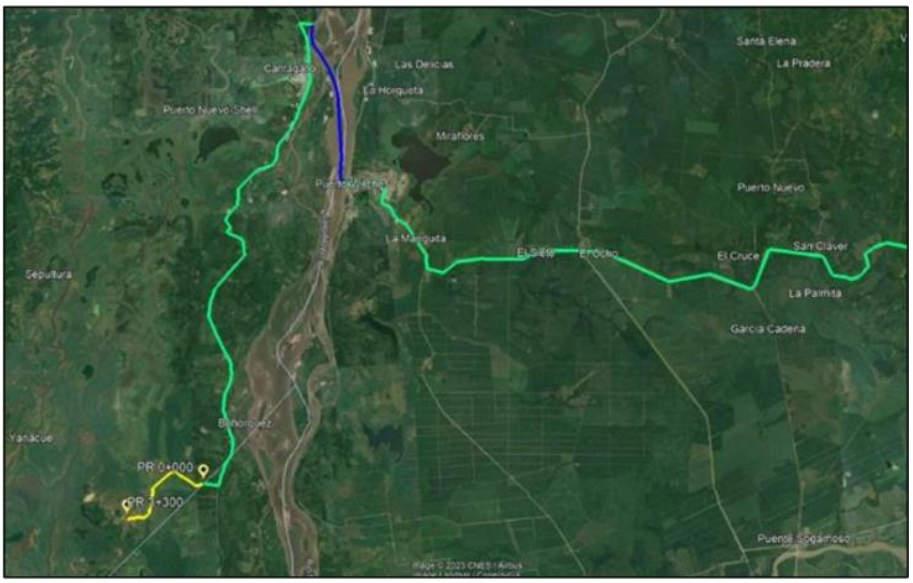


Ilustración 4. Localización de vía a intervenir – Patio Alto

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.

CONTRATO DE OBRA	4144 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI.	NIT:	901.680.783-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI.		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023		
VALOR INICIAL:	$ 200.684.084,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023 hasta 17/01/2024		

PRÓRROGA No. 1	18/01/2024 hasta 30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	01/05/2024 hasta 30/06/2024
PRÓRROGA No. 3	01/07/2024 hasta 31/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023

CONTRATO DE OBRA	4463 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO .	NIT:	901.464.207-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	18 de diciembre de 2023		
VALOR INICIAL:	$ 198.379.487,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023 hasta 17/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024 hasta 30/04/2024		
PRÓRROGA No. 2	01/05/2024 hasta 30/06/2024		
PRÓRROGA No. 3	01/07/2024 hasta 31/07/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024		

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023

CONTRATO DE OBRA	4148 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA	NIT:	901.464.207-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA		

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.681.382,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023 hasta 17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024 hasta 30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	01/05/2024 hasta 30/06/2024
PRÓRROGA No. 3	01/07/2024 hasta 31/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1231523	10	NACIÓN	$ 200.684.084,00	$ 189.699.879,80	$ 10.984.204,20
TOTALES				$ 189.699.879,80	$ 10.984.204,20

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1231523	10	NACIÓN	$ 198.379.487,00	$ 198.379.487,00	$ 0,00
TOTALES				$ 198.379.487,00	$ 0,00

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1231523	10	NACIÓN	$ 199.681.382,00	$ 199.681.382,00	$ 0,00
TOTALES				$ 199.681.382,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.684.084,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 189.699.879,80	95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 189.699.879,80	95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	$ 189.699.879,80	95%

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.379.487,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.379.487,00	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.379.487,00	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	$ 198.379.487,00	100 %

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.681.382,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.681.382,00	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.681.382,00	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	$ 199.681.382,00	100 %

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares para el inicio de la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no hay avances financieros.

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.

Meta física programada:	**95 %**
Meta física ejecutada:	**95 %**

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.

Meta física programada:	**100 %**
Meta física ejecutada:	**100 %**

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.

Meta física programada:	**100 %**
Meta física ejecutada:	**100 %**

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/06/2024	3	PRÓRROGA	APROBADO

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado adiciones, prórrogas y/o modificaciones.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONVENIO - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI – 4144 – 2023.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Cumplimiento	20%	$ 40.136.817,00	NB-100291966	31/12/2023	01/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	$ 10.034.205,00	NB-100291966	31/12/2023	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	30%	$ 60.205.226,00	NB-100291966	30/06/2024	30/06/2029

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	NB-100071760	26/10/2023	30/06/2024

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATICO ALTO – 4463 – 2023.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Cumplimiento	20%	$ 39.675.898,00	NB-100294537	16/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios,	5%	$ 9.918.975,00	NB-100294537	16/11/2023	31/12/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.					
Estabilidad de la Obra	30%	$ 59.513.847,00	NB-100294537	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	NB-100071760	16/11/2023	31/12/2023

CONVENIO - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA – 4148 – 2023.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGURO S.A					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Cumplimiento	20%	$ 39.936.277,00	NB-100294537	27/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	$ 9.984.070,00	NB-100294537	27/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	30%	$ 59.904415,00	NB-100294537	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos		Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

	% Asegurado				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	NB-100074290	27/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA	4978 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HERCAR SAS	NIT:	900.361.789-5

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL:	$ 85.339.804,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1:	$ 30.660.196,00 INCLUIDO IVA
VALOR ACTUAL:	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023 hasta 17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024 hasta 30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	01/05/2024 hasta 30/06/2024
PRÓRROGA No. 3	01/07/2024 hasta 31/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024

2.1. INFORMACION GENERAL

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO No.	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1392123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 85.339.804,00	$ 85.339.804,00	$ 0,00
1392124	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-03	$ 30.660.196,00	$ 30.660.196,00	$ 0,00
TOTAL				$ 116.000.000,00	$ 116.000.000,00	$ 0,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 1.789.992,00	$ 340.098,00	$ 0	$ 2.130.090,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada	$ 2.130.090,00	1.8 %
Total inversión ejecutada	$ 2.130.090,00	1.8 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/06/2024	3	PRÓRROGA	APROBADO

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	CG-1050764	30/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20%	$ 23.200.000,00	CG-1050764	30/06/2024	31/07/2027
Calidad del Servicio	30%	$ 34.800.000,00	CG-1050764	31/07/2024	31/07/2025

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.


3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha ó periodo del presente informe, se le realizó prórroga hasta 31/07/2024.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Resolución 055 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
Supervisor del contrato 4978 de 2023
