INFORME REPORTE No. 01 EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
BENEFICIARIO: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P."

CONTRATO DE OBRA No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025
OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA: MYM CONSTRUIMOS S.A.S NIT. 900499424-6
R. Legal HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO.
C. C. NO. 12.978.350 DE PASTO N.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025
INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IM-PLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA: I.C. OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO
No. 87.219.077 DE IPIALES – NARIÑO.

SUPERVISOR DE CONTRATOS:
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
C.C. NO. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez.
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

SUPERVISOR DE CONVENIO:
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

PERIODO DEL INFORME
14 DE MARZO DE 2025 – 10 DE MAYO DE 2025

FECHA DEL INFORME
25 DE JUNIO DE 2025

800

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos Específicos 6
3. ASPECTO GENERAL DE LOS CONTRATOS 6
3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 8
3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE CONSULTORIA 9
3.5. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ... 10
3.7. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE OBRA 12
3.8. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE CONSULTORIA. 12
3.9. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. 13
3.10. CONTROL DE PÓLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 13
3.11. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA. 13
3.12. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE CONSULTORÍA. 15
4. INFORME ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 15
4.1. UBICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 16
4.2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025 17
4.3. CANTIDADES Y ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO 20
4.4. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS. 22
4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 24
4.6. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO. 28
4.7. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES. 28
5. AVANCE CONTABLE, FINANCIERO Y EN TIEMPO 29
5.1. AVANCE CONTABLE Y FINANCIERO. 29

5.2. AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA, CONSULTORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS 31
5.3. AVANCE EN TIEMPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025. 31
5.3.1. AVANCE FÍSICO 31
5.3.2. AVANCE FINANCIERO 32
5.3.3. AVANCE PROGRAMACIÓN FINAL 32
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 33

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Ficha Técnica del Convenio Interadministrativo 8
Tabla 2. Ficha Técnica del Contrato de Obra 9
Tabla 3. Ficha Técnica del Contrato de Consultoría 10
Tabla 4. Ficha Técnica del Contrato de Prestación De Servicios 10
Tabla 5 Información Jurídica convenio interadministrativo 11
Tabla 6. Información Jurídica Contrato de Obra 12
Tabla 7. Información Jurídica Contrato de consultoría. 12
Tabla 8. Información Jurídica Contrato de Prestación De Servicios 13
Tabla 9. Información General De Las Pólizas Del Contrato De Obra. 14
Tabla 10. Póliza cumplimiento Del Contrato De Obra Anexo 0 14
Tabla 11. Póliza Resp. Civil del Contrato De Obra Anexo 0 14
Tabla 12. Información General De Las Pólizas De Contrato De consultoría 15
Tabla 13. Póliza De Contrato consultoría Anexo 0 15
Tabla 14 obligaciones de la empresa – clausula séptima del convenio 17
Tabla 15. Cantidades Y Actividades Convenio Inicial 21
Tabla 16. Actividades Contractuales Ejecutadas 23
Tabla 17. Descripción De Las Actividades Desarrolladas. 24
Tabla 18 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 28
Tabla 19 Pagos De Seguridad Social Contrato De Obra 28
Tabla 20 Pagos De Seguridad Social Contrato De Consultoría 29
Tabla 21. Informe Contable Y Financiero Contrato De Obra 29
Tabla 22. Informe Contable Y Financiero Contrato De Consultoría. 30
Tabla 23. Informe Contable Y Financiero Contrato Prestación De Servicios 30
Tabla 24. Informe Contable Y Financiero Convenio Interadministrativo 30
Tabla 25 Avance En Tiempo contratos de Obra , consultoría y prestación de servicios 31
Tabla 26. Avance En Tiempo Convenio Interadministrativo 31
Tabla 27. Balance Convenio 32

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el Informe de reporte No. 01 en el marco del cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025, suscrito entre la Administración Municipal de Valle del Guamuez y la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez "EMSERPUVAG S.A. E.S.P., cuyo objeto es *"Aunar Esfuerzos Entre Las Partes Para La Optimización Celda 01 Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos Localizado En La Vereda La Primavera E Implementación De Acciones De Fortalecimiento Al Proceso De Aprovechamiento, Para Garantizar La Buena Prestación Del Servicio Público De Aseo En El Municipio Valle Del Guamuez, Departamento Del Putumayo"*., en el cual se detalla cada una de las actividades de obras desarrolladas desde el día 14 de marzo de 2025 hasta 10 de mayo de 2025.

En el contexto de la Política Nacional Ambiental que destaca el recurso agua como el eje central; el manejo integral de los residuos sólidos se constituye en una de las prioridades, debido a la gran afectación sanitaria y ambiental que se está causando al recurso agua como al suelo por el inadecuado manejo que se realiza en la mayoría de los Municipios. De allí que el objetivo fundamental de la administración de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." es "Impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos que para los seres humanos y el medio ambiente ocasionan los residuos sólidos, esto es garantizando de manera eficiente la prestación del servicio público de aseo en sus actividades de recolección, barrido y limpieza, transporte, aprovechamiento y disposición final, esta última dispendiosa de realizar debido a los altos costos técnicos, y operacionales, además del grave riesgo que representa para los recursos naturales y la salud de las personas, por los impactos negativos que genera.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar informe reporte No. 01 de las actividades del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 del 14 de marzo de 2025, que tiene por objeto "Aunar Esfuerzos Entre Las Partes Para La Optimización Celda 01 Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos Localizado En La Vereda La Primavera E Implementación De Acciones De Fortalecimiento Al Proceso De Aprovechamiento, Para Garantizar La Buena Prestación Del Servicio Público De Aseo En El Municipio Valle Del Guamuez, Departamento Del Putumayo" por parte de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P. en el seguimiento hecho al Contrato de Obra No. SPO - CO- 001 – 2025 del 10 de abril de 2025 y del Contrato De consultoría No. SUO-CD-004-2025 del 10 de abril de 2025 y contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-PS-080-2025 del 11 de abril de 2025.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir las actividades adelantadas para la optimización del lugar de disposición final de residuos sólidos y ampliación de las chimeneas para la evacuación de gases.

- Presentar el análisis de avance del proyecto alcanzado durante el periodo de ejecución del 14 de marzo de 2025 hasta 10 de mayo de 2025.

3. ASPECTO GENERAL DE LOS CONTRATOS.

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato se ejecuta en el sector rural del Municipio de Valle del Guamuez, exactamente en la vereda la primavera.

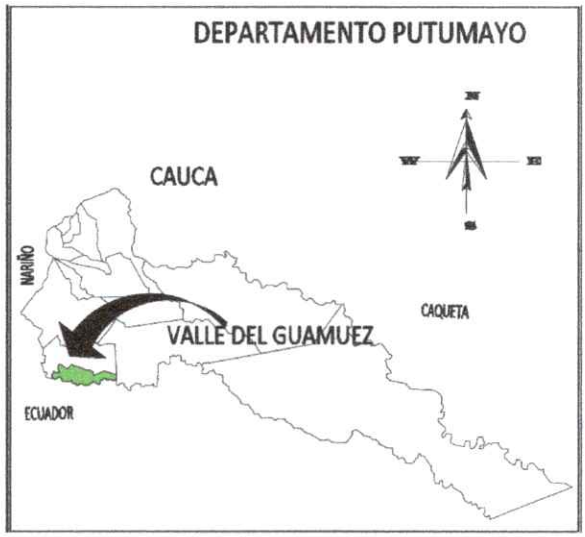


Ilustración 1 Localización ambiro departamental



Ilustración 2 Localización Vereda La Primavera - Municipio de Valle del Guamuez

A Continuación, se presenta el estado actual del Contrato de Obra, del Contrato consultoría y contrato prestación de servicios donde se relaciona la información básica contemplada en ellos.

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

En el siguiente cuadro se relaciona la información general del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025

Tabla 1 Ficha Técnica del Convenio Interadministrativo

TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.
CONVENIO No.	SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
BENEFICIARIO:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
APORTE DEL MUNICIPIO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($469.184.842) MONEDA CORRIENTE
APORTE DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($35.947.328,00 MDA/CTE).
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.132.170)
APORTE ADICIONAL DEL MUNICIPIO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.132.170)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS CON CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	29 DE AGOSTO DE 2025

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En el siguiente cuadro se relaciona la información jurídica del Contrato de Obra.

Tabla 2. Ficha Técnica del Contrato de Obra

TIPO DE CONTRATO:	OBRA.
CONTRATO No.	SPO - CO- 001 – 2025 DE 10 DE ABRIL DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.
CONTRATISTA:	M Y M CONSTRUIMOS SAS NIT. 900499424-6 R.L: HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO
OBJETO:	"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL $ (469,184,842.00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL $ (469,184,842.00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	10 DE AGOSTO DE 2025

3.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Cuadro de relación de información general del Contrato De Consultoría.

Tabla 3. Ficha Técnica del Contrato de Consultoría

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA.
CONTRATO No.	SUO-CD-004-2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.
INTERVENTORÍA:	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO C.C. 87.219.077 DE IPIALES NARIÑO
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IM-PLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS ($30.946.019,00) MDA/CTE IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS ($30.946.019,00) MDA/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	10 DE AGOSTO DE 2025

3.5. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

Cuadro de relación de información general del Contrato De Prestación De Servicios No. CD-PS-080-2025.

Tabla 4. Ficha Técnica del Contrato de Prestación De Servicios

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CONTRATO No.	CD-PS-080-2025 DEL 11 DE ABRIL DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.
CONTRATISTA:	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ 1.085.342.410 de Pasto N.

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,001,309.00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,001,309.00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	10 DE AGOSTO DE 2025

3.6. INFORMACIÓN JURÍDICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

En el siguiente cuadro se relaciona la información jurídica del convenio interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025.

Tabla 5 Información Jurídica convenio interadministrativo

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO DE 2025
APORTE DEL MUNICIPIO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($469.184.842) MONEDA CORRIENTE
APORTE DEL BENEFICIARIO EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($35.947.328,00 MDA/CTE).
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.132.170)
VALOR ADICION APORTE DEL MUNICIPIO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONVENIO:	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.132.170)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS CON CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	29 DE AGOSTO DE 2025

3.7. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE OBRA

En el siguiente cuadro se relaciona la información jurídica del Contrato de Obra No. SPO - CO- 001 – 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025.

Tabla 6. Información Jurídica Contrato de Obra

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL $ (469,184,842.00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL $ (469,184,842.00)
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	10 DE AGOSTO DE 2025

3.8. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE CONSULTORIA.

En el siguiente cuadro de relación de información jurídica del Contrato de consultoría No. SUO-CD-004 DEL 10 DE ABRIL DE 2025.

Tabla 7. Información Jurídica Contrato de consultoría.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS ($30.946.019,00) MDA/CTE IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS ($30.946.019,00) MDA/CTE IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	10 DE AGOSTO DE 2025

3.9. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En el siguiente cuadro de relación de información jurídica del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. CD-PS-080-2025 DEL 11 DE ABRIL DE 2025.

Tabla 8. Información Jurídica Contrato de Prestación De Servicios.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,001,309.00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,001,309.00)
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	10 DE AGOSTO DE 2025

3.10. CONTROL DE PÓLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El convenio interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025 no aplican garantías Desde el punto de vista jurídico, los convenios interadministrativos no requieren la constitución de pólizas de garantías porque su naturaleza no contractual, su carácter colaborativo, la ausencia de riesgo conmutativo y la relación entre entidades públicas hacen inaplicable el régimen general de garantías establecido para los contratos estatales típicos. El control y seguimiento al cumplimiento de estos convenios se ejerce por la vía del control fiscal y la supervisión administrativa, y no mediante instrumentos asegurativos.

3.11. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

En las siguientes tablas se relaciona la información básica de las pólizas del Contrato de Obra No. SPO - CO- 001 – 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025. Cumplimiento general del contrato. **1.** Cumplimiento **2.** Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo. **3.** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato **4.** Estabilidad Y Calidad De La Obra. **5.** Predios, Labores Y Operaciones, Contratistas Y Subcontratistas, Rce Patronal, Vehículos Propios Y No Propios, Gastos Médicos, Responsabilidad Civil Cruzada

Tabla 9. Información General De Las Pólizas Del Contrato De Obra.

TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
ENTIDAD ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	
TOMADOR	M Y M CONSTRUIMOS SAS NIT: 900499424-6	
BENEFICIARIO	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	
POLIZA	No. De POLIZA	FECHA DE EXPEDICION
PÓLIZA No. 0	360 - 47 - 994000045380 Anexo 0	10/04/2025

Tabla 10. Póliza cumplimiento Del Contrato De Obra Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	10/04/2025	10/02/2026	93,836,968.40
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	10/04/2025	10/02/2026	140,755,452.60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/04/2025	10/08/2028	93,836,968.40
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 años después recibo final		93,836,968.40
NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO 195 del once (11) de abril (04) de 2025, según lo establecido en el acuerdo número 003 del 28 de noviembre de 2014 "*Manual de Contratación*", articulo 43 "*Aprobación de la Garantía de Cumplimiento"*			

TIPO DE PÓLIZA	RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ENTIDAD ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	
TOMADOR	M Y M CONSTRUIMOS SAS NIT: 900499424-6	
BENEFICIARIO	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	
POLIZA	No. De POLIZA	FECHA DE EXPEDICION
PÓLIZA No. 0	360 - 74 – 994000010687 Anexo 0	10/04/2025

Tabla 11. Póliza Resp. Civil del Contrato De Obra Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, Labores Y Operaciones	10/04/2025	10/08/2025	324,700,000.00
Contratistas Y Subcontratistas	10/04/2025	10/08/2025	324,700,000.00
Rce Patronal	10/04/2025	10/08/2025	324,700,000.00
Vehículos Propios Y No Propios	10/04/2025	10/08/2025	324,700,000.00
Gastos Médicos	10/04/2025	10/08/2025	324,700,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada	10/04/2025	10/08/2025	324,700,000.00

NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO 195 del once (11) de abril (04) de 2025, según lo establecido en el acuerdo número 003 del 28 de noviembre de 2014 "Manual de Contratación", articulo 43 "Aprobación de la Garantía de Cumplimiento"

3.12. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE CONSULTORÍA.

Relación de información básica de la póliza del Contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 **1.** Cumplimiento general del contrato. **2.** Buen manejo del anticipo **3.** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato **3.** Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.

Tabla 12. Información General De Las Pólizas De Contrato De consultoría

TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
ENTIDAD ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	
TOMADOR	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO	
BENEFICIARIO	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	
PÓLIZA No. 0	360 - 47 - 994000045384 Anexo 0	10/04/2025

Tabla 13. Póliza De Contrato consultoría Anexo 0

AMPARO	FECHA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	10/04/2025	10/02/2026	9,283,805.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/04/2025	10/02/2026	15,473,009.50
Pago de salario, Prestaciones sociales e ind.	10/04/2025	10/08/2028	6,189,203.80
Calidad del servicio	10/08/2025	10/08/2030	6,189,203.80
NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO 196 del once (11) de abril (04) de 2025, según lo establecido en el acuerdo número 003 del 28 de noviembre de 2014 "Manual de Contratación", articulo 43 "Aprobación de la Garantía de Cumplimiento"			

4. INFORME ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO


Teniendo en cuenta que el día 14 de marzo 2025, por medio de acto administrativo "*ACTA DE INICIO*" se habilita EMSERPUVAG S.A. E.S.P. a ejecutar las cantidades y actividades contempladas en el marco del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025.

Se realiza el reporte de ejecución de actividades contractuales mediante informe de ejecución del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P., donde se realiza la

presentación y entrega del informe reporte No. 01, de los cuales se deriva todo el proceso de contratación, perfeccionamiento y ejecución del Contrato De Obra No. SPO - CO- 001 – 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025, Contrato De consultoría No. SUO-CD-004 DEL 10 DE ABRIL DE 2025. Y contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión No. CD-PS-080-2025 DEL 11 DE ABRIL DE 2025

4.1. UBICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene como objeto "***OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO***", tiene como epicentro desarrollo coordenadas geográficas 0° 25' 58" N, 76° 53' 23" W, vereda La Primavera Municipio Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.



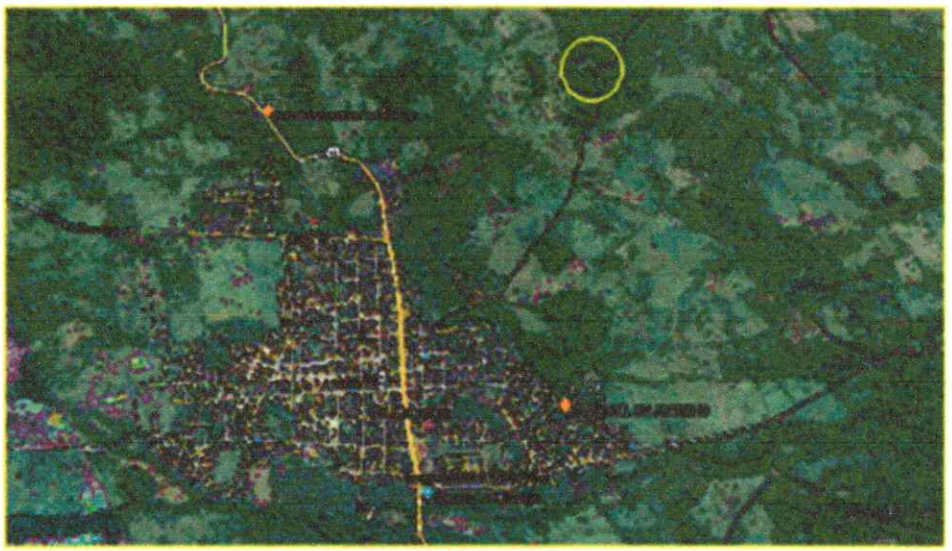


Ilustración 3 Localización general del proyecto

4.2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025

Cumpliendo con lo estipulado en la cláusula séptima – compromisos de las partes se puede describir los siguientes aspectos:

Tabla 14 obligaciones de la empresa – clausula séptima del convenio

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	ACCIONES REALIZADAS
Ser el ejecutor del presente convenio de conformidad al provecto, las especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que hacen parte del convenio.	Se realiza seguimiento permanente a las labores diarias de obra e interventoría con el apoyo a la supervisión dándole cumplimiento a las cláusulas establecidas dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P .
Abrir una cuenta bancaria separada a nombre del proyecto	Se realizo la apertura de la cuenta bancaria en Bancolombia cuenta de ahorros No. 451-000044-26 De fecha 11 de abril de 2025 de los cuales se anexa certificado de cuenta para pago parcial No. 01 del convenio.
Incorporar los recursos girados por el Municipio del Valle del Guamuez al presupuesto de la empresa y manejarlos en la cuenta que se constituya para tal efecto.	Se realizo el respectivo importe de los recursos al presupuesto de la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. de la siguiente manera: • Contrato de obra No. SPO - CO- 001 – 2025 certificados de disponibilidad presupuestal No. 2025000117 del 26 de marzo de 2025 Y Registros presupuestales No. 2025000179 del 10 de abril de 2025. • Contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 según certificados de disponibilidad presupuestal No. 2025000118 del 26 de marzo de 2025 Y Registros presupuestales No. 2025000178 del 10 de abril de 2025,

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	ACCIONES REALIZADAS
	• Contrato de apoyo a la supervisión No. CD-PS-080-2025 y certificados de disponibilidad presupuestal No. 2025000119 del 26 de marzo de 2025 Y Registros presupuestales No. 2025000180 del 11 de abril de 2025.
Suscribir los contratos necesarios para la ejecución del objeto del presente convenio ciñéndose a los lineamentos contemplados en la ley y a los manuales de contratación.	Se suscriben los contratos tanto para obra, de consultoría y apoyo a la supervisión como son: 1. contrato de obra No. SPO - CO- 001 – 2025 DE 10 DE ABRIL DE 2025, contratista M Y M CONSTRUIMOS SAS NIT: 900499424-6 cuyo representante legal es HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO. 2. Contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DE 10 DE ABRIL DE 2025, contratista OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO identificado con cedula de ciudadanía No 87.219.077 DE IPIALES NARIÑO. 3. Contrato prestación de servicios profesionales No. CD-PS – 080 DE 2025 del 11 de abril de 2025, contratista EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.085.342.410 de Pasto Nariño.
El contratista del proyecto deberá Instalar una valla informativa de cada proyecto, de acuerdo con la indicación establecida por la secretaria de planeación y obras públicas municipales asumiendo los costos correspondientes.	No se instala dicha valla de información en el presente periodo debido a que no se ha enviado modelo de valla establecido por la secretaria de planeación y obras públicas municipal.
La empresa deberá garantizar que el operador encargado de la ejecución del contrato adquiera las garantías necesarias para proteger al municipio frente a cualquier riesgo asociado, estas garantías serán las que se plasmen en la cláusula decima garantías del convenio.	En los literales 3.8, 3.9 y 3.10 del presente informe se detalla respectivamente la descripción de pólizas tanto del convenio como de los contratos de obra e interventoría que se derivan del convenio principal con todos sus aportes y respectivas aceptaciones.

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	ACCIONES REALIZADAS
Al finalizar la ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días hábiles, remitir en el informe final fotocopia de los documentos de índole legal y técnico que justifiquen la inversión a la secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal para proyectar el acta de recibo final y liquidación del convenio	No aplica
Entregar fotocopia del extracto bancario del movimiento de la cuenta corriente o de ahorro bancaria donde se efectúe el desembolso formarán parte integral del informe que se obliga a presentar a la Secretaría de Planeación y dichos movimientos deberán estar legalmente soportados.	Se anexa copia del extracto bancario de los pagos recibidos, así como copia de los desembolsos realizados a las respectivas partes involucradas para la ejecución del objeto contractual inicialmente pactados.
Realizar la revisión completa del proyecto con la Secretaría de planeación y de Obras Públicas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas de la obra. En caso de requerirse un diseño adicional, este se encontrará a cargo del beneficiario y deberá someterse a aprobación de la Secretaría de Planeación y de obras Públicas.	Se reviso detalladamente el proyecto inicial de los cuales se está en estudio la posible modificación del convenio debido a las fallas que están presentando los taludes del muro de la celda No. 01 del nuevo sistema, si esto continua así sería de gran importancia realizar el levantamiento de los muros de una manera sofisticada y segura. .
Cumplir con las normas ambientales vigentes para la ejecución de proyectos de Inversión en obras e infraestructura.	Se cumple con todas las normas ambientales pertinentes para el buen uso efectivo de las obras de infraestructura a cabalidad.

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	ACCIONES REALIZADAS
Elevar a consulta de la Secretaría de planeación y obras públicas cualquier modificación al convenio que considere pertinente dentro de la vigencia del mismo con los respectivos soportes técnicos y administrativos que justifiquen la solicitud.	Hasta la fecha no se ha realizado ninguna solicitud de modificación al presente convenio de la referencia. .
Realizar el aporte por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($35.947.328,00 MDA/CTE). Los cuáles serán utilizados para la contratación de la interventoría integral del proyecto y apoyo a la supervisión discriminados de la siguiente manera: interventoría integral del proyecto $ 30.946.019,00 apoyo a la supervisión $5.001.309,00	Se realizo el respectivo aporte de los recursos al presupuesto de la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. de la siguiente manera: • contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 por valor de $30.946.019,00 según Certificados de disponibilidad presupuestal No. 2025000118 del 26 de marzo de 2025 Y Registros presupuestales No. 2025000178 del 10 de abril de 2025. • contrato prestación de servicios de apoyo a la supervisión No. CD-PS-080-2025 del 11 de abril de 2025 por valor de $ 5.001.309,00. Según certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000119 del 26 de marzo de 2025 Y Registros presupuestal No. 2025000180 del 11 de abril de 2025.

4.3. CANTIDADES Y ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO

En las siguientes tablas (15 y 16) se describen las cantidades, actividades y presupuesto discriminado por actividad para su ejecución:

Tabla 15. Cantidades Y Actividades Convenio Inicial

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	**DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA DEL SISTEMA NUEVO**				
1.01	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Ton	4725	44360	$ 209,601,000.00
1.02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Kg	4725	3368	$ 15,913,800.00
1.03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos	m3	708.75	48013	$ 34,029,214.00
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
2.01	Suministro e Instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplen ingreso principal.	m3	731.88	56638.00	$ 41,452,219.00
2.02	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	m2	460.00	48227.00	$ 22,184,420.00
2.03	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ml	15.00	448951.00	$ 6,734,265.00
	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				**$ 329,914,918.00**
	ADMINISTRACION (22%)	**29.00%**			**$ 95,675,326.00**
	IMPREVISTOS (3%)	**1.00%**			**$ 3,299,149.00**
	UTILIDADES (5%)	**4.00%**			**$ 13,196,597.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO (B)	**34.00%**			**$ 112,171,072.00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			**un**	**$ 27,098,852.00**
	TOTAL COSTO OBRA				**$ 469,184,842.00**

818

INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO				$ 30,946,019.00
APOYO A LA SUPERVISION				$ 5,001,309.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 505,132,170.00

4.4. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS.

En la siguiente tabla se describen las actividades y cantidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2025 hasta 10 de mayo de 2025.

Tabla 16. Actividades Contractuales Ejecutadas

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01					
						PRESENTE REPORTE		SALDO POR EJECUTAR		ACUMULADO FINAL	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA DEL SISTEMA NUEVO										
1.01	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Ton	4725	44360	$ 209,601,000.00	1,170.0	$ 51,901,200.00	3,555.00	$ 157,699,800.00	1,170.00	$ 51,901,200.00
1.02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Kg	4725	3368	$ 15,913,800.00	1,170.0	$ 3,940,560.00	3,555.00	$ 11,973,240.00	1,170.00	$ 3,940,560.00
1.03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos	m3	708.75	48013	$ 34,029,214.00	175.50	$ 8,426,281.50	533.25	$ 25,602,932.00	175.50	$ 8,426,281.50
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
2.01	Suministro e Instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplen ingreso principal.	m3	731.88	56638.00	$ 41,452,219.00	292.57	$ 16,570,579.66	439.31	$ 24,881,639.78	292.57	$ 16,570,579.66
2.02	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	m2	460.00	48227.00	$ 22,184,420.00	-	$ 0.00	460.00	$ 22,184,420.00	-	$ 0.00
2.03	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ml	15.00	448951.00	$ 6,734,265.00	12.00	$ 5,387,412.00	3.00	$ 1,346,853.00	12.00	$ 5,387,412.00
	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				$ 329,914,918.00		$ 86,226,033.00		$ 243,688,885.00		$ 86,226,033.00
	ADMINISTRACION (22%)	29.00%			$ 95,675,326.00		$ 25,005,550.00		$ 70,669,777.00		$ 25,005,550.00
	IMPREVISTOS (3%)	1.00%			$ 3,299,149.00		$ 862,260.00		$ 2,436,889.00		$ 862,260.00
	UTILIDADES (5%)	4.00%			$ 13,196,597.00		$ 3,449,041.00		$ 9,747,555.00		$ 3,449,041.00
	TOTAL COSTO DIRECTO (B)	34.00%			$ 112,171,072.00		$ 29,316,851.00		$ 82,854,221.00		$ 29,316,851.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			un	$ 27,098,852.00		$ 6,774,713.00		$ 20,324,139.00		$ 6,774,713.00
	TOTAL COSTO OBRA				$ 469,184,842.00		$ 122,317,597.00		$ 346,867,245.00		$ 122,317,597.00
	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO				$ 30,946,019.00		$ 8,067,701.00		$ 22,878,318.00		$ 8,067,701.00
	APOYO A LA SUPERVISION				$ 5,001,309.00		$ 1,250,327.25		$ 3,750,981.75		$ 1,250,327.25
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 505,132,170.00		$ 131,635,625.25		$ 373,496,544.75		$ 131,635,625.25

4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato de obra.

Tabla 17. Descripción De Las Actividades Desarrolladas.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN**
1,0	**DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA DEL SISTEMA NUEVO.**	
1,1	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Este ítem consiste en el movimiento de residuos sólidos para su respectiva adecuación y conformación de tal forma que el volumen suelto de los residuos sólidos quede compactado sobre el nivel del terraplén. Este ítem se refiere a la conformación, compactación de residuos sólidos que diariamente llegan al relleno sanitario, de tal forma que se realice una adecuación de estos materiales en concordancia a las normas técnicas y ambientales establecidas para este tipo de procedimientos. Procedimiento De Ejecución • Se mueven los residuos sólidos con retroexcavadora. • Se adecua el espacio para conformar capas de 50cm. • Se Compactan los residuos solidos • Se Verifica que el asentamiento de los residuos sea el esperado.
1,2	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Este ítem se refiere al suministro e instalación de cal para estabilización de residuos sólidos, y consiste en añadir la dosis adecuada de cal para mantener el PH a 12 durante el tiempo suficiente (mínimo 2 h) para eliminar o reducir los microorganismos patógenos y los responsables de los olores. Procedimiento De Ejecución • Se esparce la dosis de cal adecuada a los residuos sólidos.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN**
		• Se Verifica que el PH se mantenga en 12 durante 2 horas
1,3	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos.	Este trabajo consiste en el Suministro e Instalación de material de cobertura intermedio y final para tapado de residuos sólidos en los lugares indicados en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. Procedimiento De Ejecución • Se determinan las especificaciones del material de cobertura a utilizar. • Se verifican los niveles para rellenos. • Se Verifican los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales. • Se selecciona el material para relleno. • Se verifican métodos para colocación y compactación del material. • Se aplico y se extendió el material en capas horizontales de 30 cms. • Se rego el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. • Se compacto por medio de equipos manuales y mecánicos. • Se verifico las condiciones finales de compactación y niveles definitivos.
2.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	
2.1	Suministro e Instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplén ingreso principal.	Este trabajo consiste en el Suministro e Instalación de material de arcilla conformar el terraplén del talud sobre la entrada principal de la celda No. 01 del nuevo sistema, en los lugares indicados en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor en capas de 15 cm y realizando la compactación respectiva. . Procedimiento De Ejecución • Se determinan las especificaciones del material de conformación a utilizar. • Se verifican los niveles para rellenos. • Se Verifican los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN**
		• Se verifican métodos para colocación y compactación del material. • Se aplico y se extendió el material en capas horizontales de 15 cms. • Se rego el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. • Se compacto por medio de retroexcavadora de orugas. • Se verifico las condiciones finales de compactación y niveles definitivos.
2,2	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	Este trabajo consiste en el suministro e instalación de geomembrana calibre 40 en los lugares indicados en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. Procedimiento De Ejecución • Se procedió al tendido de la geomembrana y a cada panel se le asigna un número de identificación y de referencia en el dibujo del plano de construcción, • En las uniones mediante traslapes se realizaron una vez que los paños se encuentren plenamente ubicados, La disposición del traslape determina la dirección de movimiento de las máquinas soldadoras de cuña caliente al momento de la soldadura por fusión. • Cumpliendo las especificaciones técnicas los traslapes no presentaron una longitud inferior a 10mm. de modo que los excedentes a ambos costados de la línea tengan el tamaño suficiente para ser asidos con la tenaza del tensiómetro durante los ensayos destructivos. y adicionalmente favorecer a que la fusión sea ejecutada completamente en el traslape. • En la zanja de anclaje se realizó para pozas de almacenamiento, reservorios, etc y se excavo en forma paralela a todo el perímetro del terreno que se impermeabilizó (sección de zanja de 0.30m x 0.30 m).
2,3	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	Esta actividad consiste en la ampliación de chimeneas existentes de acuerdo al avance en las capas de compactación de los residuos sólidos en la celda en operación. Contienen malla electrosoldada de 2 Ml de altura * 0,65 M * 0,8 M para evacuación de gases.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN**
		Procedimiento De Ejecución • Se Consulto el Proyecto sanitario. • Se Consulto las recomendaciones técnicas del fabricante. • Se Realizo el mantenimiento a la estructura de arranque de la chimenea. • Se Coloco la malla electrosoldada alrededor de los puntales. • Se Coloco el templete en alambre galvanizado para darle firmeza a la chimenea. • Se Coloco la tubería de 4" perforada. • Se Coloco la piedra bola preferiblemente de diámetro menos a 16cm.

Los resultados obtenidos de la ejecución del contrato de obra fueron revisadas y aprobadas mediante interventoría que se describen en la anterior tabla.

4.6. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO.

Para el desarrollo del contrato de obra se empleó a:

2. Ingeniero civiles para director de obra y residente de obra
1. Oficial de obra
3. Ayudantes de obra
1. Operador de máquina.;

los equipos que se utilizaron fueron
1. Volqueta.
2. Retroexcavadora
3. Herramienta menor;

para el desarrollo del contrato de consultoría se empleó a un profesional con experiencia en la dirección de interventoría.

4.7. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES.

Una vez revisada las planillas de seguridad social y aportes parafiscales relacionadas en los contratos de obra y consultoría se verifica que los pagos corresponden a lo establecido por la ley.

Tabla 18 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

AÑO Y MES	No. DE PLANILLA DE PAGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR	FECHA DE PAGO
Febrero – Marzo	32686993	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	03/03/2025
Marzo - Abril	32974560	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	31/03/2025
Abril - Mayo	33384218	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	07/05/2025

Tabla 19 Pagos De Seguridad Social Contrato De Obra

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR	No. PLANILLA	VALOR	FECHA DE PAGO	PERIODO
M Y M CONSTRUIMOS SAS	9486167522	$1,832,600	6/05/2025	04/ Abril - Mayo

Tabla 20 Pagos De Seguridad Social Contrato De Consultoría

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR	No. PLANILLA	VALOR	FECHA DE PAGO	PERIODO
Oswaldo Bastidas Melo	9485720047	1.066.700	06/05/2025	04/2025

5. AVANCE CONTABLE, FINANCIERO Y EN TIEMPO

Seguidamente se describen los avances contables, financieros en tiempo y ejecución del contrato de obra y contrato de consultoría celebrados el día 10 de abril de 2025.

5.1. AVANCE CONTABLE Y FINANCIERO.

Los valores relacionados (tabla 22), corresponden al valor financiero y contable avanzado en Contrato De Obra No SPO - CO- 001 - 2025 DEL 10 de abril de 2025, que inicia del 11 de abril al 10 de agosto de 2025, donde se reporta 26.07% por un valor de ($ 122,317,597.00), Así mismo se reporta la ejecución del contrato de consultoría No SUO-CD - 004 - 2025 del 10 de abril de 2025 equivalente al 26.07% por un valor de ($ 8,067,701.00). Así mismo se reporta la ejecución del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-PS-080-2025 equivalente al 25% por un valor de ($ 1,250,327.25) correspondientes al 25. (Tabla 24). De la misma manera se reporta (Tabla 25) el valor equivalente al Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 del 26.06% que asciende a ($131,635,625.25) M/CTE, con el objeto contractual inicial del proyecto y se avanza a satisfacción de las partes.

Tabla 21. Informe Contable Y Financiero Contrato De Obra

CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 469,184,842.00
VALOR ADICIONADO	$ 0.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 469,184,842.00
ANTICIPO CONTRATO (30.00 %)	$ 140,755,452.60
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (26.07%)	$ 122,317,597.00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (86.90)	$ 122,317,597.00
SALDO POR AMORTIZAR (13.10)	$ 18,437,855.60
SALDO POR EJECUTAR (73.93)	$ 346,867,245.00

Tabla 22. Informe Contable Y Financiero Contrato De Consultoría.

CONTRATO DE CONSULTORIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30,946,019.00
VALOR ADICIONADO	$ 0.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 30,946,019.00
ANTICIPO CONTRATO (50.00 %)	$ 15,473,009.50
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (26.07%)	$ 8,067,701.00
VALOR AMORTIZACIÓN (47.86)	$ 7,405,308.50
SALDO POR AMORTIZAR (52.14%)	$ 8,067,701.00
SALDO POR EJECUTAR (73.93%)	$ 22,878,318.00

Tabla 23. Informe Contable Y Financiero Contrato Prestación De Servicios

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5,001,309.00
VALOR ADICIONADO	$ 0.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 5,001,309.00
ANTICIPO CONTRATO (0.00 %)	$ 0.00
CUENTA DE COBRO No. 1 (25%)	$ 1,250,327.25
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (25%)	$ 1,250,327.25
VALOR REAL A PAGAR SEGÚN CUENTA DE COBRO No. 01 (25%)	$ 1,250,327.25
SALDO POR EJECUTAR (75 %)	$ 3,750,981.75
VALOR NETO A PAGAR (25%)	$ 1,250,327.25

Tabla 24. Informe Contable Y Financiero Convenio Interadministrativo

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 505,132,170.00
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**$ 505,132,170.00**
APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO AL CONVENIO:	$ 469,184,842.00
APORTE TOTAL DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. AL CONVENIO:	$ 35,947,328.00
ANTICIPO (30.00 %) APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO	$ 140,755,452.60
ANTICIPO (43.04 %) APORTE TOTAL DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 15,473,009.50
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (26.06%)	$ 131,635,625.25
VALOR EJECUTADO DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO:	$ 122,317,597.00
VALOR EJECUTADO DEL APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 9,318,028.25

5.2. AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA, CONSULTORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS .

Relación de avance respecto al tiempo del contrato de obra y consultoría del 11 de abril al 10 de mayo de 2025.

Tabla 25 Avance En Tiempo contratos de Obra , consultoría y prestación de servicios

CONTRATO DE OBRA, CONSULTORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE INICIO	11 de abril de 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	10 de agosto de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	122 DÍAS
Fecha de reporte:	10 de mayo de 2025
TIEMPO EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	30 DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	92 DÍAS
AVANCE DE OBRA E INTERVENTORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIO RESPECTO AL TIEMPO	24.59%

5.3. AVANCE EN TIEMPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025.

Relación de avance respecto al tiempo Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025 del 14 de marzo al de 10 mayo de 2025.

5.3.1. AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO
Reporte No. 1	14/03/2025	10/05/2025	26.06%	26.06%

Tabla 26. Avance En Tiempo Convenio Interadministrativo

CONVENIO	
FECHA DE INICIO	14 de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	29 de agosto de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	169 DÍAS
FECHA DE REPORTE	10 de mayo de 2025
TIEMPO EJECUTADO	58 DÍAS

PLAZO POR EJECUTAR	111 DÍAS
AVANCE DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RESPECTO AL TIEMPO	34.32%

5.3.2. AVANCE FINANCIERO

Tabla 27. Balance Convenio

VALORES DEL CONVENIO	
Valor Aporte Inicial Del Municipio	$ 469,184,842.00
Valor Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 35,947,328.00
Valor Inicial Del Convenio	$ 505,132,170.00
Valor Adicional Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 0.00
Valor Total Del Convenio	$ 505,132,170.00
Valor Ejecutado Del Convenio (26.06%)	$ 131,635,625.25
VALORES CANCELADOS	
Anticipo Inicial (30.00%) Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 140,755,452.60
ANTICIPO (43.04 %) APORTE TOTAL DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 15,473,009.50

5.3.3. AVANCE PROGRAMACIÓN FINAL

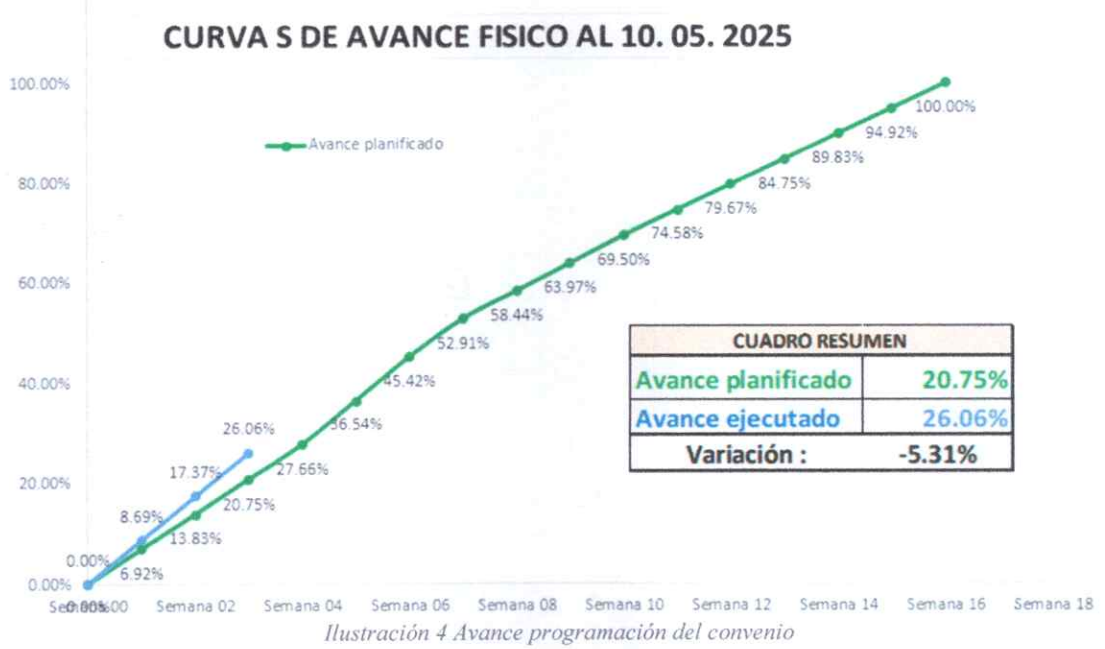


Ilustración 4 Avance programación del convenio

Como se puede observar en la ilustración No. 04 el avance del convenio interadmistrativo con respecto al tiempo, programación inicial y avance financiero real de los cuales se tiene como soporte la pre-acta financiera.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- A la fecha administrativamente se han celebrado las actas de inicio con fecha 14 de marzo de 2025 del convenio interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 del 14 de marzo de 2025, la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. en aras de dar continuidad al trámite administrativo realiza acta de inicio de los contratos de obra e interventoría y prestación de servicios profesionales el día 11 de abril de 2025.

- El desarrollo del convenio de manera coordinada entre la supervisión y el beneficiario del convenio, ha permitido la ejecución normal y eficaz de las obras, evitando así inconvenientes, retrasos o aplazamientos en el progreso de las mismas.

- Se presenta un avance físico ejecutado del 26.06% vs un avance físico programado de 20.75% lo que indica que se da cumplimiento a los plazos acordados y se desarrollan sin mayores contratiempos.

- Avanzas las actividades de todos los ítems a cabalidad, dejando a entera satisfacción de las partes y cumpliendo con el desarrollo del proyecto inicialmente pactado a satisfacción.

- Las actividades ejecutadas a la fecha han permitido la operación de manera ininterrumpida y dentro de la normatividad técnica de todos los componentes del relleno sanitario.

Por La Supervisión

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT No.: 900.304.997-8
SUPERVISOR DE CONTRATOS

Proyecto: Edwin Ricardo Martínez Martínez
Apoyo a la supervisión

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

Libertad y Orden

CONTRATO DE OBRA No.:	SPO - CO- 001 - 2025
OBJETO:	"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"
CONTRATISTA:	M Y M CONSTRUIMOS SAS NIT: 900499424- 6 R.L: HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO
INTERVENTOR:	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS M. Según Contrato de consultoria No. SUO-CD-004-2025
SUPERVISOR:	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

PRE - ACTA No. 01 - AVANCE MES No. 01	
FECHA PRESENTE REPORTE:	sábado, 10 de mayo de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL (a):	$ 469,184,842.00
VALOR ANTICIPO CONTRATO (50%):	$ 140,755,452.60
VLOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL (50%):	$ 0.00
VALOR EJECTADO :	$ 122,317,597.00
AMORTIZACION ANTICIPO (82.09%):	$ 122,317,597.00
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR (17.91) :	$ 18,437,855.60
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	26.07%
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES .
FECHA DE INICIO:	11/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/08/2025

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE REPORTE PARCIAL No. 01							
						REPORTES ANTERIORES		PRESENTE REPORTE		SALDO POR EJECUTAR		ACUMULADO FINAL	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA DEL SISTEMA NUEVO												
1.01	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Ton	4725	44360	$ 209,601,000.00		$ 0.00	1,170.0	$ 51,901,200.00	3,555.00	$ 157,699,800.00	1,170.00	$ 51,901,200.00
1.02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Kg	4725	3368	$ 15,913,800.00		$ 0.00	1,170.0	$ 3,940,560.00	3,555.00	$ 11,973,240.00	1,170.00	$ 3,940,560.00
1.03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos	m3	708.75	48013	$ 34,029,214.00		$ 0.00	175.50	$ 8,426,281.50	533.25	$ 25,602,932.00	175.50	$ 8,426,281.50
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
2.01	Suministro e Instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplen ingreso principal.	m3	731.88	56638.00	$ 41,452,219.00		$ 0.00	292.57	$ 16,570,579.66	439.31	$ 24,881,639.78	292.57	$ 16,570,579.66
2.02	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	m2	460.00	48227.00	$ 22,184,420.00		$ 0.00	-	$ 0.00	460.00	$ 22,184,420.00	-	$ 0.00
2.03	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ml	15.00	448951.00	$ 6,734,265.00		$ 0.00	12.00	$ 5,387,412.00	3.00	$ 1,346,853.00	12.00	$ 5,387,412.00
	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				$ 329,914,918.00		$ 0.00		$ 86,226,033.00		$ 243,688,885.00		$ 86,226,033.00
	ADMINISTRACION (29%)	29.00%			$ 95,675,326.00		$ 0.00		$ 25,005,550.00		$ 70,669,777.00		$ 25,005,550.00
	IMPREVISTOS (1%)	1.00%			$ 3,299,149.00		$ 0.00		$ 862,260.00		$ 2,436,889.00		$ 862,260.00
	UTILIDADES (4%)	4.00%			$ 13,196,597.00		$ 0.00		$ 3,449,041.00		$ 9,747,556.00		$ 3,449,041.00
	TOTAL COSTO DIRECTO (B)	34.00%			$ 112,171,072.00		$ 0.00		$ 29,316,851.00		$ 82,854,222.00		$ 29,316,851.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			un	$ 27,098,852.00				$ 6,774,713.00		$ 20,324,139.00		$ 6,774,713.00
	TOTAL COSTO OBRA INICIAL				$ 469,184,842.00		$ 0.00		$ 122,317,597.00		$ 346,867,246.00		$ 122,317,597.00
					(a)		(c)		(d)		(e)		(f)
					(m)		(o)		(p)		(q)		(r)

POR LA EMPRESA	POR EL CONTRATISTA	POR INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. SUPERVISOR DE CONTRATOS	M Y M CONSTRUIMOS SAS NIT: 900499424- 6 R.L: HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS M. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Contrato consultoria No. SUO-CD-004-2025	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ APOYO A LA SUPERVISION EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO


MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

ITEM Nº:	1.01	DESCRIPCIÓN:	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	UND:	Ton

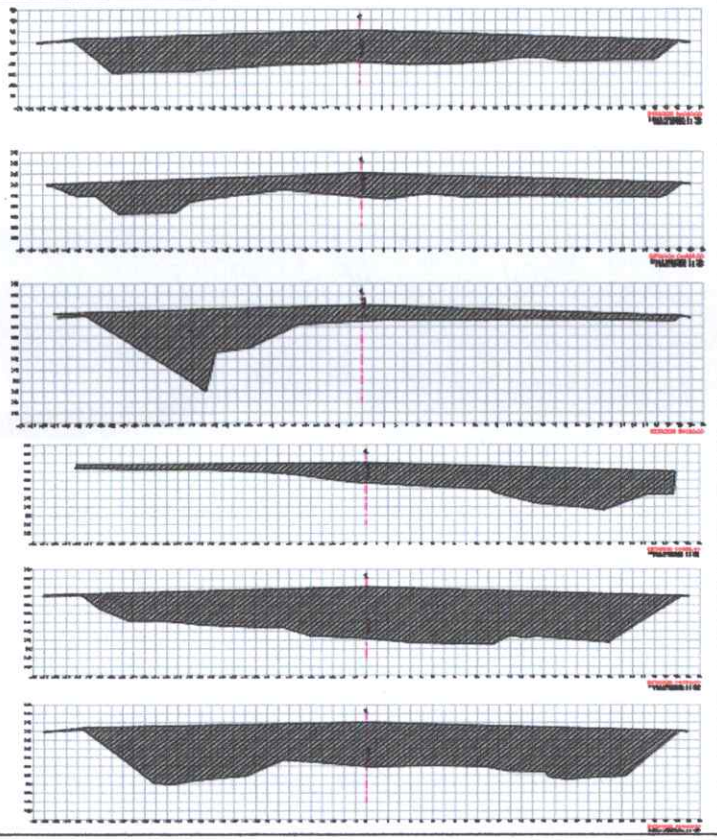ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN [Tramo]	Días Calendario	Días Trabajo	UNIDAD Ton	MEDIDA PARCIAL	VIAJES	MEDIDA TOTAL
							
	ABRIL	20	17	9.00	153.00	5.00	765.00
	MAYO	31	9	9.00	81.00	5.00	405.00
	JUNIO						
	Cantidad Ejecutada					***1,170.00***	Ton
	Cantidad Contractual					***4,725.00***	Ton
	Cantidad Imprevista						
	Cantidad Reporte Informe 1					*1,170.00*	*Ton*
	Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***Ton***
	Cantidad a Pagar presente acta Parcial No. 01					*1,170.00*	*Ton*
	TOTAL						**1,170.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ


EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

ITEM Nº:	1.02	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	UND:	Kg

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

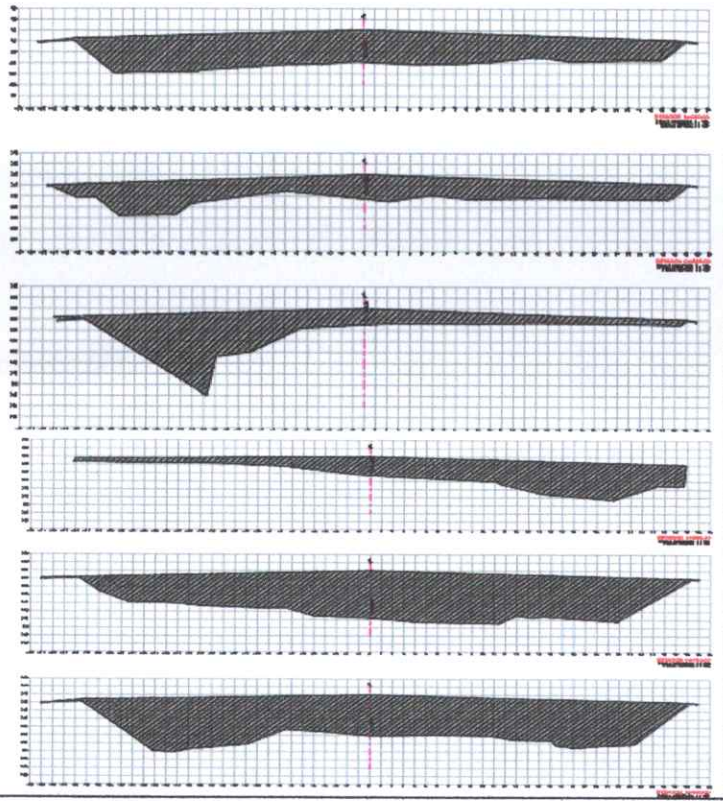

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Dias		UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	VIAJES	MEDIDA TOTAL
	Calendario	Trabajo	Kg			
ABRIL	20	17	9.00	153.00	5.00	765.00
MAYO	31	9	9.00	81.00	5.00	405.00
Cantidad Ejecutada					***1,170.00***	Kg
Cantidad Contractual					***4,725.00***	Kg
Cantidad Imprevista						
Cantidad Reporte Informe 1					*1,170.00*	*Kg*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***Kg***
Cantidad a Pagar presente acta Parcial No. 01					*1,170.00*	*Kg*
TOTAL						**1,170.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ


EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

ITEM Nº:	1.03	DESCRIPCIÓN:	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos	UND:	m3

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

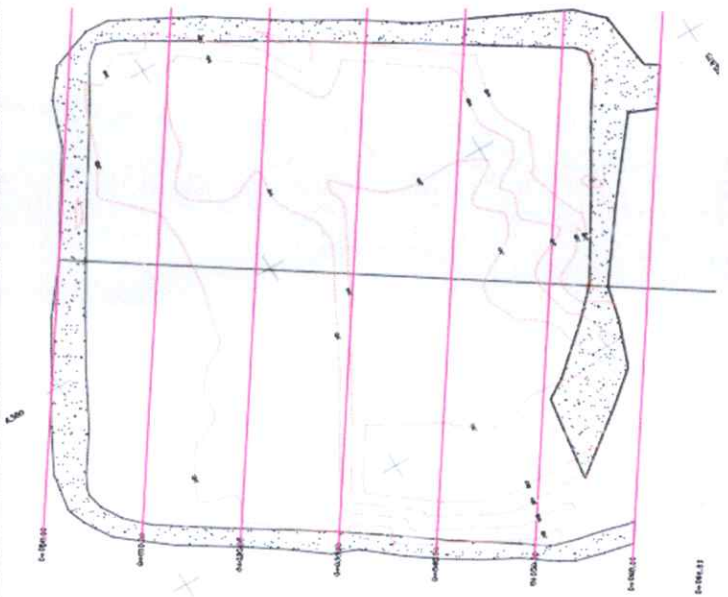

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Dias		UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Calendario	Trabajo	m3			
ABRIL	20	17	1.35	22.95	5.00	114.75
MAYO	31	9	1.35	12.15	5.00	60.75
Cantidad Ejecutada					***175.50***	m3
Cantidad Contractual					***708.75***	m3
Cantidad Imprevista						
Cantidad Reporte Informe 1					*175.50*	*m3*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***m3***
Cantidad a Pagar presente acta Parcial No. 01					*175.50*	*m3*
TOTAL						175.50

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ


EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

ITEM Nº:	2.01	DESCRIPCIÓN:	Suministro e Instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplen ingreso principal.	UND:	m3

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

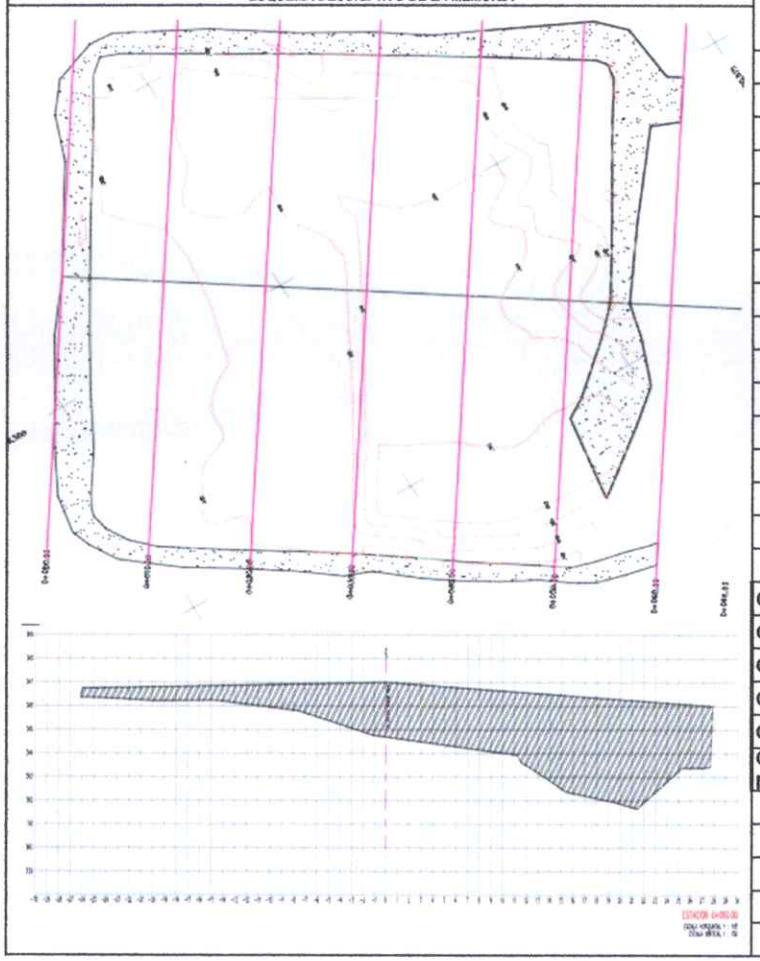

DESCRIPCIÓN [Tramo]	DIMENCIONES				Factor compactacion	MEDIDA TOTAL
	Base menor	Base mayor	Longuitud	Altura		
Entrada principal	6.53	2.5	18.00	9.00	0.40	292.57
Cantidad Ejecutada					***292.57***	m3
Cantidad Contractual					***731.88***	m3
Cantidad Imprevista						
Cantidad Reporte Informe 1					*292.57*	*m3*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***m3***
Cantidad a Pagar presente acta Parcial No. 01					*292.57*	*m3*
TOTAL						292.57

834

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ


EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

ITEM Nº:	2.02	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	UND:	m2

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

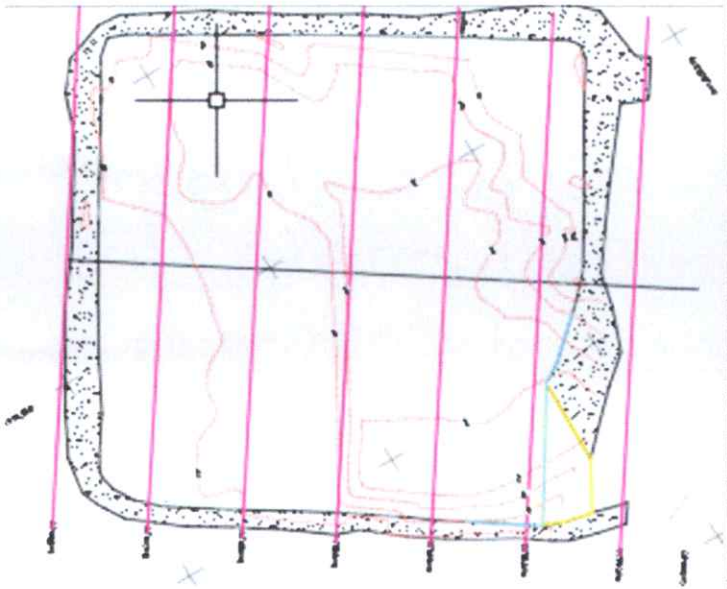

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Secciones		DIMENCIONES		Factor compactacion	MEDIDA TOTAL
		Altura	Longitud	Ancho		
Muro Entrada		12.00		18.00		0.00
Muro talud Izquierdo		12.00		18.00		0.00
Base Celda			9.50	11.00	0.00	0.00
		Traslapo			6.5%	0.00
Cantidad Ejecutada					***0.00***	0.00
Cantidad Contractual					***460.00***	0.00
Cantidad Imprevista						
Cantidad Reporte Informe 1					*0.00*	*0.00*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***0.00***
Cantidad a Pagar presente acta Parcial No. 01					*0.00*	*0.00*
TOTAL						0.00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

"OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

ITEM Nº:	2.03	DESCRIPCIÓN:	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	UND:	ml

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN [Tramo]			DIMENCIONES			MEDIDA TOTAL
			Longuitud	Espesor	Total	
Chimenea 1			3.00		1.00	3.00
Chimenea 2			3.00		1.00	3.00
Chimenea 3			3.00		1.00	3.00
Chimenea 4			3.00		1.00	3.00
Chimenea 5			3.00			0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Cantidad Ejecutada					***12.00***	ml
Cantidad Contractual					***15.00***	ml
Cantidad Imprevista						
Cantidad Reporte Informe 1					*12.00*	*ml*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***ml***
Cantidad a Pagar presente acta Parcial No. 01					*12.00*	*ml*
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						**12.00**

Reviso:	Elaboró:	Aprobó:	Vo.Bo.
HUGO ARMANDO CASTRO RL. M Y M CONSTRUIMOS SAS Contratista de Obra	KRUZ HERMER GOMEZ GOMEZ INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS M. Ingeniero Civil Contratista de Interventora	Edwin Martinez EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ APOYO A LA SUPERVISION EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

536

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085342410	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	calle14#4-30 barrio Santa Clara	7777777	edwin29martinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	17/06/2025	87437779	$417.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	42	4.900	0	182.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	42	6.300	0	234.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	42	0	0	0
ICBF				
0	42	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	182.900
Pensión	1	227.800	234.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	417.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085342410	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	calle14#4-30 barrio Santa Clara	7777777	edwin29martinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	17/06/2025	87437779	$417.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilleva	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VIT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085342410	MARTINEZ MARTINEZ EDWIN RICARDO	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085342410	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	calle14#4-30 barrio Santa Clara	7777777	edwin29martinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Indeoendiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
87437779	17/06/2025				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-04	2025-04	N	25/06/2025	87683362	TOTAL A PAGAR	
					$35.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	34.700				34.700	51	1.200	35.900			347	35.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	51	0	0	0
ICBF				
0	51	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	34.700	35.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	34.700	35.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085342410	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	calle14#4-30 barrio Santa Clara	7777777	edwin29martinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
87437779	17/06/2025	N	26/06/2025	87683362	EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-04				$35.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colmo. Asociar	Extranjero	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085342410	MARTINEZ MARTINEZ EDWIN RICARDO	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

8 de 8

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA INDEPENDIENTES 2025

Para efectos de los requisitos de índole tributaria contemplados en la ley 2277 del 13 de diciembre de 2022 que debo acreditar ante la entidad; me permito manifestarle bajo la gravedad del juramento que:

Yo, **EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ**, identificado(a) con **C.C. 1.085.342.410 de Pasto N.**, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 383 del Estatuto Tributario, como persona actualmente residente en Colombia certifico que, en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD-PS-080-2025** de del 11 de abril de 2025.

1. **SI:**____ **No:** _x___ Para la aplicación de la Retención en la Fuente, me permito certificar que soy declarante del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios.
2. __0__ **%.** Solicito que me sea aplicada una tarifa de retención en la Fuente, superior a la establecida, equivalente al porcentaje.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, para efectos de disminución en la Retención en la fuente estoy anexando certificaciones de:
   - ___ Intereses de Vivienda o Leasing habitacional
   - ___ Medicina prepagada o Póliza de salud
   - ___ Cuentas AFC
4. **SI:**_x___ **No:** ____ Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de 2012, tengo personas dependientes.

SÓLO DEBE SER DILIGENCIADA POR CIUDADANOS EXTRANJEROS

5. **SI:**____ **No:** ____ Soy extranjero residente en Colombia.

Certifico que los documentos soportes que presento del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión, ARL y voluntarios AFC, medicina prepagada, intereses de vivienda o costo financiero de Leasing habitacional , deducción de dependientes, cumplen con los requisitos de monto y periodicidad establecidos en las normas vigentes, y los ingresos corresponden al Contrato suscrito con la Empresa EMSERPUVAG S.A. ESP y que éstos no han sido ni serán presentados a otra entidad.

Se firma en La Hormiga Municipio Valle del Guamuez, a los 25 días del mes de junio del 2025

Edwin Martinez

EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ
C.C. No. **1.085.342.410 de Pasto N.**
Contratista

8-42

CUENTA DE COBRO No. 01
Contrato No. CD-PS-080-2025 del 11 de abril de 2025.

LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT 900.304-997-8

Debe a:

EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ
C.C. No. **1.085.342.410 de Pasto N.**
No responsable de IVA

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTICINCO centavos M/TE ($ 1,250,327.25)

Por concepto de la ejecución parcial del contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-PS-080-2025 del 11 de abril de 2025, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ."**

Actividades que se ejecutaron durante el periodo comprendido entre el once (11) de abril de 2025 hasta el día diez (10) de mayo de 2025.

Se firma en el Valle del Guamuez - la Hormiga - Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025.

Edwin Martinez

EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ
C.C. No. **1.085.342.410 de Pasto N.**
Contratista

INFORME DE SUPERVISION DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación 25 DE JUNIO DE 2025	**Nombre del Contratista:** EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	**No Contrato:** CD-PS-080 del 11/04/2025	**Acta de ejecución No.** 01
Periodo de Supervisión de ejecución de obligaciones:	DEL 11 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2025	**Supervisor:** CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA **Dependencia:** GERENCIA	**Apoyo a la supervisión:** N/A
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO. DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Nombre de Contratista	EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ			
Cédula de Ciudadanía	1.085.342.410 de Pasto N.			
Dirección	BARRIO TRECE DE JUNIO			
Celular	311 2813318			
Fecha de Suscripción	11 DE ABRIL DE 2025			
Fecha de Inicio	11 DE ABRIL DE 2025			
Fecha de Terminación	10 DE AGOSTO DE 2025			
Fecha de Terminación Anticipada	(N/A)			
Plazo	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Suspensión	N/A			
Fecha de Reinicio	N/A			
Valor Inicial	CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,001,309.00)			
Forma de Pago	El valor del contrato será cancelado en cuatro (04) pagos iguales correspondiente a mensualidades vencidas por valor de actas de ejecución de actividades, por el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS DE PESO MONEDA CORRIENTE ($1.250.327,25)			
Prorrogas	Prorroga 1	N/A	Prorroga 2	N/A
Adiciones	Adición 1	$ 0,00	Adición 2	$ 0,00
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:			$ 1.250.327,25
	Actas de ejecutadas:			UNA (01) ACTA EJECUTADA
	Porcentaje de Ejecución:			25%
ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del Contrato			$ 5,001,309.00
	Valor adicional no. (según sea el caso)			$ 0,00
	Valor de Reducciones (según sea el caso)			$ 0,00
	Valor Total del Contrato:			$ 5,001,309.00
	Valor de Pagos Parciales			$ 0,00
	Saldo Pendiente por pagar			$ 1.250.327,25
	Saldo Pendiente por Ejecutar			$ 3.750.981,75

	obra, informes de interventoría y supervisión, viabilidad adicional, prorroga, modificatorios, cantidades de obra, entre otros.		• Se realizo la revisión de la documentación soporte pago anticipo contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025 como plan de inversión del anticipo, cuenta de cobro. • Se realizo la revisión de la documentación soporte pago anticipo contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025 como plan de inversión del anticipo y cuenta de cobro.
	Apoyar al supervisor del contrato en la actualización de la base de datos correspondiente y manteniendo actualizado del expediente contractual para facilitar el seguimiento y el cumplimiento de las normas contractuales que rigen la materia.	**25%**	El contratista cumplió con la obligación del contrato, En este mes de abril se realizó la revisión de la documentación de la siguiente manera: • Dentro del periodo de reporte del presente informe se tiene los respectivos contratos, compromiso presupuestal, pólizas, aprobación de pólizas, actas de inicio, cuentas de cobro, plan de inversión del anticipo, programación de proyecto, recibo de ingresos estampillas, comprobante de egreso de anticipos tanto de contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 como de consultoría No. SUO-CD-004-2025.
	Apoyar al supervisor del contrato en la publicación y cargue de información de documentación técnica y administrativa que se genere en el ejercicio del apoyo, incluye los trámites para las suspensiones, adiciones, prorrogas, liquidaciones, terminaciones anticipadas.	**25%**	El contratista cumplió con la obligación en este mes de abril se ha reportado las siguientes actividades como son: • Durante el periodo del presente informe se ha proyectado el acta de inicio contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 con fecha 11/04/2025. • Durante el periodo del presente informe se ha proyectado el acta de inicio de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 11/04/2025. • Durante el presente periodo se aprueba cambio ingeniero director de obra con fecha 11 de abril de 2025.
	Proyectar la presentación de informes de supervisión respecto al avance y ejecución de las obras, los cuales deben contemplar, para su elaboración, los aspectos técnicos, administrativos y financieros de los contratos sobre el cual se ejerce supervisión, así como registro de medidas de cantidades ejecutadas y registro fotográfico sobre las mismas, así mismo, como avances de obra, elaborar actas parciales, actas finales	**25%**	El contratista cumplió con la obligación del contrato. • Para el presente periodo se contempla pre acta de avance mensual según reporte de actividades contratista de obra e interventoria, según las condiciones del contrato principal.

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION			
DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 25 DE JUNIO DE 2025	**Nombre del Contratista:** **EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ**	**No Contrato:** CD-PS-080 del 11/04/2025	**Acta de ejecución No.** 02
Periodo de ejecución de actividades:	DEL 11 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2025	**Supervisor:** CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA **Dependencia**: GERENCIA	**Apoyo a la supervisión:** (NO APLICA)
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
Nombre de Contratista	**EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ**			
Cédula de Ciudadanía	**1.085.342.410 de Pasto N.**			
Dirección	BARRIO TRECE DE JUNIO			
Celular	311 2813318			
Correo	Edwin29martinez@gmail.com			
Número de cuenta Cuenta de Ahorros No. 91207508387		**Nombre del Banco**	BANCOLOMBIA	
Aportes Seguridad Social	**No de Planilla:**	87437814	**EPS**	Sanitas EPS
	Fecha de pago:	17/06/2025	**AFP**	Porvenir
	Mes Pagado:	MAYO		
	No de Planilla:	87683395	**ARL**	Vida Colpatria S:A.
	Fecha de pago:	25/06/2025		
	Mes Pagado:	MAYO		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
Fecha de suscripción	11 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Inicio	11 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Terminación	10 DE AGOSTO DE 2025
Plazo	CUATRO (04) MESES
Forma de pago	El valor del contrato será cancelado en cuatro (04) pagos iguales correspondiente a mensualidades vencidas por valor de actas de ejecución de actividades, por el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS DE PESO MONEDA CORRIENTE ($1.250.327,25)
Valor Inicial	CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,001,309.00)

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En condición de Contratista vinculado a EMSERPUVAG S.A. E.S.P. mediante contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE

ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, se presenta el informe de ejecución de actividades, para el cobro de la primera acta, de acuerdo con las actividades específicas señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	RESULTADO	% EJECUCIÓN	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
1	Apoyar en el ejercicio de la supervisión que ostenta la gerencia del proyecto y contrato en su etapa contractual y post contractual.	- En el presente mes se reporta informe de avance parcial No. 01 del Contrato De Obra No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025, el cual se revisa los soportes de documentación que soportan el acta parcial. - En el presente mes se reporta informe de avance parcial No. 01 Contrato De Consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025, el cual se revisa los soportes de documentación que soportan el acta parcial.	50%	ANEXO. Copia acta recibo parcial No. 01 Contrato De Obra No. SPO-CO-001-2025 Copia acta recibo parcial No. 01 Contrato De Consultoría No. SUO-CD-004-2025
2	Apoyar al supervisor del contrato en la revisión técnica de documentos propios a la ejecución de un contrato de obra, informes de interventoría y supervisión, viabilidad adicional, prorroga, modificatorios, cantidades de obra, entre otros.	Se revisa informe de avance parcial No. 01 del Contrato De Obra No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025, por el CONTRATISTA: MYM CONSTRUIMOS S.A.S NIT. 900499424-6 R. Legal HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO. C. C. NO. 12.978.350 DE PASTO N. - Se reviso el acta parcial No. 01 contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025 por valor de $ 160,519,287.40. - Se realizó la revisión del acta parcial financiera No. 01 contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025 y sus respectivas memorias de cantidades de obra. Se revisa informe de avance parcial No. 01 del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025 presentado por el CONTRATISTA: I.C. OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO No. 87.219.077 DE IPIALES – NARIÑO. - Se reviso el acta parcial No. 01 contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025 por valor de $ 19,871,175.00.	50%	ANEXO Copia acta parcial No. 01 contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 Copia acta parcial financiera No. 01 contrato de obra No. SPO-CO-001-2025 Copia acta parcial No. 01 contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025
3	Apoyar al supervisor del contrato en la actualización de la base de datos correspondiente y	- Se reporta actualización de avance de contratos por un valor del 64.21%. del Contrato De Obra No. SPO-CO-001-2025 DEL 10/04/2025 donde se anexa informe	50%	ANEXO

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	RESULTADO	% EJECUCIÓN	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
	manteniendo actualizado del expediente contractual para facilitar el seguimiento y el cumplimiento de las normas contractuales que rigen la materia.	avance No. 01, acta de recibo parcial No. 01 financiera y sus respectivas memorias de cantidades de obra, copia seguridad social y aportes parafiscales personal de obra, registro fotográfico, copia bitácora de obra, copia certificada de cuenta y registro único tributario, resolución de facturación vigente y factura electrónica, aval de interventoría acta parcial No. 01. - Se reporta actualización de avance de contrato por un valor del 64.21%. del contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 DEL 10/04/2025 donde se anexa informe avance No. 01, acta No. 01 para contrato de consultoría, acta de recibo parcial No. 01 financiera y sus respectivas memorias de cantidades de obra, copias planillas de seguridad social personal de interventoria, registro fotográfico, copia bitácora de obra, copia certificada de cuenta y registro único tributario, resolución de facturación vigente y factura electrónica.		INFORME ACTA PARCIAL No. 01
4	Apoyar al supervisor del contrato en la publicación y cargue de información de documentación técnica y administrativa que se genere en el ejercicio del apoyo, incluye los trámites para las suspensiones, adiciones, prorrogas, liquidaciones, terminaciones anticipadas.	- Durante el presente periodo No existe ningún trámite para las suspensiones, adiciones, prorrogas, liquidaciones, terminaciones anticipadas.	50%	N/A
5	Proyectar la presentación de informes de supervisión respecto al avance y ejecución de las obras, los cuales deben contemplar, para su elaboración, los aspectos técnicos, administrativos y financieros de los contratos sobre el cual se ejerce supervisión, así como registro de medidas de cantidades ejecutadas y	SE realiza la proyección del informe de supervisión No. 02 EMSERPUVAG S.A. E.S.P. para el seguimiento del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025. Con sus respectivos soportes Como es: • Contrato De Obra No. SPO-CO-001-2025 se anexan los siguientes documentos: o Copia de contrato o Copia compromiso presupuestal	50%	INFORME ACTA PARCIAL No. 01

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	RESULTADO	% EJECUCIÓN	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
	registro fotográfico sobre las mismas, así mismo, como avances de obra, elaborar actas parciales, actas finales de obra, suspensión temporal, reinicio, prorroga o modificaciones a que haya lugar.	o Copia polizas de garantías contrato de obra y su respectiva aprobación o Copia acta de inicio de obra o Copia Cuenta de cobro anticipo o Copia Plan de inversión del anticipo o Copia programación de obra o Copia certificado de cuenta o Copia Recibo de caja por pago de estampillas o Comprobante de egreso y sus respectivos soportes de pago anticipo o informe avance No. 01 o copia acta de recibo parcial No. 01 financiera o copia memorias de cantidades de obra o copia seguridad social y aportes parafiscales personal de obra o registro fotográfico o copia bitácora de obra o copia certificada de cuenta o registro único tributario o resolución de facturación vigente o factura electrónica o aval de interventoria para pago parcial No. 01 • CONTRATO DE CONSULTORIA No. SUO-CD-004-2025 se anexan los siguientes documentos: o Copia de contrato o Copia compromiso presupuestal o Copia polizas de garantías contrato de obra y su respectiva aprobación o Copia Recibo de caja por pago de estampillas o Copia acta de inicio de obra		

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	RESULTADO	% EJECUCIÓN	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
		○ Copia Cuenta de cobro anticipo ○ Copia Plan de inversión del anticipo ○ Copia certificado de cuenta ○ Comprobante de egreso y sus respectivos soportes de pago anticipo ○ informe avance No. 01 ○ acta recibo parcial No. 01 contrato de consultoria ○ copia acta de recibo parcial No. 01 financiera de obra ○ copia memorias de cantidades de obra ○ copia seguridad social y aportes parafiscales personal de consultoria ○ registro fotográfico ○ copia bitácora de obra ○ copia certificada de cuenta ○ registro único tributario ○ resolución de facturación vigente ○ factura electrónica ○ aval de interventoría para pago parcial No. 01 • Contrato prestación de servicio CD-PS-080 del 11/04/2025 ○ Copia informe No. 01 periodo 11 de abril hasta 10 de mayo de 2025. ○ Copia seguridad social profesional de apoyo abril. ○ Copia cuenta de cobro periodo 1 ○ Copia informe No. 02 periodo 10 de mayo de 2025 hasta 14 de junio de 2025. ○ Copia seguridad social profesional de apoyo mayo. ○ Copia cuenta de cobro periodo 2		

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	RESULTADO	% EJECUCIÓN	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
6	Apoyar al supervisor del contrato en la presentación de informes periódicos y cuando se solicite por el supervisor, presentar informes a entes de control y comunidad en general.	- SE realiza la proyección del Informe Acta Parcial No. 01 EMSERPUVAG S.A. E.S.P. para el seguimiento del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025. Con sus respectivos soportes.	50%	ANEXO} Copia Informe de supervisión No. 02

Avance de las actas de ejecución:

- **1. Acta de ejecución**

Del periodo comprendido entre el 11 de mayo de 2025 hasta el 10 de junio de 2025

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Certificado Disponibilidad Presupuestal N°	2025000119	**Fecha**	26-03-2025	**Valor**	$ 5.001.309
Registro Presupuestal N°	2025000180	**Fecha**	11-04-2025	**Valor**	$ 5.001.309
Estampillas (recibo de caja)	PRO ANCIANOS	**4%**	N°2025002512	**Valor**	$ 266.000

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS AL DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

Se deja constancia de que únicamente se brindó apoyo profesional en los documentos en los cuales se encuentra mi firma.

4. ANEXOS DEL INFORME

- Planilla de pago de seguridad social (PILA) Mes mayo 2025.
- Evidencias de cumplimiento de actividades (anexos)

5. FIRMAS

El presente Informe de contratista, se firma el veinticinco (25) de junio de 2025.

CONTRATISTA:
Edwin Martinez
EDWIN RICARDO MARTINEZ MARTINEZ
1.085.342.410 de Pasto N.
