Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Agencia Nacional de Seguridad Vial

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PA-099-2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA NO. 2"

INFORME DE GESTION SST Y AMBIENTAL No. 1

VERSIÓN 3




29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025

JULIO DE 2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTROL DE REVISION

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES
01	06/06/2025	La entidad emite observaciones bajo radicado No. 20253000055881
02	04/07/2025	La entidad emite observaciones bajo radicado No. 20253000068251
03	26/07/2025	Radicación del documento

	ESTADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
INTERVENTORIA	ELABORÓ	Yulieth Carolina Galvis Reyes	Tecnico SST		04/07/2025
		Lizette Tatiana Sabogal Rico	Profesional Ambiental		04/07/2025
	REVISÓ	Ing. Roberto Pablo Silva	Director		04/07/2025
	APROBO	Ing. Roberto Pablo Silva	Director		04/07/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 6

CAPITULO I. INFORMACION BASICA.....7

CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 9

CAPITULO 3. ACTIVIDADES GENERALES.....13

CAPITULO 4 ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA.....14

4.2 AMBIENTAL – CONTRATISTA DE OBRA.....25

CAPITULO 5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES INTERVENTORIA.....29

5.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – INTERVENTORIA 29

CAPITULO 6. SEGUIMIENTO SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORIAL AL CONTRATISTA DE OBRA 41

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....49

ANEXOS 50

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Datos generales del contrato de Interventoría....7
Tabla 2.Profesionales ambiental y SST contratista e interventoría....8
Tabla 3.Diseños integrales de seguridad vial asignados a la zona 2 para intervención en el marco del programa OPV....10
Tabla 4. Personal de Obra....14
Tabla 5. Ingresos de personal....15
Tabla 6. Inducciones realizadas....16
Tabla 7. Reporte retiros en el periodo....17
Tabla 8. Actividades realizadas durante el periodo....18
Tabla 9. Cronograma de actividades....18
Tabla 10. Cronograma de capacitaciones....19
Tabla 11. Cronograma de capacitaciones....19
Tabla 12. Registro de pago de aportes a la seguridad social....20
Tabla 13. Reporte de accidentes laborales....20
Tabla 14. Reporte HHT....21
Tabla 15. Reporte manejo de RCD´S....25
Tabla 16. Reporte residuos reciclables....25
Tabla 17. Reporte de residuos peligrosos....26
Tabla 18. Reporte residuos ordinarios....26
Tabla 19. Inventario de sumideros....26
Tabla 20. Inventario de especies forestales....27
Tabla 21. Reporte visitas de seguimiento....27
Tabla 22. Reporte de actividades ambientales....28
Tabla 23. descripción de cronograma de capacitaciones....28
Tabla 24. Cronograma de actividades ambientales....28
Tabla 25. Reporte de personal mínimo requerido....29
Tabla 26. Reporte de ingresos en el periodo....30
Tabla 27. Reporte de inducciones....31
Tabla 28. Reporte de retiros en el periodo....32
Tabla 29. relación entrega de elementos de protección personal....33
Tabla 30. Plan de trabajo SST....33
Tabla 31. descripción de actividades planeadas, ejecutadas y pospuestas....34
Tabla 32. Cronograma de capacitaciones....35
Tabla 33. descripción de capacitaciones....35
Tabla 34. Reporte de pagos a la seguridad social....36
Tabla 35. Reporte de AT....36
Tabla 36. HHT....37
Tabla 37. Estado de productos e informes contratista....41
Tabla 38 Estado de productos e informes interventoría....42
Tabla 39. Relación personal ICOVIAS aprobado por la interventoría....43
Tabla 40. Relación personal ICOVIAS aprobado por la interventoría....44
Tabla 41. Correspondencia enviada....45
Tabla 42. Correspondencia recibida....46
Tabla 43. Mesas de trabajo....47
Tabla 44. Relación requerimientos, solicitudes....47
Tabla 45. relación incumplimientos y procesos de sanción....48

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización de los municipios que hacen parte de la Zona 2 - OPV.....9

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ABREVIATURAS

ANSV	Agencia Nacional de Seguridad Vial
APU	Análisis de precios unitarios
EDT	Estructura de desglose del trabajo
ET	Entidad Territorial
OPV	Obras por la vida
PMT	Plan de manejo de tráfico
SIG	Sistema de información geográfica
SST	Seguridad y salud en el trabajo

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV considera necesario atender prioritariamente los puntos o tramos críticos con mayor siniestralidad del país, en la red vial departamental, municipal y nacional no concesionada en el territorio nacional, realizando medidas de seguridad vial para mitigar los riesgos identificados.

En este sentido, la ANSV ha suscrito convenios interadministrativos, en el marco del programa "*Obras por la Vida*", con los entes territoriales u organismos responsables de la administración vial de los tramos críticos priorizados, con el objeto de: "*Aunar esfuerzos entre la ANSV y el organismo o entidad responsable, con el fin de implementar programas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad vial en los puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad priorizados en la red vial no concesionada a cargo del ente territorial o entidad responsable, y favorecer la mitigación de riesgos para proteger a los actores viales más vulnerables*".

Como parte del desarrollo de este programa, se llevó a cabo una invitación abierta privada N° 004 DE 2024 cuyo objeto es "***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONESEN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL YMITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.***

En el marco del contrato de interventoría N° PA-099-2025, se adjudica a CONSORCIO INTERSEG la zona 2 de intervención, correspondiente a los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.

El contrato tiene una duración de 10,5 meses, a ejecutar en cuatro fases así:

- Fase I: Plan de gestión y cronograma de actividades.
- Fase II: Implementación de diseños integrales de seguridad vial.
- Fase III: Toma, procesamiento y análisis de información para la evaluación de impacto.
- Fase IV: Resultados e informa final de obra.

Como parte de la fase I, este documento presenta el INFORME MENSUAL No. 1 comprendido entre el 29 de abril y el 28 de mayo de 2025, servirá para el desarrollo de los compromisos contractuales adquiridos, el cual contiene el alcance del contrato.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO I. INFORMACION BASICA

Datos del CONTRATANTE y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. NIT. 830.053.630-9.
Nombre del CONTRATISTA y documento de identificación:	CONSORCIO INTERSEG NIT: 901907415-5 Representante Legal Principal SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. N° 1.062.398.686 de San Diego, Cesar. Representante Legal Suplente: ADRIANA LUCIA ORTIZ TORRES C.C. N° 52.093.613 de Bogotá D.C.
Objeto del contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 2"
Valor del contrato:	**MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.275.343.944),** incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia definitivos.
Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión	569 del 16 de junio de 2024.
Plazo del contrato:	Diez meses y medio (10,5), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
Identificación garantía	Responsabilidad Civil Extracontractual NB-100097143 Seguros mundial Póliza de cumplimiento NB-100375248 de Seguros mundial
Fecha de aprobación de garantía	Póliza de cumplimiento, aprobada en fecha veinte (20) de marzo de 2025 póliza RCE, aprobada en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2025
Fecha de inicio	Veintinueve (29) de abril de 2025
Fecha de terminación:	Quince (15) de marzo de 2026

Tabla 1.Datos generales del contrato de Interventoría

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Profesionales componente SST y ambiental

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ENTIDAD
YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	37550635	TECNICO SST	CONSORCIO INTERSEG
LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO	1010199370	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO INTERSEG
YULID LILIANA GELVES	46387367	TECNICO SST	ICOVIAS
RINA ROCÍO GUTIÉRREZ DURÁN	51775787	PROFESIONAL AMBIENTAL	ICOVIAS

Tabla 2.Profesionales ambiental y SST contratista e interventoría.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Datos generales del contrato

El contrato de **interventoría** hace parte del programa "Obras por la Vida" (OPV), el cual contempla la intervención en lugares que la ANSV ha identificado con alta incidencia de siniestros viales graves o con un riesgo potencial. A cargo de Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV se adjudica la zona 2 de intervención, correspondiente a los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico. Para esta zona la ANSV ha asignado un total de 8 municipios, cuya localización general se muestra en la siguiente figura.

Figura 1 Localización de los municipios que hacen parte de la Zona 2 – OPV



Fuente: Elaboración propia.

En total se han asignado a la zona 2 un total de 32 diseños integrales de seguridad vial, para intervención en el marco del programa OPV.

En la siguiente tabla se indican los puntos y/o tramos específicos a intervenir.

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DIVIPOLA DEL DISEÑO	COORDENADAS O PR INICIAL Y PR FINAL	DIRECCIÓN O CÓDIGO VÍA
1	Cesar	Aguachica	20011-003	8.30499, -73.62106	Calle 9 con Carrera 12
2			20011-001	8.30668, -73.62646	Calle 7 con Carrera 8
3			20011-002	8.30975, -73.60339	Calle 5 con Carrera 33
4			20011-008	8.3144, -73.6069	Carrera 29 con calle 1ra
5			20011-017	8.3056, -73.5999	Carrera 37 Calle 10N
6		Valledupar	20001-012	10.4824, -73.25661	I.E. SAN JOAQUÍN Calle 9A 13-44

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DIVIPOLA DEL DISEÑO	COORDENADAS O PR INICIAL Y PR FINAL	DIRECCIÓN O CÓDIGO VÍA
7			20001-015	10.46356, -73.23564	I.E. MANUEL GERMAN CUELLO Calle 24 No. 4D-015
8			20001-017	10.45007, -73.25102	I.E. ALFONSO ARAUJO COTES Carrera 22 No.35-42
9			20001-014	10.46953, -73.2471	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80
10			20001-016	10.45896, -73.25948	I.E. TÉCNICO UPAR Diagonal 19 No.23-014
1	Magdalena	Ciénaga	47189-001	11.0119, -74.2549	Calle 7 con Carrera 7
2			47189-002	11.0122, -74.2537	Calle 7 con Carrera 9
3			47189-012	11.0072, -74.2488	Calle 18 entre Carrera 14 y 17
4			47189-016	11.0120, -74.2543	Calle 7 con Carrera 8
5			47189-022	11.0131, -74.2493	Calle 7 con Carrera 15
6		Santa Marta	47001-002	11.2423, -74.2041	Carrera 12 Avenida de los Estudiantes desde la Calle 14 o Avenida del Libertador hasta la Calle 30.
7			47001-014	11.2422, -74.1940	Carrera 19 con Calle 12 Esquina Intersección
8			47001-015	11.2411, -74.1902	Avenida del Libertador con Carrera 21
9			47001-017	11.2254, -74.1980	Prolongación Carrera 19 en intersección con la Carrera 23 (Ciudadela 29de Julio) y la Calle 23
10			47001-001	11.2398, -74.2091	Calle 22 con Carrera 7
1	Atlántico	Suan	08770-001	10.3385, -74.8791	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR – CLL 5 No. 22 - 30
2		Ponedera	08560-001	10.510030, -74.812448	I.E. RAFAEL NUÑEZ- CARRERA 19 No. 3-50
1	Guajira	Fonseca	44279-007	10.8857, -72.8497	Carrera 17 con Calle 17
2			44279-008	10.8949, -72.8292	Instituto Cristo Rey ubicado en la Salida Fonseca, Barrancas.
3			44279-010	10.8896, -72.8622	Institución Educativa Técnica - Agropecuaria De Fonseca
4			44279-005	10.8851, -72.8553	Carrera 21 entre 16 y 17
5		Riohacha	44001-003	11.541317, -72.911391	Carrera 15 con Calle 11
6			44001-018	11.539635, -72.912236	Calle 16 Carrera 12
7			44001-019	11.5366, -72.9180	Calle 18 Carrera 16 – Institución educativa
8			44001-012	11.5460, -72.9153	Carrera 15 entre Calle 12 y 13, Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla
9			44001-014	11.5434, -72.9201	Calle 13 entre Carrera 17 y 18, colegio nuestra señora de los remedios
10			44001-023	11.545118, -72.908302	Calle 14 entre Carrera 8 y 10

Tabla 3.Diseños integrales de seguridad vial asignados a la zona 2 para intervención en el marco del programa OPV

Fuente: ANSV

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Descripción del avance y estado actual del contrato de obra

Se inicia con la asignación de los diseños, a los cuales se realizará la verificación y definición de viabilidad de implementación, en donde por medio de información secundaria disponible se pueda establecer en primera instancia la viabilidad para la intervención de cada punto o tramo asignado, cuyo análisis determinará si se continúa o no con el proceso de apropiación de los diseños.

El proceso de apropiación de los diseños parte de la visita conjunta entre el delegado de la autoridad de tránsito de la entidad territorial, la interventoría y de ICOVÍAS SAS. En esta visita se revisará la pertinencia del diseño, identificando posibles generadores de riesgos de seguridad vial y verificando las condiciones operativas, de movilidad, de infraestructura, geométricas y ambientales actuales, en contraste con las existentes en el momento de elaboración del diseño. Como resultado de estas visitas, se entregarán informes ejecutivos de visita en donde se indiquen los resultados de la inspección con sus respectivos soportes.

A partir de esta visita, y considerando que mediante Resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024 el Ministerio de Transporte, en colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adoptó la actualización del "Manual de Señalización Vial de Colombia, dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial", se evidencia la necesidad de realizar la actualización a los diseños de señalización suministrados, con el objeto de alinearlos a los nuevos criterios y parámetros establecidos, a la vez, para incorporar los ajustes, modificaciones o actualizaciones de diseño necesarios.

En este sentido, esta actualización de los diseños se realizará posterior a culminadas las visitas de reconocimiento, incorporando tanto las nuevas especificaciones del manual, como los posibles requerimientos adicionales de seguridad vial evidenciados en campo.

La actualización de los diseños deberá tener la aprobación del delegado de la Autoridad de Tránsito del municipio donde se realizará la implementación, dado que este delegado es la persona idónea legalmente para autorizar su implementación. Es decir, que las recomendaciones de los delegados de la ANSV o del especialista de la Interventoría o de ICOVÍAS SAS no son de obligatoria aceptación por parte de la Autoridad de Tránsito del Municipio, y esta autoridad es autónoma legalmente en cuanto a la intervención en su territorio y es la que finalmente define qué se realiza y en qué forma. Lo anterior, se considera importante para tener en cuenta, dado que influirá en el buen desarrollo de la ejecución del contrato, puesto que se trata de un contrato de obra.

Paralela a esta actividad se adelantará la toma de información para la evaluación de impactos de cada medida, antes de la de la implementación del diseño apropiado y aprobado, únicamente en los puntos que determine la ANSV para el desarrollo de la evaluación de impactos. Para esto se seguirá lo establecido en el Apéndice F.

A partir del diseño ajustado (si es del caso), se realizará la valoración de los costos de implementación, así como la programación de actividades antes, durante y después de cada implementación por municipio. Paralelamente se realizará el registro fotográfico y de video antes de las obras y se iniciarán las actividades sociales haciendo una reunión con la comunidad e informando el inicio de las actividades. Adicionalmente, se aprovechará la reunión con la comunidad para socializar los reductores de velocidad (en caso de que se requieran) y obtener la no objeción de esta para la instalación de los elementos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

contemplados en el diseño, tendientes a la reducción de la velocidad. Así mismo, se levantarán las actas de vecindad de inicio, aceptación y entorno (si aplica). Esta parte social, se realizará conforme lo establecido en el Apéndice E – Gestión social y comunicaciones estratégicas.

Posterior a la programación de actividades, se definirán las garantías, el tipo de material a utilizar y con esta información se realizará una valoración del costo de implementación. Es de recordar que las garantías dependen de la valoración de cuatro factores a saber: estado del pavimento, nivel de tráfico de las vías objeto de intervención, grado de contaminación de la superficie de pavimento y exposición de la marca especifica. Como referencia se tomará lo indicado en el Apéndice H.

Adicionalmente, se procederá a la tramitación del plan de manejo de tránsito y permisos ambientales cuando se requieran. Paralelamente se alistarán los materiales y equipos necesarios para la implementación.

Una vez aprobados los permisos correspondientes, se iniciará la implementación de los diseños aprobados, partiendo por la limpieza de la capa de rodadura para posteriormente implementar la señalización vertical, horizontal y demás dispositivos asociados a cada diseño. Durante el proceso de implementación, se realizará el registro fotográfico y de video durante la ejecución de las obras, así mismo se adelantará la elaboración de planos récord y georreferenciación de la implementación. En los casos en que se requiera el retiro o reemplazo de señales o dispositivos, se realizará la entrega de estos a la ET correspondiente.

Una vez terminada la implementación se procederá a la evaluación en campo de las medidas de seguridad vial implementadas, así como la socialización de fin de obra con la comunidad y el registro fotográfico y de video posterior a la implementación.

Para el cierre de obra se realizará la verificación de los planos récord de la implementación, para posteriormente hacer la entrega y recibo físico a satisfacción a la Interventoría y Entes Territoriales de las obras implementadas, diligenciando el acta de entrega y recibo.

Paralelamente se realizará la entrega de los archivos magnéticos de la georreferenciación de las implementaciones, acorde con las especificaciones de la ANSV.

Finalmente se hace entrega de la documentación de cierre de obra y del manual de o guía de mantenimiento de la señalización vertical, horizontal y demás dispositivos.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO 3. ACTIVIDADES GENERALES

En el marco de nuestro compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, durante el período reportado, se llevaron a cabo diversas actividades de gestión documental destinadas a promover un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados una vez se inicien las actividades de obra. A continuación, se presentan algunas de las actividades más relevantes:

- Revisión de documentación: Durante el periodo realizamos la actualización de los sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, ajustando las actividades a desarrollar de acuerdo con la ejecución del proyecto.

- Vinculación de personal: Hemos realizado vinculación del personal contractual del proyecto, organizando la documentación, preparando las inducciones en materia SST y demás procedimientos requeridos.

- Análisis de datos: Hemos analizado los datos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en los pliegos de técnicos, con el fin de definir las metas a aplicar sobre los indicadores de los estándares mínimos.

- Visita de inspección y reconocimiento de zonas de intervención: Durante el periodo, el personal del CONSORCIO INTERSEG, realizó recorrido a todos los frentes de trabajo que serán intervenido permitiendo tener más claridad sobre los aspectos a implementar de manera preventiva sobre todo el personal que labore en el proyecto y sus alrededores.

- Preparación de herramientas e insumos para manejo SST: Durante el periodo tanto el contratista como la interventoría, realizaron la gestión para la adquisición de los elementos para atención en primeros auxilios, compra de dotación y elementos de protección personal y señalización.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO 4 ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1 Seguridad y Salud en el Trabajo - Contratista de Obra.

En el marco de nuestras responsabilidades como interventoría, hemos realizado un seguimiento y evaluación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contratista ICOVIAS en el proyecto con el objetivo de presentar los resultados de nuestra evaluación y proporcionar recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo.

GESTION DE TALENTO HUMANO

- ✓ **INGRESOS DE PERSONAL**

Durante el periodo, el contratista contó con el siguiente personal aprobado por la interventoría

N°.	NOMBRE	CARGO
1	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director
2	Diana Paola Parada Sierra	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial
3	Alba Zuleidy Avendaño Cipagauta	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial
4	Margarita Rosa Pardo	Especialista en Pavimentos
5	Diego Ignacio Gualteros Chávez	Ingeniero Residente de Obra
6	Víctor Andrés Moreno Cristancho	Ingeniero Residente de Obra
7	Anderson Yesid Niño Castillo	Ingeniero Auxiliar de Apoyo
8	Antonio de Jesús Rivas	Ingeniero Auxiliar de Apoyo
9	Giovani Alexander Brito Núñez	Tecnólogo en SIG
10	Luis Alfredo Carrillo Morales	Tecnólogo en Dibujo
11	Michel Virginia López España	Tecnólogo en Dibujo
12	Irina Rocío Gutiérrez Durán	Ingeniero Ambiental
13	Yulid Liliana Gelves	Tecnólogo en STT
14	Jenifer Yudith Rodríguez	Profesional Social y de Comunicaciones
15	Elizabeth Suárez Garcés	Profesional Social y de Comunicaciones
16	Vanessa Fernanda Cabrales Yépez	Profesional Social y de Comunicaciones

Tabla 4. Personal de Obra

Las hojas de vida iniciales se recibieron por parte de la interventoría el día 29 de marzo de 2025. Se envío aprobación por parte de la interventoría el día 15 de abril de 2025.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ INDUCCIONES SST

Durante el periodo se registró el ingreso de 16 trabajadores quienes harán parte del proceso constructivo, en la cual, se verificó la documentación referente a: afiliaciones a la seguridad social (ARL, riesgo V, EPS, fondo de pensión y caja de compensación familiar) en el caso que aplicara se solicitó la planilla de aportes a la seguridad social; así mismo, examen médico ocupacional con el énfasis requerido, hoja de vida, cédula y antecedentes disciplinarios.



Gráfica 1. Ingresos de personal


INGRESOS	
CONTRATISTA	**N° TRABAJADORES**
ICOVIAS	16
TOTAL	16

Tabla 5. Ingresos de personal

- Durante el periodo se realizaron evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con Resolución 1843 de 2025 y los peligros a los cuales se encontrarán expuestos los trabajadores. Asimismo, no se aceptaron exámenes médicos mayores a un año dado el tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador y las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Dichos resultados fueron comunicados por escrito al trabajador para posterior seguimiento.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- Una vez se confirma la documentación y afiliaciones, el personal recibe una inducción enfocado al componente de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental, con el fin de darles a conocer los diferentes riesgos a los cuales van a encontrarse expuestos y las medidas de control que deberán implementar y aplicar diariamente; así mismo, se describen las diferentes políticas de gestión, deberes, derechos y obligaciones; posteriormente, se realizó la entrega de la dotación y elementos de protección personal requeridos para la labor.

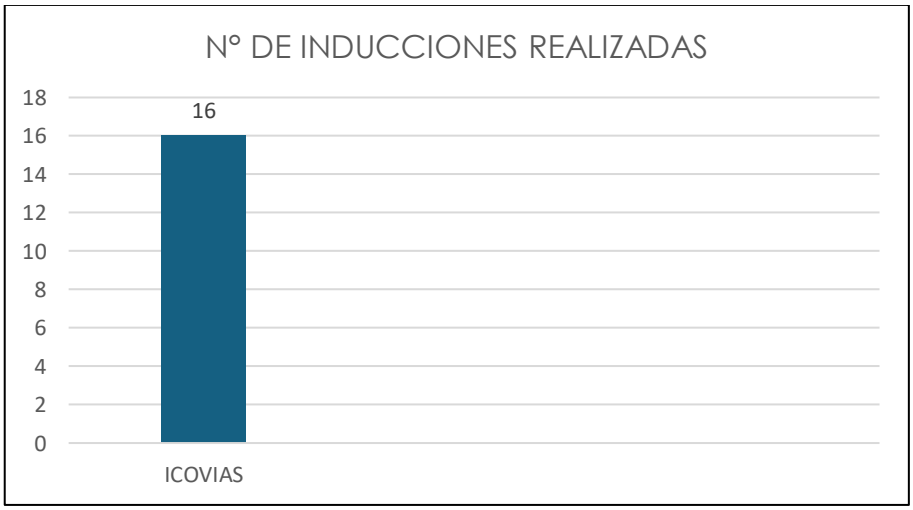

Gráfica 2. Inducciones realizadas

N° DE INDUCCIONES	
CONTRATISTA	**N° TRABAJADORES**
ICOVIAS	16
TOTAL	16

Tabla 6. Inducciones realizadas

- De acuerdo con lo registrado para el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025, no se presentaron retiros de personal por parte del contratista; razón por la cual no aplica la emisión de los paz y salvos.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co



Gráfica 3. Reporte retiros en el periodo

RETIROS	
CONTRATISTA	**N° TRABAJADORES**
ICOVIAS	0
TOTAL	0

Tabla 7. Reporte retiros en el periodo

- ✓ **ENTREGA Y REPOSICION DE EPP**

Durante el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025 al personal de ICOVIAS se le suministró Elementos de Protección Personal; no se generó reposición de estos.

- ✓ **PLAN DE TRABAJO SST**

De acuerdo con las actividades programadas vs las ejecutadas para el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025, el contratista ICOVIAS genera un cumplimiento del 100% en la cual lo desarrollado en el periodo se describe a continuación:

CRITERIO	ACTIVIDAD	ESTADO
1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo Notificación responsabilidades por cargo	PROCESO DE INDUCCIÓN	Ejecutado
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	Validar el pago seguridad Vs Nivel de riesgos	Ejecutado

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Estructura material de apoyo Estructura formatos documentos asociados inducción Desarrollo de la actividad	Ejecutado
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo Reporte FURAT, Notificación EPS	Reporte FURAT, Notificación EPS	Se contempla la actividad, sin embargo, durante el periodo no se reportaron eventos laborales, lo cual N/A
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	Análisis Eventos reportados planes de acción	Se contempla la actividad, sin embargo, durante el periodo no se reportaron eventos laborales, lo cual N/A
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	Seguimiento indicadores AT. EL	Ejecutado
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	Seguimiento Indicadores	Ejecutado
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	Seguimiento Indicadores	Ejecutado
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	Seguimiento Indicadores	Ejecutado
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	Seguimiento Indicadores	Ejecutado
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Labora	Seguimiento Indicadores	Ejecutado
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	Seguimiento Indicadores	Ejecutado

Tabla 8. Actividades realizadas durante el periodo.

CICLO PHVA	CRITERIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	2025
PLANEAR	1.1.1 Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	contrato	GERENCIA	80%	
		Curso 50 horas	SST		
		Presentación carta Modelo	SST		
PLANEAR	1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo	Notificación responsabilidades por cargo- PROCESO DE INDUCCIÓN	SST	80%	
PLANEAR	1.1.3 asignación de los recursos SST	Acta recursos 2025	GERENCIA	80%	
PLANEAR	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	Validar el pago seguridad Vs Nivel de riesgos	GERENCIA	80%	
PLANEAR	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	validar procesos norma	SST	80%	
PLANEAR	1.1.6 Conformación COPASST	Validar actas de conformación	SST	80%	
PLANEAR	1.1.7 Capacitación COPASST	CURSO 50 HORAS	SST	80%	
PLANEAR	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	Validar actas de conformación	SST	80%	
PLANEAR	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención - PyP	Verificar documento tecnico	SST	80%	
PLANEAR	1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Estructura material de apoyo	SST	80%	
		Estructura formatos documentos asociados inducción	SST		
		Desarrollo de la actividad	SST		
PLANEAR	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	Certificado curso virtual 50 horas	SST	80%	
PLANEAR	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	Actualizar , Firmar, publicar, registro Acta copaste	SST	80%	

Tabla 9. Cronograma de actividades

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

De acuerdo con las actividades programadas vs las actividades ejecutados para el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025, en cuanto al cronograma de capacitaciones, el contratista genera un cumplimiento del 50%, dado que la capacitación referente a identificación de peligros y valoración de riesgos lo realizará para el mes de agosto de 2025, a continuación, se describen las capacitaciones realizadas:

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Inducción especifica en SST	Realizado el 23 de mayo de 2025	Actividad desarrollada hacia 6 trabajadores en el mes de mayo y 10 en el mes de abril respectivamente
2	identificación de peligros	Reprogramado para agosto de 2025	N/A

Tabla 10. Cronograma de capacitaciones

#	CAPACITACIÓN	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO					
		P	E	#Ce	#C	#Te	ESTADO	P	E	#Ce	#C	#Te	ESTADO	P	E	#Ce	#C	#Te	ESTADO	P	E	#Ce	#C	#Te	ESTADO	P	E	#Ce	#C	#Te	ESTADO
1	Inducción Especifica SST	P	E					P	E					P	E					P	E					P	E				
2	Burnout	P	E																												
3	gestion de emergencias							P	E																						
4	capacitacion de primeros auxilios													P	E																
5	funciones del COPASST																			P	E										
6	Identificación de peligros																									P					
7	Prevención de accidentes y seguridad vial																														
8	Buenas prácticas ambientales en obras viales																														
10	Cierre ambiental de actividades y seguimiento del PMA																														
11	capacitacion en seguridad visual																														
12	capacitacion en investigacion de accidentes laborales																														
13	capacitacion en acoso laboral																														
14	capacitacion en uso adecuado de equipos de																														
15	capacitacion en manejo de extintores																														
17	Manejo de sustancias peligrosas																														
18	Fiebre amarilla y bioseguridad																														
19	Ahorro y uso eficiente del agua y la energía	P	E																												
20	Manejo ambiental básico																														
21	Uso adecuado de EPP							P	E																						
22	Señalización y demarcación (PMT)																														
23	Emergencias en obra incluida emergencia ambiental													P	E																
24	Higiene y pausas activas																														
25	Manejo Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos																			P	E										

Tabla 11. Cronograma de capacitaciones

✓ VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo se realizó la conformación de los integrantes de acuerdo con el número de personal que conforma ICOVIAS. La primera reunión se realizará para el mes de junio de 2025. por lo tanto, el reporte y registro de las actividades se describirán en el informe de gestión SST N°2.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo se realizó la conformación de los integrantes de acuerdo con el número de personal que conforma ICOVIAS. La primera reunión se realizará para el mes de julio de 2025 por lo tanto, el reporte y registro de las actividades se describirán en el informe de gestión SST N°3.

✓ SEGUIMIENTO DE PAGOS U HONORARIOS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Previo al ingreso de cada trabajador se realiza la verificación de los documentos requeridos su aprobación como lo son: ARL, EPS, AFP, examen médico ocupacional, carta de recomendaciones médicas, entrega de elementos de protección personal e inducción; posterior a ellos, así mismo, se verifica que el pago de los aportes a la seguridad social no solamente se realice dentro del tiempo establecido, si no también que los aportes sean abonados a las entidades donde los trabajadores fueron afiliados. El contratista remite la siguiente planilla de seguridad social:

N°	CONTRATISTA	N° DE TRABAJADORES	No PLANILLA	FECHA PAGO	FECHA LIMITE PAGO
1	ICOVIAS NOMINA	14	9485978338	2025/05/14	2025/05/13
2	ICOVIAS INDEPENDIENTES	2	9485851978	2025/05/14	2025/05/13

Tabla 12. Registro de pago de aportes a la seguridad social

Adicional con lo anterior, durante el periodo, el contratista ICOVIAS, dio cumplimiento con el pago de los salario y honorarios de los 16 profesionales que se encuentran aprobados por la interventoría.

✓ ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el periodo 29 de abril al 28 de mayo de 2025, ICOVIAS no realizó reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) dado que no se registraron eventos de origen laboral:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FECHA DEL AT	DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCION
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 13. Reporte de accidentes laborales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ INDICADORES SST

Basado en la Resolución 0312 de 2019 ICOVIAS durante el periodo da cumplimiento con los indicadores de los estándares mínimos descritos de la siguiente manera:


Periodo	Horas hombre trabajadas	Trabajadores	Horas Trabajadas	Días Trabajados	Horas Extras	Días de Ausentismo por AT	Días de Ausentismo por enfermedad común	Número de AT que se presentaron	Número de AT mortales que se presentaron	Número de casos de Enfermedad Laboral EL
29 de abril al 28 de mayo de 2025	391	16	42	23	0	0	0,00	0	0	0

Tabla 14. Reporte HHT

✓ AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA

$$x = \frac{\text{N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{N°de días de trabajo programados en el mes}} * 100$$


$$x = \frac{0}{16} * 100 = 0.0$$

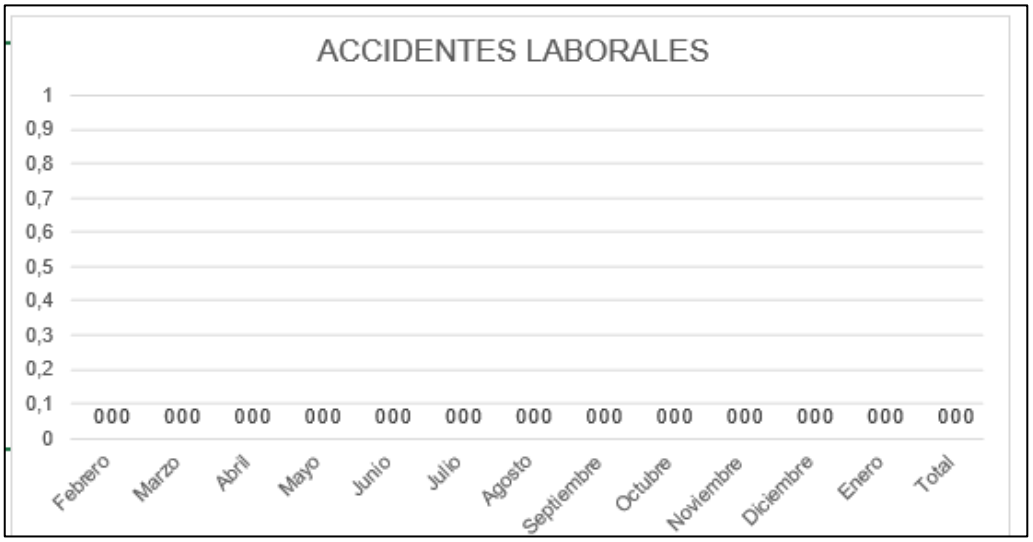

Gráfica 4. Indicador de AT

Por cada 100 trabajadores que laboran durante el periodo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

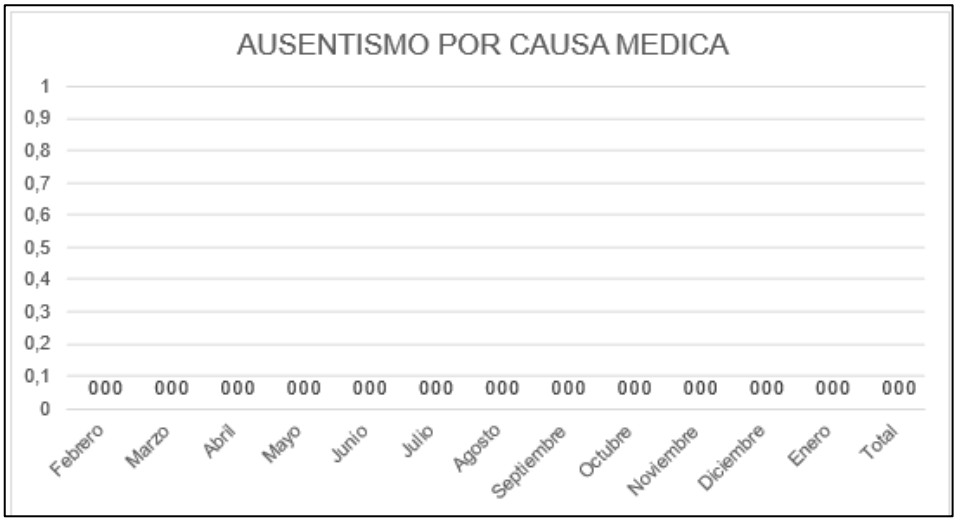


Gráfica 5. Indicador de Ausentismo por causa médica

Durante el periodo se perdió 0,0% de días programados de trabajo por incapacidad medica

✓ FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

$$x = \frac{\text{N° de AT}}{\text{N° de trabajadores en el mes}} * 100$$

$$x = \frac{0}{16} * 100 = 0$$

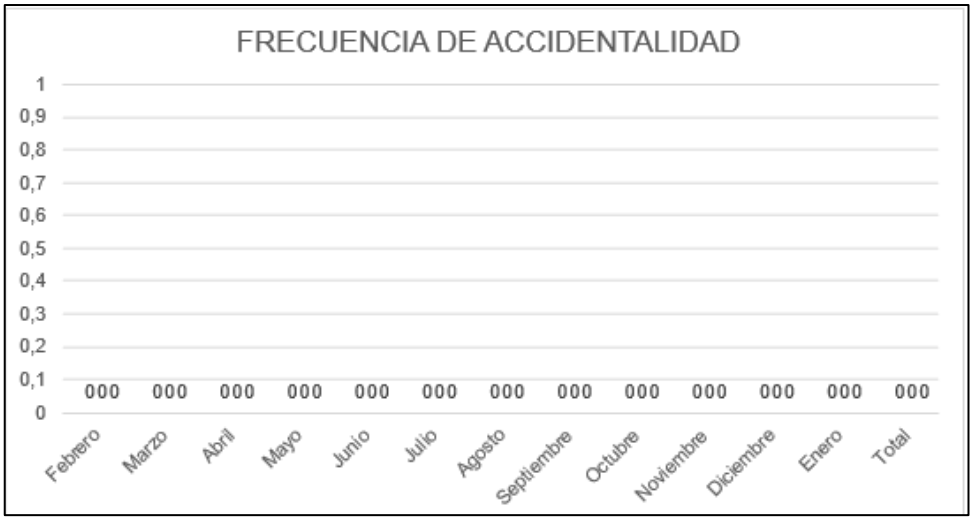

Gráfica 6. Indicador de frecuencia de AT


Por cada cien (100) trabajadores que laboraron durante el periodo, se presentaron 0 accidentes de trabajo

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ INDICE DE SEVERIDAD


$$x = \frac{\text{N° de días de incapacidad por AT + N° de días cargados en el mes}}{\text{N° de trabajadores en el mes}} * 100$$

$$x = \frac{0 + 0}{16} * 100 = 0$$

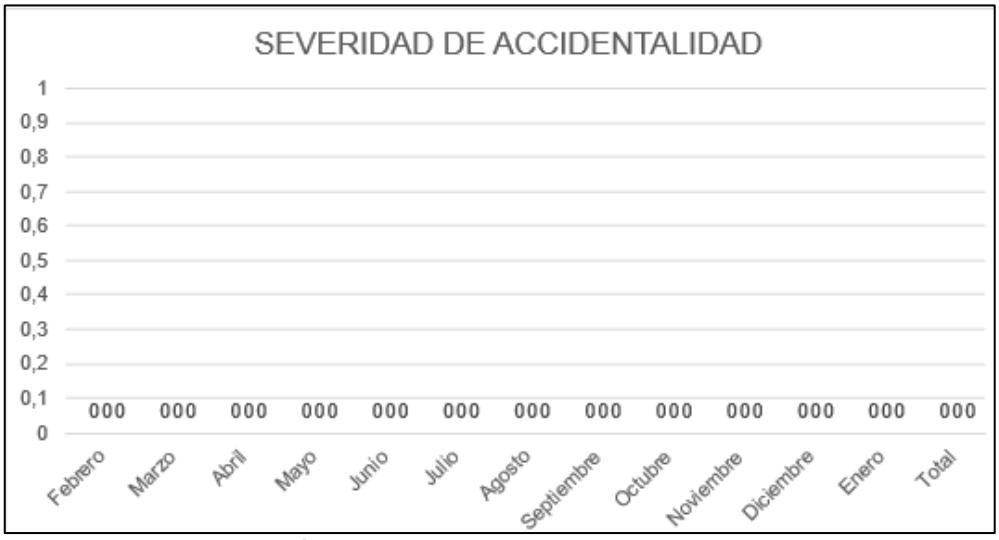

Gráfica 7. Indicador de severidad de AT

Por cada 100 trabajadores que laboran durante el periodo se perdieron 0 días por Accidente De Trabajo

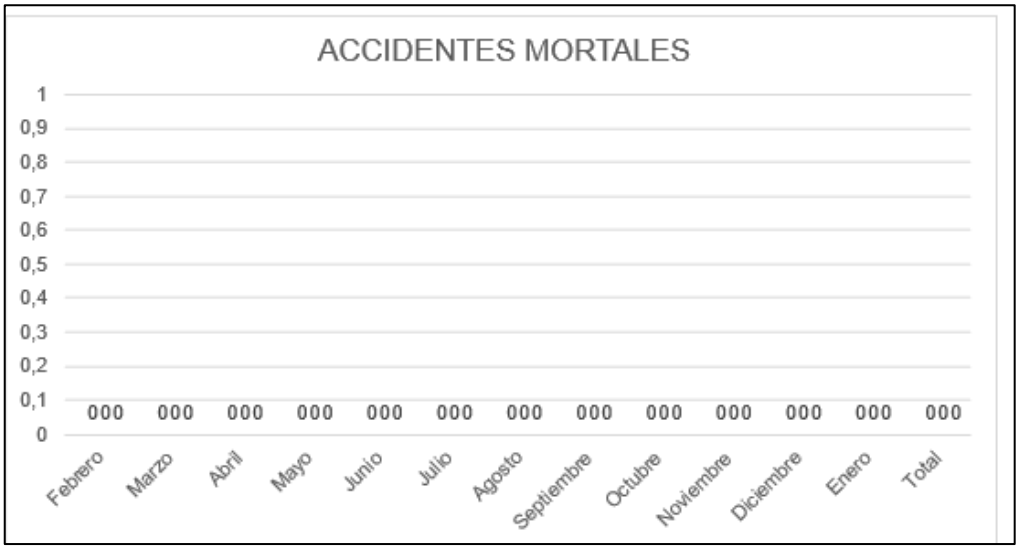

Gráfica 8. Indicador de AT mortales

Durante el periodo, el 0,0% de accidentes de trabajo fueron mortales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- ✓ **PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$x = \frac{\text{N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo}}{\text{N° de trabajadores en el periodo}} * 100000$$

$$x = \frac{0 + 0}{16} * 100000 = 0.0$$

Durante el periodo por cada 100.000 trabajadores se presentaron 0 casos de enfermedad laboral.

- ✓ **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$x = \frac{\text{N° de casos nuevos de EL en el periodo}}{\text{N° de trabajadores en el periodo}} * 100000$$

$$x = \frac{0}{16} * 100000 = 0.0$$

Durante el periodo, por cada 100.000 trabajadores se presentaron 0 casos nuevos de enfermedad laboral.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4.2 AMBIENTAL – CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo comprendido del presente informe, se desarrollaron diversas acciones orientadas a la implementación, planeación y verificación inicial del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el marco del contrato. Las actividades se enmarcan en las obligaciones contractuales y en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente. A continuación, se describen las diferentes actividades desarrolladas desde el componente Ambiental.

- ✓ **PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS**

Durante el periodo comprendido en este informe, no se gestionaron ni tramitaron permisos, licencias o autorizaciones ambientales, dado que las actividades de intervención en campo aún no han iniciado formalmente, y según el alcance del proyecto, las actividades previstas no requieren licencias ambientales ni permisos especiales.

- ✓ **MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO**

Durante el mes se realizó la búsqueda y selección del predio donde funcionará la oficina del proyecto y el punto de acopio principal. Al cierre del mes, dicho inmueble se encuentra en proceso de adecuación y aún no está operativo.

- ✓ **MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD – ORDINARIOS – RECICLABLES Y PELIGROSOS**

No se realizaron actividades relacionadas con manejo de materiales de construcción ni residuos debido que aún no se ha iniciado intervención en campo ni se cuenta con personal operativo asignado.

Manejo de RCD´S

N°	CANTIDAD	SITIO DE DISPOSICION	FECHA DE RETIRO	CERTIFICADO
1	0	N/A	N/A	N/A
2	0	N/A	N/A	N/A

Tabla 15. Reporte manejo de RCD´S

Residuos reciclables

N°	CANTIDAD	TIPO DE RESIDUO	FECHA DE RETIRO	CERTIFICADO
1	0	N/A	N/A	N/A
2	0	N/A	N/A	N/A

Tabla 16. Reporte residuos reciclables

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Residuos peligrosos

N°	CANTIDAD	TIPO DE RESIDUO	GESTOR	FECHA DE RETIRO	CERTIFICADO
1	0	N/A	N/A	N/A	N/A
2	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 17. Reporte de residuos peligrosos

Residuos ordinarios

N°	CANTIDAD	TIPO DE RESIDUO	GESTOR	FECHA DE RETIRO	CERTIFICADO
1	0	N/A	N/A	N/A	N/A
2	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 18. Reporte residuos ordinarios

- ✓ **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS**

Durante el periodo evaluado, no se llevaron a cabo actividades operativas que generaran emisiones significativas al ambiente, dado que el proyecto aún se encuentra en fase de alistamiento.

- ✓ **MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades que implicaran intervención sobre cuerpos de agua o infraestructuras hidráulicas, ya que las labores contempladas en el proyecto corresponden a actividades secas, las cuales no requieren el uso de agua como insumo operativo.

Así mismo, se resalta a la fecha el contratista cuenta con dos unidades sanitarias en la oficina administrativa para el uso tanto de hombres como mujeres.

- ✓ **INVENTARIO DE SUMIDEROS**

Durante el periodo el contratista no realizó la actividad de inventario de sumideros, dado que la información la entregará en el informe de gestión N°3.

N°	UBICACIÓN	CANTIDAD
1	0	N/A
2	0	N/A

Tabla 19. Inventario de sumideros

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

Durante el periodo comprendido en este informe, únicamente se realizaron visitas de reconocimiento a las áreas de intervención, como parte del proceso de alistamiento del proyecto. Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas del entorno y planificar las actividades futuras.

✓ ESTADO DE ESPECIES FORESTALES - INVENTARIO

Durante el periodo el contratista no realizó la actividad del estado de especies forestales, dado que la información la entregará en el informe de gestión N°3.

N°	UBICACION	ESPECIE	CANTIDAD
1	0	N/A	N/A
2	0	N/A	N/A

Tabla 20. Inventario de especies forestales

✓ CERTIFICADO DE BAÑOS PORTÁTILES

Debido a la fase del proyecto ejecutado durante el periodo no aplicó la adquisición de unidades sanitarias.

Así mismo, se resalta que el contratista no contará con el uso de unidades sanitarias portátiles, si no que hará entrega de un bono a cada trabajador para el pago del servicio del baño en los locales comerciales que se encuentren aledaños al sector de intervención; por otra parte, la oficina administrativa del contratista contará con una unidad sanitaria fija.

✓ VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION

Durante el periodo se realizaron las siguientes visitas de seguimiento:

N°	FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
1	27/05/2025	SANTA MARTHA	visitas de reconocimiento a las áreas de intervención
2	28/05/2025	CIENAGA	visitas de reconocimiento a las áreas de intervención

Tabla 21. Reporte visitas de seguimiento

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido del presente informe, no se tenían programadas actividades ambientales diferentes a las visitas de reconocimiento a las áreas de intervención tal como lo registrado en el ítem anterior.

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A

Tabla 22. Reporte de actividades ambientales

✓ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Para el periodo del informe, el contratista ICOVIAS no realizó formaciones ambientales dado que no se encontraban dentro de la ejecución de actividades del periodo.

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A

Tabla 23. descripción de cronograma de capacitaciones.

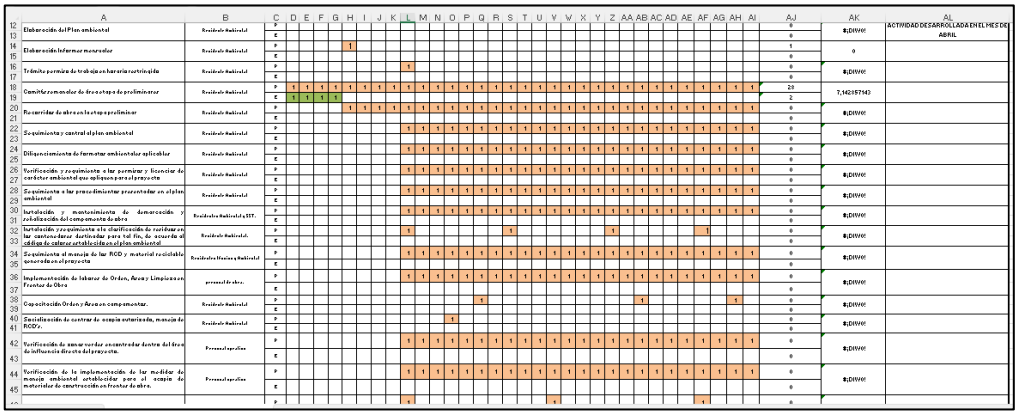


Tabla 24. Cronograma de actividades ambientales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO 5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES INTERVENTORIA

5.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – INTERVENTORIA

Durante el presente periodo, comprendido entre el 29 de abril y el 28 de mayo, se desarrollaron actividades clave orientadas a la consolidación, implementación y articulación de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental en el marco del contrato en ejecución. El informe correspondiente a estos componentes, se ciñen a lo establecido en el apéndice 06 Apéndice D – Componente ambiental y SST, así como a las directrices dadas por la ANSV, al respecto del contenido de este informe. A continuación, se describe de manera general lo ejecutado en ambos frentes.

✓ INGRESOS DE PERSONAL

Se cuenta con el siguiente personal mínimo requerido aprobado por la ANSV.

NO.	PROFESIONAL	CARGO	OFICIO APROBACION HV	DOCUMENTOS DE VINCULACION
1.	ROBERTO PABLO SILVA	Director de Interventoría	Aprobado Radicado No. 20253000036621	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
2.	JOSE MARIO ALBA RUIZ	Especialista En Transito Y Seguridad Vial	Aprobado Radicado No. 20253000047441	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
3.	NESTOR CUASPUD	Especialista De Pavimentos	Radicado No. 20253000036621	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
4.	TATIANA SABOGAL	Ingeniero Ambiental	Aprobado: 20253000034871	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
5.	JULIETH AFRICANO	Profesional Social Y De Comunicación	Aprobado: 20253000034871	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
6.	ISABEL AFANADOR ROSAS	Ingeniero Residente	Aprobado: 20253000034871	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
7.	JUAN CAMILO CRUZ	Ingeniero Residente	Aprobado: 20253000034871	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
8.	JHONATHAN DUQUE	Ingeniero Auxiliar Y De Apoyo	Aprobado: 20253000034871	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.
9.	YULIEH GALVIS	Tec. SST	Aprobado: 20253000034871	La entidad emite concepto de aprobación, pero no se registra para el periodo del informe.

Tabla 25. Reporte de personal mínimo requerido

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

INDUCCIONES SST

Durante el periodo se registró el ingreso de 09 trabajadores quienes harán parte del proceso constructivo en el ámbito de la interventoría, en la cual, se verificó la documentación referente a: afiliaciones a la seguridad social (ARL, riesgo V, EPS, fondo de pensión y caja de compensación familiar) en el caso que aplicara se solicitó la planilla de aportes a la seguridad social; así mismo, examen médico ocupacional con el énfasis requerido, hoja de vida, cédula y antecedentes disciplinarios.



Gráfica 9. Reporte de ingreso de personal nuevo interventoría

INGRESOS	
CONTRATISTA	**N° TRABAJADORES**
CONSORCIO INTERSEG	09
TOTAL	09


Tabla 26. Reporte de ingresos en el periodo

- Durante el periodo se realizaron evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con Resolución 1843 de 2025 y los peligros a los cuales se encontrarán expuestos los trabajadores. Asimismo, no se aceptaron exámenes médicos mayores a un año dado el tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador y las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Dichos resultados fueron comunicados por escrito al trabajador para posterior seguimiento.

- Una vez se confirma la documentación y afiliaciones, el personal recibe una inducción enfocado al componente de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental, con el fin de darles a conocer los diferentes riesgos a los

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

cuales van a encontrarse expuestos y las medidas de control que deberán implementar y aplicar diariamente; así mismo, se describen las diferentes políticas de gestión, deberes, derechos y obligaciones; posteriormente, se realizó la entrega de la dotación y elementos de protección personal requeridos para la labor.

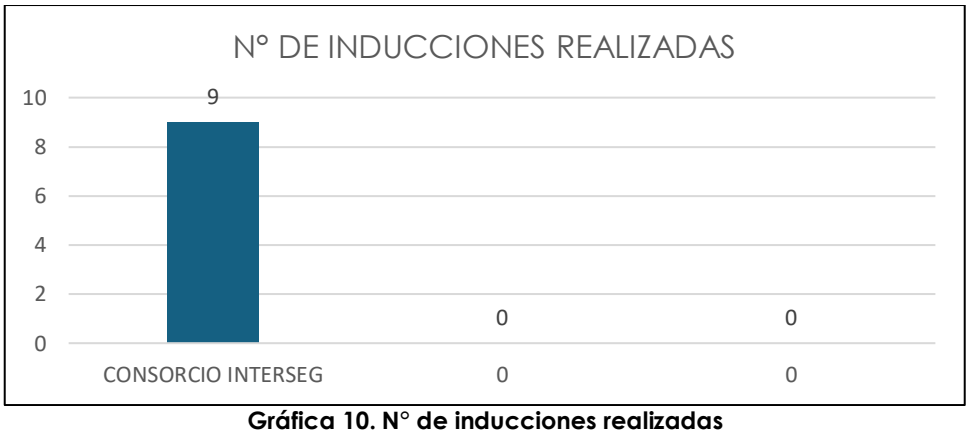


Gráfica 10. N° de inducciones realizadas

N° DE INDUCCIONES	
CONTRATISTA	**N° TRABAJADORES**
CONSORCIO INTERSEG	09
TOTAL	09

Tabla 27. Reporte de inducciones

- De acuerdo con lo registrado para el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025, se presentó el retiro del tecnólogo en SIG GIOVANNI ALEXANDER BRITO NUÑEZ CC: 1.026.263.876 haciendo la salvedad que no realizó actividades en obra, ni prestó servicios en la compañía; razón por la cual no aplica la emisión de los paz y salvos.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

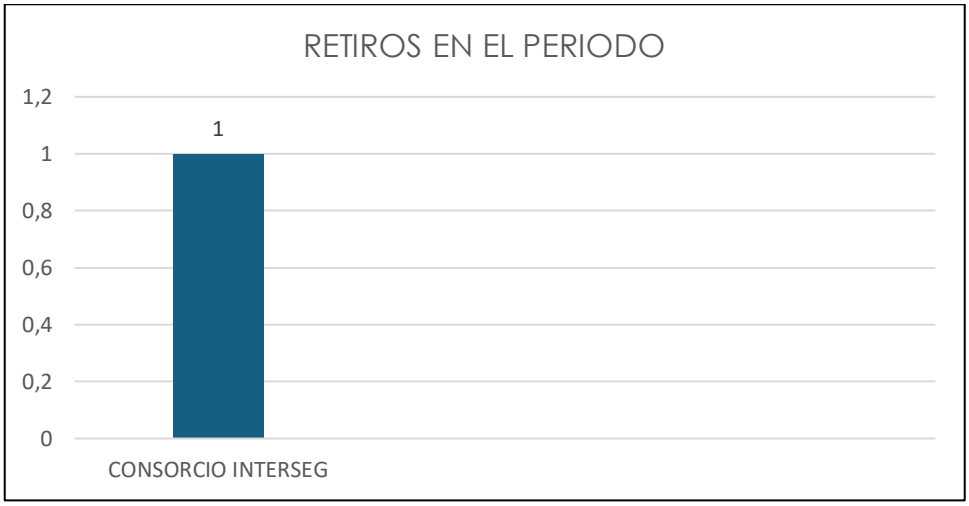

Gráfica 11. Reporte de retiros en el periodo

RETIROS	
CONTRATISTA	**N° TRABAJADORES**
CONSORCIO INTERSEG	1
TOTAL	1

Tabla 28. Reporte de retiros en el periodo.

- ✓ **ENTREGA Y REPOSICION DE EPP**

Durante el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025 únicamente se le suministró los Elementos de Protección Personal al profesional JOSE MARIO ALBA sin embargo, por trazabilidad de entrega, se relaciona el registro realizado en el mes de abril de 2025 con el personal de interventoría restante descritos de la siguiente manera (Ver anexo 1.6):

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ELEMENTOS ENTREGADOS	OBSERVACIONES
1	SABEL AFANADOR ROSAS INGENIERO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	60.292.990	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
2	JONATHAN DAVID DUQUE BAUTISTA	INGENIERO AUXILIAR DE APOYO	1.018.446.475	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
3	JOSE MARIO ALBA RUIZ	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1,140.822.001	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de mayo de 2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4	JUAN CAMILO CRUZ OROZCO,	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVETORIA	1.032.472.548	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de 5seguridad y 6gafas antiem7pañantes osc8uras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
5	DEISY JULIETH AFRICANO RODRIGUEZ	PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES	1.024.520.970	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
6	NÉSTOR ARTURO CUASPUD GUAYTARILLA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	98.395.508	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
7	ROBERTO PABLO SILVA GALVIS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	13.749.227	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
8	YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	37.550.635	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025
9	LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO	PROFESIONAL AMBIENTAL	1.010.199.370	Casco, guantes de nitrilo, tapa oídos de inserción, tapabocas quirúrgico, botas con puntera de seguridad y gafas antiempañantes oscuras	EPP entregados en el mes de abril de 2025

Tabla 29. relación entrega de elementos de protección personal.

✓ PLAN DE TRABAJO SST

De acuerdo con las actividades programadas vs las actividades ejecutados para el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025, el consorcio INTERSEG genera un cumplimiento del 100%; se resalta que, durante el periodo, las actividades fueron netamente documentales, aquellas como lo establecido en el componente de emergencias por el estado y alineación de la ejecución del contrato fueron reprogramadas para los meses de septiembre y octubre respectivamente y el seguimiento sobre el cumplimiento del SGSST por medio de auditorías, se llevará a cabo en el último trimestre del año; lo anterior, sujeto a disponibilidad de los proveedores. (Ver anexo 1.6).

ITEM	ORIGEN PHVA	OBJETIVOS DEL SIG	ACTIVIDAD	Ecológico	Económico	Humano	META	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	OBSERVACIONES
1	P		Realizar inducción y reinducción a todo el personal			X	Hacer inducción a todo el personal nuevo que ingrese a laborar y reinducción anual a todos los trabajadores	Coordinador HSEQ	100%									P								
2	P		Incluir en la revisión realizada por la alta dirección, la revisión del plan anual, resultados obtenidos re recursos asignados y la efectividad del SG SST y requisitos establecidos en el artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015			X	Realizar anualmente la revision de la alta dirección para hacer seguimiento al avance y desempeño del SGI	Coordinador HSEQ	100%													P					
3	P		Elaborar plan anual			X	Cumplir con todos los compromisos del SGI	Coordinador HSEQ	100%																	
4	H		Presentar el plan de trabajo a la alta dirección			X	Revisar y aprobar el plan	Alta gerencia Coordinador	100%																	
5	H		Realizar autoevaluación de estándares mínimos			X	Cumplir con la autoevaluación estipulada con la ARL con un cumplimiento por encima del 90% del estudio realizado	Coordinador HSEQ	80%	P	E	P													
6	P		Diseñar el presupuesto anual del SG SST			X	Estipular los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades establecidas en el presente plan	Alta gerencia Coordinador HSEQ	100%	P	E														
7	P		Revisar la política integral con la participacion del COPASST y lanzarla al sctr.			X	Revisar y aprobar politica	Coordinador HSEQ	100%	P	E	P		P												
8	P		Publicar la política integral en todos los centros de trabajo		X	X	Dar a conocer en un 100% la politica a todos los trabajadores	Coordinador HSEQ	100%			P		P												
9	P		Socializar las funciones y responsabilidades por cargos, dejando evidencia del aceptado por parte de los trabajadores			X	Todos los trabajadores deben conocer sus funciones y responsabilidades	Asesora de Gestión Humana Coordinador HSEQ	100%									P								
10	P		Actualizar documentación			X	Documentación controlada y actualizada	Coordinador HSEQ	100%	P	E															
11	H		Revisar el contexto de la organización (misión, visión, mapa de procesos, organigrama, número de trabajadores)			X	Contexto de la organización controlado y actualizado	Coordinador HSEQ	100%																	
12	H		Hacer seguimiento al plan de objetivos del SGI			X	Cumplir como mínimo en un 85% los objetivos propuestos	Alta gerencia Coordinador	85%													P				
13	H	Comprometidos en promover soluciones que satisfagan las	Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales y otros aplicables			X	Cumplir al 100% los requisitos legales aplicables a la empresa	Coordinador HSEQ	100%																	

PLAN DE TRABAJO | MPYT | HYSI | COPASST | COCOLA | PLAN DE EMERGENCIAS

Tabla 30. Plan de trabajo SST.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- ✓ ***Descripción de actividades plan de trabajo SST.***

CRITERIO	ACTIVIDAD	ESTADO
Diseñar el presupuesto anual del SG SST	Estipular los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades establecidas en el presente plan	Ejecutado
Revisar la política integral con la participación del COPASST y levantar el acta	Llevar a cabo reunión del COPASST en la cual se verifique y apruebe las políticas del SGSST	La actividad se realizó dentro del grupo empresarial de JASB aprobando y definiendo las políticas
Actualizar documentación	Documentación controlada y actualizada	Ejecutado
Revisar la lista de verificación de la afiliación a seguridad social para directos y contratistas	Vigilar que el 100% de los trabajadores este afiliado al sistema general de riesgos laborales	Ejecutado
Realizar autoevaluación de estándares mínimos	Cumplir con la autoevaluación certificada con la ARL con un cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado	N/A Se corrige actividad dado que fue realizado en el mes de enero de 2025.
Realizar auditoría interna	Cumplir con el 100% de las actividades planificadas en la auditoria	N/A Actividad reprogramada para el último trimestre del año
Actualizar programa y plan de auditoria anual	Cumplir 100% con lo programado	N/A Actividad reprogramada para el último trimestre del año
Socializar informe de auditorías	Todos los interesados deben conocer los resultados de la auditoría	N/A Actividad reprogramada para el último trimestre del año
Programar actividades del COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Brigadistas.	Verificar y dar cumplimiento con las reuniones establecidas – temporalmente no aplica COPASST, sin embargo, se aplicará VIGIA en SST por lo cual se establece la designación correspondiente.	Durante el periodo se realiza reunión de COCOLAB, adicional se reprograma la actividad referente a emergencias.
Revisar y publicar la política de prevención y drogas	Divulgar con el personal de interventoría las políticas de prevención de alcohol y drogas	La actividad se ejecutó en la inducción SSTMA
Llevar a cabo el programa de pausas activas y realizar la elección de líderes	Cumplir con las actividades propuestas en el programa de pausas activas y realizar acta de líderes	N/A Actividad reprogramada para el mes de julio de 2025
Implementar el plan de emergencia	Cumplir con las actividades propuestas en el plan de emergencia	N/A Actividad reprogramada para el mes de julio de 2025
Llevar a cabo reunión mensual del COPASST	Realizar conformación del vigía en SST.	Dada la cantidad de profesionales actuales de interventoría, inicialmente se designa un vigía en SST; sin embargo, se mantienen las actividades de COPASST con el fin de hacer seguimiento
Constitución de los brigadistas	Divulgar las funciones del 100% del personal que compone la Brigada	N/A Actividad reprogramada para el mes de julio de 2025
Realizar capacitación de primer respondiente	Capacitar al 100% del personal que compone la brigada	N/A Actividad reprogramada para el mes de septiembre de 2025

Tabla 31. descripción de actividades planeadas, ejecutadas y pospuestas.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

✓ CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

De acuerdo con las actividades programadas vs las actividades ejecutados para el periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2025, en cuanto al cronograma de capacitaciones, el CONSORCIO INTERSEG genera un cumplimiento del 100%.(ver anexo 1.6).

10. CRONOGRAMA

TEMAS	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
PLANIFICACIÓN DEL SGSST														
Induccion/ Reinduccion de Seguridad y Salud en el Trabajo	P	E												
Divulgacion de politicas y objetivos del SG-SST	P	E												
Ley 1010 acoso laboral									P					
Roles y responsabilidades comites COPASST y COCOLAB			P								P			
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE														
Pausas activas			P		P		P		P		P		P	
Capacitacion en estilos de vida saludables											P			
PROGRAMAS DE GESTIÓN														
Uso adecuado de elementos de protección personal											P			
Identificacion de peligros y valoracion de riesgos (medidas de control)							P							
Riesgo Público									P					
Capacitacion en prevencion de riesgo osteomuscular													P	
Riesgo locativo									P					
Divulgacion de protocolo de fiebre amarilla					P									
Identificación de riesgo mecánicos - movimiento de maquinaria, puntos ciegos					P									
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL														
Capacitacion en manejo defensivo											P			
Capacitacion en seguridad vial											P			
PLAN DE EMERGENCIAS														
Divulgacion plan de emergencias													P	
Formacion brigadistas en primeros auxilios														
Formacion brigadistas contra incendios														

Página 1

Tabla 32. Cronograma de capacitaciones

CRITERIO	ACTIVIDAD	ESTADO
inducción / reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar la inducción al personal de interventoría dejando trazabilidad de los meses de abril y mayo	Ejecutado
Divulgación de políticas y objetivos del SG-SST	Se lleva a cabo la formación solicitada	Ejecutado

Tabla 33. descripción de capacitaciones

✓ VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el CONSORCIO INTERSEG no aplica la implementación del COPASST, razón por la cual el día 15 de mayo de 2025, el representante legal la Dra Susana Guerra, designa como vigía en SST a Yulieth Carolina Galvis Reyes, quien, a partir del 01 de junio de 2025, elaborara los informes de gestión respectivo para dar cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986. (ver anexo 1.6).

✓ COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El COCOLAB del CONSORCIO INTERSEG quedará bajo la responsabilidad de la empresa aliada JORGE ALVARO SANCHEZ B y CIA, el ultimo comité se llevó a cabo

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

bajo el acta N° 5, celebrado del 23 de mayo de 2025 sin que se presentaran casos de acoso laboral., próxima reunión Agosto de 2025. (Ver anexo 1.6).

✓ SEGUIMIENTO DE PAGOS U HONORARIOS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Previo al ingreso de cada trabajador se realiza la verificación de los documentos requeridos su aprobación como lo son: ARL, EPS, AFP, examen médico ocupacional, carta de recomendaciones médicas, entrega de elementos de protección personal e inducción; posterior a ellos, así mismo, se verifica que el pago de los aportes a la seguridad social no solamente se realice dentro del tiempo establecido, si no también que los aportes sean abonados a las entidades donde los trabajadores fueron afiliados. El contratista remite la siguiente planilla de seguridad social:

N°	CONTRATISTA	N° DE TRABAJADORES	No PLANILLA	FECHA PAGO	FECHA LIMITE PAGO
1	JASB PROYECTOS SAS	2	86302031	05/05/2025	05/05/2025
2	JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S	7	86365733	12/05/2025	12/05/2025

Tabla 34. Reporte de pagos a la seguridad social.

✓ ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el periodo 29 de abril al 28 de mayo de 2025, EL CONSORCIO INTERSEG no realizó reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) dado que no se registraron eventos de origen laboral (Ver anexo 1.7):

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FECHA DEL AT	DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCION
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 35. Reporte de AT.

✓ INDICADORES SST

Basado en la Resolución 0312 de 2019 ICOVIAS durante el periodo se da cumplimiento con los indicadores de los estándares mínimos descritos de la siguiente manera:

Periodo	Horas hombre trabajadas	Trabajadores	Horas Trabajadas	Días Trabajados	Horas Extras	Días de Ausentismo por AT	Días de Ausentismo por enfermedad común	Número de AT que se presentaron	Número de AT mortales que se presentaron	Número de casos de Enfermedad Laboral EL
29 de abril al 28 de mayo de 2025	207	9	42	23	0	0	0,00	0	0	0


Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Tabla 36. HHT

✓ ACCIDENTES LABORALES

$$x = \frac{\text{N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{N°de días de trabajo programados en el mes}} * 100$$


$$x = \frac{0}{9} * 100 = 0.0$$

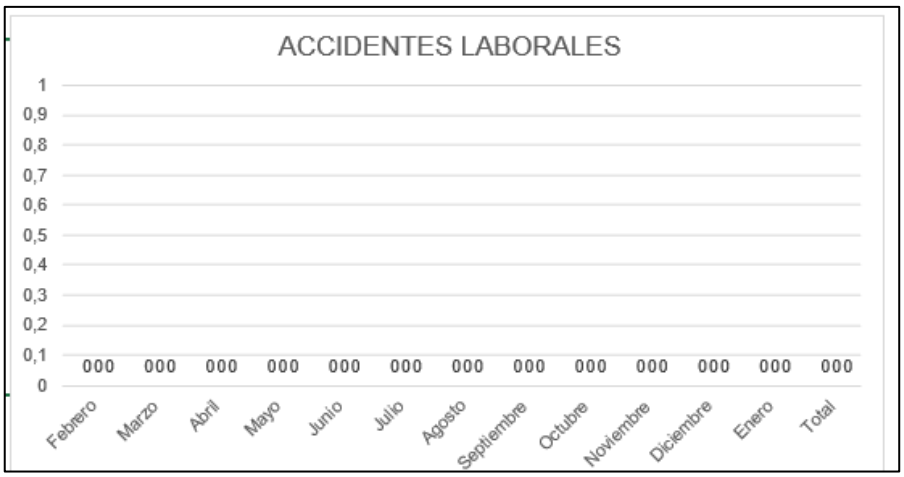

Gráfica 12. Indicador de AT

Por cada 100 trabajadores que laboran durante el periodo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.

✓ AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA

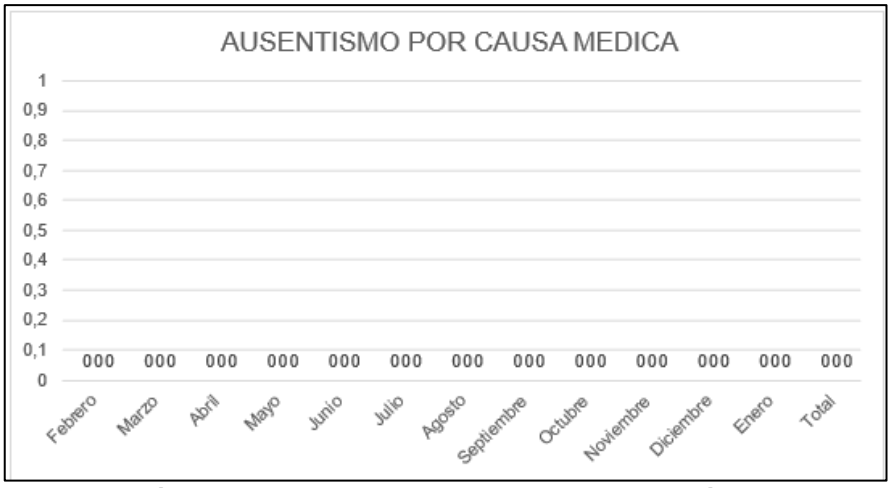

Gráfica 13. Indicador de ausentismo por causa médica


Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Durante el periodo se perdió 0,0% de días programados de trabajo por incapacidad medica

- ✓ **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$x = \frac{\text{N° de AT}}{\text{N° de trabajadores en el mes}} * 100$$

$$x = \frac{0}{9} * 100 = 0$$

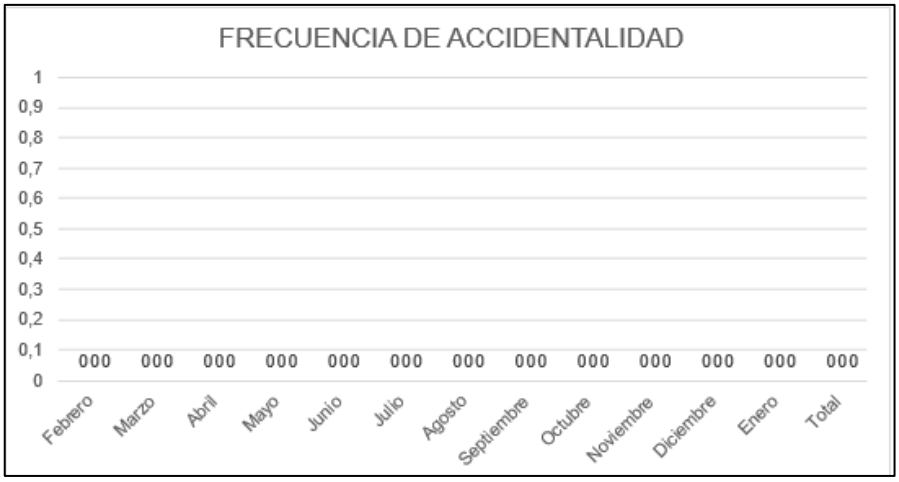

Gráfica 14. Indicador de frecuencia de AT


Por cada cien (100) trabajadores que laboraron durante el periodo, se presentaron 0 accidentes de trabajo

- ✓ **INDICE DE SEVERIDAD**

$$x = \frac{\text{N° de días de incapacidad por AT + N° de días cargados en el mes}}{\text{N° de trabajadores en el mes}} * 100$$


$$x = \frac{0 + 0}{9} * 100 = 0$$

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

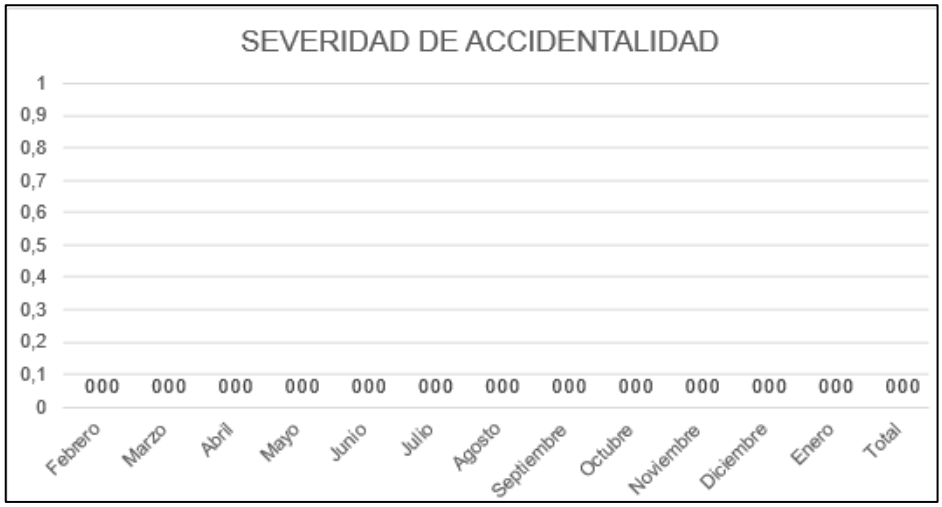

Gráfica 15. Indicador de AT

Por cada 100 trabajadores que laboran durante el periodo se perdieron 0 días por Accidente De Trabajo

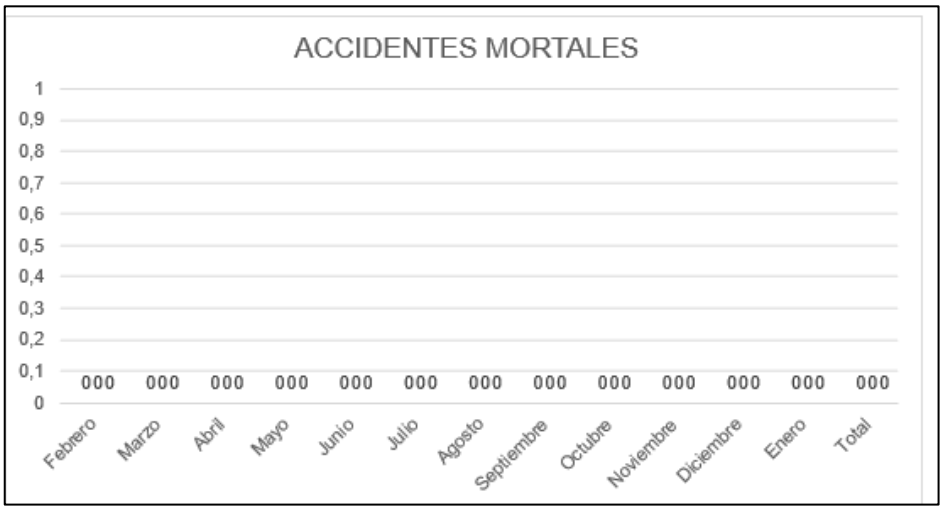

Gráfica 16. Indicador de AT Mortales

Durante el periodo, el 0,0% de accidentes de trabajo fueron mortales

.-

- ✓ **PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$x = \frac{\text{N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo}}{\text{N° de trabajadores en el periodo}} * 100000$$

$$x = \frac{0 + 0}{9} * 100000 = 0.0$$

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Durante el periodo por cada 100.000 trabajadores se presentaron 0 casos de enfermedad laboral.

- ✓ **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$x = \frac{\text{N° de casos nuevos de EL en el periodo}}{\text{N° de trabajadores en el periodo}} * 100000$$

$$x = \frac{0}{9} * 100000 = 0.0$$

Durante el periodo, por cada 100.000 trabajadores se presentaron 0 casos nuevos de enfermedad laboral.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO 6. SEGUIMIENTO SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORIAL AL CONTRATISTA DE OBRA

6.1 Estado de productos, informes semanales, informes mensuales contratista

PRODUCTO	No Y FECHA DE RADICADO CONTRATISTA DE OBRA	FECHA	ESTADO	No Y FECHA DE RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	CONCEPTO DE LA ANSV
SG-SST	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-017-V001	16/05/2025	Aprobado	01OPV-INT-ZO2-IGN-SST-002-AprobaciónPlanSST-V002	20/05/2025	Recibido
PMA	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-021-V002	19/05/2025	Aprobado	762-022 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-021-V002-PlanGestiónAmbiental-V002	20/05/2025	Recibido
Informe mensual ambiental y SST No1	001OPV-ASV-ZO2-ACT-COO-001-IMensual1-	04/06/2025	Aprobado	762-062 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-002-AprobacioninformeMensual-V001 – copia	07/06/2025	Recibido
Informe semanal 1	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-010-V001 ICV-341-C015	7/05/2025	Aprobado	001OPV-ASV-ZO2-ACT-GEA-001-InformeSemanal1.V001	10/05/2025	Recibido
Informe semanal 2	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-012V001	12/05/2025	Aprobado	001OPV-ASV-ZO2-ACT-GEA-002-InformeSemanal1.V001	14/05/2025	Recibido
Informe semanal 3	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-012V001	19/05/2025	Aprobado	001OPV-ASV-ZO2-ACT-GEA-003-InformeSemanal1.V001	22/05/2025	Recibido
Informe semanal 4	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-025-V001	26/05/2025	Aprobado	001OPV-ASV-ZO2-ACT-GEA-004-InformeSemanal1.V001	28/05/2025	Recibido

Tabla 37. Estado de productos e informes contratista.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.2 Estado de productos e informes interventoría

Producto	Oficio	Fecha	No de radicado INTERVENTORIA	No radicado observado / aprobado	Fecha	Estado
Informe mensual N°1 V3	762-097	26/07/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-048-RemisioninformeMensualNo1V2-V002	Correo electrónico de la ANSV	01/08/2025	Observado
SGSST Consorcio INTERSEG V3	-	15/07/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-SST-004-SistemadegestionSSTV2-V001	20253000056841	16/06/2025	Observado
Remisión Informe semanal 1	-	8/05/2025	001OPV-INT-NA-FOR-GEA-009-InformeSemanal-V001	Correo electrónico de la ANSV	26/06/2025	Aprobado
Remisión Informe semanal 2	-	12/05/2025	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-001INFORMESEMANAL2	Correo electrónico de la ANSV	26/06/2025	Aprobado
Remisión Informe semanal 3	-	19/05/2025	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-004-Informesemanal3Int-V001. (1	Correo electrónico de la ANSV	26/06/2025	Aprobado
Remisión Informe semanal 4	-	26/05/2025	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-008-InformesSemanal4Int-V001.	Correo electrónico de la ANSV	26/06/2025	Aprobado
Remisión Informe semanal 5	-	2/06/2025	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-010-InformeSemanal5 -V001	Correo electrónico de la ANSV	26/06/2025	Aprobado

Tabla 38 Estado de productos e informes interventoría

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.3 Estado de aprobación de hojas de vida del personal de contratista de obra.

N°.	NOMBRE	CARGO	OFICIO ENVIADO	ENTIDAD	APROBADO POR INTERVENTORIA	FECHA
1	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
2	Diana Paola Parada Sierra	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
3	Alba Zuleidy Avendaño Cipagauta	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
4	Margarita Rosa Pardo	Especialista en Pavimentos	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-014-V001	ICOVIAS	Oficio 762-028 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006 Aprobhojasdevida-V002	20/05/2025
5	Diego Ignacio Gualteros Chávez	Ingeniero Residente de Obra	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
6	Víctor Andrés Moreno Cristancho	Ingeniero Residente de Obra	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
7	Anderson Yecid Niño Castillo	Ingeniero Auxiliar de Apoyo	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
8	Antonio de Jesús Rivas	Ingeniero Auxiliar de Apoyo	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-014-V001	ICOVIAS	Oficio 762-028 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006 Aprobhojasdevida-V002	20/05/2025
9	Giovani Alexander Brito Núñez	Tecnólogo en SIG	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no pa-024-2025	14/04/2025
10	Luis Alfredo Carrillo Morales	Tecnólogo en Dibujo	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-014-V001	ICOVIAS	Oficio 762-028 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006 Aprobhojasdevida-V002	20/05/2025
11	Michel Virginia López España	Tecnólogo en Dibujo	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no PA-024-2025	14/04/2025
12	Irina Rocío Gutiérrez Durán	Ingeniero Ambiental	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no PA-024-2025	14/04/2025
13	Yulid Liliana Gelves	Tecnólogo en STT	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no PA-024-2025	14/04/2025
14	Jesús Guillermo Hernández Cervantes	Tecnólogo en STT	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no PA-024-2025	14/04/2025
15	Jenifer Yudith Rodríguez	Profesional Social y de Comunicaciones	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no PA-024-2025	14/04/2025
16	Elizabeth Suárez Garcés	Profesional Social y de Comunicaciones	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2- COE-GEA-013-V001	ICOVIAS	oficio 762-004 Aprobación hojas de vida contrato de obra no PA-024-2025	14/04/2025
17	Vanessa Fernanda Cabrales Yépez	Profesional Social y de Comunicaciones	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-014-V001	ICOVIAS	Oficio 762-028 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006 Aprobhojasdevida-V002	20/05/2025

Tabla 39. Relación personal ICOVIAS aprobado por la interventoría

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.4 Estado de aprobación de documentos de vinculación del personal de contratista de obra.

N°.	NOMBRE	CARGO	OFICIO ENVIADO	ENTIDAD	APROBADO POR INTERVENTORIA	FECHA
1	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
2	Diana Paola Parada Sierra	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
3	Alba Zuleidy Avendaño Cipagauta	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
4	Margarita Rosa Pardo	Especialista en Pavimentos	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
5	Diego Ignacio Gualteros Chávez	Ingeniero Residente de Obra	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
6	Víctor Andrés Moreno Cristancho	Ingeniero Residente de Obra	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
7	Anderson Yecid Niño Castillo	Ingeniero Auxiliar de Apoyo	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
8	Antonio de Jesús Rivas	Ingeniero Auxiliar de Apoyo	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
9	Giovani Alexander Brito Núñez	Tecnólogo en SIG	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
10	Luis Alfredo Carrillo Morales	Tecnólogo en Dibujo	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
11	Michel Virginia López España	Tecnólogo en Dibujo	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
12	Irina Rocío Gutiérrez Durán	Ingeniero Ambiental	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
13	Yulid Liliana Gelves	Tecnólogo en STT	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
14	Jesús Guillermo Hernández Cervantes	Tecnólogo en STT	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
15	Jenifer Yudith Rodríguez	Profesional Social y de Comunicaciones	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
16	Elizabeth Suárez Garcés	Profesional Social y de Comunicaciones	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025
17	Vanessa Fernanda Cabrales Yépez	Profesional Social y de Comunicaciones	ICV-341-C045 - 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	ICOVIAS	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacioncontr-V001	11/06/2025

Tabla 40. Relación personal ICOVIAS aprobado por la interventoría

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.5 CORRESPONDENCIA

6.5.1 Correspondencia enviada

FECHA	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO DESTINATARIO	DESTINATARIO	ASUNTO
3/04/2025	762-002	N/A	ICOVIAS SAS	RESPUESTA A COMUNICADO ICV-341-C001 HV CONTRATISTA
3/04/2025	762-002	N/A	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA	NOTIFICACIÓN CAMBIO DE DOMINIO AL CANAL OFICIAL CORRESPONDENCIA
15/04/2025	762-004	2025660002914	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA OBRA
15/04/2025	762-005	20256600029552	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA	ALCANCE_HV_PERSONAL_INTERVENTORIA
15/04/2025	762-006	20256600031792	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA	_ALCANCE_HV_PERSONAL_INTERVENTORIA -
16/04/2025	762-007	N/A	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA	_PERSONAL INTERVENTORÍA CONVOCATORIA
6/05/2025	762-011	N/A	ICOVIAS SAS	PERSONAL INTERVENTORÍA ACTUALIZADA
6/05/2025	762-011		ICOVIAS S.A.S	PERSONAL DE INTERVENTORÍA APROBADO
12/05/2025	001OPV-INT-ZO2-IGN-SST-001-ObsPlanSST-V001	00.294.668	ICOVIAS	Observaciones Plan STT V001
14/05/2025	OBS 001OPV-ASV-ZO2-IGNGAM-001-PLANGESTIÓNAMBIENTALV001.	00.295.211	ICOVIAS	Observaciones PGA
20/05/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006-Aprobhojasdevida-V002		ICOVIAS	Aprobación Hojas de vida de cambio

Tabla 41. Correspondencia enviada.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.5.2 Correspondencia recibida

RECIBIDA		
FECHA CORRESPONDENCIA	**RADICADO**	**DESCRIPCION**
29/03/2025	ICV-341-C-001	Entrega Hojas de vida
8/04/2025	ICV-341-C-002	Subsanación Hojas de vida
12/05/2025	ICV-341-C021 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-013-V001	Entrega documentos de ingreso personal aprobado
12/02/2025	ICV-341-C022 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-014-V001	Hojas de vida 2
15/05/2025	ICV-341-C027 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-018-V001	Cambio hoja de vida Esp. Pavimentos
16/05/2025	ICV-341-C028 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-017-V001	Entrega PSST V2
16/05/2025	ICV-341-C031001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-019-V001	Cambio HV Ing Auxiliar apoyo Víctor Petit
19/05/2025	ICV-341-C034 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-021-V002	Entrega PMA - V2
26/05/2025	ICV-341-C045 001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-026-V001	Doc ingreso personal II

Tabla 42. Correspondencia recibida.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.6 Relación de mesas de trabajo realizadas en el periodo.

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

N°	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	REUNION AMBIENTAL SST	08/05/2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION	La supervisión da a conocer la lista de chequeo de los informes mensuales SST y ambiental tanto de interventoría como contratista y la lista de formatos a aplicar
2	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	07/05/2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION	No se generan compromisos por parte del componente SST y/o ambiental
3	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	14/05/2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION	No se generan compromisos por parte del componente SST y/o ambiental
4	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	21/05/2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION	No se generan compromisos por parte del componente SST y/o ambiental
5	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	28/05/2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION	No se generan compromisos por parte del componente SST y/o ambiental

Tabla 43. Mesas de trabajo

6.7 Atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas.

Durante el periodo se reportaron solicitudes ni y requerimientos**.**

N°	RADICADO	ASUNTO	ENTIDAD	FECHA	RADICADO	RESPUESTA	FECHA
1	001OPV-ASV-ZO2-IGN-SST-001-PlanSST-V001	Entrega Plan SST	ICOVIAS	06/05/2025	001OPV-INT-ZO2-IGN-SST-001-ObsPlanSST-V001	Observaciones plan SST	12/05/2025
2	001OPV-ASV-ZO2-IGN-GAM-001-PlanGestiónAmbiental-V001	Entrega Plan Ambiental	ICOVIAS	06/05/2025	001OPV-ASV-ZO2-IGN-GAM-001-PLANGESTIÓNAMBIENTAL-V001	Observaciones planAmbiental	14/05/2025
3	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-017-V001	Entrega Plan SST V2	ICOVIAS	16/05/2025	001OPV-INT-ZO2-IGN-SST-002-AprobaciónPlanSST-V002	Aprobacion plan SST	20/05/2025

Tabla 44. Relación requerimientos, solicitudes.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.8 Descripción sobre incumplimientos, requerimiento o procesos sancionatorios.

Durante el periodo de reporte del informe no se generaron incumplimientos o requerimientos disciplinarios o procesos sancionatorios ni hacia el contratista ni hacia la interventoría.

N°	DESCRIPCION	FECHA	NOVEDAD
-	-	-	-
-	-	-	-

Tabla 45. relación incumplimientos y procesos de sanción

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Una vez se inicien las actividades de obra, los componentes ambiental y SST anexaran al presente informe los registros fotográficos correspondientes a cada aspecto relacionado en el presente informe.

- ✓ La gestión documental desarrollada durante el periodo permite fortalecer la implementación de actividades que se tiene previsto aplicar durante la ejecución del proyecto.

- ✓ Se identificaron algunas oportunidades de mejora con el contratista ICOVIAS S.A.S la cual el CONSORCIO INTERSEG recomienda que se tomen las medidas pertinentes con el fin de abordar estos hallazgos y mejorar la gestión SST.

- ✓ Se realizará seguimiento permanente sobre el cumplimiento de las actividades programadas para los periodos de los informes.

- ✓ El CONSORCIO INTERSEG está comprometido con el éxito del proyecto en cuanto a la gestión SST y estamos dispuestos a trabajar con el equipo de ICOVIAS S.A.S de manera mancomunada con el fin de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ANEXOS

- ANEXO 1.1 - FORMATO SSTA -12 -CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS
- ANEXO 1.2 - PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABADORES
- ANEXO 1.3 - FORMATO SSTA -11 FORMATO DE REPORTE DE PERSONAL
- ANEXO 1.4 - FORMATO SSTA – 12 PAZ Y SALVO DEL PERSONAL
- ANEXO 1.5 - SOPORTE DE CONTRATO PERSONAL NUEVO
- ANEXO 1.6 - PLAN DE TRABAJO SST Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
- ANEXO 1.7 - INDICADORES DE GESTIÓN SST
- ANEXO 1.8 - REPORTE DE ACCIDENTALIDAD
- ANEXO 1.9 - FORMATO SSTA – 07- LISTADO DE VEHÍCULOS
- ANEXO 1.10 - FORMATO SSTA – 08 – LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
- ANEXO 1.11- PREOPERACIONALES DIARIOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
