NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400061309, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024
NIT : 901.892.537 - 8
Asegurado : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
NIT : 899.999.061 - 9

Se expide la presente certificación a los 21 días del mes de Febrero de 2025.

Cordialmente,



_____
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA		RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
182538	BOGOTA		11			30	400061309	2
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Dia - Mes - Año	Dia - Mes - Año	Horas	Dia - Mes - Año	Horas				
21 / 2 / 2025	11 / 2 / 2025	00:00	12 / 8 / 2028	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 7B NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6832533

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 7B NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6832533

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO	3241000

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 705 de 2024, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2025	11/08/2025	363.636.363,60	360.647,57
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/02/2025	11/08/2028	181.818.181,80	1.272.229,14
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/02/2025	11/08/2025	1.090.909.090,80	1.081.942,71
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/08/2025	12/08/2027	1.090.909.090,80	4.363.636,36

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 7.078.455,78	$ 17.700,00	$ 1.348.269,60	$ 8.444.425,38	Dia - Mes - Año 23/03/2025	901892537

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.727.272.727,00	DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑIA	%	VALOR ASEGURADO
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	400757	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
Información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 302 / Bogotá D.C.
(601) 800 6017
3137843800
defensornacionaldeseguros@umbosanitas.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO
YBENAVIDES
01/08/2022|13-7|NT-P|SI|NT-CUMP-ESTATAL5|DOS
01/04/2020|13-7|P|SI|CL-CUMP-ESTATAL4|DOS

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400061309	2	BOGOTA	21 /2 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 11 /2 /2025	00:00 Horas del 12 /8 /2028	TRASLADO DE VIGENCIA

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 78 NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6632533
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66-63, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66-63, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 705 de 2024, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024 CONFORMADO POR:
-EMPRESAS GRUPO ROMERO NIT 901347937 PARTICIPACION 50%
-EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. NIT 901730540-6 PARTICIPACION 50%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	8.444.425,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
23/03/2025	$ 8.444.425,38

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN FEBRERO 21 DE 2025





NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400061309, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024
NIT : 901.892.537 - 8
Asegurado : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
NIT : 899.999.061 - 9

Se expide la presente certificación a los 21 días del mes de Febrero de 2025.

Cordialmente,



_____
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
182534	BOGOTA	11		15	400061310	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
21 / 2 / 2025	23 / 12 / 2024	00:00	23 / 6 / 2025	00:00	CANCELACION	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 7B NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6632533

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6632533
BENEFICIARIO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6632533

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	-327.272.727,00	0,00	0,00	-1.087.920,30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	-163.636.363,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS MEDICOS	-300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	-163.636.363,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	-163.636.363,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	-163.636.363,00	0,00	0,00	0,00

DEDUCIBLES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ -1.087.920,30	$ -17.700,00	$ -210.067,86	$ -1.315.688,16	Día - Mes - Año 22/02/2025	901892537

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 0,00	

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	400787	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 606 8017
3137993660
defensornacionaldeseguros@unicoboogotas.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014/13-7INT-R96INT-RC-CUMP1IDI001 13/05/2014/13-7/R96CL-RC-PARTICULAR-01IDI001
YBENAVIDES

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400061310	1	BOGOTA	Dia - Mes - Año 21 2 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Dia - Mes - Año	Horas	Dia - Mes - Año	Horas	
23 12 2024	00:00	23 6 2025	00:00	CANCELACION

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 76 NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6832533

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6832533
BENEFICIARIO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6832533

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 705 de 2024, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400061310

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	-1.315.688,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
22/02/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN FEBRERO 21 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
182535	BOGOTA	11		15	400081310	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
21 / 2 / 2025	11 / 2 / 2025	00:00	12 / 8 / 2025	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 7B NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6632533

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6632533
BENEFICIARIO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6632533

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	327.272.727,00	1.090.909.091,00	1.090.909.091,00	1.087.920,30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	163.636.363,00	327.272.727,00	327.272.727,00	0,00
GASTOS MEDICOS	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	163.636.363,00	327.272.727,00	327.272.727,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	163.636.363,00	327.272.727,00	327.272.727,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	163.636.363,00	327.272.727,00	327.272.727,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 1.087.920,30	$ 17.700,00	$ 210.067,86	$ 1.315.688,16	Día - Mes - Año 23/03/2025	901892537

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.090.909.091,00	MIL NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ANGARITA SEGUROS E&A LIMITADA	400787	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania Of. 302 / Bogotá D.C.
(601) 606 6017
3127883883
defensornacionaldeseguros@umnabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|0001 13/05/2014|13-7|P|26|CL-RC-PARTICULAR-01|0001
YBENAVIDES

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD (Dia - Mes - Año)	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400061310	2	BOGOTA	21 2 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE (Dia - Mes - Año)	A LAS (Horas)	VIGENCIA HASTA (Dia - Mes - Año)	A LAS (Horas)	TIPO DE MOVIMIENTO
11 2 2025	00:00	12 8 2025	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8
DIRECCIÓN	CALLE 7B NO. 46-43 ETAPA ESPERANZA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6832533

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6832533
BENEFICIARIO	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	NIT	901.892.537 - 8	TELÉFONO	6832533

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 705 de 2024, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 705 de 2024, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024 SE TENDRA A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400061310

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	1.315.688,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
23/03/2025	$ 1.315.688,16

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN FEBRERO 21 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO 6
CONTROL FINANCIERO COP 705 Y CIN 795

CONTRATISTA 705 DE 2024

90% CONTRATO		$ 3.272.727.272	**ADICIONES**	
10% LIQUIDACIÓN		$ 363.636.364	**ADICION 1**	
VALOR TOTAL INICIAL		$ 3.636.363.636	**ADICION 2**	
VALOR COBRADO ACUMULADO		$ 1.090.909.091		
			% COBRADO ACUMULADO:	**30,00%**
			POR COBRAR	$ 2.545.454.545

PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	30,00%		$ 1.090.909.091	ANTICIPO
2				
3				
4				
5				
6	0,00%			
10% LIQUIDACION		$ 363.636.364		
TOTAL	**30,00%**	**$ 363.636.364**	**$ 1.090.909.091**	


INTERVENTORIA 795 de 2024

95% CONTRATO	$ 345.454.546	**ADICIONES**		
5% LIQUIDACION :	$ 18.181.818	**ADICION 1**		
VALOR TOTAL INICIAL	$ 363.636.364	**ADICIÓN 2**		
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 165.050.506	**ADICION 3**		
% RELACION CONTRATISTA	10,00%	**% COBRADO ACUMULADO:**	**45,39%**	
		POR COBRAR	$ 198.585.858	

	PAGO	%INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
95% CONTRA AVANCE DE OBRA Y 5 % A LIQUIDACION	1	13,72%		$ 49.898.990	11 de febrero de 2025 al 06 de marzo de 2025
	2	15,83%		$ 57.575.758	07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025
	3	15,83%		$ 57.575.758	07 de abril de 2025 al 06 de mayo de 2025
	4	0,00%			
	5	0,00%			
	6	0,00%			
5% LIQUIDACION :			$ 18.181.818		
TOTAL		**45,39%**	**$ 18.181.818**	**$ 165.050.506**	

ANEXO 7
PROGRAMACIÓN DE OBRA


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
1			**Parques Engativa**	**155 días**	**mar 11/02/2**	**sáb 9/08/25**			**$ 3.636.363.636,00**
2			**Diagnosticos, Presupuestos y Preeliminares**	**48 días**	**mar 11/02/2**	**lun 7/04/25**			**$ 0,00**
3			**Grupo 1**	**52,78 días**	**lun 7/04/25**	**vie 6/06/25**			**$ 1.185.740.749,10**
4			**10-010-Parque Las Ferias**	**35 días**	**lun 28/04/25**	**vie 6/06/25**			**$ 279.556.279,40**
5		**1**	**PRELIMINARES**	**11 días**	**lun 28/04/25**	**vie 9/05/25**			**$ 12.085.594,00**
6		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**vie 9/05/25**	**vie 9/05/25**			**$ 595.620,00**
7		1,1,1	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	M2	540.00	$ 595.620,00
8		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 28/04/25**	**lun 28/04/25**			**$ 1.035.960,00**
9		1,2,3	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	ML	60.00	$ 1.035.960,00
10		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**1 día**	**mar 29/04/2**	**mar 29/04/2**			**$ 8.141.688,00**
11		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	1 día	mar 29/04/2	mar 29/04/2	M3	43.20	$ 8.141.688,00
12		**1.4**	**DESMONTES Y REINSTALACIONES**	**1 día**	**mar 29/04/2**	**mar 29/04/2**			**$ 2.312.326,00**
13		1,4,4	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	1 día	mar 29/04/2	mar 29/04/2	UN	1.00	$ 1.568.394,00
14		1,4,5	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-5 o	1 día	mar 29/04/2	mar 29/04/2	UN	1.00	$ 743.932,00
15		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**21 días**	**mié 30/04/2**	**vie 23/05/25**			**$ 45.879.750,00**
16		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**8 días**	**mié 30/04/2**	**jue 8/05/25**			**$ 18.711.648,00**
17		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	8 días	mié 30/04/25	jue 8/05/25	M3	216.00	$ 18.711.648,00
18		**2.3**	**RELLENOS**	**12 días**	**sáb 10/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 27.168.102,00**
19		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	sáb 17/05/25	vie 23/05/25	M3	54.00	$ 7.906.302,00
20		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	6 días	sáb 10/05/25	vie 16/05/25	M3	162.00	$ 19.261.800,00
21		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**3 días**	**jue 29/05/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 3.054.218,00**
22		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**jue 29/05/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 3.054.218,00**
23		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	jue 29/05/25	vie 30/05/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
24		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	ML	25.00	$ 2.024.550,00
25		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**21 días**	**jue 8/05/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 33.246.042,00**
26		**5.1**	**PISOS**	**21 días**	**jue 8/05/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 33.246.042,00**
27		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	1 día	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	ML	134.00	$ 989.322,00
28		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	3 días	jue 8/05/25	sáb 10/05/25	M2	60.00	$ 32.256.720,00
29		**6**	**PINTURA**	**33 días**	**mié 30/04/2**	**vie 6/06/25**			**$ 9.064.516,00**
30		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**33 días**	**mié 30/04/2**	**vie 6/06/25**			**$ 8.021.747,00**
31		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+	3 días	mié 30/04/25	vie 2/05/25	ML	92.00	$ 1.200.324,00
32		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	2 días	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	M2	142.00	$ 2.599.452,00
33		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	3 días	lun 2/06/25	mié 4/06/25	M2	300.00	$ 2.814.600,00
34		6,1,10	Pintura estructura baloncesto **	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	JGO	1.00	$ 609.995,00
35		6,1,11	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	1 día	vie 6/06/25	vie 6/06/25	JGO	1.00	$ 207.120,00
36		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	2 días	sáb 3/05/25	lun 5/05/25	UN	1.00	$ 590.256,00
37		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	mar 6/05/25	mié 7/05/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
38		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 88.990.380,00**
39		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 88.990.380,00**
40		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	jue 29/05/25	jue 29/05/25	M2	540.00	$ 88.990.380,00
41		**N.P**	**Items no previstos**	**4 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 28/05/2**			**$ 21.081.240,00**
42		N.P3	Carcamo	4 días	sáb 24/05/25	mié 28/05/2 5	ML	60.00	$ 21.081.240,00
43			A 25%	35 días	lun 28/04/25	vie 6/06/25			**$ 53.350.435,00**
44			I 1%	35 días	lun 28/04/25	vie 6/06/25			**$ 2.134.017,40**
45			U 5%	35 días	lun 28/04/25	vie 6/06/25			**$ 10.670.087,00**
46			**10-047-Parque Normandia VI sector**	**39 días**	**lun 21/04/25**	**mié 4/06/25**			**$ 119.785.168,60**
47		**1**	**PRELIMINARES**	**13 días**	**lun 21/04/25**	**lun 5/05/25**			**$ 9.680.850,00**
48		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 5/05/25**	**lun 5/05/25**			**$ 496.350,00**
49		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	M2	450.00	$ 496.350,00
50		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**4 días**	**lun 21/04/25**	**jue 24/04/25**			**$ 9.184.500,00**
51		1,2,1	Demolicion anden concr e = 0.10 incl. cargue y ret *	4 días	lun 21/04/25	jue 24/04/25	M2	450.00	$ 9.184.500,00
52		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**vie 25/04/25**	**sáb 10/05/25**			**$ 31.644.540,00**
53		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**8 días**	**vie 25/04/25**	**sáb 3/05/25**			**$ 15.593.040,00**
54		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	8 días	vie 25/04/25	sáb 3/05/25	M3	180.00	$ 15.593.040,00
55		**2.3**	**RELLENOS**	**6 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 10/05/25**			**$ 16.051.500,00**
56		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	6 días	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	M3	135.00	$ 16.051.500,00
57		**3**	**ESTRUCTURA**	**15 días**	**lun 12/05/25**	**mié 28/05/2**			**$ 47.160.900,00**

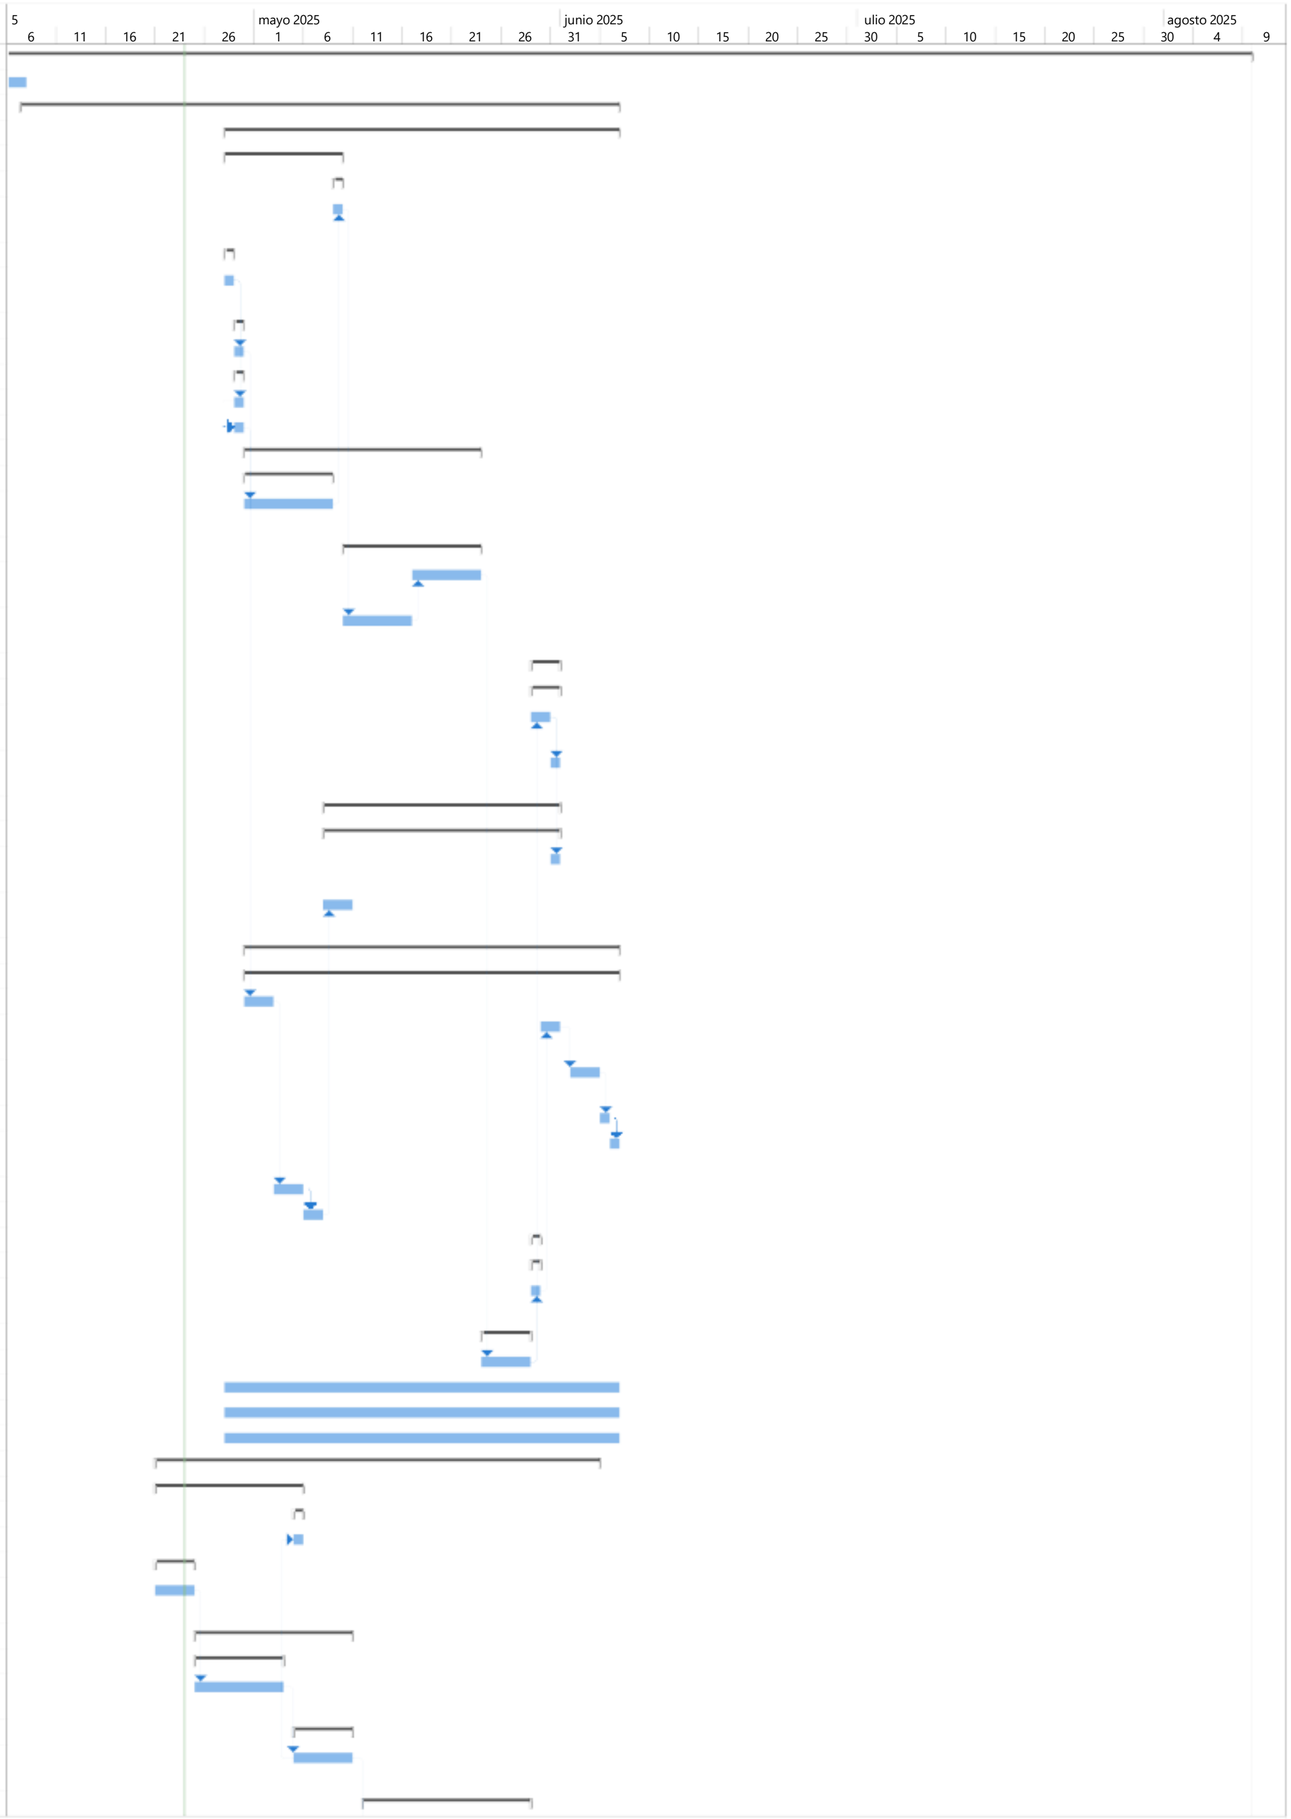

Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
58		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**15 días**	**lun 12/05/25**	**mié 28/05/25**			**$ 47.160.900,00**
59		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	15 días	lun 12/05/25	mié 28/05/25	M2	450.00	$ 47.160.900,00
60		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**5 días**	**jue 29/05/25**	**mar 3/06/25**			**$ 1.402.770,00**
61		**5.1**	**PISOS**	**5 días**	**jue 29/05/25**	**mar 3/06/25**			**$ 1.402.770,00**
62		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	5 días	jue 29/05/25	mar 3/06/25	ML	190.00	$ 1.402.770,00
63		**N.P**	**Items no previstos**	**1 día**	**mié 4/06/25**	**mié 4/06/25**			**$ 1.550.000,00**
64		N.P4	Acrilico	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	M2	10.00	$ 1.550.000,00
65			A	39 días	lun 21/04/25	mié 4/06/25			**$ 22.859.765,00**
66			I	39 días	lun 21/04/25	mié 4/06/25			**$ 914.390,60**
67			U	39 días	lun 21/04/25	mié 4/06/25			**$ 4.571.953,00**
68			**10-095-Parque Santa Cecilia**	**44 días**	**lun 7/04/25**	**mié 28/05/2**			**$ 396.202.515,08**
69		**1**	**PRELIMINARES**	**9 días**	**lun 7/04/25**	**jue 17/04/25**			**$ 14.402.637,00**
70		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 16/04/2**	**jue 17/04/25**			**$ 891.224,00**
71		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	mié 16/04/25	jue 17/04/25	M2	808.00	$ 891.224,00
72		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 7/04/25**	**mar 8/04/25**			**$ 5.369.725,00**
73		1,2,4	Demolición placa de contrapiso incl. cargue	1 día	lun 7/04/25	mar 8/04/25	M3	25.00	$ 5.369.725,00
74		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**1 día**	**mar 8/04/25**	**mié 9/04/25**			**$ 8.141.688,00**
75		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	1 día	mar 8/04/25	mié 9/04/25	M3	43.20	$ 8.141.688,00
76		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**31 días**	**mié 9/04/25**	**jue 15/05/25**			**$ 64.989.375,00**
77		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**7 días**	**mié 9/04/25**	**jue 17/04/25**			**$ 27.998.169,60**
78		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Tr	7 días	mié 9/04/25	jue 17/04/25	M3	323.20	$ 27.998.169,60
79		**2.3**	**RELLENOS**	**24 días**	**jue 17/04/25**	**jue 15/05/25**			**$ 36.991.205,40**
80		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo ID F	12 días	jue 1/05/25	jue 15/05/25	M3	55.80	$ 8.169.845,40
81		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo	12 días	jue 17/04/25	jue 1/05/25	M3	242.40	$ 28.821.360,00
82		**3**	**ESTRUCTURA**	**20 días**	**jue 1/05/25**	**sáb 24/05/25**			**$ 91.290.300,00**
83		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**20 días**	**jue 1/05/25**	**sáb 24/05/25**			**$ 91.290.300,00**
84		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	10 días	mar 13/05/25	sáb 24/05/25	M2	250.00	$ 26.200.500,00
85		3,1,4	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	10 días	jue 1/05/25	mar 13/05/25	ML	600.00	$ 65.089.800,00
86		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**6 días**	**lun 19/05/25**	**lun 26/05/25**			**$ 4.988.534,00**
87		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**			**$ 2.487.344,00**
88		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74	2 días	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
89		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno r	1 día	sáb 24/05/25	lun 26/05/25	ML	18.00	$ 1.457.676,00
90		**4.3**	**FILTROS**	**3 días**	**lun 19/05/25**	**jue 22/05/25**			**$ 2.501.190,00**
91		4,3,1	Filtro frances30*30 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	3 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	ML	30.00	$ 2.501.190,00
92		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**3 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 28/05/2**			**$ 1.232.961,00**
93		**5.1**	**PISOS**	**3 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 28/05/2**			**$ 1.232.961,00**
94		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	3 días	sáb 24/05/25	mié 28/05/25	ML	167.00	$ 1.232.961,00
95		**6**	**PINTURA**	**28 días**	**lun 21/04/25**	**vie 23/05/25**			**$ 6.067.916,00**
96		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**28 días**	**lun 21/04/25**	**vie 23/05/25**			**$ 6.067.916,00**
97		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1	3 días	mar 20/05/2	vie 23/05/25	M2	288.00	$ 2.702.016,00
98		6,1,9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	lun 21/04/25	jue 24/04/25	ML	75.00	$ 1.732.875,00
99		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	5 días	jue 24/04/25	mié 30/04/25	UN	1.00	$ 590.256,00
100		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	5 días	mié 30/04/25	mar 6/05/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
101		**8**	**MOBILIARIO**	**12 días**	**mar 6/05/25**	**mar 20/05/2**			**$ 98.391.705,00**
102		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**lun 19/05/25**	**mar 20/05/2**			**$ 88.990.380,00**
103		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	lun 19/05/25	mar 20/05/25	M2	540.00	$ 88.990.380,00
104		**8.2**	**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**mar 13/05/2**	**vie 16/05/25**			**$ 1.322.934,00**
105		8,2,8	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	1 día	mar 13/05/25	mié 14/05/25	UN	6.00	$ 571.692,00
106		8,2,13	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Columpio-STPM	1 día	mié 14/05/25	jue 15/05/25	UN	3.00	$ 332.454,00
107		8,2,14	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM**	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25	UN	6.00	$ 418.788,00
108		**8.4**	**MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN**	**6 días**	**mar 6/05/25**	**mar 13/05/25**			**$ 8.078.391,00**
109		8,4,5	Modulo Caballo Bicicleta Estatica ((Suminis+Insta)	6 días	mar 6/05/25	mar 13/05/25	UN	1.00	$ 2.107.165,00
110		8,4,7	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	6 días	mar 6/05/25	mar 13/05/25	UN	1.00	$ 3.391.847,00
111		8,4,8	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	6 días	mar 6/05/25	mar 13/05/2	UN	1.00	$ 2.579.379,00
112		**N.P**	**Items no previstos**	**3 días**	**jue 15/05/25**	**lun 19/05/25**			**$ 21.081.240,00**
113		N.P3	Carcamo	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
114			A	44 días	lun 7/04/25	mié 28/05/25			**$ 75.611.167,00**

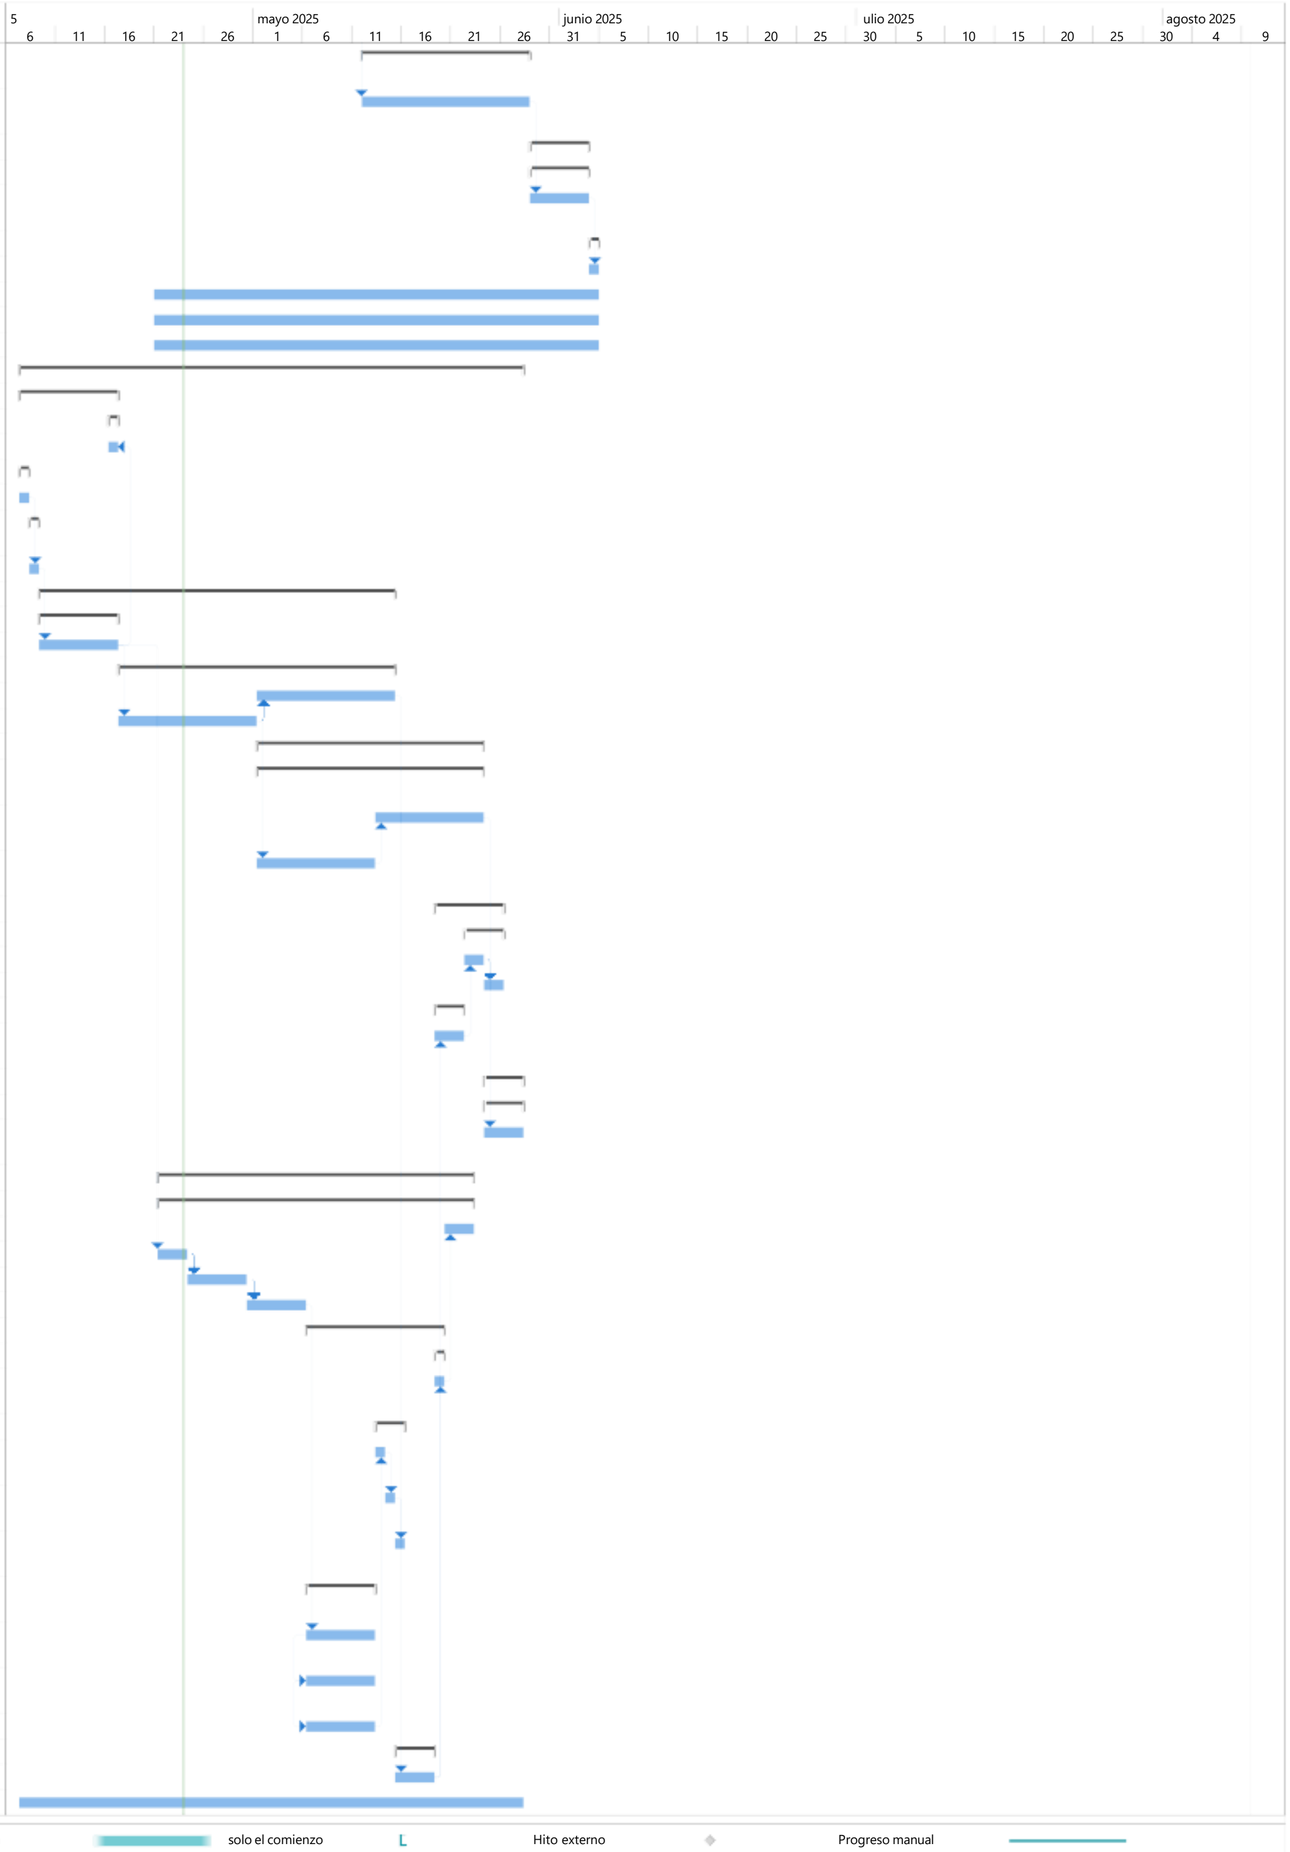

Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
115			I	44 días	lun 7/04/25	mié 28/05/25			$ 3.024.446,68
116			U	44 días	lun 7/04/25	mié 28/05/25			$ 15.122.233,40
117			**10-071-Parque Almeria**	**35 días**	**lun 21/04/25**	**vie 30/05/25**			**$ 115.361.738,76**
118		**1**	**PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 21/04/25**	**mar 22/04/2**			**$ 3.618.528,00**
119		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**2 días**	**lun 21/04/25**	**mar 22/04/25**			**$ 3.618.528,00**
120		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/2	M3	19.20	$ 3.618.528,00
121		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**13 días**	**mié 23/04/2**	**mié 7/05/25**			**$ 5.972.208,00**
122		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**8 días**	**mié 23/04/2**	**jue 1/05/25**			**$ 3.118.608,00**
123		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Tr	8 días	mié 23/04/25	jue 1/05/25	M3	36.00	$ 3.118.608,00
124		**2.3**	**RELLENOS**	**5 días**	**vie 2/05/25**	**mié 7/05/25**			**$ 2.853.600,00**
125		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo	5 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	M3	24.00	$ 2.853.600,00
126		**3**	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**jue 8/05/25**	**sáb 10/05/25**			**$ 25.152.480,00**
127		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**3 días**	**jue 8/05/25**	**sáb 10/05/25**			**$ 25.152.480,00**
128		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6m	3 días	jue 8/05/25	sáb 10/05/25	M2	240.00	$ 25.152.480,00
129		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**17 días**	**lun 12/05/25**	**vie 30/05/25**			**$ 49.271.040,00**
130		**5.1**	**PISOS**	**17 días**	**lun 12/05/25**	**vie 30/05/25**			**$ 49.271.040,00**
131		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidor	1 día	lun 12/05/25	lun 12/05/25	ML	120.00	$ 885.960,00
132		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	3 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25	M2	90.00	$ 48.385.080,00
133		**6**	**PINTURA**	**15 días**	**mar 13/05/2**	**jue 29/05/25**			**$ 4.048.140,00**
134		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**15 días**	**mar 13/05/2**	**jue 29/05/25**			**$ 4.048.140,00**
135		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	6 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	ML	70.00	$ 913.290,00
136		6,1,9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	mar 20/05/2	jue 22/05/25	ML	65.00	$ 1.501.825,00
137		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	3 días	vie 23/05/25	lun 26/05/25	UN	1.00	$ 590.256,00
138		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	3 días	mar 27/05/2	jue 29/05/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
139			A	34 días	lun 21/04/25	jue 29/05/25			**$ 22.015.599,00**
140			I	34 días	lun 21/04/25	jue 29/05/25			**$ 880.623,96**
141			U	34 días	lun 21/04/25	jue 29/05/25			**$ 4.403.119,80**
142			**10-084-Parque El Encanto**	**32 días**	**lun 28/04/25**	**mar 3/06/25**			**$ 274.835.047,26**
143		**1**	**PRELIMINARES**	**11 días**	**lun 28/04/25**	**vie 9/05/25**			**$ 11.264.987,80**
144		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**vie 9/05/25**	**vie 9/05/25**			**$ 649.667,00**
145		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	M2	589.00	$ 649.667,00
146		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 28/04/25**	**lun 28/04/25**			**$ 1.734.850,00**
147		1,2,1	Demolicion anden concr e = 0.10 incl. carg	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	M2	85.00	$ 1.734.850,00
148		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**1 día**	**mar 29/04/25**	**mar 29/04/25**			**$ 8.880.470,80**
149		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	1 día	mar 29/04/2	mar 29/04/2	M3	47.12	$ 8.880.470,80
150		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**21 días**	**mié 30/04/2**	**vie 23/05/25**			**$ 65.132.833,20**
151		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**8 días**	**mié 30/04/2**	**jue 8/05/25**			**$ 35.560.794,00**
152		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Tr	8 días	mié 30/04/25	jue 8/05/25	M3	410.50	$ 35.560.794,00
153		**2.3**	**RELLENOS**	**12 días**	**sáb 10/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 29.572.039,20**
154		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo ID F	6 días	sáb 17/05/25	vie 23/05/25	M3	58.40	$ 8.550.519,20
155		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	6 días	sáb 10/05/25	vie 16/05/25	M3	176.80	$ 21.021.520,00
156		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**2 días**	**jue 29/05/25**	**vie 30/05/25**			**$ 2.059.336,00**
157		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**2 días**	**jue 29/05/25**	**vie 30/05/25**			**$ 2.059.336,00**
158		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	jue 29/05/25	vie 30/05/25	UN	4.00	$ 2.059.336,00
159		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**1 día**	**mar 3/06/25**	**mar 3/06/25**			**$ 664.470,00**
160		**5.1**	**PISOS**	**1 día**	**mar 3/06/25**	**mar 3/06/25**			**$ 664.470,00**
161		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidor	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	ML	90.00	$ 664.470,00
162		**6**	**PINTURA**	**4 días**	**vie 30/05/25**	**mar 3/06/25**			**$ 420.690,00**
163		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**4 días**	**vie 30/05/25**	**mar 3/06/25**			**$ 420.690,00**
164		6,1,4	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=02	2 días	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	M2	45.00	$ 213.570,00
165		6,1,11	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	2 días	lun 2/06/25	mar 3/06/25	JGO	1.00	$ 207.120,00
166		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 97.065.433,00**
167		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 97.065.433,00**
168		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	jue 29/05/25	jue 29/05/25	M2	589.00	$ 97.065.433,00
169		**N.P**	**Items no previstos**	**8 días**	**sáb 24/05/25**	**lun 2/06/25**			**$ 33.189.996,00**
170		N.P3	Carcamo	4 días	sáb 24/05/25	mié 28/05/25	ML	62.00	$ 21.783.948,00
171		N.P	Anden en concreto 300psi e=10cm	3 días	vie 30/05/25	lun 2/06/25	M2	85.00	$ 11.406.048,00
172			A	32 días	lun 28/04/25	mar 3/06/25			**$ 52.449.436,50**
173			I	32 días	lun 28/04/25	mar 3/06/25			**$ 2.097.977,46**
174			U	32 días	lun 28/04/25	mar 3/06/25			**$ 10.489.887,30**
175			**Grupo 2**	**39 días**	**lun 19/05/25**	**mié 2/07/25**			**$ 940.588.778,05**
176			**10-069-Parque Alamos**	**29 días**	**lun 19/05/25**	**vie 20/06/25**			**$ 210.113.220,80**

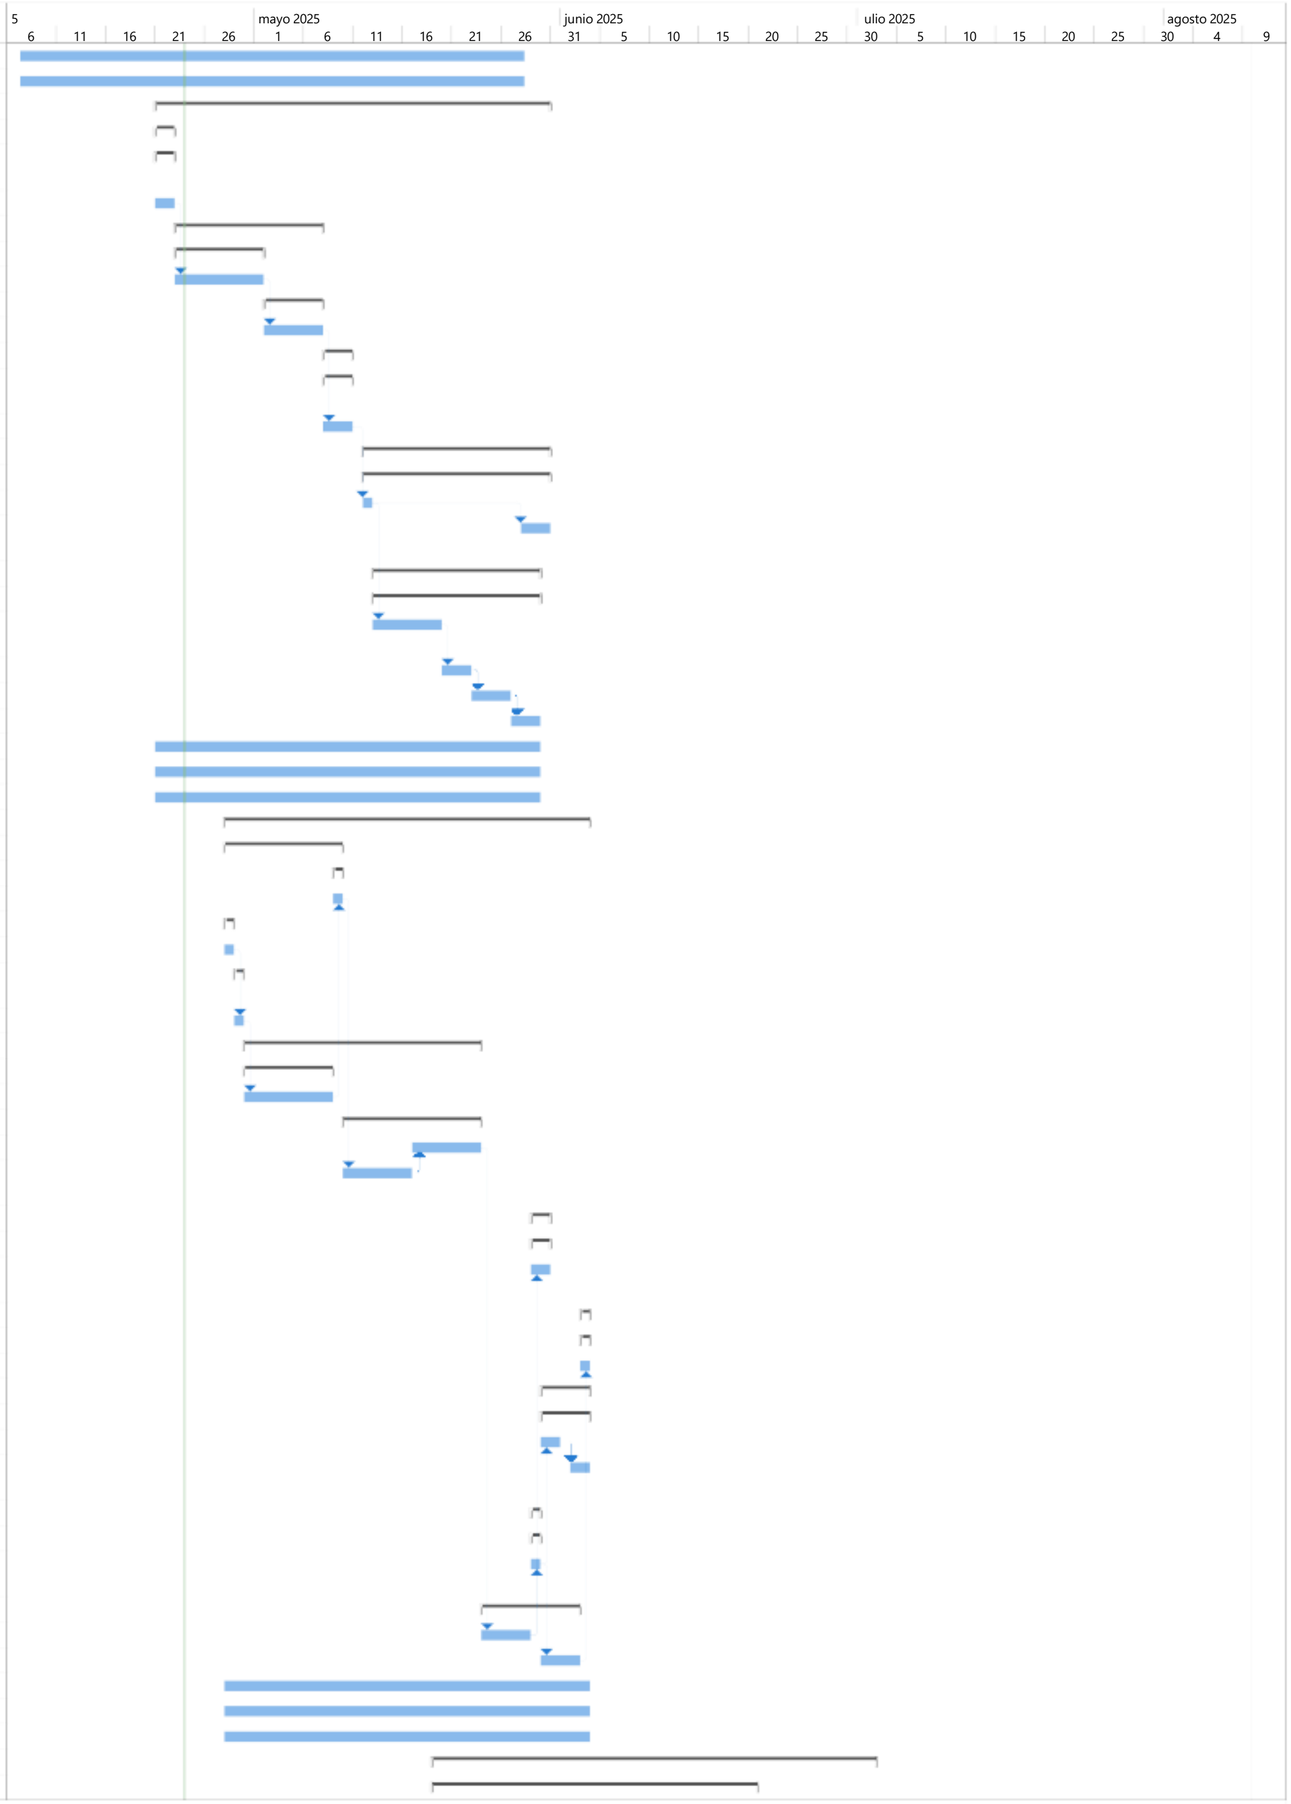

Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
177		**1**	**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 19/05/25**	**mar 27/05/2**			**$ 7.248.729,60**
178		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 27/05/2**	**mar 27/05/2**			**$ 494.144,00**
179		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	mar 27/05/2	mar 27/05/2	M2	448.00	$ 494.144,00
180		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**2 días**	**lun 19/05/25**	**mar 20/05/25**			**$ 6.754.585,60**
181		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/2	M3	35.84	$ 6.754.585,60
182		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**16 días**	**mié 21/05/2**	**sáb 7/06/25**			**$ 41.351.648,00**
183		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**6 días**	**mié 21/05/2**	**mar 27/05/2**			**$ 16.909.785,60**
184		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	6 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	M3	195.20	$ 16.909.785,60
185		**2.3**	**RELLENOS**	**10 días**	**mié 28/05/2**	**sáb 7/06/25**			**$ 24.441.862,40**
186		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	mar 3/06/25	sáb 7/06/25	M3	44.80	$ 6.559.302,40
187		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	5 días	mié 28/05/25	lun 2/06/25	M3	150.40	$ 17.882.560,00
188		**3**	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**sáb 7/06/25**	**mar 10/06/2**			**$ 8.384.160,00**
189		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**3 días**	**sáb 7/06/25**	**mar 10/06/25**			**$ 8.384.160,00**
190		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6m	3 días	sáb 7/06/25	mar 10/06/2	M2	80.00	$ 8.384.160,00
191		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**2 días**	**sáb 14/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 4.754.840,00**
192		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**2 días**	**sáb 14/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 4.754.840,00**
193		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	sáb 14/06/25	lun 16/06/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
194		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	ML	46.00	$ 3.725.172,00
195		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**1 día**	**mié 11/06/2**	**mié 11/06/2**			**$ 221.490,00**
196		**5.1**	**PISOS**	**1 día**	**mié 11/06/2**	**mié 11/06/2**			**$ 221.490,00**
197		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidor	1 día	mié 11/06/2	mié 11/06/2	ML	30.00	$ 221.490,00
198		**6**	**PINTURA**	**6 días**	**sáb 14/06/25**	**vie 20/06/25**			**$ 3.520.608,00**
199		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**6 días**	**sáb 14/06/25**	**vie 20/06/25**			**$ 3.520.608,00**
200		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	3 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	ML	80.00	$ 1.043.760,00
201		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	3 días	mié 18/06/25	vie 20/06/25	M2	264.00	$ 2.476.848,00
202		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**vie 13/06/25**	**vie 13/06/25**			**$ 73.829.056,00**
203		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**vie 13/06/25**	**vie 13/06/25**			**$ 73.829.056,00**
204		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	M2	448.00	$ 73.829.056,00
205		**N.P**	**Items no previstos**	**4 días**	**lun 9/06/25**	**jue 12/06/25**			**$ 21.081.240,00**
206		N.P3	Carcamo	4 días	lun 9/06/25	jue 12/06/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
207			A	29 días	lun 19/05/25	vie 20/06/25			**$ 40.097.942,90**
208			I	29 días	lun 19/05/25	vie 20/06/25			**$ 1.603.917,72**
209			U	29 días	lun 19/05/25	vie 20/06/25			**$ 8.019.588,58**
210			**10-768-Parque Mandarino**	**19 días**	**lun 19/05/25**	**lun 9/06/25**			**$ 66.906.642,63**
211		**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 19/05/25**	**mié 21/05/2**			**$ 5.679.295,00**
212		**1.4**	**DESMONTES Y REINSTALACIONES**	**3 días**	**lun 19/05/25**	**mié 21/05/2**			**$ 5.679.295,00**
213		1,4,1	Desmonte y reinstalacion banca existente**	1 día	mié 21/05/2	mié 21/05/2	UN	10.00	$ 1.871.080,00
214		1,4,3	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	1 día	lun 19/05/25	lun 19/05/25	UN	1.00	$ 2.239.821,00
215		1,4,4	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	1 día	mar 20/05/2	mar 20/05/2	UN	1.00	$ 1.568.394,00
216		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**3 días**	**vie 6/06/25**	**lun 9/06/25**			**$ 29.568.660,00**
217		**5.1**	**PISOS**	**3 días**	**vie 6/06/25**	**lun 9/06/25**			**$ 29.568.660,00**
218		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	3 días	vie 6/06/25	lun 9/06/25	M2	55.00	$ 29.568.660,00
219		**6**	**PINTURA**	**3 días**	**jue 22/05/25**	**sáb 24/05/25**			**$ 8.433.325,00**
220		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**3 días**	**jue 22/05/25**	**sáb 24/05/25**			**$ 8.433.325,00**
221		6,1,9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	ML	365.00	$ 8.433.325,00
222		**8**	**MOBILIARIO**	**10 días**	**lun 26/05/25**	**jue 5/06/25**			**$ 7.392.493,00**
223		**8.4**	**MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN**	**10 días**	**lun 26/05/25**	**jue 5/06/25**			**$ 7.392.493,00**
224		8,4,13	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	2 días	lun 26/05/25	mar 27/05/2	UN	1.00	$ 2.419.165,00
225		8,4,15	RODADERO CORTO EN ACERO (SUM + INST)	2 días	mié 28/05/25	jue 29/05/25	UN	1.00	$ 1.289.491,00
226		8,4,19	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	2 días	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	UN	2.00	$ 1.621.502,00
227		8,4,20	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	2 días	lun 2/06/25	mar 3/06/25	UN	2.00	$ 1.804.208,00
228		8,4,22	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	2 días	mié 4/06/25	jue 5/06/25	UN	1.00	$ 258.127,00
229			A	19 días	lun 19/05/25	lun 9/06/25			**$ 12.768.443,25**
230			I	19 días	lun 19/05/25	lun 9/06/25			**$ 510.737,73**
231			U	19 días	lun 19/05/25	lun 9/06/25			**$ 2.553.688,65**
232			**10-249-Parque florencia**	**26 días**	**lun 19/05/25**	**mar 17/06/2**			**$ 159.752.703,99**
233		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**10 días**	**lun 19/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 16.184.064,00**

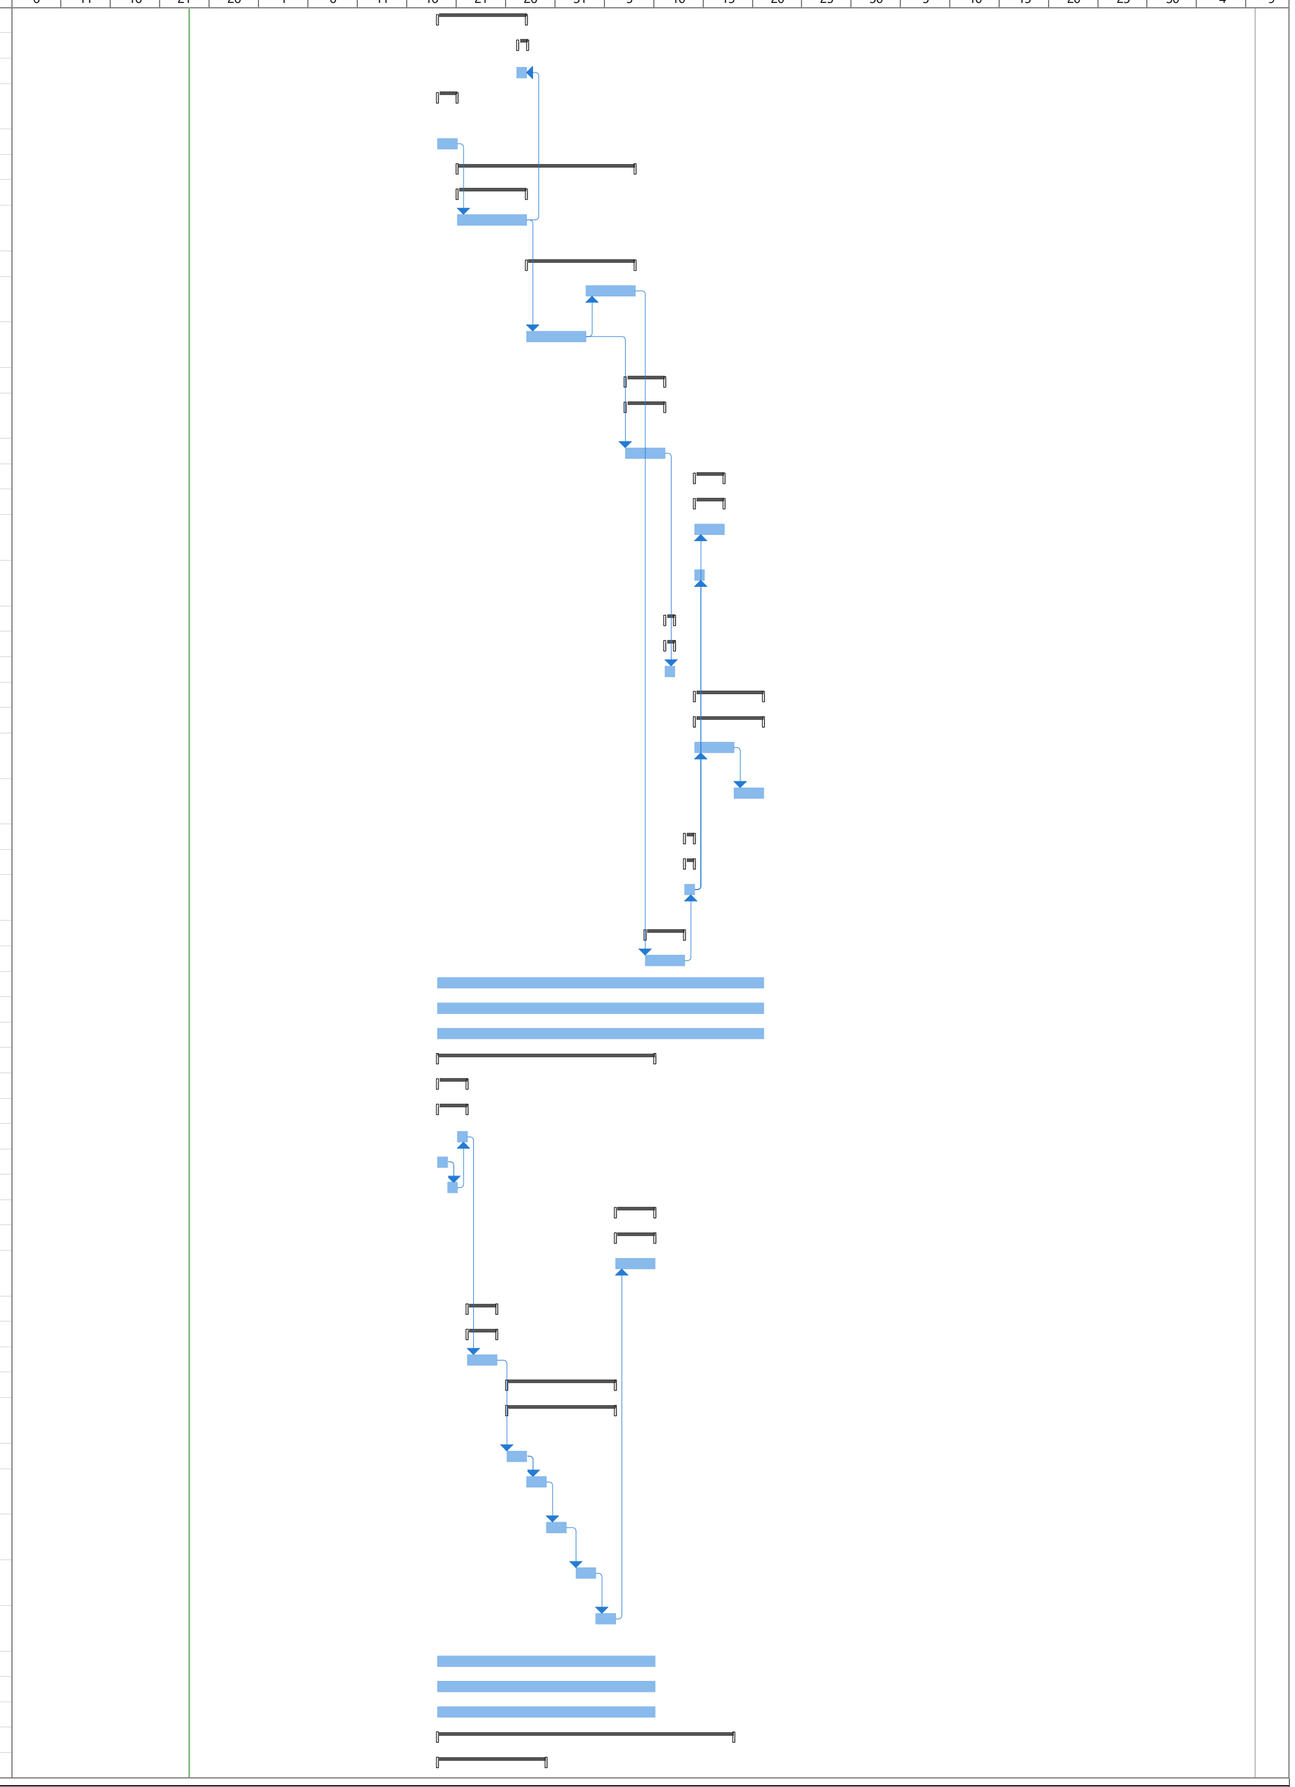

Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
234		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**5 días**	**lun 19/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 7.623.264,00**
235		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	M3	88.00	$ 7.623.264,00
236		**2.3**	**RELLENOS**	**5 días**	**sáb 24/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 8.560.800,00**
237		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	5 días	sáb 24/05/25	jue 29/05/25	M3	72.00	$ 8.560.800,00
238		**3**	**ESTRUCTURA**	**2 días**	**vie 30/05/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 8.384.160,00**
239		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**2 días**	**vie 30/05/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 8.384.160,00**
240		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	2 días	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	M2	80.00	$ 8.384.160,00
241		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**2 días**	**lun 16/06/25**	**mar 17/06/2**			**$ 32.256.720,00**
242		**5.1**	**PISOS**	**2 días**	**lun 16/06/25**	**mar 17/06/2**			**$ 32.256.720,00**
243		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	2 días	lun 16/06/25	mar 17/06/25	M2	60.00	$ 32.256.720,00
244		**6**	**PINTURA**	**6 días**	**lun 2/06/25**	**sáb 7/06/25**			**$ 5.278.550,00**
245		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**6 días**	**lun 2/06/25**	**sáb 7/06/25**			**$ 5.278.550,00**
246		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	3 días	lun 2/06/25	mié 4/06/25	M2	200.00	$ 3.661.200,00
247		6,1,9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	jue 5/06/25	sáb 7/06/25	ML	70.00	$ 1.617.350,00
248		**8**	**MOBILIARIO**	**2 días**	**lun 9/06/25**	**mar 10/06/2**			**$ 11.537.167,00**
249		**8.4**	**MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN**	**2 días**	**lun 9/06/25**	**mar 10/06/25**			**$ 11.537.167,00**
250		8,4,12	Modulo M - 3 (sum + inst)	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	UN	1.00	$ 9.118.002,00
251		8,4,13	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	1 día	mar 10/06/2	mar 10/06/2	UN	1.00	$ 2.419.165,00
252		**N.P**	**Items no previstos**	**8 días**	**vie 30/05/25**	**sáb 7/06/25**			**$ 48.307.968,00**
253		N.P	Anden en concreto 300psi e=10cm	8 días	vie 30/05/25	sáb 7/06/25	M2	360.00	$ 48.307.968,00
254			A	26 días	lun 19/05/25	mar 17/06/2			**$ 30.487.157,25**
255			I	26 días	lun 19/05/25	mar 17/06/2			**$ 1.219.486,29**
256			U	26 días	lun 19/05/25	mar 17/06/2			**$ 6.097.431,45**
257			**10-105-Parque La Florida**	**37 días**	**lun 19/05/25**	**lun 30/06/25**			**$ 243.577.313,06**
258		**1**	**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 19/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 10.355.755,20**
259		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**vie 23/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 635.328,00**
260		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	M2	576.00	$ 635.328,00
261		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**2 días**	**lun 19/05/25**	**mar 20/05/2**			**$ 1.035.960,00**
262		1,2,3	Demolición Bordillo con compresor + cargu	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/2	ML	60.00	$ 1.035.960,00
263		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**2 días**	**mié 21/05/25**	**jue 22/05/25**			**$ 8.684.467,20**
264		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	2 días	mié 21/05/2	jue 22/05/25	M3	46.08	$ 8.684.467,20
265		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**17 días**	**vie 23/05/25**	**mié 11/06/2**			**$ 48.938.400,00**
266		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**7 días**	**vie 23/05/25**	**vie 30/05/25**			**$ 19.959.091,20**
267		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	7 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	M3	230.40	$ 19.959.091,20
268		**2.3**	**RELLENOS**	**10 días**	**sáb 31/05/25**	**mié 11/06/2**			**$ 28.979.308,80**
269		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	vie 6/06/25	mié 11/06/25	M3	57.60	$ 8.433.388,80
270		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	5 días	sáb 31/05/25	jue 5/06/25	M3	172.80	$ 20.545.920,00
271		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**3 días**	**mar 17/06/2**	**jue 19/06/25**			**$ 4.673.858,00**
272		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**mar 17/06/2**	**jue 19/06/25**			**$ 4.673.858,00**
273		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
274		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	ML	45.00	$ 3.644.190,00
275		**6**	**PINTURA**	**10 días**	**jue 19/06/25**	**lun 30/06/25**			**$ 5.964.555,00**
276		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**10 días**	**jue 19/06/25**	**lun 30/06/25**			**$ 5.964.555,00**
277		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	5 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	ML	45.00	$ 587.115,00
278		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	2 días	mié 25/06/25	jue 26/06/25	M2	140.00	$ 2.562.840,00
279		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	3 días	vie 27/06/25	lun 30/06/25	M2	300.00	$ 2.814.600,00
280		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**lun 16/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 94.923.072,00**
281		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**lun 16/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 94.923.072,00**
282		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	lun 16/06/25	lun 16/06/25	M2	576.00	$ 94.923.072,00
283		**N.P**	**Items no previstos**	**3 días**	**jue 12/06/25**	**sáb 14/06/25**			**$ 21.081.240,00**
284		N.P3	Carcamo	3 días	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
285			A	37 días	lun 19/05/25	lun 30/06/25			**$ 46.484.220,05**
286			I	37 días	lun 19/05/25	lun 30/06/25			**$ 1.859.368,80**
287			U	37 días	lun 19/05/25	lun 30/06/25			**$ 9.296.844,01**
288			**10-005-Parque San Marcos**	**39 días**	**lun 19/05/25**	**mié 2/07/25**			**$ 260.238.897,57**
289		**1**	**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 19/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 12.461.920,00**
290		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**vie 23/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 595.620,00**

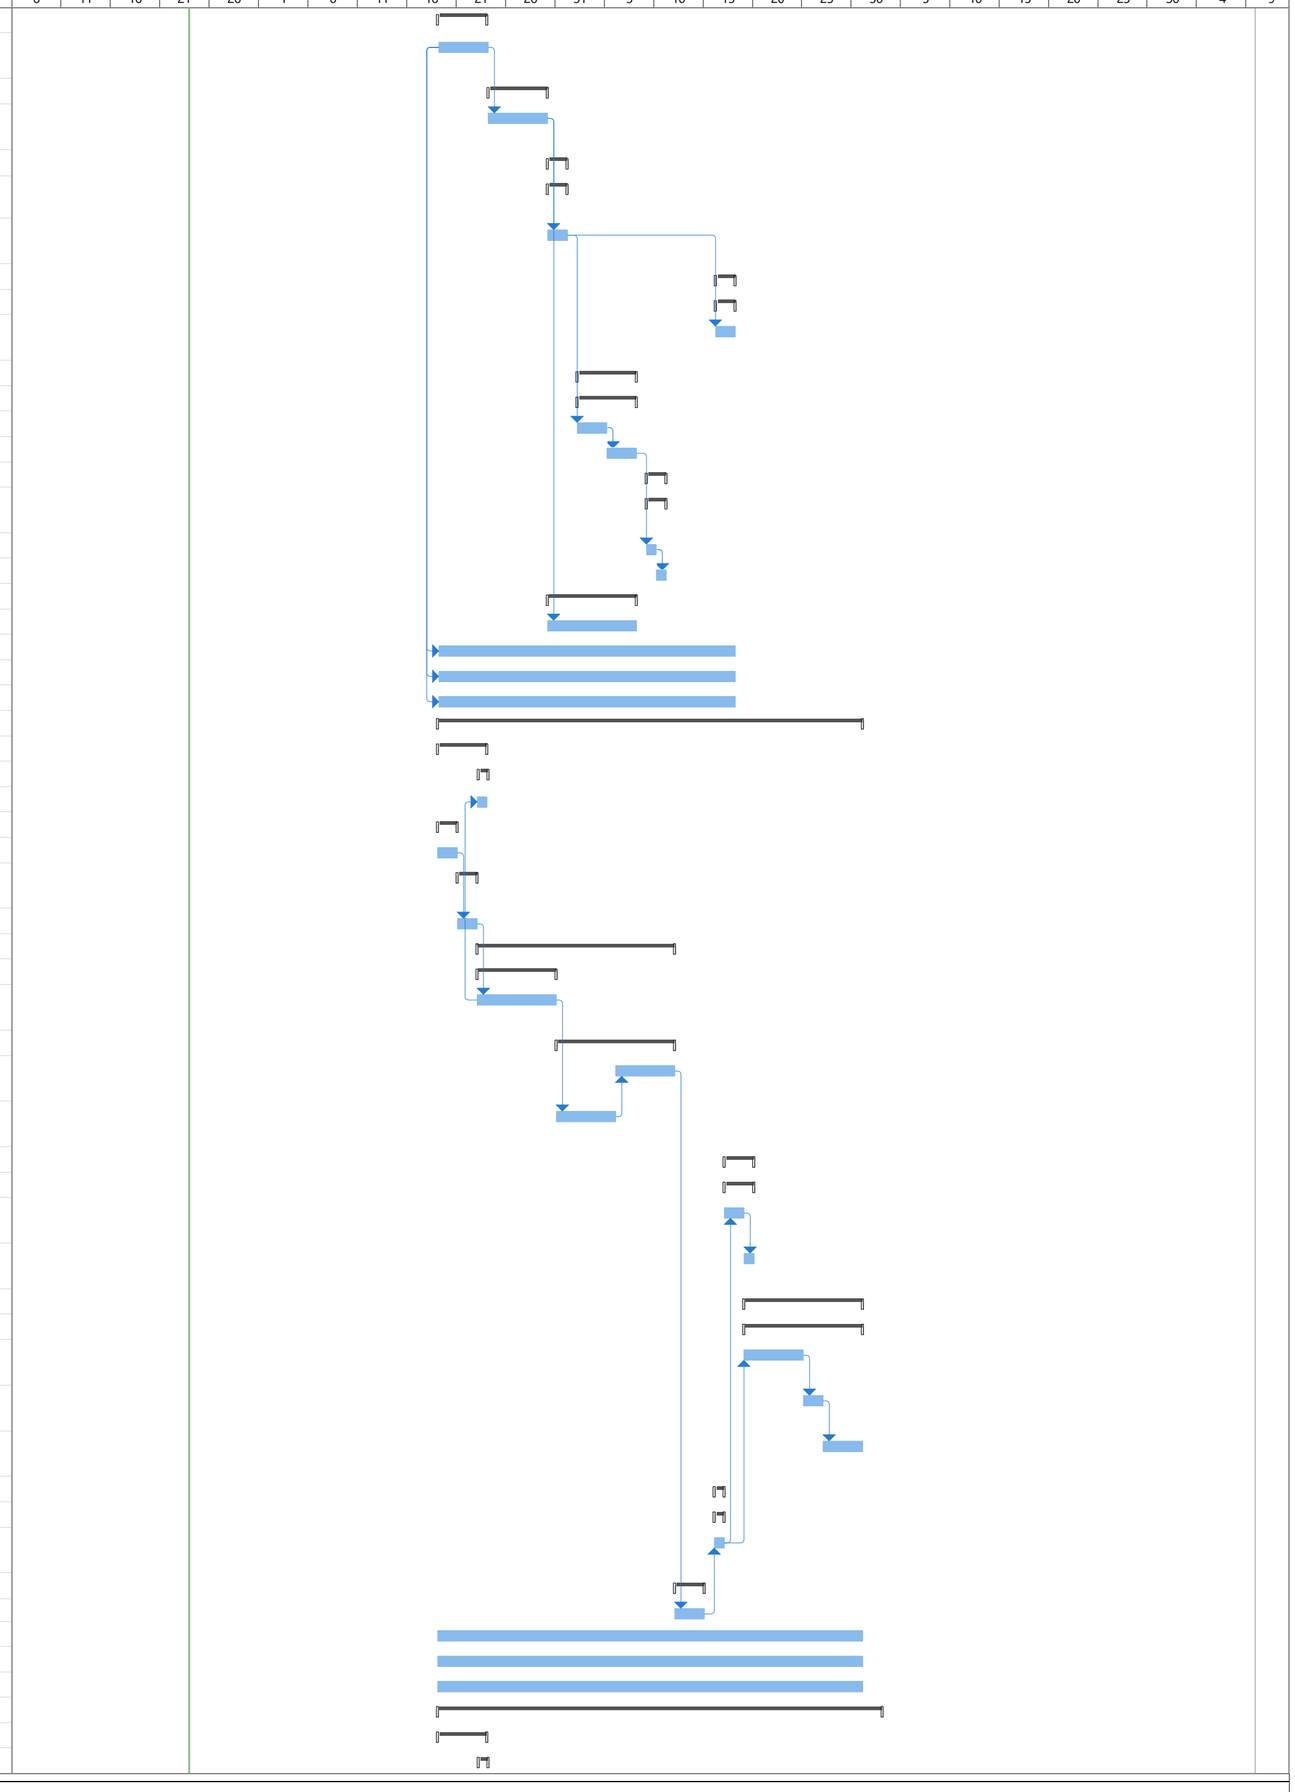

Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
291		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	M2	540.00	$ 595.620,00
292		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**2 días**	**lun 19/05/25**	**mar 20/05/2**			**$ 1.698.112,00**
293		1,2,1	Demolicion anden concr e = 0.10 incl. carg	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/2	M2	83.20	$ 1.698.112,00
294		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**3 días**	**mié 21/05/25**	**vie 23/05/25**			**$ 10.168.188,00**
295		1,3,1	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	UN	5.00	$ 518.780,00
296		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	M3	51.20	$ 9.649.408,00
297		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**vie 23/05/25**	**sáb 7/06/25**			**$ 54.376.000,00**
298		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**6 días**	**vie 23/05/25**	**jue 29/05/25**			**$ 22.176.768,00**
299		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Tr	6 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	M3	256.00	$ 22.176.768,00
300		**2.3**	**RELLENOS**	**8 días**	**vie 30/05/25**	**sáb 7/06/25**			**$ 32.199.232,00**
301		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo ID F	4 días	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	M3	64.00	$ 9.370.432,00
302		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo	4 días	vie 30/05/25	mar 3/06/25	M3	192.00	$ 22.828.800,00
303		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**3 días**	**vie 13/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 4.488.796,00**
304		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**vie 13/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 4.488.796,00**
305		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	vie 13/06/25	sáb 14/06/25	UN	4.00	$ 2.059.336,00
306		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	lun 16/06/25	lun 16/06/25	ML	30.00	$ 2.429.460,00
307		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**1 día**	**vie 13/06/25**	**vie 13/06/25**			**$ 177.192,00**
308		**5.1**	**PISOS**	**1 día**	**vie 13/06/25**	**vie 13/06/25**			**$ 177.192,00**
309		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidor	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	ML	24.00	$ 177.192,00
310		**6**	**PINTURA**	**14 días**	**mar 17/06/2**	**mié 2/07/25**			**$ 8.003.537,00**
311		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**14 días**	**mar 17/06/2**	**mié 2/07/25**			**$ 8.003.537,00**
312		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	3 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	ML	80.00	$ 1.043.760,00
313		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	3 días	lun 23/06/25	mié 25/06/25	M2	375.00	$ 3.518.250,00
314		6,1,10	Pintura estructura baloncesto **	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25	JGO	1.00	$ 609.995,00
315		6,1,11	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	1 día	sáb 21/06/25	sáb 21/06/25	JGO	1.00	$ 207.120,00
316		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	2 días	jue 26/06/25	vie 27/06/25	UN	1.00	$ 590.256,00
317		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	sáb 28/06/25	lun 30/06/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
318		6,1,14	Pintura Modulo-M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	UN	1.00	$ 991.387,00
319		**7**	**EXTERIORES-ESPACIO PUBLICO**	**3 días**	**sáb 14/06/25**	**mar 17/06/2**			**$ 9.076.582,00**
320		**7.1**	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**1 día**	**mar 17/06/2**	**mar 17/06/2**			**$ 243.550,00**
321		7,1,1	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	M2	25.00	$ 243.550,00
322		**7.2**	**CONFINAMIENTOS**	**1 día**	**sáb 14/06/25**	**sáb 14/06/25**			**$ 8.833.032,00**
323		7,2,1	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conA	1 día	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	ML	104.00	$ 8.833.032,00
324		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**jue 12/06/25**	**jue 12/06/25**			**$ 88.990.380,00**
325		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**jue 12/06/25**	**jue 12/06/25**			**$ 88.990.380,00**
326		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	jue 12/06/25	jue 12/06/25	M2	540.00	$ 88.990.380,00
327		**N.P**	**Items no previstos**	**3 días**	**lun 9/06/25**	**mié 11/06/2**			**$ 21.081.240,00**
328		N.P	Carcamo	3 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
329			A	39 días	lun 19/05/25	mié 2/07/25			**$ 49.663.911,75**
330			I	39 días	lun 19/05/25	mié 2/07/25			**$ 1.986.556,47**
331			U	39 días	lun 19/05/25	mié 2/07/25			**$ 9.932.782,35**
332			**Grupo 3**	**30 días**	**lun 16/06/25**	**sáb 19/07/25**			**$ 772.426.185,58**
333			**10-357-Parque La Faena**	**30 días**	**lun 16/06/25**	**sáb 19/07/25**			**$ 228.423.568,16**
334		**1**	**PRELIMINARES**	**4 días**	**lun 16/06/25**	**jue 19/06/25**			**$ 10.291.248,00**
335		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**jue 19/06/25**	**jue 19/06/25**			**$ 595.620,00**
336		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	M2	540.00	$ 595.620,00
337		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 16/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 1.553.940,00**
338		1,2,3	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	1 día	lun 16/06/25	lun 16/06/25	ML	90.00	$ 1.553.940,00
339		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**2 días**	**mar 17/06/25**	**mié 18/06/25**			**$ 8.141.688,00**
340		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	2 días	mar 17/06/2	mié 18/06/25	M3	43.20	$ 8.141.688,00
341		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**13 días**	**jue 19/06/25**	**jue 3/07/25**			**$ 45.879.750,00**
342		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**5 días**	**jue 19/06/25**	**mar 24/06/2**			**$ 18.711.648,00**
343		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	5 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	M3	216.00	$ 18.711.648,00
344		**2.3**	**RELLENOS**	**8 días**	**mié 25/06/2**	**jue 3/07/25**			**$ 27.168.102,00**
345		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	4 días	lun 30/06/25	jue 3/07/25	M3	54.00	$ 7.906.302,00
346		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	4 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	M3	162.00	$ 19.261.800,00
347		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**3 días**	**mié 9/07/25**	**vie 11/07/25**			**$ 2.649.308,00**
348		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**mié 9/07/25**	**vie 11/07/25**			**$ 2.649.308,00**

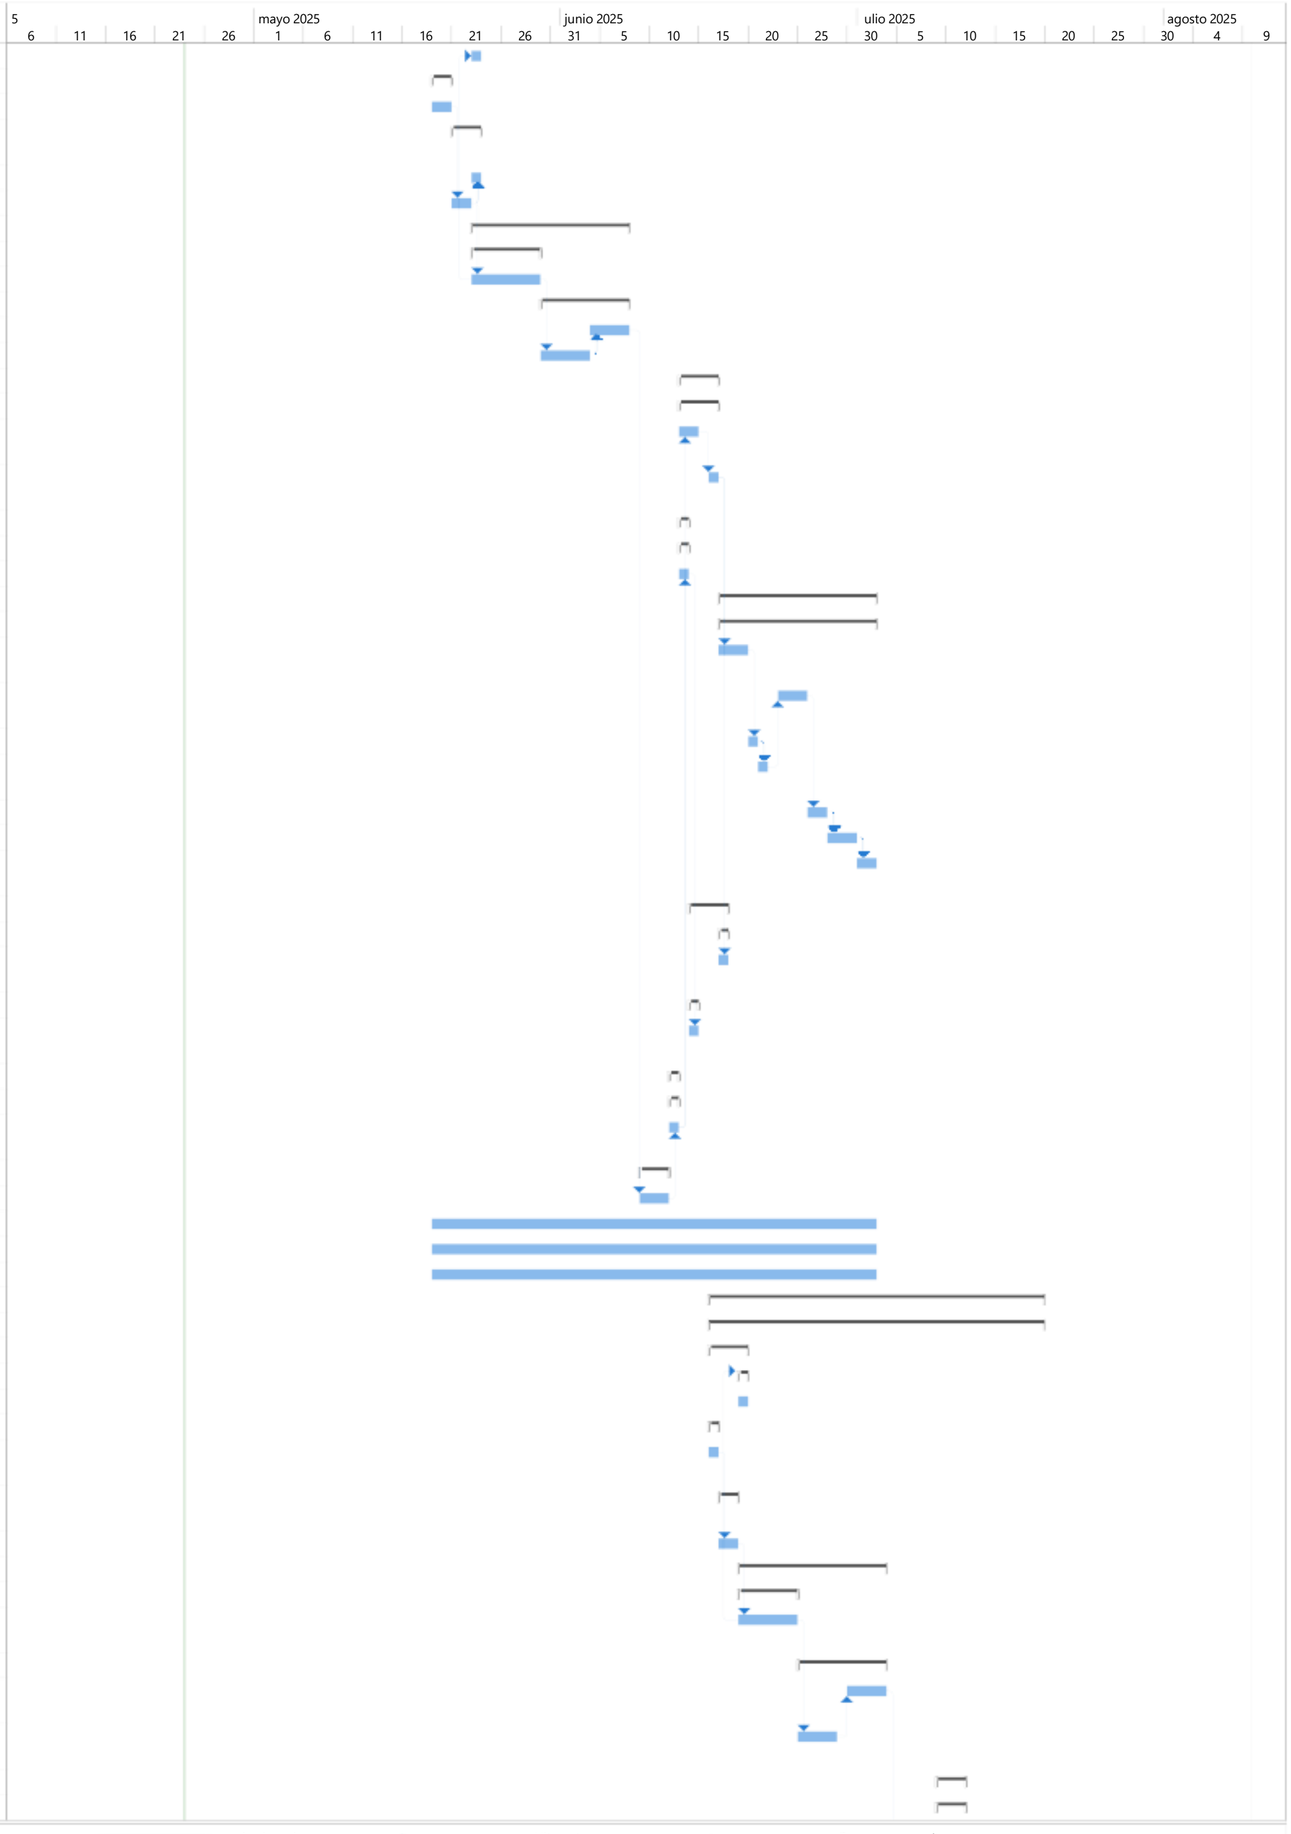

Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
349		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	mié 9/07/25	jue 10/07/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
350		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	vie 11/07/25	vie 11/07/25	ML	20.00	$ 1.619.640,00
351		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**1 día**	**sáb 12/07/25**	**sáb 12/07/25**			**$ 664.470,00**
352		**5.1**	**PISOS**	**1 día**	**sáb 12/07/25**	**sáb 12/07/25**			**$ 664.470,00**
353		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	1 día	sáb 12/07/25	sáb 12/07/25	ML	90.00	$ 664.470,00
354		**6**	**PINTURA**	**6 días**	**lun 14/07/25**	**sáb 19/07/25**			**$ 4.110.032,00**
355		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**6 días**	**lun 14/07/25**	**sáb 19/07/25**			**$ 4.110.032,00**
356		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	3 días	jue 17/07/25	sáb 19/07/25	M2	416.00	$ 3.902.912,00
357		6,1,11	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	3 días	lun 14/07/25	mié 16/07/25	JGO	1.00	$ 207.120,00
358		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**mar 8/07/25**	**mar 8/07/25**			**$ 88.990.380,00**
359		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**mar 8/07/25**	**mar 8/07/25**			**$ 88.990.380,00**
360		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	M2	540.00	$ 88.990.380,00
361		**N.P**	**Items no previstos**	**3 días**	**vie 4/07/25**	**lun 7/07/25**			**$ 21.783.948,00**
362		N.P3	Carcamo	3 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25	ML	62.00	$ 21.783.948,00
363			A	28 días	lun 16/06/25	jue 17/07/25			**$ 43.592.284,00**
364			I	28 días	lun 16/06/25	jue 17/07/25			**$ 1.743.691,36**
365			U	28 días	lun 16/06/25	jue 17/07/25			**$ 8.718.456,80**
366			**10-175-Parque Molinos de Viento**	**18 días**	**lun 16/06/25**	**sáb 5/07/25**			**$ 86.802.018,73**
367		**3**	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 30/06/25**	**mié 2/07/25**			**$ 12.576.240,00**
368		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 30/06/25**	**mié 2/07/25**			**$ 12.576.240,00**
369		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6m	3 días	lun 30/06/25	mié 2/07/25	M2	120.00	$ 12.576.240,00
370		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**3 días**	**jue 3/07/25**	**sáb 5/07/25**			**$ 24.192.540,00**
371		**5.1**	**PISOS**	**3 días**	**jue 3/07/25**	**sáb 5/07/25**			**$ 24.192.540,00**
372		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	3 días	jue 3/07/25	sáb 5/07/25	M2	45.00	$ 24.192.540,00
373		**8**	**MOBILIARIO**	**18 días**	**lun 16/06/25**	**sáb 5/07/25**			**$ 50.033.238,73**
374		**8.4**	**MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN**	**12 días**	**lun 16/06/25**	**sáb 28/06/25**			**$ 29.492.303,00**
375		8,4,1	Modulo pierna prensa horizontal (sum + inst) guiro	1 día	lun 16/06/25	lun 16/06/25	UN	1.00	$ 2.721.456,00
376		8,4,2	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	UN	1.00	$ 4.704.780,00
377		8,4,5	Modulo Caballo Bicicleta Estatica ((Suminis+Insta)	1 día	mié 18/06/25	mié 18/06/25	UN	1.00	$ 2.107.165,00
378		8,4,6	Modulo caminador aereo (suminis.+instal))	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	UN	1.00	$ 2.450.509,00
379		8,4,7	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25	UN	1.00	$ 3.391.847,00
380		8,4,8	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	1 día	sáb 21/06/25	sáb 21/06/25	UN	1.00	$ 2.579.379,00
381		8,4,12	Modulo M - 3 (sum + inst)	3 días	lun 23/06/25	mié 25/06/25	UN	1.00	$ 9.118.002,00
382		8,4,13	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	3 días	jue 26/06/25	sáb 28/06/25	UN	1.00	$ 2.419.165,00
383			A	18 días	lun 16/06/25	sáb 5/07/25			**$ 16.565.270,75**
384			I	18 días	lun 16/06/25	sáb 5/07/25			**$ 662.610,83**
385			U	18 días	lun 16/06/25	sáb 5/07/25			**$ 3.313.054,15**
386			**10-176-Parque Villas De Madrigal**	**23 días**	**lun 16/06/25**	**vie 11/07/25**			**$ 252.250.638,88**
387		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 16/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 1.568.394,00**
388		**1.4**	**DESMONTES Y REINSTALACIONES**	**1 día**	**lun 16/06/25**	**lun 16/06/25**			**$ 1.568.394,00**
389		1,4,4	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	1 día	lun 16/06/25	lun 16/06/25	UN	1.00	$ 1.568.394,00
390		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**5 días**	**mar 17/06/2**	**sáb 21/06/25**			**$ 14.222.537,60**
391		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**3 días**	**mar 17/06/2**	**jue 19/06/25**			**$ 5.994.657,60**
392		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Tr	3 días	mar 17/06/2	jue 19/06/25	M3	69.20	$ 5.994.657,60
393		**2.3**	**RELLENOS**	**2 días**	**vie 20/06/25**	**sáb 21/06/25**			**$ 8.227.880,00**
394		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo	2 días	vie 20/06/25	sáb 21/06/25	M3	69.20	$ 8.227.880,00
395		**3**	**ESTRUCTURA**	**2 días**	**lun 23/06/25**	**mar 24/06/2**			**$ 36.261.492,00**
396		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**2 días**	**lun 23/06/25**	**mar 24/06/25**			**$ 36.261.492,00**
397		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	2 días	lun 23/06/25	mar 24/06/25	M2	346.00	$ 36.261.492,00
398		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**3 días**	**mié 9/07/25**	**vie 11/07/25**			**$ 32.256.720,00**
399		**5.1**	**PISOS**	**3 días**	**mié 9/07/25**	**vie 11/07/25**			**$ 32.256.720,00**
400		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	3 días	mié 9/07/25	vie 11/07/25	M2	60.00	$ 32.256.720,00
401		**8**	**MOBILIARIO**	**7 días**	**mié 25/06/2**	**mié 2/07/25**			**$ 72.450.764,00**
402		**8.2**	**MOBILIARIO URBANO**	**2 días**	**mié 25/06/2**	**jue 26/06/25**			**$ 12.275.964,00**
403		8,2,5	Baranda cerramiento M-83 (sum + inst)	2 días	mié 25/06/25	jue 26/06/25	ML	36.00	$ 12.275.964,00
404		8,2,10	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	7 días	mié 25/06/25	mié 2/07/25	ML	40.00	$ 60.174.800,00

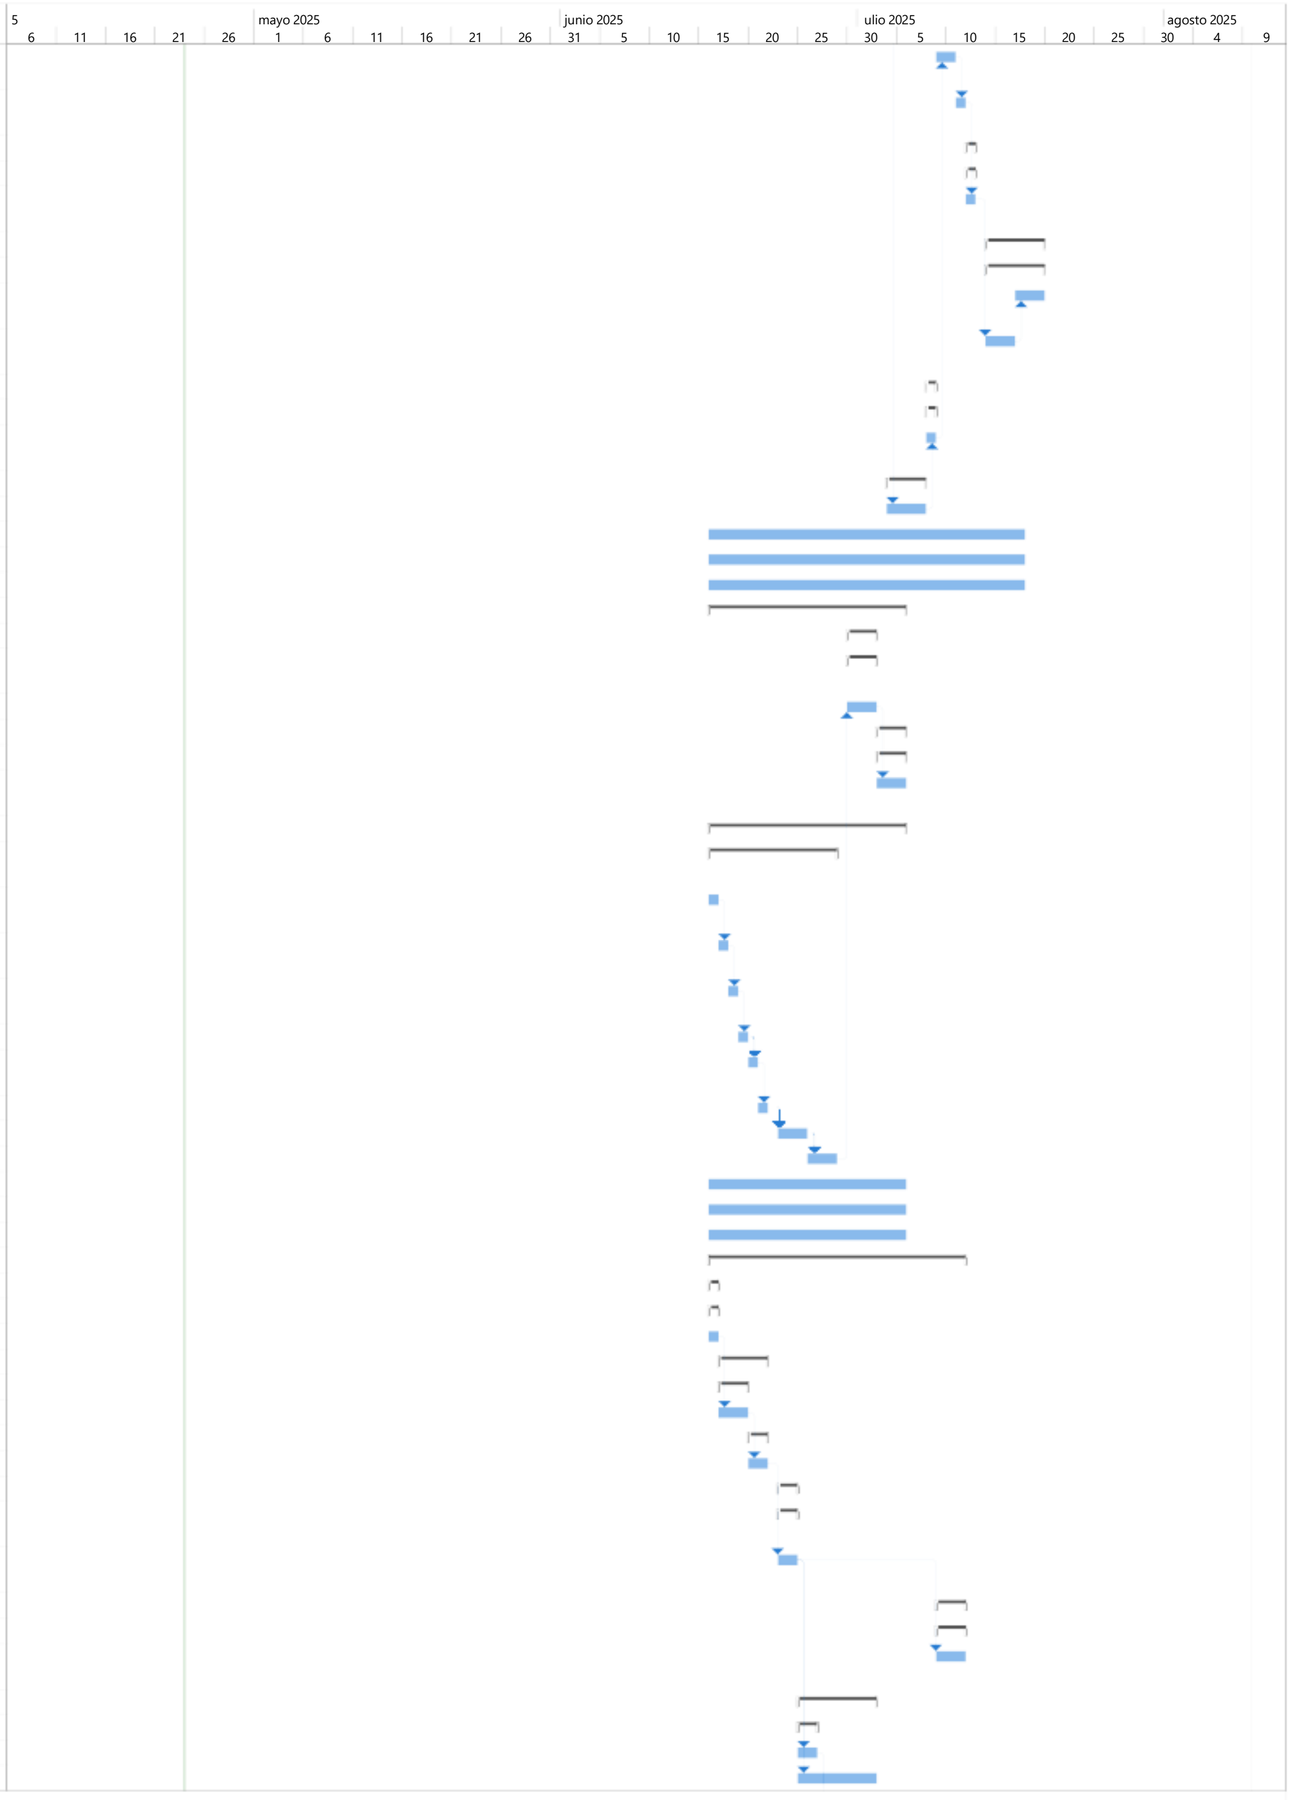


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
405		**8.4**	**MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN**	**8 días**	**vie 27/06/25**	**sáb 5/07/25**			**$ 35.797.832,00**
406		8,4,4	MODULO 3A (SUM + INST)	1 día	vie 27/06/25	vie 27/06/25	UN	1.00	$ 6.944.303,00
407		8,4,5	Modulo Caballo Bicicleta Estatica ((Suminis+Insta)	1 día	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	UN	1.00	$ 2.107.165,00
408		8,4,7	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	1 día	lun 30/06/25	lun 30/06/25	UN	1.00	$ 3.391.847,00
409		8,4,9	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Ins	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	UN	1.00	$ 6.807.972,00
410		8,4,10	Modulo Espalda Brazos Altos (Sum+Inst)	1 día	mié 2/07/25	mié 2/07/25	UN	1.00	$ 3.192.497,00
411		8,4,11	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Inst	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	UN	1.00	$ 1.816.881,00
412		8,4,12	Modulo M - 3 (sum + inst)	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	UN	1.00	$ 9.118.002,00
413		8,4,13	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	1 día	sáb 5/07/25	sáb 5/07/25	UN	1.00	$ 2.419.165,00
414			A	23 días	lun 16/06/25	vie 11/07/25			**$ 48.139.434,90**
415			I	23 días	lun 16/06/25	vie 11/07/25			**$ 1.925.577,40**
416			U	23 días	lun 16/06/25	vie 11/07/25			**$ 9.627.886,98**
417			**10-002-Parque Madrigal Primer Sector**	**17 días**	**lun 16/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 134.818.769,21**
418		**3**	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 16/06/25**	**mié 18/06/2**			**$ 7.545.744,00**
419		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 16/06/25**	**mié 18/06/25**			**$ 7.545.744,00**
420		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6m	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	M2	72.00	$ 7.545.744,00
421		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**14 días**	**jue 19/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 32.751.381,00**
422		**5.1**	**PISOS**	**14 días**	**jue 19/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 32.751.381,00**
423		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidor	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	ML	67.00	$ 494.661,00
424		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	M2	60.00	$ 32.256.720,00
425		**6**	**PINTURA**	**9 días**	**jue 19/06/25**	**sáb 28/06/25**			**$ 4.782.980,00**
426		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**9 días**	**jue 19/06/25**	**sáb 28/06/25**			**$ 4.782.980,00**
427		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+	3 días	jue 19/06/25	sáb 21/06/25	ML	45.00	$ 587.115,00
428		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	2 días	lun 23/06/25	mar 24/06/2	M2	140.00	$ 2.562.840,00
429		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	2 días	mié 25/06/25	jue 26/06/25	UN	1.00	$ 590.256,00
430		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
431		**8**	**MOBILIARIO**	**5 días**	**lun 30/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 57.834.986,00**
432		**8.2**	**MOBILIARIO URBANO**	**5 días**	**lun 30/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 57.834.986,00**
433		8,2,8	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	1 día	lun 30/06/25	lun 30/06/25	UN	6.00	$ 571.692,00
434		8,2,9	Canecas acero inoxidable (sum + inst)	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	UN	4.00	$ 2.354.732,00
435		8,2,10	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	1 día	mié 2/07/25	mié 2/07/25	ML	36.00	$ 54.157.320,00
436		8,2,13	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Columpio-STPM	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	UN	3.00	$ 332.454,00
437		8,2,14	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM*	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	UN	6.00	$ 418.788,00
438			A	17 días	lun 16/06/25	vie 4/07/25			**$ 25.728.772,75**
439			I	17 días	lun 16/06/25	vie 4/07/25			**$ 1.029.150,91**
440			U	17 días	lun 16/06/25	vie 4/07/25			**$ 5.145.754,55**
441			**10-012-Parque Santa Rosita**	**17 días**	**lun 16/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 70.131.190,60**
442		**3**	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 16/06/25**	**mié 18/06/2**			**$ 2.410.446,00**
443		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 16/06/25**	**mié 18/06/25**			**$ 2.410.446,00**
444		3,1,1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6m	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	M2	23.00	$ 2.410.446,00
445		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**14 días**	**jue 19/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 24.524.775,00**
446		**5.1**	**PISOS**	**14 días**	**jue 19/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 24.524.775,00**
447		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	ML	45.00	$ 332.235,00
448		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	M2	45.00	$ 24.192.540,00
449		**6**	**PINTURA**	**6 días**	**jue 19/06/25**	**mié 25/06/2**			**$ 4.195.865,00**
450		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**6 días**	**jue 19/06/25**	**mié 25/06/2**			**$ 4.195.865,00**
451		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	2 días	jue 19/06/25	vie 20/06/25	M2	140.00	$ 2.562.840,00
452		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	2 días	sáb 21/06/25	lun 23/06/25	UN	1.00	$ 590.256,00
453		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	mar 24/06/2	mié 25/06/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
454		**8**	**MOBILIARIO**	**3 días**	**jue 26/06/25**	**sáb 28/06/25**			**$ 1.322.934,00**
455		**8.2**	**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**jue 26/06/25**	**sáb 28/06/25**			**$ 1.322.934,00**
456		8,2,8	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	1 día	jue 26/06/25	jue 26/06/25	UN	6.00	$ 571.692,00
457		8,2,13	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Columpio-STPM	1 día	vie 27/06/25	vie 27/06/25	UN	3.00	$ 332.454,00
458		8,2,14	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM*	1 día	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	UN	6.00	$ 418.788,00
459		**N.P**	**Items no previstos**	**5 días**	**lun 30/06/25**	**vie 4/07/25**			**$ 21.081.240,00**
460		N.P3	Carcamo	5 días	lun 30/06/25	vie 4/07/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
461			A	17 días	lun 16/06/25	vie 4/07/25			**$ 13.383.815,00**
462			I	17 días	lun 16/06/25	vie 4/07/25			**$ 535.352,60**
463			U	17 días	lun 16/06/25	vie 4/07/25			**$ 2.676.763,00**
464			**Grupo 4**	**24 días**	**lun 14/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 737.607.923,27**



Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
465			**10-055-Parque Santa Maria del Lago**	**24 días**	**lun 14/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 227.596.842,88**
466		**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 21/07/25**	**mié 23/07/2**			**$ 9.773.268,00**
467		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 23/07/2**	**mié 23/07/2**			**$ 595.620,00**
468		1,1,1	Compactación fondo de excavación con eq	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/2	M2	540.00	$ 595.620,00
469		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 21/07/25**	**lun 21/07/25**			**$ 1.035.960,00**
470		1,2,3	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	ML	60.00	$ 1.035.960,00
471		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**1 día**	**mar 22/07/25**	**mar 22/07/25**			**$ 8.141.688,00**
472		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	1 día	mar 22/07/2	mar 22/07/2	M3	43.20	$ 8.141.688,00
473		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**16 días**	**mié 23/07/2**	**sáb 9/08/25**			**$ 45.879.750,00**
474		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**4 días**	**mié 23/07/2**	**sáb 26/07/25**			**$ 18.711.648,00**
475		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	4 días	mié 23/07/25	sáb 26/07/25	M3	216.00	$ 18.711.648,00
476		**2.3**	**RELLENOS**	**12 días**	**lun 28/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 27.168.102,00**
477		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	lun 4/08/25	sáb 9/08/25	M3	54.00	$ 7.906.302,00
478		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	6 días	lun 28/07/25	sáb 2/08/25	M3	162.00	$ 19.261.800,00
479		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**3 días**	**jue 31/07/25**	**sáb 2/08/25**			**$ 2.892.254,00**
480		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**jue 31/07/25**	**sáb 2/08/25**			**$ 2.892.254,00**
481		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	jue 31/07/25	vie 1/08/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
482		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	sáb 2/08/25	sáb 2/08/25	ML	23.00	$ 1.862.586,00
483		**6**	**PINTURA**	**6 días**	**lun 4/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 5.121.156,00**
484		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**6 días**	**lun 4/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 5.121.156,00**
485		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	3 días	lun 4/08/25	mié 6/08/25	M2	126.00	$ 2.306.556,00
486		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	3 días	jue 7/08/25	sáb 9/08/25	M2	300.00	$ 2.814.600,00
487		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**mié 30/07/2**	**mié 30/07/2**			**$ 88.990.380,00**
488		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**mié 30/07/2**	**mié 30/07/2**			**$ 88.990.380,00**
489		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	mié 30/07/25	mié 30/07/25	M2	540.00	$ 88.990.380,00
490		**N.P**	**Items no previstos**	**2 días**	**lun 28/07/25**	**mar 29/07/2**			**$ 21.081.240,00**
491		N.P3	Carcamo	2 días	lun 28/07/25	mar 29/07/2	ML	60.00	$ 21.081.240,00
492			A	19 días	lun 14/07/25	lun 4/08/25			**$ 43.434.512,00**
493			I	19 días	lun 14/07/25	lun 4/08/25			**$ 1.737.380,48**
494			U	19 días	lun 14/07/25	lun 4/08/25			**$ 8.686.902,40**
495			**10-167-Parque Aguas Claras**	**18 días**	**lun 21/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 71.056.181,60**
496		**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 21/07/25**	**mié 23/07/2**			**$ 1.371.552,00**
497		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**3 días**	**lun 21/07/25**	**mié 23/07/2**			**$ 1.371.552,00**
498		1,2,1	Demolicion anden concr e = 0.10 incl. cargue y ret *	3 días	lun 21/07/25	mié 23/07/25	M2	67.20	$ 1.371.552,00
499		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**12 días**	**lun 28/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 24.414.030,00**
500		**5.1**	**PISOS**	**12 días**	**lun 28/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 24.414.030,00**
501		5,1,1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	3 días	lun 28/07/25	mié 30/07/25	ML	30.00	$ 221.490,00
502		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	2 días	vie 8/08/25	sáb 9/08/25	M2	45.00	$ 24.192.540,00
503		**6**	**PINTURA**	**7 días**	**jue 31/07/25**	**jue 7/08/25**			**$ 5.530.732,00**
504		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**7 días**	**jue 31/07/25**	**jue 7/08/25**			**$ 5.530.732,00**
505		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	3 días	jue 31/07/25	sáb 2/08/25	ML	87.00	$ 1.135.089,00
506		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	1 día	lun 4/08/25	lun 4/08/25	M2	108.00	$ 1.977.048,00
507		6,1,9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	ML	34.00	$ 785.570,00
508		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	1 día	mié 6/08/25	mié 6/08/25	UN	1.00	$ 590.256,00
509		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	1 día	jue 7/08/25	jue 7/08/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
510		**7**	**EXTERIORES-ESPACIO PUBLICO**	**3 días**	**jue 24/07/25**	**sáb 26/07/25**			**$ 438.390,00**
511		**7.1**	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**3 días**	**jue 24/07/25**	**sáb 26/07/25**			**$ 438.390,00**
512		7,1,1	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	3 días	jue 24/07/25	sáb 26/07/25	M2	45.00	$ 438.390,00
513		**N.P**	**Items no previstos**	**3 días**	**jue 24/07/25**	**sáb 26/07/25**			**$ 22.486.656,00**
514		N.P3	Carcamo	3 días	jue 24/07/25	sáb 26/07/25	ML	64.00	$ 22.486.656,00
515			A	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 13.560.340,00**
516			I	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 542.413,60**
517			U	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 2.712.068,00**
518			**10-054-Parque San Jose De La Granja**	**18 días**	**lun 21/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 85.201.881,24**
519		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**2 días**	**vie 8/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 34.944.780,00**
520		**5.1**	**PISOS**	**2 días**	**vie 8/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 34.944.780,00**

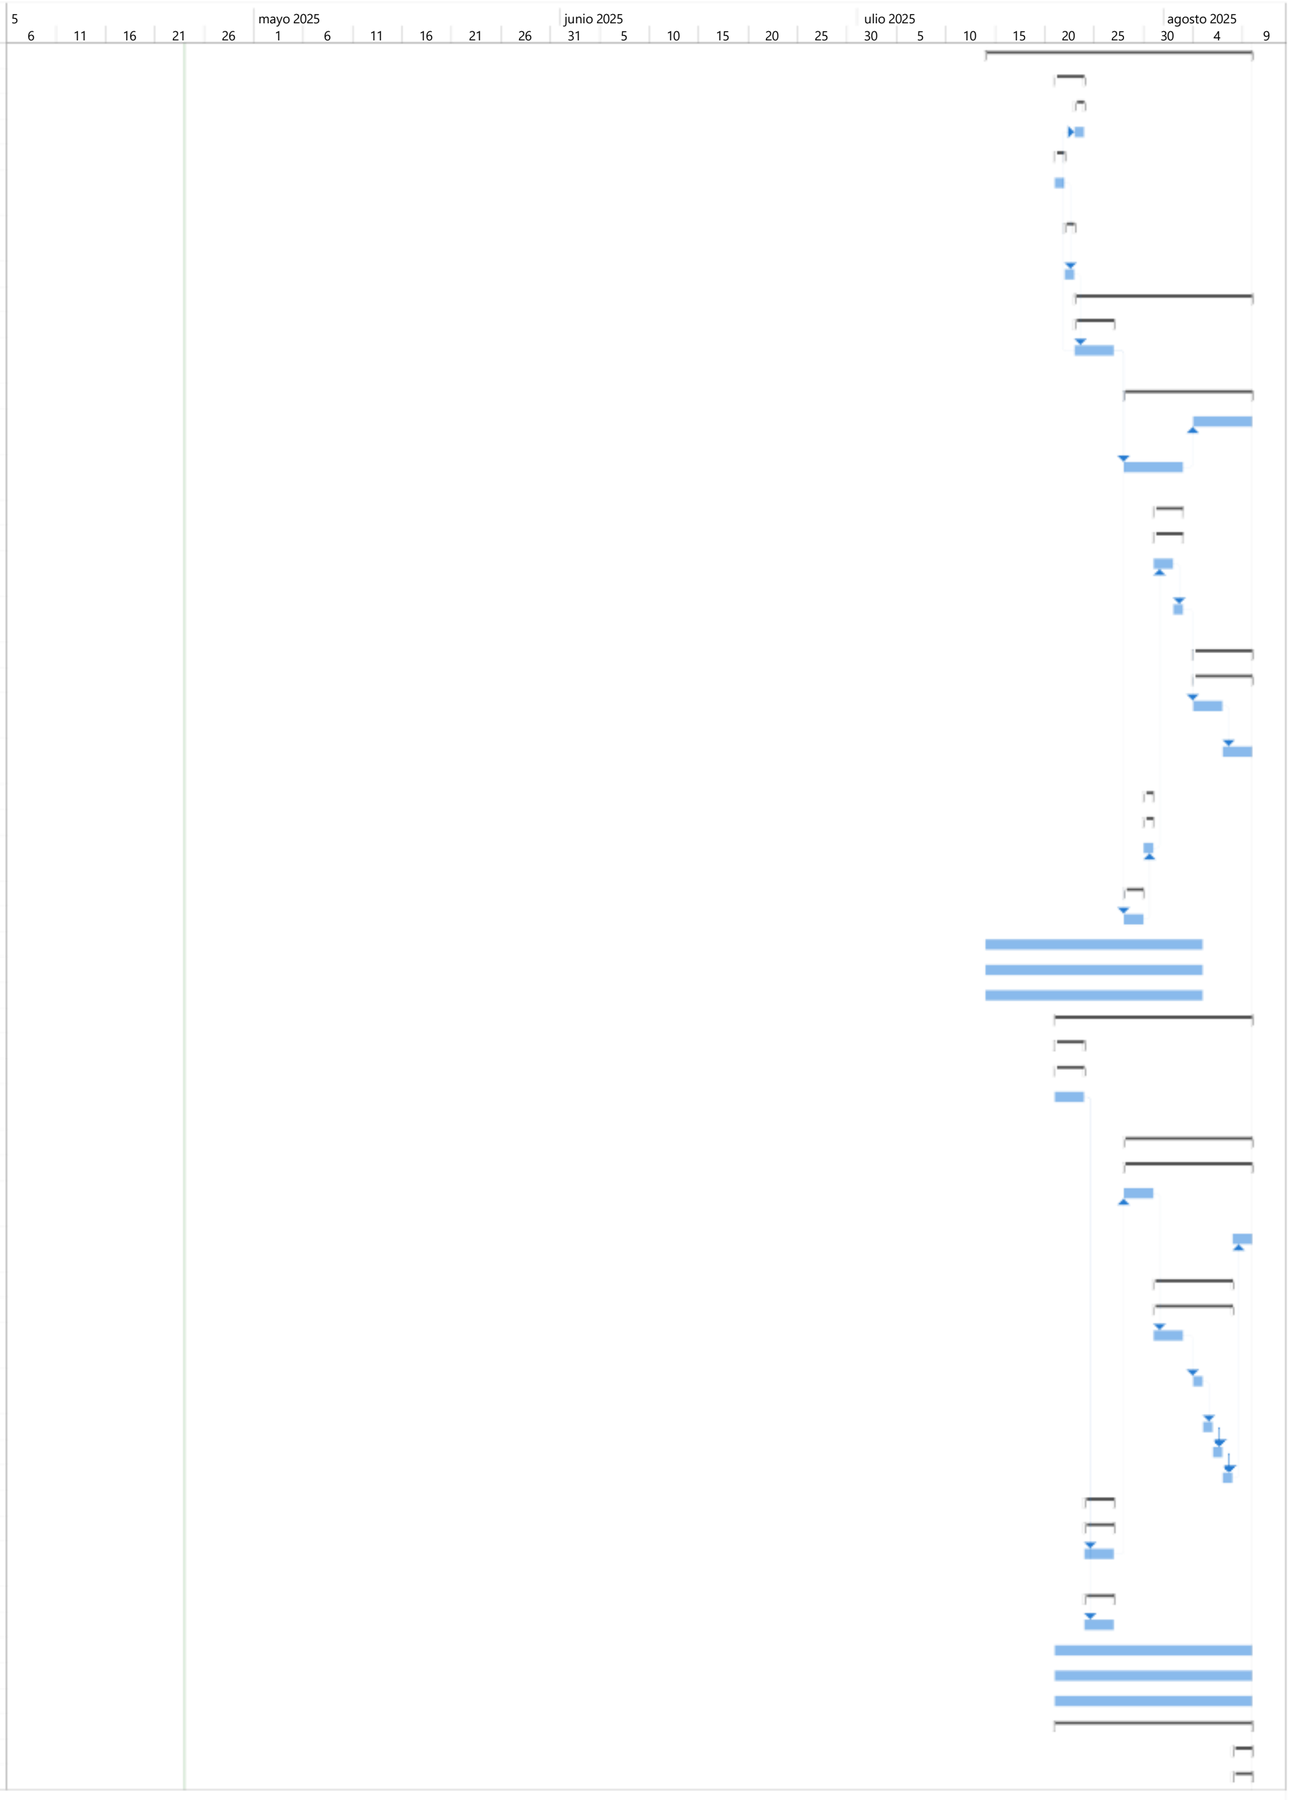


Proyecto: Programacion Santa C
Fecha: jue 24/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
521		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	2 días	vie 8/08/25	sáb 9/08/25	M2	65.00	$ 34.944.780,00
522		**6**	**PINTURA**	**11 días**	**lun 21/07/25**	**vie 1/08/25**			**$ 7.690.650,00**
523		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**11 días**	**lun 21/07/25**	**vie 1/08/25**			**$ 7.690.650,00**
524		6,1,2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	3 días	lun 21/07/25	mié 23/07/25	M2	123.00	$ 2.251.638,00
525		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	2 días	jue 24/07/25	vie 25/07/25	M2	300.00	$ 2.814.600,00
526		6,1,12	Pintura Modulo M-3A	2 días	sáb 26/07/25	lun 28/07/25	UN	1.00	$ 590.256,00
527		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	mar 29/07/2	mié 30/07/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
528		6,1,14	Pintura Modulo-M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	jue 31/07/25	vie 1/08/25	UN	1.00	$ 991.387,00
529		**8**	**MOBILIARIO**	**3 días**	**sáb 2/08/25**	**mar 5/08/25**			**$ 1.322.934,00**
530		**8.2**	**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**sáb 2/08/25**	**mar 5/08/25**			**$ 1.322.934,00**
531		8,2,8	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	1 día	sáb 2/08/25	sáb 2/08/25	UN	6.00	$ 571.692,00
532		8,2,13	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Columpio-STPM	1 día	lun 4/08/25	lun 4/08/25	UN	3.00	$ 332.454,00
533		8,2,14	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM**	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	UN	6.00	$ 418.788,00
534		**N.P**	**Items no previstos**	**2 días**	**mié 6/08/25**	**jue 7/08/25**			**$ 21.081.240,00**
535		N.P3	Carcamo	2 días	mié 6/08/25	jue 7/08/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
536			A	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 16.259.901,00**
537			I	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 650.396,04**
538			U	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 3.251.980,20**
539			**10-122-Parque Tisquesusa 1**	**18 días**	**lun 21/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 65.703.626,94**
540		**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 21/07/25**	**mié 23/07/2**			**$ 3.741.026,00**
541		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 21/07/25**	**lun 21/07/25**			**$ 1.428.700,00**
542		1,2,1	Demolicion anden concr e = 0.10 incl. cargue y ret *	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	M2	70.00	$ 1.428.700,00
543		**1.4**	**DESMONTES Y REINSTALACIONES**	**2 días**	**mar 22/07/2**	**mié 23/07/2**			**$ 2.312.326,00**
544		1,4,4	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	1 día	mar 22/07/25	mar 22/07/25	UN	1.00	$ 1.568.394,00
545		1,4,5	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-5 o 5A-STP	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	UN	1.00	$ 743.932,00
546		**5**	**PISOS Y ENCHAPES**	**4 días**	**mié 6/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 41.783.119,42**
547		**5.1**	**PISOS**	**4 días**	**mié 6/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 41.783.119,42**
548		5,1,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	4 días	mié 6/08/25	sáb 9/08/25	M2	77.72	$ 41.783.119,42
549		**6**	**PINTURA**	**7 días**	**jue 24/07/25**	**jue 31/07/25**			**$ 3.862.625,00**
550		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**7 días**	**jue 24/07/25**	**jue 31/07/25**			**$ 3.862.625,00**
551		6,1,1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	3 días	jue 24/07/25	sáb 26/07/25	ML	78.00	$ 1.017.666,00
552		6,1,9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	2 días	lun 28/07/25	mar 29/07/2	ML	78.00	$ 1.802.190,00
553		6,1,13	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	UN	1.00	$ 1.042.769,00
554		**7**	**EXTERIORES-ESPACIO PUBLICO**	**2 días**	**vie 1/08/25**	**sáb 2/08/25**			**$ 292.260,00**
555		**7.1**	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**2 días**	**vie 1/08/25**	**sáb 2/08/25**			**$ 292.260,00**
556		7,1,1	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	2 días	vie 1/08/25	sáb 2/08/25	M2	30.00	$ 292.260,00
557		**8**	**MOBILIARIO**	**2 días**	**lun 4/08/25**	**mar 5/08/25**			**$ 476.410,00**
558		**8.2**	**MOBILIARIO URBANO**	**2 días**	**lun 4/08/25**	**mar 5/08/25**			**$ 476.410,00**
559		8,2,8	Cadenas galva columpio M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	UN	5.00	$ 476.410,00
560			A	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 12.538.860,10**
561			I	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 501.554,40**
562			U	18 días	lun 21/07/25	sáb 9/08/25			**$ 2.507.772,02**
563			**10-136-Parque tisquesusa 2**	**24 días**	**lun 14/07/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 288.049.390,61**
564		**1**	**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/2**			**$ 21.624.648,00**
565		**1.1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 22/07/2**	**mar 22/07/2**			**$ 595.620,00**
566		1,1,1	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	1 día	mar 22/07/25	mar 22/07/25	M2	540.00	$ 595.620,00
567		**1.2**	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**lun 14/07/25**	**lun 14/07/25**			**$ 12.887.340,00**
568		1,2,4	Demolición placa de contrapiso incl. cargue + retiro	1 día	lun 14/07/25	lun 14/07/25	M3	60.00	$ 12.887.340,00
569		**1.3**	**DESMONTES Y RETIROS , DESTAPES**	**2 días**	**mar 15/07/25**	**mié 16/07/25**			**$ 8.141.688,00**
570		1,3,10	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	2 días	mar 15/07/2	mié 16/07/25	M3	43.20	$ 8.141.688,00
571		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**15 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 2/08/25**			**$ 45.879.750,00**
572		**2.1**	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**5 días**	**jue 17/07/25**	**mar 22/07/2**			**$ 18.711.648,00**
573		2,1,1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	5 días	jue 17/07/25	mar 22/07/25	M3	216.00	$ 18.711.648,00
574		**2.3**	**RELLENOS**	**10 días**	**mié 23/07/2**	**sáb 2/08/25**			**$ 27.168.102,00**



Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo
575		2,3,1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	mar 29/07/25	sáb 2/08/25	M3	54.00	$ 7.906.302,00
576		2,3,2	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC	5 días	mié 23/07/25	lun 28/07/25	M3	162.00	$ 19.261.800,00
577		**3**	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 4/08/25**	**mié 6/08/25**			**$ 27.120.750,00**
578		**3.1**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 4/08/25**	**mié 6/08/25**			**$ 27.120.750,00**
579		3,1,4	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	3 días	lun 4/08/25	mié 6/08/25	ML	250.00	$ 27.120.750,00
580		**4**	**REDES HIDRAULICAS**	**3 días**	**lun 4/08/25**	**mié 6/08/25**			**$ 4.673.858,00**
581		**4.1**	**REDES Y CONDUCCIÓN**	**3 días**	**lun 4/08/25**	**mié 6/08/25**			**$ 4.673.858,00**
582		4,1,1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	UN	2.00	$ 1.029.668,00
583		4,1,3	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	1 día	mié 6/08/25	mié 6/08/25	ML	45.00	$ 3.644.190,00
584		**6**	**PINTURA**	**2 días**	**vie 8/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 2.814.600,00**
585		**6.1**	**PINTURA EXTERIORES**	**2 días**	**vie 8/08/25**	**sáb 9/08/25**			**$ 2.814.600,00**
586		6,1,3	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	2 días	vie 8/08/25	sáb 9/08/25	M2	300.00	$ 2.814.600,00
587		**8**	**MOBILIARIO**	**1 día**	**jue 7/08/25**	**jue 7/08/25**			**$ 88.990.380,00**
588		**8.1**	**CANCHAS**	**1 día**	**jue 7/08/25**	**jue 7/08/25**			**$ 88.990.380,00**
589		8,1,2	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	1 día	jue 7/08/25	jue 7/08/25	M2	540.00	$ 88.990.380,00
590		**N.P**	**Items no previstos**	**13 días**	**mié 23/07/2**	**mié 6/08/25**			**$ 28.781.045,00**
591		N.P 1	Tratamiento Radicular	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/2	UN	1.00	$ 4.449.805,00
592		N.P 2	Muro contenedor de raices 1.3*1.3	4 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	UN	1.00	$ 3.250.000,00
593		N.P3	Carcamo	3 días	lun 4/08/25	mié 6/08/25	ML	60.00	$ 21.081.240,00
594			A	24 días	lun 14/07/25	sáb 9/08/25			**$ 54.971.257,75**
595			I	24 días	lun 14/07/25	sáb 9/08/25			**$ 2.198.850,31**
596			U	24 días	lun 14/07/25	sáb 9/08/25			**$ 10.994.251,55**

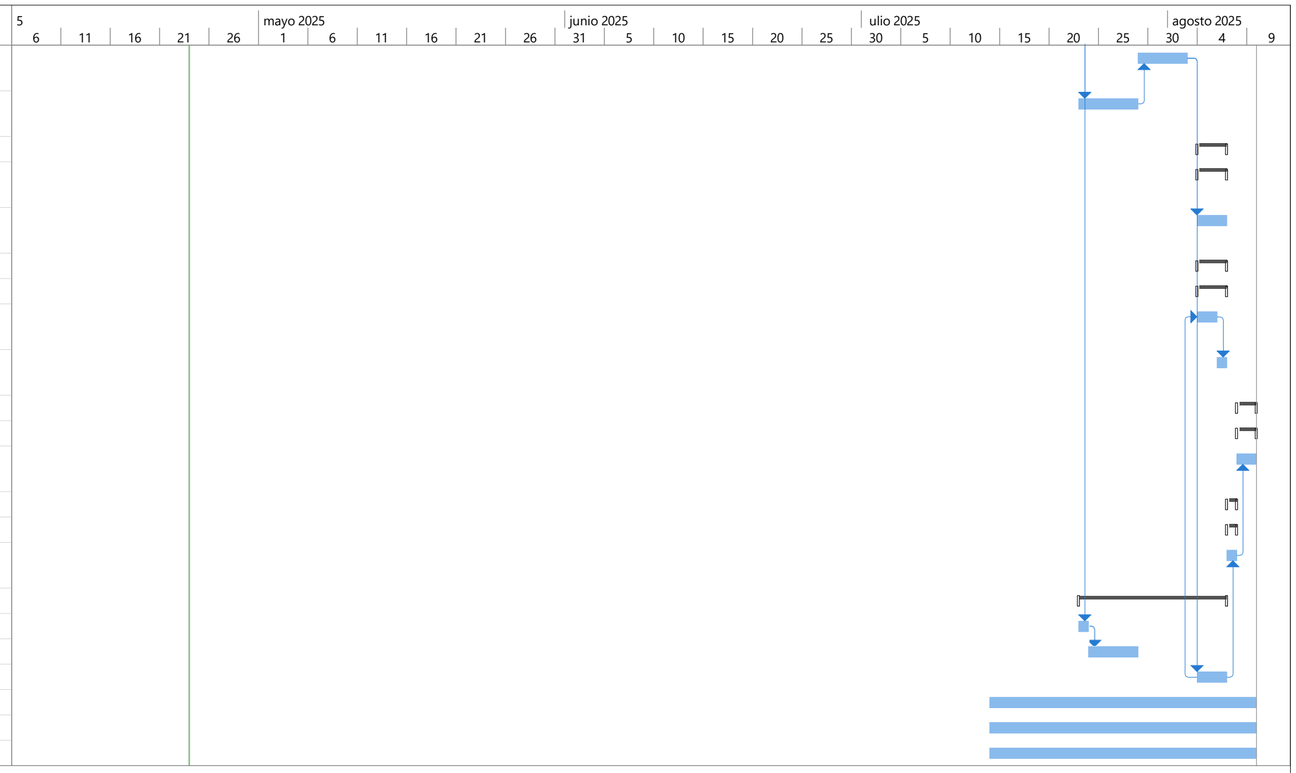

ANEXO 8
BITÁCORA DE OBRA

Fecha 28 de abril del 2025
Estado del Clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes.
Equipo de Obra: Herramienta Menor

Se inicia la jornada con charla SST, se inician las actividades de cerramiento Perimetral en la zona de los juegos infantiles

JL3 Se realiza acompañamiento por parte de interventoria en el inicio de actividades en el parque Almería. Interventoría:

Fecha 29 de abril del 2025
Estado del Clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
1 maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes
Equipo de Obra: Herramienta Menor
Rotomartillo

Se inicia la jornada con la demolición de la placa de asfalto ubicada en la área del parque infantil, esta placa media aproximadamente 5cm de espesor, la actividad se realiza de forma manual por los trabajadores con picas y palas y con la ayuda del rotomartillo, por condiciones climaticas las actividades se detienen de 2 a 3 de la tarde, luego de esto continuan con normalidad hasta las 5:00pm que finalizaron las actividades

JL3 Interventoría:

Fecha 30 de abril del 2025

Estado del Clima: Nublado / Lluvia
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Retomartillo

Actividades:
Se continuan actividades de demolición de placa asfaltica, se realiza cargue y retiro de ate material en volquetas, se detienen actividades de 2:00 pm a 4:00 pm por fuertes lluvias, se retoman actividades y finalizan a las 5:00 pm

JF3

En acompañamiento del área técnica de interventoría se evidencia que continuan con la demolición de la placa asfaltica del juego infantil y zona de ejercicio
Interventoría:

Fecha 02 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado Lluvia
Personal en Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipos en Obra: Herramienta Menor

Se inician la jornada con charla SST, se inicia con actividades de lijado de todo el parque (Estructura metalica) se detienen actividades de 1:00 pm a 2:00pm por fuertes lluvias, se finaliza la jornada a las 5:00 pm

Interventoría

JF3

Norma

Powered by CamScanner

fecha 03 de mayo del 2025

Estado del clima: Lluvia
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipos en Obra: Herramienta Menor

Se inicia la jornada con charla SST, se continua con el lijado de la estructura metalica y se retira el material de la losa de asfalto: las actividades finalizan a las 12:00 pm

JL3

Se evidencian actividades de demolición de la placa en asfalto, lijado de estructuras de juegos y retiro de dicmaterial de demolición
Interventoría: [signature]

fecha 05 de mayo del 2025

Estado del clima: Lluvia
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipos en Obra: Herramienta Menor

Se inicia la jornada con charla SST, se continua con el retiro de los elementos y accesorios del parque (Estructura Metalica) Se detienen actividades de 12:00pm a 3:00pm debido a fuertes lluvias, se retoman actividades y se descargan bordillos.

JL3

En acompañamiento del área técnica, sst y ambiental de interventoría, se evidencian capacitación a personal desmonte de estructuras de juegos y elementos de ejercicio y la llegada a obra de bordillos prefabricados.

Interventoría: [signature]

Norma

fecha 06 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado / Lluvioso
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST.
1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Rotomartillo

Se inician actividades con el desmonte del mobiliario del parque demoliendo y excavando los dados de cada estructura, del mismo modo se realiza la excavación para la instalación de los bordillos, se instalan algunos bordillos, las actividades se realizan de manera intermitente debido a lluvias que se presentan durante la jornada. se finalizan actividades a las 5:00 pm

JF3

Se realiza acompañamiento en actividades de excavación manual, replanteo general, verificación de niveles y se inicia con la instalación de bordillos prefabricados

Interventoría:

fecha 07 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado / Lluvioso
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST,
1 maestro, 2 Oficiales, 5 ayudantes.
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Se inician actividades con charla SST, se continua la instalación de bordillos en el area perimetral del parque, las actividades se realizan de forma intermitente por lluvias la jornada finaliza a las 5:00 pm

JF3

Interventoría:

Norma

Powered by CamScanner

fecha: Lunes 28 de abril del 2025
Clima: Cielo parcialmente nublado / Lluvia de 1:00 pm a 5:00 pm
Personal en Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 SST 1 maestro, 1 Operador, 2 ayudantes

1. Cerramiento Perimetral
Equipos en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador

- Se realiza el inicio de actividades de cerramiento perimetral en la zona de la cancha de microfutbol
- Se inician labores de retiro de material existente en la cancha (material granular) el cual se evidencia bastante compactado.

Residente de Obra

Interventoria

fecha Martes 29 de abril del 2025

Clima: Nublado / Lluvia de 1:30 pm a 5:00 pm
Personal en Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 SST 1 maestro, 1 Operador, 1 ayudante
Equipos en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador
1 Equipo Topografico

- Se continua realizando la excavacion del material existente, el cual esta siendo retirado en volquetas.
- Se da inicio a las actividades de topografia, el cual levanta los niveles de la cancha.

Norma

Powered by CamScanner

Se detienen actividades de 1:30 pm a 2:30 pm por fuertes lluvias

Residente de Obra Interventoría

fecha 30 de abril del 2025

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: Residente, 1 inspector, 1 SST 1 maestro, 1 ayudante, 1 Operador
Herramientas en Obra: Herramienta Menor 1 Minicargador

Se continua con actividades de excavación del material existente en la cancha el cual se encontraba bastante compactado lo que ocasiona que se dificulte la excavación

Residente de Obra Interventoría

fecha 01 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado
Personal de Obra: Residente, 1 inspector, 1 SST 1 maestro, 1 ayudante 1 Operador
Herramienta en Obra: 2 minicargadores

Se continua con actividades de excavacion del material existente en la cancha la jornada finaliza a las 4:30 pm
Se realiza acompañamiento en actividades de excavación por parte de interventoría

Residente de Obra Interventoría

Fecha 2 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Operador.
Equipos en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador.
Se inician actividades con charla SST, se continua las actividades de excavación del material existente, se retoma el retiro del material en Volquetos. Se finalizan actividades a las 5:00 pm.

Residente de Obra Interventoría

Fecha 3 de mayo del 2025

Estado del clima: Lluvia
Personal en Obra. 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante
Equipos en Obra: 1 Minicargador

Se continuan las actividades de excavación del material existente, las actividades se realizan de manera intermitente por lluvias
Se continuan con actividades de excavacion y retiro de material.

Residente de Obra Interventoría

Fecha: 05 de mayo del 2025

Estado del clima: Lluvia
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Operador

Powered by CamScanner

Equipos en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador

Se continuan las actividades de excavación y retiro de material existente en la cancha, las actividades se realizan de Manera intermitente desde las 11:00 am hasta la 3:30 pm debido a las fuertes lluvias ocasionadas, se finalizan actividades a las 5:00 pm

En acompañamiento por parte del área técnica de interventoría, se continuan con actividades de excavación y retiro y disposición de material.

Interventoría:

fecha 06 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado Lluvioso
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Operador
Equipos en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador

Se continuan las actividades de excavación y retiro de material existente en la cancha, las actividades se realizan de manera intermitente durante todas las jornada debido a las lluvias que se presentaban, la jornada finaliza a las 5:00 pm

Se evidencia la excavación de la cancha, retiro de material de excavación y llegada de material

Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Fecha: Lunes 28 de abril del 2025
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector
1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes
Equipo de Obra: Herramienta menor

Se inicia la jornada con charla SST, se inician las actividades de cerramiento perimetral en la zona de los juegos infantiles

JFB Se realiza acompañamiento en el inicio de actividades del parque la fenix, con actividades de cerramiento de parque infantil

Interventoría:

Fecha: Martes 29 de abril del 2025

Estado del tiempo: Nublado
Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector
1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes
Equipo de Obra: Herramienta Menor

Se inicia jornada con charla SST, se inician actividades de retiro de piso caucho existente en el parque, la jornada finaliza a las 5:00 pm

JFB Se evidencia que continuan con actividades de retiro de piso chip en caucho existente

Interventoría:

Fecha: Miercoles 30 de abril del 2025

Estado del tiempo: Nublado
Personal en Obra: 1 residente, 1 inspector
1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes

Norma

Powered by CamScanner

Equipos en Obra: Herramrenta Menor

Se continuan actividades de retiro del piso caucho existente en el parque, esta actividad se realiza desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm

JF3 Interventoría:

Fecha Viernes 02 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramrenta Menor

Se continuan actividades de retiro del piso caucho existente en el parque, esta actividad se realiza desde las 7:00 am hasta las 5:00pm

Continuan con actividades de desmonte, retiro y limpieza de piso caucho en plazoleta del parque infantil.

JF3 Interventoría:

Fecha Sabado 03 de mayo del 2025

Estado del clima: Lluvioso
Personal en Obra. 1 Residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Se realiza el retiro final del piso caucho existente, en camiones de disposición final. la jornada finaliza a las 12:00pm

JF3 Interventoría:

Norma

Powered by CamScanner

Fecha Lunes 05 de mayo del 2025

Estado del clima: Lluvia
Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
1 maestro, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor

Se inicia la jornada con charla SST, el personal inicia actividad de lijado y retiro de pintura del parque (Estructura metalica) las actividades se ven afectadas desde las 11:00 am hasta las 3:30 pm, las actividades finalizan a las 5:00 pm

JH3

Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría en el lijado de la estructura del juego infantil y columpio.

Interventoría:

Fecha 06 de abril de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado / Lluvia
Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST,
1 Maestro, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor

Se inicia la jornada con charla SST, se continuan actividades de lijado de mobiliario del parque (Estructura Metalica), Se realiza lavado total del parque, se lava el piso del parque a profundidad para retirar segmentos de piso caucho que habian quedado.

JH3

Se realizan actividades de lavado y limpieza de placa de juegos infantiles y continuan lijado de la estructura de los juegos y la baranda perimetral de la plazoleta.

Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Parque: Santa Cecilia

Contrato de Obra N°: COP - 705 - 2024

Objeto: Realizar a monto agotable y a precios unitarios la intervención de los parques vecinales y/o de bolsillo y espacio público (Andenes Perimetrales) en la localidad de Engativa

Contratista de Obra: Consorcio Parques Platinum 2024

Interventoría: Interventoría y Construcciones SAS

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Fecha: Lunes 7 de abril de 2025
Clima: cielo parcialmente nublado.
- Actividad realizada:

1. Cerramiento perimetral y retiro de losa de concreto:

- Se inician las actividades de cerramiento perimetral en la zona de la cancha de baloncesto.
- Entre las 8:00AM y las 12:00 PM se retira el 50% de la losa de concreto. El material retirado es transportado fuera del sitio mediante volquetas.
- Durante la tarde, se prosigue con el retiro de la losa de concreto, alcanzando un avance total del 90% de extracción del mismo al final de la jornada.

2. Condiciones de trabajo.
- No se presentaron contratiempos ni problemas durante la jornada, las actividades se desarrollaron sin ningun problema.

3. Actividades adicionales.
- Se hizo la colocación de la malla informativa referente a la rehabilitación del parque en la reja de la cancha de baloncesto.

- Personal de obra: 1 residente, 1 inspector técnico "contratista", 1 inspector técnico "interventoria", 1 inspector SST, 1 maestro, 1 operador, 2 ayudantes, 1 topografo.
- Equipo de obra: 1 minicargador, herramienta menor y equipo topografico.

JLB

Se realiza acompañamiento en el inicio de actividades en el parque Santa Cecilia con cerramiento perimetral y demolicion de losa en concreto de la cancha. Interventoría: [signature]

Fecha: Martes 8 de abril de 2025
Clima: cielo nublado con lloviznas entre 7:00 y 8:00AM, ademas de lluvias moderadas entre 12:00 y 2:00 PM.
- Personal de obra: 1 residente, 1 inspector técnico "contratista", 1 inspector [illegible]

Powered by CamScanner

- Equipo de obra: 1 minicargador, herramienta menor y equipo topografico.
- Actividad realizada:

1. Se inicia la jornada a las 8:00 AM, se continua con el retiro de la losa de concreto fallante, logrando avanzar hasta aproximadamente un 99% de la extiaccion de la misma, completando casi en su totalidad la labor pendiente desde la jornada anterior.
2. El equipo de topografia inicia las labores de nivelacion en la zona de senderos peatonales, logrando avanzar aproximadamente hasta el 50% de la nivelación programada para dicha área.
3. Entre las 12:00 PM y las 2:00 PM, debido a las condiciones metereologicas adversas (lluvias), se suspendieron temporalmente las actividades en obra. Dichos labores fueron reanudadas a las 2:00 PM, una vez mejoraron las condiciones climaticas.
4. Una vez finalizado el retiro mayoritario de la losa de concreto, se procede al retiro del material de la base y sub base existentes. Dicho material es evacuado de la zona en volquetas para su disposición final.
5. Se realiza la demarcación de los niveles y la colocacion de los guias de nylon, esto con el fin de establecer las referencias necesarias para los siguientes fases de la obra.

JF3

Se evidencia que continuan las actividades de demolición, retiro general y retiro y disposición de material.

Interventoría:

Fecha Miercoles 9 de abril de 2025.

Clima: cielo nublado con lluvias entre 2:00 PM y 3:00 PM

- Personal de obra: 1 residente, 1 inspector técnico "contratista", 1 inspector técnico "residente", "interventoria", 1 inspector SST, 1 maestro, 1 operario, 1 SST, 2 ayudantes, 1 topografo.
- Equipo de obra: 1 minicargador, herramienta menor y equipo topografico.
- Actividades realizadas:

1. Al inicio de la jornada, se continua con las labores de excavacion en el área intervenida el día martes. Las activida

de topografia no pudieron dar inicio sino hasta las 8:15 AM a causa de las condiciones climaticas.
2. Durante la mañana se hace la recepcion de 2 volquetas de material de relleno para la subbase granular.
3. El topografo continua con la nivelación de los senderos iniciada el dia martes, finalizando el proceso de nivelación de los senderos peatonales.
4. Las labores se suspenden entre las 2:00 PM y las 2:20 PM por causa de las lluvias.
5. Para el cierre de la jornada se ha realizado el retiro de aproximadamente el 40% del material de la base y subbase existentes, ademas de esto, se adelantan las actividades de nivelación para la nueva subrasante.

Interventoría

Fecha Jueves 10 de abril de 2025.
Clima: cielo nublado con lluvias entre 9:00 AM y 11:00 AM y despues de las 4:00 PM.

- Personal de obra: 1 residente, 1 inspector técnico "contratista", 1 inspector técnico "interventoria", 1 inspector SST, 1 maestro, 1 operario, 2 ayudantes.
- Equipo de obra: 1 minicargador, herramienta menor y equipo topográfico.
- Actividades realizadas:

1. Se da inicio a las labores de mejoramiento de la subrasante, realizándose excavaciones en el área a intervenir debido a la presencia de material no apto para la conformación de la subrasante.
2. Entre las 9:00 AM y las 9:15 AM se suspenden las actividades a causa de las precipitaciones.
3. Se continua con las actividades de excavación en el transcurso de la mañana, sin embargo estas son interrumpidas nuevamente a las 10:55 AM a causa de las condiciones climaticas adversas.
4. Hacia las 12:00 PM, se recibe el geotextil en el sitio de obra. Se procede a su instalación, cubriendo aproximadamente el 25% del área total de la cancha.
5. Posteriormente, se inicia el extendido y compactacion de la subbase sobre la capa de geotextil previamente instalada.
6. A las 4:00 PM se suspenden las actividades en el frente de

Powered by CamScanner

trabajo debido a lluvias intensas, las cuales ocasionan la formación de grandes encharcamientos, imposibilitando la continuidad de los trabajos.

Se realizo acompañamiento en actividades de excavación, nivelación y conformación de sobrasante, instalación de geotextil y extendido de sub base granular reciclada en la cancha. Interventoría: [signature]

Fecha Viernes 11 de abril de 2025.
Clima: lluvia 1:00 PM a 4:00 pm
Personal de obra: 1 Residente, 1 maestro, 2 oficiales 2 ayudante, 1 SST, 1 ambiental, 1 topografo
Equipo de obra: 1 mini cargador, 1 compactador

Se finaliza el mejoramiento de la sobrasantes. se extiende el geotextil, e inicio la instalacion de subbase granular.

Se continuan con actividades de mejoramiento de sobrasante, instalación de geotextil y continuan las actividade de llenos de sub base granular reciclada.

Interventoría: [signature]

Fecha Sabado 12 de abril de 2025
Clima: lluvia 08:00 am - 10:00 am
Personal de obra: 1 Residente, 1 maestro, 2 oficiales 2 ayudantes, 1 SST, 1 ambiental, 1 inspector
Equipo de obra: 1 mini cargador, 1 compactador

Se continua la instalacion de la sub base granular en el area de la cancha, se realizo replanteo Topografico de los sectores y entrega a interventoria. Se continuan con actividades de instalación de sub base granular reciclada en la cancha.

Interventoría: [signature]

Fecha Domingo 13 abril 2025

No se realizo labores

Interventoría:

Fecha: lunes 14 de abril 2025
Clima: lluvia 1:00 pm - 4:00 pm
Personal de Obra: 1 residente, 1 maestro, 1 inspector
2 oficiales, 2 ayudantes
Equipo de obra: 1 mini cargador, 1 compactador

Se continua instalacion de subbase granular en el sector de la cancha, se realizan retiros de material por las fallas encontradas, en el 20% del area de la cancha.

Interventoría

Fecha: Martes 15 de abril 2025
Clima: lluvia 10:00 am - 1:00 pm
Personal de obra: 1 residente, 1 maestro, 1 inspector
2 oficiales, 2 ayudantes
Equipo de obra: 2 mini cargadores, 1 compactador

Se inicia la excavacion de las aceras y cunetas.
Se finaliza la instalacion de subbase reciclada.
Se realiza acompañamiento por parte del área tecnica de interventoría y se evidencia el inicio de actividades de excavación manual y demolicion de anden existente en senderos peatonales

Interventoría

Fecha: Miércoles 16 de abril de 2025
Clima: Soleado
Personal de Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria: 2 minicargadores, 1 compactor

Se inicia la instalación de base granular tipo B-600 en la cuchara; se continúa la excavación con andenes y senderos en el parque.
Se evidencian actividades de compactación de subbase granular reciclada e inicio de instalación de base granular B-600, y continúan con la demolición y excavación de senderos peatonales.

JF3

Interventoría:

Fecha: Jueves 17 abril de 2025
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria: 2 minicargadores, 1 compactador

Se continua instalación de base granular en la cuchara, así mismo continúa excavación en andenes y senderos del parque.
Se realiza acompañamiento por parte de área técnica de interventoría y continúan con actividades de instalación de base granular garantizando con la excavación manual en senderos.

JF2

Interventoría:

Fecha Viernes 18 de abril de 2025
Clima: lluvias 8:00 am - 11:00 am
Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
4 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria: 2 mini cargadores, 1 compactador

Se finaliza la instalación de base granular en el sector de la cancha. Se inicia la instalación de geotextil y bordillos en los senderos internos del parque.
Se evidencia que continuan con la instalación de la base granular en la cancha e inician con la instalación de geotextil en los senderos y la instalación de bordillo prefabricado

Interventoría: [signature]

Fecha Sabado 19 de abril de 2025
Clima: soleado
Personal de obra, 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
4 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria: 2 mini cargadores, 1 compactador

Se realiza la instalación de cercamos perimetrales en la cancha, y por otra parte se continua la instalación de bordillos en los senderos internos del parque.

Interventoría: [signature]

Powered by CamScanner

Fecha Domingo 20 de abril de 2025
Clima: lluvia 01:00 pm - 04:00 pm
Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
4 oficiales, 4 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor
2 mini cargador
1 compactador

Se finaliza la instalacion de cercamos laterales en la cancha. Se continua con la instalacion de bordillos y geotextil de senderos. por otro parte se inicia el relleno con subbase reciclada en los senderos. Continuan con la instalacion de cercamos para el manejo de lluvias de la cancha, y se inicia con la instalacion de bordillos, geotextil y subbase granular reciclada en senderos peatonales.

Inlerventoria:

Fecha Lunes 21 de abril de 2025
Clima: lluvia 02:30 a 05:00 pm
Personal de obra: 1 laboratorista
1 Director
1 Inspector
1 Maestro
2 oficiales
2 ayudantes
1 SST
1 ambiental

Equipo de obra: Herramienta menor
2 mini cargador
1 Compactador
1 Equipo de densidad (cono)

Powered by CamScanner

Se realiza la toma de datos, mediante cono, se procede la instalación de bordillos en los sumideros y se continua con el relleno con sobrebase reciclada en los sumideros, así como la instalación de geotextil.

Interventoría:

Fecha Monteo 22 de abril de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 Director
1 Residente
1 Inspector
1 Maestro
5 oficiales
5 ayudantes
SST
1 Ambiental

Equipo de obra: Herramienta menor
1 mini cargador
1 compactadora
1 carro tanque

Se inicia jornada con charla de seguridad, se procede a hacer la instalación de ligante asfáltico o imprimación en la zona de la cancha, se procede con la instalación de concreto asfalto MD-C10 en el area de la cancha, se realiza toma de temperatura al asfalto.

Se realiza acompañamiento en la imprimación con emulsión asfáltica e instalación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente MD-10 y verificación de niveles.

Interventoría:

Fecha Miercoles 23 de abril de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 Residente
1 Inspector
1 Maestro
2 operadores
2 ayudantes

Equipo de obra: Herramienta menor
1 mini cargador
1 compactador de rana

Se continua con el relleno de zanjeo en el interior del parque, se inicia la excavación del zanjeo perimetral en el sector de la transversal 7S.

Fecha Jueves 24 de abril de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 residente
1 Inspector
1 Maestro
2 operadores
2 ayudantes

Equipo de obra: Herramienta menor
1 mini cargador
1 Compactador de rana

De continua la instalacion de subbase granular en los senderos del parque, asi mismo con la compactacion del mismo con equipo de mano. por otra parte se continua con la excavacion del anden localizado en paralelo con la transversal 75, se retiran los volumenes existentes.

Se realizan actividades de excavacion manual, instalacion de bordillos prefabricados, geotextil e instalacion de subbase granular recibida en senderos peatonales.

Interventoria:

Fecha Viernes 28 de abril de 2023

Clima: soleado

Personal de obra: 1 residente
1 inspector
1 maestro
2 oficiales
2 ayudante
1 SST
1 Ambiental
1 Topografo

Equipo de obra: Herramienta menor
1 mini cargador
1 compactador manual
1 Nivel

Se continuo con el relleno de los sanderos al interior del parque, con mismo se continua con la excavacion del anden en paralelo con la transversal 75.

Se realizo acompañamiento por parte de interventoría y se evidencian actividades de excavación manual, instalacion de bordillo prefabricado e instalacion de sub base granular reciclada

Interventoría:

Fecha Sabado 26 de abril de 2025

Estado del tiempo: Soleado

Personal de obra: 1 Residente
1 Inspector
1 maestro
2 oficiales
2 ayudantes

Equipo de obra: Herramienta menor
1 Compactador de rana
1 mini cargador

Se continuo instalacion de subbase en sanderos, en mismo estan activ. del parque con respectivo compactacion, se realiza la toma de densidades de los sanderos al interior del parque

Se realiza acompañamiento en actividades de compactacion de la sub base granular reciclado y en la toma de densidades internas del suelo.

Interventoría:

Fecha Domingo 27 de abril de 2025

No se realizan labores

Residente de obra

Interventoría

28 abril de 2025

Estado del tiempo: lluvia 1:00 pm a 5:00 pm

Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes

Equipo de obra: Herramienta menor
1 Minicargador

Se inicia jornada con charla de seguridad, se continua excavacion, relleno, instalacion de geotextil y sardinel en sendas peatonales, se finaliza labore 17:00

Residente de obra

Interventoría

29 de abril del 2025

Estado del clima: lluvia 1:30 a 5:00 pm

Personal en obra: 1 residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 2 oficiales 3 ayudantes

Equipo en obra: Herramienta menor
1 Minicargador

1. Se inicia la jornada con charla de seguridad

2. Se continua con la instalacion de geotextil y sardinel

3. Se continua con excavaciones de andenes y senderos peatonales.

Powered by CamScanner

4. A las 10:00 am Se recibe la visita de la alcaldia de la localidad incluyendo al alcalde, el cual hace una revesión del avance del parque.

5. A las 2:00 pm se detienen las excavaciones por temas de lluvia y se continua unicamente con la instalacion de geotextil y bordillos.
Se realiza acompañamiento en actividades de excavación manual, instalación de geotextil y bordillo prefabricado.

Interventoria:

Fecha: 30 de abril del 2025

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 Maestro, 4 Oficiales, 3 ayudantes, 1 Operador
Equipo en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador

Se inician actividades cortando y abriendo la maya electrosoldada en los senderos peatonales que se iban a fundir, se comienza la fundida a las 9:50 am, con ayuda del minicargador se dezplaza el concreto a los diferentes senderos que se iban a fundir, simultaneamente se le aplica el color y finalmente se comenzo a estampar, se finaliza fundidas a las 1:30 pm, y se finalizo el estampado a las 3:30 pm
Se realiza acompañamiento por parte del área técnica de interventoria en la fundida de los senderos peatonales, iniciando con la instalación de malla electrosoldada, instalación de concreto continuando con la aplicación de color ocre en el concreto y

finalizando con el estampado tipo adoquin en el concreto.

JC3 Interventoría: [signature]

Fecha 02 de mayo del 2025

Estado del clima - Nublado
Personal en Obra: Residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Operador
Equipo en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador

Se continua actividades de instalacion de bordillos y geotextil a lo largo de los senderos peatonales del parque, se descargan bordillos que llegan a obra a las 3:40 pm
Se finalizaci jornada a las 5:00 pm

JC3 Interventoría: [signature]

Fecha 03 de mayo del 2025

Estado del Clima: Lluvia
Personal en Obra: Residente, 1 inspector, 1 SST
1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Operador
Equipo en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador
Se continua con la excavación, relleno, instalación de geotextil y bordillo en los andenes y senderos, se realizan los cortes cada 2,5 m en los senderos fundidos el 30 de abril, se finalizan actividades a las 12:00 pm

JC3 Interventoría: [signature]

Powered by CamScanner

fecha 05 de mayo del 2025

Estado del Clima: Lluvia
Personal en Obra: Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Operador,
Herramientas en Obra: Herramienta Menor
1 Minicargador

Se inician actividades con charla SST, se continua con la excavación, relleno, instalación de geotextil y bordillo en los andenes del Parque, se reciben 8m³ de arena y se descargan bordillos, las actividades se realizan de manera intermitente desde las 11:00 am hasta las 3:30 pm debido a fuertes lluvias, se realiza limpieza general en el parque

Se evidencian actividades de excavación manual, instalación de bordillo, llenos de sub base granular.

Interventoría:

fecha 06 de mayo del 2025

Estado del clima: Nublado / Lluvia
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 3 Oficiales, 6 ayudantes
Herramienta en Obra: Herramienta Menor

Se inicia la jornada con charla SST, se continua con la excavación, relleno, instalacion de geotextil y bordillo en los andenes y senderos del parque, se inician actividades de ligado en las estructuras metalicas (Parque) y se comienza la excavación para la placa anclada en uno de los columpios del parque, las actividades se

Powered by CamScanner

realizan de manera intermitente debido a fuertes lluvias que se presentaron, la jornada finaliza a las 5:00 pm
Se evidencian actividades de lijado de estructura de juegos y biosaludables y continuan con la rehabilitación de senderos.

Interventoría:

Fecha 07 de Mayo del 2025

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 Oficiales, 5 ayudantes.
Equipos en Obra: Herramienta menor.

Se continuan actividades de excavación, relleno, instalación de geotextil y bordillo en los andenes y senderos del parque. Se continuan con actividades de lijado del mobiliario del parque, se finaliza excavacion para la losa de concreto del columpio y se inicia la instalación de bordillos en esta zona.
Se realiza acompañamiento por parte del área técnica de interventoría y se evidencia que continuan con actividades de lijado en juegos, se inicia con la demolición y contracción de placa para la zona del columpio.

Interventoría:

Fecha 08 de Mayo del 2025

Estado del Clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Residente interventoría, 1 inspector, 1 SST, 2 maestros, 6 ayudantes, 2 Oficiales, 1 Operador
Equipos en Obra: Herramienta Menor, 1 Mini cargador

ANEXO 9
ENSAYOS DE CALIDAD

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS Geotecnia, Construcción y Consultoría	**DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA NORMA INV E-161-13**	**CODIGO: GEO 27** **VERSION: 2** **FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 28-06-2018**

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024 **MATERIAL:** SUB BASE GRANULAR RECICLADA - TIPO C

DIRECCION: N/A **CANTERA:** GRECO

OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ **FECHA INFORME:** 25-abr-25

INGENIERO(A) : JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN **INFORME GEO N°:** 02452-25

LOCALIZACION: PARQUE SANTA CECILIA - COD. 10-095 - LOCALIDAD DE ENGATIVA

N° ENSAYO				1	2	3	4	5
FECHA DE ENSAYO				21/04/2025	21/04/2025	21/04/2025		
LOCALIZACIÓN				CANCHA	CANCHA	CANCHA		
COSTADO				SUR	CENTRO	NORTE		
CAPA N°				UNICA	UNICA	UNICA		
ESPESOR DE LA CAPA (cm)				10	10	10		
DESCRIPCION MATERIAL				SBGR-C	SBGR-C	SBGR-C		
1	Peso frasco + arena inicial	gr		7154	7118	7071		
2	Peso frasco + arena final	gr		2109	2173	2144		
3	Peso total arena usada	gr	(2-3)	5045	4945	4927		
4	Constante del cono	gr	CONSTANTE	1606	1606	1606		
5	Peso arena en el hueco	gr	(3-4)	3439	3339	3321		
6	Densidad de la arena (gr/cm^3)	gr/cm3	CONSTANTE	1,399	1,399	1,399		
7	Volumen del hueco (cm^3)	cm3	(5/6)	2458	2387	2374		
8	Peso suelo extraído húmedo (g)	gr	TERRENO	5019	4852	4860		
9	Humedad speddy	%	HUMEDOMETRO	9,8	10,4	10,5		
10	Peso suelo extraído seco	gr	8/(9/100+1)	4571	4395	4399		
11	Peso material retenido en 3/4"	gr	TERRENO	385	425	441		
12	% material retenido en 3/4"	%	(11/8)*100	8	9	9		
13	Densidad del material secoen terreno	gr/cm^3	(10/7)	1,860	1,842	1,853		
14	Densidad máxima del proctor	gr/cm^3	LABORATORIO	1,934	1,934	1,934		
15	Humedad óptima laboratorio	%	LABORATORIO	10,2	10,2	10,2		
16	Peso especifico mat ret en		LABORATORIO	-	-	-		
17	Densidad máxima corregida	gr/cm^3	(1/(((100-12)/14)+(12/16)))*100	-	-	-		
18	Compactación terreno	%	(13/14)*100	**96,15**	**95,22**	**95,81**		
19	Porcentaje de compactacion especificado	%	ESTABLECIDO POR NORMA	95	95	95		
20	Verificacion de Cumplimiento	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

OBSERVACIONES: El porcentaje admitido de sobretamaños para aplicar la correcion se considera valido para materiales que contengan hasta el 30% de masa que correspondan a particulas mayores de 19,0 mm.
Se realizó toma de densidades sobre la capa superior del material instalado, la capa cumple según la compactación minima del 95% del proctor modificado. En campo se trabajo con proctor de 1,934 humedad optima de 10,2.

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

* Los resultados corresponden unicamente a las muestras nombradas en este informe
* El laboratorio no asume responsabilidades por reproducción parcial o total del presente informe sin autorización previa generada por nuestra empresa.

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS Geotecnia, Construcción y Consultoría	**DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA NORMA INV E-161-13**	**CODIGO: GEO 27** **VERSION: 2** **FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 28-06-2018**

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024 **MATERIAL:** BASE GRANULAR B-600

DIRECCION: N/A **CANTERA:** PROYECTO MONTE OLIVO - CB

OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ **FECHA INFORME:** 25-abr-25

INGENIERO(A) : JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN **INFORME GEO N°:** 02452-25

LOCALIZACION: PARQUE SANTA CECILIA - COD. 10-095 - LOCALIDAD DE ENGATIVA

N° ENSAYO				1	2	3	4	5
				21/04/2025	21/04/2025	21/04/2025		
LOCALIZACIÓN				CANCHA	CANCHA	CANCHA		
COSTADO				OCCIDENTE	ORIENTE	CENTRO		
CAPA N°				UNICA	UNICA	UNICA		
ESPESOR DE LA CAPA (cm)				10	10	10		
DESCRIPCION MATERIAL				B-600	B-600	B-600		
1	Peso frasco + arena inicial	gr		6994	6948	6892		
2	Peso frasco + arena final	gr		2247	2136	2091		
3	Peso total arena usada	gr	(2-3)	4747	4812	4801		
4	Constante del cono	gr	CONSTANTE	1606	1606	1606		
5	Peso arena en el hueco	gr	(3-4)	3141	3206	3195		
6	Densidad de la arena (gr/cm^3)	gr/cm3	CONSTANTE	1,399	1,399	1,399		
7	Volumen del hueco (cm^3)	cm3	(5/6)	2245	2292	2284		
8	Peso suelo extraído húmedo (g)	gr	TERRENO	4917	5024	5033		
9	Humedad speddy	%	HUMEDOMETRO	8,7	8,6	8,9		
10	Peso suelo extraído seco	gr	8/(9/100+1)	4524	4626	4622		
11	Peso material retenido en 3/4"	gr	TERRENO	461	423	470		
12	% material retenido en 3/4"	%	(11/8)*100	9	8	9		
13	Densidad del material secoen terreno	gr/cm^3	(10/7)	2,015	2,019	2,024		
14	Densidad máxima del proctor	gr/cm^3	LABORATORIO	2,047	2,047	2,047		
15	Humedad óptima laboratorio	%	LABORATORIO	9,0	9,0	9,0		
16	Peso especifico mat ret en		LABORATORIO	-	-	-		
17	Densidad máxima corregida	gr/cm^3	(1/(((100-12)/14)+(12/16)))*100	-	-	-		
18	Compactación terreno	%	(13/14)*100	**98,43**	**98,61**	**98,86**		
19	Porcentaje de compactacion especificado	%	ESTABLECIDO POR NORMA	98	98	98		
20	Verificacion de Cumplimiento	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

OBSERVACIONES: El porcentaje admitido de sobretamaños para aplicar la correcion se considera valido para materiales que contengan hasta el 30% de masa que correspondan a particulas mayores de 19,0 mm.
Se realizó toma de densidades sobre la capa superior del material instalado, la capa cumple según la compactación minima del 95% del proctor modificado. En campo se trabajo con proctor de 2,047 humedad optima de 9,0.

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

* Los resultados corresponden unicamente a las muestras nombradas en este informe
* El laboratorio no asume responsabilidades por reproducción parcial o total del presente informe sin autorización previa generada por nuestra empresa.

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS
Geotecnia, Construcción y Consultoría

REGISTRO FOTOGRAFICO
TOMA DE DENSIDADES

CODIGO: GEO 17

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN
FORMATO: 15-04-2018

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024

DIRECCION: N/A

OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

INGENIERO(A): JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN

LOCALIZACION: PARQUE SANTA CECILIA - COD. 10-095 - LOCALIDAD DE ENGATIVA

FECHA DE ENSAYO: 21/04/2025 21/04/2025

CANTERA: GRECO PROYECTO MONTE OLIVO - CB

MATERIAL: * SUB BASE GRANULAR RECICLADA - TIPO C
* BASE GRANULAR - B600

INFORME GEO N°: 02452-25






OBSERVACIONES:

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

GEOCONSUL INGENIERÍA S.A.S - NIT 901.253.468-7 GEOTECNÍA, CONSTRUCCÍON Y CONSULTORIA S.A.S
CRA 4 48T 20 SUR – Bogotá D.C. / CEL. 3112687137 - 3004590692/ EMAIL. laboratoriogeoconsul@gmail.com

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS
Geotecnia, Construcción y Consultoría

ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO GRUESO INV 213:13

CODIGO: GEO 006
VERSION: 4
FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 30-11-2017


PROYECTO	CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ	**LUGAR**	LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTÁ D.C.	**TIPO DE ENSAYO**	
CLIENTE	CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024	**FECHA**	11-abr-25	Granulometría	X
INGENIERO (A)	JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN			Límites	X
FUENTE DEL MATERIAL	CANTERA GRECO SAS			Humedad, Wn	X
DESCRIPCION	SUB BASE GRANULAR RECICLABLE			Solicitud No.:	1876
MUESTRA 1	PROFUNDIDAD : N/A	**NORMA**	INV-E-213/125/126	Oficio Nº	GEO 2446-25

DATOS DEL ENSAYO DE GRADACION

TAMIZ mm	TAMIZ pulg	MASA RETENIDA	PORCENAJE RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	PORCENTAJE PASA	% PASA UNIFICADO	NORMA ARTICULO 610-23	FACTOR CORRECCIÓN
100	4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
87,5	3 1/2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
75	3"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
62,5	2 1/2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
50	2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100	
37,5	1 1/2"	1074,3	9,48	9,48	90,52	90,52	70-95	
25	1	986,2	8,71	18,19	81,81	81,81	60-90	
19	3/4"	1148,6	10,14	28,33	71,67	71,67		
12,5	1/2"	1506,4	13,30	41,63	58,37	58,37	45-75	
9,51	3/8	1024,9	9,05	50,68	49,32	49,32	40-70	
4,76	No. 4	1622,4	14,32	65,00	35,00	35,00	25-55	
2,00	No. 10	1324,9	11,70	76,70	23,30	23,30	15-40	
0,42	No. 40	1015,8	8,97	85,67	14,33	14,33	6-25	
0,15	No. 100	745,3	6,58	92,25	7,75	7,75		
0,074	No. 200	206,9	1,83	94,07	5,93	5,93	2-15	
	Fondo	4,1	0,04					
	Total ensayo	10659,8						
W seco antes de lavar		11326,9	% Error Muestra	0,06	% Error Permitdo	0,1	Rango de error en % del valor permitido	0,6
W seco después de lavar		10700,8						

PORCENTAJE MATERIAL	
GRAVA	65,00
ARENA	29,07
FINOS	5,93


CLASIFICACION	
U.S.C	**GP-GM**
A.S.T.H.O	**A-1-a**
HUMEDAD NATURAL	
P1	385,6
P2	366,5
P3	118,4
% Wn	**7,69**

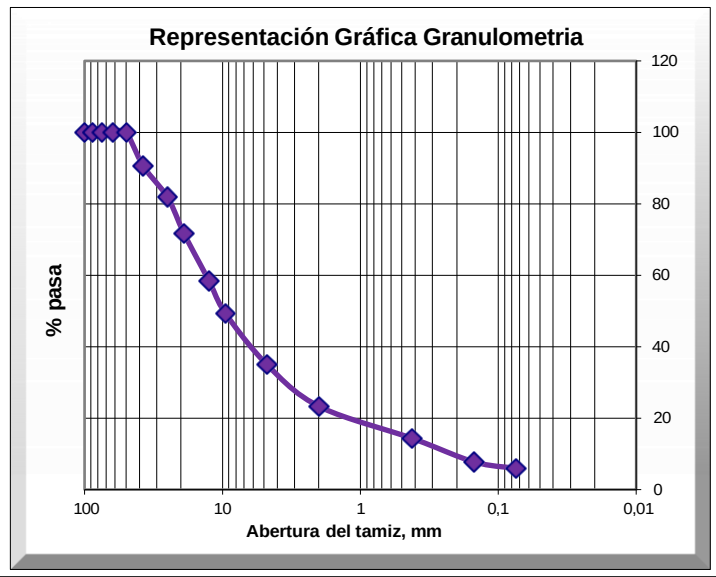

LIMITE LIQUIDO INV E-125			
Nº Golpes	**16**	**24**	**35**
Wmh+Wr	-	-	-
Wms+Wr	-	-	-
Wr	-	-	-
W %			
HUMEDAD			

LIMTE PLASTICO INV E-126			
Wmh+Wr	-	-	
Wms+Wr	-	-	
Wr	-	-	
W %			
HUMEDAD			

INDICE DE PLASTICIDAD	
INDICE DE TENACIDAD	
INDICE DE COMPRESIBILIDAD	
INDICE DE FLUIDEZ	

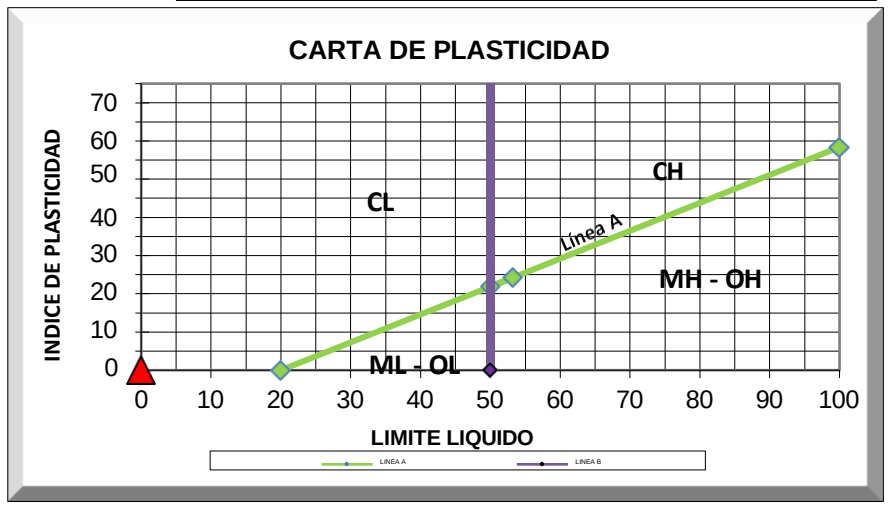

OBSERVACIONES: LA GRADACION CUMPLE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS FRANJAS GRANULOMETRICAS QUE EXIGE LA NORMA INVIAS 2022 EN EL ARTICULO 320:2022, EL MATERIAL CUMPLE


JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

ING. WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

GEOCONSUL INGENIERÍA S.A.S - NIT 901.253.468-7 GEOTECNÍA, CONSTRUCCÍON Y CONSULTORIA S.A.S
CRA 4 48T 20 SUR – Bogotá D.C. / CEL. 3112687137 - 3004590692/ EMAIL. laboratoriogeoconsul@gmail.com

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS Geotecnia, Construcción y Consultoría	**CURVA DE GRADACION INVIAS ARTICULO 610.2.2:22**	**CODIGO: GEO 010** **VERSION: 3** **FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 18-04-2018**

PROYECTO	CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ	**LUGAR**	LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTÁ D.C.	**TIPO DE ENSAYO**	
CLIENTE	CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024	**FECHA**	11-abr-25	**GRAFICA**	x
INGENIERO (A)	JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN			**Solicitud No.:**	1876
FUENTE DEL MATERIAL	CANTERA GRECO SAS			**Oficio Nº**	GEO 2446-25
MUESTRA 1	PROFUNDIDAD: N/A	**NORMA**	INV-E-213/125/126		

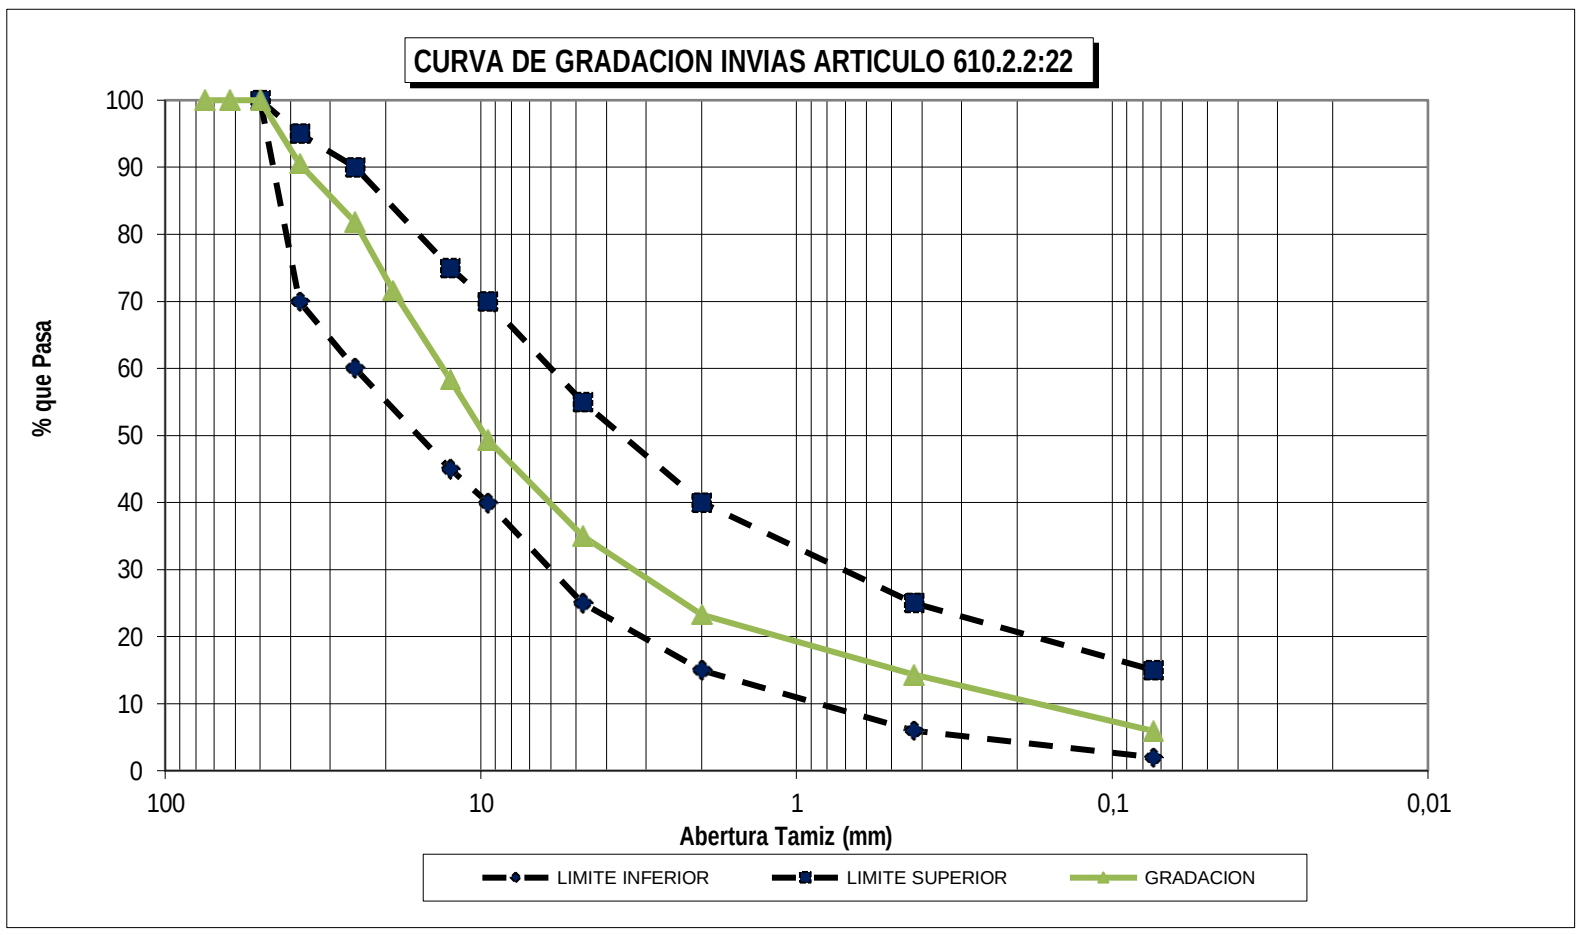

TIPO DE GRADACIÓN RECEBO RE-75

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA
3"	75	-	-	100,00
2 1/2"	62,5	-	-	100,00
2"	50	100	100	100,00
1 1/2"	37,5	70	95	90,52
1	25	60	90	81,81
3/4"	19	-	-	71,67
1/2"	12,5	45	75	58,37
3/8"	9,5	40	70	49,32
N°4	4,76	25	55	35,00
N°10	2	15	40	23,30
N°40	0,425	6	25	14,33
N°200	0,074	2	15	5,93

OBSERVACIONES: LA CURVA GRANULOMETRICA, SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TAMICES QUE EXIGE LA NORMA INVIAS 2022 ARTICULO 320-3

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

ING. WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO
INGENIERO CIVIL

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS
Geotecnia, Construcción y Consultoría

ENSAYO INFORME
RELACIONES HUMEDAD- PESO UNITARIO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) NORMA INV E-142-2013


CODIGO: GEO 25
VERSION: 3
FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 25-06-2018

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024
DIRECCION: N/A
OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PUBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
INGENIERO (A): JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN
MATERIAL: SUB BASE GRANULAR RECICLABLE
CANTERA: CANTERA GRECO SAS
LOCALIZACION: LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTÁ D.C.

SONDEO Nª: N/A
APIQUE Nº: N/A
PROFUNDIDAD: N/A
FECHA DE TOMA: 11/04/2025
FECHA DE ENSAYO: 12/04/2025
OBSERVACIONES: N/A
INFORME GEO Nº: GEO 2446-25

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD CON DIFERENTES HUMEDADES				
Ensayo N°	**1**	**2**	**3**	**4**
Metodo a usar para el ensayo:	C	C	C	C
Tipo de martillo utilizado	manual/ 10±0,02 lb	manual/ 10±0,02 lb	manual/ 10±0,02 lb	manual/ 10±0,02 lb
Numero de molde:	1	1	1	1
Número de capas:	5	5	5	5
Número de golpes por capa:	56	56	56	56
Masa suelo inicial (g):	6000	6000	6000	6000
Cantidad de agua adicionada (cm^3):	0	120	240	360
Masa molde + base + suelo compactado (g):	9546	9843	9954	9843
Masa del molde + base (g):	5439	5439	5439	5439
Masa del material humedo compactado(g):	**4107**	**4404**	**4515**	**4404**
Masa del material seco (g):	**3856**	**4048**	**4067**	**3894**
V=Volumen del molde (cm^3):	2114	2114	2114	2114
Densidad seca (g/cm^3):	**1,824**	**1,915**	**1,924**	**1,842**
Densidad seca (kg/m^3):	**1824**	**1915**	**1924**	**1842**
Peso unitario seco (ϒd) (KN/m^3):	**17,89**	**18,78**	**18,87**	**18,06**

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD				
Ensayo N°	**1**	**2**	**3**	**4**
Recipiente Número:	155	213	174	192
Masa Recipiente + masa húmeda (g):	421,6	417,9	390,6	393,6
Masa Recipiente + masa seca (g):	400,9	391,0	360,1	358,6
Masa Recipiente (g):	82,4	85,9	82,7	91,2
Humedad (%):	**6,5**	**8,8**	**11,0**	**13,1**

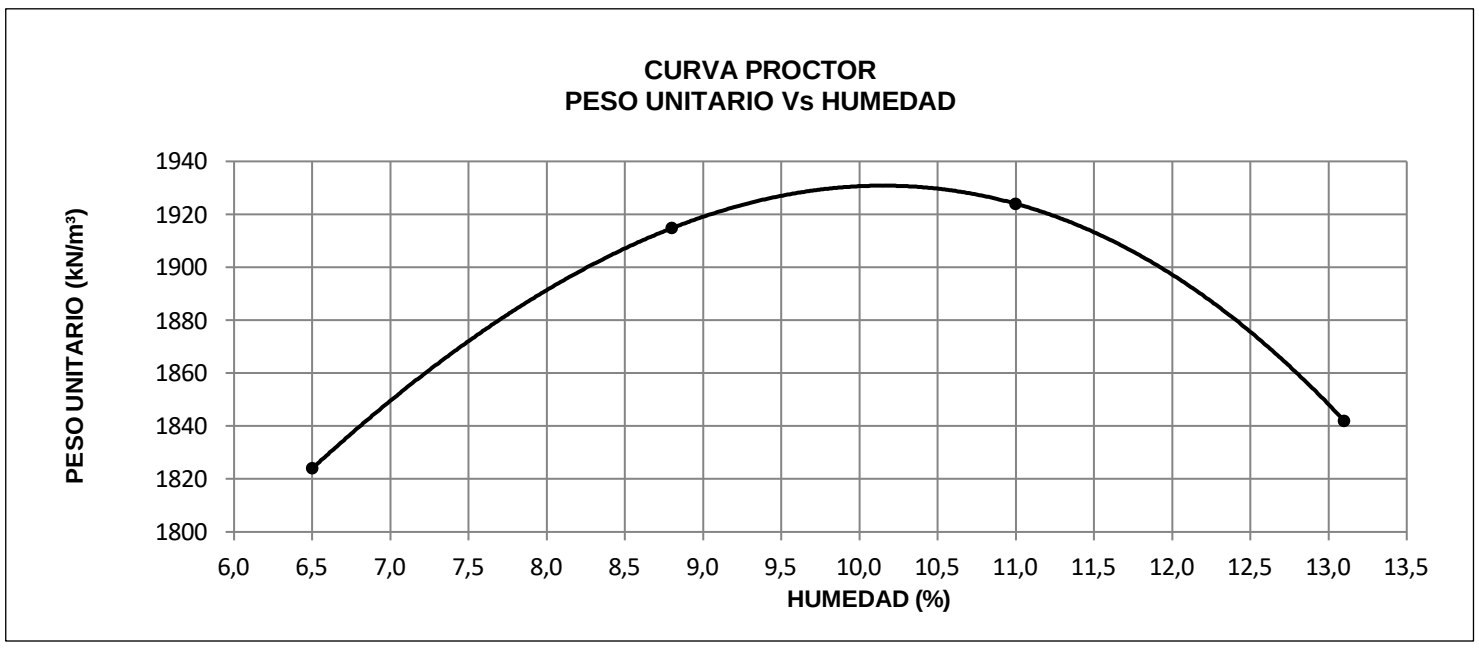

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO: **1934** **kg/m³**
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO: **1,934** **g/cm³**
PESO UNITARIO MAXIMO DE LABORATORIO: **18,96** **KN/m3**
HUMEDAD ÓPTIMA: **10,2** **%**

OBSERVACIONES: * INFORMACION DE CANTERA Y UBICACIÓN DE ENSAYOS DADOS POR EL CLIENTE

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO
INGENIERO CIVIL

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS
Geotecnia, Construcción y Consultoría

ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO GRUESO INV 213:13

CODIGO: GEO 006
VERSION: 4
FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 30-11-2017


PROYECTO	CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ	**LUGAR**	LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTÁ D.C.	**TIPO DE ENSAYO**	
CLIENTE	CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024	**FECHA**	11-abr-25	Granulometría	X
INGENIERO (A)	JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN			Límites	X
FUENTE DEL MATERIAL	CANTERA PROYECTO MONTE OLIVO - CIUDAD BOLIVAR			Humedad, Wn	X
DESCRIPCION	MATERIAL GRANULAR B600			Solicitud No.:	1877
MUESTRA 1	PROFUNDIDAD : N/A	**NORMA**	INV-E-213/125/126	Oficio Nº	GEO 2446-25

DATOS DEL ENSAYO DE GRADACION

TAMIZ mm	TAMIZ pulg	MASA RETENIDA	PORCENAJE RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	PORCENTAJE PASA	% PASA UNIFICADO	NORMA ARTICULO 610-23	FACTOR CORRECCIÓN
100	4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
87,5	3 1/2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
75	3"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
62,5	2 1/2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
50	2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00		
37,5	1 1/2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100	
25	1	1401,6	12,37	12,37	87,63	87,63	75-100	
19	3/4"	1248,3	11,02	23,39	76,61	76,61	65-90	
12,5	1/2"	1711,5	15,11	38,50	61,50	61,50		
9,51	3/8	1306,9	11,54	50,04	49,96	49,96	45-68	
4,76	No. 4	1845,2	16,29	66,33	33,67	33,67	30-50	
2,00	No. 10	1127,6	9,96	76,29	23,71	23,71	15-32	
0,42	No. 40	1362,9	12,03	88,32	11,68	11,68	7-20	
0,15	No. 100	632,4	5,58	93,90	6,10	6,10		
0,074	No. 200	145,7	1,29	95,19	4,81	4,81	0-9	
	Fondo	7,4	0,07					
Total ensayo		10789,5						
W seco antes de lavar		11326,9	% Error Muestra	0,05	% Error Permitdo	0,1	Rango de error en % del valor permitido	0,5
W seco después de lavar		10853,5						

PORCENTAJE MATERIAL	
GRAVA	66,33
ARENA	28,86
FINOS	4,81


CLASIFICACION	
U.S.C	**GP-GM**
A.S.T.H.O	**A-1-a**
HUMEDAD NATURAL	
P1	360,9
P2	346,4
P3	114,2
% Wn	**6,23**

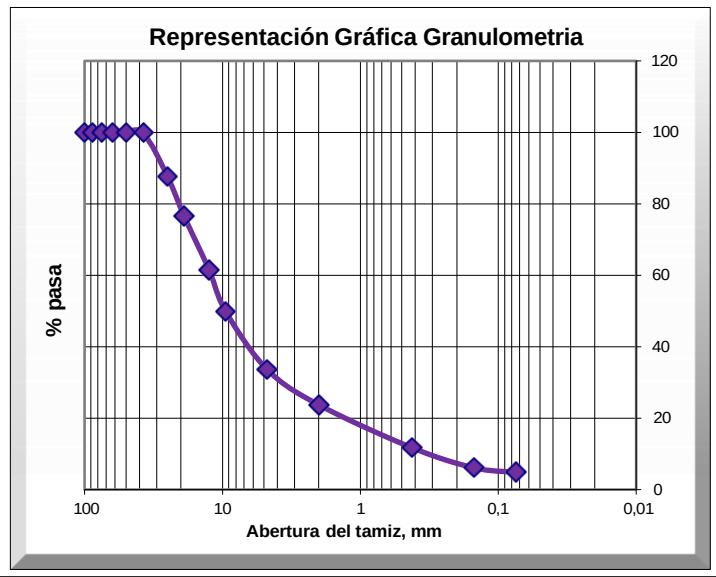

LIMITE LIQUIDO INV E-125			
Nº Golpes	**16**	**24**	**35**
Wmh+Wr	-	-	-
Wms+Wr	-	-	-
Wr	-	-	-
W %			
HUMEDAD			

LIMTE PLASTICO INV E-126			
Wmh+Wr	-	-	
Wms+Wr	-	-	
Wr	-	-	
W %			
HUMEDAD			

INDICE DE PLASTICIDAD	
INDICE DE TENACIDAD	
INDICE DE COMPRESIBILIDAD	
INDICE DE FLUIDEZ	

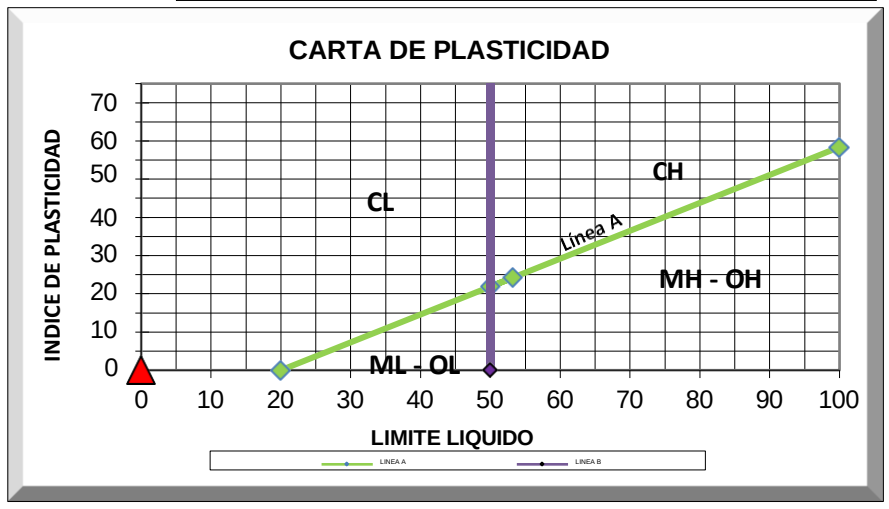

OBSERVACIONES: LA GRADACION CUMPLE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS FRANJAS GRANULOMETRICAS QUE EXIGE LA NORMA INVIAS 2022 EN EL ARTICULO 330:2022, EL MATERIAL CUMPLE


JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

ING. WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

GEOCONSUL INGENIERÍA S.A.S - NIT 901.253.468-7 GEOTECNÍA, CONSTRUCCÍON Y CONSULTORIA S.A.S
CRA 4 48T 20 SUR – Bogotá D.C. / CEL. 3112687137 - 3004590692/ EMAIL. laboratoriogeoconsul@gmail.com

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS Geotecnia, Construcción y Consultoría	**CURVA DE GRADACION INVIAS ARTICULO 610.2.2:22**	**CODIGO: GEO 010** **VERSION: 3** **FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 18-04-2018**

PROYECTO	CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ	**LUGAR**	LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTÁ D.C.	**TIPO DE ENSAYO**	
CLIENTE	CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024	**FECHA**	11-abr-25	**GRAFICA**	x
INGENIERO (A)	JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN			**Solicitud No.:**	1877
FUENTE DEL MATERIAL	CANTERA PROYECTO MONTE OLIVO - CIUDAD BOLIVAR			**Oficio Nº**	GEO 2446-25
MUESTRA 1	PROFUNDIDAD: N/A	**NORMA**	INV-E-213/125/126		

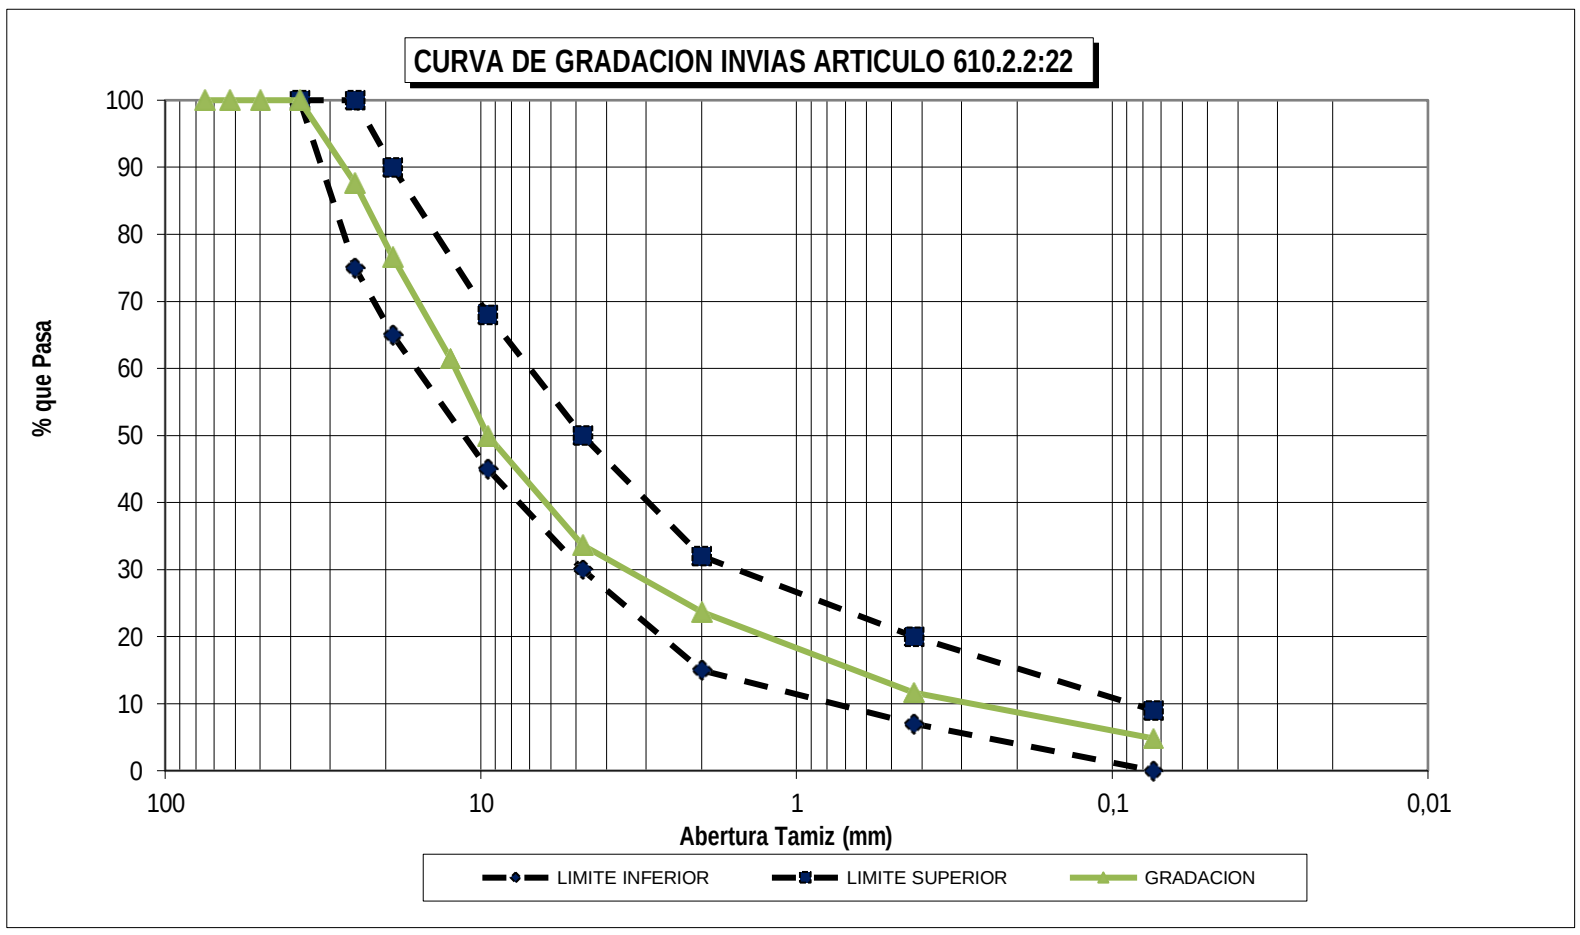

TIPO DE GRADACIÓN RECEBO RE-75

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	**mm**	**LÍMITE INF.**	**LÍMITE SUP.**	**% PASA**
3"	75	-	-	100,00
2 1/2"	62,5	-	-	100,00
2"	50	-	-	100,00
1 1/2"	37,5	100	100	100,00
1	25	75	100	87,63
3/4"	19	65	90	76,61
1/2"	12,5	-	-	61,50
3/8"	9,5	45	68	49,96
N°4	4,76	30	50	33,67
N°10	2	15	32	23,71
N°40	0,425	7	20	11,68
N°200	0,074	0	9	4,81

OBSERVACIONES: LA CURVA GRANULOMETRICA, SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TAMICES QUE EXIGE LA NORMA INVIAS 2022 ARTICULO 330-3

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

ING. WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO
INGENIERO CIVIL

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS
Geotecnia, Construcción y Consultoría

ENSAYO INFORME
RELACIONES HUMEDAD- PESO UNITARIO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) NORMA INV E-142-2013


CODIGO: GEO 25
VERSION: 3
FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 25-06-2018

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024
DIRECCION: N/A
OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PUBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
INGENIERO (A): JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN
MATERIAL: MATERIAL GRANULAR B600
CANTERA: CANTERA PROYECTO MONTE OLIVO - CIUDAD BOLIVAR
LOCALIZACION: LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTÁ D.C.

SONDEO Nª: N/A
APIQUE Nº: N/A
PROFUNDIDAD: N/A
FECHA DE TOMA: 11/04/2025
FECHA DE ENSAYO: 14/04/2025
OBSERVACIONES: N/A
INFORME GEO Nº: GEO 2446-25

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD CON DIFERENTES HUMEDADES				
Ensayo N°	**1**	**2**	**3**	**4**
Metodo a usar para el ensayo:	C	C	C	C
Tipo de martillo utilizado	manual/ 10±0,02 lb	manual/ 10±0,02 lb	manual/ 10±0,02 lb	manual/ 10±0,02 lb
Numero de molde:	1	1	1	1
Número de capas:	5	5	5	5
Número de golpes por capa:	56	56	56	56
Masa suelo inicial (g):	6000	6000	6000	6000
Cantidad de agua adicionada (cm^3):	0	120	240	360
Masa molde + base + suelo compactado (g):	9771	10017	10156	10097
Masa del molde + base (g):	5439	5439	5439	5439
Masa del material humedo compactado(g):	**4332**	**4578**	**4717**	**4658**
Masa del material seco (g):	**4129**	**4275**	**4327**	**4181**
V=Volumen del molde (cm^3):	2114	2114	2114	2114
Densidad seca (g/cm^3):	**1,953**	**2,022**	**2,047**	**1,978**
Densidad seca (kg/m^3):	**1953**	**2022**	**2047**	**1978**
Peso unitario seco (ϒd) (KN/m^3):	**19,15**	**19,83**	**20,07**	**19,39**

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD				
Ensayo N°	**1**	**2**	**3**	**4**
Recipiente Número:	45	172	36	185
Masa Recipiente + masa húmeda (g):	415,3	385,9	400,7	326,5
Masa Recipiente + masa seca (g):	399,9	366,6	375,3	302,2
Masa Recipiente (g):	85,3	95,4	92,7	88,9
Humedad (%):	**4,9**	**7,1**	**9,0**	**11,4**

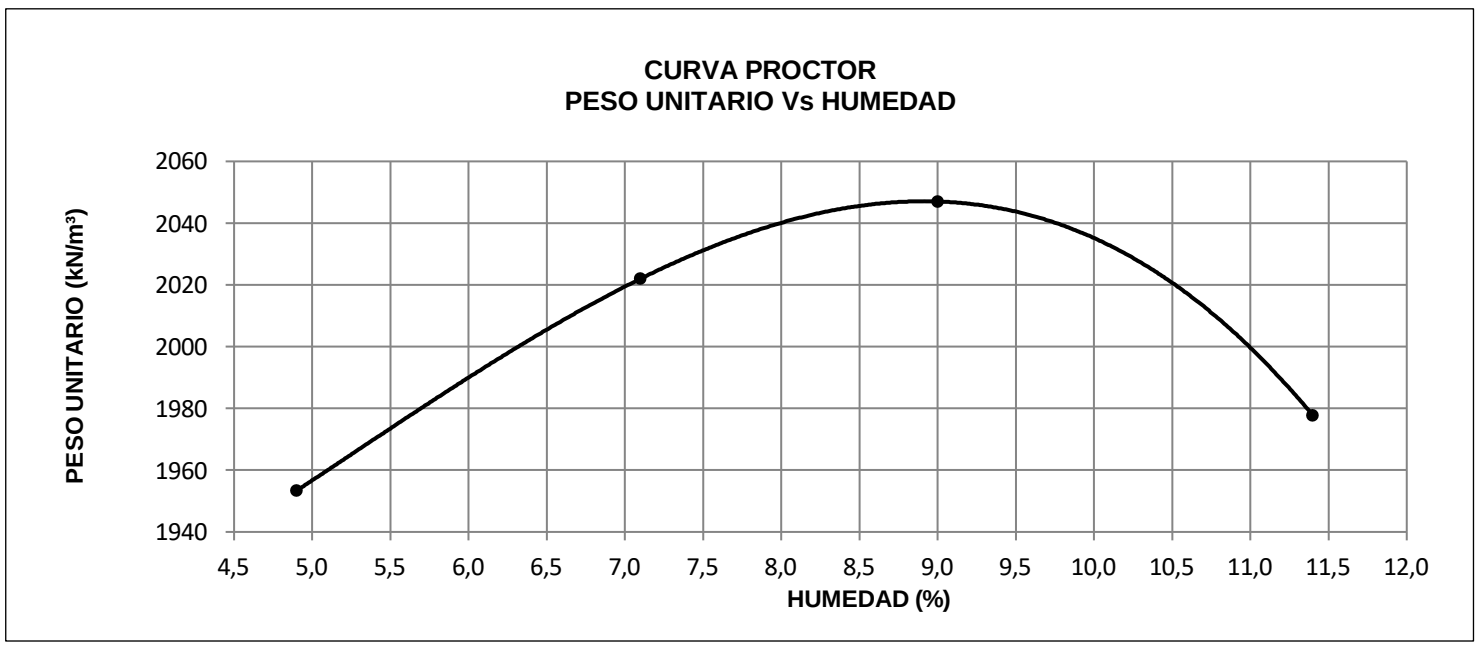

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO: **2047** **kg/m³**
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO: **2,047** **g/cm³**
PESO UNITARIO MAXIMO DE LABORATORIO: **20,07** **KN/m3**
HUMEDAD ÓPTIMA: **9,0** **%**

OBSERVACIONES: * INFORMACION DE CANTERA Y UBICACIÓN DE ENSAYOS DADOS POR EL CLIENTE

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO
INGENIERO CIVIL

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS Geotecnia, Construcción y Consultoría	**DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA NORMA INV E-161-13**	**CODIGO: GEO 27** **VERSION: 2** **FECHA ELABORACIÓN FORMATO: 28-06-2018**

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024 **MATERIAL:** SUB BASE GRANULAR RECICLADA - TIPO C

DIRECCION: N/A **CANTERA:** GRECO

OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ **FECHA INFORME:** 30-abr-25

INGENIERO(A) : JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN **INFORME GEO N°:** 02461-25

LOCALIZACION: PARQUE SANTA CECILIA - COD. 10-095 - LOCALIDAD DE ENGATIVA

N° ENSAYO				**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
FECHA DE ENSAYO				29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024
LOCALIZACIÓN				ANDEN	ANDEN	ANDEN	ANDEN	ANDEN
COSTADO				OCCIDENTE	SUR	CENTRO	NORTE	ORIENTE
CAPA N°				UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
ESPESOR DE LA CAPA (cm)				10	10	10	10	10
DESCRIPCION MATERIAL				SBGR-C	SBGR-C	SBGR-C	SBGR-C	SBGR-C
1	Peso frasco + arena inicial	gr		7058	7003	6952	6906	6870
2	Peso frasco + arena final	gr		2406	2395	2187	2235	2098
3	Peso total arena usada	gr	(2-3)	4652	4608	4765	4671	4772
4	Constante del cono	gr	CONSTANTE	1606	1606	1606	1606	1606
5	Peso arena en el hueco	gr	(3-4)	3046	3002	3159	3065	3166
6	Densidad de la arena (gr/cm^3)	gr/cm3	CONSTANTE	1,399	1,399	1,399	1,399	1,399
7	Volumen del hueco (cm^3)	cm3	(5/6)	2177	2146	2258	2191	2263
8	Peso suelo extraído húmedo (g)	gr	TERRENO	4401	4352	4621	4443	4572
9	Humedad speddy	%	HUMEDOMETRO	9,2	9,5	9,6	9,4	9,7
10	Peso suelo extraído seco	gr	8/(9/100+1)	4031	3975	4216	4062	4168
11	Peso material retenido en 3/4"	gr	TERRENO	482	514	460	497	522
12	% material retenido en 3/4"	%	(11/8)*100	11	12	10	11	11
13	Densidad del material secoen terreno	gr/cm^3	(10/7)	1,851	1,852	1,867	1,854	1,842
14	Densidad máxima del proctor	gr/cm^3	LABORATORIO	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934
15	Humedad óptima laboratorio	%	LABORATORIO	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
16	Peso especifico mat ret en		LABORATORIO	-	-	-	-	-
17	Densidad máxima corregida	gr/cm^3	(1/(((100-12)/14)+(12/16)))*100	-	-	-	-	-
18	Compactación terreno	%	(13/14)*100	**95,72**	**95,78**	**96,55**	**95,86**	**95,23**
19	Porcentaje de compactacion especificado	%	ESTABLECIDO POR NORMA	95	95	95	95	95
20	Verificacion de Cumplimiento	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: El porcentaje admitido de sobretamaños para aplicar la correcion se considera valido para materiales que contengan hasta el 30% de masa que correspondan a particulas mayores de 19,0 mm.
Se realizó toma de densidades sobre la capa superior del material instalado, la capa cumple según la compactación minima del 95% del proctor modificado. En campo se trabajo con proctor de 1,934 humedad optima de 10,2.

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

* Los resultados corresponden unicamente a las muestras nombradas en este informe
* El laboratorio no asume responsabilidades por reproducción parcial o total del presente informe sin autorización previa generada por nuestra empresa.

CamScanner

GEOCONSUL INGENIERÍA SAS Geotecnia, Construcción y Consultoría	**REGISTRO FOTOGRAFICO** **TOMA DE DENSIDADES**	**CODIGO: GEO 17** **VERSION: 1** **FECHA ELABORACIÓN** **FORMATO: 15-04-2018**

EMPRESA: CONSORCIO PARQUES PLATINIUM 2024

DIRECCION: N/A

OBRA: CONTRATO FDLE-LP-705-2024 - REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

INGENIERO(A): JOSE LEONARDO FERIZ GUZMAN

LOCALIZACION: PARQUE SANTA CECILIA - COD. 10-095 - LOCALIDAD DE ENGATIVA

FECHA DE ENSAYO: 29/04/2024

CANTERA: GRECO

MATERIAL: * SUB BASE GRANULAR RECICLADA - TIPO C
* BASE GRANULAR - B600

INFORME GEO N°: 02461-25







OBSERVACIONES: _____

WILSON JUEZ MORA
COORDINADOR DE LABORATORIO

JORGE GONZALES SANCHEZ
LABORATORISTA

CamScanner

ANEXO 10
INFORMES SEMANALES

	Formato	
	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 1	FECHA 13/04/2025

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	Objeto	"REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Contrato No.	705 de 2024		
Valor Inicial:	$ 3.636.363.636		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Fecha de Iniciación:	11/02/2025		
Fecha de terminación:	10/08/2025		

Semana Número: 9 Del: 7/04/2025 Al: 13/04/2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 61 días

Interventoría: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Nombre del Supervisor: VICTOR HUGO HUERTAS

AVANCE DE LA OBRA

AVANCE FINANCIERO

Periodo 11/02/2025 a 13/04/2025


Avance Financiero (%) 0,00%

AVANCE FISICO EJECUTADO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,22%	2,22%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	1,26%
Durante el periodo	0,96%	2,22%	
Acumulado actual	0,96%	2,22%	

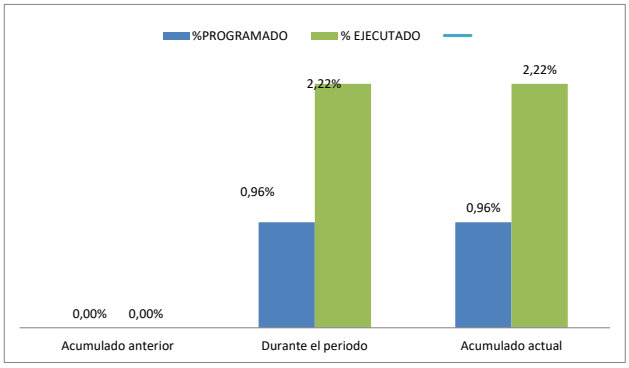

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO

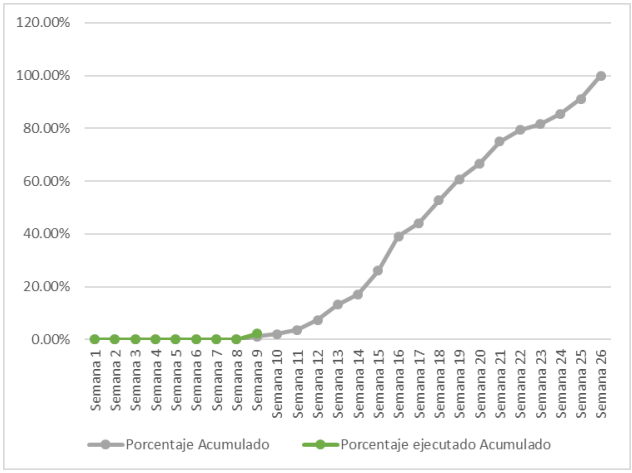

ACTIVIDADES DE OBRA EN CADA FRENTE

FRENTE: Parque Santa Cecilia 10-095

Personal Total 6 Oficial: 3 Ayudante: 3

Maquinaria 1 Equipos Herramienta menor

% de avance: 20,33% Fecha entrega 28/05/2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1.-	Se inicia actividades de demolicion de placa en el parque Santa Cecilia
2.-	Se incia con excavacion en cancha del parque santa cecilia
3.-	
4.-	
5.-	
6.-	
7.-	
8.-	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN

1.- Continuar excavacion hasta nivel de subrasante

2.- Retiro de fallos

3.- Nivelacion y conformcion de subrasante

OBSERVACIONES

Se da inico de obra, posterior a la ejecucion de documentos preeliminares

FIRMAS

CONTRATISTA

Nombre **ANDREA RODRIGUEZ**

Cargo Director de Obra

INTERVENTORÍA

Nombre **CARLOS ALBERTO ARAMBULA**

Cargo R.L INTERVENTORIA

Formato

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 2

FECHA: 20/04/2025

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024
Contrato No.	705 de 2024
Valor Inicial:	$ 3.636.363.636
Plazo Inicial:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	11/02/2025
Fecha de terminación:	10/08/2025

Objeto: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

Semana Número: 10 Del: 14/04/2025 Al: 20/04/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 68 días

Interventoría: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Nombre del Supervisor: VICTOR HUGO HUERTAS

AVANCE DE LA OBRA

AVANCE FINANCIERO

Periodo 14/04/2025 a 20/04/2025


Avance Financiero (%): 0,00%

AVANCE FISICO EJECUTADO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,03%	4,25%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,96%	2,22%	2,21%
Durante el periodo	1,08%	2,03%	
Acumulado actual	2,04%	4,25%	

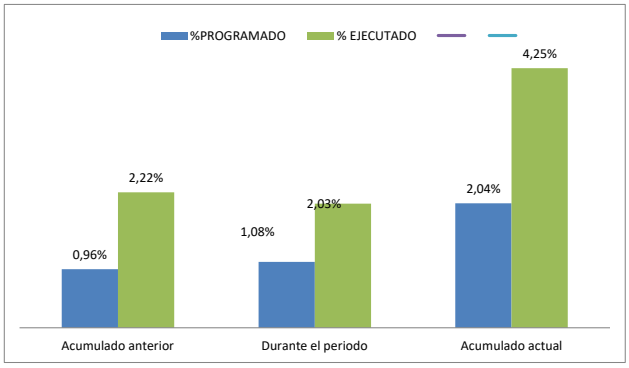

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO

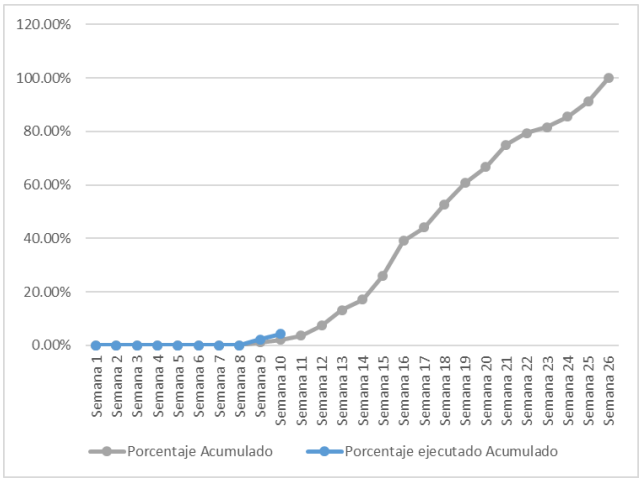

ACTIVIDADES DE OBRA EN CADA FRENTE

FRENTE: Parque Santa Cecilia 10-095

Personal Total: 6 Oficial: 3 Ayudante: 3

Maquinaria: 1 Equipos: Herramienta menor

% de avance: 39,04% Fecha entrega: 28/05/2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1.-	Se finaliza demolicion y excavacion sector cancha
2.-	Se realiza conformacion y nivelacion de la subrasante
3.-	Se instala geotextil nt-4000
4.-	Se inicia excavacion en andenes
5.-	Se instala sub base
6.-	Se instala base
7.-	
8.-	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:











PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN

1.-	Continuar excavacion andenes
2.-	Instalacion de prefabricados
3.-	

OBSERVACIONES

Se da inico de obra, posterior a la ejecucion de documentos preeliminares

FIRMAS

CONTRATISTA

Nombre: **ANDREA RODRIGUEZ**

Cargo: Director de Obra

INTERVENTORÍA

Nombre: **CARLOS ALBERTO ARAMBULA**

Cargo: R.L INTERVENTORIA

Formato

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 3

FECHA: 27/04/2025

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	Objeto	"REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Contrato No.	705 de 2024		
Valor Inicial:	$ 3.636.363.636		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Fecha de Iniciación:	11/02/2025		
Fecha de terminación:	10/08/2025		

Semana Número: 11 Del: 21/04/2025 Al: 27/04/2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 75 días

Interventoría: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Nombre del Supervisor: VICTOR HUGO HUERTAS

AVANCE DE LA OBRA

AVANCE FINANCIERO

Periodo 21/04/2025 a 27/04/2025


Avance Financiero (%) 0,00%

AVANCE FISICO EJECUTADO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,18%	8,43%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,04%	4,25%	4,84%
Durante el periodo	1,56%	4,18%	
Acumulado actual	3,60%	8,43%	

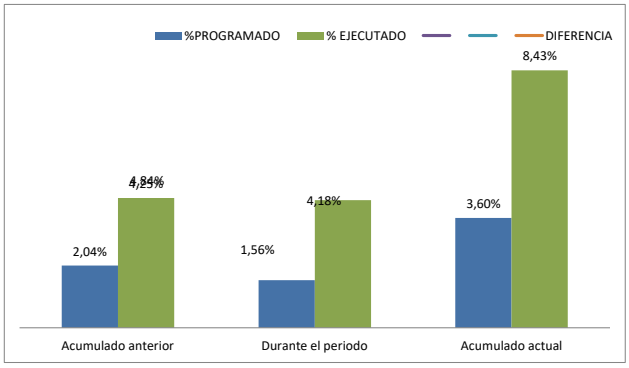

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO

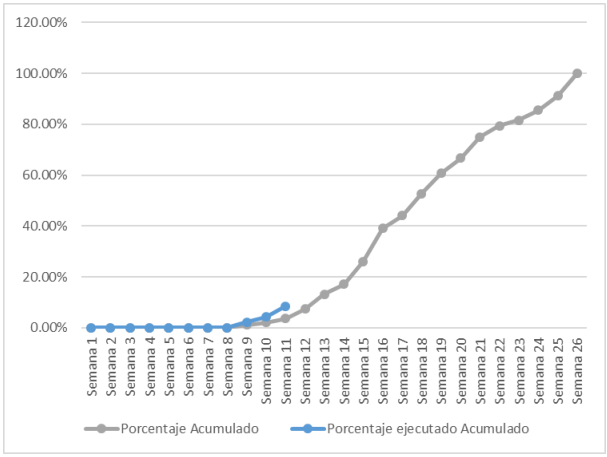

ACTIVIDADES DE OBRA EN CADA FRENTE

FRENTE: Parque Santa Cecilia 10-095

Personal Total 8 Oficial: 4 Ayudante: 4

Maquinaria 2 Equipos Herramienta menor

% de avance: 77,41% Fecha entrega 28/05/2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1.-	Se inicia la instalacion de prefabricados
2.-	Se instala el asfalto en la cancha
3.-	Se instala geotextil en andenes
4.-	Se inicia relleno de sub base en andenes
5.-	
6.-	
7.-	
8.-	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:






PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN

1.- Continuar excavacion andenes

2.- Instalacion de prefabricados

3.-

OBSERVACIONES

Se instala el asfalto en cancha, se realiza corte para acta parcial 01

FIRMAS

CONTRATISTA

Nombre **ANDREA RODRIGUEZ**

Cargo Director de Obra

INTERVENTORÍA

Nombre **CARLOS ALBERTO ARAMBULA**

Cargo R.L INTERVENTORIA

	Formato	
	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 4	FECHA 4/05/2025

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	Objeto	"REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Contrato No.	705 de 2024		
Valor Inicial:	$ 3.636.363.636		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Fecha de Iniciación:	11/02/2025		
Fecha de terminación:	10/08/2025		

Semana Número: 12 Del: 28/04/2025 Al: 4/05/2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 82 días

Interventoría: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Nombre del Supervisor: VICTOR HUGO HUERTAS

AVANCE DE LA OBRA

AVANCE FINANCIERO

Periodo 21/04/2025 a 27/04/2025


Avance Financiero (%) 15,63%

AVANCE FISICO EJECUTADO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	7,20%	15,63%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	3,60%	8,43%	8,19%
Durante el periodo	3,83%	7,20%	
Acumulado actual	7,43%	15,63%	

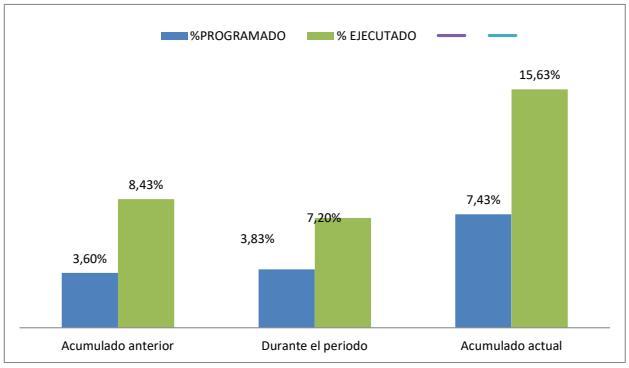

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO

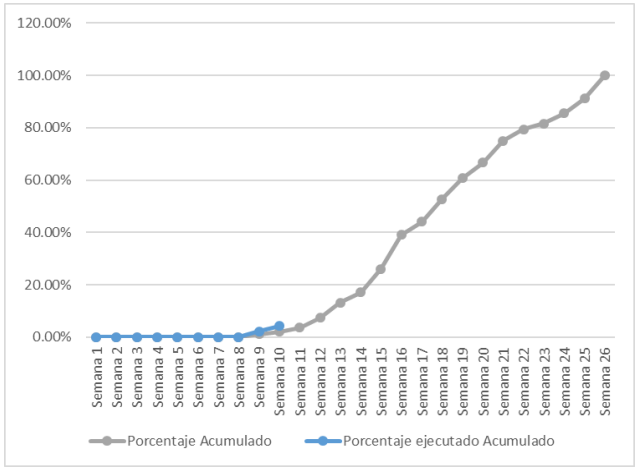

ACTIVIDADES DE OBRA EN CADA FRENTE

FRENTE: Parque Santa Cecilia 10-095

Personal Total 9 Oficial: 5 Ayudante: 4

Maquinaria 3 Equipos Herramienta menor

% de avance: 90,47% Fecha entrega 28/05/2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1.-	Se continua instalacion de prefabricados
2.-	Se continua relleno de sub base en andenes
3.-	Se continua geotextil en andenes
4.-	se funden 126 m de andenes
5.-	
6.-	
7.-	
8.-	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN

1.-	Continuar excavacion andenes
2.-	Instalacion de prefabricados
3.-	Continuar relleno de andenes

	Formato	
	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 4	FECHA 4/05/2025

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024	Objeto	"REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Contrato No.	705 de 2024		
Valor Inicial:	$ 3.636.363.636		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Fecha de Iniciación:	11/02/2025		
Fecha de terminación:	10/08/2025		

Semana Número: 12 Del: 28/04/2025 Al: 4/05/2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 82 días

Interventoría: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Nombre del Supervisor: VICTOR HUGO HUERTAS

FRENTE: Parque El Encanto 10-084

Personal Total 4 Oficial: 1 Ayudante: 3

Maquinaria 1 Equipos Herramienta menor

% de avance: 76,33% Fecha entrega 3/06/2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1.-	Se inicia excavacion
2.-	Se realiza nivelacion y conformacion de subrasante
3.-	Se instala sub base
4.-	se instala base
5.-	
6.-	
7.-	
8.-	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN

1.-	Compactacion y sello de la base
2.-	
3.-	

OBSERVACIONES	**FIRMAS**
	CONTRATISTA _____ Nombre **ANDREA RODRIGUEZ** Cargo Director de Obra **INTERVENTORÍA** _____ Nombre **CARLOS ALBERTO ARAMBULA** Cargo R.L INTERVENTORIA

ANEXO 11

OFICIOS DE APROBACIÓN Y RADICADOS

ALCANCE AL RADICADO 2025-601-007440-2 ENTREGA DE DOCUMENTOS COBRO No. 1 - CONTRATO INTERVENTORIA 795 DE 2024

Recibidos ×

Interventoria y construciviles mié, 23 abr, 11:24 a.m.

CORDIAL SALUDO, SE RADICA ALCANCE AL RADICADO 2025-601-007440-2 ENTREGA DE DOCUMENTOS COBRO No....

CDI Engativa mié, 23 abr, 2:49 p.m.

para mi, Leonardo

Traducir al español ×

Buen día,

En atención a su solicitud nos permitimos informar que su comunicación ha sido registrada ante la Alcaldia Local de Engativá, con el siguiente radicado:

Alcaldía Local de Engativa
R No. 2025-601-007841-2
2025-04-23 14:47 - Folios: 2 Anexos: ARC
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERVENTORIA Y CO

ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA– CONTRATO DE OBRA 705 DE 2024

Interventoria y construciviles <iycengativa2024@gmail.com> vie, 25 abr, 11:37 a.m.

para cdi.engativa

Cordial saludo, se radica entrega de programación de obra – contrato de obra 705 de 2024

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



IYCE-795-2024-0...

Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

IYCE-795-2024-019

Señores
CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024
Andrea Rodriguez
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 795 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

ASUNTO: APROBACIÓN PRESUPUESTOS INICIALES – COP 705 DE 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, se permite emitir aprobación de los presupuestos iniciales del contrato de obra No. 705 de 2024 presentado por el CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024 mediante el oficio PAR-OBR-041.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

IYCE-795-2024-020

Señores
CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024
Andrea Rodriguez
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 795 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

ASUNTO: APROBACIÓN PROGRAMACIÓN – COP 705 DE 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, se permite emitir aprobación de la programación del contrato de obra No. 705 de 2024 presentada por el CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024 mediante el oficio PAR-OBR-040.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

ENTREGA PRESUPUESTOS INICIALES – CONTRATO DE OBRA 705 DE 2024

Recibidos ×

Interventoria y construciviles vie, 25 abr, 11:26 a.m.

Cordial saludo, se radica entrega de presupuestos iniciales – contrato de obra 705 de 2024

CDI Engativa vie, 25 abr, 5:59 p.m.

para mi

Traducir al español ×

Buen día,

En atención a su solicitud nos permitimos informar que su comunicación ha sido registrada ante la Alcaldia Local de Engativá, con el siguiente radicado:


Alcaldia Local de Engativa
R No. 2025-601-008082-2
2025-04-25 17:59 - Folios: 15 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERVENTORIA Y CONSTRUCI

ENTREGA INFORMES MENSUALES No. 2 – CIN 795 DE 2024 - INTERVENTORÍA

Recibidos ×

Interventoria y construciviles mar, 29 abr, 4:27 p.m.

Cordial saludo, se radica entrega informes mensuales no. 2 – cin 795 de 2024 - interventoría IYCE-795-2024-023 - ENTREG...

CDI Engativa mié, 30 abr, 4:23 p.m.

para mi

Traducir al español ×

Buen día,

En atención a su solicitud nos permitimos informar que su comunicación ha sido registrada ante la Alcaldia Local de Engativá, con el siguiente radicado:


R No. 2025-601-008316-2

CDI
Alcaldía Local de Engativá
Fecha: 09 MAY 2025
Registro No. 20256010088312
Recibido por:

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2025

IYCE-795-2024-026

Doctor:
VÍCTOR HUGO HUERTAS PRADA
Alcalde Local De Engativá
Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría No. CIN 795 de 2024 - Contrato de obra pública No. COP 705 de 2024

Asunto: ENTREGA DE DOCUMENTOS COBRO No. 1– CONTRATO DE OBRA 705 DE 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S radica en la alcaldía local de Engativá los siguientes documentos con el fin de dar trámite al pago N.° 1 del contrato de obra No. 705 de 2024, dando cumplimiento al contrato en referencia

- Oficio de radicación
- Informe de actividades
- Acta de mayores y menores
- Acta parcial
- Memoria de cantidades
- Certificado pago parafiscales consorcio
- Certificado pago parafiscales grupo romero
- Certificado pago parafiscales empresa de servicios públicos sinergia
- Acuerdo consorcial
- Rut consorcio
- Rut grupo romero
- Rut empresa de servicios públicos sinergia
- Rit

•Pólizas cop 705 de 2024
•Factura
•Resolución de facturación
•Certificación bancaria
•Certificación de cumplimiento

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA
Representante Legal Interventoria y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

Folios: 83

ANEXO 12
PMT APROBADOS

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024**.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
N/A	N/A	CUADRANTE: ENTRE 0.8m y 152.9m AL NORTE de la CL 52A - ENTRE 2.7m y 67.6m AL ORIENTE de la TV 85 IDENTIFICADOR 10-095 (URBANIZACION SANTA CECILIA)	N/A	28-mar-25	27-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE PARQUE PUBLICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
50003262	N/A	CL 52B - KR 78	CL 52B - KR 78A	28-mar-25	27-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO NORTE PARA UBICACIÓN DE VEHÍCULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

Las obras se solicitan con las siguientes observaciones:

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma: 

Nombre: CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024

Director de proyecto: Andrea Rodríguez

Interventoria de la Obra

Firma: 

Nombre: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Representante interventoría: CARLOS ALBERTO ARÁMBULA

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO


Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

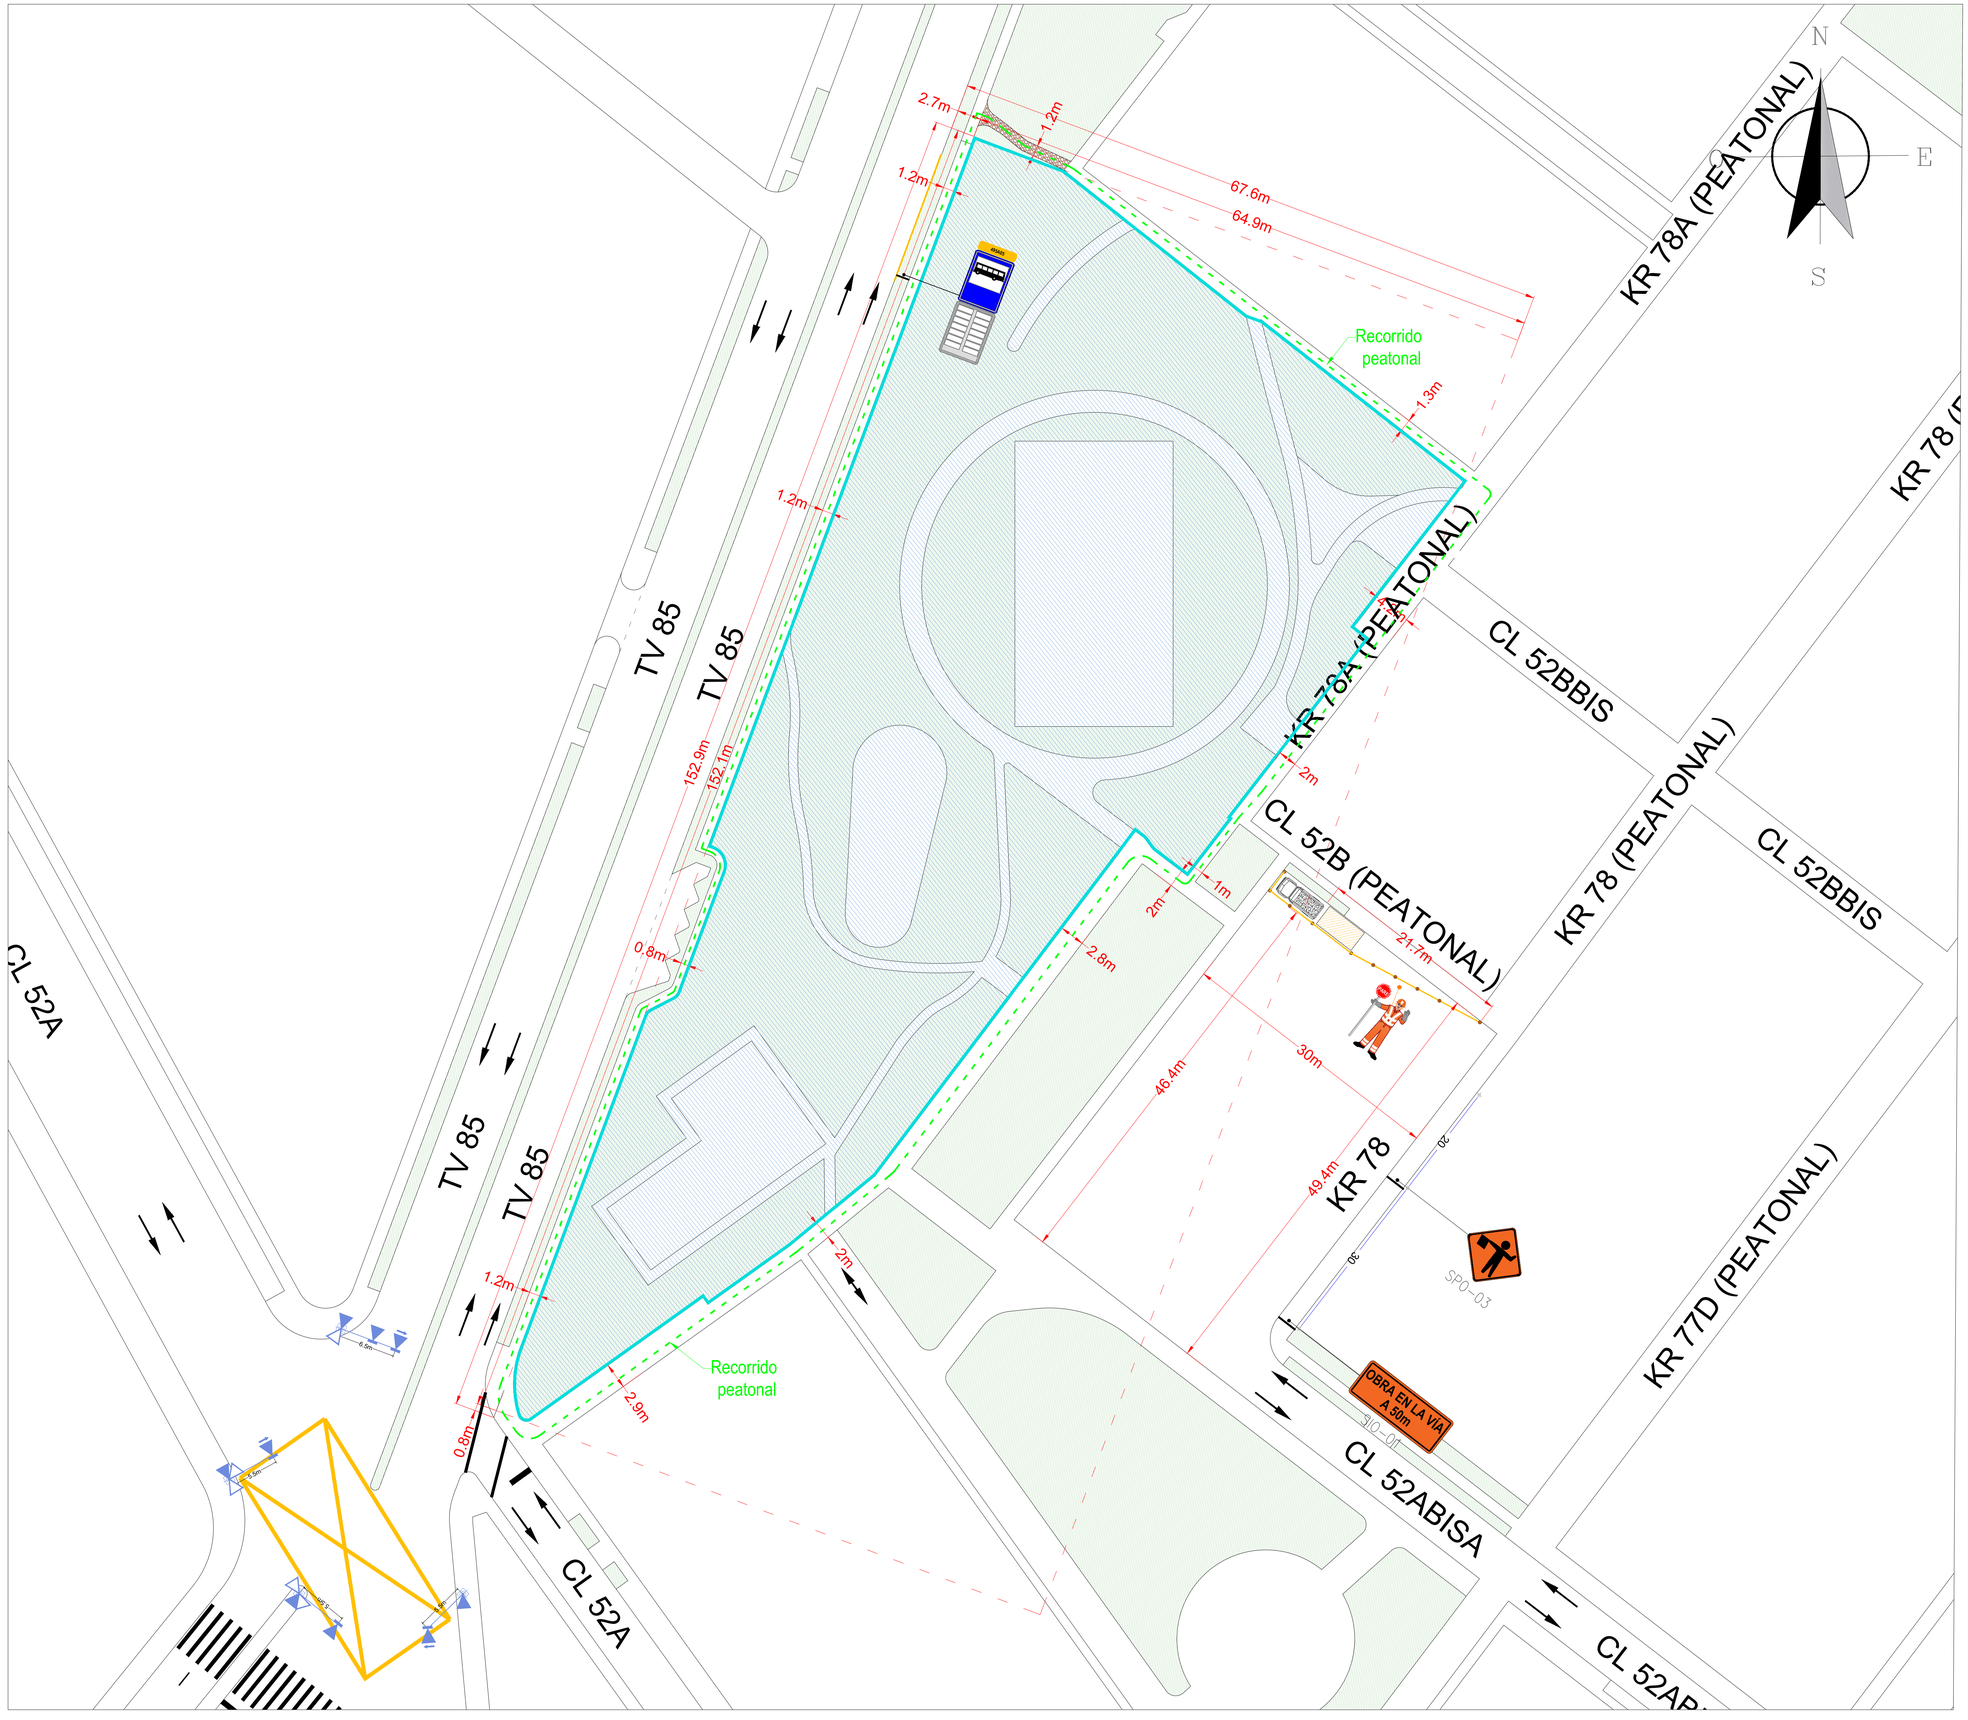

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:

1. CUADRANTE: ENTRE 0.8m y 152.9m AL NORTE de la CL 52A - ENTRE 2.7m y 67.6m AL ORIENTE de la TV 85 IDENTIFICADOR 10-095 (URBANIZACIÓN SANTA CECILIA)
2. CL 52B ENTRE KR 78 Y KR 78A

CIV: 50003262

COSTADO: CUADRANTE Y NORTE

LOCALIDAD: ENGATIVÁ

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
A XXX.m TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	5.5m SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 10 DE MARZO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO
PARQUES PLATINUM
2024

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024**.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
N/A	N/A	CUADRANTE - ENTRE 37.3m y 73m AL NORTE de la CL 63F y ENTRE 18.6m y 42.4m AL OCCIDENTE de la KR 74 IDENTIFICADOR 10-084 (URBANIZACIÓN EL ENCANTO)	N/A	21-mar-25	20-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE PARQUE PUBLICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
10008718	N/A	KR 74A - 98.36m AL NORTE de la CL 63F	N/A	21-mar-25	20-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO ORIENTE PARA UBICACIÓN DE VEHÍCULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

Las obras se solicitan con las siguientes observaciones:

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma: 

Nombre: CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024

Director de proyecto: Andrea Rodríguez

Interventoria de la Obra

Firma: 

Nombre: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Representante interventoría: CARLOS ALBERTO ARÁMBULA

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO


Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

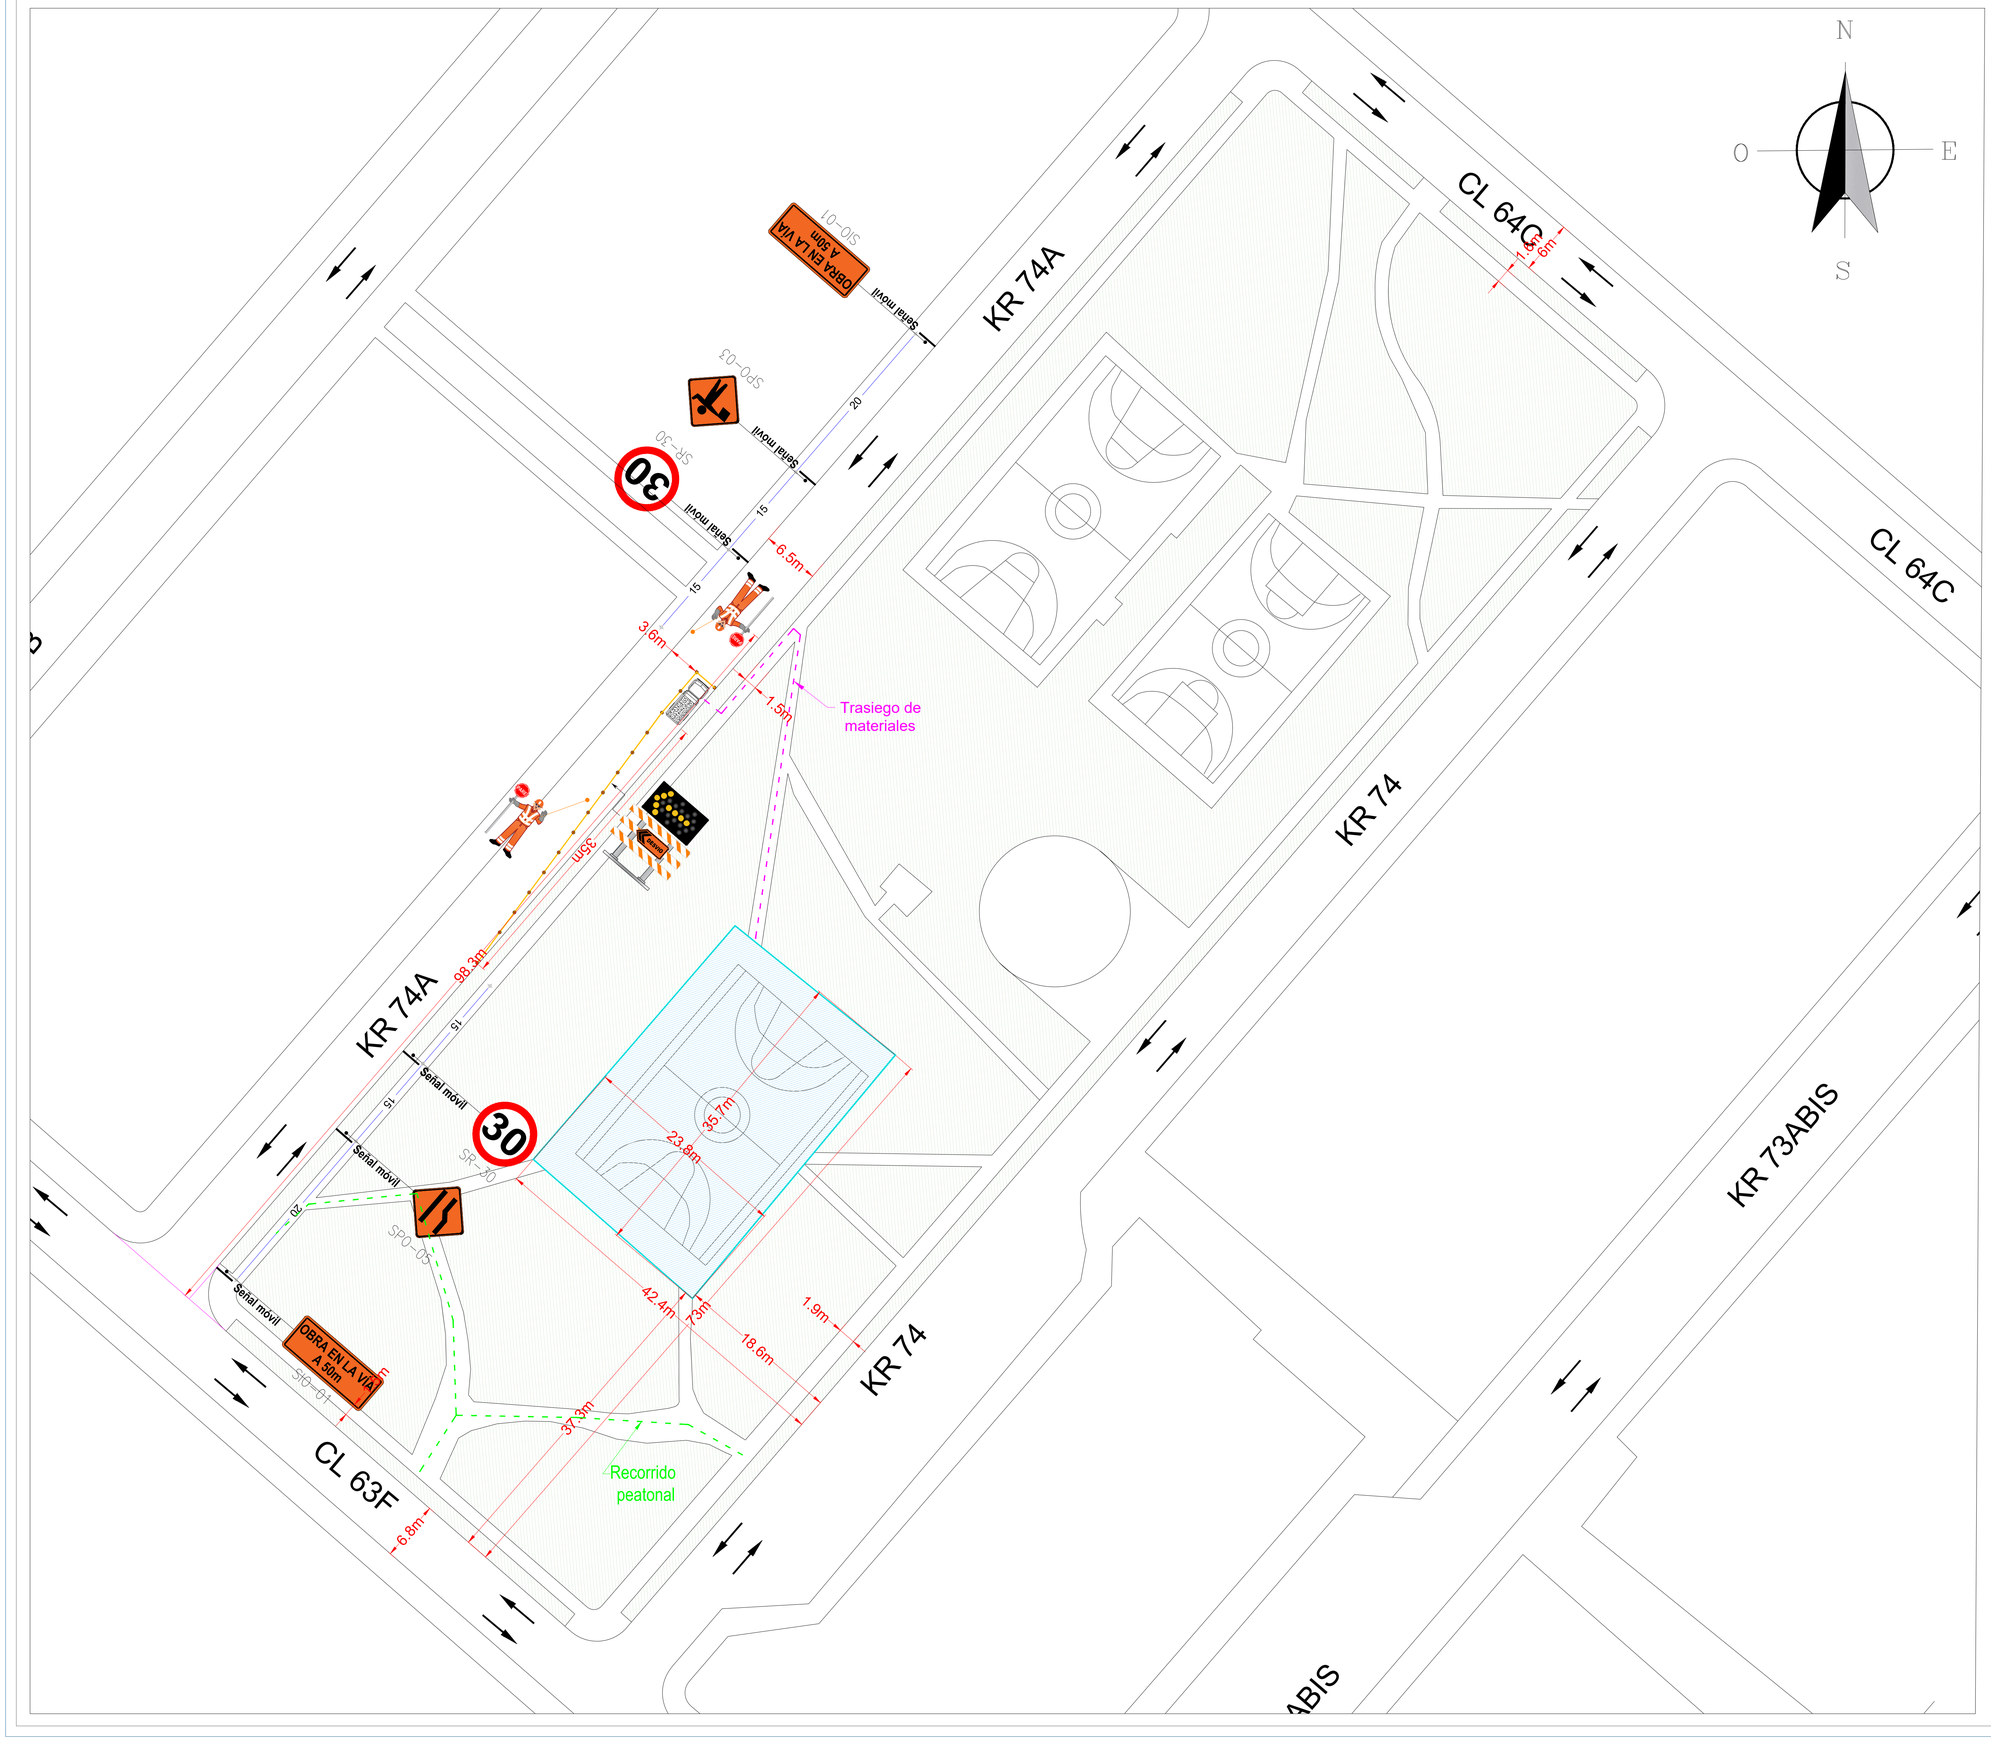

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:

1. CUADRANTE: ENTRE 37.3m Y 73m AL NORTE de la CL 63F - ENTRE 18.6m y 42.4m AL OCCCIDENTE de la KR 74 IDENTIFICADOR 10-084 (URBANIZACIÓN EL ENCANTO)
2. KR 74A a 98.36m AL NORTE de la CL 63F

CIV: 10008718

COSTADO: CUADRANTE - ORIENTE

LOCALIDAD: ENGATIVÁ

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SP0-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SP0-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SP0-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SP0-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 10 DE MARZO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024**.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
N/A	N/A	CUADRANTE: ENTRE 3.1m y 53.2m AL SUR de la CL 74 - ENTRE 2.7m y 51.2m AL OCCIDENTE de la TV 83B IDENTIFICADOR 10-071 (ALMERIA)	N/A	21-mar-25	20-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE PARQUE PUBLICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
10006321	N/A	TV 83B - 74m AL SUR de la CL 74	N/A	21-mar-25	20-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO OCCIDENTE PARA UBICACIÓN DE VEHÍCULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

Las obras se solicitan con las siguientes observaciones:

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma: 

Nombre: CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024

Director de proyecto: Andrea Rodríguez

Interventoria de la Obra

Firma: 

Nombre: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Representante interventoría: CARLOS ALBERTO ARAMBULA

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO


Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

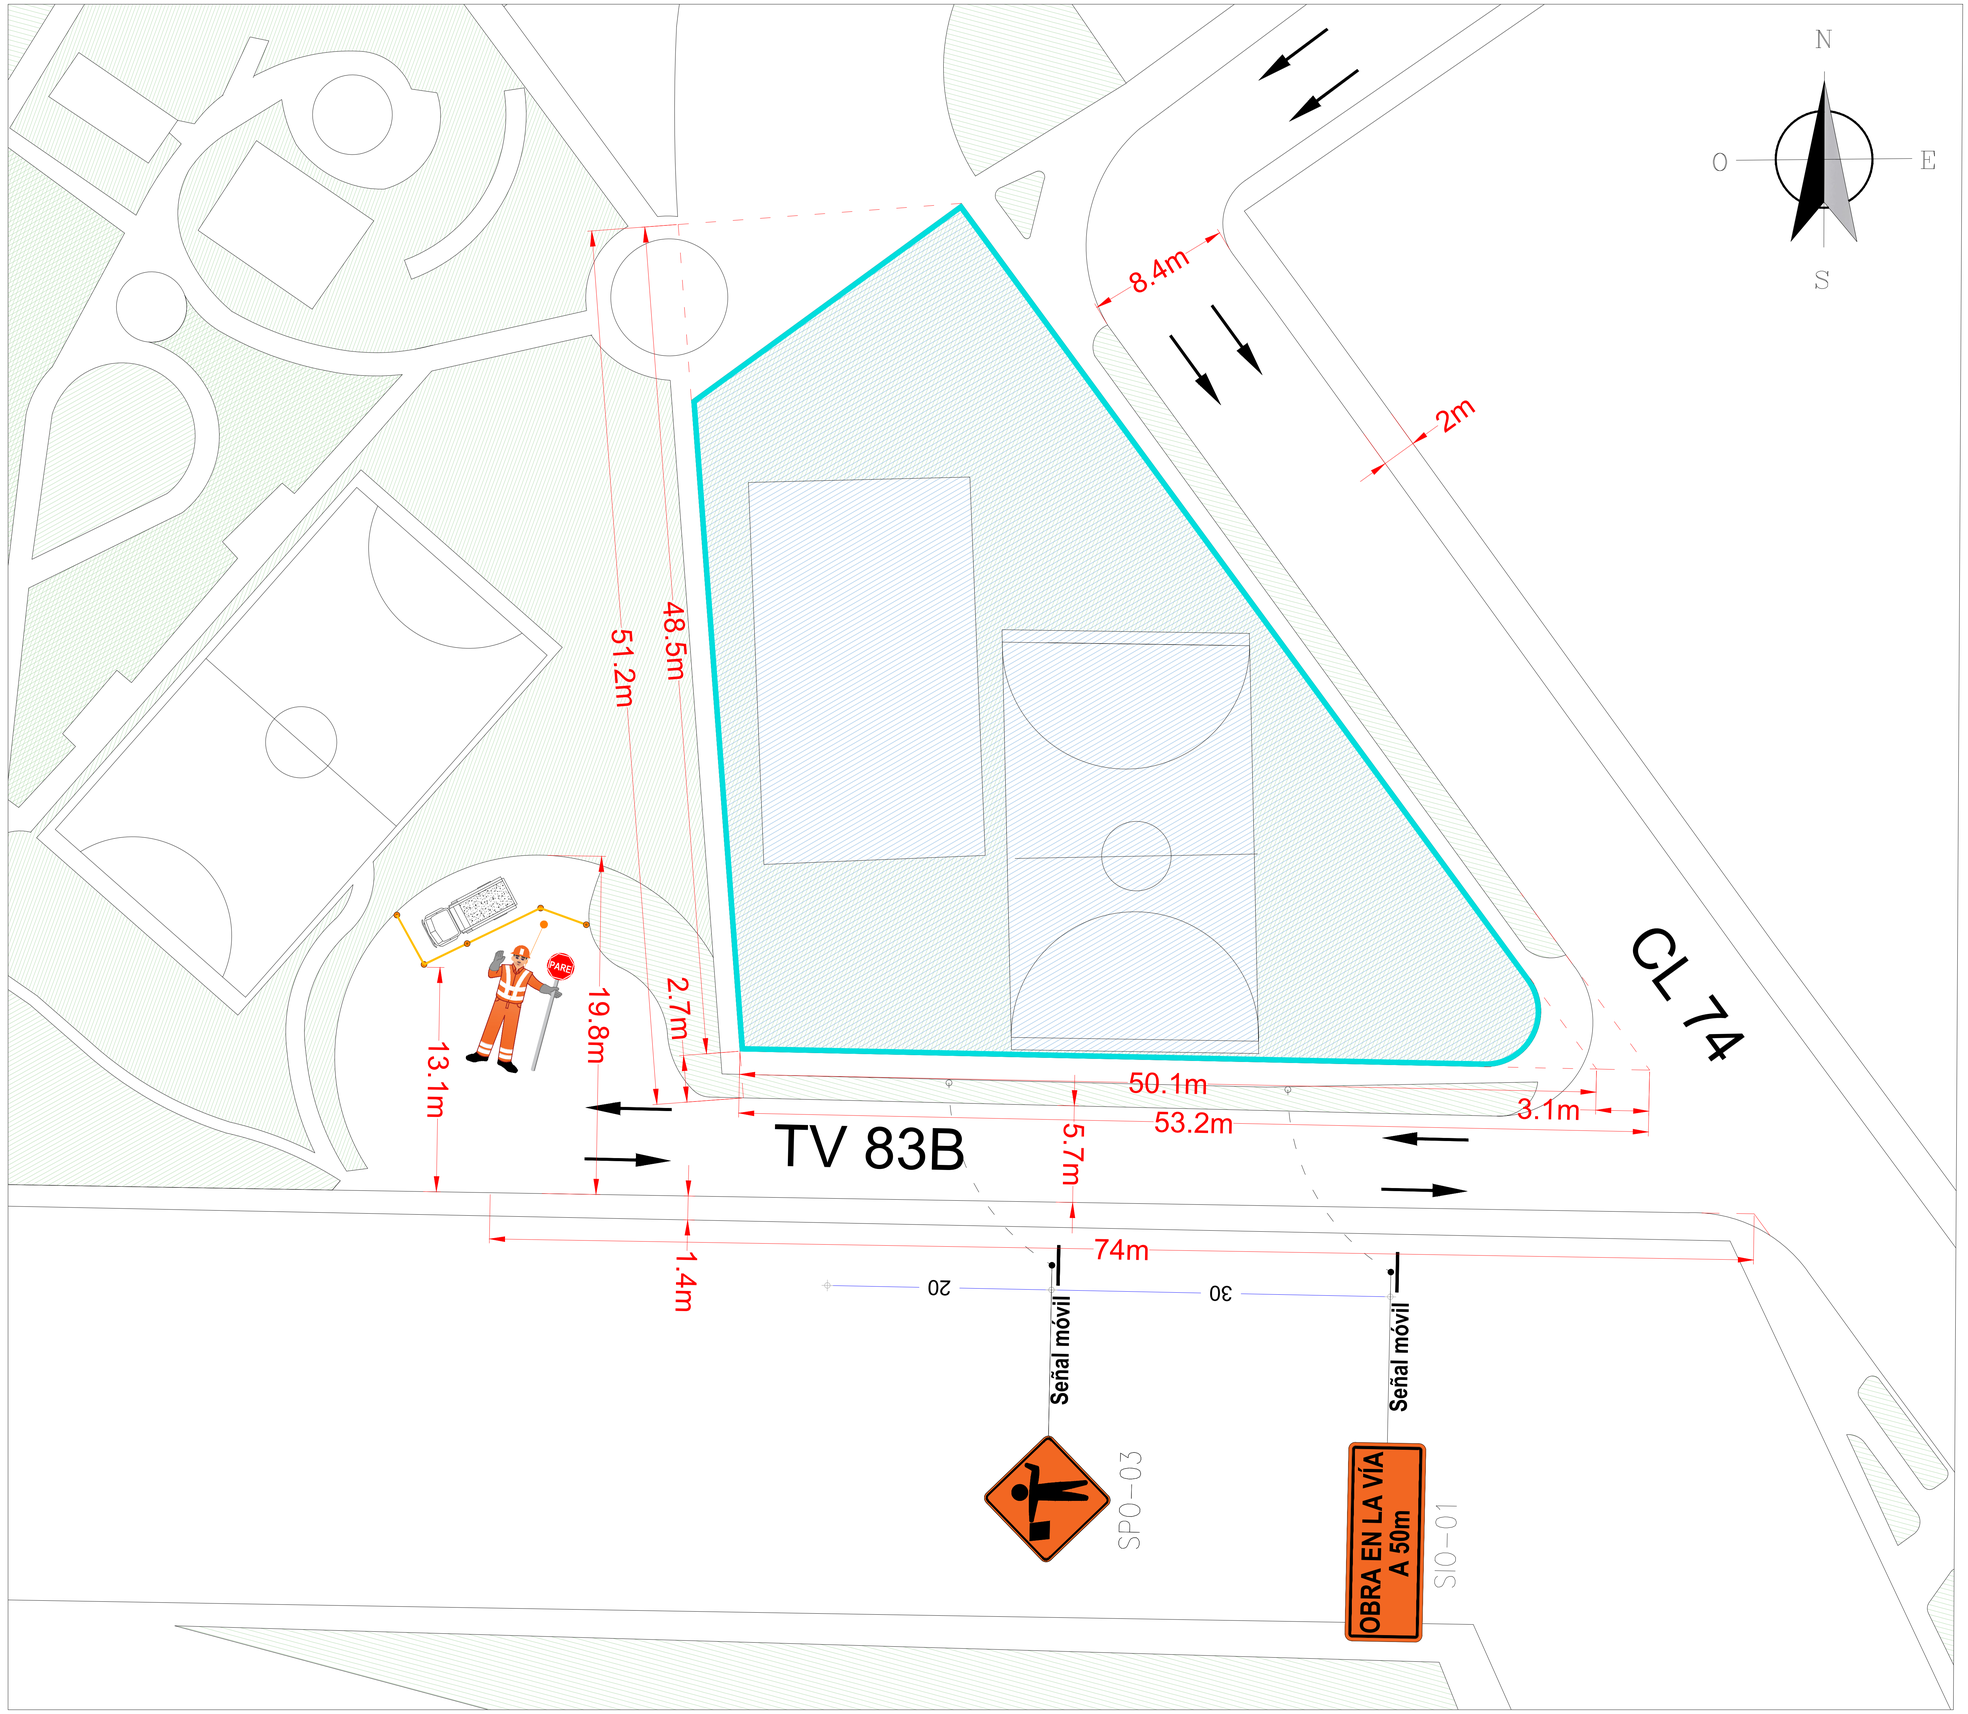

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:

1. CUADRANTE: ENTRE 3.1m y 53.2m AL SUR de la CL 74 - ENTRE 2.7m y 51.2m AL OCCIDENTE de la TV 83B IDENTIFICADOR 10-071 (ALMERIA)
2. TV 83B a 74m AL SUR de la CL 74

CIV: 10006321

COSTADO: CUADRANTE - OCCIDENTE

LOCALIDAD: ENGATIVÁ

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍO	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VIA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRANSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO
PARQUES PLATINUM
2024

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024**.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
N/A	N/A	CUADRANTE 1: ENTRE 8.7m y 37.7m AL OCCIDENTE de la KR 69H - ENTRE 6m y 37.3m AL SUR de la CL 77 IDENTIFICADOR 10-010 (URBANIZACION DEL BARRIO LAS FERIAS)	N/A	28-mar-25	27-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE PARQUE PUBLICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
N/A	N/A	CUADRANTE 2: ENTRE 6.2m y 24.7m AL ORIENTE de la KR 69K - ENTRE 45m y 73.7m AL SUR de la CL 77 IDENTIFICADOR 10-010 (URBANIZACION DEL BARRIO LAS FERIAS)	N/A	28-mar-25	27-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE PARQUE PUBLICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
10007850	N/A	KR 69H - 15m AL NORTE de la CL 75	N/A	28-mar-25	27-may-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	ENGATIVÁ	FDLE-LP-705-2024	CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO OCCIDENTE PARA UBICACIÓN DE VEHÍCULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

Las obras se solicitan con las siguientes observaciones:

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma: 

Nombre: CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024

Director de proyecto: Andrea Rodríguez

Interventoria de la Obra

Firma: 

Nombre: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

Representante interventoría: CARLOS ALBERTO ARÁMBULA

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO


Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

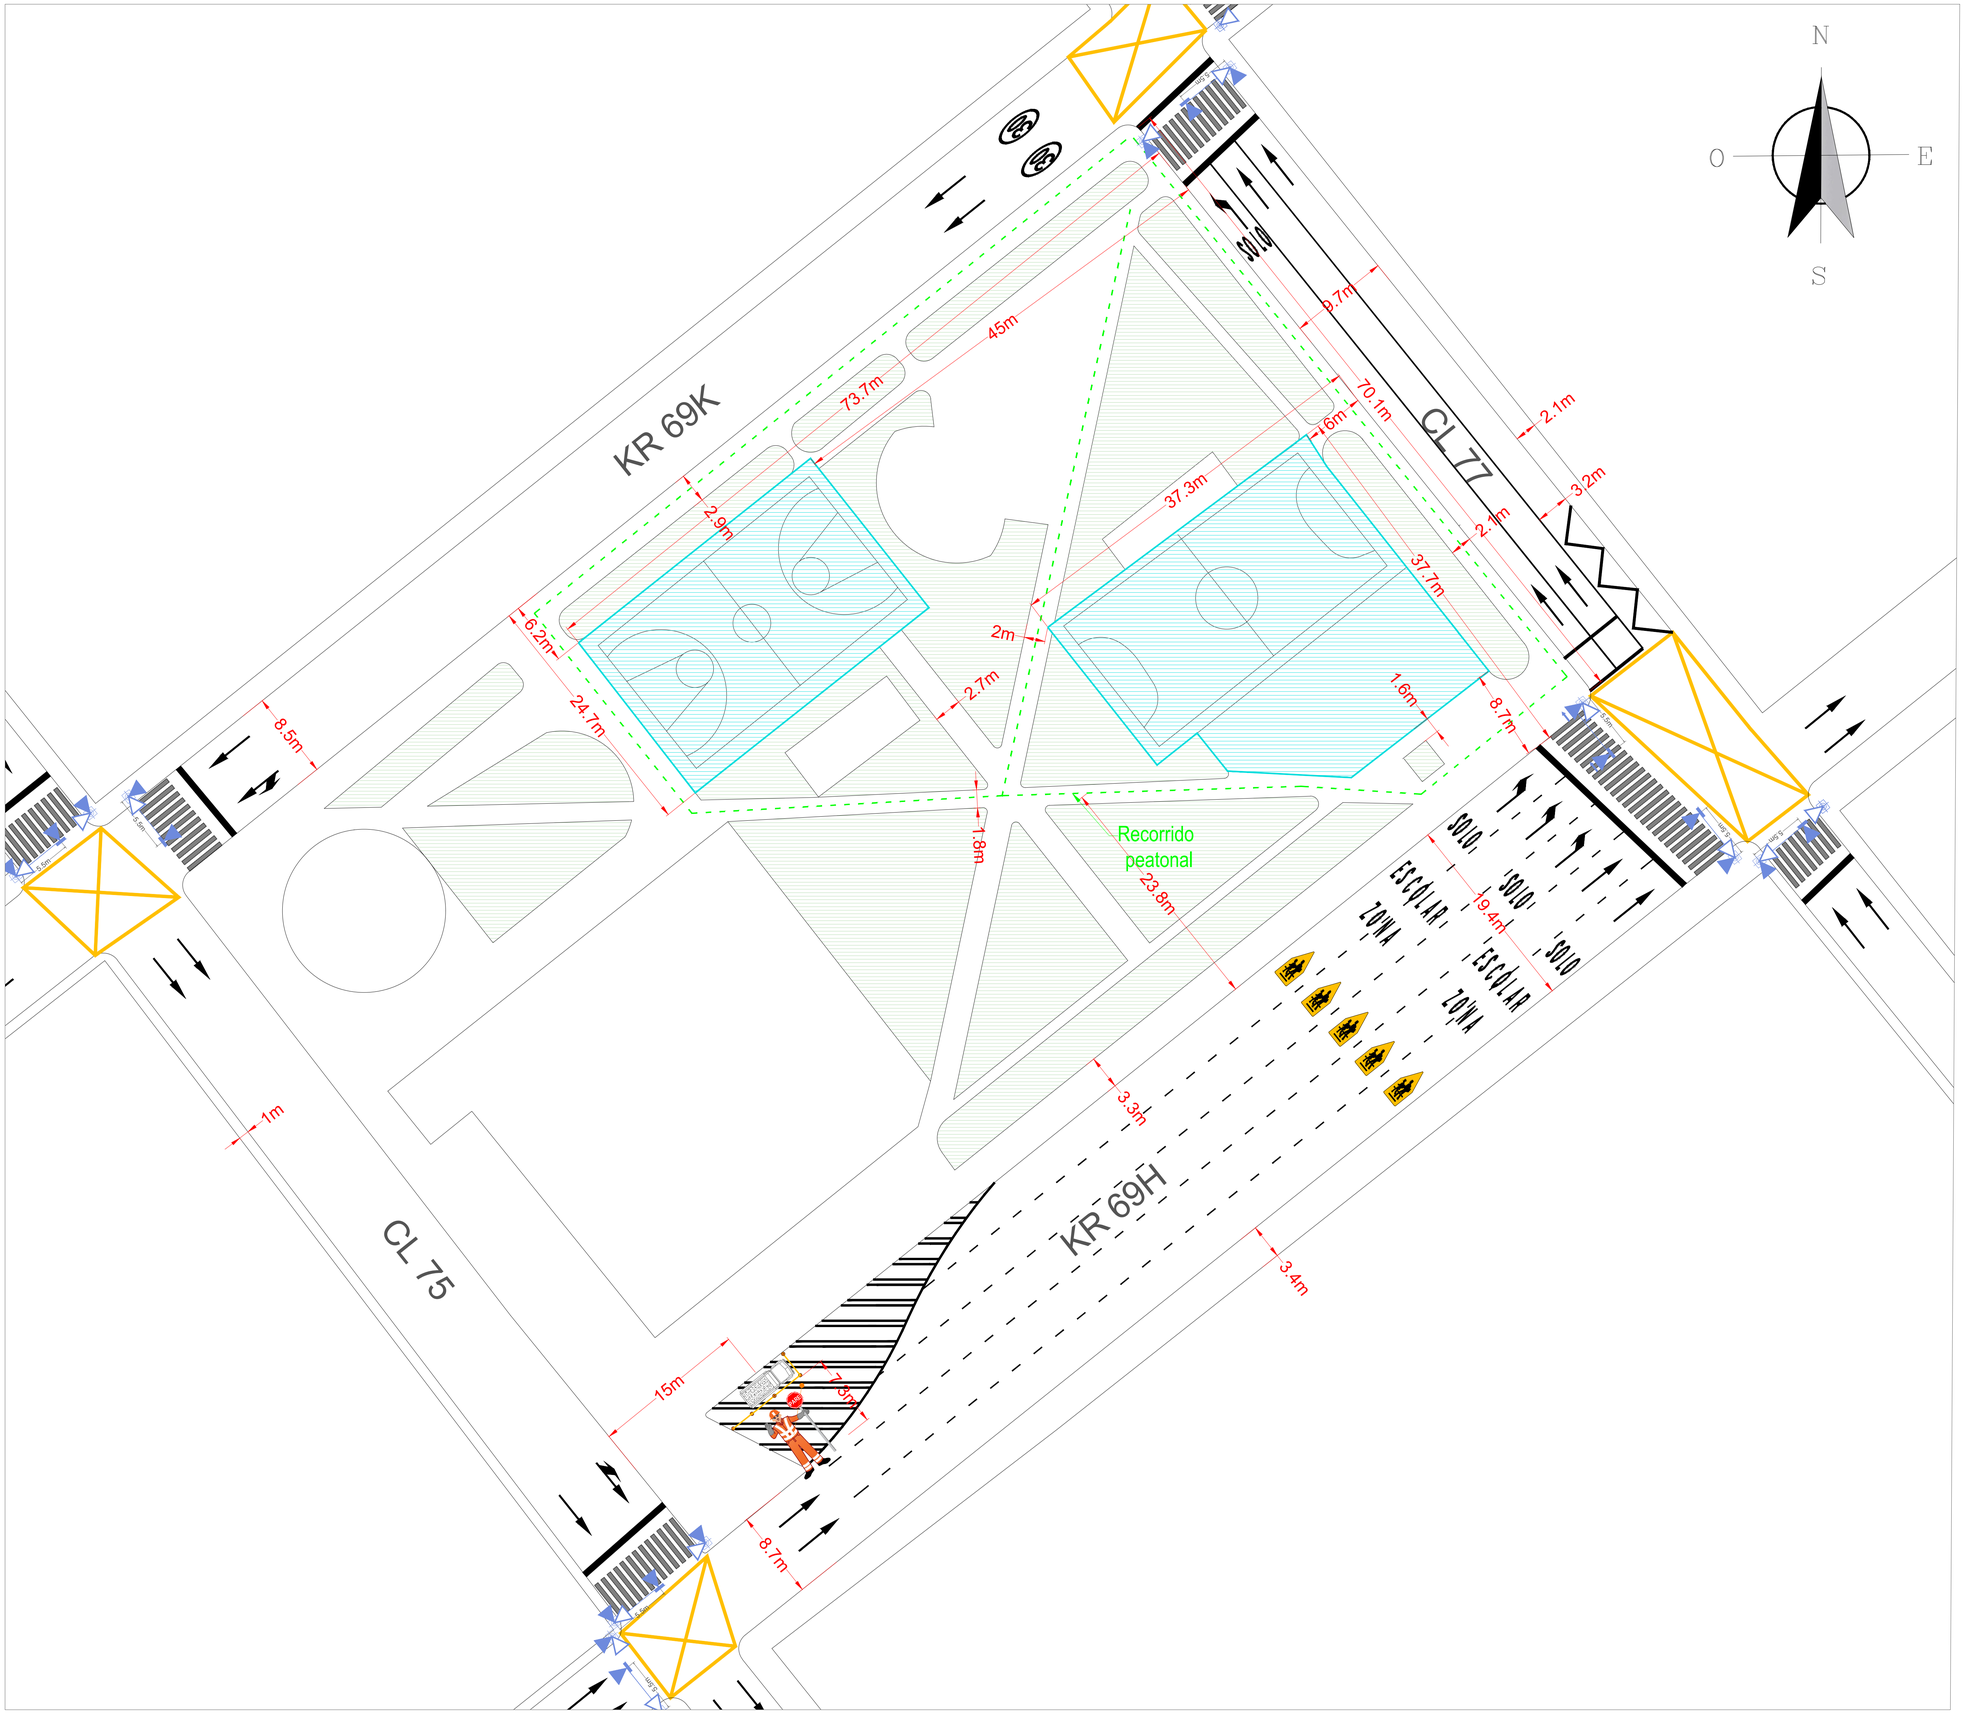

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:

1. CUADRANTE 1: ENTRE 8.7m y 37.7m AL OCCIDENTE de la KR 69H - ENTRE 6m y 37.3m AL SUR de la CL 77
2. CUADRANTE 2: ENTRE 6.2m y 24.7m AL ORIENTE de la KR 69K - ENTRE 45m y 73.7m AL SUR de la CL 77
3. KR 69H a 15m AL NORTE de la CL 75

CIV: 10007850

COSTADO: CUADRANTES - OCCIDENTE

LOCALIDAD: ENGATIVÁ

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 10 DE MARZO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO PARQUES PLATINUM 2024

ANEXO 13
CERTIFICACIÓN DE MATERIALES

ENGATIVA

REMISION MANUAL	
Numero:	RM399
Fecha:	25/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-ESPEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

OTRO ¿Cuál?:

Observación: PAGO DE CONTADO 726,000

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

25 ABR 2025

HORA

Elaborado

Nombre y firma

ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

ENGATIVA.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carréra Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RM-00000402
Fecha: 30/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	**Transportador**	
Contacto:	WHR URBANISMOS SAS	-	
Nit o C.C.:	900931521 **Código:** 900931521	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 80 SUR 42 69	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,000
			Total	14,000

Observación:
PLACA SOB000 FRENTE ENGATIVA; PESO NETO 20.30 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
basculactasur
30 ABR 2025
HORA
ACEPTACION DE SU CONTENIDO

basculactasur	basculactasur	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	19526
Fecha:	3/05/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	RAFAEL URIBE URIBE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

OTRO ¿Cuál?:

Observación: 0 3 MAY 2025 PAGO DE CONTADO 726,000

HORA

LA PUBLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29129
Fecha:	14/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S COTA. SUR

12 ABR 2025

ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29134
Fecha:	14/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR 14 ABR 2025

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	19170
Fecha:	10/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
10 ABR 2025
HORA
ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29087
Fecha:	11/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

OTRO ¿Cual?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
11 ABR 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29039
Fecha:	10/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SQB000

¡OTRO ¿Cual?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA SUR

10 ABR 2025

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

[illegible] RECICLADOS DE COLOMBIA [illegible] S A S
[illegible]
Avenida Carrera [illegible]
BOGOTA D.C
Tel: [illegible] Fax:

REMISION

Número: [illegible]
Fecha: 19/11/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	[illegible]	Transportador	
Contacto:	[illegible]		
Nit o C.C.:	[illegible]	Placa:	Cajas: 3
Dirección:	[illegible]	Conductor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	[illegible]	
Teléfono:		OC Nro	Costo Alt
Fax:			

Item	Mat	Lote	P.M	Cant	Empaque
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total	[illegible]	

Observación:
PLACA [illegible] FECHA ENCUESTA [illegible] PESO NETO 21.71 KG

[illegible]
Recibido
ELABORADO
[illegible]
MORA

Firma:
APROBADO

Firma:
RECIBIDO

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29040
Fecha:	10/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
10 ABR 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	19168
Fecha:	10/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

10 ABR 2025

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29089
Fecha:	11/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

OTRO ¿Cuál?:

Observación: 11 ABR 2025 SIN VALE

HORA

NO TIPLICA ACEPTACIÓN DE LA CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29000
Fecha:	9/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	X
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

OTRO ¿Cuál?

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
09 ABR 2025

HORA

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29114
Fecha:	12/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

OTRO ¿cual?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

12 ABR 2025

HORA

NO REFLEJA ACEPTACIÓN DE SUS

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029267
Fecha: 24/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	**Transportador**	
Contacto:	WHR URBANISMOS SAS	-	
Nit o C.C.:	900931521 **Código:** 900931521	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 80 SUR 42 69	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro**	**Docto.Alt.** **P.V. Nro.** PV-00003658
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,000
			Total	14,000

Observación:
PLACA SRL286 FRENTE ENGATIVA SIN VALE; PESO NETO 20.30 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
basculactasur
ELABORADO
24 ABR 2025
HORA _____
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

basculactasur
APROBADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RM-00000401
Fecha: 30/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS
Contacto:	WHR URBANISMOS SAS
Nit o C.C.:	900931521 **Código:** 900931521
Dirección:	CL 80 SUR 42 69
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador
-
Placa: **Guía:** **Cajas:** 0

Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,000
			Total	14,000

Observación:
PLACA SRL286 FRENTE ENGATIVA; PESO NETO 20.30 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
BTA. SUR
30 ABR 2025
BOGA
...TACION DE SU CONTENIDO

basculactasur	basculactasur	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29179
Fecha:	15/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

15 ABR 2025

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV29128
Fecha:	14/04/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	ENGATIVA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SRL286

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. COTA. SUR 12 ABR 2025 HORA

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028949
Fecha: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	**Transportador**	
Contacto:	WHR URBANISMOS SAS		
Nit o C.C.:	900931521 **Código:** 900931521	**Placa:**	**Guia:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 80 SUR 42 69	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro**	**Docto.Alt.** **P.V. Nro.** PV-00003599
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
[illegible] SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO TEATINAL			M3	[illegible]
			Total	[illegible]

Observación:
PLACA SRL286 FRENTE BOCHICA SIN VALE; PESO NETO 20.30 TN

fragudelo
ELABORADO

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
07 ABR 2025
HORA
NO VALIDA [illegible]

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 19.04.2025 10:12:55
FOLIO: 501695652
PEDIDO: 501695651

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECADOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: SRL286 14542 112000

Observaciones

CEMEX
19 ABR 2025
DESPACHADO

CLIENTE

Usuario :EDIN DAVIDI ORTIZ ANGULO

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A002019-049-2025 Generado el: 2025-04-21**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-21 10:32:24

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Heterogéneo	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rapida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

ENGATIVA

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A002019-050-2025 Generado el: 2025-04-28**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-28 06:43:10

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-045-2025 Generado el: 2025-04-08**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-08 10:34:26

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): EDWAR TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: VALE 6223 NOCHE	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-040-2025 Generado el: 2025-04-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-07 12:05:43

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): EDWAR TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.. **PBT VD A002019-043-2025 Generado el: 2025-04-08**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-08 06:31:06

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rapida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envie una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562. .

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-046-2025 Generado el: 2025-04-08**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-08 10:54:04

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): EDWAR TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-048-2025 Generado el: 2025-04-08**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-08 12:59:31

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): EDWAR TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **CONDUCTOR:** EDWARD JEOVANI TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 1022998642 **PLACA VEHICULO:** SQB000 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-047-2025 Generado el: 2025-04-08**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-08 12:06:13

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): HENRY TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 79669915 **CONDUCTOR:** HENRY TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 079669915 **PLACA VEHICULO:** SRL286 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A002019-042-2025 Generado el: 2025-04-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-07 15:40:57

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** HENRY TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 079669915 **PLACA VEHICULO:** SRL286 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-044-2025 Generado el: 2025-04-08**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-08 10:00:58

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): WHR URBANISMOS SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 900931521 **CONDUCTOR:** HENRY TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 079669915 **PLACA VEHICULO:** SRL286 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACION DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002019-041-2025 Generado el: 2025-04-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-04-07 12:40:59

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): HENRY TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 79669915 **CONDUCTOR:** HENRY TALERO **NO DE IDENTIFICACION:** 079669915 **PLACA VEHICULO:** SRL286 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**WHR URBANISMOS SAS **NIT:** 900931521 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ENGATIVA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante: **20104** Placa: **TSV058** Tipo Vehiculo: **DOBLE**

Empresa:

Conductor: **11253589** **MANUEL CASTRO**

Unidad: **KG** Producto: **MD-10**

Fecha Entrada:	23/04/2025	Hora Entrada:	5:14:00 a. m.	Peso Entrada:	12,380
Fecha Salida:	23/04/2025	Hora Salida:	6:41:00 a. m.	Peso Salida:	39,460
				Peso Neto:	27,080
Remisión Ent.:	123	Remisión Sal.:	55575	Cubicos:	15,213.48 M3
Origen:	BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.-CIUDAD		
Destino:	BOGOTA D.C.		BOGOTA		

Observaciones: **CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024**

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	20105	Placa:	IDA673	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:					
Conductor:	79351353	HUMBERTO QUINTERO			
Unidad:	KG	Producto:	MD-10		
Fecha Entrada:	23/04/2025	Hora Entrada:	5:19:00 a. m.	Peso Entrada:	12,230
Fecha Salida:	23/04/2025	Hora Salida:	7:26:00 a. m.	Peso Salida:	38,210
				Peso Neto:	25,980
Remisión Ent.:	123	Remisión Sal.:	55576	Cubicos:	14,595.51 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA			

Observaciones: CONSORCIO PARQUE PLATINUN 2024

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS

830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR

Teléfono: 3052936105

Comprobante:	20109	Placa:	EYY230	Tipo Vehiculo:	SENCIILO
Empresa:	901892537	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024			
Conductor:	79669639	LUIS VILLARRAGA			
Unidad:	KG	Producto:	MD-10		
Fecha Entrada:	23/04/2025	Hora Entrada:	7:02:00 a. m.	Peso Entrada:	7,680
Fecha Salida:	23/04/2025	Hora Salida:	7:50:00 a. m.	Peso Salida:	21,360
				Peso Neto:	13,680
Remisión Ent.:	123	Remisión Sal.:	55577	Cubicos:	7,685.39 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA			
Observaciones:					

ANDRES CAMARGO

Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	20113	Placa:	VEQ839	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	901892537	CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024			
Conductor:	1073519239	BRAYAN DIAZ			
Unidad:	KG	Producto:	MD-10		
Fecha Entrada:	23/04/2025	Hora Entrada:	8:02:00 a. m.	Peso Entrada:	11,810
Fecha Salida:	23/04/2025	Hora Salida:	9:12:00 a. m.	Peso Salida:	37,960
				Peso Neto:	26,150
Remisión Ent.:	006	Remisión Sal.:	55580	Cubicos:	14,691.01 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-ENGATIVA			
Observaciones:					

JF3
Jose Feliz

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

Powered by CamScanner

ANEXO 14
ACTAS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Seguimiento y Visita de obra al COP 705-2024 / CIN 795-2024.

Fecha: 29 Abril 2025.

Hora de inicio: 8:00

Hora de finalización: 10:30

Modalidad: X Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

Lugar: Urg. Las Ferias, Elencanto y Santa Cecilia.

Dependencia: Infraestructura. ALE.

Nombre del Responsable:

	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
1		1104889889	Jose leonardo feriz	Leo	Consorcio Parques Platinum			X							ing.jleonardo@gmail.com	
2		1015446704	Sebastian Torres	Sebas	Interventoría			X							——— " ———	
3		80037888	Juan P. Gomez	—	Interventoría			X						X	———	
4		1000166728	Laura Camila Torres	Laura	Consorcio Parques Platinum				X						———	
5		80206657	Leonardo Hernández	—	Infraestructura ALE			X						X	leonardo.hernandez@gobiernobogota.gov.co	
6		52735151	Patricia Supelano	Pato.	Consorcio Parques Pl.			X						X	Ambiental para	
7		1033682834	Alexandra Bertión	Alexa	consorcio Parques Plat			X						X	—	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 29 de Abril de 2025, siendo las 8:00 am se da inicio al comité de obra del contrato Nº 305 de 2024. Avance de obra: 15%.
Este día se realizó recorrido de obra por los parques:

1. LAS FERIAS:

* Cuenta con cerramiento en el parque infantil para mantenimiento, paso chip.
* Se debe construir una caja en el anden que limita con la cancha, costado noroccidental (frente al hostal las ferias.
* Contratista informa que las máquinas de torre de sentadillas y la torre de pecho plano están en muy mal estado y que solo el mantenimiento no garantiza un adecuado funcionamiento.
* Mantenimiento de cancha de microfutball se inicia en la semana comprendida entre el 05 y el 10 de mayo 2025, según programación.
* Pintura de los biosaludables. pendiente.
* Cerramiento parque con TV-85 (Parque infantil).

2. PARQUE EL ENCANTO:

* Cuenta con cerramiento en área de intervención
* Inicio de obra con excavación en la sobrasante, el material existente no servia ya que era muy plástico, por este motivo se retiro.
* FDLE: Solicita instalación de carpeta asfaltica de mayor resistencia cumpliendo con los lineamientos de IDRD (7 cm).
* Pendiente verificar niveles.

3. SANTA CECILIA:

* Cuenta con cerramiento en área de intervención
* Se solicita protección de los árboles que estan dentro del cerramiento.
* Se evidencia asfalto en cancha y construcción de 125 mts de cinderes.
* Se debe ampliar anden de acceso al salón comunal, 1.20 mts a 1.40 mts
* Construir anden del costado norte de la cl 52 bis A con TV. 85. hasta donde va el adoquín.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

* Se debe reparar anden hasta donde este afectado, costado norte, cerca al paradero 495 A05.
* Los APOS recibieron observaciones, estas deben ser atendidas de manera rapida.
* El FDLE pide solicitar acentar el 05 mayo 2025.

Social:

* No se han recibido PQD'S.
* Se han respondido correos con sugerencias y preguntas de la comunidad del parque santa cecilia
* Pendiente radicar actas de ceaindad.
* Comunidad (comité civico de Santa Cecilia) solicitó reunión de seguimiento del contrato, esta será atendida el Jueves 05 de mayo de 2025 a la 10:00 am en el parque Santa Cecilia. llevar claras las solicitudes que generen esta reunión.
* No se evidencia instalación de vallas en 3 parques.

SST - AMBIENTAL: Mejorar protección individuos árboreos.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Proteger árboles en zonas de intervenación	Contratista	inmedito.
2	Radicar oventas	contratista Interventoría.	05/05/2025.
3.	Asistir a reunión comunitaria el 05/05/2025 Santa. cecilia.	FDLE-contratista-e interventoría	05/05/2025.
4	Instalación vallas informativas / mantenimiento PSI	Contratista	05/05/2025.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner
