	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 13 de octubre de 2025	**SEMANA No.**	**28**	DEL	**6-oct-25**	AL	**12-oct-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	194 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	194 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizo tramo de prueba en el Municipio de Cabrera cundinamarca entre las abscisas K10+700 al K11+700 para este tramo de prueba se realizaron las siguientes actividades.
1. Se realizo transporte, extendida y compactacion de material remanente.
2. Se realiza distribucion de cemento segun dosificacion del diseño. para los 100m del tramo de prueba.
3. Se realiza escarificacion a suelo existente a una capa de 15 cm de espesor.
4. Se realiza homogenisacion del material remanente junto con el cemento y la capa de suelo existente.
5. Se realiza la preparacion del quimico diluio con el volumen de agua segun diseño.
6. Se realiza aplicacion del quimico diluido con agua sobre el material homogeneizado.
7. Nuevamente se realiza homogeneizacion del material con el producto quimico.
8. Se extiende el material y se compacta.
9. Se toma muestra de laboratorio "Briquetas para el ensayo de conpresion inconfinada"

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	75,93%	12,10%	-63,83%
Durante el periodo	1,79%	0,00%	-1,79%
Acumulado Actual	77,71%	12,10%	-65,61%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	194,00	80,00	-179,78

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

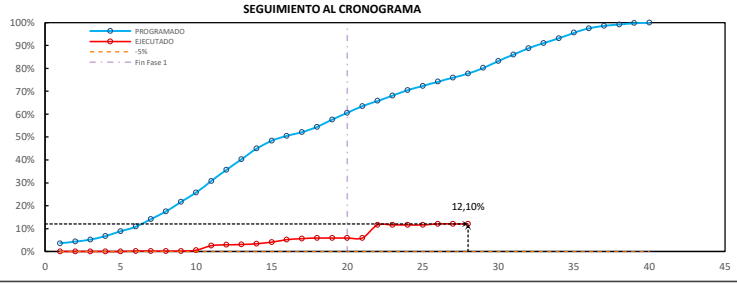

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 17.435.341.229,00	$ 1.714.425.463,33	5,32%
Durante el periodo	$ 1.483.287.810,00	$ 1.852.036,67	0,01%
Acumulado Actual	$ 18.918.629.039,00	$ 1.716.277.500,00	5,32%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 17.202.351.539

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

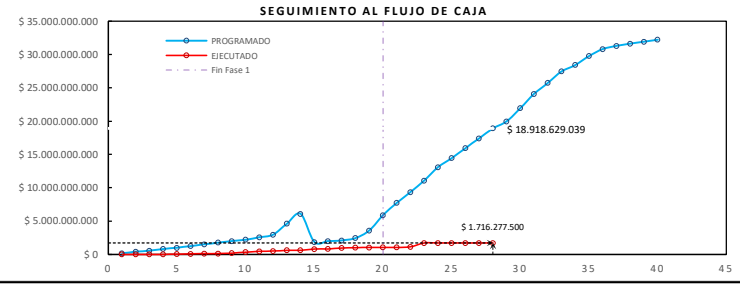


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4.916.182.932	#N/D	0%
Durante el periodo	$ 491.400.936	#N/D	0%
Acumulado Actual	$ 5.407.583.869	#N/D	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

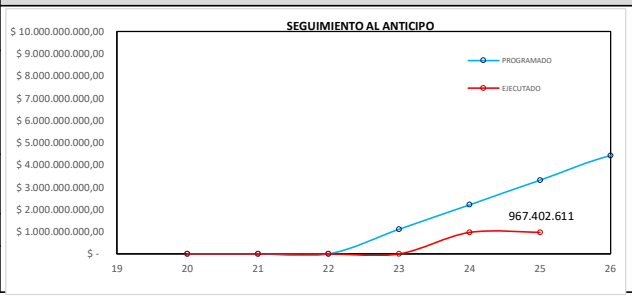

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada se realizaron las siguientes actividades:

- Se remite al Contratista el comunicado 25C02_DTO_156 del 02 de octubre de 2025, solicitando un recorrido ambiental con el fin de verificar diferentes aspectos del área.
- El 03 de octubre de 2025 se realiza acompañamiento al Comité de seguimiento de manera virtual a partir de las 3:00 pm, en compañía del ICCU, la Interventoria y el Contratista. Desde el componente ambiental se mencionan los comunicados remitidos al Contratista para solicitar el cumplimiento del PAGA previo al inicio de obras, el concepto sobre ocupación de cauce en las provincias de Alto Magdalena y Tequendama, y la entrega del Plan de Contingencia de acuerdo a los productos químicos a aplicar, entre otros aspectos.
- Revisión de la documentación de la cantera La Colina, remitidos por parte del Contratista por medio del comunicado CVG – ICCU –OF-0193-2025 del 01 de octubre de 2025
- Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 6 al 12 de octubre de 2025, fueron remitidas las observaciones al informe social mensual del contratista para que fueran atendidas. Por otro lado, la supervisora social del ICCU, Alexandra Martínez, presentó a la profesional Lida Rey, quien también apoyará el proceso de supervisión.

En el espacio de comité técnico del 9 de octubre de 2025, se acordó que el contratista de obra sectorizaría y priorizaría los tramos a intervenir, teniendo en cuenta las zonas con mayor presencia de comunidad. Esta actividad deberá contar con la presencia del alcalde municipal o del delegado que este asigne. Una vez se socialicen los resultados de esta gestión, el equipo social realizará las actividades correspondientes desde su componente.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, en las que se recibieron y revisaron las planillas de pago correspondientes al mes de agosto, verificando su consistencia y cumplimiento normativo. Se participó en el comité de obra, espacio en el que se revisaron avances, se analizaron aspectos técnicos y se concertaron acciones para optimizar la ejecución de actividades de prueba en los proximos dias. Así mismo, el contratista entregó los planos de las instalaciones provisionales, los cuales fueron recibidos como insumo fundamental para la planeación y el inicio de actividades en campo. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación con el contratista y garantizar el orden administrativo previo a las siguientes fases constructivas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 28 el contratista presenta un avance fisico del contrato del 12.10% vs un programado fisico del 77.71%.
* Para la presente semana 28 segun programacion de obra el contratista debio iniciar actividades correspondientes la fase 2 de ejecucion de obra con actividades de (Preliminares, Explanacion y excavaciones replanteo de vias, Muros, PMT, PAGA)

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Para la semana 28 el contratista demostro disponibilidad de recursos economicos para el desarollo del objeto contractual teniendo en cuenta que ya dispone con maquinaria y equipos.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 28 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $18.918.629.039 vs un acumulado ejecutado de $1.716.277.500 por lo que se presenta un atraso de $17.202.351.539

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista para el tramo de prueba no dio cumplimiento a la calidad de los trabajos segun lo evidenciado en el oficio 25co2_DTO_161

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**FECHA PROGRAMADA**	**RESPONSABLE**
Elaborar y entregar resultados completos de los ensayos y pruebas para caracterización.	02 de julio de 2025 8 (incumplido) se fija nuevamente entrega en próximas semanas (17 de octubre de 2025, urgente)	CONSORCIO VICGER 2021
Definir especificación particular para estabilización con fisuramiento y condiciones de garantía.	Después de recibir resultados de laboratorio tramo de prueba	CONSORCIO VICGER 2021
Iniciar tramo de prueba piloto de 100 metros para validar proceso constructivo y materiales, en el municipio de cabrera	Miercoles, 8 de octubre de 2025	CONSORCIO VICGER 2021
Autorización y ejecución del conteo de tráfico en días típicos y atípicos para análisis de impacto en el municipio del colegio	Lunes, 05 de octubre de 2025.	CONSORCIO VICGER 2021
Definir metodología de recibo con LWD (deflector dinámico de carga) para evaluación de compactación.	Durante tramo de prueba	CONSORCIO VICGER 2021
Establecer y aprobar procedimientos para mantenimiento y supervisión de fisuramientos.	Durante tramo de prueba	CONSORCIO VICGER 2021
Establecer y aprobar procedimientos para mantenimiento y supervisión de fisuramientos.	Durante tramo de prueba	CONSORCIO VICGER 2021

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alejandro Rodríguez
