INFORME EJECUTIVO PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

UNION TEMPORAL SAN DIEGO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2025


Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Imagen 1.UBICACION FRENTES DE OBRA Lote 2

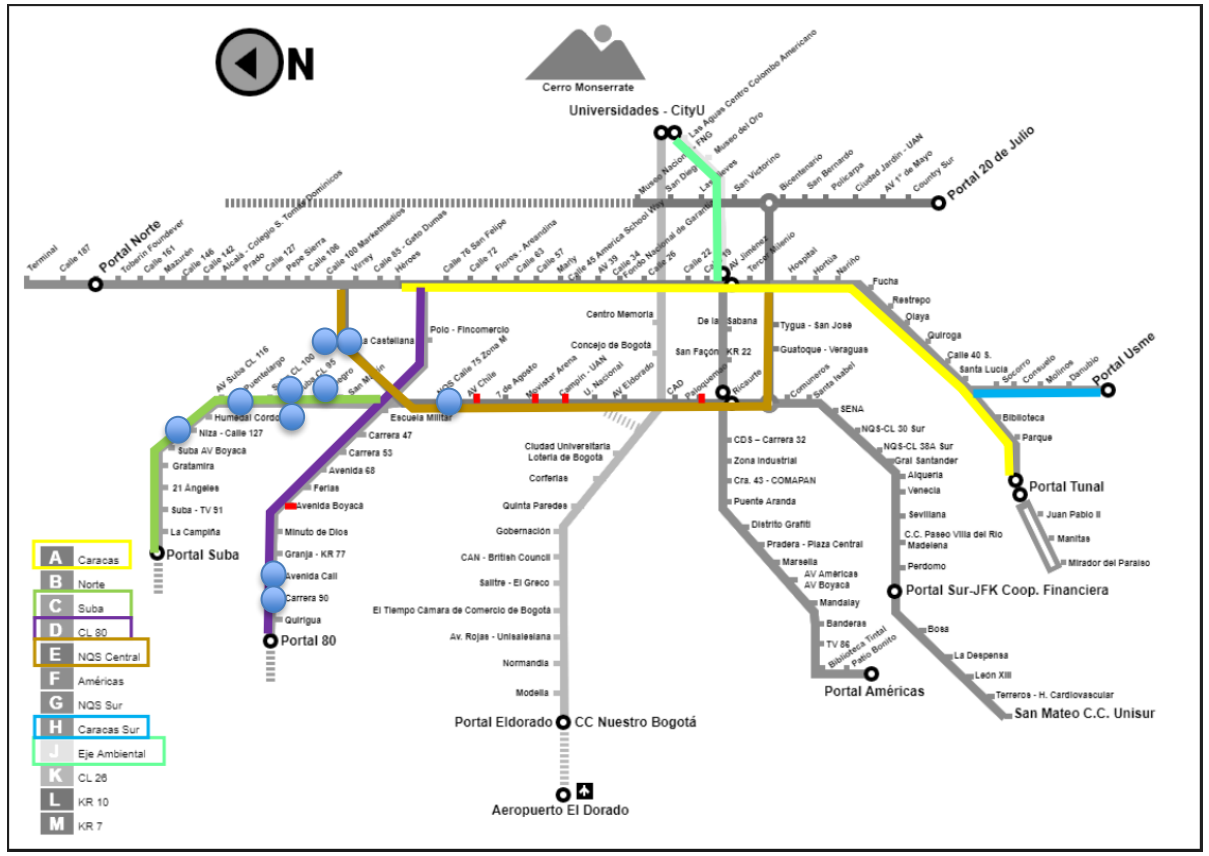

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.


MET-02	1381-L2-005	NQS CENTRAL -E	LA CASTELLANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
289,67	289,67	100 %


ANTES



DURANTE

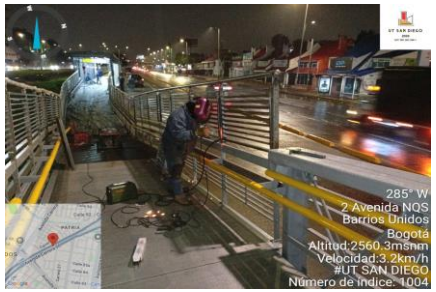

DESPUES

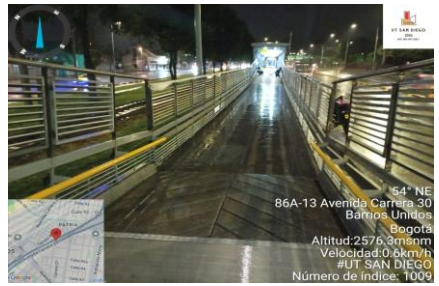

Se realiza la instalación de el realce de la celosía metálica en la transición en los costados occidental y oriental de la Estación; de igual manera se ejecuta el realce en los accesos a el puente peatonal en los dos costados.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025


MET-02	1381-L2-011	NQS CENTRAL - E	CALLE 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
145,23	145,23	100%

ANTES

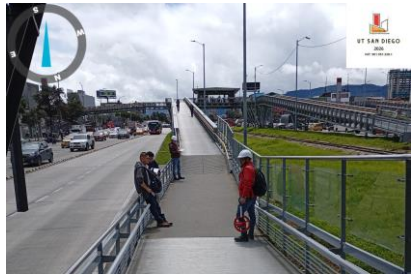

DURANTE

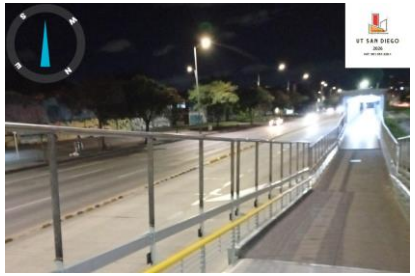

DESPUES



Se ejecuta el realce de la celosía metálica en la transición

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

MET-08	1381-L2-012	NQS CENTRAL -E	LA CASTELLANA	CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGÓN SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSÍAS NECESARIAS	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
47,52	47,52	70%

ANTES



DURANTE



DESPUES







Se realiza el cambio de modulación del vagón articulado a biarticulado en los dos costados de la Estación desmontando las celosías existentes instalando nuevas con las distancias para que se cumpliera con la funcionabilidad de los buses biarticulados instalando estribos de aproximación, desmontando y modificando los apoyos isquiáticos de los vagones, instalando señalización y las estructura para las banderolas de aproximación

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.


MET-02	1381-L2-013	SUBA - C	SUBA-CALLE 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
74,12	74,12	100%


ANTES



DURANTE

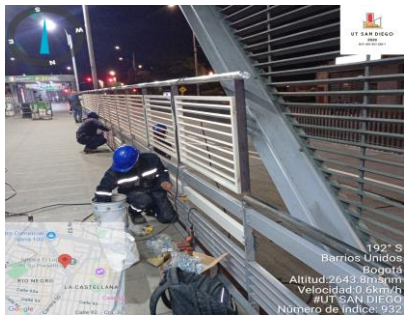

DESPUES

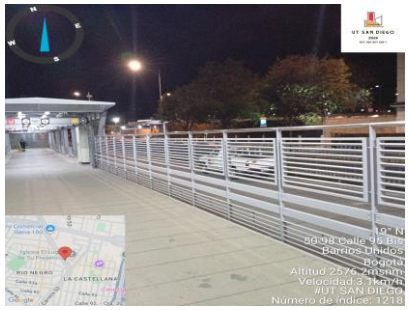

Se realiza la instalación del realce en la transición o pasarela de la Estación.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.


MET-02	1381-L2-014	SUBA - C	PUENTE LARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
71,58	71,58	100%


ANTES



DURANTE

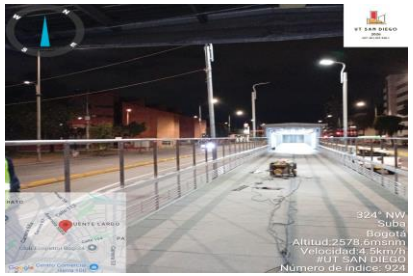

DESPUES

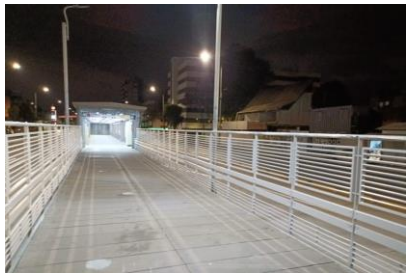

Se realiza la instalación del realce en la transición o pasarela de la Estación.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025


MET-02	1381-L2-015	SUBA - C	NIZA 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
74,17	74,17	100%


ANTES



DURANTE

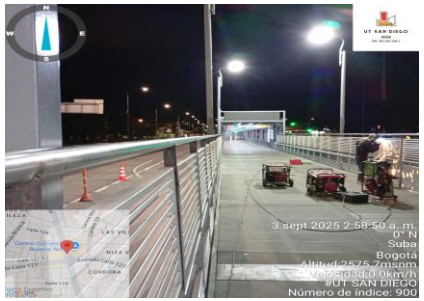

DESPUES

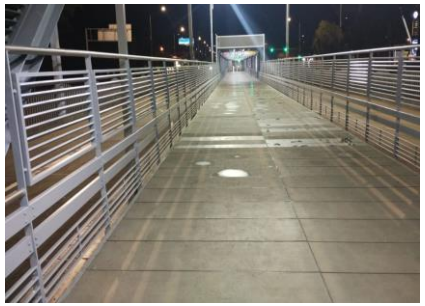

Se realiza la instalación del realce en la transición o pasarela de la Estación.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.


MET-02	1381-L2-016	SUBA - C	RIONEGRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
72,20	72,20	100%

ANTES

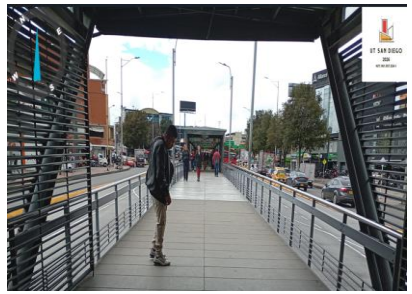

DURANTE

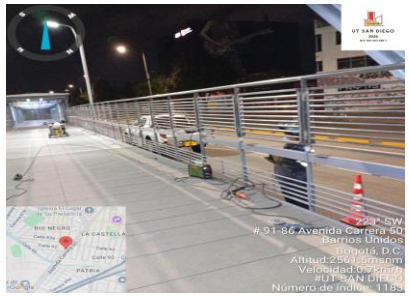

DESPUES



Se realiza la instalación del realce en la transición o pasarela de la Estación.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

MET-04	1381-L2-019	CALLE 80 - D	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
14,42	14,42	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se realiza la instalación de puertas abatibles en celosía metálica con pasadores en los vanos designados

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

MET-04	1381-L2-020	CALLE 80 - D	AVENIDA CALI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
14,36	14,36	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se realiza la instalación de puertas abatibles en celosía metálica con pasadores en los vanos designados

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

MET-03	1381-L2-021	SUBA - C	SUBA-CALLE 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	100%

Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
277,5	277,5	100%


ANTES



DURANTE



DESPUES

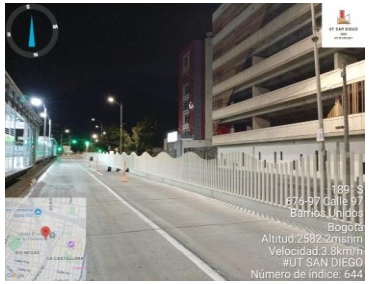



Se implementa PMT se realiza la demolición de los tope llantas o separadores viales y se instala cerramiento tipo onda efectuándose el vaciado en concreto acelerado de la viga la cual se dilata cada junta y se instala la señalización con el chebrón y cintas reflectivas en los costados oriental y occidental de la Estación

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.






MEDICION DE ESPESORES




CONTROL DE PERFORACIONES

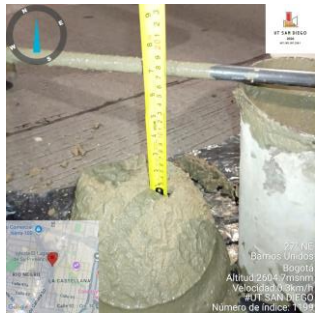


CONTROLES DE MEZCLA





VERIFICACION DE NIVELACION Y PLOMADA DE ESTRUCTURA



TRABAJOS CONSTRUCCION EN TALLER

Se realizan mediciones para cumplir con los parámetros y especificaciones del contrato.

Se realizan nivelaciones y se verifican espesores de pintura.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025






VERIFICACION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTRCCION PERSONAL




SEÑALIZACION DE OBRA

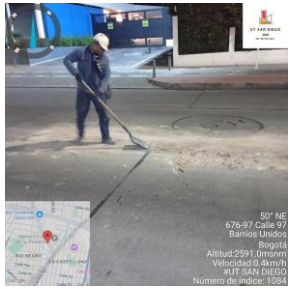

ASEO DE OBRA





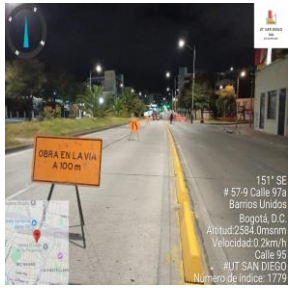

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE PMT

Se realizan cerramientos, señalización de obra.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre del 2025.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025

CONCLUSION

Las actividades realizadas corresponden al proceso de construcción de las ordenes de trabajos autorizadas y correspondientes a los lineamientos dados por interventoría y Transmilenio. En el periodo de Agosto – Septiembre de 2025.

Se encuentra ajustando los trabajos de acuerdo a las condiciones existentes en obra para los cuales se presentan las actividades ejecutadas.

Todos los trabajos tienen aval por parte de interventoría cumpliendo con los parámetros establecidos en el contrato.
