INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02
PERIODO DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 20 DE SEPTEIMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026

NIT: 901.957.338-1

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2025

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

BOGOTÁ D.C. 2025

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 5
2 GENERALIDADES 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 ALCANCE 5
3 INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO 7
3.1 DATOS GENERALES, FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN 7
3.2 VALOR INICIAL DEL CONTRATO 7
3.3 GARANTÍAS 8
4 ASPECTOS TECNICOS 8
4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo 8
4.1.1 ORDEN No 1381-L2-005: 11
4.1.2 ORDEN No 1381-L2-011 12
4.1.3 ORDEN No 1381-L2-012 13
4.1.4 ORDEN No 1381-L2-013 14
4.1.5 ORDEN No 1381-L2-014 15
4.1.6 ORDEN No 1381-L2-015 16
4.1.7 ORDEN No 1381-L2-016 17
4.1.8 ORDEN No 1381-L2-018: 19
4.1.9 ORDEN No 1381-L2-019: 20
4.2.0 ORDEN No 1381-L2-020: 21
4.2.1 ORDEN No 1381-L2-021: 22
5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES 23
6 PLAN DE MANEJO TRANSITO(PMT) 24
7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 25
8 CONCLUSION 25
9 ANEXOS 26
9.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CASTELLANA 1 A 5 (MET-02) 11
9.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 75 1 A 5 (MET-02) 12
9.3 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CASTELLANA 1 A 5 (MET-08) 13
9.4 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 95 1 A 5 (MET-02) 14
9.5 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PUENTELARGO 1 A 5 (MET-02) 15
9.6 FORMATO ORDEN DE TRABAJO NIZA CALLE 127 1 A 5 (MET-02) 16
9.7 FORMATO ORDEN DE TRABAJO RIONEGRO 1 A 5 (MET-04) 17
9.8 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CARRERA 90 1 A 5 (MET-04) 20

9.9 FORMATO ORDEN DE TRABAJO AV. CALI 1 A 5 (MET-04) 21
9.10 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 95 1 A 5 (MET-03)..... 22
9.11 ACTA DE COSTOS N° 1 PERIODO 21 DE AGOSTO A 20 DE SEPTIEMBRE 23

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2 6
Tabla 2. DATOS GENERALES 7
Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO 7
Tabla 4. GARANTIAS DEL CONTRATO 8
Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO 9
Tabla 6. ANALISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MINIMO 20
Tabla 7. ANALISIS PMT ESTACION MOVISTAR ARENA 23
Tabla 10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN 24
Tabla 11. EJECUTADO VS PROYECTADO 25
Tabla 12. VALORES CONTRACTUALES 25

CONTENIDO ILUSTRACIONES

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2 6
Ilustración 2. COI ESTACIÓN CALLE 95 24

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	NO. COPIAS
Interventoría	1
Transmilenio	1

INDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	ACTUALIZACIÓN
1	25/08/2025	primera versión entregada a interventoría

TABLA DE CONTROL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	Cesar Patarroyo	Residente de obra	
Vo.Bo	John Moreno	Residente interventoría	
APROBO	Eduardo Andrés Acero	Director de Interventoría	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

En las actividades del sistema de trasporte masivo TM, se tiene como alcance llevar a cabo las adecuaciones y/o construcción de obras complementarias ordenadas sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C. y sus áreas de influencia que se encuentre a cargo de TRANSMILENIO S.A en los tiempos de ejecución definidos por el interventor y la entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

2 GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. Lote 2

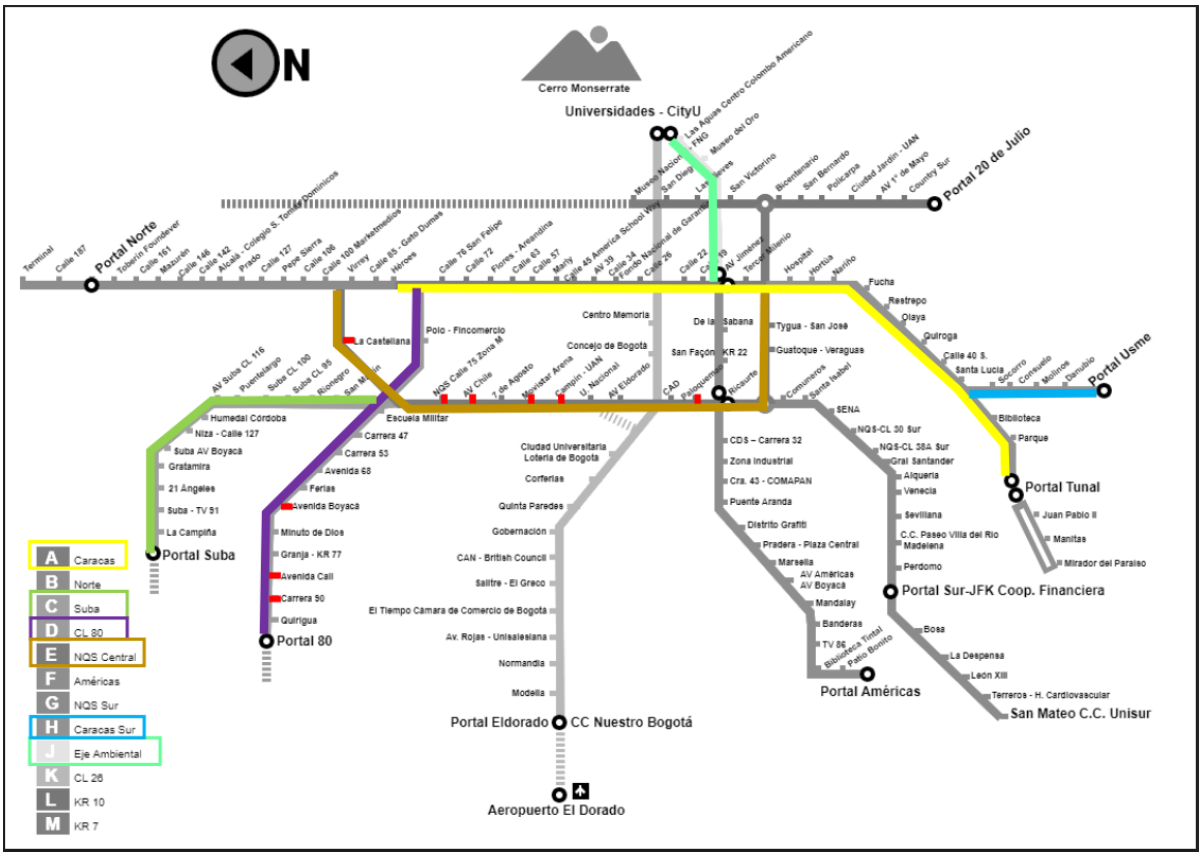
2.2 ALCANCE

La Unión Temporal San Diego deberá cumplir con todas y cada una de las características, actividades, condiciones y obligaciones técnicas del anexo técnico, así mismo tener en cuenta la descripción técnica del proceso constructivo y de ejecución de cada actividad y su detalle; donde la calidad se deberá cumplir con todas las normas técnicas vigentes gestión que aplicara a las obras de los diferentes frentes a realizar en las estaciones del sistema Transmilenio, en la ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta la identificación de áreas a intervenir y que se encuentren autorizadas por los supervisores. Donde el equipo profesional del contratista realizará inspecciones dejando evidencia fotográfica a los diferentes frentes donde se podrá evidenciar el antes, durante y después de la ejecución de actividades.

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2

LOTE	TRONCAL
2	CALLE 80
	SUBA
	CARACAS
	CARACAS SUR
	NQS CENTRAL (INCLUYE ESTACIONES CALLE SEXTA)
	EJE AMBIENTAL

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2



Fuente: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/mapa-interactivo-de-transmilenio-rutas-y-estaciones-del-sistema

3 INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO

3.1 DATOS GENERALES, FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN

Tabla 2. DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
No. CONTRATO	1381-2025		1369-2025	
OBJETO	Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. Lote 2		REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN (LOTE 1 Y LOTE 2), CUYO OBJETO ES:REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	
PARTICIPACION CONTRACTUAL	UNION TEMPORAL SAN DIEGO 2026	% PARTICIPACIÓN	CONSORCIO ALIANZA XXI	% PARTICIPACIÓN
	G 63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	80%	DAIMCO S.A.S	99,90%
	ICFAN S.A.S	20%	DIBENEM S.A.S	0,10%
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO 2025		21 DE JULIO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MAYO 2026		20 DE MAYO 2026	
TIEMPO DE EJECUCION	10 MESES		10 MESES	

3.2 VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO

UNION TEMPORAL SAN DIEGO 2026		
VALOR DEL CONTRATO	$	13.750.000.000

3.3 GARANTÍAS

Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No DE POLIZA	DESCRIPCIÓN	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	NB-100391857	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIEMTO	21/07/2025	20/11/2026	$ 4.125.000.000
			PRESTACIONES SOCIALES	21/07/2025	21/05/2029	$ 1.375.000.000
			ESTABILIDAD DE OBRA	24/05/2026	21/05/2031	$ 4.125.000.000
	NB-100102243	RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARO	21/07/2025	21/05/2026	$ 687.500.000
			PATRONAL	21/07/2025	21/05/2026	$ 687.500.000
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/067/2025	21/05/2026	$ 687.500.000
			VEHICULOS PROPIOS U NO PROPIOS	21/07/2025	21/05/2026	$ 687.500.000

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

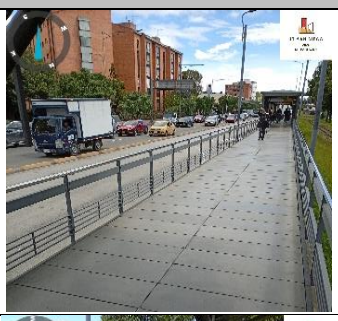
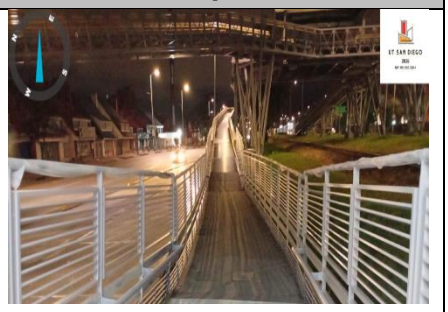
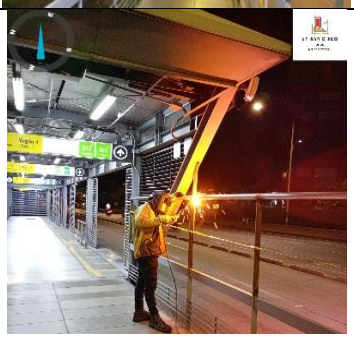
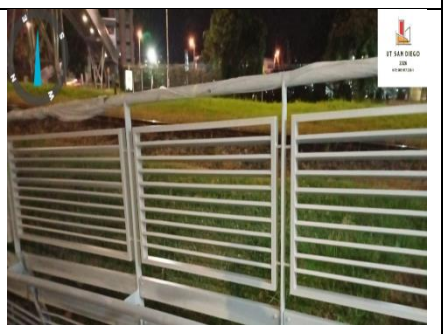
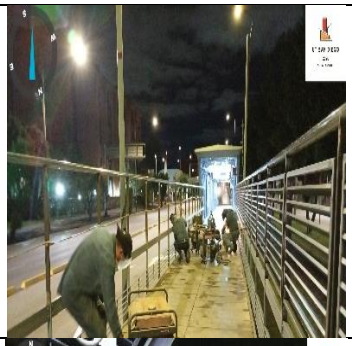
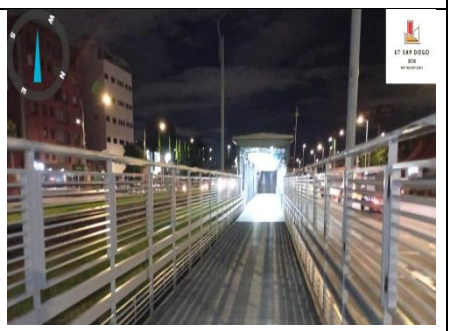
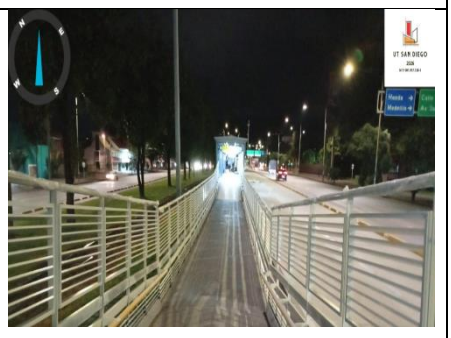
A continuación, se relacionan las actividades por ítem dé ejecución con su registro fotográfico durante el periodo comprendido entre el periodo 21 de Agosto de 2025 al 20 de Septiembre de 2025.

Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO		**CTO. 1381-2025**	
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S. A	
ÍTEMS	**OT. No**	**Estación**	**Descripción**
MET-02	**1381-L2-005**	CASTELLANA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES
MET-02	**1381-L2-011**	CALLE 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES
MET-08	**1381-L2-012**	CASTELLANA	CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGON ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGON SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSIAS NECESARIAS
MET-02	**1381-L2-013**	CALLE 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES
MET-02	**1381-L2-014**	PUENTE LARGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES
MET-02	**1381-L2-015**	NIZA CALLE 127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES
MET-02	**1381-L2-016**	RIONEGRO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES
MET-04	**1381-L2-019**	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES
MET-04	**1381-L2-020**	AV. CALI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES
MET-03	**1381-L2-021**	CALLE 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

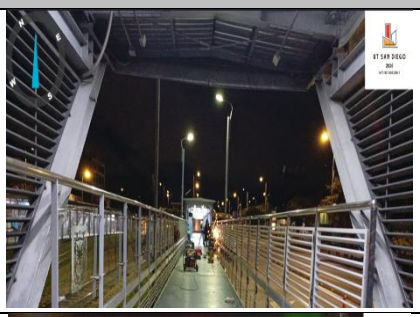
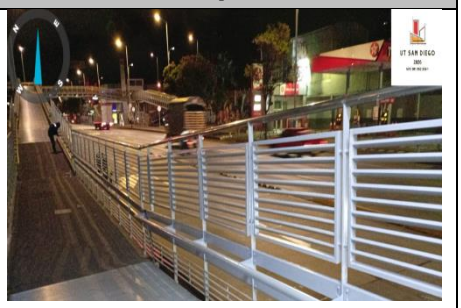
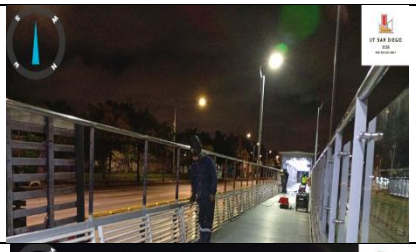

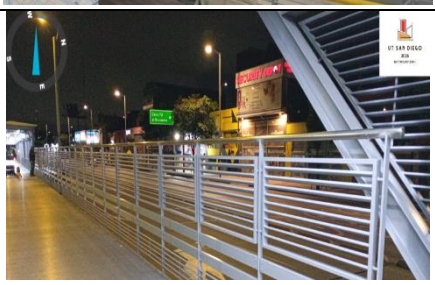
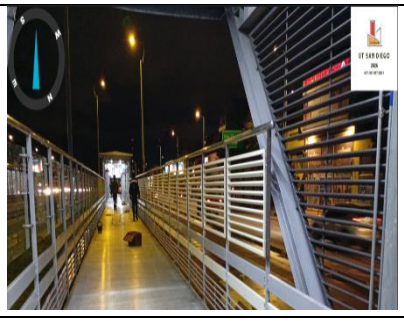
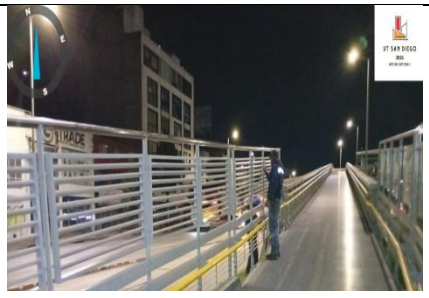
4.1.1 ORDEN No 1381-L2-005:

Troncal	Estación	Descripción
NQS SUR - G	CASTELLANA MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

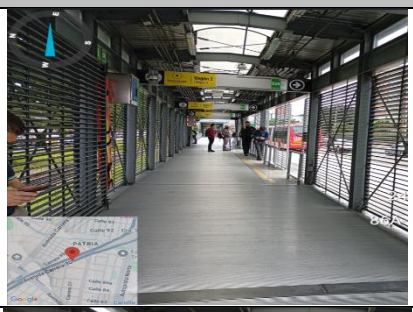
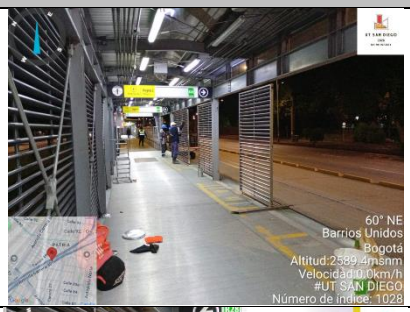
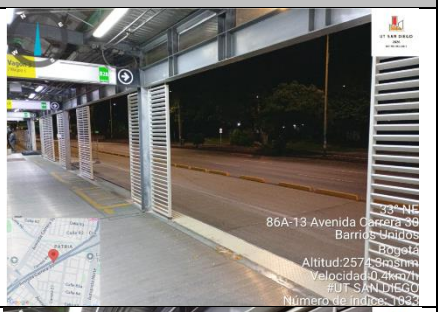
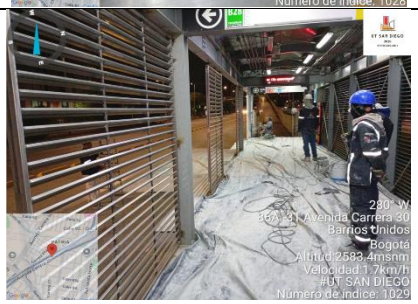
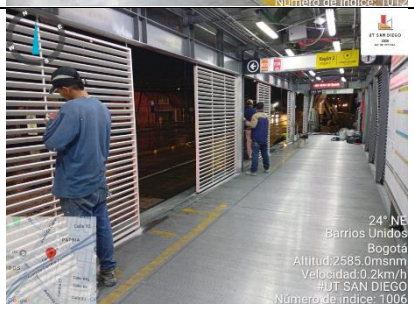
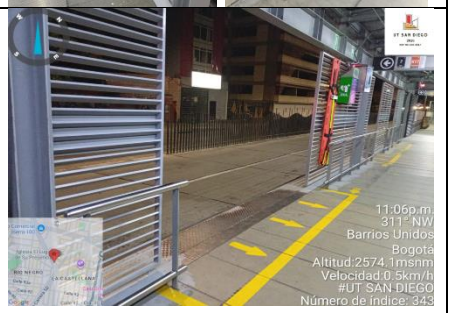
4.1.2 ORDEN No 1381-L2-011:

Troncal	Estación	Descripción
NQS SUR - G	CALLE 75 MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

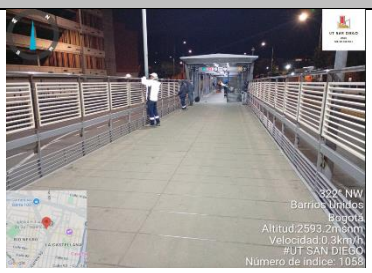
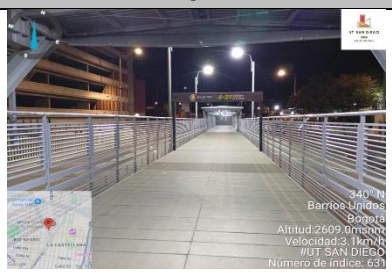
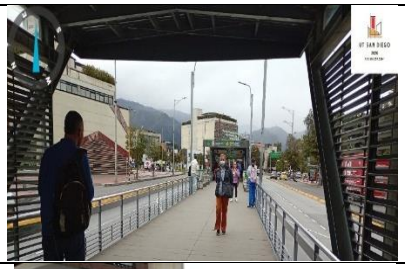
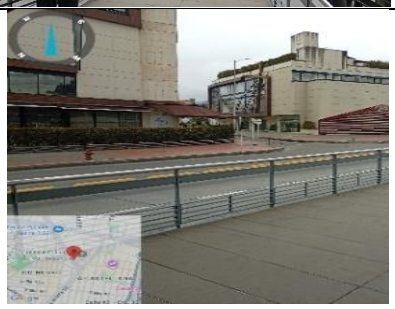
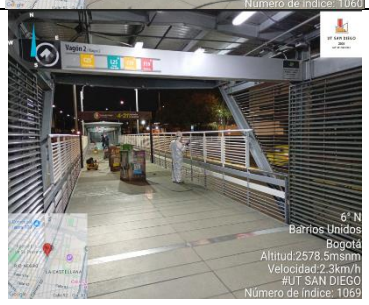
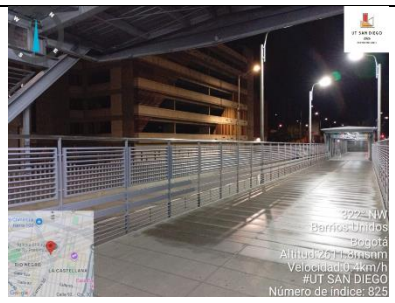
4.1.3 ORDEN No 1381-L2-012:

Troncal	Estación	Descripción
NQS SUR - G	CASTELLANA MET-08	CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGON ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGON SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSIAS NECESARIAS

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

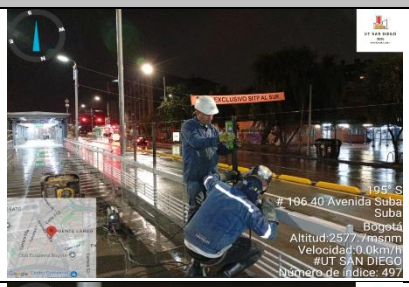
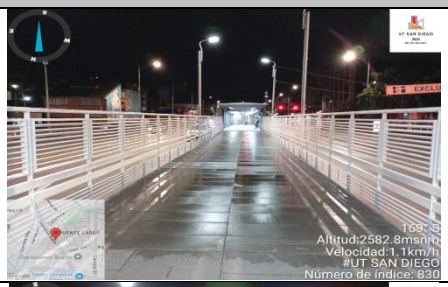
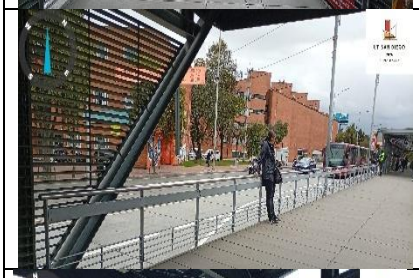
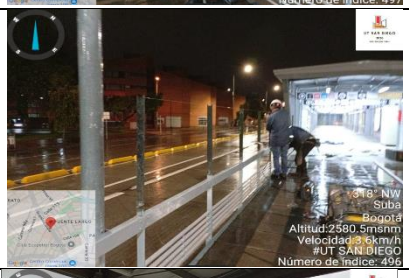
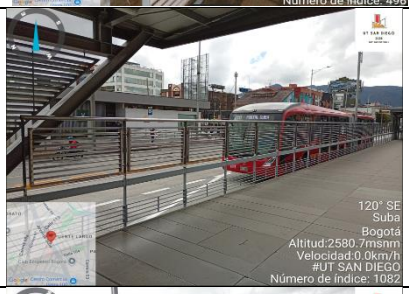
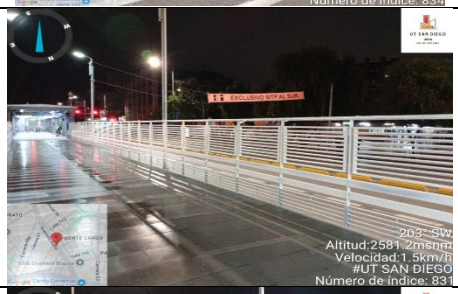
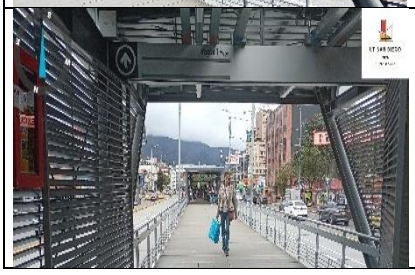
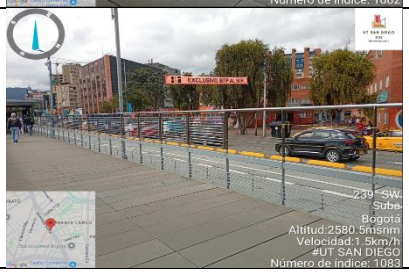
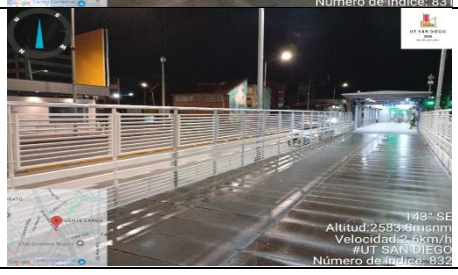
4.1.4 ORDEN No 1381-L2-013:

Troncal	Estación	Descripción
SUBA - C	CALLE 95 MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

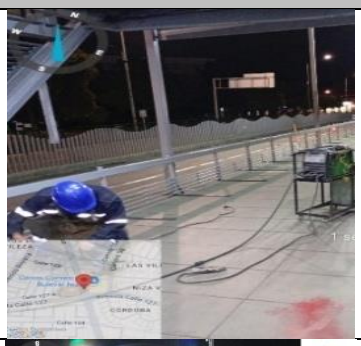
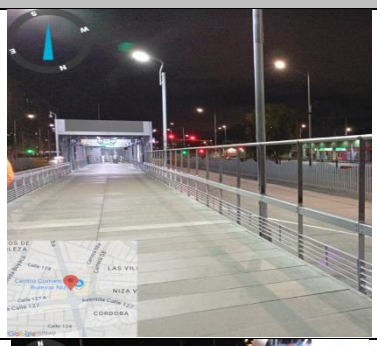
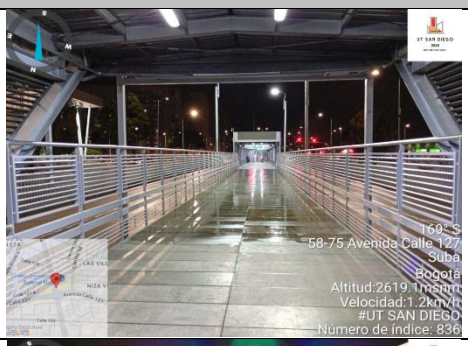
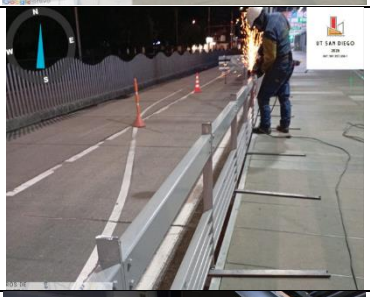
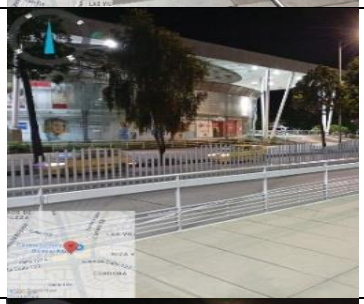
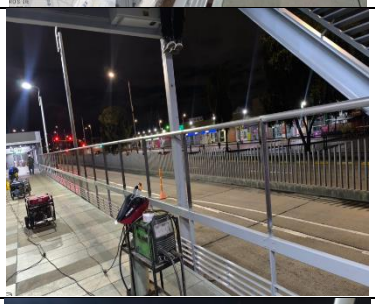
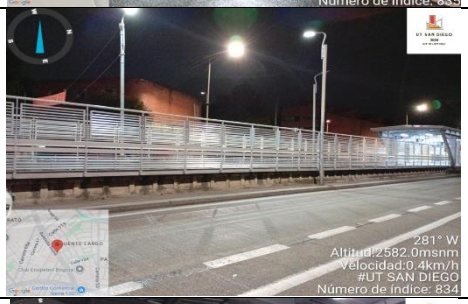
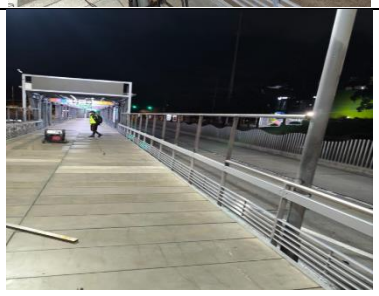
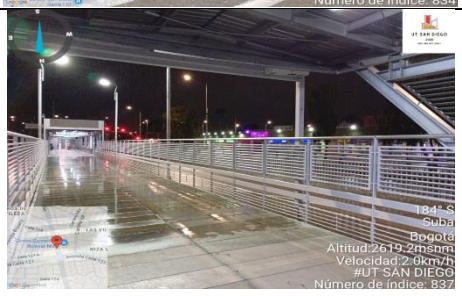
4.1.5 ORDEN No 1381-L2-014

Troncal	Estación	Descripción
SUBA - C	PUENTELARGO MET-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

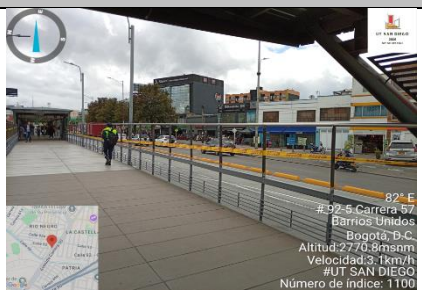
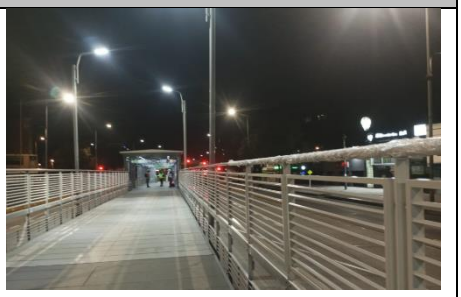
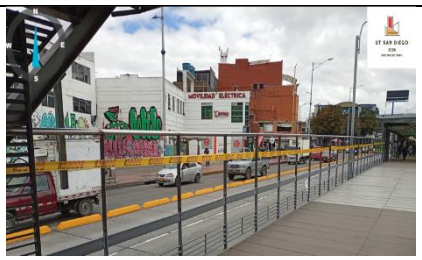
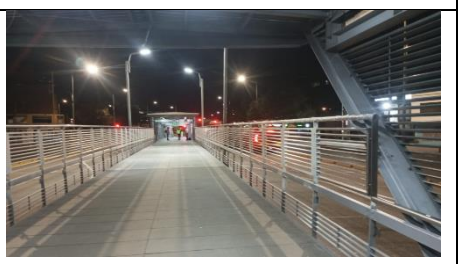
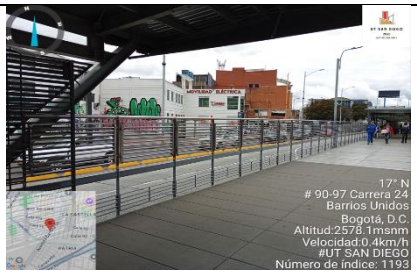
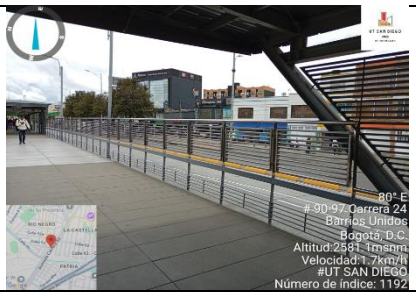
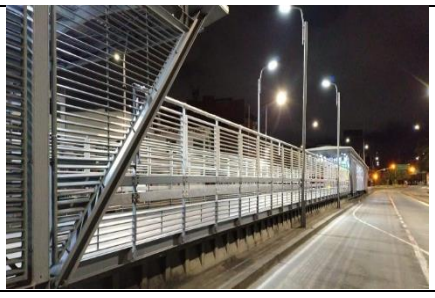
4.1.6 ORDEN No 1381-L2-015

Troncal	Estación	Descripción
SUBA - C	NIZA CALLE 127 MET-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

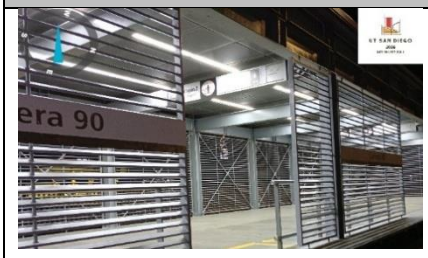
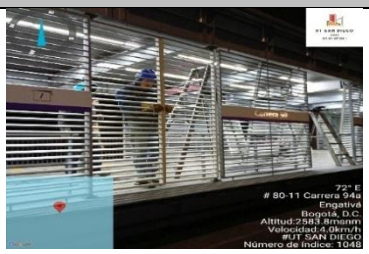
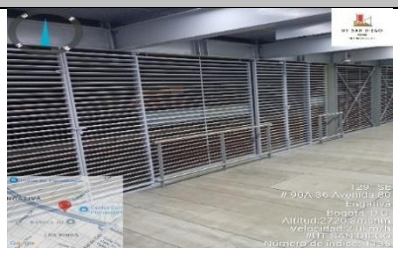
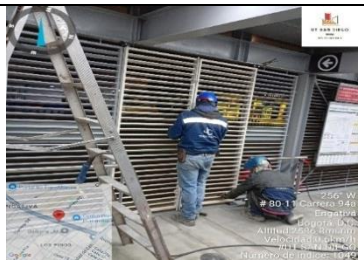
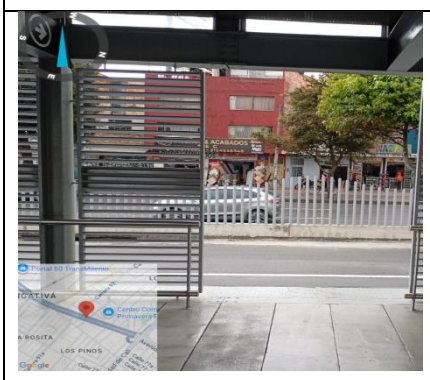
4.1.7 ORDEN No 1381-L2-016

Troncal	Estación	Descripción
SUBA - C	RIONEGRO MET-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

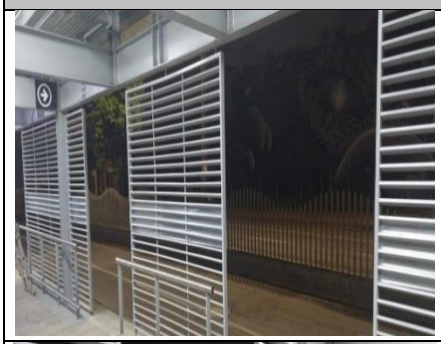
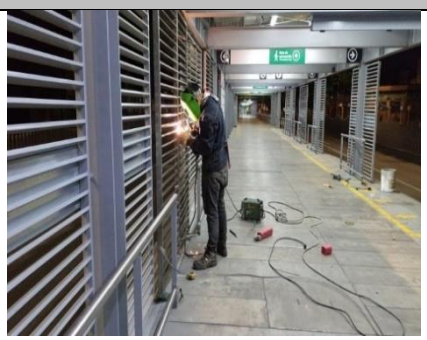
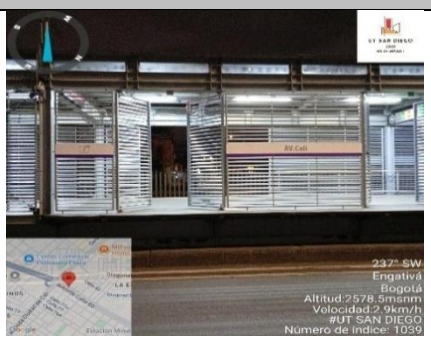
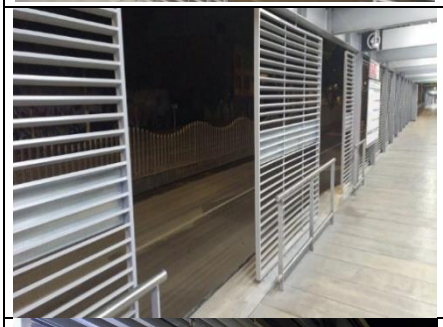
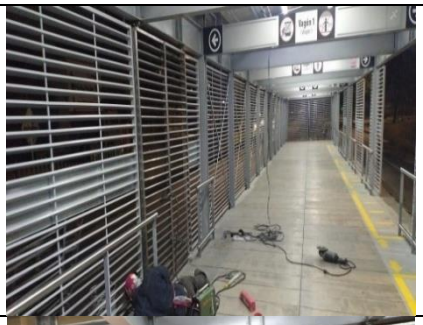
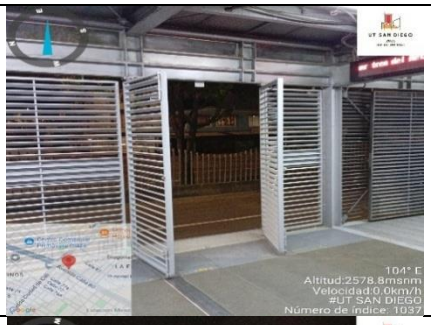
4.1.8 ORDEN No 1381-L2-019

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 - D	CARRERA 90 MET-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

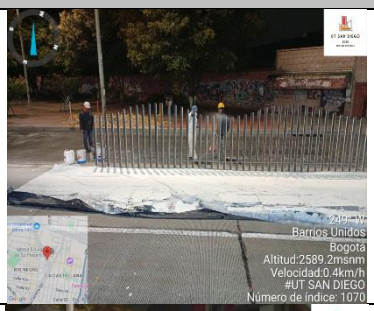
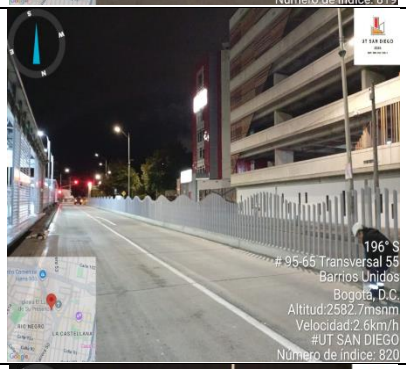
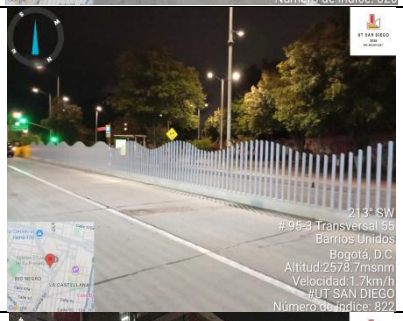
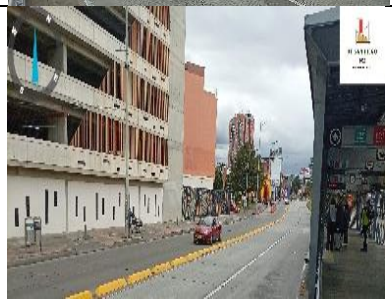
4.1.9 ORDEN No 1381-L2-020

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 - D	AV. CALI MET-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

4.1.10 ORDEN No 1381-L2-021

Troncal	Estación	Descripción
SUBA - C	CALLE 95 MET-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES

Tabla 6.ANALISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MINIMO

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
21/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
22/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
23/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
24/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
25/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
26/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
27/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS ,PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
28/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS Y PLATINAS , DEMOLICIÓN, INSTALACIÓN DEL MET-02 MET-03 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
29/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS Y PLATINAS , DEMOLICIÓN, INSTALACIÓN DEL MET-02 MET-03 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
30/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS Y PLATINAS , DEMOLICIÓN, INSTALACIÓN DEL MET-02 MET-03 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
31/08/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOCIAS Y PLATINAS , DEMOLICIÓN, INSTALACIÓN DEL MET-02 MET-03 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
1/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN, INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
2/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO

3/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
4/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
5/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
6/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
7/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
8/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
9/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
10/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
11/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
12/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
13/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
14/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
15/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
16/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
17/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO

18/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
19/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO
20/09/2025	SIN REPORTE NO SE ACECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACIÓN DE MET-02 MET-04 Y TRABAJO ADMINISYTRATIVO

No se reportan afectaciones por lluvia, ausencias ni incapacidades del personal mínimo relacionado en la tabla anterior.

6 PLAN DE MANEJO TRANSITO(PMT)

Tabla 7. ANALISIS PMT ESTACIÓN CALLE 95

FECHA DE APROBACION DEL COI	NUMERO DE APROBACION	FECHA DE INICIO DEL COI	FECHA DE FINALIZACION DEL COI	ESTACIÓN
28/08/2025	202561202611342	29/08/2025	18/09/2025	CALLE 95

Ilustración 2. COI ESTACIÓN CALLE 95

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

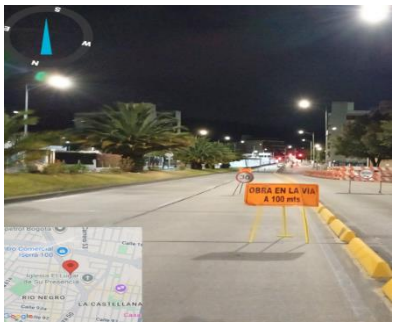
Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) y otros

CÓDIGO: PM02-PR01-R04 VERSIÓN: 3.0

COI No. 35
AGOSTO 28 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
24493	12003219	12003252	AV SUBA (TV 55) 65m AL SUR DE LA KR 93	AV SUBA (TV 55) 40m AL NORTE DE LA CL 97	U.T. SAN DIEGO 2026	29-ago-25	18-sep-25	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1369-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, EN ESPECIAL LA REALIZADA CON AGUAS BOGOTA S.A. 2. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE MAS DE UN CARRIL. 3. LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION SE DEBE UBICAR SIEMPRE SOBRE SEPARADORES Y/O ANDENES, NUNCA SOBRE LA CALZADA VEHICULAR. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS CERCANAS A LAS INTERVENCIONES. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA BRT, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO DEL FLUJO VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO (03:30 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	CORREDOR	LEIDY F. HIGUERA M.	20256120294835 2
24494	12003219	12003252	AV SUBA (TV 55) 65m AL SUR DE LA KR 93	AV SUBA (TV 55) 40m AL NORTE DE LA CL 97	U.T. SAN DIEGO 2026	29-ago-25	18-sep-25	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1369-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS , EN ESPECIAL LA REALIZADA CON AGUAS BOGOTA S.A. 2. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE MAS DE UN CARRIL. 3. LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION SE DEBE UBICAR SIEMPRE SOBRE SEPARADORES Y/O ANDENES, NUNCA SOBRE LA CALZADA VEHICULAR. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS CERCANAS A LAS INTERVENCIONES. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA BRT Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO DEL FLUJO VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO (03:30 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	CORREDOR	LEIDY F. HIGUERA M.	20256120294835 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN

ÍTEMS	OT. No	Estación	Descripción	PORCENTAJE DE AVANCE
MET -02	**1381-L2-005**	CASTELLANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%
MET -02	**1381-L2-011**	CALLE 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%
MET-08	**1381-L2-012**	CASTELLANA	CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGON ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGON SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSIAS NECESARIAS	100%
MET-02	**1381-L2-013**	CALLE 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%
MET-02	**1381-L2-014**	PUENTE LARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%
MET-02	**1381-L2-015**	NIZA CALLE 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%
MET-02	**1381-L2-016**	RIONEGRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%
MET-04	**1381-L2-019**	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	100%
MET-04	**1381-L2-020**	AVENIDA CALI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	100%
MET-03	**1381-L2-021**	CALLE 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	100%

Tabla 9. EJECUTADO VS PROYECTADO

ITEM	% EJECUTADO	% PROYECTADO	DIFERENCIA
MET-02	100%	100%	0%
MET-03	100%	100%	0%
MET-04	100%	100%	0%
MET-08	100%	100%	0%

Haciendo un análisis de la tabla 10. Porcentaje de ejecución por estación y la tabla 11. Ejecutado vs proyectado se puede evidenciar que el MET-02 se encuentra ejecutado en un 100% el MET-03 se encuentra ejecutado en un 100 %, el MET-04 se encuentra en un 100%.

Tabla 10. VALORES CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR CONTRACTUAL CON AIU	$ 13.750.000.000	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	12.66%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	9.48%
VALOR FACTURADO	$ 3.044.492.437	22.14%
VALOR FALTANTE POR EJECUATR CON AIU	$ 10.705.507.563	77.86%

Según el valor contractual del contrato con AIU y la ejecución de las ordenes de trabajo numero dos que surgen de la necesidad de la entidad, se tiene ejecutado y facturado un 22.14% que corresponde a un valor de $ 3.044.492.437 AU incluido, discriminado de la siguiente manera, para el acta numero uno un valor de $1.740.809.942 AU incluido que corresponde a un 12.66% del valor total del contrato, para el acta número 2 un valor de %1.303.682.495 AU incluido que corresponde al 9.48% del valor total del contrato, contando con un valor pendiente por ejecutar de $10.705.507.563 AIU incluido que corresponde a un 77.86% del valor total del contrato.

8 CONCLUSIÓN

Se relacionan todas las actividades ejecutadas por el Contratista UNION TEMPORAL SAN DIEGO 2026 estaciones entregadas a satisfacción al 100% de ejecución en el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2025 al 20 de septiembre de 2025,se ejecutan las órdenes de trabajo que surgen de las necesidades de la entidad aprobadas por la interventoría del contrato, se tiene en cuenta la normatividad y especificaciones técnicas de acuerdo los requerimientos del contrato.

9 ANEXOS

9.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CASTELLANA 1 A 5 (MET-02)
9.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 75 1 A 5 (MET-02)
9.3 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CASTELLANA 1 A 5 (MET-08)
9.4 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 95 1 A 5 (MET-02)
9.5 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PUENTELARGO 1 A 5 (MET-02)
9.6 FORMATO ORDEN DE TRABAJO NIZA CALLE 127 1 A 5 (MET-02)
9.7 FORMATO ORDEN DE TRABAJO RIONEGRO 1 A 5 (MET-02)
9.8 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CARRERA 90 1 A 5 (MET-004)
9.9 FORMATO ORDEN DE TRABAJO AV. CALI 1 A 5 (MET-004)
9.10 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 95 1 A 5 (MET-03)
9.11 ACTA DE COSTOS N° 2 PERIODO
