ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
13	28	07	2025	14:00 Horas	15:20 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoria No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Eliana Zuluaga Marín	Contratista – INVIAS DT Quindío
Santiago Ospina Vargas	Contratista – INVIAS DT Quindío
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista – INVIAS DT Quindío
Emilia Esther De La Ossa Contreras	Interventoria No. 3668 de 2024
Óscar Lizarazo	Interventoria No. 3668 de 2024
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

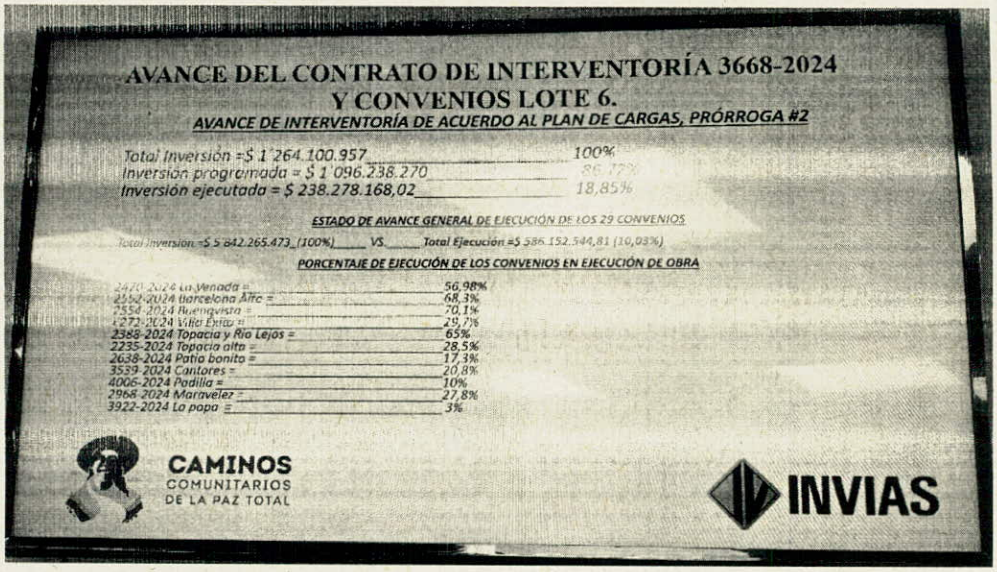
TEMA 1: Lectura de compromisos

- La Interventoría sí realizó el acta e informe correspondiente al mes de junio, no obstante, se reenviaron observaciones para subsanar. En ese sentido, el ingeniero Fernando García Giraldo expresa realizar las correcciones lo más pronto posible. La interventoría No. 3668 de 2024 se compromete realizar la entrega de este informe el miércoles 30 de julio de 2025. Se le realiza la aclaración al equipo central de la Interventoría la trazabilidad del incumplimiento en los compromisos.
- Se realizó entrega de la carta de intención de los laboratorios – Control de calidad.
- Se entregó la evaluación técnico-financiera de la obra correspondiente a la JVC Villa Éxito. En ese sentido, la Interventoría expresa que el retraso en la obra se ve reflejado en el personal que se tiene en esta, por lo cual, la Interventoría manifiesta que se tomarán medidas para solucionar esta situación. Para ello, se le solicita a la Interventoría proporcionar avances de estas actuaciones en la próxima reunión de seguimiento, asimismo, se le recomienda al inspector estar más presente en sitio.
- La Interventoría envió oficio a la Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total solicitando su pronunciamiento con relación al tema ambiental.

ACTA No.	FECHA			HORA	
13	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	07	2025	14:00 Horas	15:20 Horas

TEMA 2: Componente Técnico

- En primer lugar, se procede a mencionar sobre los avances programados y ejecutados. En ese sentido, la Interventoría No. 3668 de 2024 expone que el avance programado
- A la fecha, se presenta el siguiente informe con corte al miércoles 23 de julio de 2025:



- Dentro del componente técnico, se le expresa a la representante legal de la Interventoría No. 3668 de 2024 y al director técnico todos los inconvenientes presentados en su ejecución, tales como las situaciones que han sucedido con las Juntas de Acción Comunal y el retraso que se han presentado con el inicio de la obra. En ese sentido, la Interventoría expresa que, a la fecha, se han realizado diferentes actividades para poder dar cumplimiento a lo solicitado, no obstante, expresa que el problema radica en los profesionales que las Juntas de Acción Comunal contratan. Como plan de subsanación, la Interventoría No. 3668 de 2024, expresa que van a iniciar con el envío de oficios en aras de considerar la posibilidad de realizar los procesos sancionatorios.
- Desde nivel central de la Interventoría No. 3668 de 2024, expresan que van en concordancia con la actuación del director de la Interventoría e insta al componente social a acompañar mayormente a las personas para que se realice el cumplimiento.
- En aras de poder solucionar los inconvenientes presentados, la Interventoría No. 3668 de 2024 y el equipo de CCPT en la Dirección Territorial Quindío propone realizar reuniones pronto con los representantes legales y profesionales de las Juntas de Acción Comunal, al igual que, se inicie con la validación de los profesionales adscritos a las Juntas y la emisión de oficios de incumplimiento por parte de las Juntas.

TEMA 3: Componente ambiental

- La Interventoría No. 3668 de 2024, ya envió el oficio a la gerencia de CCPT con el propósito de recibir por escrito el aval para continuar con aquellos convenios que estén en Ley Segunda.
- La JAC El Agrado (Salento-Q) han solicitado a la Alcaldía Municipal de Salento mediar la situación DRMI con la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), donde se expresó que la Corporación está en

ACTA No.	FECHA			HORA	
13	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	07	2025	14:00 Horas	15:20 Horas

disposición de ayudar a la Junta la posibilidad de realizar el convenio, toda vez que se realicen las especificaciones técnicas que se van a llevar a cabo en la vía.

- A manera informativa, el ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa un incidente sucedido con un residente de la JAC Chagualá (Salento-Q) en la reunión con la CRQ.

TEMA 5: Componente social




- El profesional Santiago Ospina Vargas, expresa los avances que se han tenido desde el componente social. Para la semana pasada se realizó la radicación de cuatro (04) convenios solidarios y el compromiso de esta semana, es realizar la radicación de cinco convenios más. A la fecha, se tienen trece (13) radicaciones y se realiza la claridad de aquellos convenios que están "suspendidos" desde el avance de las actividades sociales.

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Interventoría No. 3668 de 2024	Entrega de informe y acta de costos correspondientes al mes de junio con las subsanaciones.	30/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Programación de reuniones con los representantes legales, los cuales, deben realizarse cuatro juntas por día.	29/07/2025 30/07/2025 31/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Inicio de obra de los convenios correspondientes a las Juntas de Acción Comunal de las veredas: Canaán, Los Juanes, Los Balsos, La Montaña y San Juan de Carolina.	31/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Informe mensual de Interventoría y acta de costos correspondiente al período de Julio	05/08/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
13	28	07	2025	14:00 Horas	15:20 Horas

Eliana Zuluaga Marín	
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Fabián Velásquez Henao	
Emilia Esther De La Ossa Contreras	Asistencia virtual
Óscar Lizarazo	Asistencia virtual

INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	MEPI-FR-4
		VERSIÓN	1
	FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	PÁGINA	de

TEMA DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3668-2024 — HORA DE INICIO: 2:00Pm — FECHA: 28/07/2025

DEPENDENCIA CONVOCANTE: INVIAS – D.T. QUINDIO — LUGAR DE LA REUNIÓN:

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS QUINDIO	SUPERVISOR C3668	3113250287	fgarcia@invias.gov.co	
2	JAhir Alfonso Luis S	Invias Quindio	Direction Inter	3138914120	Director Desarrollo Vial 2T@gmail.	
3	Fabian Velasquez Henao	Interventoria	Profesional Ambiental	3187459550	desarrollovial2Tambiental@gmail.com.	Fabian Velas
4	Eliana Zuluaga M.	Invias Q.	Abogada Contratista	3244195590	ezuluaga@inviasgov.	
5	Diego Alfredo Aragón O	Invias Q	Ing. Contratista	316 646 0641	daragon@invias.gov.co	
6	Santiago Ospina Vargas	INVIAS-DTQUI	Contratista	3117601124	sospina@invias.gov.co	
