INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	11

ACTA No.	FECHA			HORA	
15	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Eliana Zuluaga Marín	Contratista – INVIAS DT Quindío
Santiago Ospina Vargas	Contratista – INVIAS DT Quindío
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista – INVIAS DT Quindío
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024
Luisa Fernanda Zapata López	Interventoria No. 3668 de 2024
Fernando Grande Piroga	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Lectura de compromisos

- Se realizó mesa de trabajo con el propósito de realizar la entrega de informe y acta de costos correspondientes al mes de junio con las subsanaciones nuevas.
- Se realizó de forma parcial las entregas de las actas, ya que se entregó el acta correspondiente al período de junio con radicado de oficio No. 2025E-VUVRAZ-09705, se resalta que la información financiera que se entregó en ese informe debe ser alimentada en el One Drive de liquidaciones compartido. A la fecha, no se ha entregado el acta del período de julio, debido a que la Interventoría expresa que los Organismos de Acción Comunal no han hecho entrega del insumo para completar el informe financiero, por lo cual, solicitan plazo de entrega para el viernes 22 de agosto de 2025.
- A la fecha, se ha iniciado obra de los convenios correspondientes a las Juntas de Acción Comunal correspondiente con las veredas: Canaán, Los Juanes, Los Balsos, La Montaña y San Juan de Carolina.
- A la fecha no se ha realizado la entrega del Informe mensual de Interventoría y acta de costos correspondiente al período de Julio. Se reitera que se realizará el viernes 22 de agosto de 2025.

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
15	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

- La Interventoría expresa que se cumplió de manera parcial la información del cuadro comparativo entre la cantidad de obra proyectada en el año 2024 vs lo proyectado en el año 2025, lo anterior debido a que esto se realiza de acuerdo con el inicio y avance de obra.
- Se realizaron los oficios contables realizando apremios a los profesionales contables de los convenios – en total 11 y Oficio a los Organismos de Acción Comunal reiterándoles la ejecución de la OPC antes de culminar el proyecto – en total 13.

TEMA 2: Componente Técnico

- La Interventoría hace presentación del nuevo personal adscrito al contrato No. 3668 de 2024: ingeniero residente de Interventoría que se llama Fernando Grande Quiroga y profesional social que se llama Luisa Fernanda Zapata López. Asimismo, se expresa que ingresó un inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que se llama Hermógenes Barreto. Asimismo, se expresa que la Supervisión por parte de la Dirección Territorial Quindío, se aprobó el ingreso de un inspector de obra que se llama Miguel Ángel Hoyos Gómez, para un total de seis (06) profesionales.
- El ingeniero Fernando García Giraldo expresa que a la fecha no se hace necesario el especialista de pavimentos, por lo cual, en caso de necesitarse, se solicita la Interventoría envía por escrito la necesidad de este perfil.
- Dentro de los avances mencionados por la interventoría, está:

CONVENIO 2470-2024, GÉNOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS:


Se realiza el céreo de la subbase granular desde la K0+076 a K0+087
Se realiza el vaciado de concreto ciclópeo central en el tramo desde el K0+010 a K0+028
Se realiza instalación de la formaleta para la huella derecha, cuneta derecha y huella izquierda.

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

AVANCE O ATRASO FISICO





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- A la fecha, ya se tiene el material para realizar la OPC y ya se realizó la primera radicación del componente ambiental a la Subdirección de Sostenibilidad. Se le recomienda la Interventoría realizar un oficio a los Organismos de Acción Comunal de los convenios donde se exprese que la custodia y cuidado de los materiales que estén en la obra son responsabilidad del representante legal.

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
15	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas


CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Vaciado de concreto de 21 Mpa de la margen izquierda del k0+110,8 al k0+122,1
Vaciado de concreto ciclópeo en la franja central desde el K0+041 al K0+067
Amarre y figurado en la margen derecha del k0 +110,8 a k0+122,1

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA $105.220.549 (69,58%)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ [illegible] (69,58%)
ATRASO O AVANCE FISICO (19,64%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS


- Se le solicita a la Interventoría que se anexen fotografías actualizadas en las diapositivas, mínimo del mismo día o un día anterior al comité de seguimiento. Se solicita a la Interventoría realizar la Obra de Participación Comunitaria -OPC- a más tardar el día 25 de agosto de 2025. Ya se cuenta con primer radicado ambiental.

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Vaciado de concreto de 21 Mpa izquierda del K0+076,5 al K0+100
Extendido y amarrado de acero en la margen izquierda en el k0+076.5 al K0+100

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA $182.612.158 (87,7%)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ [illegible] (87,67%)
ATRASO FISICO (20,33%)

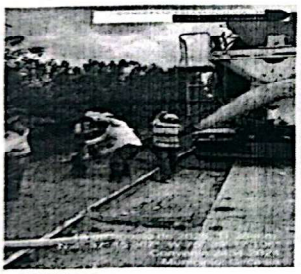



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- Se manifiesta que este convenio tiene un recurso muy limitado en la obra, no obstante, sí se considera que se va a realizar. Se solicita a la Interventoría realizar la Obra de Participación Comunitaria -OPC- a más tardar el día 25 de agosto de 2025. Ya se cuenta con primer radicado ambiental.

Scanned with CamScanner


ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó el levantamiento del acero de refuerzo para las cunetas y la verificación de la pendiente longitudinal y transversal.
Se realiza el vaciado de 5.9 m^3 de concreto premezclado, distribuidos de la siguiente manera:
6 módulos de placa huella
8 módulos de cuneta
4 vigas riostras de 5 m

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$65.523.730 (42,97%)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 77.583.846,26 (50,84%)
ATRASO FISICO	(7,89%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- Se solicita a la Interventoría realizar la Obra de Participación Comunitaria -OPC- a más tardar el día 29 de agosto de 2025. Ya se cuenta con primer radicado ambiental.


CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RÍO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la instalación del acero de refuerzo de la huella derecha y de las vigas riostra con longitud de 2.05 m del K0+00 a K0+064
Se realiza la instalación de formaleta para la huella derecha y se realiza el vaciado de concreto de la cuneta derecha del K0+00 a K00+052

TOTAL INVERSION PROGRAMADA	$97.154.821 (63,32%)
TOTAL INVERSION EJECUTADA	$ 108.864.520,30 (70,96%)
ATRASO FISICO	(7,63%)

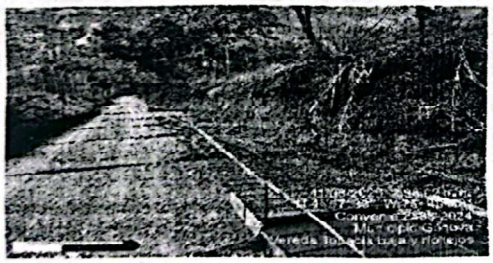

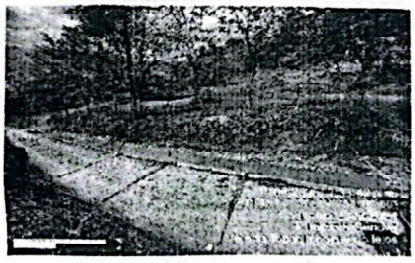

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se recomienda a la Interventoría la instalación de un banner o "pasa calle" del cierre vial, al igual que sea compartido de manera virtual con la comunidad, lo anterior, con el ánimo de evitar inconvenientes con estos. Se solicita a la Interventoría realizar la Obra de Participación Comunitaria -OPC- a más tardar el día 25 de agosto de 2025. Ya se cuenta con primer radicado ambiental.

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instala la formaleta de la huella derecha y se realiza el vaciado de concreto de la huella derecho del K00+045 al K00+058
Se realiza la colocación de la formaleta de la cuneta derecha y el vaciado de concreto de la cuneta derecha K00+00 al K00+027
Se realiza la instalación de formaleta para el bordillo derecho y se realiza el vaciado de concreto del bordillo derecho de K0+00 a K00+060

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

ATRASO FÍSICO





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se solicita a la Interventoría realizar la Obra de Participación Comunitaria -OPC- a más tardar el día 29 de agosto de 2025. Ya se cuenta con primer radicado ambiental.

CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella-cuneta de franja izquierda K0+070 - k0+080
Corte y figurado de acero #3 para elemento de huella-cuneta-bordillo
Amarre de acero #3 para malla de huella-cuneta k0+090-k0+135
Encofrado de franja izquierda de huella-cuenta k0+070 - k0+080

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

ATRASO FÍSICO





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se le solicita nuevamente a la Interventoría realizar la revisión técnica y ambiental de la OPC que se instalará en este convenio. Se menciona que esta Junta de Acción Comunal, tiene una fecha de terminación para el 31 de agosto de 2025; por lo cual, se realizó llamada con Planta Central y la representante legal para evaluar la posibilidad de realizar una ampliación al plazo de ejecución del convenio, ya que de no ser así se puede evidenciar un presunto incumplimiento por parte de la Junta.

Scanned with CamScanner


ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas


CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Vaciado de concreto de huella y cuneta costado izquierdo k0+077-k0+083.
Amarre de acero #3 en huella costado izquierdo K0+078 a K0+083
Encofrado de bordillo costado izquierdo k0+068-k0+083

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$45.069.679 (43,55%)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 78.371.246,54 (52,08%)
ATRASO FISICO	(8,53%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- Se menciona que de este convenio se recibió un derecho de petición de manera anónima al Instituto Nacional de Vías; por lo cual, se le reitera a la Interventoría el envío de los insumos que son necesarios para poder responder de forma oportuna y adecuada esta solicitud. Asimismo, se reitera la importancia de iniciar la OPC y realizar el primer radicado ambiental.


CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

vaciado de concreto de 14 Mpa para 24 modulos de la K0+041 a K0+082
Vaciado de concreto de 21 Mpa para 11 modulos de la K0+041 a K0+082
Excavacion de vigas riostras desde la K0+082 a K0+092

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$45.583.299 (28,76%)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 83.642.133,77 (42,02%)
ATRASO FISICO	(13,26%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se reitera la importancia de iniciar la OPC y realizar el primer radicado ambiental.

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizó la limpieza de obras de drenaje transversal colmatadas correspondientes al tramo a intervenir, y también se realizó el corte y figurado del acero de refuerzo para riostras, huellas, cunetas, bordillos

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

ATRASO FISICO (-13,75%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se reitera a la Interventoría que las fotos deben ser actualizadas. Asimismo, se reitera la importancia de iniciar la OPC y realizar el primer radicado ambiental.

CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

vaciado de concreto de 21 Mpa de bordillo en un total de 18 ml
vaciado de concreto de 21 Mpa de 9 ml de cuneta y huella izquierda
Amarre y figurado de acero para huella, cuneta y bordillo en un total de 3 modulos
Vaciado de concreto de 14 Mpa de huellas en un total de 42 ml

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

ATRASO FISICO (4,29%)




CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- No se expone ninguna situación extraordinaria.

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA



ACTIVIDADES REALIZADAS

vaciado de concreto en huella costado derecho en k0+000 – k0+024.
vaciado de concreto en paños de concreto ciclópeo franja central en k0+000 – k0+024.

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

ATRASO FISICO

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

- No se expone ninguna situación extraordinaria.

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Conformación del tramo a ejecutar
Instalación de campamento
Acopio de materiales pétreos





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

- No se expone ninguna situación extraordinaria.
- Se expresa que la Junta de Acción Comunal de Los Juanes sí está en ejecución, no obstante, la Interventoría se equivoco con relación al nombre y número de convenio de este:

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavaciones y conformación de tramo a ejecutar
Conformación de material granular





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- La Interventoría expresa que la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan De Carolina ya inició obra, pero no se anexaron fotografías y/o diapositiva al respecto.
- El ingeniero Fernando Garcia Giraldo menciona a la Interventoría que se hace necesario realizar un plan de contingencia para garantizar el inicio y ejecución de los convenios que faltan, lo anterior debido a que el plazo de ejecución se está agotando y se hace necesario garantizar el cumplimiento de cada convenio.
- Asimismo, se le reitera a la Interventoría el tema de las vallas, los Elementos de Protección Personal - EPP- al nuevo personal que se ingresó y la capacitación que se le debe realizar al personal de cada Junta de Acción Comunal.
- Se le reitera a la Interventoría ser muy cautelosos con la información que está proporcionando y con los datos que realmente están en obra, lo anterior en aras de evitar discordancia y/o inconvenientes futuros.

COMPROMISOS		
NOMBRE	TEMA	FECHA

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

Interventoría No. 3668 de 2024	Entrega del acta del período de julio.	22/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Entrega del cuadro comparativo entre la cantidad de obra proyectada en el año 2024 vs lo proyectado en el año 2025	25/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Proyectar oficio circular a los organismos de Acción de Comunal donde se les exprese que la custodia y cuidado del material corresponde a los representantes legales	20/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Inicio de Obras de Participación Comunitaria	25/08/2025 - 4 29/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Realizar visita previa al acta del recibo técnico definitivo. Se debe realizar con 1 mes mínimo de anticipación. Esto se debe realizar con aquellas obras que estén sobre el 70%.	OAC Barcelona Alta y Buenavista (Circasia-Q) 21/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Revisar las OPC que incluyan el tema de luminarias para verificación técnica de los postes de instalación	25/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Insumos para responder derecho de petición JAC Cantores.	22/08/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Plan de contingencia para iniciar la ejecución de los convenios que hacen falta	21/08/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

Eliana Zuluaga Marin	
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	9-1-17
Fabián Velásquez Henao	Fabián Velásquez Henao
Jahir Alfonso Luís Sanabria	/ / /
Sara Sofía Monsalve Verjan	Sara Monsalve Verjan.
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Sandra P. Oviedo.

Scanned with CamScanner

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
15	19	08	2025	14:00 Horas	16:35 Horas

Fabián Velásquez Henao	
Luisa Fernanda Zapata López	Luisa Fernanda Zapata Lopez.
Fernando Grande Piroga Quiroga	Fernando Grande Quiroga

Scanned with CamScanner

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES

CÓDIGO	MEPI-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	de

TEMA DE LA REUNIÓN: REUNION DE SEGUIMIENTO No. 15 CONTRATO INTERV. No. 3668-2024

HORA DE INICIO: 2:00 pm

FECHA: 19/08/2025

DEPENDENCIA CONVOCANTE: D.T. QUINDIO — INVIAS

LUGAR DE LA REUNIÓN: SALA JUNTAS D.T. QUINDIO

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS QUINDIO	PROF. ESPECIALISTA.	3113250787	fgarcia@invias.gov.co	
2	Sandra P. Quiceno.	Interventoria	Financiera	316400 parte	contabilidad.cdvzt@gmail.com	Sandra Quiceno
3	Luisa Fernanda Zapata Lopez	Interventoría	P. Social	3128538898	profesionalsocial2t@gmail.com	Luisa F. Zapata L.
4	Sara Monsalve Vergara	Interventoria	Ingeniera Auxiliar	3143130946	ingsaramonsalve.cdvzt@gmail.com	Sara Monsalve Vergara
5	Fabian Velasquez Marin	Interventoría	Prof. Ambiental	3187459550	desarrollovial2Tambital@gmail.com	Fabian Velasquez
6	Eliana Zaloaga M.	Invias Quindio	contratista	3244195590	ezaloaga@invias.gov.co	
7	JAHIR A JUAN S.	Interventoría	Director	3138914120	directorinterventoria@gmail.com	9/17
8	Fernando Grande Quiroga.	Interventoría	Residente	3002498851	residentecdesarrollovial jfgran 2t@gmail.com	Fernando Grande Q.
9	Diego A. Aragon Olivar	Invias Quindío	Apoyo Prof. DTQ.	3166460661	daragon@invias.gov.co	
10	Santiago Ospina Vargas	INVIAS. DTQuindio	Contratista. Prof. Soc.	3117601124	sospina@invias.gov.co	

Scanned with CamScanner
