ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Eliana Zuluaga Marín	Contratista – INVIAS DT Quindío
Santiago Ospina Vargas	Contratista – INVIAS DT Quindío
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista – INVIAS DT Quindío
Alexander Montenegro Solano	Contratista – INVIAS DT Quindío
Fabian Fernando Rincón Alzate	Contratista – INVIAS DT Quindío
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Fernando Grande Piroga	Interventoria No. 3668 de 2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024
Luisa Fernanda Zapata López	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Lectura de compromisos

La Dirección Territorial Quindío presentó a los ingenieros Alexander Montenegro Solano y Fabián Fernando Rincón Álzate, quienes se vinculan para apoyar la supervisión de la Dirección Territorial Quindío al contrato de interventoría.

- Se resolvieron inquietudes a los ingenieros que ingresan en calidad de apoyo a la supervisión, relacionadas con el funcionamiento y ejecución del programa de convenios solidarios. Se les indicó que dentro de sus funciones deberán realizar seguimiento social y ambiental.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

- Se solicitó a la interventoría realizar nuevamente la convocatoria a cada Junta de Acción Comunal (JAC), con el fin de garantizar su participación en la reunión programada para el 25 de agosto de 2025, asegurando la asistencia tanto de contadores como de ingenieros.
- Se reiteró que la interventoría debe contar con los insumos derivados de los balances financieros, avances de obra y actas respectivas, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Asimismo, se recordó que los convenios y contratos finalizan el 31 de octubre de 2025, por lo que se debe garantizar la entrega a satisfacción de las obras y demás componentes, junto con la presentación de una propuesta de acciones de mejora.

Actas en trámite:

- El acta de junio ya fue enviada y tramitada ante la Subdirección en Bogotá.
- El acta de julio se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la Dirección Territorial.
- Se indicó que los reportes de avance semanal deben coincidir con la matriz de seguimiento, conforme a lo solicitado en el correo enviado por el ingeniero Neira, en el cual se requiere un informe detallado.
- El ingeniero Fernando García Giraldo manifestó su preocupación, dado que ninguna Junta de Acción Comunal ha entregado aún los rendimientos financieros. La interventoría informó que ha remitido oficios a las juntas solicitando dicha entrega y debe presentar cuadro de avance de los rendimientos que fue enviado por comunicado.
- Se registró que aún no han iniciado las obras correspondientes a las JAC de Piamonte, Chaguala, Coqueta, Arenales, Resguardo Indígena, y que en la JAC de La Argentina se presentan inconvenientes con el profesional designado.
- La interventoría informó que remitió un oficio a Bogotá solicitando información sobre los convenios ubicados en zonas de Ley Segunda, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta oficial.
- Se indicó que, teniendo en cuenta el aval ya otorgado de los convenios que están dentro de ley 2da, los convenios deben iniciar. La CRQ expedirá a cada Junta un oficio en el cual se precisará que no existe inconveniente para el inicio.
- Se recordó a la interventoría que los compromisos adquiridos deben cumplirse y quedarán sujetos a verificación mediante oficios de seguimiento.
- Por parte de la supervisión se indicó que la interventoría debe presentar todos los avances de obra, teniendo en cuenta la fecha de terminación de los convenios.
- Se reiteró que debe cumplirse con la instalación de la valla informativa y con la entrega de los rendimientos financieros de cada Junta.
- La supervisión recomendó preparar con antelación las cartas que deben remitirse a la CRQ, en atención a lo solicitado por Bogotá en materia ambiental.
- La interventoría informó que en la fecha se radicó el plan de contingencia, en el cual se contempla el acompañamiento a mesas de trabajo y el seguimiento a las Juntas de Acción Comunal.

TEMA 1: Lectura de compromisos

- Se realizó entrega del acta del período de junio, el acta de julio está en revisión por parte de la Dirección Territorial.
- Se entregó el plan de contingencia a través de correo electrónico el día 25/08/2025.

TEMA 2: Componente Técnico

- Dentro de los avances técnicos mencionados por la interventoría No. 3668 de 2024, está:

ACTA No.	FECHA			HORA	
16	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #2

Total Inversión =$ 1´264.100.957_____ 100%
Inversión programada = $ 528,894,672_____ 41,84%
Inversión ejecutada = $ 369,541,639,32_____ 29,23%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5´842.265.473_(100%)_____ VS._____ Total Ejecución =$ 1,060,748,013,94 (18 %)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA

2470-2024 La Venada = 56,7%
2552-2024 Barcelona Alta = 88,7%
2554-2024 Buenavista = 92,3%
4272-2024 Villa Exito = 66,7%
2388-2024 Topacia y Rio Lejos = 75,6%
2235-2024 Topacia alta = 50,3%
2638-2024 Patio bonito = 46,6%
3539-2024 Cantores = 53%
4006-2024 Padilla = 42,7%
2968-2024 Maravelez = 39,9%
3922-2024 La popa = 32,5%
3922-2024 La Montaña = 17,4%
2767-2024 Los Balsos= 3,6 %
2764 – 2024 Los Juanes = 4,2%
3737 – 2024 San Juan de Carolina= 2,3%

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

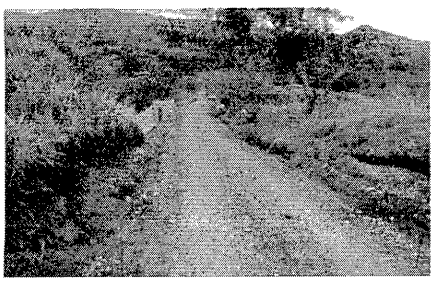
- La interventoría informó que el profesional en ingeniería renunció y, adicionalmente, se ha solicitado una gran cantidad de material, situación que ha generado inconvenientes para la terminación de las actividades. En consecuencia, se le indicó a la interventoría que la supervisión no validará más jornales, dado que el avance ha sido limitado.
- Al consultar por el balance, la interventoría señaló que aún no se cuenta con dicho documento. Por lo tanto, se acordó coordinar con el ingeniero Fabián la entrega del balance para el miércoles, con el fin de que quede validado. Así mismo, se solicitó establecer la fecha exacta de finalización y resolver el tema documental pendiente.
- Se requiere información sobre el oficio ambiental enviado a la Subdirección, incluyendo el número de radicado correspondiente.
- Se solicita el inicio y entrega de la OPC, junto con la fecha de finalización.

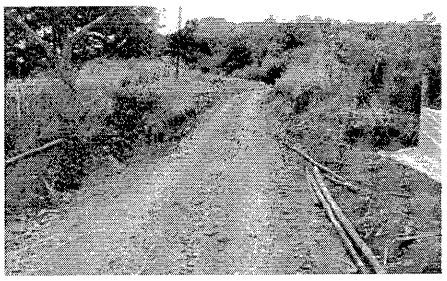
CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la conformación con maquinaria del terreno hasta 100 metros.

PROGRAMADO 6,4 % **EJECUTADO 3,6%**





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se inicio con la ejecucion el dia 12 de agosto de 2025 y llevan ejecutado el 3,6% del convenio



ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas


CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Perfilamiento de la entrada a la escuela, extendido de piedra en la franja central, corte y figurado de acero
Continuar las actividades para la construcción de la placa huella.

PROGRAMADO 69,4% EJECUTADO 89,1 %



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS



- Se requiere el balance, teniendo en cuenta que la obra ya finalizó. No obstante, está pendiente el ingreso a la escuela y la construcción de un bordillo faltante. La terminación se programó para el 28 de agosto de 2025.
- Se solicita el documento de entrega y recibo definitivo de la obra, el cual debe incluir los balances, lo ejecutado y la entrega de todos los componentes.
- La OPC quedará lista una vez se disponga del material correspondiente en campo.
- Se recomienda enviar las cartas de la CRQ por parte del área ambiental, con el fin de realizar el cierre ambiental.

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la conformación con maquinaria del terreno hasta 100 metros.

PROGRAMADO 6,4% EJECUTADO 4,2 %

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- La supervision indica que se debe tener en cuenta el drenaje de la via, por la parte social se debe de realizar un acta de vencidad con la comunidad, con los dueños del predio para la realizacion de las ventanas de descarga, y al finalizar un acta de satisfaccion.




ACTA No.	FECHA			HORA	
16	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Corte y figurado de acero
- Extendido y amarrado de acero en la margen izquierda
- Vaciado de concreto en la margen izquierda en el k0+102 al k0+133
- Se continua con extendido y colocación de concreto, excavaciones para viga riostra y vaciado de concreto

PROGRAMADO 67,3 % EJECUTADO 87,6%

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Hace falta los bordillos, ya esta para terminacion.
- La OPC esta pendiente del plan de compras, es un salon comunal.

CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO




ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la instalación de acero y formaleta para 6 módulos de cuneta y 12 módulos de placa huella

Realiza el vaciado de 11, 4 m^3 de concreto premezclado, distribuidos de la siguiente manera: 12 módulos de placa huella; 7 módulos de cuneta; 6 vigas riostras de 5 m ; 12ml de bordillo

Proxima semana: Se continuará con al instalación de acero y formaleta en módulos finales y en placa de acceso para realizar la ultima fundida programada

PROGRAMADO 49,5 % EJECUTADO: 50,9%

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se ha presentado inconvenientes con el personal cambio del maestro de obra, no hay rendimientos.
- Recomendación por parte de supervision enviar oficios a la junta solicitando los rendimientos.
- Se debe de realizar acta de recibo previo.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas



CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fundida de 2 módulos de placa huella y dos módulos de cuneta, un módulo a cada lado de la vía. Trabajo realizado en el segmento inicial Armado de acero para placa de acceso Fundida de dos módulos de concreto ciclópeo en el tramo final de la vía abscisas k0+ 039.6 a K0+046

Próxima semana: Se finalizará el primer tramo que consta de 50m con la fundida de la rampa de inicio la rampa de acceso y Se realizará el corte y figurado de acero y armado de formaleta para el segundo tramo propuesto

PROGRAMADO 29 % EJECUTADO 32,5 %


- Se presenta un inconveniente relacionado con la nómina. La interventoría debe validar las certificaciones bancarias, revisando los números de cédula y de cuenta. Cuando esta información no se envía de manera correcta, se dificulta la labor de revisión de la interventoría y se generan demoras en el giro de la nómina, debido a la falta de entrega de información clara por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Se tiene planeado finalizar la obra en el término de un mes, por lo cual se solicita establecer un plazo exacto de terminación.

CONVENIO 2388-2024, CIRCASIA VEREDA LA TOPACIA Y RÍO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- TRAMO 1. K0 + 000 - K0 + 033: Se realiza la colocación del acero de refuerzo, instalación de formaleta y vaciado de concreto de la cuneta derecha. TRAMO 2. K0 + 033 - K0 + 052: Se realiza la instalación de formaleta para la cuneta derecha y la colocación de acero de refuerzo de la cuneta derecha.
- Se continuará con la actividad de acero de refuerzo, colocación de formaletas y vaciado de concreto para huella izquierda y vigas riostras

PROGRAMADO 63,3 % EJECUTADO 70,9 %





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se debe de realizar acta de recibo previo por parte de la supervisión.
- La OPC no se ha iniciado les hace falta el plan de compras, (adecuaciones salón comunal)

GENOVA

ACTA No.	FECHA			HORA	
16	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas


CONVENIO 2235-2024, CIRCASIA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRAMO 2. K0 + 000 – K0 + 027: Se realiza la instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y vaciado de concreto del bordillo derecho. Se realizan labores de sobre acarreo de material pétreo entre los tramos 1 y 2.

Próxima semana: Se continuara con la instalación de formaleta, acero de refuerzo y vaciado de concreto de huella izquierda y vigas riostras en el tramo 1

PROGRAMADO: 47,7 % **EJECUTADO 50,30%**





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 2638-2024, MONTENEGRO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza de acero y vigas riostras de material acumulado por lluvias
- Encofrado de franja izquierda de huella-cuenta k0+070 - k0+080
- Alistamiento, preparacio y vaciado de concreto para huella-cuneta de franja izquierda K0+080- k0+0135
- Proxima semana: Se continua con localizacion y replanteo para armado de acero #3 en costado izquierdo k0+60 - k0+74

PROGRAMADO 42,8 % **EJECUTADO 46, 6%**


CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se encuentran en el 46%, se realizó prórroga hasta el 31 de octubre de 2025.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza y aseo k0+000 - k0+083. - Fabricación de rampa para acceso de franja izquierda. - corte y figurado de refuerzo transversal para franja en huella y cuneta costado derecho en banco.- Traslado y acopio de material de agregados, piedra guayaba.
- PRÓXIMA SEMANA: Localización y replanteo de franjas de carpeta de rodadura en costado derecho, encofrado de paños de concreto piedra pegada, corte y figurado de acero #3 para refuerzos trasversales.k0+000,

PROGRAMADO 46,6 % **EJECUTADO 53%**





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se requiere dar respuesta oportuna y clara de los requerimientos enviados de forma anónima.
- La supervisión indica tener la bitácora en cuanto al concreto, y revisar que la placa no tenga fisuras
- La interventoría deberá de entregar un documento de aprobación de cambios técnicos y deben de estar dentro del tramo postulado.



CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la fundición para el concreto ciclópeo de los 9 módulos faltantes del costado derecho de la placa huella. Se realizan actividades de limpieza de la vía e instalación de afirmado iniciando y terminando la huella para dar paso a lo vehículos por este lado y comenzar a intervenir el costado izquierdo.

Se continuara con las actividades de replanteo y localización de la huella izquierda.

PROGRAMADO 34,3 % **EJECUTADO 42,7 %**

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Iniciaron el 15 de julio y llevan un avance de 42.

ACTA No.	FECHA			HORA	
16	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas



- La Supervisión indica que el avance de esta obra ha sido muy lento, por lo tanto, se requiere un mayor avance. La interventoría indica inconveniente con el personal no ha sido estable, hubo demora para la maquinaria.
- El profesional técnico en la interventoría debe de hacer presencia constante en la obra, ser rigurosos.



ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas







- Falta radicar la OPC

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Interventoría No. 3668 de 2024	Fecha de entrega de los balances, fecha de entrega de los OPC de todos los convenios	**26/08/2025**
Interventoría No. 3668 de 2024	Radicar las OPC del Cabildo Dachi Agore Drua y las JAC La Argentina, La Coqueta y La Montaña	**29/08/2025**
Interventoría No. 3668 de 2024	Radicar las OPC de las JAC Asocomunal Calarcá, Chagualá y Arenales.	**05/09/2025**
Interventoría No. 3668 de 2024	Ambientales pendiente de radicar 5 (San Juan De Carolina, Los Pinos, Los Juanes, Los Balsos, La Argentina)	**29/08/2025**

ACTA No.	FECHA			HORA	
16	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	
Santiago Ospina Vargas	No asistió
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Alexander Montenegro Solano	
Fabián Fernando Rincón Alzate	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Fernando Grande Piroga Quiroga	

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
16	25	08	2025	08:00 Horas	10:35 Horas

Sara Sofía Monsalve Verjan	Sara Monsalve Verján
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Sandra Patricia Oviedo.
Fabián Velásquez Henao	Fabián Velasquez H.
Luisa Fernanda Zapata López	Luisa Fernanda Zapata López.

INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	MEPI-FR-4
		VERSIÓN	1
	FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	PÁGINA	de

TEMA DE LA REUNIÓN: REUNION DE SEGUIMIENTO No. 16 - CONTRATO 3668-2024 | HORA DE INICIO: 8:00 a.m. | FECHA: 25/08/2025

DEPENDENCIA CONVOCANTE: D.T. QUINDIO. | LUGAR DE LA REUNIÓN: D.T. QUINDIO

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS DT QUINDIO	SUPERVISOR CTO DE INTERV. No. 3668	3113250287	fgarcia@invias.gov.co	
2	Diego Alfredo Aragón Oliver	INVIAS DTQ.	Apoyo Supervisión	316 6460661	daragon@invias.gov.co	
3	Fabian Fdo Rincón Alzate.	INIAS DTQ	Apoyo supervisión	3102036685.	frincon@invias.gov.co	
4	Jahir Alfonso Luis S	Interventor CDV 2T	Director Interventoría	3138914170	Directordesarrollovial2T@gmail	
5	Fernando Grande O.	Interventoría CDV 2T	Residente Int.	3002498851	jfernando780@yahoo.es	
6	Fabian Velasquez Moreno	Interventoría CDV 2T	Prof. Ambiental	3187459550	desarrollovial2Tambiental@gmail.com	
7	Eliana Zuluaga Marin	INVIAS DT	Abogada	3244195590	ezuluaga@invias.gov.co	
8	Luis Fernando Zapata López	Interventoría	Prof. Social	3128538898	profesionalsocial2te@gmail.com	
9.	Sandra Patricia Quicos	Interventoría.	Financiero.	3164009958.	contabilidad.cdv2t@gmail.com	
10.	Alexander Montenegro Solano.	INVIAS.	Contratista.	3016598199.	Amontenegro@invias.gov.co	
