ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la verificación, control y supervisión de la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas D.T. Quindío
Convocada por:	Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías - INVIAS		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Fernando García Giraldo	Funcionario – INVIAS D.T. Quindío
Eliana Zuluaga Marín	Contratista – INVIAS D.T. Quindío
Santiago Ospina Vargas	Contratista – INVIAS D.T. Quindío
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista – INVIAS D.T. Quindío
Alexander Montenegro Solano	Contratista – INVIAS D.T. Quindío
Fabian Fernando Rincón Alzate	Contratista – INVIAS D.T. Quindío
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Contrato de Interventoria No. 3668 de 2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Contrato de Interventoria No. 3668 de 2024
Anamaría Madroñero Melo	Contrato de Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Contrato de Interventoria No. 3668 de 2024
Luisa Fernanda Zapata López	Contrato de Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Contrato de Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Bienvenida

- Se realiza saludo inicial a la Interventoría No. 3668 de 2024, donde se mencionó que esta es la reunión de seguimiento número 17. Por parte de la interventoría se menciona que, a la fecha, el ingeniero residente

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

ya terminó su contrato y la Interventoría se encuentra en los trámites de ingreso del nuevo residente y/o auxiliar de ingeniería de apoyo e inspectores.

- La Interventoría No. 3668 de 2024, menciona que los inspectores sí están realizando el seguimiento a las obras; no obstante, en ocasiones debido a la organización interna, los inspectores ingresan a las obras a destiempo, es decir, que las obras inician y posterior a ello, ingresa el inspector. La Interventoría aclara que esto también se debe a que las Juntas inician las obras sin notificar a la Interventoría, por lo cual, están solicitando a través de oficio ese aviso.
- La supervisión del contrato de Interventoría insiste y manifiesta al director de la Interventoría que se debe contar mayor presencia, control y seguimiento por parte del área técnica en las zonas de obra de los convenios, asimismo, se expresa que este seguimiento debe ser integral abarcando: cantidades de obra, calidad de obra y demás. Al igual que por parte de la supervisión del contrato de Interventoría, se solicita que haya mayor seguimiento por parte de la Interventoría en cuanto al cumplimiento de las obras en su plazo contractual y en los cronogramas estipulados de los convenios. Finalmente, la supervisión expresa que la responsabilidad total e integral del cumplimiento de todos los aspectos de los convenios la tiene la Interventoría No. 3668 de 2024.
- El apoyo técnico a la supervisión del contrato de Interventoría No. 3668 de 2024, expresa que el jueves 28 de agosto se realizaron las visitas a siete (07) Juntas de Acción Comunal y como resultado de ello, se encontraron una serie de observaciones para la interventoría; reiterando que la responsabilidad del seguimiento, supervisión, verificación y control a la ejecución técnica y de todos los componentes de las obras a cargo de los Organismos de Acción Comunal - OAC depende netamente de la Interventoría.
- Dentro de las observaciones mencionadas, se expresan:
  1. Se evidenció material pétreo que puede no estar en coherencia con lo estipulado en la cartilla por parte del Instituto. En ese sentido, se le expresa a la Interventoría que cuando se hagan cambios o uso de materiales diferentes a los estipulados en cartilla por parte de los OAC, la Interventoría debe evaluar y aprobar dichos cambios o usos de materiales diferentes, toda vez que se verifique que cumpla con la calidad y estabilidad de la obra.
  2. En algunos proyectos se evidenció que el material y/o piedra que se está utilizando en los sobreanchos de la vía puede estar presentando sobretamaños, pues estas presentan diferentes dimensiones que en ocasiones puede que no estén cumpliendo con lo que el Instituto estipula, por lo que se solicita a la interventoría verificar el retiro de estos sobretamaños o se evalúe la necesidad de cambio de proveedor de material a uno que garantice la homogeneidad del material. A su vez, se menciona que la piedra cuando se instala en el centro o bordes, se están realizando con martillos metálicos que, en ocasiones, pueden fracturar la piedra y es menester por parte de la interventoría verificar si es necesario su cambio.
  3. Se solicita a la interventoría verificar que los acopios del material se realicen de manera adecuada, en cuanto a su la ubicación, a su debida señalización u acordonamiento y a la separación para evitar la contaminación y el detrimento de la calidad de la obra. En ese sentido, la supervisión por parte de la Dirección Territorial Quindío expresa que esta clase de observaciones no deberían estar presentándose, toda vez que la Interventoría cuenta con una serie de profesionales capacitados e idóneos para asumir la responsabilidad que esto abarca, no obstante, se realizan como observaciones que para salvaguardar y prevenir cualquier inconveniente que se pueda presentarse con relación a la calidad de la obra.
  4. Con relación al acero de refuerzo y a los cambios en su figuración, estos pueden darse considerando la previa revisión, aprobación y documentación por parte de la Interventoría.
  5. En cuanto a la ejecución en obra, algunos traslapos se solicita verificar y revisar en cuanto a sus longitudes y distribuciones en la obra, igualmente se solicita verificar que los ganchos cuenten con los dobleces estipulados según los planos de construcción y/o normativa vigente.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

6. Se resaltan que algunas OAC están cumplimiento adecuadamente con su ejecución. No obstante, se le sugiere a la Interventoría realizar visitas, documentar cada situación y subsanar situaciones antes de terminar las respectivas obras.
7. Se observaron superficies de apoyo con agentes contaminantes como: hojas, tierra y demás. Por lo que se solicita a la interventoría verificar que estas superficies cuenten con la limpieza necesaria previo al vaciado de los concretos.
8. Se sugiere a la Interventoría realizar seguimiento a la calidad de la obra y documentarlo, verificando la evidencia de controles de calidad y diseños de mezcla.
9. La señalización debe ir en coherencia al manual de señalización vigente, en ese sentido, se evidenciaron en ciertos proyectos que podría estar acatando el citado manual así como su Plan de Manejo de Tránsito -PMT-. Por lo cual, se sugiere a la interventoría tomar acciones y mejores medidas entorno a esto, con el propósito de mejorar la seguridad vial de todos los usuarios que transitan por las zonas de obra, así como documentarlo.
10. Se le sugiere a la Interventoría realizar la verificación estricta al uso de los Elementos de Protección Personal -EPP-, igualmente se solicita a la interventoría realizar el control y seguimiento de que todo el personal presente en obra cuente con las afiliaciones a la seguridad social integral y parafiscales.
11. Se le recuerda a la Interventoría que es necesario garantizar las juntas en los bordillos en aras de evitar posibles fisuras o grietas en estos elementos.
12. Se recomienda a la interventoría revisar adecuadamente todo lo relacionado con el componente social.
13. Se le sugiere a la Interventoría verificar la rectificación de los alineamientos longitudinales de las vigas riostras, así como sus juntas y acabados de obra.

- La supervisión por parte de la Dirección Territorial Quindío aclara que lo anterior corresponde a la exhortación que se le realiza a la Interventoría en aras de poder tomar acciones de mejorar y evitar inconvenientes por calidad de obra. Asimismo, se recuerda a la Interventoría No. 3668 de 2024 el acatamiento de la Cartilla de Obras Menores, ya que esta estipula la adecuada ejecución de las obras que se realizan.

TEMA 2: Compromisos

- De acuerdo con los compromisos adquiridos la reunión pasada, se tiene que:
  1. A la fecha no se ha cumplido con el compromiso "de entrega de los balances y de entrega de los OPC de todos los convenios", la Interventoría menciona que a la fecha se cuenta con cinco (05) balances.
  2. Se cumplió con la primera radicación de las OPC de los convenios concernientes a Dachi Agore Drua, La Argentina, La Coqueta y La Montaña.
  3. A la fecha no se ha cumplido con los radicados ambientales de los convenios concernientes a San Juan De Carolina, Los Juanes, Los Pinos, Los balsos y La Argentina. No obstante, la Interventoría se compromete a realizarlo hoy 01 de septiembre de 2025.

TEMA 3: Componente técnico

- Con el propósito de iniciar la reunión de avance, la Interventoría No. 3668 de 2024 se permitió presentar la siguiente presentación:

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.

CCPT INTERVENTORIA 3668 de 2024

DESARROLLO VIAL 2T

COMITÉ DE SEGUIMIENTO – 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- Se le solicita a la Interventoría realizar el seguimiento y cumplimiento de los convenios y las tareas que se le asignan semanalmente a la Interventoría.
- Para el día 05 de septiembre los veintiocho (28) convenios deberán estar completamente en ejecución, por lo que se solicita a la interventoría imprimir toda la celeridad y gestión necesaria en la aprobación de los planes de compra. Asimismo, la supervisión reitera a la interventoría que los veintiocho (28) balances de obra deben entregarse en su totalidad a mas tardar el día 12 de septiembre, presentando un avance significativo (mínimo el 50% - catorce (14) convenios) el día 08 de septiembre de 2025.
- Se le reitera a la Interventoría No. 3668 de 2024, que el día 02 de septiembre de 2025 se realizará una reunión presencial con el representante legal del convenio solidario No. 2470 de 2024, con el propósito de socializar las problemáticas de recurso relacionadas con la ejecución del proyecto.
- A la fecha, faltan cinco (05) pólizas por comprar, por lo cual, se le solicita a la Interventoría agilidad y seguimiento para poder cumplir con esta obligación.
- Desde la supervisión del contrato de interventoría No. 3668 de 2024, nuevamente se solicita a la Interventoría la presentación de la subsanación de las observaciones manifestadas por la Territorial del INVIAS al acta mensual de costos y al informe mensual de interventoría correspondientes al período de julio de 2025. Asimismo, se solicita a la interventoría la entrega oportuna del acta mensual de costos y el informe mensual de interventoría del período de agosto de 2025.
- La información de los avances de obras se realizaron por parte de la interventoría a corte del 28 de agosto de 2025. Estos fueron:


CONVENIO 2470-2024, GÉNOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

KO + 042 – KO + 041; KO + 082 – KO + 088. se realiza la instalación del acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la huella derecha, cuneta derecho
KO + 032 – KO + 041: Se realiza la instalacion de acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la huella izquierda y vigas riostras.
KO + 035 – KO + 070. Se realiza la instalación de acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la cuneta izquierda.

PROGRAMADA	(0,00%)
EJECUTADA	(65,28%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-5,95%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se procede a leer lo expuesto. Se menciona la situación que está sucediendo con relación al material.

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Vaciado de concreto ciclópeo en la franja central en un total de 20 ml
Se realiza acta de recibo previo




CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- Se menciona que la Interventoría realizará un oficio para la ejecución urgente de las actividades pendientes.

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Fundido de concreto ciclópeo en la franja central
Limpieza de la zona
Se realiza acta de recibo previo



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- Le faltan ejecutar los ciclópeos y bordillos, por lo cual, se le solicita a la Interventoría No. 3668 de 2024 verificar la finalización de esta obra en el menor tiempo posible.

CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la instalación de arcén y formaleta para 4 módulos de cuneta y 4 módulos de placa huella
Se realizan el vaciado de 4,7 m^3 de concreto premezclado, distribuidos de la siguiente manera:
4 módulos de placa huella
4 módulos de cuneta
2 vigas riostras de 5 m
38,9 ml de bordillo



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- Faltan la construcción de rampas de acceso y de ciclópeos.


ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RIO LEJOS




- Faltan la ejecución ciclópeos. Se solicita mayor seguimiento por parte de la Interventoría.

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

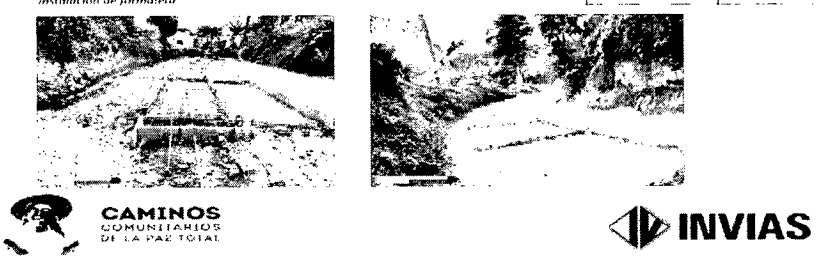

- Se procede a la lectura de la diapositiva.

CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

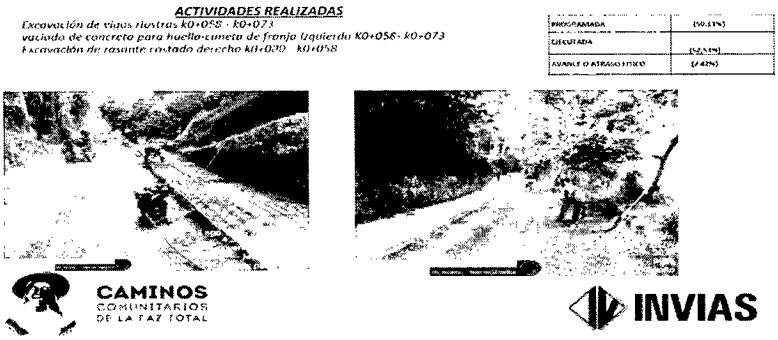

- Se manifiesta que el avance de este convenio es muy bajo, por lo cual, se solicita mayor seguimiento por parte de la Interventoría.

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas


CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Corte y figurado de aceros tanto de riostras como de refuerzos, así como la fundida de huella y cuneta, desde la KO +000 hasta la KO +027

PROGRAMADA	(58,10%)
EJECUTADA	(55,19%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-2,91%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- Se procede a la lectura de lo anexo en la diapositiva.


CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza vaciado de concreto para la huella de los 8 módulos faltantes del costado izquierdo de la placa huella.
Se realiza la losa de transición para este costado izquierdo y también una losa de conexión de la placa huella con una entrada de una vereda

PROGRAMADA	(42 %)
EJECUTADA	(51,8 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(9,76 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se procede con la lectura de lo anexo a la diapositiva. La interventoría se menciona que se envió oficio sobre el cierre de la vía para la ejecución de las obras.

CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo vaciado del concreto de huella y vigas riostras para los 12 módulos del costado derecho de la placa huella del segundo trama, dando en total 40 ml de placa huella aproximadamente.

PROGRAMADA	(54,9 %)
EJECUTADA	(44,4 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-10,46 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona un bajo avance en la obra física.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas


CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizaron actividades en obra

PROGRAMADA	(37,7 %)
EJECUTADA	(31,55%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-5,27 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- No se presentó ejecución en la obra, debido a que no se cuenta con el personal. Por lo cual, la Interventoría menciona que hoy enviarán oficio a la Junta de Acción Comunal solicitando avance.

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Armado de acero tanto de huella margen derecha como de cuneta margen derecha desde K0 036 y K0+030.
Vaciado de concreto de huella y cuneta de 3 huellas y fundida de piedra pegada costado derecho

PROGRAMADA	(34,6 %)
EJECUTADA	(26,8%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-8,46 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- Se solicita mayor seguimiento por parte de la Interventoría.

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Conformación y compactación de material de sub base
Excavación de vigas riostras k0+000 - k0+042

PROGRAMADA	(17,3 %)
EJECUTADA	(9,1 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-8,12 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

- Se procede a leer lo anexo a la diapositiva. Se resalta que el avance es muy bajo.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavaciones y conformación de sub base en un total de 42 ml
Corte figurado de acero para vigas riostras





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se procede a leer lo anexo a la diapositiva.

CONVENIO 2385-2024, PIJAO VEREDA LA MARIELA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la conformación con maquinaria del terreno en busca de la rasante k0+080 - k0+090
Compactación de sub base con maquinaria pesada vibro compactador k0+030 - k0+110





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se procede a leer lo anexo a la diapositiva.

CONVENIO 3347-2024, SALENTO VEREDA CANAAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza excavaciones de viga riostra
Se realiza conformación con subbase
Se realiza corte y figurado de acero para viga riostras





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se procede a leer lo anexo a la diapositiva. Se resalta preocupación por avance.

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas


CONVENIO 2664-2024, SALENTO VEREDA LOS PINOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la conformación de la cuneta izquierda
Extendido y amarrado de acero de parrillas
Vaciado de concreto de franja de circulación izquierda desde el k0+000 al k0+015.6
Vaciado de concreto de cuneta de la margen izquierda desde el k0+000 al k0+015.6

PROGRAMADA	[illegible]
EJECUTADA	[illegible]
AVANCE O ATRASO FISICO	[illegible]





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se procede a leer lo anexo a la diapositiva.
- Para finalizar, se presenta esta diapositiva, con el avance general de ejecución de los 29 convenios.

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #2

Total Inversión =$ 1´264.100.957_____ 100%
Inversión programada = $ 528,894,672_____ 41,84%
Inversión ejecutada = $ 369,541,639,32_____ 29,23%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5´842.265.473_(100%)____ VS.____Total Ejecución =$ 1´232.127.675,55 (21%)

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Para finalizar, se solicita especial cuidado con los convenios correspondientes a los Organismos de Acción Comunal de: La Venada (Génova-Q), Canaán (Salento-Q) y La Popa (La Tebaida-Q).

TEMA 4: Componente social y ambiental

- De lo social, la interventoría indica que quedaran cuatro (04) convenios radicados para el día 05 de septiembre de 2025. Para quedar un total de dos (02) convenios pendientes por realizar la primera radicación. Se deben allegar a esta Dirección Territorial los avances de las Obras de Participación Comunitaria -OPC- y presentar avance de las demás actividades estipuladas en el Plan de Gestión Social. Asimismo, se le solicita a la Interventoría No. 3668 de 2024 realizar un acta donde el Organismo de Acción Comunal asuma completamente responsabilidad del mantenimiento, custodia y cuidado de la OPC que se instale.
- Se le recuerda a la Interventoría No. 3668 de 2024, ser muy cautelosos con la revisión de los materiales y proveedor que se implementen y compren para la ejecución de la OPC, pues estos deben coincidir con los enviados y aprobados por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.
- Se reitera la capacitación de "Inclusión Social con Perspectiva de Género" que la dictará el Subdirección de Sostenibilidad, asimismo, se le expresa la Interventoría que la Dirección Territorial Quindío ya realizó el apoyo a la convocatoria de los representantes legales de los Organismos de Acción Comunal, por lo cual, la responsabilidad de la Interventoría es garantizar la asistencia y tomar las evidencias.

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas



- De lo relacionado con el aspecto ambiental, la interventoría indica que se han radicado once (11) convenios, y que para el día 05 de septiembre de 2025 se radicará un total de nueve (09) convenios más. Los ocho (08) convenios restantes se radicarán a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024	Radicación de cuatro (04) convenios en el componente social	**05/09/2025**
Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024	Radicación de nueve (09) convenios en el componente ambiental	**05/09/2025**
Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024	Radicación de ocho (08) convenios en el componente ambiental	**15/09/2025**
Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024	Ejecución de obra en los veintiocho (28) convenios	**05/09/2025**
Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024	Veintiocho (28) balances de obra deben entregarse en su totalidad	**12/09/2025**
Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024	Avance de mínimo del 50% de los balances de obra a entregar (mínimo catorce (14) convenios)	**08/09/2025**

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
17	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

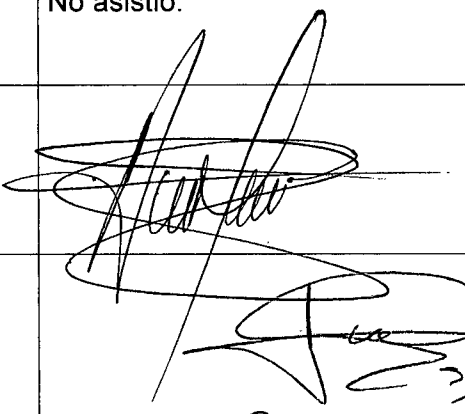Eliana Zuluaga Marín	No asistió.
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	No asistió.
Alexander Montenegro Solano	
Fabián Fernando Rincón Alzate	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Sara Sofía Monsalve Verjan	Sara Monsalve Verjan.
Anamaría Madroñero Melo	

ACTA No.	FECHA			HORA	
17	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

Fabián Velásquez Henao	Fabian Velasquez H.
Luisa Fernanda Zapata López	Luisa Fernanda Zapata L.
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Sandra P. Oviedo R.

INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	MEPI-FR-4
		VERSIÓN	1
	FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	PÁGINA	1 de 1

TEMA DE LA REUNIÓN: REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERV. 3668 DE 2024 — HORA DE INICIO: 8:10 am — FECHA: 01/09/2025

DEPENDENCIA CONVOCANTE: INVIAS D.T. QUINDIO — LUGAR DE LA REUNIÓN: INVIAS QUINDIO

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS QUINDIO	PROFESIONAL ESPEC	3113250287	fgarcia@invias.gov.co	
2	Anamaria Madroñero Melo	Interventoria	Auxiliar de interventoria	3177663639	insp.anamariamadroñero@gmail.com	
3	Sara Sofia Monsalve Vergara	Interventoria	Auxiliar de interventoria	3143133496	Ingsaramonsalve.cduzt@gmail.com	Sara Monsalve
4	Luisa fernanda Zapata Lopez	Interventoria	Prof. Social	3128538898	profesionalsocial2t@gmail.com	Luisa Fza Zapata
5	Fabian Velasquez Henao	Interventoria	Prof. Ambiental	3187459950	desarrollovial2Tambiental@gmail.com	Fabian Velasquez H
6	Sandra Patricia Arcos C	Interventoria	financiero.	3164109498	contabilidad-cduzt@gmail.com.	Sandra P. Arcos.
7	Jahir Alfonso Luis S.	Interventoria	Director Interventoria	3133914120.	Directordesarrollovial2t@gmail.com.	
8.	Alexander Montenegro Solano.	INVIAS.	Contratista Ops.	3016598199	Amontenegro@invias.gov.co	
9.	Fabian Fernando Rincón Alzate	INVIAS.	Contratista OPS.	3102031665	frincon@invias.gov.co	
10	Santiago Ospina Vargas	INVIAS. DTQui	Contratista. Prof Social	3117601124	sospina@invias.gov.co	
