ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías - INVIAS		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Fernando García Giraldo	Funcionario – INVIAS D.T. Quindío
Eliana Zuluaga Marín	Contratista – INVIAS DT Quindío
Santiago Ospina Vargas	Contratista – INVIAS DT Quindío
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista – INVIAS DT Quindío
Alexander Montenegro Solano	Contratista – INVIAS DT Quindío
Fabian Fernando Rincón Alzate	Contratista – INVIAS DT Quindío
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024
Luisa Fernanda Zapata López	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Bienvenida

- Se realiza saludo inicial a la Interventoría Contrato No. 3668 de 2024, donde se menciona que esta es la reunión de seguimiento número 18. En ese sentido y antes de iniciar la lectura de compromisos, la supervisión de la Dirección Territorial Quindío del Invias menciona que el día de hoy, lunes 08 de septiembre de 2025 a las 2:00 pm debe quedar listo el plan de compras de los convenios que se encuentre pendientes de su aprobación, tales como las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Dorado Alto Las Camelias y La Coqueta, para lo cual, se realizará mesa de trabajo con la Dirección Territorial Quindío y el personal que la Interventoría delegue.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

- Desde la supervisión, se le solicita a la Interventoría No. 3668 de 2024, que se debe verificar el inicio de actividades de obra entre hoy lunes 08 de septiembre de 2025 y el martes 09 de septiembre de 2025 de los convenios correspondientes a las JAC La Argentina, Arenales, el Resguardo Dachi Agore Drua, Río Verde Bajo y Paraguaicito, Chagualá y Asociación de Juntas de Acción Comunal de Calarcá. A su vez, se les solicita enviar registro fotográfico a esta Dirección Territorial hoy y mañana a más tardar a las 5:00 pm.
- Desde la supervisión, se le menciona a la Interventoría No. 3668 de 2024, que desde la semana pasada se le sugirió a su director de interventoría la posibilidad de aumentar el personal del grupo de interventoría para acompañar la supervisión y ejecución de los convenios 2024; a la fecha, la Interventoría manifiesta que ya se solicitó el cambio de cargo de la ingeniera Sara Sofia Monsalve Verjan y se presentó la nueva hoja de vida del ingeniero residente adicional. A su vez, se menciona que hoy se solicitará el ingreso de cuatro (04) inspectores nuevos. Asimismo, se menciona que a la fecha no se ha encontrado ingeniero que supla el cargo de la ingeniera Sara Sofia Monsalve Verjan, pero el Ing. Jahir Luis informa que en el transcurso de la tarde enviara al Instituto la propuesta de ingeniero auxiliar para su revisión y aprobación.
- Desde la supervisión, se le manifiesta a la Interventoría No. 3668 de 2024, que se les compartió una serie de documentos por parte de la Controlaría General de la República donde se expresan múltiples observaciones que se deben considerar en la ejecución de los convenios 2024, lo anterior en aras de evitar replicar las mismas situaciones. A su vez, se manifiesta que deben tener cautela con: los acabados de las obras, como las dilataciones de la placa huella; el ceñirse a lo estipulado en las cartillas y manuales del Instituto Nacional de Vías; así como en las dimensiones de la estructura de placa huella.
- El apoyo a la supervisión de la Dirección Territorial Quindío expresa que particularmente la Junta de Acción Comunal Patio Bonito, se requiere mayor seguimiento y control por parte de la interventoría para evitar irregularidades en la construcción de la placa huella.

TEMA 2: Lectura de compromisos

A continuación, se procede a leer y validar el cumplimiento de los compromisos pactados en la reunión pasada:

1. Radicación de cuatro (04) convenios en el componente social: Se cumplió. Están pendientes por radicar cinco (05) convenios para enviar a la Subdirección de Sostenibilidad - S.S. este viernes 12 de septiembre de 2025.
2. Radicación de nueve (09) convenios en el componente ambiental: Este compromiso, se cumplió parcialmente debido a que interventoría radicó siete (07) convenios. No obstante, se menciona que a la fecha se tienen dieciocho (18) convenios radicados y no han sido respondidos desde la S.S.
3. Radicación de ocho (08) convenios en el componente ambiental: A la fecha, este compromiso sigue pendiente por cumplir. No obstante, se reitera que el 15 de septiembre de 2025, se radicarán la totalidad de los convenios en el componente ambiental.
4. Inicio de actividades de obra y/o ejecución de obra de los veintiocho (28) convenios: A la fecha, este compromiso no se cumplió debido a que la Interventoría expresa que están pendientes por aprobar plan de compras y porque algunas JAC pese a tener el presupuesto aprobado, no inician. Se solicita a la Interventoría enviar los soportes donde se evidencie las solicitudes de inicio de actividades de obra a las JAC.
5. Veintiocho (28) balances de obra deben entregarse en su totalidad: A la fecha, este compromiso sigue pendiente y se reitera a la Interventoría su cumplimiento.
6. Avance de mínimo del 50% de los balances de obra a entregar (mínimo catorce (14) convenios): A la fecha, este compromiso no se cumplió debido a que la Interventoría manifiesta que carece de la información suficiente para cumplirlo. Entrega de la totalidad de balances queda para el 12 de septiembre de 2025.

ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

TEMA 3: Componente técnico

En cuanto a la parte técnica, la Interventoría No. 3668 de 2024 procede a exponer lo siguiente:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.

CCPT INTERVENTORIA 3668 de 2024

DESARROLLO VIAL 2T

COMITÉ DE SEGUIMIENTO – 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

Inicialmente se expone la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Charlas de Seguridad

- En cada uno de los puestos visitados se dictaron charlas de seguridad, en donde se dictaron temas como : Riesgo Biomecánico, riesgo y controles, (Levantamiento de Cargas, Pausas activas y estiramientos musculares.





Hallazgos

- Se pudo evidenciar en las visitas realizadas que en los puestos de trabajo : que en la Vereda Patio Bonito del municipio de Pijao, el personal no cuenta con la debida dotación Personal indicada para las mismas (overol)
- En la vereda Canaan se evidencio igualmente que no cuentan con mesas de trabajo adecuadas para realizar labores de corete de madera y otros.





ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

Acciones Correctivas

- 2.- Se hizo el respectivo requerimiento al señor oficial de obra de la Vereda Canaan de Salento, con el fin de que solicitara a la Junta de acción Comunal a fin de que les facilitaran los equipos necesarios para realizar las actividades como son las mesas de trabajo en madera.
- Se oficiara a la Junta de acción Comunal de la vereda Patio Bonito del municipio de Pijao para que se compren los respectivos Uniformes.

- Se menciona que dichas capacitaciones de SST, se han levantado actas.


En cuanto a la parte técnica, se tiene:

CONVENIO 2470-2024, GENOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la instalación del acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la huella derecha e izquierda y cuneta derecha e izquierda y vigas riostras.

PROGRAMADA	
EJECUTADA	
AVANCE O ATRASO FISICO	





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que los inconvenientes manifestados por el representante legal, ya se solucionaron.
- Se resalta la importancia de ser cautelosos al momento de empatar la placa huella con la carretera principal.
- La OPC ya cuenta con material y se espera que al 30 de septiembre de 2025 ya esté ejecutada al 100%.
- Se le recuerda a la Interventoría la entrega del acta de visita previa al recibo y/o entrega definitiva de la obra.

CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	
EJECUTADA	
AVANCE O ATRASO FISICO	





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que desde el componente técnico aún están pendientes por realizar ciertas actividades de obra.
- Se solicita la entrega del acta de visita previa al recibo y/o entrega definitiva de la obra.
- En cuanto a la OPC, la Interventoría manifiesta que el presidente no contesta. En ese sentido, el profesional social se compromete a llamar al presidente para poder subsanar esta situación.

ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	[81,57%]
EJECUTADA	[92,19%]
AVANCE O ATRASO FISICO	[10,62%]





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se expresa que la comunidad y la representante legal de la JAC realizarán la terminación de los procedimientos pendientes por ejecutar en la parte técnica.
- Se le reitera a la Interventoría No. 3668 de 2024 la importancia de la firma del ingeniero residente en los formatos concernientes a la liquidación y cierre.
- Se solicita la entrega del acta de visita previa al recibo y/o entrega definitiva de la obra.


CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

>Se realiza la instalación de acero y formaleta para 8 módulos de cuneta, 8 módulos de placa huella, 70.4 ml de bordillo
>Se realiza el vaciado de 5,3 m^3 de concreto premezclado, distribuidos de la siguiente manera:
-4 módulos de placa huella en el lado derecho
-4 módulos de cuneta en el lado derecho
-3 vigas riostras de 2.05 m
-35,2 ml de bordillo en el costado izquierdo, 28,8 ml de bordillo en el costado derecho
>Además, se fundieron 9 módulos centrales de concreto ciclópeo y 18 módulos laterales (9 en cada costado)

PROGRAMADA	[48,47%]
EJECUTADA	[75,29%]
AVANCE O ATRASO FISICO	[11,67%]





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se espera que la parte técnica termine el 12/09/2025 y la OPC termine el 15/09/2025.
- No se cuenta con acta de visita previa; no obstante, se solicita que se haga lo más pronto posible.

CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RIO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRAMO 2. Se realiza la instalación de acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la huella izquierda.

PROGRAMADA	[60,37%]
EJECUTADA	[80,74%]
AVANCE O ATRASO FISICO	[17,37%]





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que el primer tramo intervenido, ya está listo en su ejecución. Se espera que el segundo tramo termine el viernes 19 de septiembre de 2025.
- No se cuenta con acta de visita previa; no obstante, se solicita que se haga lo más pronto posible.
- La OPC se espera terminar para el 20 de septiembre de 2025.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRAMO 1. Ser instala de acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la huella izquierda.
TRAMO 1. Se instala de acero de refuerzo formaleta y vaciado de concreto de huellas y cunetas lado izquierdo.
TRAMO 1. Se realiza la excavacion, instalación de acero y formaleta y posterior fundida de vigas riostras

PROGRAMADA	(58,4%)
EJECUTADA	(61,8%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(3,38%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que todo el material ya está en obra. El material de la OPC no ha llegado, por lo cual, se solicita que se revise y se apoye a la JAC con este tema.
- Se espera que el 30 de septiembre de 2025 se termine la obra.
- No se cuenta con acta de visita previa; no obstante, se solicita que se haga lo más pronto posible.


CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavacion de rasante costado derecho k0+040- k0+073
Excavacion de vigas riostras k0+040- k0+073;
Corte, figurado y armado de malla de acero #3 para huella-cuneta y bordillo k0+012 - k0+073

PROGRAMADA	(57,45%)
EJECUTADA	(62,38%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(4,93%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que los anchos que presenta la obra son muy variables. Por lo cual, se le solicita a la Interventoría realizar una visita urgente en aras de poder corregir esta situación antes de fundirla. Asimismo, la Interventoría expresa que se realizará visita, se dejará en bitácora y se enviará oficio.
- Se espera que esta obra termine el 30 de septiembre de 2025.

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la disposición de formaletas de bordillo costado derecho y así mismo la fundida, desde K0+000 hasta k0+027, posterior a ello se fundió un modulo de huella y uno de cuneta hasta llegar hasta K0+030, a continuación se comenzo con instalación de formaleta para la piedra pegada costado derecho, tanto central como lateral, desde K0+030 hasta K0+069.

PROGRAMADA	(59,76%)
EJECUTADA	(65,09%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(5,33%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se espera que esta obra termine el 30 de septiembre de 2025.
- El apoyo a la supervisión técnica de la DT Quindío realizó una serie de observaciones con el propósito de realizar acciones correctivas, las cuales, ya fueron subsanadas.

ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas


- No se cuenta con acta de visita previa; no obstante, se solicita que se haga lo más pronto posible.


CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el armado e instalación del acero y formaletas para la huella de 11 modulos del costado izquierdo de la placa huella.

PROGRAMADO	(49,3 %)
EJECUTADO	(33,8%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(5,59 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se espera que JAC Padilla termine el 30 de septiembre de 2025.
- Se reitera realizar de manera pronta el acta de visita previa.


CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la fundición del concreto ciclópeo para los 12 módulos del costado derecho de la placa huella del segundo tramo, dando en total 20 ml. de placa huella aproximadamente. También se realiza la demolición, excavación y mejoramiento del suelo con material afirmado de 5cm para cunetas nuevas, en 17 ml. aproximadamente del primer tramo costado izquierdo.

PROGRAMADA	(59,3 %)
EJECUTADA	(46,66 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-12,6 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se espera que JAC Maravelez termine el 30 de septiembre de 2025.
- Se reitera realizar de manera pronta el acta de visita previa.
- OPC revisar los postes para las luminarias.


CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizaron actividades en obra

PROGRAMADA	(46,57%)
EJECUTADA	(32,5%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(14,06 %)






CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que el ingeniero ya retomó obra y ya están avanzando.
- Desde el componente social, se expresa que se va a realizar una socialización de avance con la comunidad explicando el retraso que se presenta en la obra y se solicitará a la Alcaldía Municipal el cierre total de la vía.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA

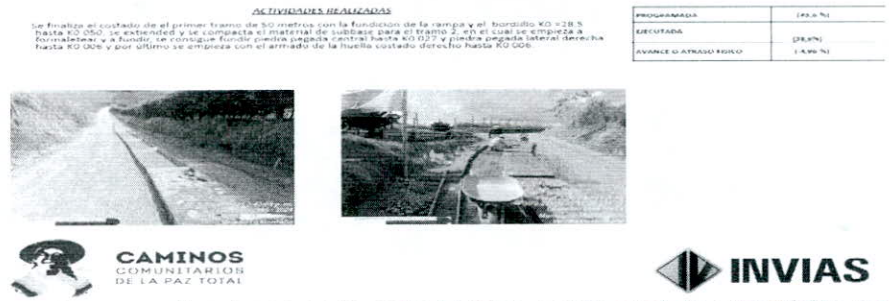

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se menciona que hay complicaciones en la parte técnica, por lo cual, la supervisión por parte de la DT solicita realizar las acciones pertinentes para subsanar dichas situaciones.

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- La supervisión por parte de la DT, solicita a la Interventoría realizar seguimiento continúo a la ejecución técnica en esta JAC.

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- La supervisión por parte de la DT, solicita a la Interventoría realizar seguimiento continuo a la ejecución técnica en esta JAC.
- Se resalta que se presenta una situación similar a Los Balsos.


ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 2385-2024, PIJAO VEREDA LA MARIELA



- Considerando el avance la obra y que el plazo contractual está muy reducido, se solicita a la Interventoría No. 3668 de 2024 realizar planes de contingencia que permitan la adecuada ejecución del convenio.

CONVENIO 3347-2024, SALENTO VEREDA CANAAN

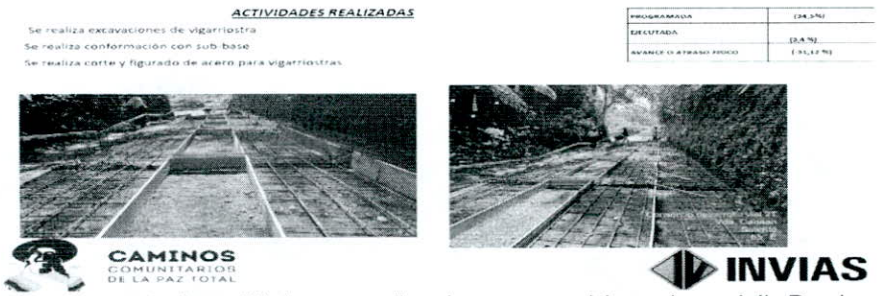

- En esta JAC, se han presentado múltiples complicaciones con el ingeniero civil. Por lo cual, se solicitó cambio. Ya se tienen hojas de vida y se está a la espera de realizar efectivo este trámite.
- Se manifiesta la preocupación por parte de la DT en cuanto al avance y estructuración de este proyecto.
- Se sugiere implementar la señalización normativa en la obra.
- Se le solicita a la Interventoría revisar con su especialista el material de soporte en aras de garantizar la calidad y estabilidad de la obra.

CONVENIO 2664-2024, SALENTO VEREDA LOS PINOS



- Se resalta la buena presencia por parte del componente técnico. Asimismo, por parte de la DT se han realizado múltiples observaciones que a la fecha se han subsanado.

ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

CONVENIO 3156-2024, FILANDIA VEREDA PAVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la conformación y mejoramiento del terreno con material de subbase.

PROGRAMADA	(3,20 %)
EJECUTADA	(9,47%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(3,39 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- Se comenta que la comunidad ha solicitado presencia de la Interventoría para validar una situación referente al nacimiento de agua. En ese sentido, por parte de la DT Quindío le sugiere a la Interventoría realizar dicha visita y validarlo desde el componente técnico y ambiental.


CONVENIO 3160-2024, CIRCASIA VEREDA PIAMONTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el mejoramiento del terreno con subbase granular de 5cm.
Se realizaron 2 modulos de placa huella al costado derecho e izquierdo.

PROGRAMADA	(3,20 %)
EJECUTADA	(11,14%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(7,94 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se realizan ciertas observaciones técnicas.

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #3

Total Inversión =$ 1'264.100.957 ____ 100%
Inversión programada = $ 811,190,827 ____ 64,17%
Inversión ejecutada = $ 517,244,985,87 ____ 40,92%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5'842.265.473 (100%) VS. Total Ejecución =$ 1 366.885.481,99 (24%)

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS



- Finalmente, se expone el avance general de la Interventoría.
- En cuanto a las pólizas y prórrogas, la profesional jurídica de la D.T. QUINDIO del INVIAS, expresa que a la fecha únicamente está pendiente por pagar la tercer (03) póliza la JAC Patio Bonito (Pijao-Q) y las pólizas referentes a la JAC El Dorado Alto Las Camelias.

ACTA No.	FECHA			HORA	
18	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas



- Se menciona que faltaron las diapositivas correspondientes a la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan de Carolina correspondiente al municipio de Salento (Quindío).

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Interventoría No. 3668 de 2024	Veintiocho (28) balance de obra	12/09/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Acta de costo correspondiente al periodo de julio	08/09/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Acta de costo correspondiente al periodo de agosto	08/09/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
18	08	09	2025	08:00 Horas	11:10 Horas

Alexander Montenegro Solano	
Fabián Fernando Rincón Alzate	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Sara Sofía Monsalve Verjan	Sara Sofia Monsalve Verjan
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Sandra P. Oviedo R.
Fabián Velásquez Henao	Fabian Velasquez Henao
Luisa Fernanda Zapata López	Luisa Fernanda Zapata Lopez.

500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	CÓDIGO	MEPI-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

TEMA DE LA REUNIÓN: REUNION DE SEGUIMIENTO No 18 CONTRATO 3668/2024 — HORA DE INICIO: 8:00 am — FECHA: 08/09/2025

DEPENDENCIA CONVOCANTE: INVIAS D.T. QUINDIO — LUGAR DE LA REUNIÓN: INVIAS. D.T. QUINDIO

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA G.	INVIAS QUINDIO	SUPERVISOR CONT INTERV #3665/2024	3113150787	fgarcia@invias.gov.co	
2	Diego Alfredo Aragón Olaya	INVIAS DTQ.	Contratista OPS	3166460661	daragón@invias.gov.co	
3	Alexander Montenegro Solano	INVIAS	Contratista Ops	3016598199	Amontenegro@invias.gov.co	
4	Jaiir Alfonso Jos S	Interventoria	Coserco D02T.	3138114120	Proyectodesarrollo vial 2T.A & MAL	
5.	Sandra Patricia Quiroz.	Interventoria	financiero	3164109988	contabilidadcol.colaz t@gmail.com	Sandra Patricia Quiroz
6	Fabian Velasquez Henao	Interventoria	Prof. Ambiental	3187459550	desarrollovial2Tambiental @gmail.com	Fabian Velasquez H
7	Sara Sofia Ramsalve Versain	Interventoria	Aux. Interventoria	3143132496	ingsaramonsalve.dv2t@gmail.com	Sara Ramsalve.
8	Juan Fernando Zapata L.	Interventoria	Prof. Social	3128538848	profesionalsocial2t@gmail.com	Juan Fda Zapata L.
9	Eliana Zuluaga M.	Invias	Abogada, Contratista	3244195590	ezuluaga@invias.gov.co	
10	Santiago Ospina Vargas	INVIAS. DTQui	Prof. Social. Contratista	3117601174	sospina@invias.gov.co	
11	Fabian Fdo Rincón A	INVIAS DTQui	Contratista OPS	3102031695	frincon@invias.gov.co	
