ACTA No. 019	CIUDAD Y FECHA: Armenia, 19 de septiembre de 2025	HORA DE INICIO: 8:00 a. m.	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:40 a. m.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío			
CONVOCADA POR: Dirección Territorial Quindío – Instituto Nacional de Vías		LUGAR: Sala de Juntas – Dirección Territorial Quindío	MODALIDAD: Presencial

Nota: En los casos en que se requiera dejar firmada el acta de reunión, esta deberá ser suscrita por los participantes. De lo contrario, deberá anexarse como respaldo el formato físico ETHU-FR-25 o el formulario de asistencia virtual utilizado durante la reunión.

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Fernando García Giraldo	Funcionario	Instituto Nacional de Vías - Invias, D.T. Quindío
Eliana Zuluaga Marín	Contratista – Profesional jurídico	Instituto Nacional de Vías - Invias, D.T. Quindío
Santiago Ospina Vargas	Contratista – Profesional social	Instituto Nacional de Vías - Invias, D.T. Quindío
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista – Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - Invias, D.T. Quindío
Alexander Montenegro Solano	Contratista – Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - Invias, D.T. Quindío
Fabian Fernando Rincón Alzate	Contratista – Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - Invias, D.T. Quindío
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Director de Interventoría	Consorcio Desarrollo Vial 2T – CI No. 3668-2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Ingeniera residente	Consorcio Desarrollo Vial 2T – CI No. 3668-2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Profesional financiero	Consorcio Desarrollo Vial 2T – CI No. 3668-2024
Fabián Velásquez Henao	Profesional ambiental	Consorcio Desarrollo Vial 2T – CI No. 3668-2024
Luisa Fernanda Zapata López	Profesional social	Consorcio Desarrollo Vial 2T – CI No. 3668-2024

2. AGENDA DE LA REUNIÓN

TEMA	RESPONSABLE
1. Lectura de compromisos	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024
2. Componente técnico	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Antes de iniciar la reunión, la Dirección Territorial Quindío se permite realizar las siguientes aclaraciones:

- Se insiste por parte de la supervisión a la Interventoría la necesidad urgente de realizar una reunión presencial con la representante legal del contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 y con las personas que ella considere necesario.
- Se pregunta a la Interventoría si cuentan con el ingeniero residente y el ingeniero auxiliar a pesar de que la supervisión viabilizó el ingreso de estos profesionales desde 01/09/2025; para conformar un equipo de Interventoría más robusto con el propósito de cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones adjudicadas a la Interventoría. No obstante, la Interventoría expresa que a la fecha no han ingresado.

Tema 1: Lectura de compromisos.

- Radicados ambientales pendientes: Se incumplió el compromiso ambiental con relación a las radicaciones que se tenían previstas para el 15/09/2025, la Interventoría informa que las Juntas de Acción Comunal están gestionando los documentos de autorización anexas a los Planes de Gestión Ambiental. Asimismo, se comprometen nuevamente a cumplir a cabalidad con este compromiso el 19 de septiembre de 2025.
- Balances de obra: Se incumplió este compromiso por parte de la interventoría. La Interventoría expresa que los residentes correspondientes a la Juntas de Acción Comunal no contestan y, por ende, no es posible obtener la información necesario.
- Acta de costos Julio: Se incumplió este compromiso, debido a que una vez fue entregada a la DT Quindío, esta se devolvió debido a que continúan las mismas observaciones financieras en el informe mensual de Interventoría.
- Acta de costos Agosto: Se incumplió este compromiso, este lleva diez (10) días de retraso.

Tema 2: Observaciones técnicas.

La Dirección Territorial Quindío manifiesta el rol y el funcionamiento de la Interventoría, haciendo énfasis en que las funciones de interventoría deben adelantarse con carácter preventivo y proactivo. Asimismo, se trae a colación el oficio con radicado No. 2025S-VQUI-067507 del 12/09/2025, donde se expresan las siguientes observaciones reiterativas y recurrentes a la Interventoría No. 3668 de 2024 en el componente técnico:

1. ***Alineación de placas huella:*** Se evidencian desplazamientos y falta de continuidad en el eje de colocación, lo cual compromete la uniformidad estructural y el tránsito seguro.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PINOS

2. ***Adherencia deficiente de la piedra en superficie:*** Se observa escalonamiento de hasta 2 cm con respecto a la placa huella, lo que genera discontinuidad, afectación en la rodadura y potenciales puntos de concentración de esfuerzos.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PINOS

3. ***Lavado de finos por lluvias:*** El concreto queda expuesto, evidenciándose pérdida de mortero superficial, lo cual reduce la resistencia a la abrasión y disminuye la durabilidad del pavimento.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PINOS

4. ***Recubrimientos normativos del acero de refuerzo:*** Se constata incumplimiento de los espesores mínimos exigidos en la NSR-10 y en las especificaciones técnicas de INVIAS, exponiendo el acero a la acción de agentes agresivos (carbonatación y cloruros), con riesgo de corrosión prematura.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANAAN - LOS PINOS - SAN JUAN DE CAROLINA

5. ***Juntas de construcción:*** Se evidencian cortes irregulares y juntas mal ejecutadas, lo que puede generar fisuras, pérdida de continuidad y filtraciones de agua que deterioran la estructura.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PINOS - SAN JUAN DE CAROLINA

6. ***Manejo inadecuado de sobrantes de concreto:*** Se registran vertimientos en áreas de tránsito que afectan la funcionalidad de la placa huella y generan irregularidades en la superficie de rodadura.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA

7. ***Vigas sin alineación a eje:*** Se evidencia que no se está realizando el chequeo o libración por parte del interventor de la formaleta.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PADILLA

8. ***Revisión de compactación y descole:*** Se evidencia acolchonamiento del material instalado tipo SBG-C, se informa a la interventoría verificar el nivel freático en el punto más bajo del tramo, además tomar acciones con referencia al descole de la placa huella y manejo hidráulico ya que en visitas anteriores se había identificado los posibles inconvenientes a futuro por entregas de aguas en ese punto.



JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la interventoría es garante del cumplimiento contractual, técnico y normativo, se requiere de carácter prioritario que adopte las siguientes medidas.

- Asimismo se reitera desde la Dirección Territorial que, de acuerdo con lo observado en las imágenes, muchas actividades las tendrá que realizar la interventoría con carácter correctivo, y no preventivo. A su vez, nuevamente se le indica a la Interventoría la necesidad de hacer mayor presencia por parte de los profesionales (Director, Residentes, Auxiliares) de la Interventoría, además de realizar capacitaciones a los inspectores de interventoría que se encuentran en cada una de las obras.
- Desde la supervisión del Invias se manifiesta que la Interventoría está incumpliendo su función en la revisión, seguimiento y control al cumplimiento del adecuado uso de los Elementos de Protección Personal -EPP-, concernientes al componente de Salud y Seguridad en el Trabajo -SST-. A su vez, se evidencia desde la supervisión que la interventoría no está incumpliendo con la función de control y verificación de la instalación de la señalización temporal y preventiva de la zona de obra. De igual manera, se resalta que la interventoría no se está cumpliendo cabalmente con su función de seguimiento y control de los plazos contractuales y cronogramas de obra. Lo anterior teniendo en cuenta que el plazo contractual corresponde al 31/10/2025 y toda vez que, a la fecha, se observan Convenios que no tienen aún inicio de actividades.
- La DT Quindío hace referencia con lo establecido en las leyes 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015, precisando que se evidencia un incumplimiento por parte de la interventoría, resalta que la responsabilidad de ejercer el seguimiento, el control, la supervisión y la verificación de los contratos de obra que recaen en la interventoría, y en tal sentido, es la interventoría la que deberá responder por las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos.
- Se hace necesario que la Interventoría realice la entrega de las actas previas de recibido definitivo de todos los convenios.


A continuación, la interventoría procede a exponer los avances en cada convenio:

CONVENIO 2470-2024, GÉNOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS

BERMA CUNETA IZQUIERDA: Instalación de formaletas hasta K0+000, armado de acero hasta K0+007 se funde concreto hasta K0+017
PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA: Se arma acero hasta K0+000 y se funde concreto hasta K0+007.
CONCRETO CICLOPEO: Se llega a fundir hasta K0+000.
BERMA CUNETA DERECHA: Se funde concreto hasta K0+0010 y se instala refuerzo hasta K0+007

PROGRAMADA	[84,51%]
EJECUTADA	[76,66%]
AVANCE O ATRASO FISICO	[-7,85%]





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	(79,7%)
EJECUTADA	(95,5%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(15,85%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	(86,33%)
EJECUTADA	(92,19%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(5,86%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

>Se realiza el vaciado de 5,6 m^3 de concreto premezclado, distribuidos de la siguiente manera:
-4 módulos de placa huella en el lado izquierdo abcsas k0 +000 a k0 + 014.1
-4 módulos de cuneta en el lado izquierdo k0 +000 a k0 + 014.1
-3 vigas riostras de 2.05 m
-10módulos de bordillo en la do derecho y 8 módulos de bordillo en el lado izquierdo
>Además, se fundieron 8 módulos centrales de concreto ciclópeo y 16 módulos laterales (8 en cada costado)
>Rampa de acceso en el tramo inicial de 1,30m x 5m
>Viga de finalización de rampa de inicio de 5m

PROGRAMADA	(75,2 %)
EJECUTADA	(84,55 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(9,36 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RÍO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRAMO 2. Se realiza la instalación de acero de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto de la huella izquierda.

PROGRAMADA	(71,89%)
EJECUTADA	(91,94%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(20,05%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el tramo 1, se instala refuerzo de berma cuneta izquierda para un total de 10 secciones
en el tramo 2 se instala el refuerzo de la huella izquierda de 14 secciones.

PROGRAMADA	(64,6%)
EJECUTADA	(64,7%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(0,11%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavación de rasante costado derecho K0+073 K0+139
Excavación de vigas riostras K0+073 - K0+139
Corte, figurado y armado de malla de acero #3 para huella-cuneta y bordillo k0+073 - k0+139

PROGRAMADA	(64,77%)
EJECUTADA	(71,27%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(6,50%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la instalación de formaletas de bordillo costado derecho y asi mismo la fundida, desde K0+000 hasta K0+027, posterior a ello se fundió un módulo de huella y uno de cuneta hasta llegar hasta K0+030, a continuación se comenzó con instalación de formaleta para la piedra pegada costado derecho, tanto central como lateral, desde K0+030 hasta K0+069.

PROGRAMADA	(69,3%)
EJECUTADA	(72,56%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(7,23%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS


CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la fundición de 12 módulos adicionales y 13 vigas riostras del costado izquierdo.
Se realiza el armado e instalación del acero para 14 módulos mas y 15 viga riostras del costado izquierdo.

PROGRAMADA	(58,9 %)
EJECUTADA	(67,7%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(8,83 %)

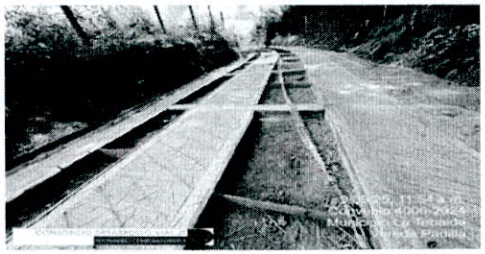



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS


CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la fundición del concreto de placa huella del primer tramo del costado izquierdo para 12 modulos, 14 vigas riostras, 6 cunetas y un tramo de la losa de trasnsición incial.

PROGRAMADA	(64,8%)
EJECUTADA	(56,36 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-8,43 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

**Se fundió los últimos dos módulos de placa huella correpondientes al primer tramo*
**Se realizó la fundida de un módulo inicial y módulo final de concreto ciclopeo.*
** En el primer tramo se realizó la fundida de la rampa de acceso al inicio del tramo y rampa de acceso en el el tramo final*

PROGRAMADA	(55,3%)
EJECUTADA	(37%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-18,34 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa desde K0+000 hasta K0+039 huella del costado derecho de la placa huella
se realizo instalación de formaleta para huella centro y cuneta hasta la abscisa K0+039.

PROGRAMADA	(53,5 %)
EJECUTADA	(39,5%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-13,97 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Amarre de acero #3 para malla de huella
Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para huella costado izquierdo k0+000 - k0+042

PROGRAMADA	(39,5%)
EJECUTADA	(23%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-16,48 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Amarre de acero #3 para cunetas K0+000 - k0+021
Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para cuneta costado izquierdo k0+000 - k0+24

PROGRAMADA	(39,5%)
EJECUTADA	(22,7%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-16,80 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2385-2024, PIJAO VEREDA LA MARIELA

ACTIVIDADES REALIZADAS

corte y figurado de acero #3 para vigas y bordillo y refuerzo trasversal
Amarre de vigas riostras
amarre de acero #3 para malla de refuerzo de costado izq – der
Acopio de materiales pétreos

PROGRAMADA	(35%)
EJECUTADA	(22,6%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-12,45%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3347-2024, SALENTO VEREDA CANAAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza excavaciones de 15 módulos viga riostra de K0+009.6 a K0+048

Se realiza conformación con sub-base (afirmado) de 60ml de K0+030 a K0+060

Se realiza corte y figurado de acero para viga riostras, cuneta izquierda y placas de circulación izquierda y derecha de K0+009.6 a K0+048

Se realiza vaciado de 8 módulos de ciclópeo central de 14 MPa de K0+000 a K0+025.6

Se realiza vaciado de 8 módulos de circulación izquierdo y derecho de 21 MPa de K0+000 a K0+025.6

PROGRAMADA	(49,5%)
EJECUTADA	(27,4 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-22,06 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CONVENIO 2664-2024, SALENTO VEREDA LOS PINOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

>Se realiza el vaciado de 17.63 m^3 de concreto de 21 mpa, y 11.75 m3 de ciclopeo de 14 mpa distribuidos de la siguiente manera:
-18 módulos de viga riostra (solo media viga)
-19 módulos de placa huella en el lado izquierdo
-19 módulos de cuneta en el lado izquierdo
- 18 módulos de bordillo izquierdo
-29 módulos de ciclópeo de sobre ancho izquierdo de 45cms
- 14.5 módulos de ciclópeo central

PROGRAMADA	(47,3 %)
EJECUTADA	(32,9%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-14,37 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CONVENIO 3156-2024, FILANDIA VEREDA PAVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se compactado el terreno con un equipo de Rana-Compactadora
Armado de acero y instalación de acero de 3/8".
Encofrado de huellas.
Se realizo cereo en el tramo.

PROGRAMADA	(12,22%)
EJECUTADA	(9,38 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-2,84 %)



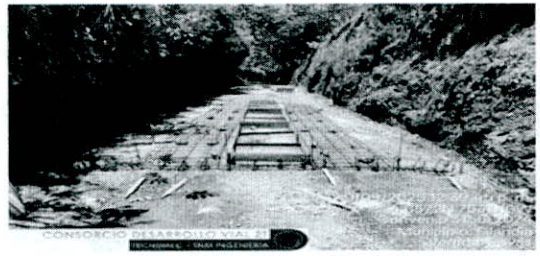

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3160-2024, CIRCASIA VEREDA PIAMONTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Armado de acero y instalación de acero.
Alistamiento, preparacion y vaciado de concreto de modulos de huellas y ciclopeo.

PROGRAMADA	(3,28 %)
EJECUTADA	(11,14%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(7,86 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- La información que se presenta no está actualizada.

CONVENIO 3777-2024, SALENTO VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la fundición para 13 modulos aproximadamente de huellas y vigas riostras.
Se realiza la instalación y armado del acero para 10 módulos adicionales.

PROGRAMADA	(47,3 %)
EJECUTADA	(20,2%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-27,09 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Se solicita Plan de contingencia para poder realizar la obra.

CONVENIO 2703-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA ARGENTINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo conformacion de via en un totla de 170 ml y se instalo material de Sub base granular tipo c en un total de 170 ml

PROGRAMADA	(3,3 %)
EJECUTADA	(17,07%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(13,69 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 4100-2024, CALARCA CABILDO MAYOR INDIGENA DACHI AGORE DRUA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acopio de material granular





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Para finalizar, se procede a exponer los avances generales del contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 y de los convenios en forma acumulada:

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #3

Total Inversión =$ 1´264.100.957_____100%
Inversión programada = $ 811,190,827_____ 64,17%
Inversión ejecutada = $ 517,244,985,87_____ 40,92%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5´842.265.473_(100%)____ VS.___Total Ejecución =$ 1´620.520.926,69 (28%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


- La Dirección Territorial Quindío insta a la Interventoría a realizar un plan de contingencia en aras de poder subsanar todas las observaciones que se han realizado a lo largo de la ejecución de los convenios solidarios e interadministrativos del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total; asimismo, en este plan, se deben especificar las medidas a tomar frente a la actuación de la Interventoría va a realizar. En vista a que el Director de la Interventoría no está presente, se le solicita a la residente de la Interventoría proporcionar una fecha para el plan de contingencia con relación al cumplimiento del plazo contractual establecido para la ejecución de los convenios 2024.
- Para finalizar esta reunión, se deja constancia que el Director de la Interventoría No. 3668 de 2024 el ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria no asistió al comité de seguimiento No. 19 del día 15 de septiembre de 2025, aclarando que no hay justificación de su parte ante su ausencia.

4. COMPROMISO* (Descripción puntual el compromiso)	**4.1 RESPONSABLE**		**4.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO**
	NOMBRE SERVIDOR / CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	
Realizar la primera radicación completa de los Plan de Gestión Ambiental correspondientes a los convenios solidarios e interadministrativos	Fabián Velásquez Henao	Ambiental – Interventoría No. 3668 de 2024	6 radicaciones para el día 15/09/2025 y 4 radicaciones para el día 19/09/2025
Acta de entrega y recibido definitivo de la JVC Villa Éxito	Jahir Alfonso Luis Sanabria y Junta de Vivienda Comunitaria Villa Éxito	Director de Interventoría – Interventoría No. 3668 de 2024	17/09/2025
Concepto de cambio de material por parte de la Interventoría en la Junta de Acción Comunal Canaán	Jahir Alfonso Luis Sanabria	Director de Interventoría – Interventoría No. 3668 de 2024	18/09/2025
Concepto de la Interventoría sobre la Intervención en la JAC Pavas	Fabián Velásquez Henao	Ambiental – Interventoría No. 3668 de 2024	16/09/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	**FIRMA**
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	Eliana Zuluaga Marín ✓

NOMBRE	**FIRMA**
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Alexander Montenegro Solano	
Fabian Fernando Rincón Alzate	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	**No asistió**
Sara Sofía Monsalve Verjan	Sara Sofia Monsalve Verjan

NOMBRE	FIRMA
Sandra Patricia Oviedo Rueda	
Fabián Velásquez Henao	
Luisa Fernanda Zapata López	

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	ETHU-FR-25
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	Versión	2
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: INVIAS - D.T. QUINDIO — Ciudad: ARMENIA (Q.) — Fecha: 15/09/2025

Nombre del evento: REUNION SEGUIMIENTO CONTRATO 3668-2024 — Lugar: D.T. QUINDIO — Responsable: D.T. QUINDIO

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento (CC / CE / P)	No. Documento	Nacionalidad	Edad	Sexo (H / M / I)	Discapacidad (Ver Referencia) (SI / NO)	Tipo de discapacidad	Etnia (I / N / R / G / P / NA)	Correo electrónico	Celular	Nombre de la organización o grupo	Firma
1	FERNANDO GARCIA G.	X	9730458	COL	46	X		N/A	NA	fgarcia@invias.gov.co	3113250287	INVIAS QUINDO	
2	Eliana Zalcaga	X	1094897925		37	X		N/A	NA	ezalcaga@invias.gov	3244195590	INVIAS	
3	Susa Sofia Monsalve	X	1234644394		26	X		N/A	NA	ingbasemonsalve@gmail.com	3143132496	Interventoria	Susa Monsalve
4	Diana Fernanda Zapata L	X	1094883518		39	X		N/A	NA	profesional social 2@gmail.com	3128538898	Interventoria	Diana Fda Zapata L.
5	Fabian Velasquez Henao	X	75.088892	Col	42			N/A	NA	desarrovial2tegmail.com	3187459558	Interventoria	Fabian Velasquez H.
6.	Saudra Patricia Cerón		41360000							apoyobdcfond@gmail.com	3166000000		Saudra Cerón
7	Fabian Rincón.		1094956904		29			N/A.	NA	Frincon@invias.gov.co	3102031685.	INVIAS Quindío	
8.	Alexander Montenegro Solano	X	1094916306.	COL	35	X		N/A.	NA	Amontenegro@invias.gov.co	3016598199	INVIAS	
9	Diego Alfredo Aragón Oliver	X	1109264004	COL.	39	X		—	NA	daragon@invias.gov.co	3166460661	Invias DT Q.	
10	~~Santiago Orpina Vega~~	X	1077971833	COL	24	X	X	N/A	NA	Sorpina@invias.gov.co	3117601124	INVIAS - DTQUI	

Discapacidad: Marque con una **X SI** tiene o **NO** alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.

A	* Auditiva	S/C	* Sordo ceguera
V	* Visual -Persona ciega	PS	* Psicosocial
F	* Física	M	* Multiple, tiene más de un tipo de discapacidad

Tipo de documento: Marque con un **X** el tipo que corresponda

CC	Cédula
CE	Cédula de Extranjería
P	Pasaporte

Sexo

H	Hombre
M	Mujer
I	Intersexual

Etnia

I	Indígena
N	Negro
R	Raizal
P	Palenquero
G	Gitano/Rom
N/A	No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link**https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022**
