CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 416 de 2023

# INFORME DE INTERVENTORIA No.3

MENSUAL [X] FINAL [ ]

**Objeto Contrato:**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA CIHCM416-2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN (1) CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.**




**MUNICIPIO:** COLOMBIA.

**DEPARTAMENTO:** HUILA.

**VEREDA:** NAZARETH.

# CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 416 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | YOVANY PEÑA FIERRO | **ENTIDAD** | INDERHUILA |
| **1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA** | | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | CIHCM416 DE 2023 | | |
| **OBJETO** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMI. TRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN (1) CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.** | **PERIODO DEL INFORME** | Entre el 1de julio del 2024 al 23 de julio del 2024 |
| **CONTRATISTA** | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. | **NIT:** | 891.101.100-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. JAVIER BARRERO MOSSOS | **C.C:** | 7.685.694 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):** | **09 DE NOVIEMBRE DE 2023** | | |
| **FECHA DE INICIO (D/M/A):** | **21 DE NOVIEMBRE DE 2023** | | |
| **PLAZO INICIAL** | TRES (03) MESES | | |
| **OTROSI No. 1** 31/05/2024 | MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL | | |
| **PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):** | PRÓRROGA DE UN (01) MES | | |
| **PLAZO TOTAL:** | CUATRO (04) MESES | | |
| **VALOR INICIAL:** | **$124.462.130,00** | | |
| **VALOR ADICIONAL** (SI APLICA): | $10.647.996,72 | | |
| **VALOR TOTAL:** | **$135.110.126,72** | | |
| **2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA** | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | CLPIH394 DE 2023 | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA" | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC | **NIT:** | 901.765.550-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ANDRES FELIPE PAREDES SANABRIA | **C.C:** | 1.075.260.938 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 26/10/2023 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/11/2023 | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal. |
| **PLAZO ADICIONAL (No.1):** | UN (01) MES |
| **PLAZO TOTAL:** | CUATRO (04) MESES |
| **VALOR INICIAL:** | $531.161.721,00 |
| **VALOR ADICIONAL** (SI APLICA): | $49.284.708,10 |
| **VALOR TOTAL:** | $ 580.446.429,10 |

## 3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato tiene desarrollo en el departamento del Huila, Huila es uno de los treinta y dos departamentos que conforman la República de Colombia. Su capital y ciudad más poblada es Neiva. Está ubicado al suroeste del país, en la región andina.

Su organización territorial comprende cuatro subregiones: Subnorte, Subcentro, Subsur y Suboccidente. Cuenta con 37 municipios, y 128 centros poblados. Su economía genera el 1.62 % del PIB colombiano. De acuerdo con el DANE, posee una población estimada (2024) de 1.192.273 habitantes correspondiente al 2,2% de la participación en la población total.

Fue creado por la Ley 46 del 29 de abril de 1905, constituido por la provincia de Neiva y la del sur, pertenecientes al antiguo Estado Soberano del Tolima. El 15 de junio del mismo año, inició su vida independiente bajo la administración de Rafael Puyo Perdomo.

El departamento del Huila está localizado al suroccidente de Colombia, entre los 3°55'12" y 1°30'4" de latitud norte (entre el nacimiento del río Riachón, municipio de Colombia y el pico de la Fragua, municipio de Acevedo), y los 74°25'24" y 76°35'16" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (entre el Alto de Las Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, municipio de San Agustín).




Mapa físico del Huila. ( https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Huila_%28pol%C3%ADtico%29.svg).

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la superficie del Huila comprende 19.890 km² que corresponde tan solo a un 1.74 % de la superficie total del país. Comparada con la superficie de los demás departamentos, ocupa el 26° lugar, por encima de Caldas, Atlántico, Quindío, Risaralda y Sucre.
Ref.( https://es.wikipedia.org/wiki/Huila)

El proyecto se desarrolla en un municipio del departamento del Huila:

- **Vereda Nazareth De La Zona Rural Del Municipio De Colombia**

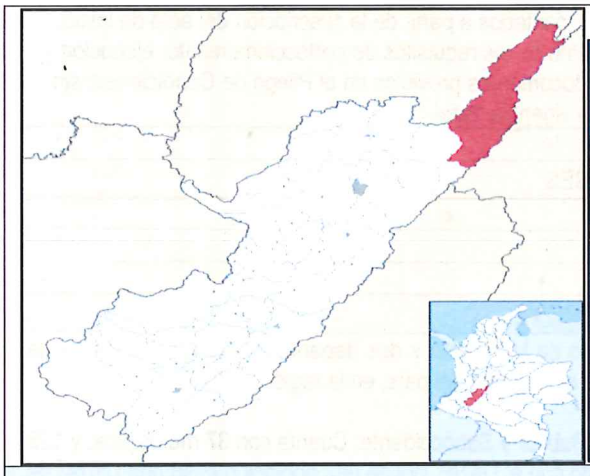



## 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La construcción corresponde a una cubierta autoportante para un área aproximada de 684 m2, el proyecto consiste en un sistema de cubierta que no requiere estructura intermedia de soporte, evitando así la construcción de Cerchas y Correas necesarias en otros tipos de sistemas.

La estructura del proyecto será un sistema a porticado de concreto, estará soportada con columnas en concreto reforzado para la estabilización del terreno, elementos zapatas, vigas de cimentación y viga canal.

Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 - NSR-10. La cubierta será en teja auto portante metálica cal. 22, con todos sus componentes. Además, el proyecto contará con redes eléctricas para su iluminación cumpliendo la normativa, también tendrá las salidas de aguas lluvias (bajantes aguas lluvias, cunetas) que garanticen el continuo y normal funcionamiento de la totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva.

Las actividades de para obra para ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA EN CONCRETO.
- CUBIERTA.
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO.
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- TRANSPORTE.

## 5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

El día 2 de julio del 2024 se realiza un comité técnico No.6 en las instalaciones del Inderhuila entre Contratista, Interventoría y la entidad contratante Inderhuila, representado por la Supervisión, ingeniera Karoll Lisseth Buitrago y el apoyo a la el supervisión del contrato el Arq., Yovanny peña fierro donde se le presenta a los supervisores del contrato las actividades del contrato e ítem no previstos que no estaban contemplados en el contrato, pero que son relevantes para el desarrollo del mismo; como son remplazo de material de excavación por ciclópeo ya que el material de excavación es totalmente orgánico y no cumple para el soporte de una estructura por lo que se realiza mejoramiento del terreno.

Teniendo en cuenta que es una actividad necesaria e indispensable para el desarrollo y continuidad de la obra, aclarando que la interventoría realizará el seguimiento cuantitativo de las cantidades ejecutadas en obra, con el compromiso de realizar el respectivo balance de obra a través del Acta de Mayores y menores cantidades y creación de ítem no previsto, en el que el contratista presentará el respectivo APU, para el correspondiente aval de la interventoría y revisión y aprobación de la entidad contratante.

***La entidad contratante Inderhuila autoriza los trabajos para darle continuidad a la obra solicitando que se lleve a cabo los compromisos antes mencionados***.

Actividades realizadas en el mes de julio 2024:

- ✓ Se procede con inicio de actividad de excavación y retiro de material.
- ✓ Se ejecutan actividades de demolición de placa en concreto
- ✓ Desmonte de cerramiento perimetral
- ✓ Desmonte de marcos de canchas existentes
- ✓ Relleno en recebo seleccionado,
- ✓ Solado en concreto, concreto ciclópeo,
- ✓ Construcción de zapatas,
- ✓ columnas eje B
- ✓ Amarre de acero de refuerzo,
- ✓ Transporte de materiales pétreos y material de relleno.

**Se extiende la jornada laboral diaria con el fin de avanzar en la ejecución de las actividades.**

Se requiere hacer suspensión al contrato de obra puesto que el Inderhuila revisara el balance de obra presentado con el ajuste de las condiciones encontradas en el terreno, aprobar adición de recursos económicos, creación de Ítems no previstos y prorroga en el plazo de la ejecución para lograr cumplir el objeto contractual, ya es esta próximo a vencer el plazo de ejecución inicial.

## 6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

| ACTIVIDAD | FECHA (dd/mm/aaaa) | DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | 23/11/2023 | | | 22/02/2024 |
| Suspensión No. 1 | 28/12/2023 | 35 | | |
| Reinicio No. 1 | 31/05/2024 | | 154 | |
| Suspensión No. 2 | 23/07/2024 | 54 | | 24/07/2023 |
| Reinicio No. 2 | 06/11/2024 | | | |
| TERMINACIÓN Cto. | 07/12/2024 | | | |
| **TOTAL DIAS** | | **89** | **154** | |

**7. ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

| Tipo de Acta | No. | Fecha |
|---|---|---|
| *FIRMA CONTRATO* | 1 | *26/10/2023* |
| *ACTA DE INICIO* | 2 | *23/11/2023* |
| *ANTICIPO* | 3 | *04/12/2023* |
| *ACTA DE JUSTIFICACION DE LA SUSPENSION No. 01* | 4 | *28/12/2023* |
| *ACTA DE SUSPENSION No. 01* | 5 | *28/12/2023* |
| *ACTA DE JUSTIFICACION DEL REINICIO No. 01* | 6 | *31/05/2024* |
| *ACTA DE REINICIO No. 01* | 7 | *31/05/2024* |
| *OTROSI No. 01* | 8 | *31/05/2024* |
| *ACTA DE JUSTIFICACION DE LA SUSPENSION No. 02* | 9 | *23/07/2024* |
| *ACTA DE SUSPENSION No. 02* | 10 | *23/07/2024* |


**8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO**
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

| | |
|---|---|
| a). **Obligaciones de Carácter General.** | El día 2 de julio del 2024 se realiza un comité técnico No.6 en las instalaciones del Inderhuila entre Contratista, Interventoría y la entidad contratante Inderhuila, representado por la Supervisión, ingeniera Karoll Lisseth Buitrago y el apoyo a la el supervisión del contrato el Arq., Yovanny peña fierro donde se le presenta a los supervisores del contrato las actividades del contrato e ítem no previstos que no estaban contemplados en el contrato, pero que son relevantes para el desarrollo del mismo; como son remplazo de material de excavación por ciclópeo ya que el material de excavación es totalmente orgánico y no cumple para el soporte de una estructura por lo que se realiza mejoramiento del terreno.<br><br>Teniendo en cuenta que es una actividad necesaria e indispensable para el desarrollo y continuidad de la obra, aclarando que la interventoría realizará el seguimiento cuantitativo de las cantidades ejecutadas en obra, con el compromiso de realizar el respectivo balance de obra a través del Acta de Mayores y menores cantidades y creación de ítem no previsto, en el que el contratista presentará el respectivo APU, para el correspondiente aval de la interventoría y revisión y aprobación de la entidad contratante.<br><br>***La entidad contratante Inderhuila autoriza los trabajos para darle continuidad a la obra solicitando que se lleve a cabo los compromisos antes mencionados.***<br><br>• Actas de Comité de Obra No.7<br>• Verifica obligaciones contractuales del contratista de obra.<br>• Se revisa y avala el balance de mayores y menores cantidades de obra, memorias de cálculo e ítem nuevos y no previstos; se entrega a la entidad contratante Inderhuila para su respectiva revisión. |

| | |
|---|---|
| | • Se verifica y se cuantifica los ítem contractuales e ítem no previstos que están resultando debido al trabajo de replanteo y verificación de las cantidades contractuales en obra; de acuerdo con los nuevos planos y rediseño estructural del contrato.<br><br>• 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES<br>✓ 1.01 Localización y replanteo.<br>✓ 1.02 Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.<br>✓ 1.03 Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.<br>✓ 1.04 Demolición muro en ladrillo tolete tipo tizón e= 0,25 mts. Incluye retiro del material sobrante.<br>✓ 1.05 Desmonte marcos canchas existentes.<br>✓ 1.06 Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.<br>✓ 1.07 Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.<br>• 2. CIMENTACIÓN<br>✓ 2.01 Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts<br>✓ 2.02 Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga.<br>✓ 2.03 Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.<br>✓ 2.04 Acero de refuerzo F'y=60.000 P.S.I. zapatas<br>✓ 2.05 Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño<br>✓ 2.06 Acero de refuerzo F'y=60.000 P.S.I. viga de cimentación<br>✓ 2.078. TRANSPORTE<br>8.01 Transporte de materiales pétreos |
| b). **Actividades Administrativas.** | a Interventoría Sociedad Técnica Ltda.<br>- Hace seguimiento cuantitativo y financiero de las mayores y menores cantidades e ítem no previstos; trabajos realizados con el seguimiento de esta interventoría;<br>- Se revisa pagos de seguridad social del personal en obra.<br>- Se revisa y avala el balance de mayores y menores cantidades de obra, memorias de cálculo e ítem nuevos y no previstos; se entrega a la entidad contratante Inderhuila para su respectiva revisión |
| c). **Actividades Operativas.** | ***La entidad contratante Inderhuila autoriza los trabajos para darle continuidad a la obra solicitando que se lleve a cabo los compromisos antes mencionados***.<br><br>Actividades realizadas en el mes de julio 2024:<br>✓ Se procede con inicio de actividad de excavación y retiro de material.<br>✓ Se ejecutan actividades de demolición de placa en concreto<br>✓ Desmonte de cerramiento perimetral<br>✓ Desmonte de marcos de canchas existentes<br>✓ Relleno en recebo seleccionado,<br>✓ Solado en concreto, concreto ciclópeo,<br>✓ Construcción de zapatas,<br>✓ columnas eje B<br>✓ Amarre de acero de refuerzo,<br>✓ Transporte de materiales pétreos y material de relleno. |

| | |
|---|---|
| | **Se extiende la jornada laboral diaria con el fin de avanzar en la ejecución de las actividades.**<br><br>Se requiere hacer suspensión al contrato de obra puesto que el Inderhuila revisara el balance de obra presentado con el ajuste de las condiciones encontradas en el terreno, aprobar adición de recursos económicos, creación de Ítems no previstos y prorroga en el plazo de la ejecución para lograr cumplir el objeto contractual, ya es esta próximo a vencer el plazo de ejecución inicial. |
| d). **Actividades Logísticos.** | ✓ Se revisa que los trabajos sean realizados con todas las normas que exigen la seguridad y salud en el trabajo.<br>✓ Se revisa y firma bitácora de obra<br>✓ Se realizo cuantificación de las cantidades contractuales y los ítem no previstos e ítem nuevos. Se revisa y avala el balance de mayores y menores cantidades de obra, memorias de cálculo e ítem nuevos y no previstos; se entrega a la entidad contratante Inderhuila para su respectiva revisión.<br>✓ Se llevo a cabo 2 comité de obra.<br>✓ Se verifica y se cuantifica los ítem contractuales e ítem no previstos que están resultando debido al trabajo de replanteo y verificación de las cantidades contractuales en obra; de acuerdo con los nuevos planos y rediseño estructural del contrato. |
| e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.** | Se verifica el retiro y disposición del material de excavación en el lugar autorizado por la comunidad nazarena. |
| f). **Actividades Financieras.** | Se verifica y se cuantifica los ítem contractuales e ítem no previstos que están resultando debido al trabajo de replanteo y verificación de las cantidades contractuales en obra; de acuerdo con los nuevos planos y rediseño estructural del contrato. Y buena inversión del anticipo. |
| g). **Actividades Jurídicos** | - Suspensión No2 del contrato<br>Póliza De Cumplimiento Y Póliza De Responsabilidad Civil. (actualizadas) |
| **9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO** | |

| DÍA | ESTADO DEL TIEMPO |
|---|---|
| 01/07/2024 | SECO |
| 02/07/2024 | SECO |
| 03/07/2024 | SECO |
| 04/07/2024 | SECO |
| 05/07/2024 | SECO |
| 06/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 07/07/2024 | SECO |
| 08/07/2024 | SECO |
| 09/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 10/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 11/07/2024 | SECO |
| 12/07/2024 | SECO |
| 13/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 14/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 15/07/2024 | SECO |
| 16/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 17/07/2024 | SECO |
| 18/07/2024 | SECO |
| 19/07/2024 | SECO |
| 20/07/2024 | LLUVIOSO-FUERTE |
| 21/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |
| 22/07/2024 | LLUVIOSO-FUERTE |
| 23/07/2024 | LLUVIOSO-MODERADO |

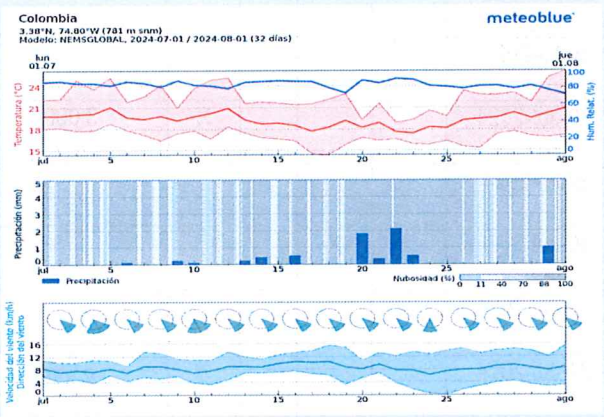


*Estado del tiempo mes de julio, Fuente: METEOBLUE*
*Ilustración 6*

## 10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

| | Resistencia concreto | Relación volumétrica concreto |
|---|---|---|
| *Diseños de mezcla para los concretos.* | 3.000 PSI | 1:2.3 |
| *Diseños de mezcla para base.* | *N. A* | N.A. |
| *Compresión simple al concreto.* | 3.000 PSI | |
| *Ensayo de compactación de campo* | *N.A.* | |

**NOTA:** *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

**Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA**

| DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta) | FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa) | FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa) | EDAD DEL ENSAYO | | | | RESISTENCIA REQUERIDA | RESISTENCIA FINAL OBTENIDA | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 7 | 14 | 28 | | | |
| ZAPATAS A | 21-Jun-2024 | 24-Jun-2024 | | | | | | | |
| | | 28-Jun-2024 | | X | | | | 2225 | |
| | | 5-Jul-2024 | | | | | | | |
| | | 19-Jul-2024 | | | | X | 3.000. | 3119 | CUMPLE |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN A | 03-Jul-2024 | 6-Jul-2024 | | | | | | | |
| | | 10-Jul-2024 | | X | | | | 2142 | |
| | | 17-Jul-2024 | | | | | | | |
| | | 31-Jul-2024 | | | | X | 3.000 | 3035 | CUMPLE |
| COLUMNAS EJE B | 20-Jul-2024 | 23-Jul-2024 | | | | | | | |
| | | 27-Jul-2024 | | X | | | | 2320 | |
| | | 03-Ago-2024 | | | | | | | |
| | | 17-Ago-2024 | | | | X | 3.000 | 3317 | CUMPLE |

**Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA**

| DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta) | FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa) | FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa) | EDAD DEL ENSAYO | | | | RESISTENCIA REQUERIDA (PSI) | RESISTENCIA FINAL OBTENIDA (PSI) | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 7 | 14 | 28 | | | |
| ZAPATAS A | 21-Jun-2024 | 24-Jun-2024 | X | | | | | 1599 | |
| | | 28-Jun-2024 | | X | | | | 2212 | |
| | | 05-Jul-2024 | | | X | | | 2926 | |
| | | 19-Jul-2024 | | | | X | 3.000 | 3100 | CUMPLE |
| ZAPATAS B | 25-Jun-2024 | 28-Jun-2024 | X | | | | | 1682 | |
| | | 02-Jul-2024 | | X | | | | 2185 | |
| | | 09-Jul-2024 | | | X | | | 2959 | |
| | | 23-Jul-2024 | | | | X | 3.000 | 3174 | CUMPLE |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN A | 03-Jul-2024 | 06-Jul-2024 | X | | | | | 1484 | |
| | | 10-Jul-2024 | | X | | | | 2160 | |
| | | 17-Jul-2024 | | | X | | | 2762 | |
| | | 31-Jul-2024 | | | | X | 3.000 | 3050 | CUMPLE |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN B | 06-Jul-2024 | 09-Jul-2024 | X | | | | | 1731 | |
| | | 13-Jul-2024 | | X | | | | 2226 | |
| | | 20-Jul-2024 | | | X | | | 3009 | |
| | | 03-Ago-2024 | | | | X | 3.000 | 3281 | CUMPLE |
| COLUMNAS A | 16-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | X | | | | | 1772 | |
| | | 23-Jul-2024 | | X | | | | 2424 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30-Jul-2024 | | | X | | | 2926 | |
| | | 13-Ago-2024 | | | | X | 3.000 | 3388 | CUMPLE |
| COLUMNAS B | 20-Jul-2024 | 23-Jul-2024 | X | | | | | 1739 | |
| | | 27-Jul-2024 | | X | | | | 2341 | |
| | | 03-Ago-2024 | | | X | | | 2852 | |
| | | 17-Ago-2024 | | | | X | 3.000 | 3314 | CUMPLE |

## 11. CONTROL DE ANTICIPO

| Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha (dd/mm/aaaa) | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo (25%) | 04/12/2023 | $132.790.430,25 | | $126.150.908,00 |
| Acta parcial No. 01 | | | | |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $531.161.721,00 | | $531.161.721,00 | | |

## 12. COMITES DE OBRA

| Fecha de Realización (dd/mm/aaaa) | Lugar | Resultado del Comité (Describir) |
|---|---|---|
| 27/11/2023 | Oficina Interventoría | Socializadas las observaciones estructurales, observaciones a las memorias de cálculo, el contratista queda con el compromiso de enviar formalmente a la Entidad Contratante las observaciones encontradas. |
| 05/12/2023 | Inderhuila | Una vez entregadas y expuestas las observaciones estructurales encontradas, la Entidad Contratante se compromete a dar respuesta en el transcurso de la semana siguiente. |
| 5/06/2024 | Oficina interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda. | Trámite para convocar comité técnico con la Supervisión del Contrato, con el fin de analizar y estudiar el hallazgo de roca en el material de la excavación. Y material de orgánico – Remplazo de material; ítem nuevos y no previstos |
| 12/06/2024 | INDERHUILA – Área de Infraestructura | Aprobación y aval por parte de la supervisión Inderhuila e interventoría de la creación de ítem nuevo: "Excavación en Roca. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada" sustitución del material orgánico en – cimentación con ciclópeo corte y rotura demolición de placa. |
| 18/06/2024 | Obra | Se realiza comité de obra, en el sitio de la obra, con el fin de verificar el avance y seguimiento cuantitativo de los ítem nuevos y no previstos. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Se realiza de forma conjunta interventoría y contratista, la verificación de las cantidades ejecutadas y por ejecutar con el fin de realizar Balance de Obra. |
| 2/07/2024 | inderhuila | Participantes Contratista, Interventoría y la entidad contratante Inderhuila, representado por la Supervisión, ingeniera Karoll Lisseth Buitrago y el apoyo a la el supervisión del contrato el Arq., Yovanny peña fierro donde se le presenta a los supervisores del contrato las actividades del contrato e ítem no previstos que no estaban contemplados en el contrato, pero que son relevantes para el desarrollo del mismo; como son remplazo de material de excavación por ciclópeo ya que el material de excavación es totalmente orgánico y no cumple para el soporte de una estructura por lo que se realiza mejoramiento del terreno.<br><br>Teniendo en cuenta que es una actividad necesaria e indispensable para el desarrollo y continuidad de la obra, aclarando que la interventoría realizará el seguimiento cuantitativo de las cantidades ejecutadas en obra, con el compromiso de realizar el respectivo balance de obra a través del Acta de Mayores y menores cantidades y creación de ítem no previsto, en el que el contratista presentará el respectivo APU, para el correspondiente aval de la interventoría y revisión y aprobación de la entidad contratante.<br><br>***La entidad contratante Inderhuila autoriza los trabajos para darle continuidad a la obra solicitando que se lleve a cabo los compromisos antes mencionados.*** |
| 12/07/2024 | Oficina Empresa Sociedad Técnica Sota Ltda. | Revisión y aval por parte de la interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda. del balance de obra con sus respectivas memorias de cálculo de las mayores y menores cantidades e ítem no previstos e ítem nuevos con sus respectivos APU. |

## 13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

| TIPO DOCUMENTO | FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa) | No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA) | FORMATO (Físico/Digital) |
|---|---|---|---|
| Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.0)) | 07/11/2023 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas R.C (Endoso (No.0)) | 07/11/2023 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.1)) | 10/01/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas R.C (Endoso (No.1)) | 10/01/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.2)) | 12/01/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólizas R.C (Endoso (No.2)) | 12/01/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.3)) | 12/01/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas R.C (Endoso (No.3)) | 12/01/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.4)) | 24/06/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Pólizas R.C (Endoso (No.4)) | 24/06/2024 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| | | | |
| Actas de socialización e inicio de obra | 27/12/02023 | S.N. | Físico |
| Actas de conformación de veeduría ciudadana | 27/12/02023 | S.N. | Físico |
| Acta de vecindad | N.A. | | |
| Actas de comités (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024) | 27/12/2023<br>30/06/2024<br>25/07/2024 | S.N. | Físico |
| | | | |
| Registros de ensayos de laboratorio (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024) | 30/06/2024<br>25/07/2024 | S.N. | Físico |
| | | | |
| Registros de ensayos de calidad (periodo del (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024)) | 30/06/2024<br>25/07/2024 | S.N. | Físico |
| | | | |
| Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024) | 27/12/2023<br>30/06/2024<br>25/07/2024 | S.N. | Físico |
| | | | |
| Correspondencia (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024)) | 25/07/2024 | S.N. | Físico |
| | | | |
| Registro fotográfico de valla | 12/12/2023 | S. N | FISICO Y DIGITAL |
| Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO) (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024) | 27/12/2023 | S.N. | Físico |
| Copias de Bitácora de Obra (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024) | 27/12/2023<br>30/06/2024<br>25/07/2024 | S.N. | Físico |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Informe HSEQ (periodo del 1/07/2024 al 25/07/2024) | 30/06/2024<br>25/07/2024 | S.N. | Físico |

## 14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

| NOMBRE YAPELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN | CARGO | MODALIDAD DE CONTRATACION |
|---|---|---|---|
| RICARDO BARRERO MOSSOS | 80426493 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | TERMINO FIJO |
| JAVIER ANTONIO NOREÑA | 7721877 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | TERMINO FIJO |
| JAVIER BARRERO MOSSOS | 7.685.694 | REPRESENTANTE LEGAL | TERMINO FIJO |

## 15. RELACIÓN DE PAGOS

| TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.) | No. COMPROBANTE | FECHA |
|---|---|---|
| Anticipo | 2024 000 609 | 14/06/2024 |
| Acta parcial No. 01 | En Tramite | En Tramite |

## 16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| PERSONAL | PENSIÓN | SALUD | ARL | CCF | PARAFISCALES | No. PLANILLA | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO BARRERO MOSSOS | $ 1.280.000 | $ 320.000 | $ 556.800 | $ 320.000 | $ | 28596922 | 28/12/2023 |
| | $ 1.280.000 | $ 320.000 | $ 556.800 | $ 480.000 | $ | 28766729 | 17/01/2024 |
| | $ 960.000 | $ 240.000 | $ 417.600 | $ 240.000 | $ | 30379123 | 08/07/2024 |
| | $ 960.000 | $ 240.000 | $ 417.600 | $ 240.000 | $ | 30379674 | 08/08/2024 |
| | | | | | | | |
| **PERSONAL** | **PENSIÓN** | **SALUD** | **ARL** | **CCF** | **PARAFISCALES** | **No. PLANILLA** | **FECHA DE PAGO** |
| JAVIER ANTONIO NOREÑA | $ 352.000 | $ 88.000 | $ 11.500 | $ 88.000 | $ | 28404527 | 12/12/2023 |
| | $ 352.000 | $ 88.000 | $ 11.500 | $ 88.000 | $ | 28818588 | 19/01/2024 |
| | $ 361.600 | $ 90.400 | $ 11.800 | $ 90.400 | $ | 30202546 | 31/06/2024 |
| | $ 361.600 | $ 90.400 | $ 11.800 | $ 90.400 | $ | 30559926 | 31/07/2024 |
| | | | | | | | |
| **PERSONAL** | **PENSIÓN** | **SALUD** | **ARL** | **CCF** | **PARAFISCALES** | **No. PLANILLA** | **FECHA DE PAGO** |
| JAVIER BARRERO MOSSOS | $960.000 | $240.000 | $417.600 | $240.000 | $ | 28404079 | 12/12/2023 |
| | $960.000 | $240.000 | $417.600 | $240.000 | $ | 28766644 | 19/01/2024 |
| | $ 960.000 | $ 240.000 | $ 417.600 | $240.000 | $ | 30128247 | 31/07/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 960.000 | $ 240.000 | $ 417.600 | $240.000 | $ | 30559993 | 31/07/2024 |
| | | | | | | | |

## 17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

**Póliza legalización del CONTRATO:**

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | AMPARO | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-44-101051737 | 0 | 07/11/2023 | Cumplimiento del contrato | 02/11/2023 | 02/08/2024 |
| | | | | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 02/11/2023 | 02/02/2027 |
| | | | | Estabilidad y Calidad de Obras | 02/02/2024 | 02/02/2029 |

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-40-101018842 | 0 | 07/11/2023 | 02/11/2023 | 02/02/2024 |

**Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:**

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | AMPARO | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-44-101051737 | 1 | 01/01/2024 | Cumplimiento del contrato | 02/11/2023 | 02/08/2024 |
| | | | | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 02/11/2023 | 02/02/2027 |
| | | | | Estabilidad y Calidad de Obras | 02/02/2024 | 02/02/2029 |

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-40-101018842 | 1 | 01/01/2024 | 02/11/2023 | 02/02/2024 |

**Póliza actualizada**

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | AMPARO | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-44-101051737 | 2 | 01/01/2024 | Cumplimiento del contrato | 22/11/2023 | 21/08/2024 |
| | | | | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 21/11/2023 | 21/02/2027 |
| | | | | Estabilidad y Calidad de Obras | 21/02/2024 | 21/02/2029 |

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-40-101018842 | 2 | 01/01/2024 | 2111/2023 | 21/02/2024 |

**Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1**

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | AMPARO | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-44-101051737 | 3 | 01/01/2024 | Cumplimiento del contrato | 21/11/2023 | 21/08/2024 |
| | | | | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 21/11/2023 | 21/02/2027 |
| | | | | Estabilidad y Calidad de Obras | 21/02/2024 | 21/02/2029 |

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-40-101018842 | 3 | 01/01/2024 | 21/11/2023 | 21/02/2024 |

**Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:**


**POLIZA DE CUMPLIMIENTO** (Relacionar todas las actualizaciones)




| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | AMPARO | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-44-101051737 | 4 | 24/06/2024 | Cumplimiento del contrato | 21/11/2023 | 23/01/2025 |
| | | | | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 21/11/2023 | 26/07/2027 |
| | | | | Estabilidad y Calidad de Obras | 21/02/2024 | 21/02/2029 |

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** (Relacionar todas las actualizaciones)

| ASEGURADORA | No. | ENDOZO | FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) | VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 61-40-101018842 | 4 | 24/06/2024 | 21/11/2023 | 25/07/2024 |

**18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
(Describir el contenido del plano)

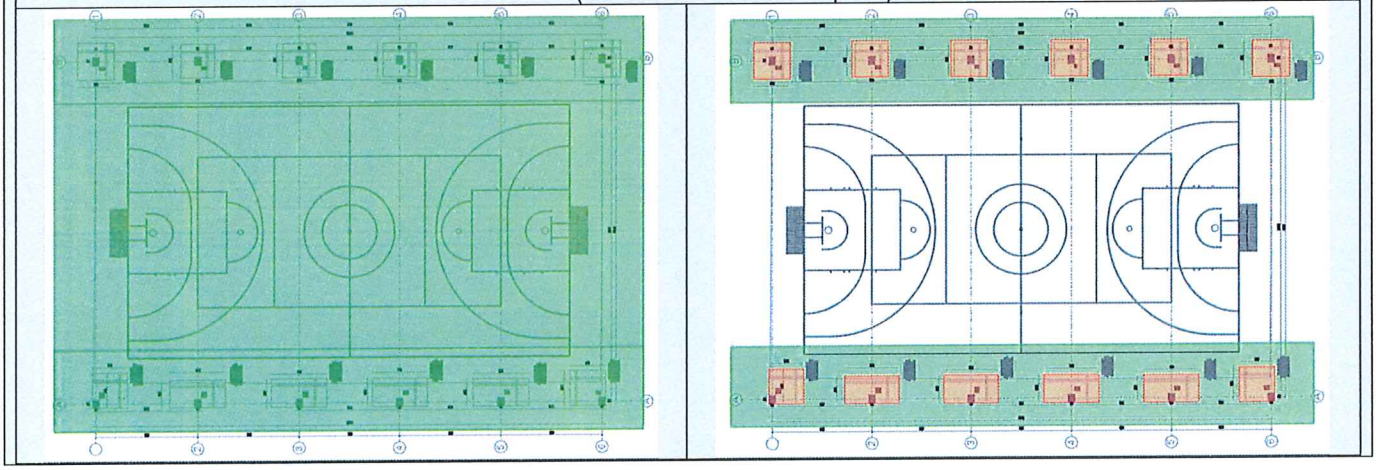
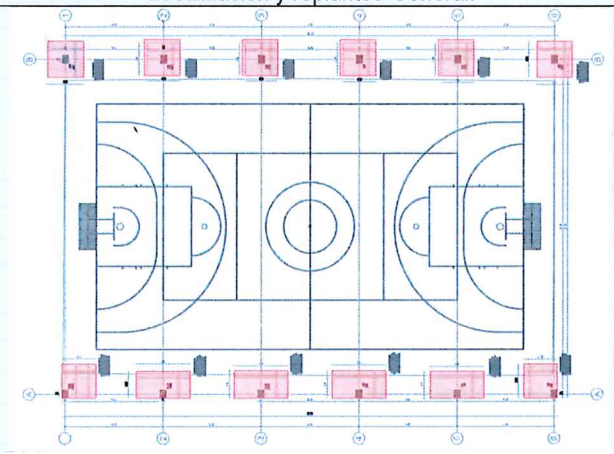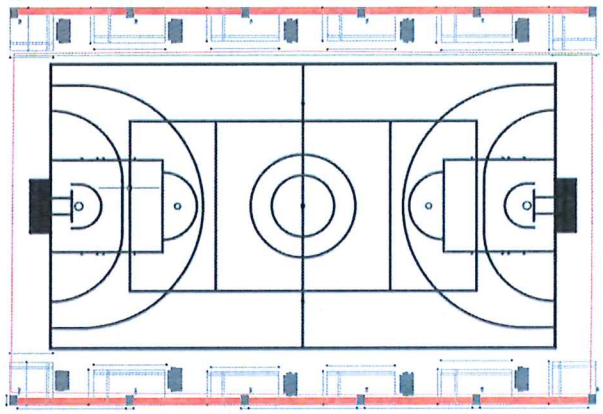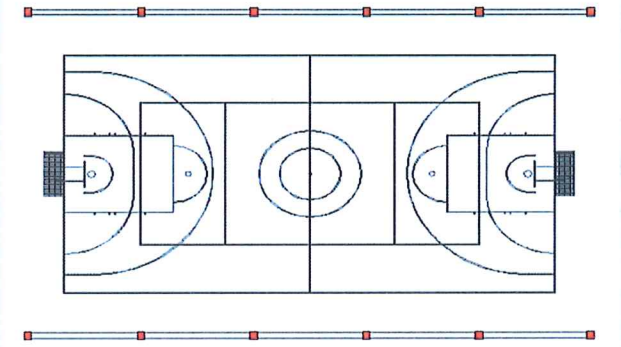
| Loaalización y replanteo General. | Excavación y Relleno. |
|---|---|
|  Construcción Zapatas. |  Construcción Viga de Cimentación. |
|  Construcción de Columnas. | |

**19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS**

**PRESUPUESTO "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | INFORME 1 | | | INFORME 2 | | | ACUMULADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANTIDAD | VR/UNIT | VR/TOTAL | CANTIDAD | VALOR | PORCENTAJE | CANTIDAD | VALOR | PORCENTAJE | CANTIDAD | VALOR | PORCENTAJE |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localizacion y replanteo | M2 | 678,41 | $ 3.559,00 | $ 2.414.461,00 | 678,41 | $ 2.414.461,19 | 0,57% | 0,00 | $ - | 0,00% | 678,41 | $ 2.414.461,19 | 0,57% |
| 1,2 | Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla,cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante. | ML | 60,8 | $ 20.862,00 | $ 1.268.410,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 1,3 | Excavación manual sin clasificar Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 306,43 | $ 46.008,00 | $ 14.098.231,00 | 280,00 | $ 12.882.240,00 | 3,03% | 26,43 | $ 1.215.991,44 | 0,29% | 306,43 | $ 14.098.231,44 | 3,32% |
| 1,4 | Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente. | M3 | 108,90 | $ 83.859,00 | $ 9.132.560,00 | 65,85 | $ 5.522.115,15 | 1,30% | 43,05 | $ 3.610.444,42 | 0,85% | 108,90 | $ 9.132.559,57 | 2,15% |
| | | SUB-TOTAL | | | **$ 26.913.662,00** | | **$ 20.818.816,34** | | | **$ 4.826.435,86** | | | **$ 25.645.252,20** | |
| 2 | CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts. | M2 | 86,33 | $ 34.016,00 | $ 2.936.431,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 2,2 | Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño. | M3 | 74,14 | $ 619.136,00 | $ 45.902.743,00 | 45,73 | $ 28.313.089,28 | 6,66% | 0,00 | $ - | 0,00% | 45,73 | $ 28.313.089,28 | 6,66% |
| 2,3 | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas. | KG | 5104,00 | $ 7.117,00 | $ 36.325.168,00 | 4193,55 | $ 29.845.495,35 | 7,02% | 0,00 | $ - | 0,00% | 4.193,55 | $ 29.845.495,35 | 7,02% |
| 2,4 | Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño. | M3 | 4,46 | $ 742.129,00 | $ 3.309.895,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 3,50 | $ 2.597.451,50 | 0,61% | 3,50 | $ 2.597.451,50 | 0,61% |
| 2,5 | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación. | KG | 1567,00 | $ 7.117,00 | $ 11.152.339,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 1000,00 | $ 7.117.000,00 | 1,67% | 1.000,00 | $ 7.117.000,00 | 1,67% |
| | | SUB-TOTAL | | | **$ 99.626.576,00** | | **$ 58.158.584,63** | | | **$ 9.714.451,50** | | | **$ 67.873.036,13** | |
| 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. | M3 | 16,00 | $ 920.937,00 | $ 14.734.992,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 12,85 | $ 11.834.040,45 | 2,78% | 12,85 | $ 11.834.040,45 | 2,78% |
| 3,2 | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas. | KG | 5695,00 | $ 7.117,00 | $ 40.531.315,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 3258,00 | $ 23.187.186,00 | 5,46% | 3.258,00 | $ 23.187.186,00 | 5,46% |
| 3,3 | Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado. | M3 | 17,00 | $ 1.004.994,00 | $ 17.084.898,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 3,4 | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal. | KG | 2367,00 | $ 7.117,00 | $ 16.845.939,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | Suministro e instalación de manto zetal viga canal. | M2 | 60,80 | $ 40.352,00 | $ 2.453.402,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | | SUB-TOTAL | | | $ 91.650.546,00 | | $ 0,00 | | | $ 35.021.226,45 | | | $ 35.021.226,45 | |
| 4 | CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. | M2 | 684,30 | $ 211.583,00 | $ 144.786.247,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | | SUB-TOTAL | | | $ 144.786.247,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | |
| 5 | ACABADOS - PLACA EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 307,11 | $ 14.799,00 | $ 4.544.921,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 5,2 | Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño. | ML | 60,80 | $ 83.862,00 | $ 5.098.810,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | | SUB-TOTAL | | | $ 9.643.731,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | |
| 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 50,48 | $ 80.155,00 | $ 4.046.224,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 6,2 | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 20,40 | $ 107.103,00 | $ 2.184.901,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 6,3 | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. | ML | 2,20 | $ 219.079,00 | $ 481.974,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 6,4 | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño. | UND | 2,00 | $ 350.030,00 | $ 700.060,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | | SUB-TOTAL | | | $ 7.413.159,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | |
| 7 | PLACA POLIDEPORTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. | UND | 3,00 | $ 638.978,00 | $ 1.916.934,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,2 | disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 10,98 | $ 46.008,00 | $ 505.168,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,3 | Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. | ML | 28,00 | $ 49.348,00 | $ 1.381.744,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,4 | Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" | UND | 2,00 | $ 304.539,00 | $ 609.078,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,5 | Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" | UND | 2,00 | $ 282.310,00 | $ 564.620,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,6 | Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. | UND | 1,00 | $ 1.016.947,00 | $ 1.016.947,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,7 | Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. | UND | 1,00 | $ 4.701.770,00 | $ 4.701.770,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,8 | Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. | ML | 14,00 | $ 88.546,00 | $ 1.239.644,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,9 | Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. | UND | 12,00 | $ 369.013,00 | $ 4.428.156,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,10 | Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. | ML | 60,00 | $ 58.160,00 | $ 3.489.600,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,11 | Suministro e instalación de reflector led de 150 w | UND | 12,00 | $ 1.018.910,00 | $ 12.226.920,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,12 | Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. | UND | 1,00 | $ 975.130,00 | $ 975.130,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,13 | Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. | UND | 1,00 | $ 1.035.490,00 | $ 1.035.490,00 | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | | **SUB-TOTAL** | | | **$ 34.091.201,00** | | **$ 0,00** | | | **$ 0,00** | | | **$ 0,00** | |
| 8 | **TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Transporte de materiales petreos. | M3-Km | 9822,05 | $ 1.100,00 | $ 10.804.255,00 | 8459,00 | $ 9.304.900,00 | 2,19% | 1363,05 | $ 1.499.355,00 | 0,35% | 9.822,05 | $ 10.804.255,00 | 2,54% |
| | | **SUB-TOTAL** | | | **$ 10.804.255,00** | | **$ 9.304.900,00** | | | **$ 1.499.355,00** | | | **$ 10.804.255,00** | |
| | | ***Costo Directo*** | | | **$ 424.929.377,00** | | **$ 88.282.300,97** | **25.08%** | | **$ 51.061.468,81** | **12,02%** | | **$ 139.343.769,78** | **37.10%** |

**NOTA:** Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. HERNAN DARIO RIVERA F.
DIRECTOR DE OBRA

ING. **RICARDO BARRERO MOSSOS**
DIERCTOR DE INTERVENTORIA

## ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO OBRA

- VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... $ 473.402.864
- VALOR DEL ANTICIPO..... $ 118.350.716
- PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 25%

**AVANCE FISICO REAL**

- Avance Físico Mensual..... **12.02%**
- Avance Físico Acumulado..... **37.10%%**

**AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA**

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del 56.81%

**PORCENTAJE DE AVANCE O ATRASO SEGÚN CRONOGRAMA**

Se presenta un atraso de obra del 19.71%

**AVANCE EN TIEMPO**

- Tiempo Total de Obra..... 90 días
- Tiempo Total Transcurrido .....89 días
- Tiempo Total que les queda..... 61días
- Avance Porcentual según plazo inicial..... 98.88%

## COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Nota:

- Teniendo en cuenta la aprobación por parte del Inderhuila supervisor del contrato el Arq. Yovanny Peña Fierro de actividades de ítem no previstos pero necesarios para el desarrollo del contrato; se inician actividades contractuales e ítem no previstos llevando esta interventoría la cuantificación y verificación de cantidades.

- Trabajos que se llevan a cabo según las especificaciones técnicas del contrato.

## 20. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion Acero de Refuerzo.



Construccion Columnas.

## 21. ANEXOS

- ACTAS DE COMITÉS.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO

| | | |
|---|---|---|
| ING. RICARDO BARRERO MOSSOS | (25/07/2024) | ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO |
| FIRMA ORIGINAL<br>**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** | **FECHA DE ENTREGA** | FIRMA ORIGINAL<br>**Vo. Bo APOYO SUPERVISION** |

02 de Julio 2024

Se termina de instalar formaleta en madera para la viga de cimentacion del eje A, Se inicia instalacion de los separadores en concreto para evitar que los aceros longitudinales de la viga de cimentacion del eje B no se apoye en el suelo, Se inicia la instalación de los aceros de refuerzo para esta viga.

Residente Obra

Residente Interventor



03 de Julio del 2024

Luego de verificar los aceros longitudinales y transversales y con el visto bueno de la interventoria; Se realiza el vaciado del Concreto de 3.000 psi en la viga de cimentacion del eje A, Se realiza prueba de asentamiento 7,1" y Se toman 4 muestras de especimenes de concretos

Residente Obra

Residente Interventor

04 de Julio del 2024

Se Continua Con la instalacion de los aceros de refuerzos longitudinales y transversales de la viga de Cimentacion del eje B, Se inicia la Instalacion de Formaleta en madera para viga de cimentacion

Resi. Obra

Resi. Inter.



05 de Julio del 2024

Se termina de Instalar la formaleta en madera para la viga de Cimentacion en el eje B, Se Continua amarre de acero de refuerzo para columnas.

Resi. Obra

Resi. Inter.

06 de Julio del 2024

luego de Verificar los aceros de refuerzos longitudinales y transversales de la viga de cimentacion eje B, y Con el visto bueno de Interventoria Se procede a realizar la fundicion de la misma asi como la prueba de asentamiento de 6,8" y se toman 4 especimenes de Concreto para rotura de cilindros. como igualmente la interventoria toma 4 especimenes de Concreto.

Resi. Obra

Resi. Interv.



07 de Julio del 2024

No se realizan laboratios

Resi. Obra

Resi. Interv.

08 de Julio del 2024

Se Continua realizando el amarre de los aceros de refuerzo longitudinales y transversales, Se levantan los Castillos de los Columnas del eje A. A6 - A5 - A4.

Rosi Obra

Rosi Interventoria



09 de Julio del 2024

Se inicia el amarre en los Castillos de las Columnas A6 - A5 - A4, amarrando los flejes de estas, así como los zunchos en ambos sentidos, llega al proyecto 150 bultos de cemento.

Rosi Obra

Rosi Inter.

10 de Julio del 2024

Se Continua Con el amarre de los aceros tramversales de las Columnas A6 - A5 - A4 asi Como los ganchos en ambos sentidos,

llega al proyecto un viaje de Hierro de ½", asi Como un viaje de arena

[redacted]
Resi Obra

Resi Inter.



11 de Julio del 2024

Se presenta lluvia durante en la mañana y la tarde, por lo Cual no fue posible trabajar.

[redacted]
Resi Obra

Resi Inter.

12 de Julio del 2024

Se Continua Con la Instalacion de los aceros de refuerzo en las Columnas A6 - A5 - A4, lo cual se termina y se inicia la instalacion de aceros de refuerzos transversales en las Columnas A3 - A2 - A1.

Resi. Obra

Resi. Inter.



13 de Julio del 2024

Se Continua con la instalacion de los aceros de refuerzos transversales asi como los ganchos en ambos sentido, llega al proyecto, formaleta metalica, para formaletiar la totalidad de las columnas a Construir, Se inicia la formaletiada de las columnas A6 - A5 - A4

Resi Obra

Resi. Inter.

14 de Julio del 2024

No se realizan labores en obra

Rosi Obra

Rosi Interv.



15 de Julio del 2024

Se termina de instalar los aceros de refuerzos ~~long~~ transversales asi como los ganchos en ambos sentidos. Se inicia la instalacion de formaleta metalica y se termina en estas columnas asi como en las columnas A6-A5-A4.

Se inicia instalacion de aceros de refuerzo transversal en columnas B6- B5 - B4

Rosi Obra

Rosi Interve.

16 de Julio del 2024

Se realiza la verificacion de la instalación de los aceros de refuerzos longitudinales y transversales con la interventoria, de las columnas del eje A, luego de aplomarlas, Se realiza la fundicion de estas con Concreto de 3.000 psi asi como la prueba de asentamiento 6,9" y se toman 4 pruebas de especimenes de Concreto, por parte del contratista de obra, asi como 4 muestras por parte de la interventoria.

Resi Obra

Resi Inter.



17 de Julio del 2024

Se continua Con la instalacion de aceros de refoorzos transversales asi como los ganchos en ambos Sentidos de las columnas B6 - B5 B4.

Resi Obra

Resi Inter.

18 de Julio del 2024

Se termina la instalacion de aceros de refuerzo transversales en las Columnas B6 - B5 - B4 y se inicia la instalacion de formaleta metalica de estas Columnas, y se inicia la instalacion de aceros de refuerzo transversales asi como los anchos en ambos sentidos de las columnas B3 - B2 - B1. Se desformaletea las Columnas A6 A5 - A4

Residente Obra

Resi. Interv.



19 de Julio del 2024

Se termina de instalar los aceros de refuerzo en las Columnas B3 - B2 - B1 y se formaletean estas mismas, tambien se desformaletea las columnas A3 - A2 - A1

Residente Obra

Resi. Interv.

20 de Julio del 2024

Se realiza la verificacion de la Instalacion y aplomado de las Columnas del eje B, Se realiza la fundicion de estas Con Concreto de 3.000 Psi Con un asentamiento de 6,7" donde el Contratista de obra toma especimenes de Concreto para el Control de la resistencia del Concreto

Rosi Obra

Rosi Interventoria



21 de Julio del 2024

No Se realizan labores en Obra

Rosi Obra

Rosi Interventoria

22 de Julio del 2024

Llega acero de refuerzo figurado para la vigas aereas asi como un viaje de triturado de 1/2" un viaje de arena y 80 bultos de Cemento.
Se realiza el desformaleteo de las Columnas B1 - B2 - B3

Resi. Obra

Resi. Inter.



23 de Julio del 2024

Se desformaletea las Columnas B4 - B5 - B6, Se realiza el retiro de la formaleta metalica.

Se suspende el Contrato de Obra de acuerdo a lo estipulado en la respectiva acta de Suspension.

Resi. Obra

Resi. Inter

ASOPAGOS s.a.

# CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 014
Período Pensión 2024-06
Período Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-08-08

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Numero Identificación | 80426493 |
| Nombre | RICARDO BARRERO MOSSOS |
| EPS | ALIANSALUD EPS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| Caja de compensación | Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR |
| ARL | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS |
| Número Planilla | 30379674 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | E |
| Periodo Pensión | 2024-06 |
| Periodo Salud | 2024-07 |
| Tipo Cotizante | Dependiente |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 6.000.000 | 0,0400000 | $ 240.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 6.000.000 | 0,1600000 | $ 960.000 | $ 0 | $ 0 | $ 960.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 0 |

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6.000.000 | 0,0696000 | $ 417.600 | 6 |

## APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 6.000.000 | 0,0400000 | $ 240.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

ASOPAGOS s.a.

# CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2024-06
Período Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-07-31

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Numero Identificación | 7685694 |
| Nombre | JAVIER BARRERO MOSSOS |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| Caja de compensación | Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR |
| ARL | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS |
| Número Planilla | 30559993 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | E |
| Periodo Pensión | 2024-06 |
| Periodo Salud | 2024-07 |
| Tipo Cotizante | Dependiente |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 6.000.000 | 0,0400000 | $ 240.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 6.000.000 | 0,1600000 | $ 960.000 | $ 0 | $ 0 | $ 960.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 0 |

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6.000.000 | 0,0696000 | $ 417.600 | 891101100 |

## APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 6.000.000 | 0,0400000 | $ 240.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Período Pensión 2024-06
Período Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-07-31

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Numero Identificación | 7721877 |
| Nombre | JAVIER ANTONIO NOREÑA ROJAS |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| Caja de compensación | Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR |
| ARL | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS |
| Número Planilla | 30559926 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | E |
| Periodo Pensión | 2024-06 |
| Periodo Salud | 2024-07 |
| Tipo Cotizante | Dependiente |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.259.394 | 0,0400000 | $ 90.400 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.259.394 | 0,1600000 | $ 361.600 | $ 0 | $ 0 | $ 361.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.259.394 | 0,0052200 | $ 11.800 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.259.394 | 0,0400000 | $ 90.400 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
