Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	Rama Judicial -Coordinación Administrativa Florenc	**Fecha del informe:**	23/10/2025
Unidad responsable:	Area Administrativa - Florencia Caquetá	**Contrato No.**	036 de 2025
Supervisor (es):	BERNARDO MENDEZ CUERVO	**Fecha de suscripción:**	9/09/2025
	C.C. 7.705.913 expedida en Neiva - Huila	**Valor total:**	$ 123.508.633,05
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	**106 días** Del 17/9/2025 al 31/12/2025
Contratista:	**CONSORCIO INTERFORENCIA**	**Fecha de terminacion:**	31/12/2025
Nit:	901979104	**Lugar de ejecución:**	FLORENCIA
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía (IP-12 DE 2025)	**Porcentaje avance:**	12%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION
Objeto de contratación: Contratar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía que consiste en contratar el mantenimiento y adecuaciones del Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castañeda” de la ciudad de Florencia – Caquetá.			

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	17/09/2025
Plazo inicial:	106 días
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2025
Fecha terminación:	31/12/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	NA			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 123.508.633,05			**Valor Total:**	$ 123.508.633,05
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 92.656.176,52

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
24,98	30.852.456,53	**Pago 001** - Factura No. **FE-1** de fecha 23/10/2025 - Correspondiente a las actividades realzaidas por interventoria durante el periodo comprendido entre 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025.
24,98		
	30.852.457	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
23/10/2025	44,00	24,98	Dentro del proceso de interventoría técnica al contrato de obra civil 035 suscrito para el mantenimiento del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia, Caquetá, se han desarrollado las siguientes actividades durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre de 2025: *Acompañamiento en la inspección técnica inicial realizada en la sede judicial, con el objetivo de evaluar las condiciones preliminares requeridas para el inicio de labores en sitio y el desarrollo adecuado de la obra. *Seguimiento a la ejecución de actividades en sitio, entre las que se destacan: Demolición de pañetes afectados por humedad en el sótano, Oficina 104 – *Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y auditorio, ubicados en el primer piso del edificio. *Aplicación de inhibidor de hongos, nuevos pañetes e impermeabilizados. *Aplicación de estuco acrílico, lijado de estucos, acopio y trasiego de escombros. *Aplicación de pinturas tipo 2. Estas acciones han sido verificadas por la interventoría en cuanto a su correcta ejecución técnica y cumplimiento de especificaciones contractuales. A la fecha, el proyecto presenta un avance físico estimado del 24.98%.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
23/10/2025	Interventoría ejercida al proceso de obra 035 de 2025 que tiene por objeto principal llevar a cabo el Mantenimiento al Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia - Caquetá, ejecutandose las siguientes actividades: Acompañamiento en la inspección técnica inicial realizada en la sede judicial, con el objetivo de evaluar las condiciones preliminares requeridas para el inicio de labores en sitio y el desarrollo adecuado de la obra. *Seguimiento a la ejecución de actividades en sitio, entre las que se destacan: Demolición de pañetes afectados por humedad en el sótano, Oficina 104 – *Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y auditorio, ubicados en el primer piso del edificio. *Aplicación de inhibidor de hongos, nuevos pañetes e impermeabilizados. *Aplicación de estuco acrílico, lijado de estucos, acopio y trasiego de escombros. *Aplicación de pinturas tipo 2. Estas acciones han sido verificadas por la interventoría en cuanto a su correcta ejecución técnica y cumplimiento de especificaciones contractuales.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**
6/10/2025	Mediante correo electrónico, el área administrativa del Palacio de Justicia de Florencia —como responsable de las sedes judiciales y en especial de aquella donde se adelanta el proyecto de obra—, y en apoyo a la labor de supervisión, envió solicitud al contratista para la entrega de los documentos pendientes, reiterando la obligación de cumplir de manera taxativa con cada uno de los compromisos establecidos en el contrato.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

El Contrato de **Interventoría 036 de 2025** ejecutado al proceso de Obra Civil No. 035 de 2025, suscrito para adelantar el mantenimiento del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia, Caquetá, se ha venido ejecutando de manera normal, continua y sin contratiempos.

A la fecha, se han desarrollado las siguientes actividades:

*Acompañamiento en la Inspección técnica en la sede judicial, con el objetivo de evaluar las condiciones preliminares requeridas para el inicio de labores en sitio y el desarrollo de la obra.
*Demolición de los pañetes afectados por humedad en el sótano, Oficina 104 – Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y auditorio, ubicados en el primer piso del edificio.
*Aplicación de inhibidor de hongos, nuevos pañetes e impermeabilizados.
*Aplicación de estuco acrílico, lijado de estucos, acopio y trasiego de escombros.
*Aplicación de pinturas tipo 2.

Estas intervenciones han permitido avanzar en el mejoramiento de las condiciones físicas del inmueble, contribuyendo a fortalecer la imagen institucional y a generar espacios más adecuados para el bienestar de los servidores judiciales.

Resumen pendientes del contratista:

Remisión de documentos descritos en las obligaciones contractuales y conforme a lo enunciado en el pliego de condiciones IP-12-2025.

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR
BERNARDO MENDEZ CUERVO

Contrato 036 de 2025

CONSORCIO INTERFLORENCIA
NIT 901.979.104-8
CALLE 39A No 6W 18
Tel: (57) - Ext. undefined
Neiva - Colombia
ASESORIASDJ22@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 1

Señores	DIRECCION ADMINISTRATIVA JUDICIAL NEIVA HUILA		
NIT	800.165.866-1	**Teléfono**	(608) 3103995554 - Ext. 000
Dirección	Ed Palacio de Justicia OF 105	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 15:23
Expedición	23/10/2025, 16:01
Vencimiento	07/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial 1 correspondiente al periodo 17 de septiembre al 22 de octubre 2025 Contrato de interventoria No. 036 de 2025 Objeto : CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA GERARDO CORTES CASTAÑEDA DE LA CIUDAD DE FLORENCIA - CAQUETÁ.	1.00	30,852,456.53

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-07 por $ 30,852,456.53

Observaciones:
#$27-01-02-012;036DE2025;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Total Bruto	25,926,434.06
IVA 19%	4,926,022.47
Total a Pagar	**30,852,456.53**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100483078 aprobado en 20251022 prefijo FE desde el número 1 al 15 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 652304dcb7ae256fa28b54b5046ed6613d8576896b27fdbd392a95b370ef099e4dbc406db2206a7d3484cedc11de34bd

INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL ___x___ **FINAL** _____

PERIODO DE ____17/09/2025____ **A** ____22/10/2025____

CONTRATO No. : 035 DE 2025 (17/09/2025)

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Selección Abreviada de Menor Cuantía (SA-05 DE 2025).

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : SA-05-2025

OBJETO : "CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA "GERARDO CORTES CASTAÑEDA" DE LA CIUDAD DE FLORENCIA – CAQUETÁ"

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA GERARDO CORTES CASTAÑEDA DE LA CIUDAD DE FLORENCIA – CAQUETÁ.

VALOR : MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (1,400,888,509.60) M/CTE.

PLAZO : Ciento seis (106) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE INICIO : 17 de septiembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de diciembre de 2025

CONTRATISTA : CONSORCIO LPI 25, REPRESENTATE LEGAL LEOMAN BUENDIA VICTORIA.

CONSULTOR INTERVENTORÍA : CONSORCIO INTERFLORENCIA, REPRESENTANTE LEGAL ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA.

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El Contrato de Obra No. 035 de 2025 fue suscrito el día 17 de septiembre de 2025 entre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Consorcio LPI 25.

El contratista cumplió con la entrega de los documentos previos exigidos para la legalización del contrato, entre ellos: garantía única, pago de estampillas, pago del impuesto de timbre, y certificación de pago de la prima de la póliza.

La garantía única fue revisada y aprobada por la supervisión, permitiendo la suscripción del Acta de Inicio el 17 de septiembre de 2025.

El contratista ha venido ejecutando las actividades conforme al cronograma aprobado, entregando informes semanales y mensuales dentro de los plazos establecidos, los cuales han sido revisados por la interventoría.

A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución sin novedades contractuales que afecten su desarrollo.

1.1. GARANTÍAS

El contratista CONSORCIO LPI 25 presentó la Garantía Única No. 61-44-101061115, expedida por Seguros del Estado S.A., la cual ampara los riesgos exigidos en el Anexo 2 del Contrato No. 035 de 2025, así:

- Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato, vigencia: plazo contractual + 4 meses.
- Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales: 20% del valor del contrato, vigencia: plazo contractual + 3 años.
- Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato, vigencia: 5 años contados a partir del acta de recibo final.
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 20% del valor del contrato, vigencia: 5 años contados desde el acta de recibo final.

- Calidad del servicio prestado: 20% del valor del contrato, vigencia: plazo contractual + 4 meses.

Así mismo, presentó la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 61-40-101022133, con amparo por valor de $284.700.000, vigente del 17 de septiembre de 2025 al 6 de enero de 2026, que cubre predios, labores y operaciones; contratistas y subcontratistas; vehículos propios y no propios; y responsabilidad civil patronal.

Las garantías se encuentran vigentes, aprobadas y publicadas en la plataforma SECOP II, cumpliendo con los requisitos contractuales establecidos.

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, el contratista CONSORCIO LPI 25 alcanzó un avance físico del 24,98 % correspondiente a la ejecución de las siguientes actividades:

- Inspección técnica inicial de la sede judicial para evaluar las condiciones preliminares requeridas para el inicio de labores en sitio.
- Demolición de pañetes afectados por humedad en el sótano, primer y segundo piso del edificio.
- Aplicación de pañetes impermeabilizados, estuco acrílico y lijado de estucos.
- Acopio, cargue, transporte y disposición de escombros.
- Aplicación de pinturas tipo 2.
- Fabricación e instalación de cerramiento perimetral y divisiones en vidrio templado.

El desarrollo de estas actividades se ha realizado conforme a las especificaciones técnicas del contrato y bajo supervisión permanente de la interventoría, evidenciándose una ejecución normal y continua sin contratiempos.

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

El avance financiero del contrato a la fecha corresponde igualmente al 24,98 %, equivalente a un valor ejecutado de $ 350.000.000,00 M/CTE, según lo reportado en la factura FE-1 y aprobado mediante el primer informe de avance de obra.

Los pagos se han realizado conforme a las condiciones establecidas en el contrato, sin registrarse retrasos ni observaciones en el flujo financiero.

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

El gasto presupuestal del contrato refleja el valor efectivamente invertido en la ejecución de actividades de mantenimiento y adecuación del Palacio de Justicia de Florencia.

A la fecha de corte (22/10/2025), se ha comprometido y ejecutado un total de $ 350.000.000,00 M/CTE, correspondiente al 24,98 % del valor total del contrato ($ 1.400.888.509,60 M/CTE).

No se evidencian desviaciones presupuestales ni modificaciones al plan de pagos aprobado.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El contrato no contempla anticipo, por lo cual los recursos ejecutados corresponden exclusivamente a actividades certificadas y aprobadas por la interventoría, pagadas contra entrega del primer informe parcial de obra.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Dado que el contrato no ha manejado recursos por concepto de anticipo ni administración directa de fondos públicos por parte del contratista, no se generan rendimientos financieros asociados a la ejecución presupuestal del periodo.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

De acuerdo con la revisión de la documentación aportada por el Contratista LPI-25, se verificó el cumplimiento del Decreto 392 de 2018, mediante el cual se promueve la vinculación laboral de personas con discapacidad.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, el contratista reportó que no cuenta con personal en condición de discapacidad vinculado a la ejecución del contrato; sin embargo, se evidencia que cumple con la normativa en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación.

La interventoría deja constancia de que el contratista presentó los formatos y

certificaciones exigidas, por lo tanto, no se registran incumplimientos frente a este aspecto normativo.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el periodo evaluado, según los informes semanales y mensuales presentados por el Contratista LPI-25, no se reportaron accidentes laborales ni incidentes que afectaran la ejecución del contrato o comprometieran la integridad del personal de obra.

Igualmente, no se registran reclamaciones laborales, demandas o inconformidades por parte del personal vinculado directa o indirectamente a las actividades ejecutadas.

La interventoría verificó la afiliación del personal al sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP) y el cumplimiento de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando un manejo adecuado de los elementos de protección personal y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial establecidas en el contrato.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA 1 (Del 17 al 23 de septiembre de 2025)

Durante la primera semana de ejecución del contrato, el contratista CONSORCIO LPI-25 inició las actividades de carácter preliminar, enfocadas en la organización logística de materiales, adecuación de zonas de trabajo y demoliciones iniciales.

Se llevó a cabo la demolición de pañetes en muros del sótano afectados por humedad, con el fin de proceder posteriormente con los trabajos de impermeabilización.

Asimismo, se realizó el acopio de residuos de construcción y demolición (RCD), dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental y seguridad establecidas.

El avance físico ejecutado durante esta semana fue del 3%, frente al 2% programado, evidenciando un inicio de obra favorable y dentro de los parámetros previstos.

5.2. SEMANA 2 (Del 24 al 30 de septiembre de 2025)

Durante la segunda semana, se continuó con las actividades de mantenimiento y adecuación del Palacio de Justicia, avanzando en el desarrollo de los frentes de trabajo.

Se ejecutó la aplicación de pañetes impermeabilizados y estucos en el sótano, el inicio de la fabricación del cerramiento perimetral en el taller de ornamentación y la demolición de pañetes en oficinas de los pisos 1A y 1B.

Además, se realizó la recolección y disposición temporal de RCD en la zona designada.

El avance físico semanal fue del 4%, acumulando un 7% total, frente al 5% programado, mostrando un rendimiento óptimo.

El contratista informó posibles demoras menores por cierre vial entre los departamentos del Huila y Caquetá, lo cual podría afectar el suministro de materiales.

5.3. SEMANA 3 (Del 1 al 7 de octubre de 2025)

Durante esta semana se desarrollaron actividades relacionadas con acabados y avances en la fabricación de estructuras metálicas.

Se efectuó la aplicación de pinturas en el sótano, la colocación de pañetes impermeabilizados, aplicación de estucos y pintura en oficinas del piso 1A y 1B, y la continuación de la fabricación del cerramiento perimetral.

Igualmente, se inició la fabricación de vidrios templados, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

El avance físico semanal alcanzó un 5%, llegando a un 12% acumulado, evidenciando una ejecución continua y organizada por parte del contratista.

5.4. SEMANA 4 (Del 8 al 14 de octubre de 2025)

En la cuarta semana de ejecución, se avanzó en los trabajos de instalaciones internas, cerramientos y acabados en muros y pisos.

El contratista realizó la instalación de vidrios templados en oficinas del piso 1A, la aplicación de pintura final en muros del sótano y oficinas, y la culminación del cerramiento perimetral metálico.

De igual manera, se efectuó la limpieza general de los frentes intervenidos y se continuó con el control de humedad en zonas previamente tratadas.

El avance físico semanal fue del 5%, con un acumulado del 17%, manteniendo una ejecución acorde a la programación establecida.

5.5. SEMANA 5 (Del 15 al 21 de octubre de 2025)

Durante la quinta semana, se centraron los esfuerzos en terminaciones y alistamiento de áreas para las siguientes fases del proyecto.

Se realizaron retoques de pintura, ajustes menores en estucos, limpieza y disposición final de RCD, y la verificación de niveles y acabados en el área de oficinas.

Además, se desarrollaron labores de mantenimiento preventivo de herramientas y equipos, garantizando su correcto funcionamiento para la continuidad de las obras.

El avance físico semanal fue del 5%, con un acumulado del 22% aproximadamente, manteniendo la tendencia de ejecución positiva observada en semanas anteriores.

Las labores se realizaron bajo cumplimiento de las normas de seguridad industrial y sin incidentes reportados.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante el seguimiento realizado al desarrollo del contrato, se identifican diversos riesgos que podrían afectar el normal avance del proyecto. Entre ellos se destacan las condiciones climáticas adversas propias de la ciudad de Florencia, donde las lluvias constantes han generado y podrían continuar generando demoras en la ejecución de actividades que requieren condiciones secas, como pintura, transporte y trabajos en exteriores. Adicionalmente, se evidencian riesgos relacionados con retrasos en el suministro de materiales provenientes de otras regiones del país, debido a posibles afectaciones en las vías de acceso entre los departamentos del Huila y Caquetá. También se considera el riesgo de alteraciones del orden público o manifestaciones sociales que puedan restringir el acceso del personal o la movilización de materiales hacia el sitio de obra. Por otra parte, existen riesgos técnicos asociados a condiciones no visibles durante la etapa inicial,

tales como humedades o deterioros estructurales no detectados, que podrían requerir ajustes en el diseño o la programación. Asimismo, se han identificado riesgos administrativos derivados de posibles demoras en la entrega de informes semanales, registros fotográficos o documentación técnica por parte del contratista, lo cual podría afectar los tiempos de revisión y respuesta por parte de la Interventoría. Finalmente, se reconocen riesgos laborales menores propios de las actividades de mantenimiento y adecuaciones, los cuales pueden prevenirse mediante la aplicación estricta de los protocolos de seguridad industrial y salud en el trabajo. Todos estos riesgos se encuentran bajo seguimiento y control permanente por parte de la Interventoría, implementando las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar su impacto en la ejecución del contrato.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuación del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia, se ha realizado un estricto seguimiento al cumplimiento del componente ambiental y social establecido en el contrato. El contratista ha implementado medidas de manejo ambiental orientadas a la adecuada disposición y recolección de escombros, residuos comunes y materiales sobrantes, los cuales son acopiados en zonas definidas y posteriormente trasladados a sitios autorizados por la autoridad ambiental local. Se observa cumplimiento de las prácticas de control de polvo, ruido y emisiones, garantizando así el mínimo impacto sobre el entorno laboral y la comunidad vecina. Igualmente, se verifica el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal de obra, así como el mantenimiento del orden y la limpieza en las áreas intervenidas. Desde el componente social, no se han reportado quejas o afectaciones por parte de los funcionarios judiciales o de la comunidad colindante, evidenciándose una comunicación respetuosa y una correcta convivencia durante la ejecución de los trabajos. La interventoría ha continuado con el monitoreo de las actividades para asegurar que las condiciones ambientales y sociales se mantengan dentro de los parámetros exigidos, contribuyendo al desarrollo sostenible y responsable del proyecto.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Durante el periodo evaluado, la interventoría ha identificado la necesidad de fortalecer ciertos aspectos relacionados con el control de calidad de los procesos constructivos y los entregables del contrato. En ese sentido, se recomendó al contratista mantener una supervisión más rigurosa en la aplicación de los acabados, especialmente en las actividades de pañetes impermeabilizados y estucos, con el fin de garantizar la uniformidad y adherencia de los materiales conforme a las especificaciones técnicas. Se implementaron acciones preventivas orientadas a verificar la correcta dosificación de los morteros, el almacenamiento adecuado de los insumos y la protección de las áreas recién intervenidas para evitar deterioros prematuros. Así mismo, se efectuaron controles correctivos relacionados con el orden en el acopio de materiales y la limpieza del frente de trabajo, buscando optimizar el flujo de actividades y la seguridad en la obra.

De igual manera, la interventoría solicitó la entrega oportuna de registros fotográficos y fichas técnicas de los materiales empleados, como parte del aseguramiento de la calidad y la trazabilidad del proyecto. Estas medidas han permitido mantener un nivel adecuado de cumplimiento en los estándares exigidos y garantizar que los productos y entregables del contrato se desarrollen con calidad, seguridad y conformidad técnica.

9. OBSERVACIONES

Durante el desarrollo del periodo evaluado, la interventoría ha evidenciado un avance físico y financiero acorde con la programación establecida, destacándose la adecuada disposición del contratista para atender las recomendaciones y observaciones técnicas emitidas. No obstante, se registraron leves retrasos en la entrega de algunos materiales debido a las condiciones de transporte y cierres viales entre los departamentos del Huila y Caquetá, situación que fue oportunamente informada y gestionada para evitar afectaciones mayores en el cronograma de ejecución.

El personal en obra ha mostrado cumplimiento en las normas de seguridad industrial y en el manejo ambiental, manteniendo orden y limpieza en las zonas intervenidas.

Se resalta la buena comunicación y coordinación entre el contratista, la interventoría y la supervisión, lo que ha favorecido el avance continuo y controlado de las actividades.

La interventoría continuará realizando el seguimiento permanente a la calidad de los trabajos ejecutados, al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la correcta aplicación de las medidas técnicas, ambientales y de seguridad establecidas, garantizando así la correcta ejecución del contrato.

Anexo estado de Ejecución del proyecto
















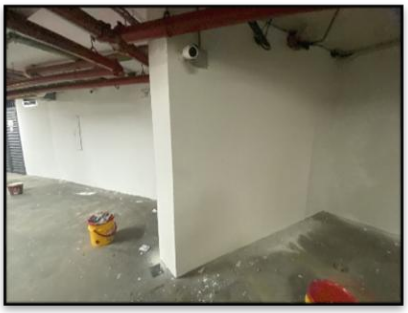












CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-64	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021










CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-64	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021











CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-64	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021

































Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los 22, del mes de octubre de 2025

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
Representante Legal
CONSORCIO INTERFLORENCIA
Interventoría

Bernardo Mendez Cuervo
Supervisor Contrato 036 de 2025
Vo.

ACTA PARCIAL No. 1 DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERFLORENCIA
(Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, y Ambiental)
NIT: 901979104-8

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	10	2025								
2. ACTA No.	1			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		PARCIAL DE INTERVENTORIA	X	MODIFICACIONES			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO DE	036 DE 2025			7. FECHA CONTRATO:	9	9	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 123.508.633,05
9. FECHA ACTA INICIO:	17	9	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2025			11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 Meses
12. PRORROGAS:				13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA "GERARDO CORTES CASTAÑEDA" DE LA CIUDAD DE FLORENCIA – CAQUETÁ".										
16. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERFLORENCIA RL. ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA										
27. SUPERVISOR:	BERNARDO MENDEZ CUERVO										

B. DATOS ESPECÍFICOS

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		31. EJECUCIÓN			
			PRESENTE ACTA PARCIAL 01		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN	VALOR
1	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA "GERARDO CORTES CASTAÑEDA" DE LA CIUDAD DE FLORENCIA – CAQUETÁ".	$ 103.788.767,27	24,98%	$ 25.926.434,06	**24,98%**	**$ 25.926.434,06**
IVA DEL 19%		$ 19.719.865,78		$ 4.926.022,47		**$ 4.926.022,47**
TOTAL		$ 123.508.633,05		$ 30.852.456,53		**$ 30.852.456,53**

C. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva, a los 22 días del mes de octubre del año 2025.

Nombre: **ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA**
INTERVENTOR

Nombre: **BERNARDO MENDEZ CUERVO**
SUPERVISOR

DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA

CERTIFICA QUE:

A través de la presente yo DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL identificada con la cédula de ciudadanía número 1.081.516.817 de Tarqui, TP 248.902-T en calidad de CONTADORA PUBLICA de la empresa **CONSORCIO INTERFLORENCIA** identificado con NIT **901.979.104-8** se encuentra a paz y salvo por concepto del pago los aportes en seguridad social en cumplimiento del Artículo 50 de la ley 789 de 2.002, por lo tanto declaro bajo la gravedad de juramento que se ha cumplido de manera oportuna e ininterrumpida con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales: al igual que con los aportes parafiscales correspondientes según lo dispuesto en: “Artículo 25 y 31 Ley 1607 y el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al Estatuto Tributario, esto desde su acta de inicio hasta la fecha.

La presente certificación se expide en Neiva, a los (23) diez días del mes de octubre de 2025, con destino a las partes interesadas.



Dolly Jimena Cerquera
CC 1.081.516.817
TP 248.902-T
Contadora Publica

Neiva-Huila
Asesoriasdj22@gmail.com
3195755861

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D0FBA3A504EF64

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081516817 de TARQUI (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 248902-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO





DESTINO: CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO INTERFLORENCIA NIT 901.979.104
CERTIFICADO 20251023-001





Neiva-Huila
Asesoriasdj22@gmail.com
3195755861

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12123891
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM PARRA OLAYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 NO. 1I-32	TELÉFONO:	8723301
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4622661698**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			393795

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.600	$ 0	$ 409.600
SUBTOTALES:										**$ 409.600**	**$ 0**	**$ 409.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:													**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 178.200	$ 178.200	$ 0	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:									**$ 178.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 12123891	PARRA OLAYA WILLIAM	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.560.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.560.000	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 409.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.560.000	5202901	$ 178.200	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 907.800

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75086879		ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 54 No 2C-16.SEGUNDO PISO	POPAYAN-CAUCA	3148630113	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1869467557	9492656846	I	2025/10/20	2025/10/22	NEQUI	2	$534,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	75086879	ZEMANATE ENIER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$200	$0	$99,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$100	$0	$28,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$28,500	$100	$0	$28,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				1	$533,400	$900	$0	$534,300

2025/10/21 07:31 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075322351
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ANGEL HURTATIS JOVEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CLL 18 A 40-44	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4621129461**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993985932

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1075322351	HURTATIS JOVEN LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	107532235	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52425347
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELICA MARIA RIVAS TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 8C # 38-48	TELÉFONO:	8773820
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4627213308**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994416754	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52425347	RIVAS TORRES ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	52425347	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52425347
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELICA MARIA RIVAS TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 8C # 38-48	TELÉFONO:	8773820
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4627155571**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994416749

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 227.800	$ 1.900	$ 229.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.900**	**$ 229.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 178.000	$ 1.500	$ 0	$ 179.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 179.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 800	$ 0	$ 99.900
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 99.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52425347	RIVAS TORRES ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO		30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	52425347	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 509.100

Planilla Pagada
