CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 416 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No.4

MENSUAL [X] FINAL [ ]

Objeto Contrato:

CONTRATO DE INTERVENTORIA CIHCM416-2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN (1) CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: COLOMBIA.

DEPARTAMENTO: HUILA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 416 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	YOVANY PEÑA FIERRO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CIHCM416 DE 2023		
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMI. TRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN (1) CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	**PERIODO DEL INFORME**	Entre el 23 de noviembre de 2023 al 27 de noviembre de 2024.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.	**NIT:**	891.101.100-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JAVIER BARRERO MOSSOS	**C.C:**	7.685.694
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	**09 DE NOVIEMBRE DE 2023**		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	**21 DE NOVIEMBRE DE 2023**		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
OTROSI No. 1 31/05/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL		
OTRO SI No. 2 06/11/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES		
VALOR INICIAL:	**$124.462.130,00**		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$10.647.996,72		
VALOR TOTAL:	**$135.110.126,72**		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH423 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA PABLO SEXTO	NIT:	901.770.588-1
REPRESENTANTE LEGAL:	YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ	C.C:	1.118.561.079
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	14/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	28/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) Meses previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización del contrato		

OTRO SI No. 1 31/05/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTRO SI No. 2 06/11/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 473.402.864,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL: OTRO SI No. 2 06/11/2024	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 37.916.539,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($511.319.403.00)

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la institución educativa Paulo VI sede I en la zona urbana del municipio de Colombia, del Departamento del Huila. El municipio está ubicado en las coordenadas 3°22'30"N 74°48'07"O en el norte del Departamento, Se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental, bañado por las aguas del río Cabrera. Es uno de los más extensos, montañosos y uno de los menos densos del territorio huilense, tiene una extensión territorial de 1.698 km², que corresponde al 8.5% del área total del departamento del Huila, está ubicado a una altitud de 850 metros sobre nivel del mar, con una temperatura aproximadamente de 24 °C. Cuenta con una población de 12.778 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019

El sitio donde se desarrollará el proyecto está localizado en la institución Educativa Paulo VI, sede I, en el municipio de Colombia Huila.

A continuación, se presenta de manera gráfica la ubicación del área de estudio.



Localización del municipio de Colombia en Colombia.
Ilustración 1



Localización de Colombia en el Departamento del Huila.
Ilustración 2

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_(Huila)



Localización Especifica I E. Paulo Sexto Sede I; Fuente: Satélites Pro
Ilustración 3



Localización perímetro Urbano Municipio de Colombia Huila.
Ilustración 4
Fuente: Google Earth

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construcción a una cubierta autoportante, este sistema de cubierta no requiere estructura metálica de soporte, logrando eliminar la implementación de perfiles metálicos usualmente utilizados para otro tipo de cubiertas
Se proyecta la construcción de la cubierta mediante sistema aporticado, el cual es un sistema de construcción sólido y durable, cuyos elementos estructurales consisten en vigas y columnas conectadas a través de nudos, formando pórticos resistentes en las dos direcciones: verticales (columnas), y horizontales (vigas), la estructura está compuesta por un mejoramiento del terreno en concreto

ciclópeo en el área de la cimentación, zapatas aisladas, vigas de amarre para cimentación, columnas en concreto, vigas aereas y viga canal.

Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA NSR-10. La cubierta será en teja auto portante metálica cal. 22, con todos sus componentes. Además, el proyecto contará con iluminación mediante la instalación de 10 reflectores cumpliendo la normativa, también tendrá 8 bajantes de aguas lluvias que garantizaran la correcta evacuación del agua en época de invierno, además se contempla la construcción de cunetas en concreto, la instalación de 2 canchas multifuncionales y la demarcación de la cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. Logrando el normal funcionamiento del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva del plantel educativo Paulo VI sede I, en el municipio de Colombia del Departamento del Huila

Las actividades para ejecutar
son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO
- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

De acuerdo con el seguimiento de obra esta interventoría relaciona las actividades ejecutadas en la: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Ítem 1.07 Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente: Se ejecuta actividad de relleno en recebo seleccionado, se procede a cargar el material de relleno en volqueta sencilla y se inicia actividad en áreas de cimentación y sobre excavación del eje A, se compacta el material mecánicamente

ESTRUCTURA EN CONCRETO

- Ítem 3.01 Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI: Se realiza la fundición de 5 columnas en concreto de 3000 psi en el eje A.

- Ítem 3.03 Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización: Se realiza función monolítica de cada viga canal en el eje A y B, garantizando correcto vibrado del concreto de 3000 psi, se ejecuta actividad según diseño estructural del proyecto.

- Ítem 3.04 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal: Se realiza amarre de acero de refuerzo según despiece de acero en el plano estructural, se realiza figuración de estribos de viga canal en el sitio de la obra, debido a la complejidad de la figura, garantizando la dimensión y el diámetro del acero propuesto en el diseño

- Ítem 3.05 Suministro e instalación de manto zetal viga canal. Como primera medida se realiza instalación de capa preliminar de impermeabilizante paraguas en la sección de la viga canal del eje A y eje B, posteriormente se instala manto en área interna y finalmente se realiza instalación de tres capas de impermeabilizante paraguas sobre el manto, garantizando una correcta impermeabilización.

CUBIERTA

- Ítem 4.01 Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz: Se instala cubierta autoportante en lámina acesco de acuerdo a los planos de referencia. La cantidad contratada en las condiciones iniciales contractuales se mantiene.

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

- Ítem 5.01 Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto: se realiza actividad de demarcación de cancha con pintura trafico pesado, se definen las tres actividades básicas (microfutbol, voleibol y baloncesto)
- Ítem 5.02 Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura: esta actividad se anula debido a error en la descripción y el cálculo del ítem contractual.
- Ítem 5.03 Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm: se realiza fundición de placas, se hace restitución de placa demolida para la cimentación de la estructura de la cubierta, se vierte concreto de 3000 psi
- Ítem 5.04 Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño: Se realiza fundición de cuneta en concreto de 3000 psi reforzada con malla electrosoldada, se construye pestaña para instalación de rejillas en concreto, se funde cuneta en el eje A y B según diseño.
- Ítem 5.05 INP Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 para futbol de salón y baloncesto, con tablero en acrílico de 1,8mx1,05m x10mm. Incluye: Aro, malla, demarcado, logos administración, anticorrosivo y pintura: Se realiza suministro e instalación de 2 unidades de cancha multifuncional, según diseño, se ancla cancha a placa de concreto, se instala aro, malla, tablero en acrílico, se pinta estructura de cancha con anticorrosivo y esmalte gris, se instalan mallas.
- Ítem 5.06 INP Rejillas prefabricadas para cunetas: se realiza instalación de rejillas prefabricadas en concreto según diseño, sobre cunetas laterales de cubierta, se sitúan bajantes en tubería de 4" para recolección de aguas lluvias.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- Ítem 6.01 Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias: Se realiza instalación de bajantes en tubería de PVC Sanitaria de 4", se garantiza adecuada instalación del encole del agua lluvia en la viga canal y el descole del agua lluvia en las cunetas, se instala 4 bajantes en el eje A y 4 bajantes en el eje B, según diseño hidrosanitario del proyecto.

- Ítem 6.02 Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües: Se realiza instalación de tubería PVC Sanitaria de 6" garantizando la correcta evacuación de aguas lluvias hacia los sumideros transversales propuestos en el diseño hidrosanitario.

- Ítem 6.03 Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño: Se realiza fundición de cajas de inspección en concreto de 2500 psi en el eje A y en el eje B, se realiza cañuela garantizando adecuada evacuación de aguas lluvias.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Ítem 7.01 Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor: Se construyen tres cajas de inspección según especificaciones técnicas, se realiza ubicación según diseño eléctrico del proyecto.

- Ítem 7.02 Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. Se realiza excavación para instalación de tubería conduit tipo pesado para canalización de red de baja tensión, según diseño eléctrico

- Ítem 7.03 Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts: Se ejecuta actividad de canalización en ductos conduit pvc yipo pesado, posteriormente se tapa brecha y se compacta el terreno.

- Ítem 7.04 Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2": se realiza transición de red eléctrica aérea a subterránea en poste instalado.
-
- Ítem 7.05 Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste: Se anula ítem debido a la no inclusión del medidor eléctrico.
-
- Ítem 7.06 Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna: Se realiza instalación de caja de distribución en columna de concreto, se instalan circuitos según diseño eléctrico.
-
- Ítem 7.07 Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. Se instala brazo galvanizado según diseño con acabado en pintura poliester, se realiza instalación de base en brazo para anclar el reflector.

- Ítem 7.08 Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. Se ejecuta actividad de instalación de cableado en tubería galvanizada para montaje de reflectores, según diseño eléctrico del proyecto

- Ítem 7.09 Suministro e instalación de reflector led de 150 w. Se procede con instalación de 10 reflectores led sylflood de 150W marca sylvania, según descripción de APU.

- Ítem 7.10 Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. Se realiza instalación de tomacorriente doble a 120v en columna según diseño.
- Ítem 7.11 Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. Se realiza instalación de un tomacorriente doble a 240v y un tomacorriente doble a 120v en columna según diseño.
- Ítem 7.12 Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado. Se procede con excavación y posterior hincada y plomada de poste de concreto de 8m x 510kg, se ubica poste según

diseño eléctrico.

- Ítem 7.13 Vestida de red de acometida en cable con neutro concéntrico 2*8+8. Se realiza vestida de la red de acometida en cable concéntrico 2x8+8, desde poste existente hasta poste instalado, según diseño eléctrico.

- Ítem 7.14 INP Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste (incluye medidor): Se ejecuta actividad de instalación y cableado de medida directa en poste, se instala medidor bifásico electrónico.

NOTA: Las medidas, cuantificación y cálculo de las cantidades de obra ejecutadas durante el período, se encuentran registradas en las Memorias de Cálculo, que hacen parte integral del presente informe.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	28/11/2023			18/02/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	30		
Reiniciación No. 1	31/05/2024		154	
Suspensión No. 2	23/07/2024	54		23/07/2023
Reiniciación No. 2	06/11/2024		105	
Terminación Contrato	06/12/2024	30		06/12/2024
TOTAL DIAS		**114**	**259**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Inicio		28/11/2023
Justificación de Suspensión No. 1	1	28/12/2023
Suspensión No. 1	1	28/12/2023
Justificación para el Reinicio No. 1	2	31/05/2024
Reinicio No. 1	1	31/05/2024
Justificación Suspensión No. 2	3	23/07/2024
Suspensión No. 2	2	23/07/2024

Justificación Reinicio No. 2	4	06/11/2024
Reinicio No. 2	2	06/11/2024
Acta de Modificación mayores y menores cantidades e ítems nuevos	1	06/11/2024
Otro si modificatorio No.2 mayores y menores cantidades y creación de ítems nuevos, Adición y prórroga	5	06/11/2024
Acta de Recibo parcial de obra No.1	1	27/11/2024
Acta de Terminación	1	06/12/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	• Verifica obligaciones contractuales del contratista de obra. • Se realiza otrosi No.2 donde se autoriza adicional en dinero y prorroga de un mes al contrato. • Se verifica el buen desarrollo y se cuantifica los ítem contractuales e ítem no previstos aprobados. - *ESTRUCTURAS EN CONCRETO* - Suministro e instalación de manto zetal viga canal: La cantidad ejecutada se mantiene con las mismas condiciones contractuales *ACABADOS – PLACAS EN CONCRETO* - Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto: La cantidad ejecutada aumenta respecto a las condiciones contractuales. - Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura: La cantidad ejecutada disminuye respecto a la cantidad contractual, teniendo en cuenta que el APU, incluye la instalación dos canchas. *INSTALACIONES ELÉCTRICAS* - Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. - Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. - Canalización en ductos Conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. - Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" - Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" - Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. - Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. - Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en

	conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. - Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. - Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. - Suministro e instalación de reflector led de 150 w - Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. - Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
b). **Actividades Administrativas.**	erventoría Sociedad Técnica Ltda. - Hace seguimiento cuantitativo y financiero de las mayores y menores cantidades e ítem no previstos; trabajos realizados con el seguimiento de esta interventoría. - Se revisa pagos de seguridad social del personal en obra; Y su buen manejo de la seguridad industrial para la conservación de la salud de sus trabajadores. Se revisa las pólizas actualizadas según otrosí No.2
c). **Actividades Operativas.**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** **ACTIVIDADES PRELIMINARES** - Ítem 1.07 Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente: Se ejecuta actividad de relleno en recebo seleccionado, se procede a cargar el material de relleno en volqueta sencilla y se inicia actividad en áreas de cimentación y sobre excavación del eje A, se compacta el material mecánicamente **ESTRUCTURA EN CONCRETO** - Ítem 3.01 Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI: Se realiza la fundición de 5 columnas en concreto de 3000 psi en el eje A. - Ítem 3.03 Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización: Se realiza función monolítica de cada viga canal en el eje A y B, garantizando correcto vibrado del concreto de 3000 psi, se ejecuta actividad según diseño estructural del proyecto. - Ítem 3.04 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal: Se realiza amarre de acero de refuerzo según despiece de acero en el plano estructural, se realiza figuración de estribos de viga canal en el sitio de la obra, debido a la complejidad de la figura, garantizando la dimensión y el diámetro del acero propuesto en el diseño - Ítem 3.05 Suministro e instalación de manto zetal viga canal. Como primera medida se realiza instalación de capa preliminar de impermeabilizante paraguas en la sección de la viga canal del eje A y eje B, posteriormente se instala manto en área interna y finalmente se realiza instalación de tres capas de impermeabilizante paraguas sobre el manto, garantizando una correcta impermeabilización.

CUBIERTA

- Ítem 4.01 Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz: Se instala cubierta autoportante en lámina acesco de acuerdo a los planos de referencia. La cantidad contratada en las condiciones iniciales contractuales se mantiene.

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

- Ítem 5.01 Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto: se realiza actividad de demarcación de cancha con pintura trafico pesado, se definen las tres actividades básicas (microfutbol, voleibol y baloncesto)
- Ítem 5.02 Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura: esta actividad se anula debido a error en la descripción y el cálculo del ítem contractual.
- Ítem 5.03 Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm: se realiza fundición de placas, se hace restitución de placa demolida para la cimentación de la estructura de la cubierta, se vierte concreto de 3000 psi
- Ítem 5.04 Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño: Se realiza fundición de cuneta en concreto de 3000 psi reforzada con malla electrosoldada, se construye pestaña para instalación de rejillas en concreto, se funde cuneta en el eje A y B según diseño.
- Ítem 5.05 INP Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 para futbol de salón y baloncesto, con tablero en acrílico de 1,8mx1,05m x10mm. Incluye: Aro, malla, demarcado, logos administración, anticorrosivo y pintura: Se realiza suministro e instalación de 2 unidades de cancha multifuncional, según diseño, se ancla cancha a placa de concreto, se instala aro, malla, tablero en acrílico, se pinta estructura de cancha con anticorrosivo y esmalte gris, se instalan mallas.
- Ítem 5.06 INP Rejillas prefabricadas para cunetas: se realiza instalación de rejillas prefabricadas en concreto según diseño, sobre cunetas laterales de cubierta, se sitúan bajantes en tubería de 4" para recolección de aguas lluvias.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- Ítem 6.01 Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias: Se realiza instalación de bajantes en tubería de PVC Sanitaria de 4", se garantiza adecuada instalación del encole del agua lluvia en la viga canal y el descole del agua lluvia en las cunetas, se instala 4 bajantes en el eje A y 4 bajantes en el eje B, según diseño hidrosanitario del proyecto.

- Ítem 6.02 Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües: Se realiza instalación de tubería PVC Sanitaria de 6" garantizando la correcta evacuación de aguas lluvias hacia los sumideros transversales propuestos en el

diseño hidrosanitario.

- Ítem 6.03 Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño: Se realiza fundición de cajas de inspección en concreto de 2500 psi en el eje A y en el eje B, se realiza cañuela garantizando adecuada evacuación de aguas lluvias.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Ítem 7.01 Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor: Se construyen tres cajas de inspección según especificaciones técnicas, se realiza ubicación según diseño eléctrico del proyecto.

- Ítem 7.02 Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. Se realiza excavación para instalación de tubería conduit tipo pesado para canalización de red de baja tensión, según diseño eléctrico

- Ítem 7.03 Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts: Se ejecuta actividad de canalización en ductos conduit pvc yipo pesado, posteriormente se tapa brecha y se compacta el terreno.

- Ítem 7.04 Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2": se realiza transición de red eléctrica aérea a subterránea en poste instalado.
-
- Ítem 7.05 Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste: Se anula ítem debido a la no inclusión del medidor eléctrico.
-
- Ítem 7.06 Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna: Se realiza instalación de caja de distribución en columna de concreto, se instalan circuitos según diseño eléctrico.
-
- Ítem 7.07 Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. Se instala brazo galvanizado según diseño con acabado en pintura poliester, se realiza instalación de base en brazo para anclar el reflector.

- Ítem 7.08 Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. Se ejecuta actividad de instalación de cableado en tubería galvanizada para montaje de reflectores, según diseño eléctrico del proyecto


- Ítem 7.09 Suministro e instalación de reflector led de 150 w. Se procede con instalación de 10 reflectores led sylflood de 150W marca sylvania, según descripción de APU.

	- Ítem 7.10 Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. Se realiza instalación de tomacorriente doble a 120v en columna según diseño. - Ítem 7.11 Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. Se realiza instalación de un tomacorriente doble a 240v y un tomacorriente doble a 120v en columna según diseño. - Ítem 7.12 Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado. Se procede con excavación y posterior hincada y plomada de poste de concreto de 8m x 510kg, se ubica poste según diseño eléctrico. - Ítem 7.13 Vestida de red de acometida en cable con neutro concéntrico 2*8+8. Se realiza vestida de la red de acometida en cable concéntrico 2x8+8, desde poste existente hasta poste instalado, según diseño eléctrico. - Ítem 7.14 INP Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste (incluye medidor): Se ejecuta actividad de instalación y cableado de medida directa en poste, se instala medidor bifásico electrónico. **NOTA:** Las medidas, cuantificación y cálculo de las cantidades de obra ejecutadas durante el período, se encuentran registradas en las Memorias de Cálculo, que hacen parte integral del presente informe.
d). **Actividades Logísticos.**	- Se revisa que los trabajos sean realizados con todas las normas que exigen la seguridad y salud en el trabajo. - Se revisa y firma bitácora de obra - Se hizo medición de cantidades de los ítems realizados e ítem no previsto o ítem nuevos Se llevo a cabo acta de terminación de obra el 6 de diciembre del 2024.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	La interventoría sociedad técnica Ltda. Solicito Limpieza y recolección de escombros
f). **Actividades Financieras.**	Según otro si No. 2 se autoriza al contrato de obra y a la interventoría prorroga de un mes y un adicional al contrato de acuerdo al balance de obra de mayores y menores cantidades e item nuevos y no previstos.
g). **Actividades Jurídicos**	- otrosí No.2 Acta de terminación del contrato.

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO


DÍA	ESTADO DEL TIEMPO
06/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
07/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
08/11/2024	LLUVIOSO-FUERTE
09/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
10/11/2024	SECO
11/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
12/11/2024	SECO
13/11/2024	SECO
14/11/2024	SECO
15/11/2024	SECO
16/11/2024	SECO
17/11/2024	LLUVIOSO-FUERTE
18/11/2024	SECO
19/11/2024	SECO
20/11/2024	SECO
21/11/2024	SECO
22/11/2024	LLUVIOSO-FUERTE
23/11/2024	LLUVIOSO-FUERTE
24/11/2024	SECO
25/11/2024	SECO
26/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
27/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
28/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
29/11/2024	LLUVIOSO-MODERADO
30/11/2024	SECO
01/12/2024	SECO
02/12/2024	SECO
03/12/2024	LLUVIOSO-MODERADO
04/12/2024	LLUVIOSO-MODERADO
05/12/2024	SECO
06/12/2024	LLUVIOSO-MODERADO

Durante el período del 06 noviembre al 30 de noviembre de 2024, se presentan lluvias intermitentes que no generaron retrasos en las actividades programadas.

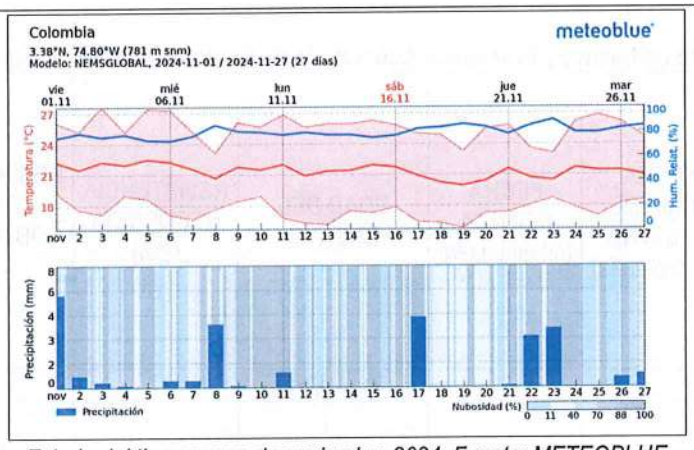

Estado del tiempo mes de noviembre 2024, Fuente: METEOBLUE
Ilustración 6

Durante el período del 01 diciembre al 06 de diciembre de 2024, se presentan lluvias intermitentes que no generaron retrasos en las actividades programadas.

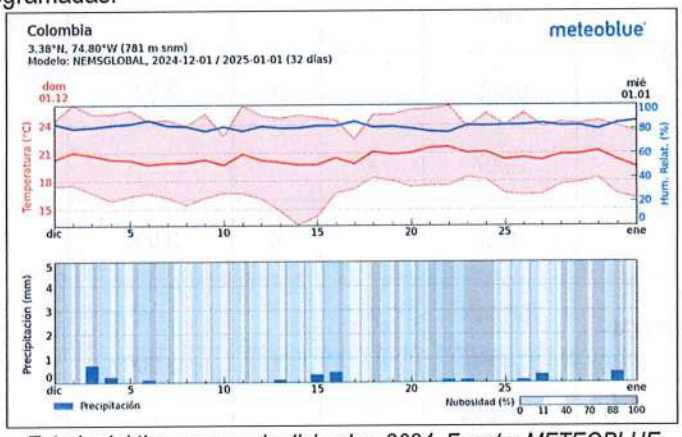

Estado del tiempo mes de diciembre 2024, Fuente: METEOBLUE
Ilustración 7

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	1:2.3
Diseños de mezcla para base.	*N. A*	N.A.
Compresión simple al concreto.	3.000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	*N.A.*	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO		RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA (PSI)	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	28			
ZAPATAS EJE B B1, B2, B3, B4, B5	05/07	12/07	X			2451	
		02/08		X	3.000	3320	CUMPLE
COLUMNAS EJE B B1, B2, B3, B4, B5	12/07/24	19/07	X			2158	
		09/08		X	3.000	3072	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE A	22/07/24	29/07	X			1960	
		19/08		X	3.000	3120	CUMPLE
VIGA AÉREA VIGA CANAL EJE B	09/11/24	16/11/24	X			1952	
		07/12/24		X	3.000	3150	CUMPLE
VIGA AÉREA VIGA CANAL EJE A	16/11/24	23/11/24	X			2001	
		14/12/24		X	3.000	3220	CUMPLE

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA (PSI)	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE B B1, B2, B3, B4, B5	05/07/24	12/07/24	X				2.446	
		19/07/24		X			2.894	
		02/08/24			X	3.000	3.314	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN	10/07/24	17/07/24	X				2.322	
		24/07/24		X			2.608	

EJE B		07/08/24			X	3.000	3.101	CUMPLE
COLUMNAS EJE B B1, B2, B3, B4, B5	12/07/24	19/07/24	X				2.147	
		26/07/24		X			2.526	
		09/08/24			X	3.000	3.057	CUMPLE
ZAPATAS EJE A A1, A2, A3, A4, A5	19/07/24	26/07/24	X				2.116	
		02/08/24		X			2.588	
		16/08/24			X	3.000	3.131	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE A	22/07/24	29/07/24	X				1.936	
		05/08/24		X			2.782	
		19/08/24			X	3.000	3.232	CUMPLE
VIGA AÉREA – VIGA CANAL EJE B	09/11/24	16/11/24	X				1.933	
		23/11/24		X			2.706	
		07/12/24			X	3.000	3.324	CUMPLE
COLUMNAS EJE A A1, A2, A3, A4, A5	12/11/24	19/11/24	X				2.061	
		26/11/24		X			2.749	
		10/12/24			X	3.000	3.282	CUMPLE
VIGA AÉREA - VIGA CANAL EJE A	16/11/24	23/11/24	X				1.981	
		30/11/24		X			2.788	
		14/12/24			X	3.000	3.235	CUMPLE

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor	Amortización	Valor pagado
Valor contrato	02/10/2024	$ 473.402.864,00		
Valor Adicional – Otro sí No. 2	06/11/2024	$ 37.916.539,00		
Valor Anticipo (25%)	14/06/2024			$ 118.350.716,00
Acta Parcial No. 1	27/11/2024	$ 441.199.892,00	$ 110.299.973,00	$ 330.899.919,00
Acta Final de Obra	21/01/2025	$ 70.119.511,00	$ 8.050.743,00	$ 62.068.768,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 473.402.864,00	$ 37.916.539,00	$ 511.319.403,00	$ 511.319.403,00	$0.00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

05/12/2023	Obra - Contratista, supervisión e Interventoría	Se revisaron las observaciones a los hallazgos: - Despiece del acero en la viga de cimentación y aceros en general - Tala de árbol para realizar el proceso constructivo de la zapata 2, - Entibados para la profundidad de excavación de 3,00m. - Mayores excavaciones Canales laterales con tapa
21/12/2023	Oficinas de SOTA LTDA. - Contratista, supervisión e Interventoría	Comité con la supervisión del contrato entidad contratante Inderhuila, La interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda. y el Contratista Unión Temporal Pablo Sexto Una vez expuestas todas las observaciones encontradas a raíz de la revisión de planos y en sitio de la obra, y evidenciándose la necesidad de realizar un balance de obra y revisión y cambios del diseño estructural ; así como la creación de ítems no previstos, el contratista de obra e interventoría solicitan suspensión ya que dicho proceso impacta directamente el avance operativo y la estimación preciso de recursos y gestión eficiente del tiempo.
03/06/2024	Obra - Contratista, supervisión e Interventoría	Se realizo comité de obra en la institución educativa Paulo Sexto Sede I, en compañía de la supervisión, interventoría y el contratista de obra; se realiza mediciones en terreno y se contrastan los planos modificados por la entidad con las cantidades de obra a ejecutar, adicionalmente se verifica que ya se efectuó la tala del árbol ubicado en la zapata 2 del eje B en el área de las graderías, Se hace la aclaración de posibles modificaciones al balance presentado el 21 de mayo de 2024, se está a la espera de comité extraordinario entre la supervisión, la interventoría y el contratista de obra, junto al quipo formulador de los diseños de la entidad, para revisión general del balance presentado y las nuevas observaciones en campo.
25/06/2024	Obra - Contratista e Interventoría	Se desarrolla comité con la interventoría, 2 docentes de la institución y el contratista de obra, la comunidad educativa expresa su preocupación por la poda de árboles, el retiro de materas y la demolición de las graderías en la zona de influencia del proyecto, solicitan desplazar la cubierta hacia un costado con el fin de generar la menor afectación posible a las materas y evitar la poda de los árboles, solicitan no iniciar obra hasta tanto se superen los inconvenientes.
02/07/2024	INDERHUILA - Contratista, supervisión e Interventoría	Comité técnico en las instalaciones del Inderhuila entre Contratista, Interventoría y la entidad contratante Inderhuila, representado por la Supervisión, ingeniera Karoll Lisseth Buitrago y el apoyo a la supervisión del contrato el Arq., Yovanny peña fierro donde se le presenta a los supervisores del contrato las actividades del contrato e ítem no previstos que no estaban contemplados en el contrato, pero que son relevantes para el desarrollo del mismo; Como son la gradería en concreto que está en el eje A, sobre excavación en el eje A ítem que elevan las cantidades contractuales del proyecto. teniendo en cuenta que es una actividad necesaria e indispensable para el desarrollo y continuidad de la obra, aclarando que la interventoría realizará el seguimiento cuantitativo de las cantidades ejecutadas en obra, con el compromiso de realizar el respectivo balance de obra a través del Acta de Mayores y menores cantidades y creación de ítem no previsto, en el que el

		contratista presentará el respectivo APU, para el correspondiente aval de la interventoría y revisión y aprobación de la entidad contratante.
22/07/2024	INDERHUILA - Contratista, supervisión e Interventoría	Se realizo comité de obra con la supervisión, la interventoría y el contratista de obra, se decide hacer suspensión No. 2 al contrato de obra, para revisión y aprobación del balance No. 1, con el fin de garantizar el objeto contractual.
13/11/2024	OBRA - Contratista, supervisión e Interventoría	Revisión de avance general de la obra, se verifica ejecución de las actividades presupuestadas, evidenciando el buen desarrollo de la obra frente al cronograma de actividades y flujo de inversión

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.0))	07/11/2023	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.0))	07/11/2023	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.1))	10/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.1))	10/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.2))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.2))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.3))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.3))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.4))	24/06/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.4))	24/06/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.7))	26/11/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.7))	26/11/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL

Copias de Bitácora de Obra (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	27/11/2024 05/12/2024	S. N	Digital - SECOP II
Informe SST (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	04/07/2024 02/08/2024 27/11/2024 05/12/2024	S.N.	Físico
Actas de socialización e inicio de obra	30/11/2023	S.N.	Físico
Actas de conformación de veeduría ciudadana	30/11/2023	S.N.	Físico
Actas de comités (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	05/12/2023 21/12/2023 03/07/2024 25/06/2024 02/07/2024 22/07/2024 13/11/2024 05/12/2024	S.N.	Físico
Registros de ensayos de laboratorio (periodo del (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	2611/2024 05/12/2024	S.N.	Físico
Registros de certificados de calidad (periodo del (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	27/11/2024 05/12/2024	S.N.	Físico
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	30/11/2023 28/12/2023 30/06/2024 23/07/2024 05/12/2024	S.N.	Físico
Correspondencia (periodo del (23/112023) al (05/12/2024))	27/11/2024 05/12/2024	S.N.	Físico
Registro fotográfico de valla	04/12/2023	N. A	Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
JAIRO ISAAC GAMEZ BARREROS	12102729	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO

JAVIER BARREROS MOSSOS	7.685.694	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	EGR 2024000608	14 de junio de 2024
Acta Parcial No. 1	EGR 2024001678	20 de diciembre de 2024

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
JAIRO ISAAC GAMEZ BARREROS	$ 352.000	$ 88.000	$ 11.500	$ 88.000	$	28404527	12/12/2023
	$ 352.000	$ 88.000	$ 11.500	$ 88.000	$	28818588	19/01/2024
	$ 448.000	$ 112.000	$ 194.900	$ 112.000	$	30559926	31/07/2024
	$ 448.000	$ 112.000	$ 194.900	$ 112.000	$	30628823	13/08/2024
	$ 448.000	$ 112.000	$ 194.900	$ 112.000	$	**31405990**	**08/11/2024**
	$80.000	$ 320.000	$10.500	$80.000	$	**32216129**	**13/01/2025**
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARREROS MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28404079	12/12/2023
	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28766644	19/01/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30128247	31/07/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30559993	31/07/2024
	$ 1.920.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$	**31413023**	**05/11/2024**
	$ 2.352.000	$ 1.837.500	$ 1.023.200	$ 588.000	$	32195097	25/01/2025
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28404079	12/12/2023
	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28766644	19/01/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30128247	31/07/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30559993	31/07/2024
	$ 1.920.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$	**31413023**	**05/11/2024**
	$ 2.352.000	$ 1.837.500	$ 1.023.200	$ 588.000	$	32195097	25/01/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-	0	07/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024

	101051737			Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	02/02/2024	02/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	0	07/11/2023		02/11/2023	02/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101051737	1	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	02/02/2024	02/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	1	01/01/2024		02/11/2023	02/02/2024
Póliza actualizada						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101051737	2	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	21/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/11/2023	21/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	21/02/2024	21/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	2	01/01/2024		2111/2023	21/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101051737	3	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	21/11/2023	21/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/11/2023	21/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	21/02/2024	21/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA		VIGENCIA	

			DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	3	01/01/2024	21/11/2023	21/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101051737	4	24/06/2024	Cumplimiento del contrato	21/11/2023	23/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/11/2023	26/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	21/02/2024	21/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	4	24/06/2024	21/11/2023	25/07/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101051737	7	26/11/2024	Cumplimiento del contrato	21/11/2023	09/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/11/2023	10/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	21/02/2024	21/02/2029


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	7	26/11/2024	21/11/2023	09/12//2024

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	19. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES PRELIMINARES


Ítem 1.01 Localización y replanteo

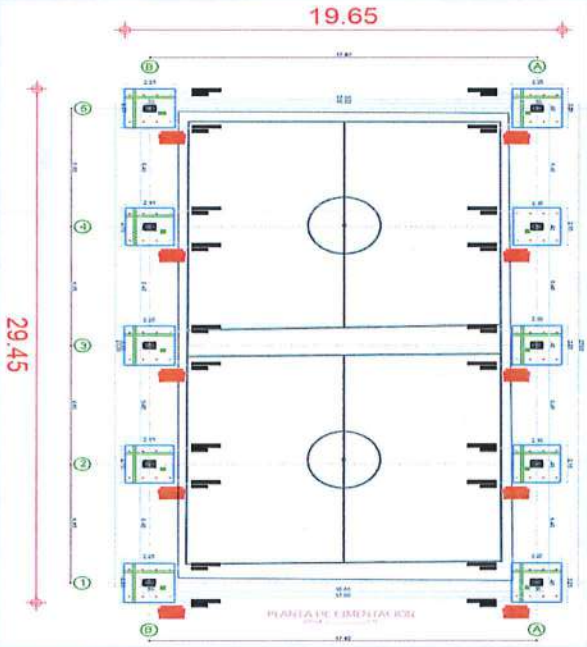






Ítem 1.02 Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante

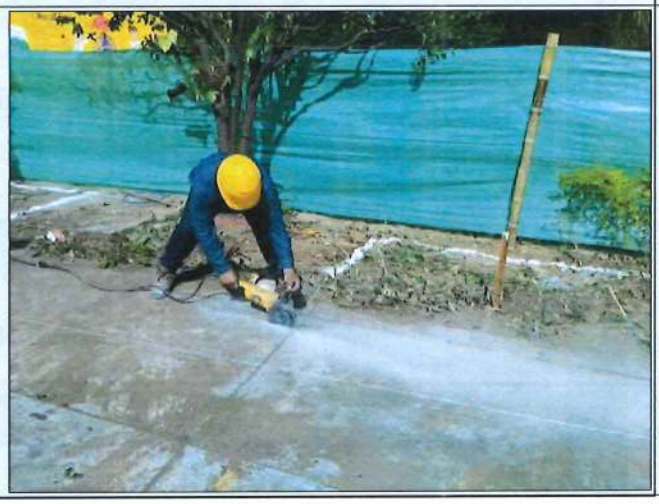


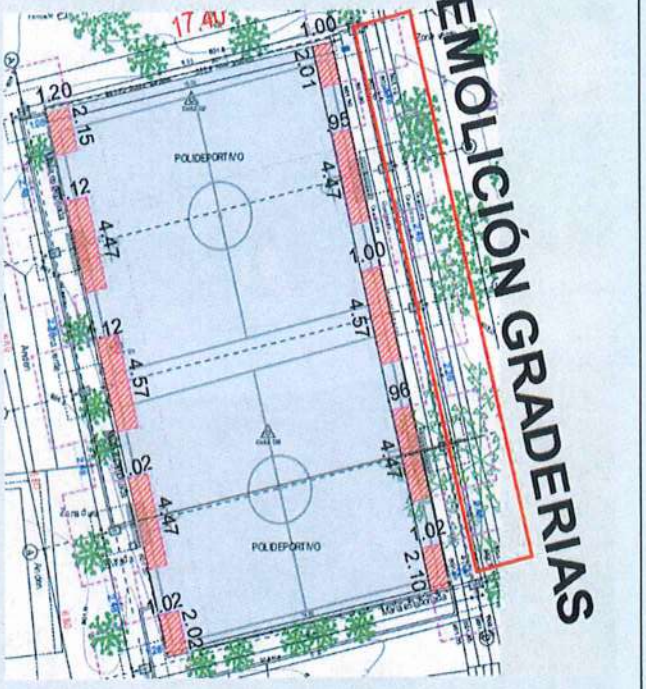





Item 1.03 Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante

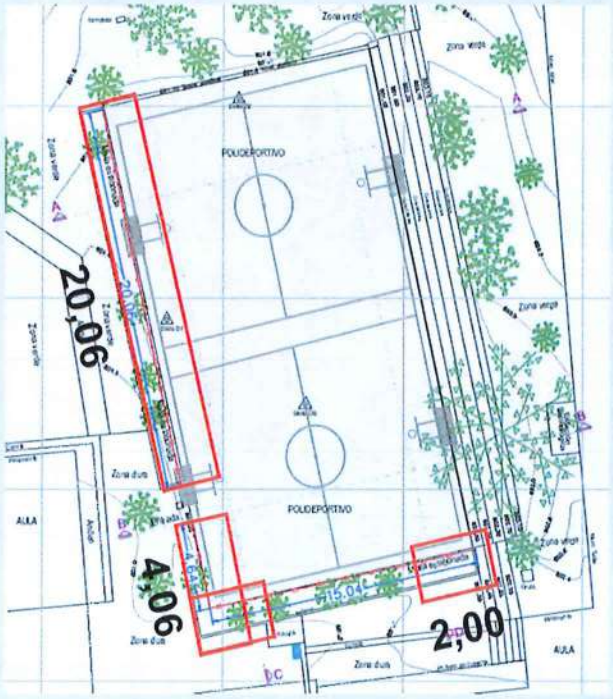

POLIDEPORTIVO
20,06
4,06
2,00
AULA







Item 1.04 Demolición muro en ladrillo tolete tipo tizón e= 0,25 mts. Incluye retiro del material sobrante

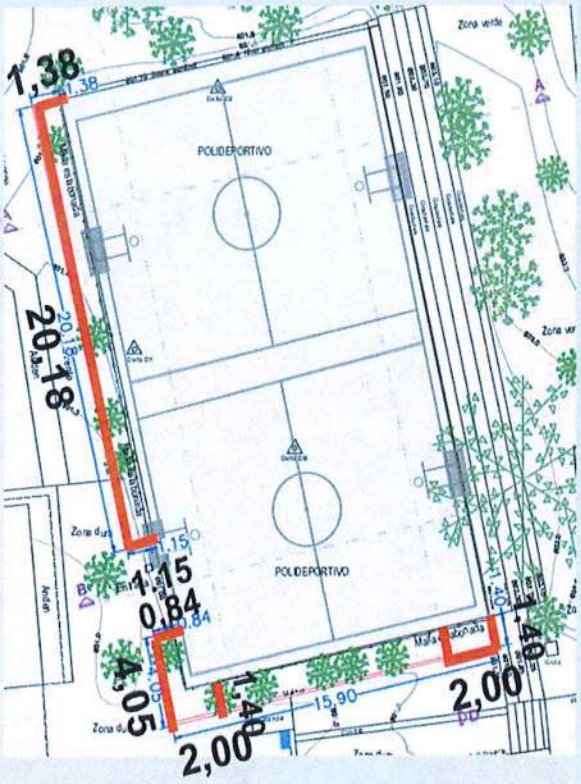








Ítem 1.05 Desmonte marcos canchas existentes

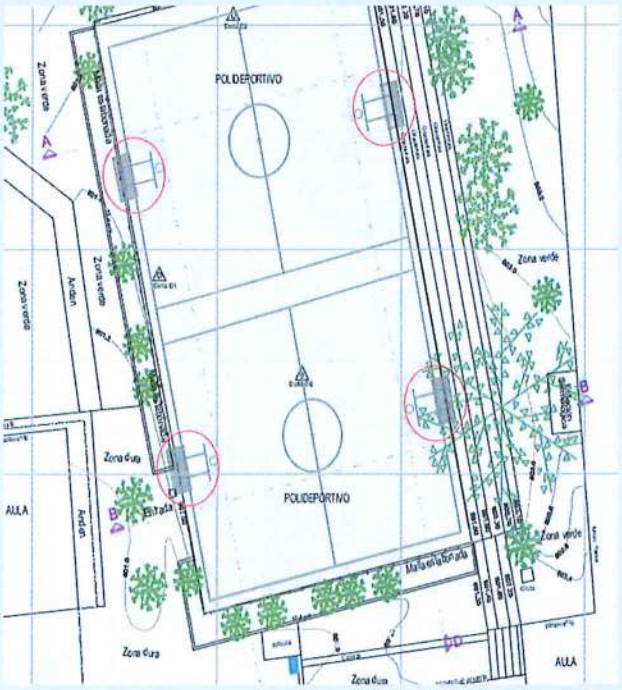










Ítem 1.06 Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada

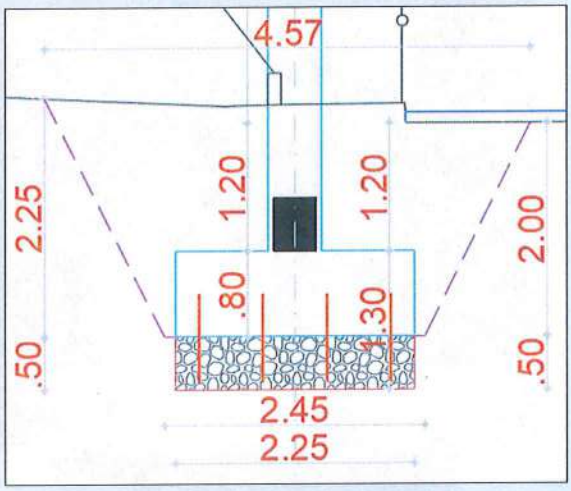


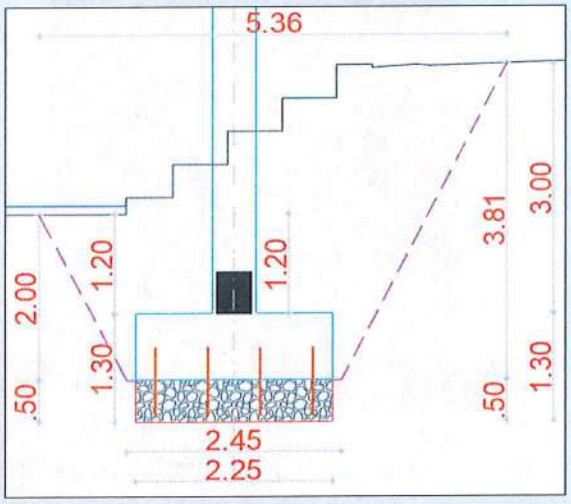

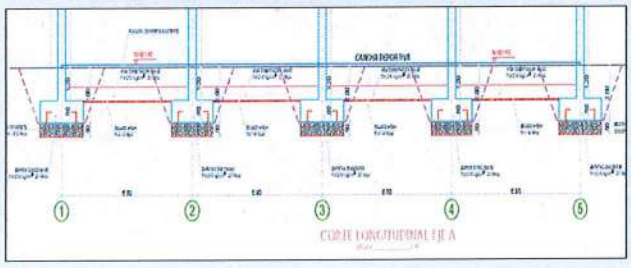







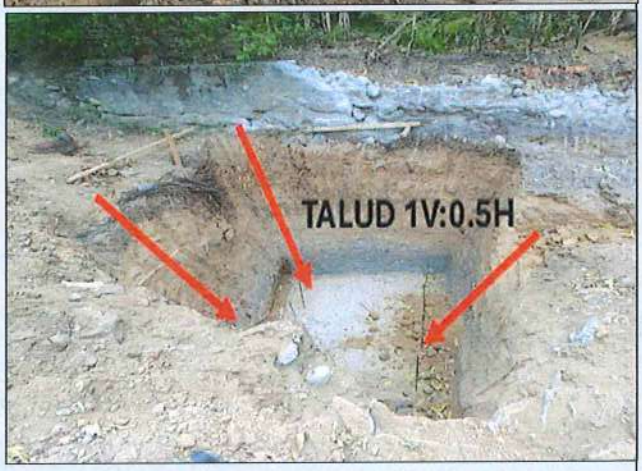


Ítem 1.07 Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente:

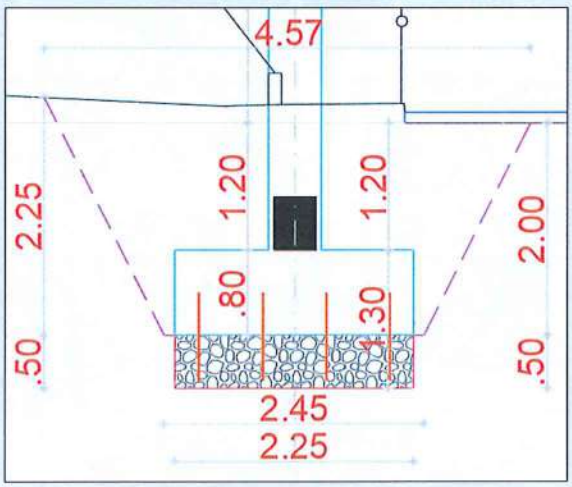



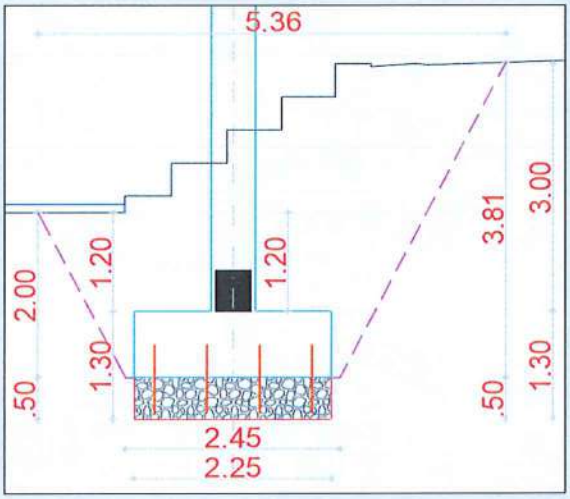








CIMENTACIÓN

Ítem 2.01 Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts


VIGA CIMENTACION .40x.50
f'c=210 kg/cm2 21 Mpa
1.20
2.00
.80
.50
4.60
SOLADO e=5cm
f'c= 14 Mpa

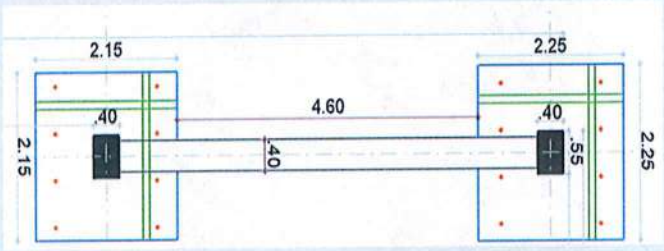

2.15
2.25
4.60
.40
.40
.40
.55
2.15
2.25







Ítem 2.02 Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga

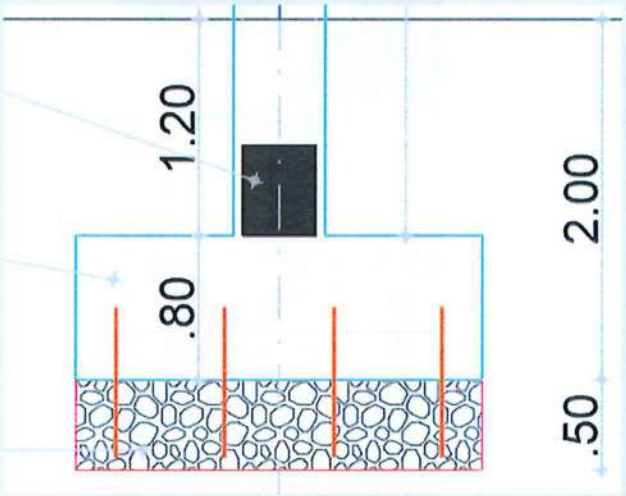








Ítem 2.03 Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño

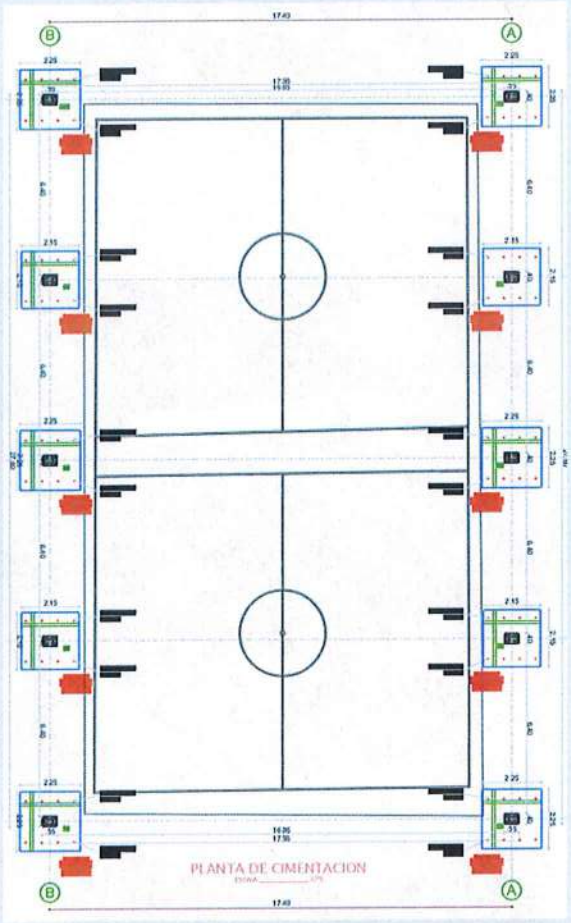









Ítem 2.04 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas

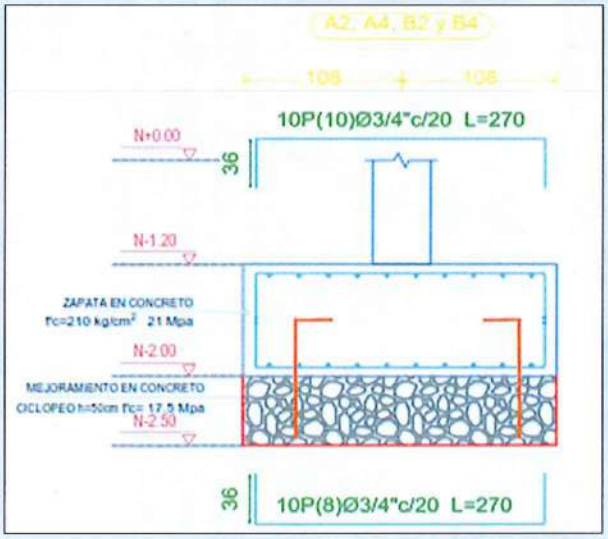

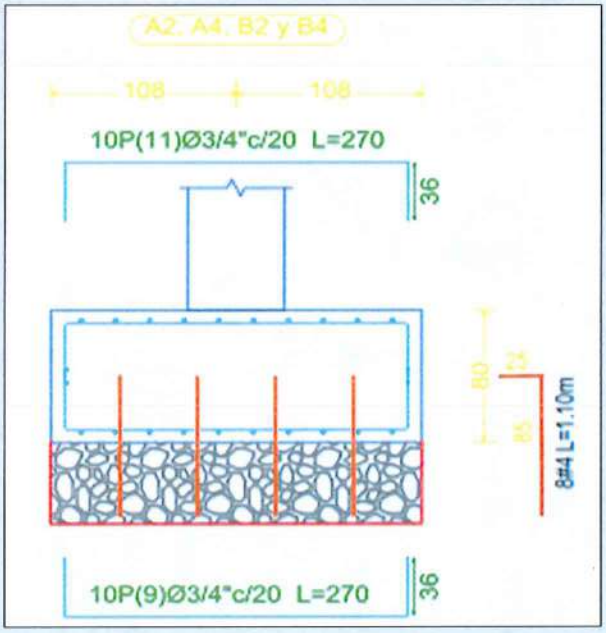










Ítem 2.05 Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño

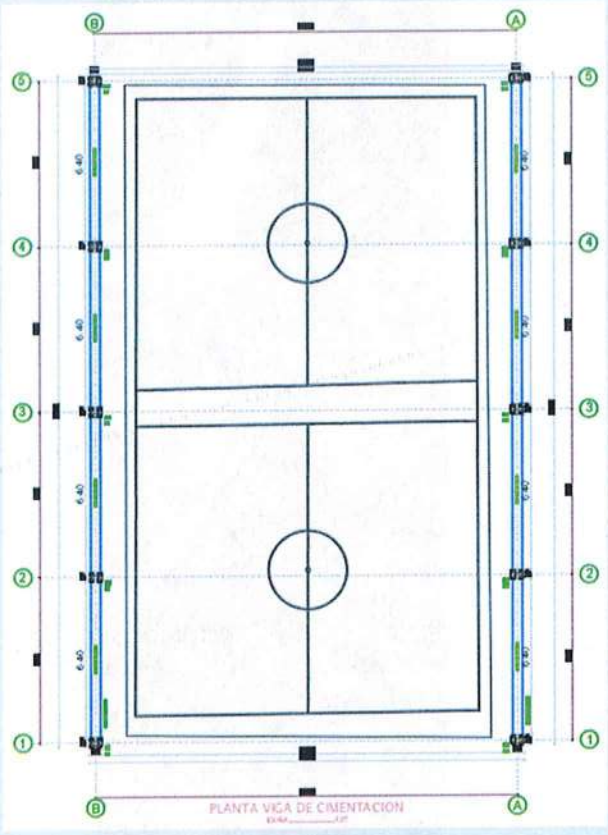






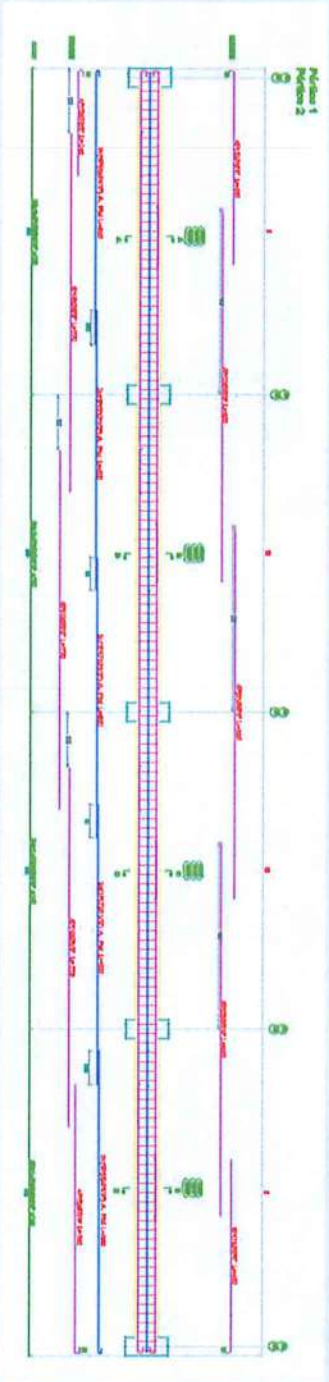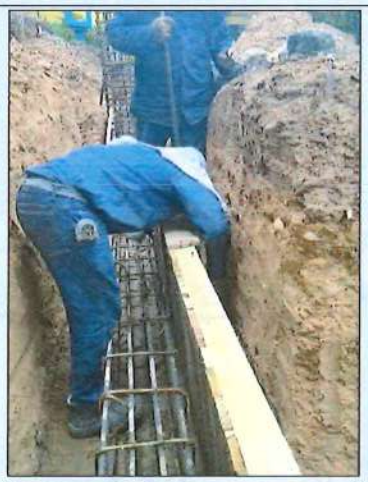

Ítem 2.06 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	
	  

ESTRUCTURA EN CONCRETO


Ítem 3.01 Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI

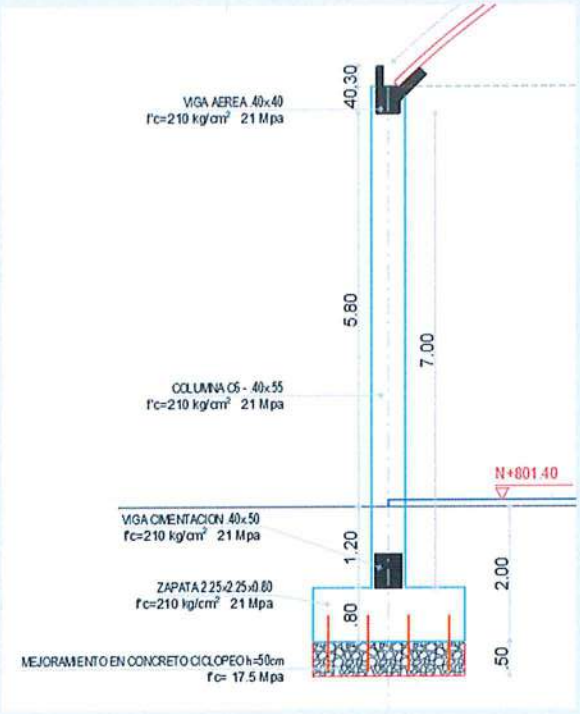








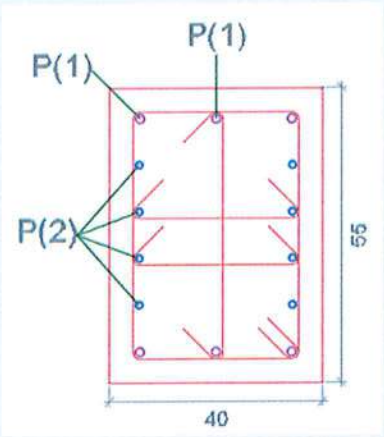

Ítem 3.02 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

Ítem 5.03 Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm

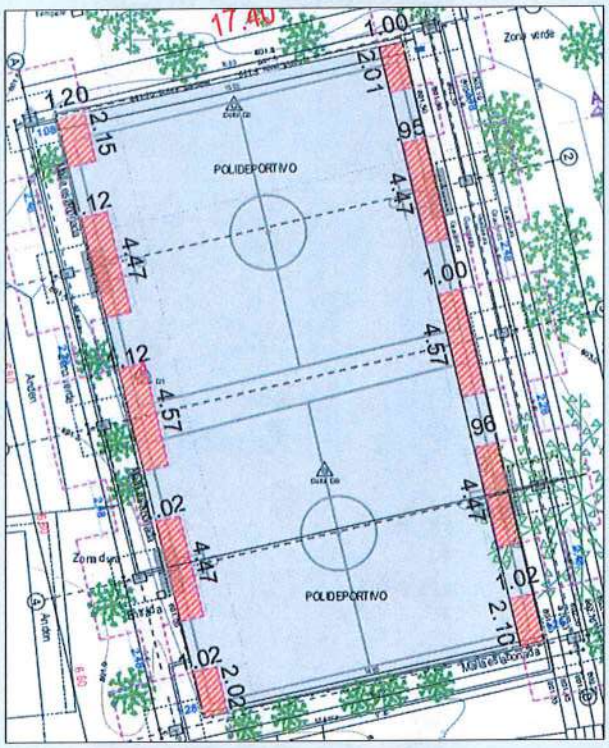









Ítem 5.04 Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño

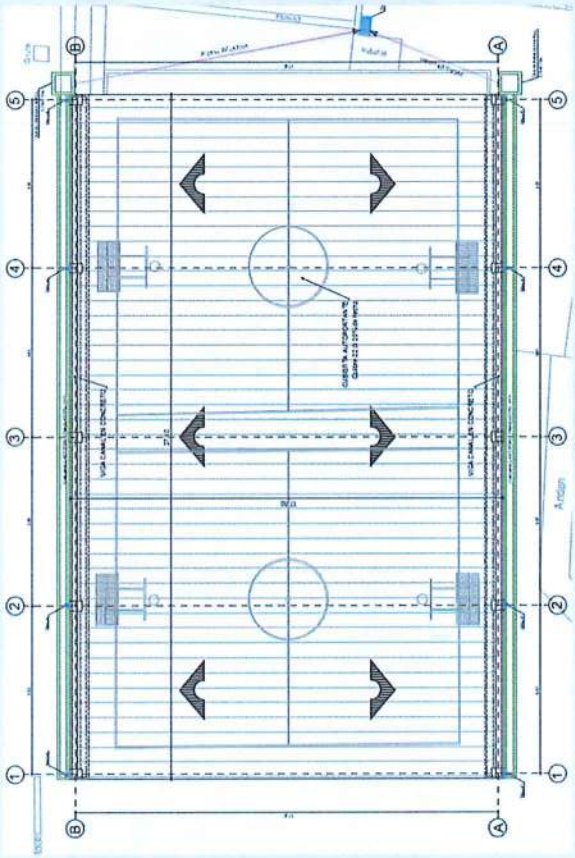

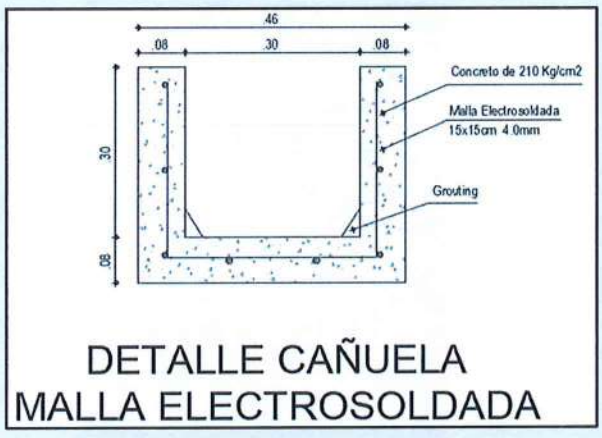

DETALLE CAÑUELA
MALLA ELECTROSOLDADA








INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Ítem 6.01 Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias

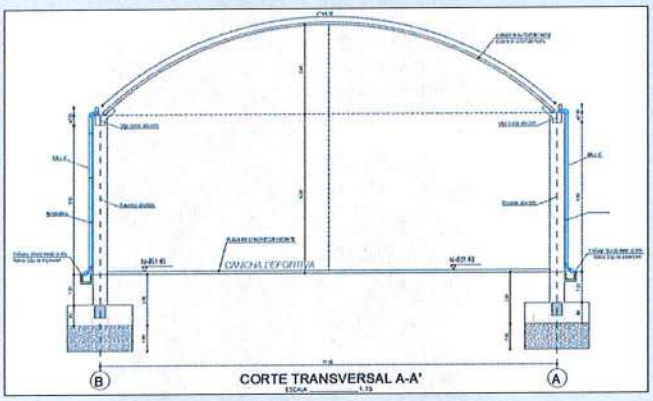


CORTE TRANSVERSAL A-A'







Ítem 6.02 Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües

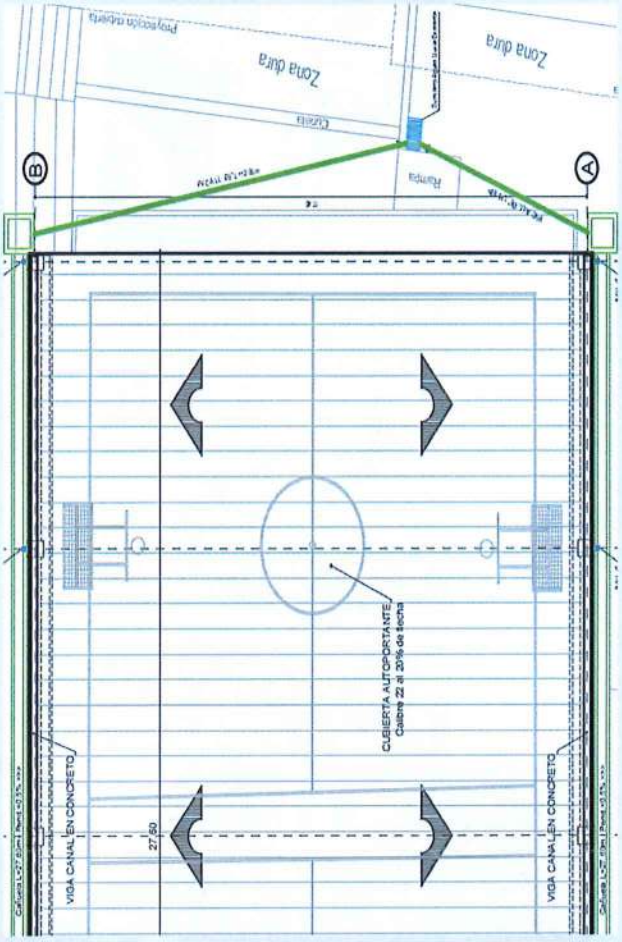









Ítem 6.03 Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño

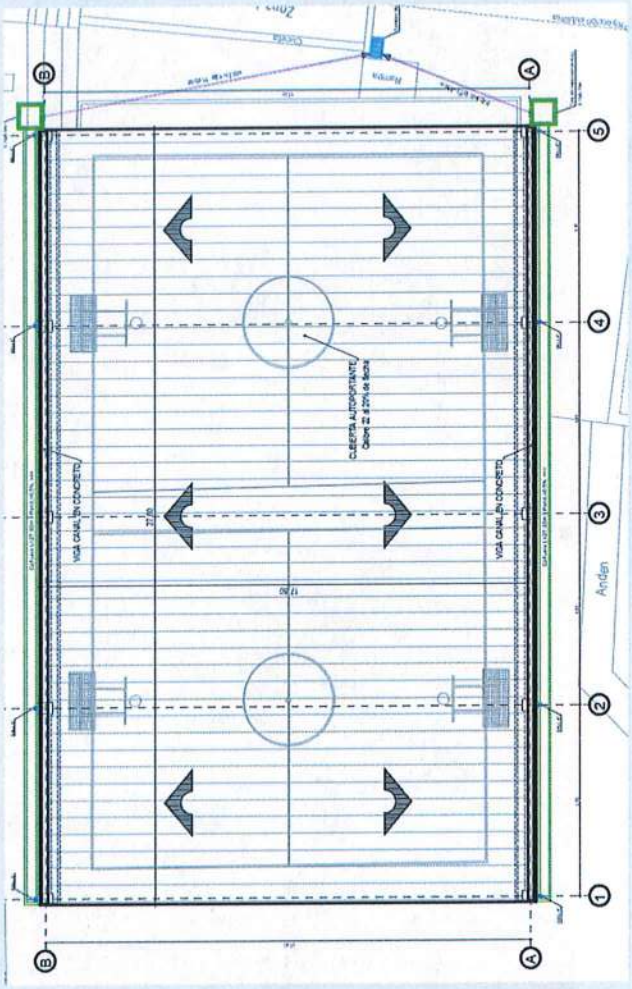



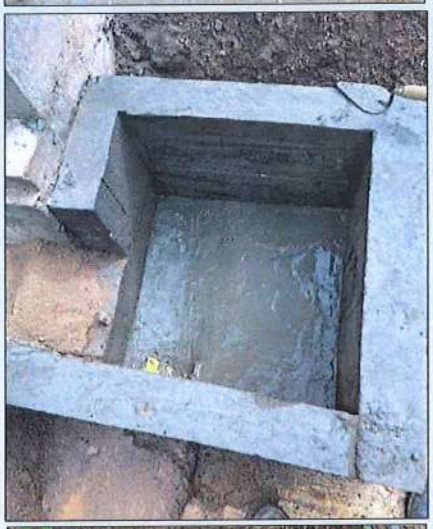



INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ítem 7.01 Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.










ítem 7.02 Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera

autorizada.

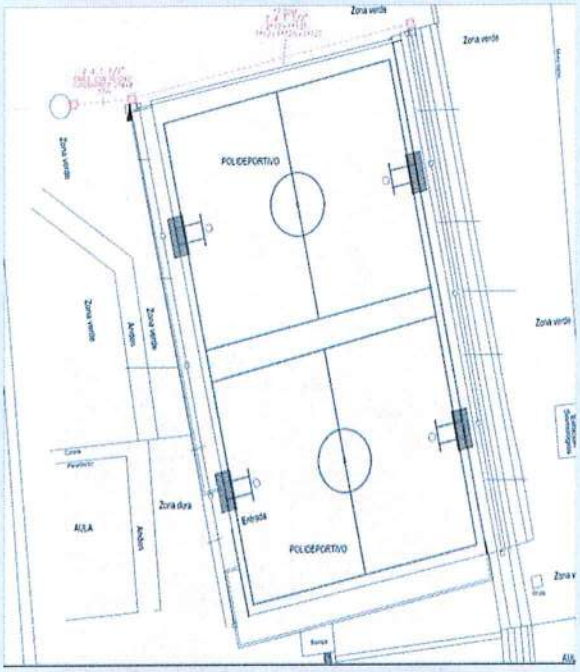








ítem 7.03 Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.

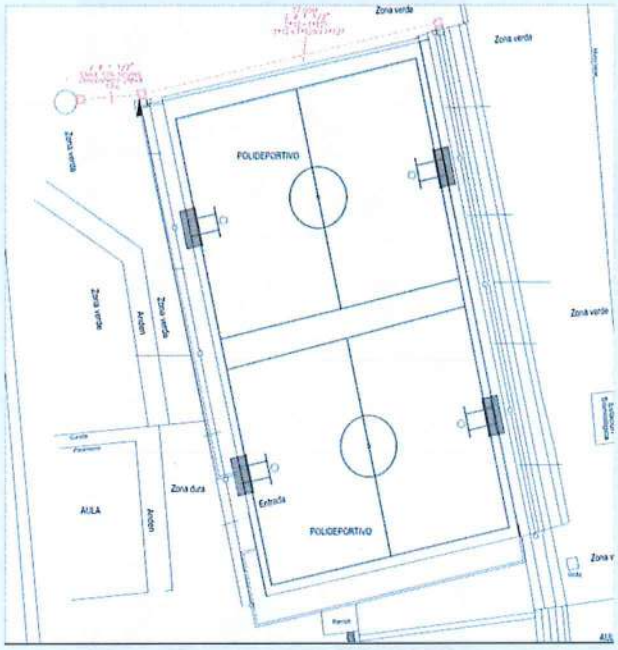








ítem 7.04 Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"

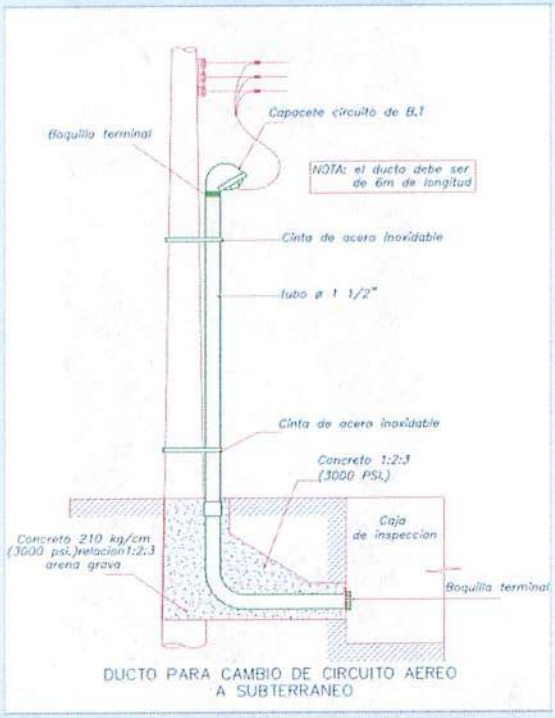

DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO








ítem 7.05 Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.

Se anula ítem debido a la no inclusión del medidor eléctrico.

ítem 7.06 Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.

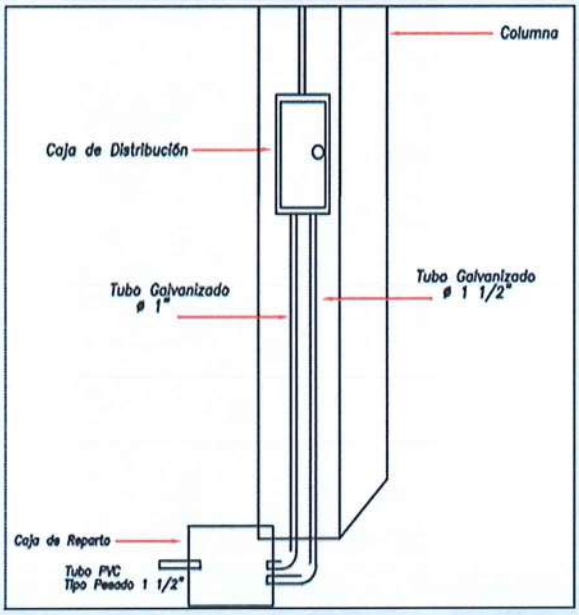









ítem 7.07 Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.

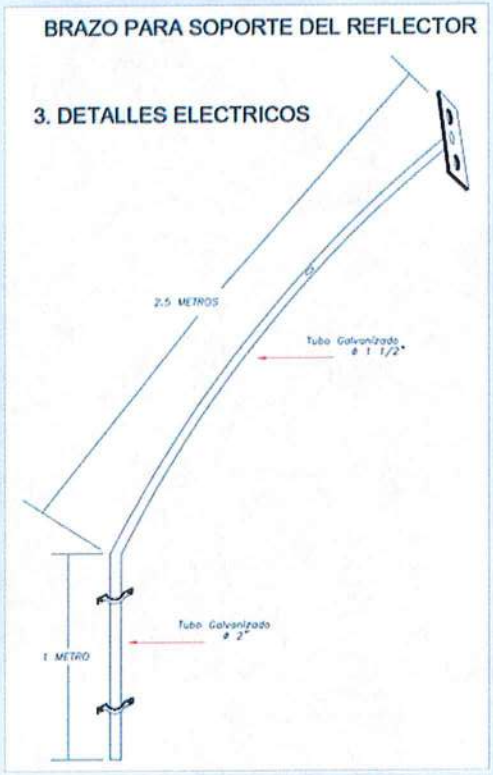




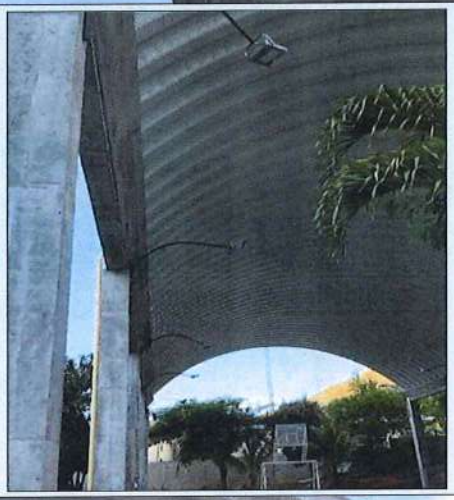



ítem 7.08 Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.

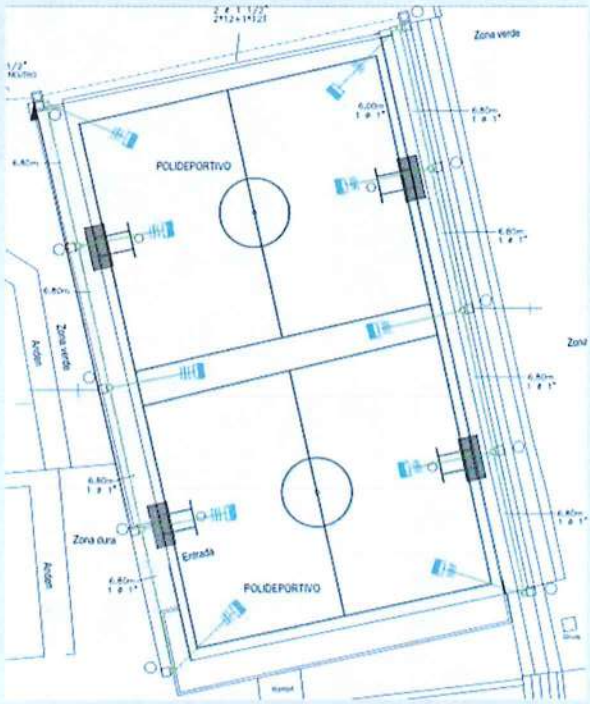








ítem 7.09 Suministro e instalación de reflector led de 150 w

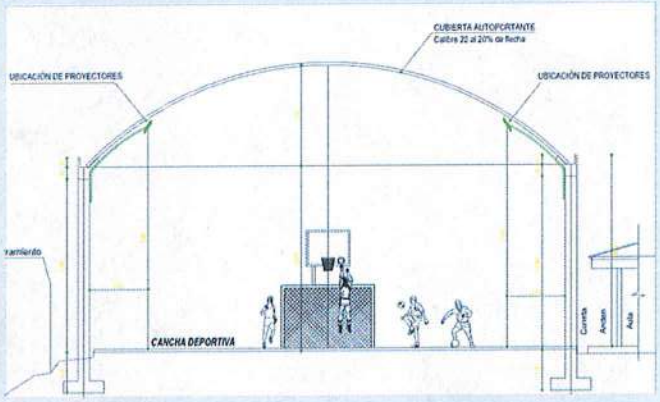









ítem 7.10 Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.

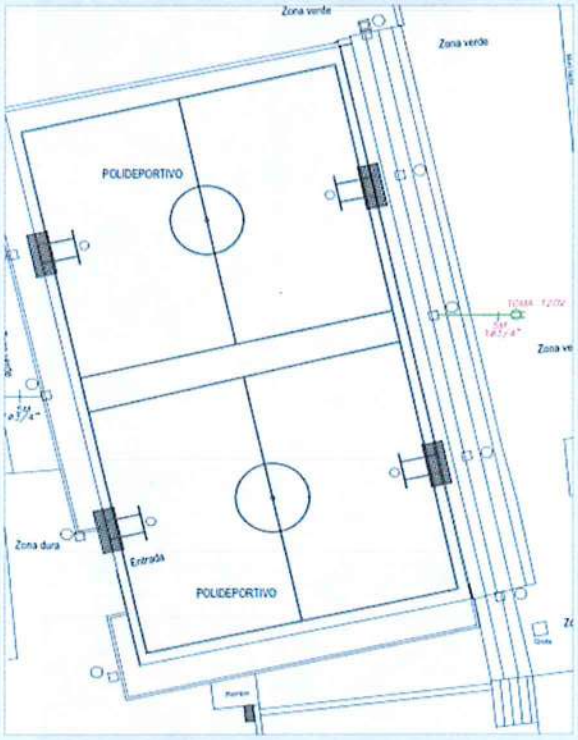






ítem 7.11 Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.

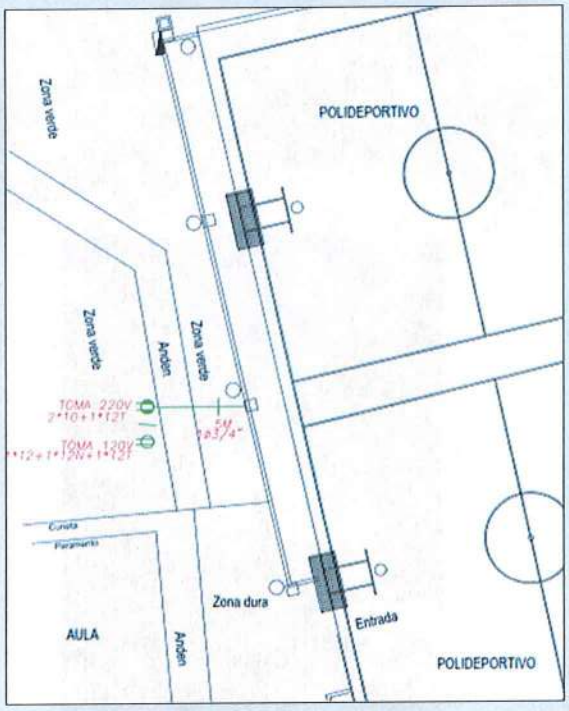






ítem 7.12 Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado

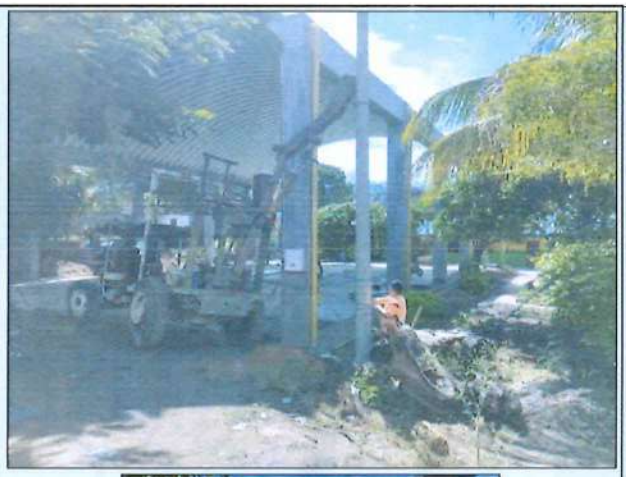


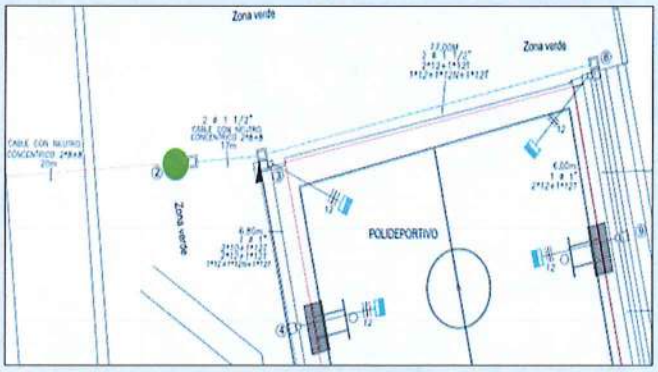






ítem 7.13 Vestida de red de acometida en cable con neutro concéntrico 2*8+8

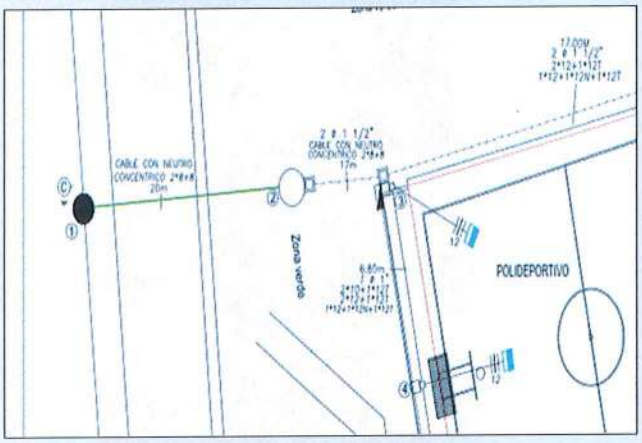








7.14 INP Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste (incluye medidor)

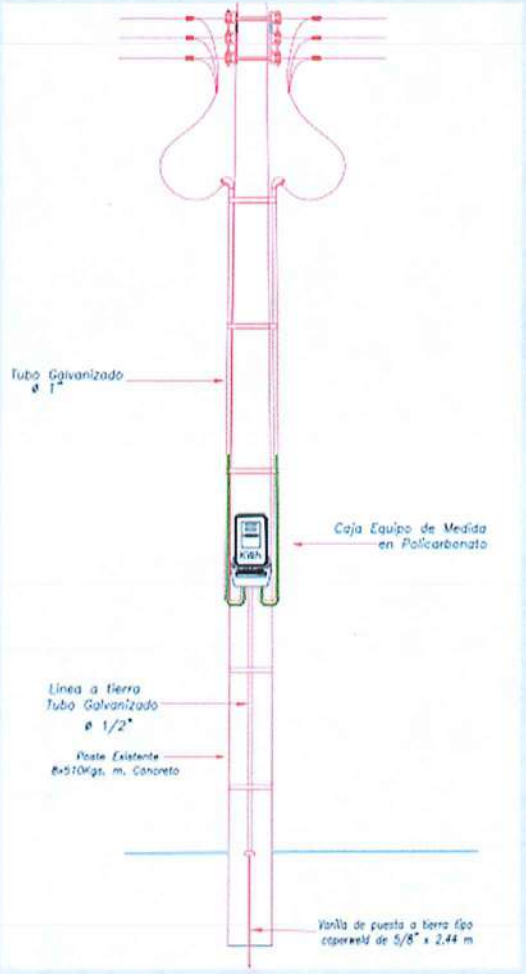
Tubo Galvanizado
ø 1"
Caja Equipo de Medida
en Policarbonato
Kilowatthorímetro
Linea a tierra
Tubo Galvanizado
ø 1/2"
Poste Existente
8x510Kgs. m. Concreto
Varilla de puesta a tierra tipo
copperweld de 5/8" x 2.44 m





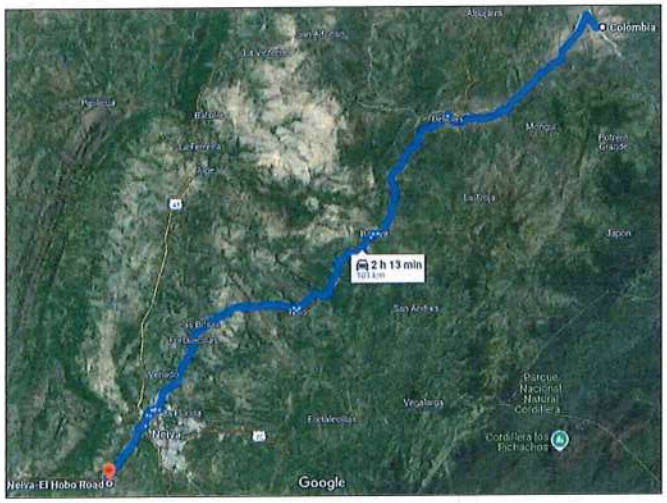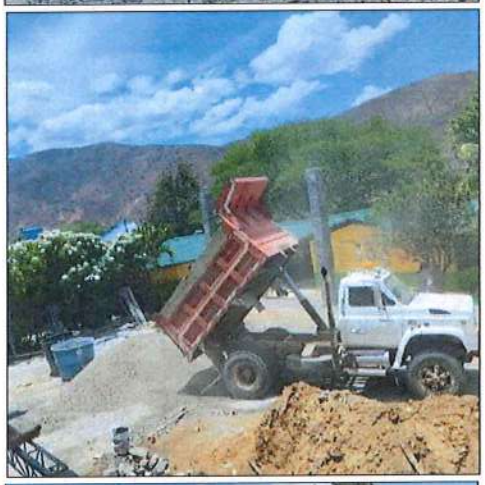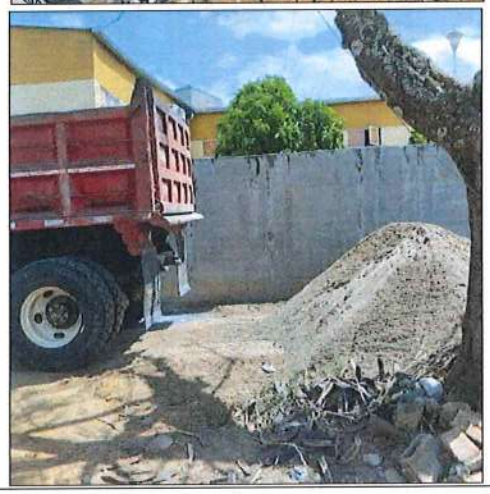

TRANSPORTE	
Ítem 8.01 Transporte de materiales pétreos	
	  

20. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES FINALES			EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL 4			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 23.333.770,00			$ 71.418.168,00		$18.516.482,18			$ 71.418.168,00	
1.01	Localización y replanteo.	M2	588,55	$ 3.524,00	$ 2.074.050,00	578,69	$ 3.524,00	$ 2.039.304,00	0,00	$ 0,00	0,00%	578,69	$ 2.039.304,00	100,00%
1.02	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	125,18	$ 26.026,00	$ 3.257.935,00	256,28	$ 26.026,00	$ 6.669.839,00	0,00	$ 0,00	0,00%	256,28	$ 6.669.839,00	100,00%
1.03	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	24,70	$ 20.659,00	$ 510.277,00	28,70	$ 20.659,00	$ 592.913,00	0,00	$ 0,00	0,00%	28,70	$ 592.913,00	100,00%
1.04	Demolición muro en ladrillo tolete tipo tizón e= 0,25 mts. Incluye retiro del material sobrante.	ML	28,48	$ 12.020,00	$ 342.330,00	33,00	$ 12.020,00	$ 396.660,00	0,00	$ 0,00	0,00%	33,00	$ 396.660,00	100,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	4,00	$ 115.598,00	$ 462.392,00	4,00	$ 115.598,00	$ 462.392,00	0,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 462.392,00	100,00%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	215,11	$ 45.559,00	$ 9.800.196,00	531,70	$ 45.559,00	$ 24.223.720,00	0,00	$ 0,00	0,00%	531,70	$ 24.223.720,00	100,00%
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	82,93	$ 83.041,00	$ 6.886.590,00	445,96	$ 83.041,00	$ 37.033.340,00	222,98	$18.516.482,18	50,00%	445,96	$ 37.033.340,00	100,00%
2.	CIMENTACIÓN				$ 87.577.967,00			$ 67.879.986,00		$ 0,00			$ 67.879.986,00	
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	17,70	$ 33.685,00	$ 596.225,00	14,72	$ 33.685,00	$ 495.843,00	0,00	$ 0,00	0,00%	14,72	$ 495.843,00	100,00%
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	57,15	$ 356.532,00	$ 20.375.804,00	24,44	$ 356.532,00	$ 8.713.642,00	0,00	$ 0,00	0,00%	24,44	$ 8.713.642,00	100,00%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	45,72	$ 613.094,00	$ 28.030.658,00	39,09	$ 613.094,00	$ 23.965.844,00	0,00	$ 0,00	0,00%	39,09	$ 23.965.844,00	100,00%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3.472,00	$ 7.048,00	$ 24.470.656,00	2.705,11	$ 7.048,00	$ 19.065.615,00	0,00	$ 0,00	0,00%	2705,11	$ 19.065.615,00	100,00%
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	7,08	$ 734.887,00	$ 5.203.000,00	10,24	$ 734.887,00	$ 7.525.243,00	0,00	$ 0,00	0,00%	10,24	$ 7.525.243,00	100,00%
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.263,00	$ 7.048,00	$ 8.901.624,00	1.151,22	$ 7.048,00	$ 8.113.799,00	0,00	$ 0,00	0,00%	1151,22	$ 8.113.799,00	100,00%
3.	ESTRUCTURA EN CONCRETO				$ 75.643.354,00			$ 68.114.017,00		$ 38.264.862,00			$ 68.114.017,00	

3.01	Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	15,00	$ 911.951,00	$ 13.679.265,00	15,40	$ 911.951,00	$ 14.044.045,00	7,70	$ 7.022.023,00	50,00%	15,40	$ 14.044.045,00	100,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.121,00	$ 7.048,00	$ 29.044.808,00	3.238,81	$ 7.048,00	$ 22.827.133,00	0,00	$ 0,00	0,00%	3238,81	$ 22.827.133,00	100,00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 995.187,00	$ 16.918.179,00	15,50	$ 995.187,00	$ 15.425.399,00	15,50	$ 15.425.399,00	100,00%	15,50	$ 15.425.399,00	100,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.973,00	$ 7.048,00	$ 13.905.704,00	1.930,50	$ 7.048,00	$ 13.606.164,00	1.930,50	$ 13.606.164,00	100,00%	1930,50	$ 13.606.164,00	100,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	52,44	$ 39.958,00	$ 2.095.398,00	55,34	$ 39.958,00	$ 2.211.276,00	55,34	$ 2.211.276,00	100,00%	55,34	$ 2.211.276,00	100,00%
4.	**CUBIERTA**				**$111.028.308,00**			**$111.028.308,00**		**$111.028.308,00**			**$ 111.028.308,00**	
4,01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	529,92	$ 209.519,00	$ 111.028.308,00	529,92	$ 209.519,00	$111.028.308,00	529,92	$111.028.308,00	100,00%	529,92	$ 111.028.308,00	100,00%
5.	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**				**$ 16.612.904,00**			**$ 28.693.157,00**		**$ 28.693.157,00**			**$ 28.693.157,00**	
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.655,00	$ 4.657.066,00	317,78	$ 14.655,00	$ 4.657.066,00	317,78	$ 4.657.066,00	100,00%	317,78	$ 4.657.066,00	100,00%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$3.674.995,00	$ 7.349.990,00	0,00	$3.674.995,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	0,26	$ 83.918,00	$ 21.819,00	36,59	$ 83.918,00	$ 3.070.560,00	36,59	$ 3.070.560,00	100,00%	36,59	$ 3.070.560,00	100,00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	55,20	$ 83.044,00	$ 4.584.029,00	55,20	$ 83.044,00	$ 4.584.029,00	55,20	$ 4.584.029,00	100,00%	55,20	$ 4.584.029,00	100,00%
5.05 INP	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 para futbol de salón y baloncesto, con tablero en acrílico de 1,8mx1,05m x10mm. Incluye: Aro, malla, demarcado,	UND	0,00	$3.405.132,00	$ -	2,00	$3.405.132,00	$ 6.810.264,00	2,000	$ 6.810.264,00	100,00%	2,000	$ 6.810.264,00	100,00%

	logos administracion, anticorrosivo y pintura.													
5.06 INP	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML	0,00	$ 173.392,00	$ -	55,20	$ 173.392,00	$ 9.571.238,00	55,20	$ 9.571.238,00	100,00%	55,20	$ 9.571.238,00	100,00%
6.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 6.409.967,00**			**$ 6.517.913,00**		**$ 6.517.913,00**			**$ 6.517.913,00**	
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	48,24	$ 79.372,00	$ 3.828.905,00	49,60	$ 79.372,00	$ 3.936.851,00	49,60	$ 3.936.851,00	100,00%	49,60	$ 3.936.851,00	100,00%
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	17,80	$ 106.058,00	$ 1.887.832,00	17,80	$ 106.058,00	$ 1.887.832,00	17,80	$ 1.887.832,00	100,00%	17,80	$ 1.887.832,00	100,00%
6.03	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño	UND	2,00	$ 346.615,00	$ 693.230,00	2,00	$ 346.615,00	$ 693.230,00	2,00	$ 693.230,00	100,00%	2,00	$ 693.230,00	100,00%
7.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 35.745.559,00**			**$ 35.057.044,00**		**$ 35.057.044,00**			**$ 35.057.044,00**	
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 632.743,00	$ 1.898.229,00	3,00	$ 632.743,00	$ 1.898.229,00	3,00	$ 1.898.229,00	100,00%	3,00	$ 1.898.229,00	100,00%
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.559,00	$ 233.262,00	10,28	$ 45.559,00	$ 468.347,00	10,28	$ 468.347,00	100,00%	10,28	$ 468.347,00	100,00%
7.03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 48.866,00	$ 1.563.712,00	34,00	$ 48.866,00	$ 1.661.444,00	34,00	$ 1.661.444,00	100,00%	34,00	$ 1.661.444,00	100,00%
7.04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 301.567,00	$ 603.134,00	3,00	$ 301.567,00	$ 904.701,00	3,00	$ 904.701,00	100,00%	3,00	$ 904.701,00	100,00%
7.05	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$1.007.023,00	$ 1.007.023,00	0,00	$ 1.007.023,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7.06	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$4.655.888,00	$ 4.655.888,00	1,00	$ 4.655.888,00	$ 4.655.888,00	1,00	$ 4.655.888,00	100,00%	1,00	$ 4.655.888,00	100,00%
7.07	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 365.412,00	$ 4.384.944,00	10,00	$ 365.412,00	$ 3.654.120,00	10,00	$ 3.654.120,00	100,00%	10,00	$ 3.654.120,00	100,00%
7.08	Suministro e instalación de	ML	60,00	$ 57.592,00	$ 3.455.520,00	68,00	$ 57.592,00	$ 3.916.256,00	68,00	$ 3.916.256,00	100,00%	68,00	$ 3.916.256,00	100,00%

	cableado para redes internas para montaje de reflectores.													
7.09	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$1.008.967,00	$ 12.107.604,00	10,00	$ 1.008.967,00	$ 10.089.670,00	10,00	$ 10.089.670,00	100,00%	10,00	$ 10.089.670,00	100,00%
7.10	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 965.614,00	$ 965.614,00	1,00	$ 965.614,00	$ 965.614,00	1,00	$ 965.614,00	10,00%	1,00	$ 965.614,00	100,00%
7.11	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$1.025.385,00	$ 1.025.385,00	1,00	$ 1.025.385,00	$ 1.025.385,00	1,00	$ 1.025.385,00	100,00%	1,00	$ 1.025.385,00	100,00%
7.12	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1,00	$2.231.187,00	$ 2.231.187,00	1,00	$ 2.231.187,00	$ 2.231.187,00	1,00	$ 2.231.187,00	100,00%	1,00	$ 2.231.187,00	100,00%
7.13	Vestida de red de acometida en cable con neutro concentrico 2*8+8	UND	1,00	$1.614.057,00	$ 1.614.057,00	1,00	$ 1.614.057,00	$ 1.614.057,00	1,00	$ 1.614.057,00	100,00%	1,00	$ 1.614.057,00	100,00%
7.14 INP	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste (incluye medidor)	UND	0,00	$1.972.146,00	$ 0,00	1,00	$ 1.972.146,00	$ 1.972.146,00	1,00	$ 1.972.146,00	100,00%	1,00	$ 1.972.146,00	100,00%
8.	**TRANSPORTE**				**$ 22.370.462,00**			**$ 20.346.932,00**		**$ 0,00**			**$ 20.346.932,00**	
8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	20523,36	$1.090,00	$ 22.370.462,00	18.666,91	$ 1.090,00	$ 20.346.932,00	0,00	$ 0,00	0,00%	18666,91	$ 20.346.932,00	100,00%
% AVANCE DE OBRA											**58,20%**			**100,00%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. YONATHAN DAVID REYES LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA

ING. JAIRO ISAAC GÁMEZ BARRERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO OBRA

- VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... $ 473.402.864
- VALOR DEL ANTICIPO..... $ 118.350.716
- PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 25%

AVANCE FISICO REAL

- Avance Físico Mensual..... **58.20%**
- Avance Físico Acumulado..... **100%**

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del 100%

PORCENTAJE DE AVANCE O ATRASO SEGÚN CRONOGRAMA

Se presenta un avance de obra del 100%

AVANCE EN TIEMPO

- Tiempo Total de Obra..... 120 días
- Tiempo Total Transcurrido .....120 días
- Tiempo Total que les queda..... 0 días
- Avance Porcentual según plazo inicial..... 120%

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

OTRO SI No. 2 06/11/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL:	**$124.462.130,00**
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$10.647.996,72
VALOR TOTAL:	**$135.110.126,72**

21. ANEXOS

- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

ING. **JAIRO ISAAC GÁMEZ BARRERO**	(13/03/2025)	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo. Bo APOYO SUPERVISION**

BITÁCORA DE OBRA.

Contrato de Obra No- CLPIH423 de 2023.

objeto:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE 7 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA PABLO SEXTO.

Nit. 901.770.588-1.

INTERVENTORÍA.

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

Nit. 891.701.700-5.

Acta de Inicio de Obra: 28-11-2023.

Luego de la firma del acta de inicio en las instalaciones del Inderhuila se lleva a cabo la primera visita de obra.

El día 30 de noviembre de 2023, se realizo Visita a la institución educativa Pablo Sexto Sede 1 del municipio de Colombia Huila, sitio donde se va a ejecutar la obra. Durante la visita se realizo la Socialización del Proyecto, a la cual asistieron los representantes de la comunidad. Junto con el personal de la interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda. el personal de la entidad contratante y el contratista Unión Temporal Cubierta Pablo Sexto. Durante este espacio se realizo la presentación de los diseños del Proyecto, se socializó el plazo estimado para la ejecución de la obra.

Posteriormente se realizo la conformación de la Veeduría ciudadana, conformada por tres Personas de la comunidad.

En la visita realizada se logro evidenciar algunos aspectos que al parecer no se tuvieron en cuenta en el estudio Previo. Se realizo el contraste de la implantacion de la cubierta sobre la concha existente y se logro evidenciar que no se tuvo en cuenta la sobre excavación que se genero en el eje B, en el area donde se encuentra localizada las gradarias; además es necesario realizar la tala de un arbol de gran magnitud para realizar el proceso constructivo de la Zona B2.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Director de Obra

Director Interventoria

El día 04 de diciembre se remite oficio a la interventoria Soto Ltda, realizando la entrega de documentación solicitada posterior a la firma del acta de inicio.

El mismo día 04 de diciembre, se envió oficio a la interventoría Soto Ltda con motivo de entrega de la documentación necesaria para el trámite del anticipo de contrato de Obra CLPIH 423 de 2023.

El día martes 05 de diciembre se realizo en conjunto con la Supervisión, el contratista la interventoría las observaciones a los hallazgos

- Despiece del acero en la viga de cimentación y aceros en general.
- Tala de Arbol para realizar el proceso constructivo de la Zapata B2.
- Entibados para la profundidad de excavación de 3m.
- Mayores excavaciones.

- Cuadro Interstey con tapa.

Se realizó comité de obra No. 1 para tratar los temas mencionados anteriorm

Residente de Obra

Residente de Interventor

Director de Obra

Director de Interven

El día 06 de diciembre de 2023. Se solicita tramitar la suspensión de la Obra No debido a los diferentes hallazgos en las cantidades de Obra contractuales y en los diseños del proyecto.

El día Miercoles 13 de diciembre de 2023. Se remite Oficio a la interventoria Sota ltda describiendo la relación detallada del hallazgo No. 2, tala del arbol, del acero de en la viga de cimentación y las entibados para la Sobre excavación.

Ese mismo día se dio respuesta al Oficio INDER001-12/12/23, Se envió documentación solicitada.

El día Miercoles 20 de diciembre. se envia Oficio a la interventoria reiterando la solicitud de la suspensión del contrato.

El día Jueves 21 de diciembre de 2023 Se realiza Comite de Obra No. 2 en las oficinas de Sota ltda, al cual asistio la supervisión, el contratista de Obra y la interventoria, en el desarrollo del comité se realizo la socialización

detallada de cada una de las observaciones estructurales, así como de otras observaciones referentes a los planos de diseño y memorias de cantidades. En el comité de obra No. 2 se acepta la suspensión del contrato hasta tanto se solucione por parte de la entidad contratante los diseños estructurales del proyecto.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Director de Obra

Director de Interventoría

El día Jueves 28 de diciembre de 2023 se realiza la suscripción de acta de Justificación No. 1 y Acta de suspensión No 1 para el contrato de Obra Pública No. CLPIH 423 de 2023 y el contrato de interventoría No CIHCM446 de 2023.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2023 y el 28 de diciembre de 2023 se realizaron diversas actividades relacionadas con la entrega de documentación para la legalización del anticipo, documentos necesarios para el inicio de obra, revisión de los cronogramas inicialmente aprobados y se hizo observación de la modificación de los planos por parte de la entidad.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Director de Interventoría

Acta de Reinicio de Obra No. 1.
Fecha: 31 de Mayo de 2024

Luego del reinicio del contrato de Obra CLPIH 423 de 2023 se procede a realizar Comite de Obra No. 3. en la institución educativa Punto sexto sede 1, en compañía de la supervisión, interventoria y el contratista de obra; se realiza mediciones en terreno y se contrastan los planos modificados por la entidad con las cantidades de obra a ejecutar, adicionalmente se verifica que ya se efectuo la tala del arbol ubicado en la zapata B2 en el area de las graderias, se hace la aclaracion de posibles modificaciones al balance presentado el 21 de mayo de 2024; se esta a la espera de comité extraordinario entre la Supervisión, la interventoria el contratista y el equipo formulador de los diseños de la entidad, para revisión general del balance presentado y las nuevas observaciones en campo.

Ya que se requiere esclarecer las cantidades de Obra Anales antes de dejar en firme el balance, para proceder con las actividades finales en campo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Director de Obra

Director de Interventoría

- El día 11 de Junio se envió Oficio a la interventoría Reiterando solicitud de Socialización del balance de Obra No 1.

- El día Martes 25 de Junio se realizo Comité de Obra No. 4. en la zona del Proyecto, se desarrolla comité con la interventoría y 2 docentes de la Institución y el contratista de Obra.

La comunidad educativa expresa su preocupación por la poda de arboles, el retiro de materiales y la demolición de las gradarias en la zona de influencia del proyecto, solicitan desplazar la cubierta a un costado con el fin de generar la menor afectación posible a las moreras y evitar la poda de los arboles, Solicitan No iniciar Obra hasta tanto se espere el inconveniente de la poda de arboles y las moreras, peticion que no es viable puesto que hay una placa existente y se debe garantizar cobertura total de la concha con la cubierta autoportante segun diseños Proyectos, la demolicion de las gradarias debe efectuarse. puesto que interfieren con la cimentacion de la abuela en el eje B

Por otra parte en la visita de campo se recalca la importancia de creacion de items nuevos para incluir zapatas pilotadas para las cuchas, se incluirá el

modular bipásico trifolar, además se propone un talud de 1V:05H para las excavaciones, de tal manera que se garantiza la geometría de las zapatas y la seguridad del personal que realice los trabajos a -2.50m de la rasante del terreno, cabe aclarar que esta última modificación incrementa los contratos de demolición, de losa placa, volumen de excavación y volumen de relleno para la construcción de la cimentación de la estructura de la cubierta.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Director de Obra

Director de Interventoría

El día 26 de junio de 2024, el Lic. Edwards García Castillo, rector de la institución educativa Paulo Sexto, autoriza mediante Oficio el inicio de actividades físicas en campo, solicitando se preserve en la medida de lo posible la vegetación existente en la zona del proyecto.

El día 27 de junio se inicia actividad de cerramiento en toma Verde, de la zona de trabajo, generando un espacio adecuado para la ejecución de las obras. y limitando el ingreso de personal no autorizado.
También se realiza señalización de la obra, ubicación del botiquín, extintor, área para disposición de basuras y adecuación de la bodega para almacenamiento de materiales.
→ Se ejecuta actividad de localización y replanteo el día 28 de junio.
→ Se inicia transporte de agregados para concretos el 28 y 29 de junio

Fecha: Lunes 01 de Julio de 2024

Estado del Clima: Seco

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

- Se procede con inicio de actividad de excavación y retiro de material, Se realiza excavación mecánica puesto que debido a los inconvenientes presentados, previo inicio de actividades se presenta un retraso significativo en el avance de la Obra, el contratista asume a su costo y riesgo emplear una retroexcavadora pajarita; se maneja un talud de 1V:0.5H Se excava para cimentación en ejes A y B.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Residente Interventoría

Fecha: Martes 02 de Julio de 2024

Estado del clima: Seco

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudantes (5).

Actividades Realizadas

→ Se desarrolla Comité de Obra No 5. Socialización Balance.

→ Se continua con excavación y retiro de material, Adicionalmente se inicia actividad de demolición mecanica de andenes y placa de la cancha que interfiere con las excavaciones, Se emplea retroexcavadora y Pulidora con disco de tungsteno

→ se realiza entrega de balance de obra ajustado al tiempo

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

NKA

Fecha: Viernes 03 de Julio de 2024

Estado del clima: Seco

Personal en Obra: Maestro General (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

- Se inicia actividad de fundición de ciclopeo en concreto de 2500psi y se vierte concreto en eje B para zapatas B1, 2, 3, 4 y 5.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Jueves 04 de Julio de 2024.

Estado del Clima: Seco
Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas.

→ Se inicia actividad de armado de acero de refuerzo grado 60 para zapatas y columnas, se realiza armado de castillos y parrillas según diseño estructural y despiece Acero

→ Se realiza demolición de cerramiento perimetral e malla eslabonada y tubería galvanizada.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Interventor

- ¡ Fecha: Viernes 05 de Julio de 2024

Estado del Clima: Seco
Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante: (5)

Actividades Realizadas.

→ Se inicia actividad de fundición de zapatas en concreto de 3000 psi.
se vierte concreto para zapatas eje B'
→ Se realiza toma de muestra de concreto
para verificación de resistencia.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Sabado 06 de Julio de 2024.

Estado del clima: lluvioso moderado

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5).

Actividades Realizadas

→ Se realiza armado de acero de refuerzo para zapatas y columnas segun despiece de Acero.
→ Se funde zapata eje. B3
→ Se realiza actividad de demolición de muro en ladrillo tolete y desmonte de conchas.
→ Se realiza solicitud para revisión de mayores y menores metrados de Obra, Items no previstos, adicional en tiempo y adicional de recursos economicos

Residente Obra

Residente Interventoria

Director NIKEL

Fecha: Domingo 07 de Julio → Día No laborable

Fecha: Lunes 08 de Julio de 2024

Estado del Clima: Seco

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas.

→ Se realiza actividad de fundición de Zapatas en concreto de 3000 psi, se vierte concreto en Zapatas eje B 4/5

→ Se transporta agregados para concreto en Volqueta sencilla de capacidad 6m3.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Rep. Legal

Fecha: Martes 09 de Julio de 2024.

Estado del Clima: Nublado moderado

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5).

Actividades Realizadas

→ Se inicia actividad de concreto de limpieza para solado de 2000 psi de 0,05m de espesor, se vierte concreto para solado de Vigas de cimentación eje B.

→ Se inicia armado de acero de refuerzo grado 60 para Vigas de cimentación segun despiece en el diseño estructural del proyecto

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Miércoles 10 de Julio de 2024.

Estado del Clima: Nuboso y moderado

Personal en Obra: Costo general
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de fundición de vigas de cimentación en concreto de 3000 psi, previo encofrado en comilla en madera para garantizar la geometría de la viga, se funde Viga en el eje B.

→ Se realiza toma de muestra de concreto para verificación de resistencia.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Jueves 11 de Julio de 2024.

Estado del clima: Seco
Personal en Obra: Maestro general (1).
Oficial (1)
Ayudante: (5)

Actividades Realizadas

→ Se realiza desencofrado de vigas de cimentación
→ se procede con encofrado de columnas eje "B 1 y 2, se emplea formaleta metálica para garantizar un acabado optimo para las columnas.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Obra

Fx Fecha: Viernes 12 de Julio de 2024

Estado del Clima: Seco
Personal en Obra: Puesto general: (1)
Oficial: (1)
Ayudante: (5)

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de fundición de columnas eje B 1 y 2, se vierte concreto de 3000 psi, se emplea vibro electrico para garantizar el adecuado acabado al concreto
→ Se realiza toma de muestras de concreto para verificación de resistencia

Residente de Obra

Residente Interventoría

Maestro de Obra

Director Interventoría

Fecha: Sabado 13 de Julio de 2024

Estado del clima: Lluvia fuerte

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (4)

Actividades Realizadas

→ Se realiza armado de estribos para columnas eje B 3, 4 y 5, segun despiece de acero en diseño estructural.

→ Se inicia encofrado de columnas con formaleta metalica

Residente de Obra

Residente Interventoria



Director Obra

Director Interventoria

Fecha: Domingo 14 de Julio: Dia No Labo.

F. Fechas: Lunes 15 de Julio de 2024.

Estado del Clima: lluvioso fuerte

Personal en Obra: Maestro general
Operario (1)
Ayudante (5)

Actividades realizadas

→ Se continua con encofrado de columnas eje B 3, 4 y 5., con formaleta metalica

→ Se procede con fundicion de columnas eje B 3, 4, y 5, se vierte concreto de 3000 psi con adecuado Vibrado

Residente Obra

Residente Interventoria

Director Obra

Fechas: Martes 16 de Julio de 2024

Estado del clima: Nuboso frente

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial: (1)
Ayudante: (5)

Actividades Realizadas.

→ Se inicia actividad de transporte de material recebo seleccionado para relleno.

→ Se ejecuta actividad de instalación de relleno en recebo seleccionado en zonas de cimentación y sobre excavación, Se compacta material mecanicamente.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director I...

Fecha: Miercoles 17 de Julio de 2024.

Estado del Clima: Seco
Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante: (5)

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de fundición de concreto ciclopeo de 2500 psi en eje A para instalación de zapatas eje A 1, 2, 3, 4 y 5., se instala acero de 1/2" para esfuerzo cortante, Figura a 90°.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Jueves 18 de Julio de 2024.

Estado del Clima: Seco

Personal en Obra: Maestro general: (1)
Oficial: (1)
Ayudante: (5).

Actividades Realizadas

- Se inicia actividad de armado de acero de refuerzo según despiece para zapatas y columnas en el eje A.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

NKA

Fecha Viernes 19 de Julio de 2024.

Estado del clima: Seco
Personal en Obra: Maestro General
Oficial (1)
Ayudante. (5).

Actividades Realizadas

→ Se inicia con actividad de fundición de Zapatas eje A1, 2 y 3. en concreto de 3000 psi.
→ Se continua con armado de Acero para Zapatas y columnas eje A 4 y 5., según descripción en Planos estructurales.
→ Se hace toma de muestra de concreto, para ser resistencia.
→ Se realiza Solicitud de Suspensión de Obra No 2.

Residente de Obra

Director de Obra

Sabado 20 de Julio de 2024 ← Fecha

Estado del Clima: Lluvioso fuerte

Personal en Obra: Residente general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de fundición de Zapatas eje A 4 y 5. en concreto de 3000 psi.

→ Se inicia actividad de fundición de Solado de limpieza en concreto de 2000 psi para Vigas de cimentación Eje A.

→ Se inicia armado de acero para Vigas de cimentación eje A.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Domingo 21 de Julio → Día No Laboral
Fecha: Lunes 22 de Julio de 2024.

Estado del clima: Nublado moderado
Personal en Obra: Maestro General (1)
Oficial (1)
Ayudante (5).

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de fundición de Vigas - de amarre para cimentación en el Eje A, se vierte concreto de 3000 psi, se hace vibrado adecuado
→ Se toman muestras de concreto, para ensayos Resistencia
→ Se realiza comité de Obra No. 6, se reune la interventoría, el contratista de Obra y la supervisión y se decide hacer Suspensión de Obra No 2. para revisión y optimización de balance de Obra No. 1, con el fin de garantizar el objeto Contractual

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Fecha: Martes 23 de Julio de 2024.

→ Se realiza Suspensión de Obra No 2.

Fecha: Miercoles 06 de Noviembre de 2024.

Estado del clima: Nuboso moderado

Personal en obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5).

Actividades Realizadas

→ Se reinicia el contrato de obra
Se emite Acta de reinicio No 2.
→ Se inicia instalación de plataforma para fundición de Viga canal eje B, se instala Porales, Cerchas metalicas y Correas en madera.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Fecha: Jueves 07 de 2024 - Noviembre.

Estado del Clima: Lluvioso, nublado

Personal en Obra: Maestro General
Oficial (1)
Ayudante (5).

Actividades Realizadas

→ Se continua con instalación de plataf para fundición de Viga Canal eje B.


→ Se inicia armare de acero de refuerzo para Viga Canal del eje B. se realiza armare en base al despiece de Acero del diseño estructural del proyecto.

Residente de Obra

Residente de Interv

Director de Obra

Director de Interventor

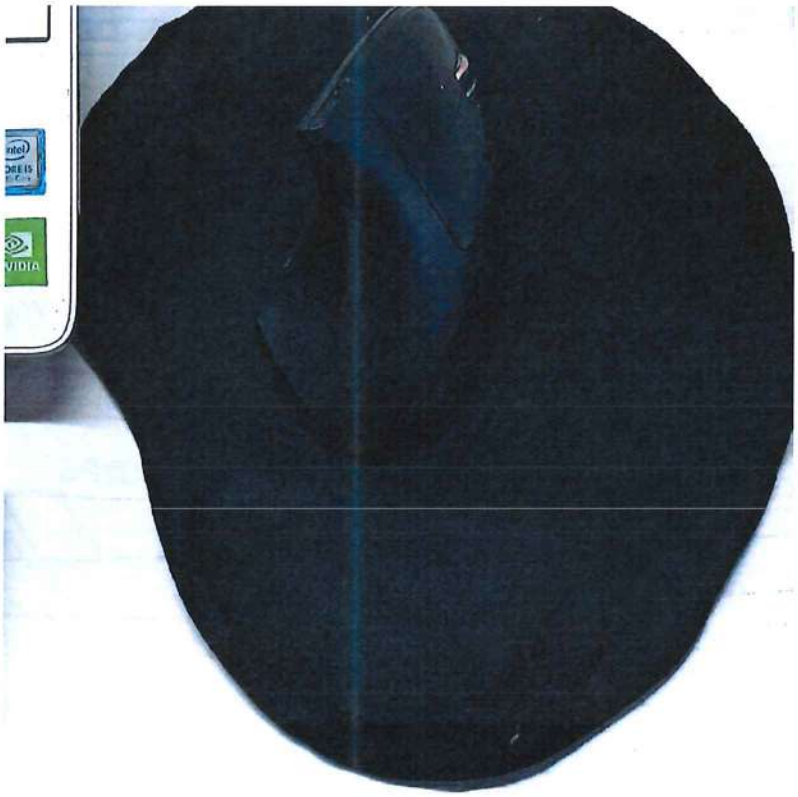

37

Fecha: Viernes 08 de 2014 - Noviembre.

Estado del clima: lluvioso durante

Personal en obras: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se continua con armado de acero de refuerzo grado 60 para Viga Canal del eje B. Según despiece de acero del diseño estructural.

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

Director Obra

Director Fiscalizador

Fecha: Sabado 09 de Noviembre de 2024.

Estado del clima: Lluvioso / moderado

Personal en Obra: Maestro General: (1)
Oficial: (1)
Ayudante: (5)

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de Fundida de Viga Canal del eje B en concreto de 3000 psi, se impermeabiliza la mezcla con impermeabilizante SIKA 50 fundida en su totalidad la Viga Canal guardando Volúmen del concreto de manera monolítica.

→ Se realiza toma de muestras de concreto para Verificación de resistencia

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Domingo 10 de Noviembre → Día No laborable

Fecha: Lunes 11 de Noviembre de 2024.

Estado del clima: Seco

Personal en Obra: Maestro General (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas:

→ Se inicia encofrado para columnas eje A 1, 2 y 3, posteriormente se instalan estribos pendientes según despiece del plano estructural.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fe

F. Fecha: Jueves 12 de noviembre de 20

Estado del Clima: Seco

Personal en Obra: Maestro
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades realizadas

- Se ejecuta actividad de fundición de columnas del eje A 1,2
Se vierte concreto de 3000 p
Se garantiza correcto Vibrado d
correcto-
→ Se realiza toma de muestras de concret
para verificación de resistencia

Residente de Obra

Residente d

Director de Obra

Director Inte

Fecha:

Fecha: Jueves 14 de noviembre de 2024.

Estado del clima: Seco

Personal en Obra: Maestro de Obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades realizadas.

→ Se ejecuta actividad de instalación y compactación mecánica de relleno, se instala suelo seleccionado en áreas de cajón y sobre excavación.

→ Se procede con instalación de plataforma para fundición de Viga Cabezal en el eje A, se emplea panal y cercha metálica y comillas en

→ Se inicia instalación de Acero de refuerzo para Viga Cabezal - Segun diseño estructural.

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2024.

Estado del clima: Seco

Personal en Obra: Maestro General (1)
Operario (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas.

→ Se finaliza encofrado en Viga Canal eje A.

→ Se finaliza armado de Acero de refuerzo grado 60 para Viga Canal, segun despiece de acero en diseños estructurales.

Residente Obra

Residente Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Sabado 16 de Noviembre de 2024 ← Fecha

Estado del Clima = Seco

Personal en Obra = Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudantes (5)

Actividades Realizadas

→ Se realiza fundición de Viga Canal en el eje A, se vierte concreto de 3.000, Vaciado monolíticamente y garantiza Vibrado de concreto adecuado.
→ Se realiza toma de muestras de concreto para verificación de resistencia.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Practicante Obra

Director interventoría

Fecha: Domingo 17 de noviembre 2024 → Día No Laboral

Fecha: Lunes 18 de noviembre 2024.

Estado del clima = Nuboso y fuerte

Personal en Obra = 1 Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (5).

Actividades realizadas

→ Se realiza instalación de tubería de 4" para bajantes, se instalan 4 bajantes en el eje A y 4 bajantes en el eje B

→ Se realiza excavación para instalación de tubería de 6", posteriormente se instala tubería de 6" de caja de inspección final. Sumideros - Según diseño hidrosanitario.

Residente de Obra

Residente Alternante

Fecha: Martes 19 de noviembre de 2024

Estado del clima: Seco

Personal Obra

Maestro de obra
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se realiza impermeabilización e instalación de monto en Viga Cordes, se garantiza adecuada instalación del producto, genera una capa impermeable para evitar la filtración de agua lluvia.

→ Se procede con la construcción de dos cajas de inspección en el eje B 1 y otra en el eje A.

Residente de Obra

Residente de Instalación

Director de Obra

Director [illegible]

Fecha: Miercoles 20 de noviembre de 2024.

Estado del Clima: Seco

Personal en Obra: Residente de obra (1).
Oficial: (1)
Ayudantes: (5)

Actividades Realizadas.

→ Se inicia actividad de excavación para cunetas en el eje A y B, se transporta material sobrante de excavación. Se garantizan los niveles en la excavación para generar una correcta evacuación de agua lluvia.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Jueves 21 de noviembre de 2024

Estado del Clima: Lluvioso moderado

Personal en Obra: Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

- Se inicia fundición de placa inferior de Viga cuneta en eje A y de la cuneta del eje B en concreto de 3000 psi, se garantizan niveles en el concreto para una correcta ejecución de obra. Luego se realiza refuerzo de anden con malla electrosoldada

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2024.

Estado del Clima: Nuboso fuerte

Personal en Obra: Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se inicia actividad de fundición de cuneta en el eje B, se realizo encofrado posteriormente se procede a vaciar el concreto de 3000 psi en la cuneta, se define pestaña para instalación de rejillas. prefabricadas en concreto



Director de obra

Director de interventoría

Residente de Hum.

Residente Tecn.

Fecha Sabado 23 de Noviembre de 20

Estado del clima: Lluvioso, fuerte

Personal en Obra: Maestro general (
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se ejecuta actividad de fundición de Cuneta en el eje A, para evacuación de aguas lluvias, se realiza Conexión de bajantes a cuneta, se vierte concreto de 3000 psi para su construcción, previo encofrado en formaleta de madera

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Director Obra

Director Interventoría

Fecha: Domingo 24 de Noviembre: Día No laborable
Fecha: Lunes 25 de Noviembre de 2024

Estado del clima: Seco
Personal en Obra: Maestro General (1)
Oficial (1)
Ayudantes (5)

Actividades Realizadas

→ Se inicia Fabricación de teja para cubierta en lomina Acesco, Según especificaciones Técnicas.
→ Se ejecuta actividad de fundición de placas en concreto de 3000 psi, para reconstrucción de áreas afectadas por la cimentación y el proceso constructivo de la estructura de la cubierta. Según contratistas de Obra aprobadas.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director de Interventoría

Fecha: Martes 26 de Noviembre de 2024

Estado del Clima: Nuboso moderado

Personal en Obra: Maestro de Obra (1)
Oficial (1)
Ayudantes: (5)

Actividades Realizadas

→ Se procede con instalación de cubierta autoportante en lamina Acesco, garantizando adecuada instalación, se garantiza fijación con chazo autoroscante, se emplea grua para la instalación.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Miercoles 27 de Noviembre de 2024

Estado del Clima: Lluvias moderadas

Personal en Obra: Maestro General (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se descarpa cunetas en concreto.
→ Se realiza instalación de tapas de cajas de inspección.
→ Se hace cantela en 2 cajas de inspección garantizando correcta evacuación de agua lluvia.
→ Se realiza entrega de Acta Parcial No. 1 a la interventoría.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2024

Estado del clima: Nuboso/ moderado

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se inicia actividade de instalación de rejillas prefabricadas en concreto de 0,40 x 0,50 x 0.06 cm, se ubica rejillas en cunetas laterales de concreto garantizando adecuada instalación,

Residente Obra

Residente Interventoría

Asesor de Obra

Director de Interventoría

echa: Viernes 29 de noviembre de 2024

Estado del Clima: Nuvoso moderado

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se procede con actividades de instalaciones eléctricas.

→ Se inicia excavación para canalización en tubería Conduit Pvc.

Residente de obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Sabado 30 de noviembre de 2024

Estado del Clima: Lluvioso

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas.

→ Se inicia instalación de poste. en concreto de 8m x 510 kg, Incluye excavación, hincado y plomada, Se gesta instalación con grua

→ Se procede con instalación de brazo en tubería galvanizada de 3,50 m de longitud según diseño, se instala reflector en soporte del brazo.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Auxiliar de Obra

Auxiliar Interventoria

Fecha: Domingo 01 de diciembre de 2024: Dia No Laboral

Fecha: Lunes 02 de diciembre de 2024

Estado del clima: Seco

Personal en Obra: Maestro general (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se inicia actividad de instalación de red de acometida, se realiza vertical de red en cable concéntrico 2X8+8

→ Se realiza transición de red aerea a red subterranea en poste instalado

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

NKA

Fecha: Martes 03 de diciembre de 2024.

Estado del clima: Nuboso, producido

Personal en Obra: Maestro general

Oficial (1)

Ayudante (5)

Actividades Realizadas

→ Se inicia construcción de cajas de inspección eléctricas según diseño, se construyen tres cajas con tapa de lámina Alfajor.

→ Se distribuyen circuitos en cajas, se vierte grava en cada fondo de cada caja de inspección.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha. Miercoles 04 de Diciembre de 2024

Estado del clima: Nublado moderado

Personal en obra: Maestro General (1)
Oficial (1)
Ayudante (5)

Actividades Realizadas.

→ Se inicia actividad de instalación de Tomacorriente doble de 120V, se instala una unde en columna eje B y una und en columna eje A, adicionalmente se instala 1 und de tomacorriente de 240 v en columna de eje A.

→ Se procede con instalación de 10 reflectores Led de 150W, marca Sylvania segun descripción de APU.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Jueves 05 de diciembre de 20

Estado del clima: Seco
Personal en obra: Maestro Ger.
Oficial (1)
Ayudante (5)
Actividades Realizadas.

→ Se inicia actividad de demarcación de concha multifuncional. con pintura tráfico secado, se inicia de marcación de actividad de microfútbol y Voleibol

→ Se instalan canchas multifuncionales según diseño en tubería de 3" y 2" y tablero en acrílico.

Residente de Obra

Residente Interv

Director de Obra

Director Interventoría

Fecha: Viernes 06 de diciembre de 2024

Estado del clima: Seco.

Personal en Obra: Jefa de obra general (1)
Oficial (1)
Ayudantes (5)

Actividades Realizadas

→ Se continúa con actividad de demarcación de concha, se demarca la actividad de hormigón, para completar las tres actividades básicas.

→ Se realiza instalación de medidor y bifurcación y caja de circuitos.

→ Se realiza Aseo General a la Obra.
→ Terminación de Obra a satisfacción.

Residente de Obra

Residente Inspección

Director de Obra

Director Inspección

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2023-11
Periodo Salud 2023-12
Fecha Pago Planilla 2023-12-12

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	28404527
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-11
Periodo Salud	2023-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.200.000	0,0400000	$ 88.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.200.000	0,1600000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.200.000	0,0052200	$ 11.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.200.000	0,0400000	$ 88.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2023-12
Periodo Salud 2024-01
Fecha Pago Planilla 2024-01-19

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	28818588
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-12
Periodo Salud	2024-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.200.000	0,0400000	$ 88.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.200.000	0,1600000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.200.000	0,0052200	$ 11.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.200.000	0,0400000	$ 88.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-05
Periodo Salud 2024-06
Fecha Pago Planilla 2024-07-31

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	30202546
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-05
Periodo Salud	2024-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.800.000	0,0400000	$ 112.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.800.000	0,1600000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.800.000	0,0696000	$ 194.900	20

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.800.000	0,0400000	$ 112.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-06
Periodo Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-07-31

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	30559926
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-06
Periodo Salud	2024-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.800.000	0,0400000	$ 112.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de .	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.800.000	0,1600000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.800.000	0,0696000	$ 194.900	20

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.800.000	0,0400000	$ 112.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-07
Periodo Salud 2024-08
Fecha Pago Planilla 2024-08-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	90628823
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-07
Periodo Salud	2024-08
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.800.000	0,0400000	$ 112.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.800.000	0,1600000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.800.000	0,0696000	$ 194.900	20

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.800.000	0,0400000	$ 112.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-11
Periodo Salud 2024-12
Fecha Pago Planilla 2024-12-19

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	31811987
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-11
Periodo Salud	2024-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0052200	$ 10.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-12
Periodo Salud 2025-01
Fecha Pago Planilla 2025-01-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	32216129
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-12
Periodo Salud	2025-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0052200	$ 10.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2025-01
Periodo Salud 2025-02
Fecha Pago Planilla 2025-02-03

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12102729
Nombre	JAIRO ISAAC GAMEZ BARRERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	92342878
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2025-01
Periodo Salud	2025-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0052200	$ 10.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Periodo Pensión 2023-11
Periodo Salud 2023-12
Fecha Pago Planilla 2023-12-12

Tipo Identificación	CC
Numero Identificacion	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	28404079
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pension	2023-11
Periodo Salud	2023-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.000.000	0,1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0,0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2023-12
Período Salud 2024-01
Fecha Pago Planilla 2024-01-19

Tipo Identificación	CC
Numero Identificacion	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	28766644
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pension	2023-12
Periodo Salud	2024-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/12/23								X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.000.000	0,1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0,0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	9.000.000	0,0400000	$ 360.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2024-05
Período Salud 2024-06
Fecha Pago Planilla 2024-07-31

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Numero Planilla	30126247
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-05
Periodo Salud	2024-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.000.000	0,1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0,0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2024-06
Período Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-07-31

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	30559993
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-06
Periodo Salud	2024-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.000.000	0,1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0,0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Periodo Pensión 2024-07
Periodo Salud 2024-08
Fecha Pago Planilla 2024-10-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	30629336
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-07
Periodo Salud	2024-08
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.000.000	0,1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0,0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Periodo Pensión 2024-11
Periodo Salud 2024-12
Fecha Pago Planilla 2024-12-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	31787543
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-11
Periodo Salud	2024-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	14.700.000	0,1250000	$ 1.837.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	14.700.000	0,1600000	$ 2.352.000	$ 0	$ 0	$ 2.352.000	$ 73.500	$ 73.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	14.700.000	0,0696000	$ 1.023.200	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	14.700.000	0,0400000	$ 588.000	14.700.000	0,0200000	$ 294.000	0,0300000	$ 441.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2024-12
Período Salud 2025-01
Fecha Pago Planilla 2025-01-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	32195097
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-12
Periodo Salud	2025-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	14.700.000	0,1250000	$ 1.837.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	14.700.000	0,1600000	$ 2.352.000	$ 0	$ 0	$ 2.352.000	$ 73.500	$ 73.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	14.700.000	0,0696000	$ 1.023.200	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	14.700.000	0,0400000	$ 588.000	14.700.000	0,0200000	$ 294.000	0,0300000	$ 441.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2025-01
Período Salud 2025-02
Fecha Pago Planilla 2025-02-03

Tipo Identificación	CC
Numero Identificacion	7685684
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	32343113
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2025-01
Período Salud	2025-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	14.700.000	0,1250000	$ 1.837.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	14.700.000	0,1600000	$ 2.352.000	$ 0	$ 0	$ 2.352.000	$ 73.500	$ 73.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	14.700.000	0,0696000	$ 1.023.200	891101100

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	14.700.000	0,0400000	$ 588.000	14.700.000	0,0200000	$ 294.000	0,0300000	$ 441.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0
