	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30-sep-24	9	2024	SEMANA No.:	7	DEL	23-sep-24	AL	28-sep-24

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS R&R 2024				CONTRATISTA:	CONINTER JMJ S.A.S			
REP. LEGAL:	HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO				REP. LEGAL:	FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO			
CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024	VALOR INICIAL:	$	2.456.520.808,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-018-2024	VALOR INICIAL:	$	258.197.504,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$	2.456.520.808,00	PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$	258.197.504,00
SUSPENSIÓN 1:	N/A				SUSPENSIÓN 1:	N/A			
REINICIO 1:	N/A				REINICIO 1:	N/A			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	%	$	-
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	-
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0		
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
6,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	$ 26.009,00	800,00	$ 20.807.200,00
6,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 19.948,00	1040,00	$ 20.745.920,00
6,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	$ 13.869,00	300,00	$ 4.160.700,00
6,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	$ 105.049,00	30,00	$ 3.151.470,00
6,05	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	$ 133.227,00	15,00	$ 1.998.405,00
					$ -
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 50.863.695,00
				IMPLEMENTACIÓN PGIO	$ 377.352,00
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 51.241.047,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	24,00%	19,68%	-6,23%
DURANTE EL PERIODO	4,00%	2,09%	
ACUMULADO ACTUAL	28,00%	21,77%	



1641

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD


Ensayo de densidades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con la excavación del box de la calle 50, en el box de la calle 48, se organizará terreno para fundida de aletas.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



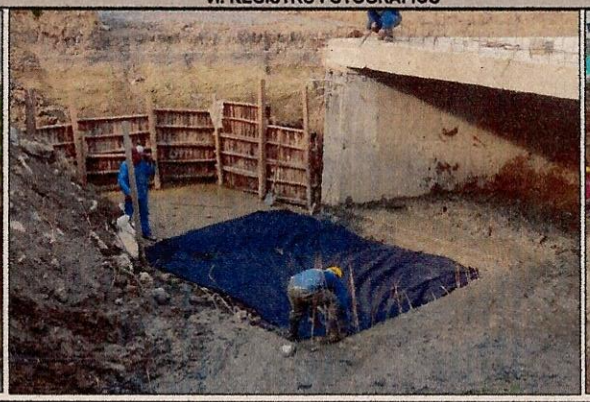



VII. FIRMAS

CONINTER JMJ S.A.S	**RITA ESQUIVEL CARRANZA**
R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO	APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

1642

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2	
						VERSIÓN	1			
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039			
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACIÓN:	7-oct-24	9	2024	SEMANA No.:	8	DEL	30-sep-24	AL	5-oct-24	
CONTRATO DE OBRA						**CONTRATO DE INTERVENTORIA**				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".				
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS R&R 2024				CONTRATISTA:	CONINTER JMJ S.A.S				
REP. LEGAL:	HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO				REP. LEGAL:	FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO				
CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024	VALOR INICIAL:	$	2.456.520.808,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-018-2024	VALOR INICIAL:	$	258.197.504,00	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$	-	
PRORROGA 1:	N/A				PRORROGA 1:	N/A				
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR TOTAL	$	2.456.520.808,00	SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR TOTAL	$	258.197.504,00	
REINICIO 1:	N/A				REINICIO 1:	N/A				
II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA										
ANTICIPO					PORCENTAJE%			$	-	
RESUMEN ACTAS PAGADAS:					TOTAL PAGADO:			$	-	
PARCIAL 1:	$ -				% AVANCE FINANCIERO:			0		
PARCIAL 2:	$ -									
PARCIAL 3:	$ -									
FINAL:	$ -									


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
6,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	$ 26.009,00	259,27	$ 6.743.353,00
6,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 19.948,00	337,05	$ 6.723.493,00
6,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	$ 13.869,00	287,33	$ 3.984.980,00
6,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	$ 105.049,00	40,03	$ 4.205.322,00
6,05	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	$ 133.227,00	31,69	$ 4.221.697,00
6,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	$ 763.549,00	21,05	$ 16.073.088,00
6,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	$ 11.961,00	5000,00	$ 59.805.000,00
NP01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (PIDRA RAJON O SIMILAR)	M3	$ 232.508,00	176,62	$ 41.065.186,00
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 142.822.119,00**
				IMPLEMENTACIÓN PGIO	$ 1.059.580,00
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 143.881.699,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	28,00%	21,77%	-5,38%
DURANTE EL PERIODO	5,00%	5,86%	
ACUMULADO ACTUAL	33,00%	27,62%	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Ensayo de densidades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con la excavación del box de la calle 50, en el box de la calle 48, se organizará terreno para fundida de aletas.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







VII. FIRMAS

CONINTER JMJ S.A.S	**RITA ESQUIVEL CARRANZA**
R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO	APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

1644

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	1	DE		2
						VERSIÓN	1			
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039			

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14-oct-24	9	2024	SEMANA No.:	9	DEL	7-oct-24	AL	12-oct-24

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS R&R 2024			CONTRATISTA:	CONINTER JMJ S.A.S		
REP. LEGAL:	HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO			REP. LEGAL:	FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO		
CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024	VALOR INICIAL:	$ 2.456.520.808,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-018-2024	VALOR INICIAL:	$ 258.197.504,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 2.456.520.808,00	PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 258.197.504,00
SUSPENSIÓN 1:	N/A			SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A			REINICIO 1:	N/A		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		$	-
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	-
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0		
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				


III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	$ 47.386,00	57,75	$ 2.736.542,00
1,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 19.948,00	72,19	$ 1.439.996,00
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	$ 12.392,00	284,90	$ 3.530.481,00
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 21.269,00	370,37	$ 7.877.400,00
6,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	$ 1.796.895,00	92,00	$ 165.314.340,00
6,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	$ 11.961,00	6000,00	$ 71.766.000,00
NP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)	M2	$ 94.784,00	51,44	$ 4.875.689,00
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 257.540.448,00**
				IMPLEMENTACIÓN PGIO	$ 1.910.662,00
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 259.451.110,00**

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	33,00%	27,62%	0,18%
DURANTE EL PERIODO	5,00%	10,56%	
ACUMULADO ACTUAL	38,00%	38,18%	



1645

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD


Ensayo de densidades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con la excavación del box de la calle 50, en el box de la calle 48, se organizará terreno para fundida de aletas.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



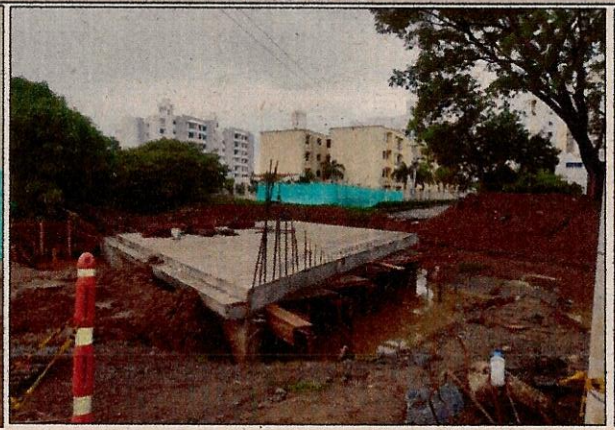



VII. FIRMAS

CONINTER JMJ S.A.S	**RITA ESQUIVEL CARRANZA**
R.L. FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO	APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

1646

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	**LP-SIM-017-2024**	**PLAZO INICIAL**	**4 MESES**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**	**ACTA DE INICIO**	**14 de agosto de 2024**
		FECHA DE TERMINACION	**14 de diciembre de 2024**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS RYR 2024**	**VALOR EJECUTADO**	**$ 938.015.718,00**
INTERVENTORIA:	**CONINTER JMJ S.A.S**	**% EJECUTADO**	**38,18%**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1**		**CANTIDADES ACUMULADAS**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**			
1	**PRELIMINARES**				**$ 66.185.239,00**		**$ 61.007.584,00**		**$ 50.756.082,00**	**76,69%**
1,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	198,24	$ 180.237,00	$ 35.730.183,00	258,43	$ 46.579.544,00	258,43	$ 46.579.544,00	100,00%
1,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	197,40	$ 47.386,00	$ 9.353.996,00	199,50	$ 9.453.507,00	57,75	$ 2.736.542,00	28,95%
1,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	256,62	$ 19.948,00	$ 5.119.056,00	249,38	$ 4.974.533,00	72,19	$ 1.439.996,00	28,95%
1,04	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJO EN CAUCE	UND	4,00	$ 3.995.501,00	$ 15.982.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2	**PAVIMENTO RIGÍDO**				**$ 929.683.824,00**		**$ 418.240.429,00**		**$ 11.407.881,00**	**1,23%**
2,01	EXCAVACION MECÁNICA CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	228,38	$ 24.781,00	$ 5.659.485,00	166,25	$ 4.119.841,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	892,72	$ 12.392,00	$ 11.062.586,00	931,00	$ 11.536.952,00	284,90	$ 3.530.481,00	30,60%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1457,43	$ 21.269,00	$ 30.998.079,00	1210,30	$ 25.741.871,00	370,37	$ 7.877.400,00	30,60%
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3862,80	$ 13.869,00	$ 53.573.173,00	1330,00	$ 18.445.770,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,05	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	476,83	$ 127.008,00	$ 60.561.225,00	476,83	$ 60.561.225,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	776,48	$ 105.049,00	$ 81.568.448,00	399,00	$ 41.914.551,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,07	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	365,40	$ 137.877,00	$ 50.380.256,00	266,00	$ 36.675.282,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,08	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	365,40	$ 1.402.396,00	$ 512.435.498,00	101,92	$ 142.937.726,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,09	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA CLASE F (SOLADO)	M3	2,38	$ 763.549,00	$ 1.817.247,00	1,46	$ 1.111.770,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4785,00	$ 11.961,00	$ 57.233.385,00	4785,00	$ 57.233.385,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,11	BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	522,00	$ 123.361,00	$ 64.394.442,00	145,61	$ 17.962.056,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3	**CUNETAS Y SUMIDEROS**				**$ 174.506.569,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	110,31	$ 42.762,00	$ 4.717.076,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	143,40	$ 19.948,00	$ 2.860.543,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	133,22	$ 13.869,00	$ 1.847.628,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17,98	$ 105.049,00	$ 1.888.781,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,05	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	5,99	$ 98.128,00	$ 587.787,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4.749,22	$ 11.961,00	$ 56.805.420,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	33,98	$ 1.147.382,00	$ 38.988.040,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SUMIDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8"	M	58,37	$ 1.144.617,00	$ 66.811.294,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
4	**ESPACIO PÚBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**				**$ 37.621.088,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**
4,01	S/I TABLETA GUÍA PREFABRICADO TÁCTIL PARA DISCAPACITADO EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INLCUYE ARENA H=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADAS	M	238,00	$ 52.955,00	$ 12.603.290,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5

MUNICIPIO DE MONTERIA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	LP-SIM-017-2024	PLAZO INICIAL	4 MESES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	ACTA DE INICIO	14 de agosto de 2024
		FECHA DE TERMINACION	14 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS RYR 2024	VALOR EJECUTADO	$ 938.015.718,00
INTERVENTORIA:	CONINTER JMJ S.A.S	% EJECUTADO	38,18%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		CANTIDADES ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
4,02	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	190,40	$ 131.396,00	$ 25.017.798,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
5	**SEÑALIZACION**				**$ 64.263.707,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**
5,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	13,00	$ 560.371,00	$ 7.284.823,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
5,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	8,00	$ 819.124,00	$ 6.552.992,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
5,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	225,61	$ 91.287,00	$ 20.595.260,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
5,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	1128,00	$ 8.353,00	$ 9.422.184,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
5,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	48,00	$ 425.176,00	$ 20.408.448,00	0,00	$ 0,00	0,00		0,00%
6	**BOX COULVERT**				**$ 1.166.169.954,00**		**$ 1.859.512.223,00**		**$ 769.273.830,00**	**65,97%**
6,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	641,70	$ 26.009,00	$ 16.689.975,00	2757,45	$ 71.718.517,00	2757,45	$ 71.718.517,00	429,71%
6,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	834,21	$ 19.948,00	$ 16.640.821,00	3584,69	$ 71.507.296,00	3584,69	$ 71.507.296,00	429,71%
6,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	450,27	$ 13.869,00	$ 6.244.795,00	608,13	$ 8.434.155,00	602,53	$ 8.356.489,00	133,82%
6,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	869,27	$ 105.049,00	$ 91.315.944,00	869,27	$ 91.315.944,00	93,43	$ 9.814.938,00	10,75%
6,05	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	2080,00	$ 133.227,00	$ 277.112.160,00	2080,00	$ 277.112.160,00	62,29	$ 8.298.443,00	2,99%
6,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	286,31	$ 1.796.895,00	$ 514.469.007,00	428,21	$ 769.448.408,00	173,73	$ 312.174.568,00	60,68%
6,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	18,87	$ 763.549,00	$ 14.408.170,00	34,82	$ 26.586.776,00	27,54	$ 21.028.521,00	145,95%
6,08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11270,30	$ 11.961,00	$ 134.804.058,00	37875,93	$ 453.033.999,00	22270,30	$ 266.375.058,00	197,60%
6,09	INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS PARA TRAFICO VEHICULAR	M	58,00	$ 1.608.312,00	$ 93.282.096,00	56,18	$ 90.354.968,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,10	TUBERIA DE DRENAJE. DIAMETRO 4"	M	27,70	$ 43.427,00	$ 1.202.928,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP	**NO PREVISTOS**						**$ 99.670.145,00**		**$ 99.670.145,00**	**100,00%**
NP01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (PIDRA RAJON O SIMILAR)	M3		$ 232.508,00		354,71	$ 82.472.536,00	354,71	$ 82.472.536,00	100,00%
NP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)	M2		$ 94.784,00		181,44	$ 17.197.609,00	181,44	$ 17.197.609,00	100,00%
		COSTO TOTAL OBRAS			**$2.438.430.381,00**		**$ 2.438.430.381,00**		**$ 931.107.938,00**	
		IMPLEMENTACIÓN PGIO			**$18.090.427,00**		**$ 18.090.427,00**		**$ 6.907.780,00**	**38,18%**
		COSTO TOTAL OBRAS			**$2.456.520.808,00**		**$ 2.456.520.808,00**		**$ 938.015.718,00**	

16 de 8

ANEXO No.2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

ACTA DE COMITÉ No. 2

CONTRATO No.	LP-SIM-017-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS R&R 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.456.520.808,00) M/CTE, equivalentes a 1.889,6313 SMLMV.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2024
FECHA FINAL	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR	CONINTER JMJ S.A.S
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-018-2024
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	AVANCE DE OBRA- PLAN DE TRABAJO NOVEDAD COLECTOR DE ALCANTARILLADO CALLE 50.

En la ciudad de Montería a los **dieciocho (18)** días del mes **octubre** del año 2024 los suscritos a saber el contratista **CONSORCIO OBRAS R&R 2024**, representado legalmente por HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO, el interventor **CONINTER JMJ S.A.S** representado por FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINTO, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **RITA ESQUIVEL**, se llevó a cabo el presente comité en la oficina de interventoría, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.
2. AVANCE DE OBRA SEMANAL.
3. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Temas claves
   3.1. Intervención por parte del interventor.
   3.2. Intervención por parte del contratista de obra.
   3.3. Intervención por parte del Municipio.
4. COMPROMISOS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS.

COMPROMISO PACTADO	RESPONSABLES	FECHA	ESTADO
Presentar proyecto de balance de obra a la interventoría para su revisión	CONSORCIO OBRAS R&R 2024	18/08/2024	CUMPLIDO
Revisión del proyecto de balance	CONINTER JMJ SAS	18/08/2024	CUMPLIDO
Socialización del resultado de proyección de balance en próximo comité.	Contratista de obra e interventoría	19/08/2024	CUMPLIDO

2. AVANCE DE OBRA SEMANAL.

El contrato de obra se inició el 14 de agosto de 2024.

El director de la interventoría manifiesta que el contrato se encuentra en el mes 3 de ejecución, semana 10, se cuenta con un avance de obra del 39.03%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M2
1,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3
2,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2
2,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3

3. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Temas claves

A la fecha se ejecutan las actividades del balance de obras No. 1 conforme a la programación aprobada.

Ahora bien, debido a que a la fecha se ha ejecutado el 38.18% de las actividades contempladas en el balance de obras No. 1, se hace necesario revisar la pertinencia de una adición para lograr la meta física inicial, tal como se hizo mención en el comité de obras de fecha 19 de agosto de 2024.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.


	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

Adicionalmente, el 1 de octubre de 2024, se realizó visita técnica con la empresa VEOLIA SA, motivada en una presunta interferencia con el colector de la calle 50 con cra 14C. Realizada la visita y revisado en campo con el personal de Veolia, estos advirtieron sobre la presencia de una tubería de alcantarillado embebida en la losa de fondo existentes del Box de la calle 50, tubería que a la fecha de la visita no era visible.

El apoyo a la supervisión manifiesta que en efecto la tubería no es físicamente visible ni siquiera cuando el canal está seco, e indica que la empresa VEOLIA mediante oficio VAM-PYC-IPA-PY/24-10/00374 de fecha 8 de octubre del corriente, contempló las siguientes alternativas de reubicación a realizar por el contratista de obra del contrato LP-SIM-017-2024:

1 "(...) Iniciar con cota fondo en Manhole existente en 12.815 (MH - E1), llegar a manhole proyectado (MH - P1) con cota fondo 12.790, realizar el cruce del canal y empalmar con Manhole proyectado (MH - P2) con cota fondo 12.70, y finalmente, empalmar el colector en el Manhole existente (MH - E2) con cota fondo 12.536."

Alternativa 1.

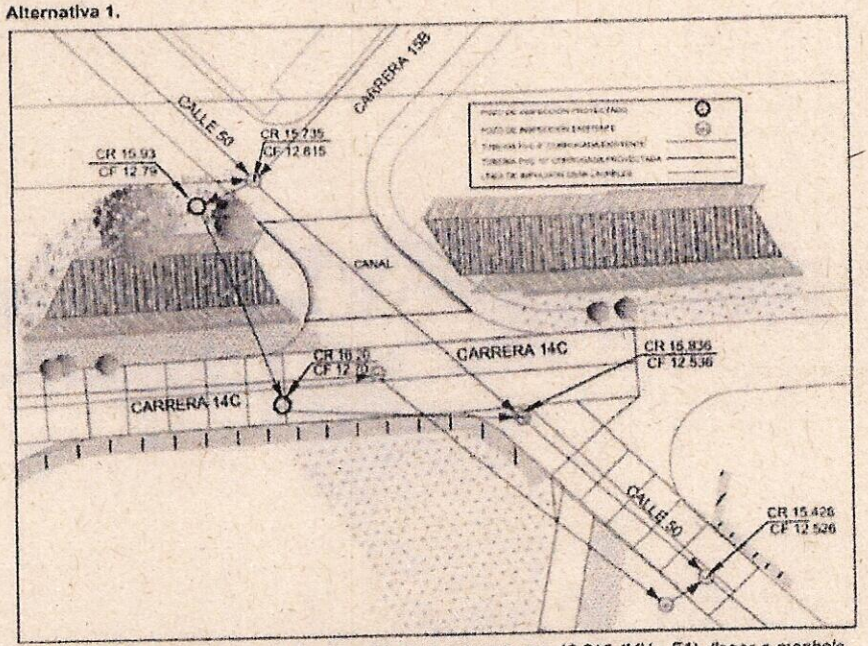


Recomendación: *Iniciar con cota fondo en Manhole existente en 12.815 (MH - E1), llegar a manhole proyectado (MH - P1) con cota fondo 12.790, realizar el cruce del canal y empalmar con Manhole proyectado (MH - P2) con cota fondo 12.70, y finalmente, empalmar el colector en el Manhole existente (MH - E2) con cota fondo 12.536.*

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

"(...) Alternativa 2 Iniciar con cota fondo en Manhole existente en 12.815 (MH - E1), llegar a manhole proyectado (MH - P1) con cota fondo 12.740, realizar el cruce del canal y empalmar con Manhole proyectado (MH - P2) con cota fondo 12.64, y finalmente, empalmar el colector en el Manhole existente (MH - E2) con cota fondo 12.536."

Alternativa 2.

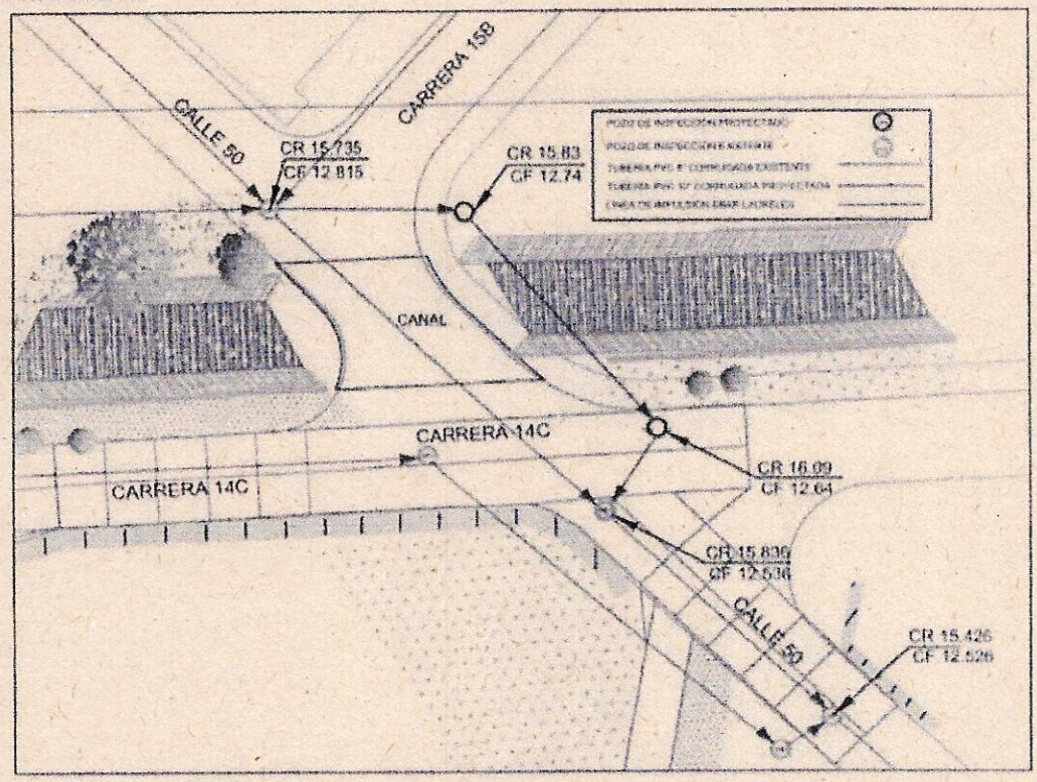

Posteriormente, en fecha 9 de octubre de 2024 mediante oficio C.E SIM-2706-2024 con asunto "*Remisión de información*", la Secretaria de Infraestructura solicitó al contratista de obra y de interventoría revisar lo planteado por VEOLIA:

" (...) Por lo anterior, agradecemos al contratista de obra CONSORCIO OBRAS R&R 2024 su disposición para realizar la mencionada reubicación en el marco de la ejecución del contrato de obra; así mismo, agradecemos a la firma interventora

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

CONINTER JMJ S.A.S., evaluar y revisar las alternativas planteadas por la empresa VEOLIA, y también las actividades no previstas que implican la reubicación, considerar cantidades y plantear un balance de obra que permita visibilizar el alcance del contrato incluyendo la reubicación del colector."

Lo expuesto en el oficio en cita, se solicita de manera especial, teniendo en cuenta que la Entidad debe realizar la consecución de recursos y, por principio de economía en el marco de los distintos procesos, al requerirse recursos adicionales para la culminación de las obras, es preciso hacer dicha gestión por un valor certero que se enmarque dentro de las necesidades que así lo justifiquen y no, gestionarlos de manera parcial, puesto que se corre el riesgo de dejar sin financiación algunos trabajos.

La interventoría manifiesta que ha revisado el tema del colector, considerando que la alternativa 2 planteada por Veolia, es la más recomendable, especialmente por facilidad constructiva, debido a que las excavaciones que se generarían con alternativa No.1, podrían ocasionar el volcamiento de dos árboles aledaños a la zona de excavación, los cuales no cuentan con el permiso de tala y/o aprovechamiento forestal, por no estar prevista esta actividad en el marco de las actividades a ejecutar según el contrato referenciado.

Ante esto, el apoyo a la supervisión manifiesta que ve viable la alternativa 2, teniendo en cuenta que gestionar un permiso en este momento del proyecto, retrasaría las actividades a realizar pues se estaría sujeto al permiso otorgado por un tercero, en este caso la CVS. Adicional a esto, la línea de excavación propuesta para la alternativa 2 está libre de obstáculos.

En este sentido, desde la secretaría de infraestructura se considera viable ajustarse a la alternativa No. 2 propuesta por VEOLIA y, sobre el particular, realizar el análisis de costos de dicha actividad para ser tenido en cuenta, en el pre-balance que se encuentra en proyección, de acuerdo a lo sustentado en el proyecto balance No. 1 que justificó el balance obras No. 1.

Por último, se indica que, desde la Secretaría de Infraestructura estamos a la espera del pronunciamiento de la Secretaría de Tránsito con relación a la posibilidad de incluir el mejoramiento de la vía que intercomunica los dos box culvert en construcción, ubicada en la carrera 14 C entre calles 48 y 50. De esta evaluación, se estudiará la posibilidad de ser incluida en el prebalnace No. 2.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-006	01	23/01/2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO PACTADO	RESPONSABLES	FECHA
Presentación de análisis de costos de la alternativa 2 de VEOLIA	Contratista de obra	23/10/2024
Revisión del análisis del costo	Contratista de interventoría	24/10/2024

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO OBRAS R&R 2024
CONTRATISTA
OBRA
Rep. Legal. Haylen Karina Velásquez Mercado

CONINTER JMJ S.A.S
CONTRATISTA
INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA
Rep. Legal. Francisco Troncoso Pino

RITA ESQUIVEL CARRANZA
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Andrés Fabian Villalba – Director de Interventoría

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ANEXO No.3. SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO No.3.1. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901856308	5	CONSORCIO OBRAS R&R 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	2024101518412792411 3	9475444600	E	2024/10/03	2024/10/16	BANCO AV VILLAS	13	$10,749,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	34982426	BAENA LOPEZ DOMINGA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
2	CC	1003592039	BERTEL GUZMAN RAFAEL DARIO	Z5-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	72261552	BLANCO OCHOA EDUAR ANTONIO	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF16	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
4	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	78702575	DIAZ LUGO FIDIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	10767532	DONADO DIAZ YOBANIS ALFONSO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	10999232	ESPITIA JIMENEZ ADRIEL ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	15620718	ESPITIA MENDOZA YORLIS	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF16	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
9	CC	15681878	FAJARDO AVILA EDER ANTONIO	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF16	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
10	CC	10934961	HERNANDEZ HERNANDEZ ROGER DE JESUS	230301	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	CCF16	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
11	CC	78752424	HERNANDEZ PADILLA WILSON ENRIQUE	231001	19	$823,334	$131,800	EPS002	19	$823,334	$33,000	CCF16	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
12	CC	1067837827	IGLESIA VELASQUEZ LUIS MARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1067931307	MESTRA ANGULO YONAIR	230201	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF16	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
14	CC	1064311897	MILANES ZUÑIGA AURA VERONICA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
15	CC	78759910	MONTERROZA DIAZ ENRIS DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	15045856	MONTESINO LOBO ANTENOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	6887972	MUÑOZ WILCHEZ JOSE LUIS		0	$0	$0	ESSC07	28	$1,213,334	$48,600	CCF16	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
18	CC	1067912081	NAVARRO PEREZ LUIS MIGUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	6888375	OLASCUAGA OLASCUAGA LIBARDO IGNACIO		0	$0	$0	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
20	CC	6888375	OLASCUAGA OLASCUAGA LIBARDO IGNACIO		0	$0	$0	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
21	CC	1067871750	PASTRANA PACHECO LEONEL ANTONIO	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF16	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
22	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	10769866	PICO SANCHEZ CARLOS ALBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF16	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
26	CC	1065376198	SUAREZ CARRASCAL AYLIN KARINA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
27	CC	1067871207	TORRES ANAYA ANDRES ELIECER	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
28	CC	1069465547	URDA MERCADO JOSE GREGORIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
29	CC	1033368982	VELASQUEZ MERCADO HAYLEN KARINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

2024/10/23 11:25 AM

1655

aportes en línea

Resumen General de Pago

30	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,300,000		$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(29)**					$33,763,336		$5,402,400			$35,063,338	$1,403,000			$35,063,338	$1,403,000			$35,063,338	$2,441,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$5,402,400	$50,400	$0	$5,452,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$963,800	$9,000	$0	$972,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,125,900	$10,500	$0	$1,136,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,362,800	$22,000	$0	$2,384,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$949,900	$8,900	$0	$958,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,441,500	$22,700	$0	$2,464,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$2,441,500	$22,700	$0	$2,464,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,403,000	$13,100	$0	$1,416,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	$1,403,000	$13,100	$0	$1,416,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$1,403,000	$13,500	$0	$1,416,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$1,000	$0	$105,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$500	$0	$52,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$88,000	$900	$0	$88,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$260,200	$2,500	$0	$262,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$228,900	$2,200	$0	$231,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$221,900	$2,100	$0	$224,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$284,000	$2,700	$0	$286,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$164,000	$1,600	$0	$165,600
TOTAL				29	$10,649,900	$99,700	$0	$10,749,600

2024/10/23 11:25 AM

1660

ANEXO No.3.2. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901723533	5	CONINTER JMJ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIA PUENTES MONTEVERDE	Calle 50 con cra 14	MONTERIA-CORDOBA	7895321	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	74142438	9474142438	E	2024/10/08	2024/10/03	BANCO AV VILLAS	0	$5,809,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	25775918	ARANGO DIAZ KAREN MARGARITA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	78751886	CARABALLO ORTEGA JOSE ALBERTO	25-14	30	$3,614,000	$578,300	EPS037	30	$3,614,000	$144,600	CCF16	30	$3,614,000	$144,600	14-11	30	$3,614,000	$251,600	30	$0	$0
3	CC	1233345807	DIAZ GONZALEZ LIANY MELISSA	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS002	30	$1,820,000	$72,800	CCF16	30	$1,820,000	$72,800	14-11	30	$1,820,000	$126,700	30	$0	$0
4	CC	1067929312	DIAZ LOBO LUIS CARLOS	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS002	30	$1,820,000	$72,800	CCF16	30	$1,820,000	$72,800	14-11	30	$1,820,000	$126,700	30	$0	$0
5	CC	34997241	GARCIA GUERRA NEYLA PAULINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1064985372	HERNANDEZ RAMOS NATHALIA PATRICIA	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
7	CC	1069473116	LEAÑO AMEZQUITA CINDY PAOLA	230301	30	$1,445,600	$231,300	EPS010	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
8	CC	1063274318	LOPEZ GUERRERO JONATHAN ALEXANDER	230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS005	30	$1,430,000	$57,200	CCF16	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	$99,600	30	$0	$0
9	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
10	CC	10772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	25-14	30	$1,807,000	$289,200	EPS002	30	$1,807,000	$72,300	CCF16	30	$1,807,000	$72,300	14-11	30	$1,807,000	$125,800	30	$0	$0
11	CC	10965468	ZOLA GONZALEZ ESTEBAN DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$18,761,600	$3,002,000			$18,761,600	$750,600			$18,761,600	$750,600			$18,761,600	$1,306,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,002,000	$0	$0	$3,002,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,075,500	$0	$0	$1,075,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,484,500	$0	$0	$1,484,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,000	$0	$0	$234,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,306,200	$0	$0	$1,306,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,306,200	$0	$0	$1,306,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$750,600	$0	$0	$750,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$750,600	$0	$0	$750,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$750,600	$0	$0	$750,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,900	$0	$0	$57,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$144,600	$0	$0	$144,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$490,900	$0	$0	$490,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,200	$0	$0	$57,200
TOTAL				11	$5,809,400	$0	$0	$5,809,400

2024/10/24 09:09 AM

165 f

ANEXO No.4. REGISTRO FOTOGRAFICO

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	✓ CONINTER JMJ SAS ✓ NIT. 901.723.533-5

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
LOCALIZACIÓN:	BARRIO MONTE VERDE, MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SIM-017-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS R&R 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	CMA-SIM-018-2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONINTER JMJ S.A.S
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024

FOTOGRAFÍA (1)



FOTO No.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN EL CANAL DE LA CALLE 50 CON CRA 14C

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5

FOTOGRAFÍA (2)



FOTO No. 2. DE EXCAVACIÓN EN EL CANAL DE LA CALLE 50 CON CRA 14C MOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN EL CANAL DE LA CALLE 50 CON CRA 14C

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.733.533-5

FOTOGRAFÍA (3)

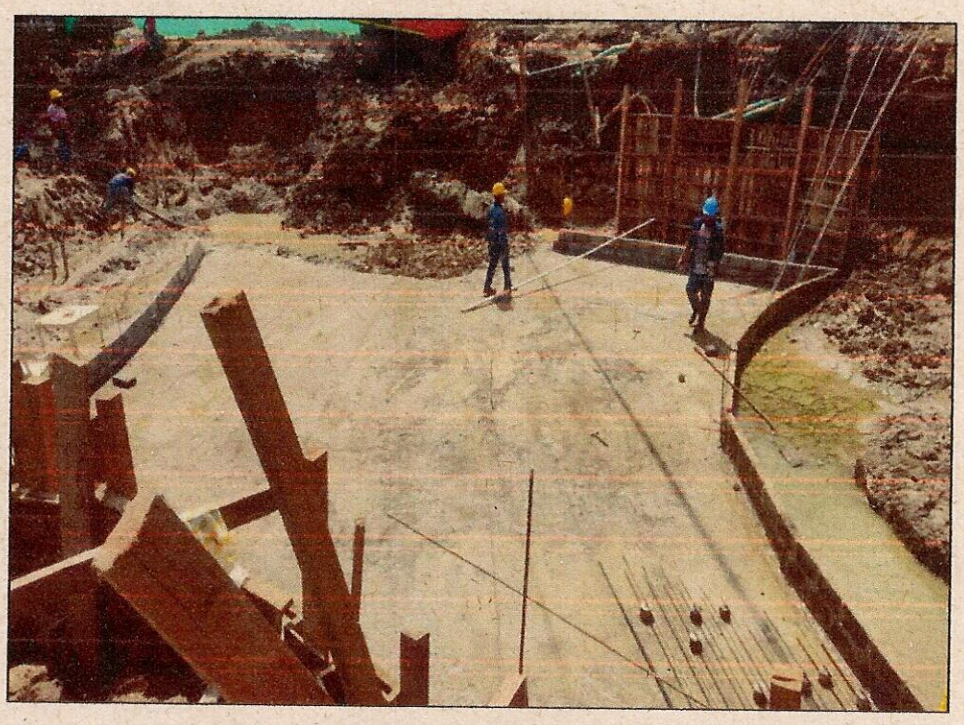


FOTO No. 3. CONCRETO PARA SOLADO BOX COULVERT DE LA CALLE 50

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.733.533-5

FOTOGRAFÍA (4)



FOTO No.4. ACERO DE REFUERZO BOX COULVERT DE LA CALLE 50

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.553-5

FOTOGRAFÍA (5)



FOTO No. 5 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS BOX COULVERT DE LA CALLE 48

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5

FOTOGRAFÍA (6)



Foto No. 6. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CALLE 47.

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5

FOTOGRAFÍA (7)



FOTO No.7 EXCAVACIÓN PARA VIA CALLE 48.

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.733.533-5

FOTOGRAFÍA (8)



FOTO No.8 EXCAVACIÓN PARA VIA CALLE 48.

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.733.533-5

FOTOGRAFÍA (9)



FOTO No.9 BOX COULVERT CALLE 48.

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5

FOTOGRAFÍA (10)



FOTO No.10 ACERO DE REFUERZO PARA BOX COULVERT.

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5

FOTOGRAFÍA (11)



FOTO No.11 RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES.

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONINTER JMJ SAS NIT. 901.733.533-5

FOTOGRAFÍA (12)

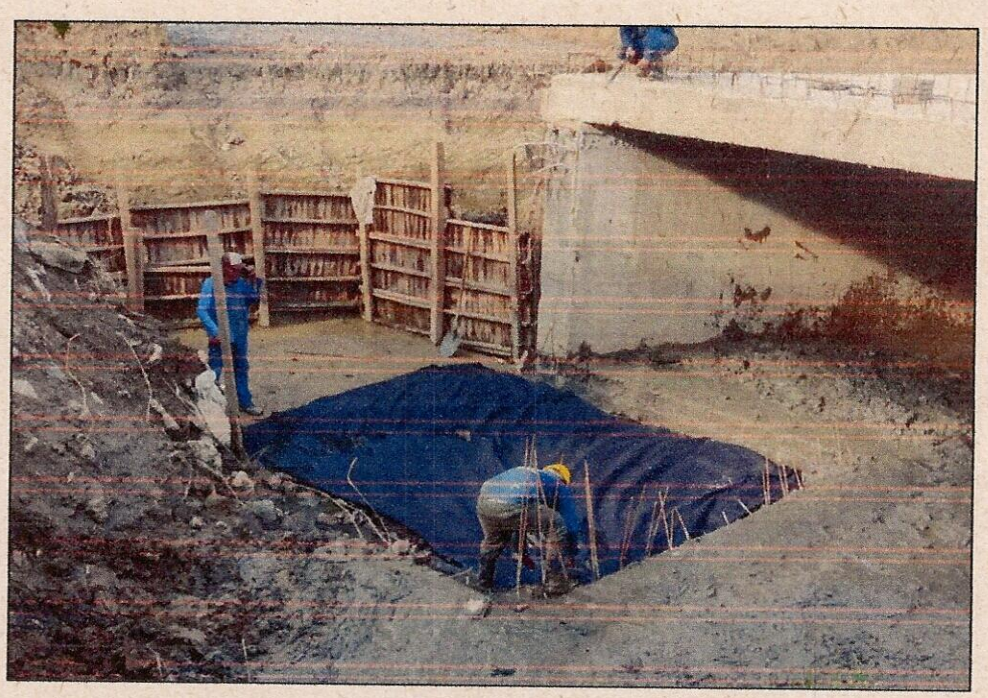


FOTO No.12 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES BOX DE LA CALLE 48.

ANEXO No.5. ENSAYOS DE LABORATORIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.
I.N.V. E-410-18

Código:	FL-03
Versión:	01
Fecha:	02/10/2018


Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	22 de Septiembre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M4	Muro # 3	14/09/2024	21/09/2024	7	102	203	0,0081	168,8	4000	20,8	3019,8	75,5	E
M4			28/09/2024	14									
M4			12/10/2024	28									

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth [illegible] Avila Gonzalez
Área Técnica.

DELTA LABORATORIO
Ing. Jesús Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

1670

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.
I.N.V. E-410-18

Código:	FL-03
Versión:	01
Fecha:	02/10/2018


Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	22 de Septiembre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M3	Muro # 2	13/09/2024	20/09/2024	7	102	203	0,0081	234,7	4000	28,9	4198,7	105,0	E
M3			27/09/2024	14									
M3			11/10/2024	28									

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth Paola Avila Gonzalez
Área Tecnica.

DELTA LABORATORIO
Ing. Jesus Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.


DELTA LABORATORIO CALIDAD Y SERVICIO	DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO. I.N.V. E-410-13	Código: FL-03 Versión: 01 Fecha: 02/10/2018

Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	22 de Septiembre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M2	Muro # 1	12/09/2024	19/09/2024	7	102	203	0,0081	224,8	4000	27,7	4021,6	100,5	E
M2			26/09/2024	14									
M2			10/10/2024	28									

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Ing. Julieth Paola Ávila González
Área Técnica.

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Ing. Jesús Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

2672


DELTA LABORATORIO CALIDAD Y SERVICIO	DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO. I.N.V. E-410-13	Código: FL-03 Versión: 01 Fecha: 02/10/2018

Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	22 de Septiembre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M1	Losa Inferior	05/09/2024	12/09/2024	7	102	203	0,0081	230,4	4000	28,4	4121,8	103,0	E
M1			19/09/2024	14	102	203	0,0081	240,3	4000	29,6	4298,9	107,5	E
M1			03/10/2024	28									

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth [illegible] Avila Gonzáles
Área Técnica.

DELTA LABORATORIO
Ing. Jesús Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

1673

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.
I.N.V. E-410-13


Código:	FL-03
Versión:	01
Fecha:	02/10/2018

Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	01 de Octubre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M1	Losa Inferior	05/09/2024	12/09/2024	7	102	203	0,0081	230,4	4000	28,4	4121,8	103,0	E
M1			19/09/2024	14	102	203	0,0081	240,3	4000	29,6	4298,9	107,5	E
M1			03/10/2024	28									

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth Paola Avila González
Área Técnica

DELTA LABORATORIO
Ing. Jesús Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

764

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.
I.N.V. E-410-13

Código:	FL-03
Versión:	01
Fecha:	02/10/2018


Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Montería Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Montería Córdoba
Fecha de informe:	01 de Octubre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M2	Muro # 1	12/09/2024	19/09/2024	7	102	203	0,0081	224,8	4000	27,7	4021,6	100,5	E
M2			26/09/2024	14	102	203	0,0081	238,4	4000	29,4	4264,9	106,6	E
M2			10/10/2024	28									

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth Paola Avila González
Área Técnica.

DELTA LABORATORIO
Ing. Jesus Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

1635

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.
I.N.V. E-410-13


Código: FL-03
Versión: 01
Fecha: 02/10/2018

Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	01 de Octubre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M3	Muro # 2	13/09/2024	20/09/2024	7	102	203	0,0081	234,7	4000	28,9	4198,7	105,0	E
M3			27/09/2024	14	102	203	0,0081	241,6	4000	29,8	4322,2	108,1	E
M3			11/10/2024	28									

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth [illegible] Avila González
Área Técnica.

DELTA LABORATORIO
Ing. Jose Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

1670

DELTA LABORATORIO CALIDAD Y SERVICIO	DELTA LABORATORIO DE SUELOS S.A.S. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO. I.N.V. E-410-13	Código: FL-03 Versión: 01 Fecha: 02/10/2018


Proyecto:	Construcción de Obras Hidraulicas y Complementarias en la Urbanización Monteverde en el Municipio de Monteria Córdoba
Entidad Solicitante:	Consorcio Obras R&R 2024
Ubicación:	Urbanización Monte verde Monteria Córdoba
Fecha de informe:	01 de Octubre del 2024

Cilindro	Ubicación	Fecha de toma	Fecha de falla	Edad	Diametro (mm)	Altura (mm)	Area (m2)	Carga KN	Resistencia de Diseño Psi	Resistencia obtenida		Resistencia Obtenida %	Forma de falla
										MPa	Psi		
M4	Muro # 3	14/09/2024	21/09/2024	7	102	203	0,0081	168,8	4000	20,8	3019,8	75,5	E
M4			28/09/2024	14	102	203	0,0081	234,5	4000	28,9	4195,1	104,9	E
M4			12/10/2024	28									

DELTA LABORATORIO
CALIDAD Y SERVICIO

Observaciones
Las muestras fueron suministradas por el solicitante.

FORMA DE FALLA



DELTA LABORATORIO
Calidad y servicio
Aux: Victor Gallego Montalvo
Área Laboratorio.

DELTA LABORATORIO
Ing. Julieth [illegible] Avila Gonzáles
Área Técnica

DELTA LABORATORIO
Ing. Jesus Alejandro Otero Vitola
Área Control de Calidad.

769

ANEXO No.6. BITACORA DE OBRA
