ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	115 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	115 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.837.558.807
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA / LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

FOSCA (FOSCA-QINCHITA-SANAME)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	2-ago-25	115	0	-25
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	20-ago-25	133	7	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176			no iniciado	24	no iniciado

Plazo del proyecto: 266 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	12,43%	4,23%	-8,21%
Durante el periodo	2,56%	0,10%	-2,47%
Acumulado Actual	14,99%	4,32%	-10,67%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

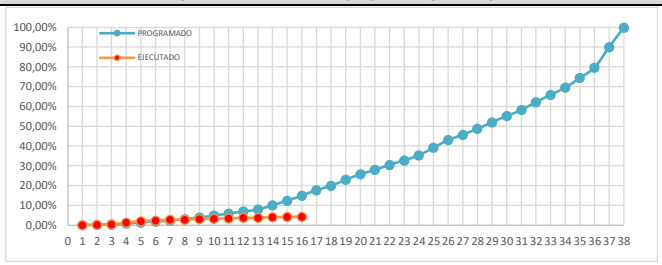

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	115,00	152	-28,50

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4.394.189.227	$ 1.493.647.729	34%
Durante el periodo	$ 906.147.843	$ 33.661.131	4%
Acumulado Actual	$ 5.300.337.070	$ 1.527.308.860	29%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	3.773.028.210

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-10,67%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

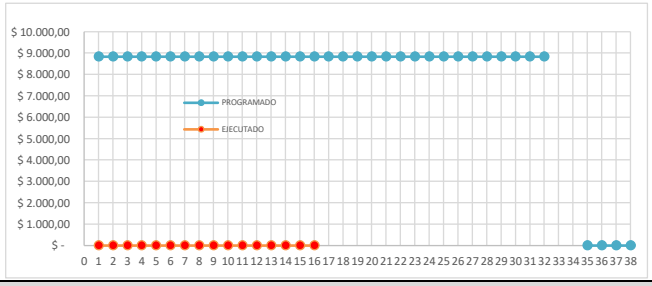

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El lunes 28 de julio mediante comunicado 766-132-ICCU se remite al ICCU el informe semanal No.14 del contrato de interventoría.

El miércoles 30 de julio mediante comunicado 766-135-ICCU se remite al ICCU el ALCANCE COMUNICADO 766-134 - REMISIÓN DE INFORMES DE LABORATORIOS – PROVINCIA DEL GUAVIO – CONTRATO DE OBRA N° 138 DE 2025 LOTE 1 en el cual se aclara que se encuentran revisados por parte de interventoría y actualmente están en proceso de ajuste de correcciones y complementaciones por parte del CONSORCIO SOFAN C-031; además, que dentro de los resultados de los ensayos de laboratorio de suelos realizados en los tres (3) municipios, que se ejecutaron conforme al alcance del proyecto, se tuvo en cuenta los diseños de pavimento y análisis de estabilización de suelos, bajo el enfoque del uso de aditivos químicos no tradicionales en combinación con cemento al 3%.

El jueves 31 de julio mediante comunicado 766-137-ICCU se da RESPUESTA A OFICIO DE SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-128, REPROGRAMACION AJUSTADA AL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE y como resultado de dicha revisión, se emitieron las siguientes observaciones: 1. Inconsistencias en las fechas propuestas, 2. Persistencia de desfases previos, 3. Ausencia de actividades actualmente en ejecución y 4. Errores ortográficos en documentos.

El viernes 01 de agosto mediante comunicado 766-136-ICCU se da RESPUESTA A OFICIO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-127 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CONTRATO en el cual manifestamos que el contenido técnico presentado resulta coherente en cuanto a las fuentes de información consultadas y los eventos reportados. Sin embargo, con el fin de contar con una trazabilidad completa para efectos contractuales y administrativos, se requirió complementar el documento con los siguientes aspectos:
1. Cuantificación del impacto en horas y días efectivos no laborados
Se solicitó consolidar un cuadro resumen donde se especifique:
• Los días específicos en los que no se ejecutaron actividades de campo por cada tramo o municipio afectado.
• Las horas efectivas en que no se pudieron ejecutar actividades esos días.
• La causa o tipo de evento asociado (precipitación intensa, cierre vial, alerta roja, sismo, etc.).
• Una sumatoria total por tramo o zona.
Esto se debe evaluar, frente al cronograma de actividades.
2. Definición de acciones frente a la suspensión de actividades
En su comunicación se expresa lo siguiente:
"...se reitera la necesidad de mantener la suspensión temporal de las actividades en los tramos afectados, hasta tanto se verifiquen condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad…"
Sin embargo, no se especifica de manera clara:
• Cuál es la suspensión de actividades, si el proyecto sigue en ejecución y tampoco desde qué fecha exacta se consideran suspendidas las actividades "manera temporal" y durante las lluvias en cada uno de los tramos afectados.
• Qué se propone por parte del Consorcio Sofán frente a la recuperación de estos días: ¿se dispondrá de mayores recursos en tiempo seco, se aumentarán las horas de trabajo, existe como plan de contingencia? O definitivamente ¿se solicitará modificación de plazo? ¿prórroga? ¿reprogramación?

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Sibaté 1,5 km de la provincia de Soacha y en el tramo de Medina 2,5 km de la provincia de Medina.

- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Fosca 5,0 km, en el tramo de Chipaque 3,1 km y en el tramo de Quetame 1,9 km en la provincia de oriente.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el componente ambiental con las actividades correspondientes del 28 de Julio al 03 de agosto del 2025.

1. Se realiza recorrido de verificación de actividades de instalación de tubería para alcantarillado existente evidenciando que no haya contaminación del agua, con los materiales utilizados estas actividades se llevan a cabo los días 29 al 31 de agosto.

2. Revisión por parte de la interventoría la subsanación del informe N° 3 del contratista en lo cual fue aprobado.

3. Orden y aseo en campamento, baterías sanitarias y oficina de contratista el 28 de julio del 2025.

4. El componente ambiental participa en reuniones internas del contratista Consorcio Sofan el día 29 de julio y externas con supervisión e interventoría 30 de julio.

5.Debido a las lluvias se realizan acciones de adecuación con maquinaria para mejorar el acceso al campamento.

6.Seguimiento al PAGA el día 3 de julio la entidad solicito hacer ajustes ya que se encontraba muy general y se debe hacer 4 PAGAS por cada provincia, en lo cual el contratista informa que se debe oficiar para hacer los pagas. El día 14 de julio se hace mesa de trabajo con el contratista socializando la solicitud de la entidad en lo cual el contratista solicita mesa de trabajo con la supervisión.

Por otra parte, en respuesta a la negativa del contratista y la falta de gestión, en lo cual la interventoría hace una invitación al comité el día 23 de julio a la supervisión.
El ingeniero Andrés Tolosa para dar más claridad y unificar conceptos en cuanto a la estructuración y la metodología en la que establece la guía invias del 2022.
De acuerdo con las observaciones del componente ambiental del contratista en comité de obra el día 23 de julio solicitaron mesa de trabajo con la supervisión para realizar mesa de trabajo y estructurar los 4 PAGAS para seguir los lineamientos, el cual se llevó a cabo el día 28 de julio a las 10.30am dando claridad y se realiza acta de soporte para llevar seguimiento a la aplicación del PAGA, Ese mismo día de programa mesa de trabajo para el día 4 de agosto del 2025.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 28 de julio, el Contratista remitió mediante correo electrónico la respuesta proyectada para atender la solicitud realizada por la Secretaría de Planeación del municipio de Ubalá, con los ajustes notificados por la Interventoría el 25 de julio. En la misma fecha, de manera presencial el área técnica de la Interventoría indicó al Contratista unas nuevas observaciones al documento, las cuales fueron atendidas y remitidas nuevamente por el Consorcio SOFAN C-031 a través de correo electrónico.

El 29 de julio, la interventoría remitió la respuesta para la Secretaría de Planeación del Municipio de Ubalá revisada, aprobada y firmada por parte del área técnica para remisión al peticionario.

El 29 de julio, el Contratista confirmó asistencia a la reunión extraordinaria No. 2, citada por el Secretaría de Planeación el 24 de julio. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría informó a la Secretaría de Planeación la confirmación de asistencia a la reunión solicitada.

El 30 de julio, el componente social del Contratista, Interventoría y la supervisión de la entidad asistió al comité de seguimiento semanal No 12.

El 30 de julio, el Contratista remitió la presentación para la reunión extraordinaria No. 2, para revisión de la Interventoría.

El 30 de julio, el Contratista remitió a través de correo electrónico la respuesta respecto a la ubicación de las alcantarillas en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul al secretario de Planeación del municipio de Ubalá.

El 31 de julio, desde la Interventoría se remitió la presentación de la reunión extraordinaria No. 2 con algunos ajustes y Visto Bueno.

El 31 de julio, se llevó a cabo la reunión extraordinaria No. 2 en el colegio rural de la vereda de San Luis con la participación de la comunidad del tramo de Casa Rosada – Laguna Azul, el alcalde y el secretario de Planeación de Ubalá, con el fin de socializar y aclarar inquietudes acerca del proyecto y la ejecución de las actividades hidráulicas en el tramo mencionado.

El 31 de julio, durante la reunión extraordinaria No. 2, se realizó la entrega del folleto No. 1 de inicio de actividades hidráulicas y PMT.

El 1 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 1 con las firmas de los profesionales del Consorcio SOFAN C-031 para que la Interventoría de inicio al proceso de recolección de firmas del Consorcio Intervención AC y de la Entidad.

El 1 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 1 con los soportes (planilla de asistencia – registro fotográfico) para revisión de la Interventoría.

El 1 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico las cartas personalizadas proyectadas para socializar el inicio de actividades hidráulicas en los tramos del municipio de Junín y Gama.

El 1 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico el Informe Mensual No. 3 en versión 2 del componente social con el ajuste de las observaciones realizadas.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Actividades de salud y seguridad en trabajo desarrolladas la semana 28 Julio al 03 de agosto del 2025.

1.El componente SST participa en reuniones internas el día 05 de agosto con el Consorcio Sofan donde hablan de los pendientes y la respuesta de estos para el día del comité de obra no tener pendientes de informes. Reuniones externas la cual se llevó a cabo el día 06 de agosto con la supervisión ICCU y con la interventoría Consorcio intervención AC cuya reunión es comité de obra donde se lleva un control riguroso de los avances de obra en términos técnicos y los componentes social, ambiental, salud y seguridad en el trabajo.

2.Actualización de base de datos control diario y semanal del personal tanto del Consorcio Sofan como de los subcontratistas de lunes a domingo del día 28 de julio al 03 de agosto.

3.Supervisión de salud y seguridad en el trabajo en campo en las fechas del 28 de julio al 03 de agosto. Se ha venido trabajando en la prevención en campo las actividades armado de tubería, armado y fundida de alcantarillado, supervisión de personal, charlas de seguridad con temas (cuidado de manos, prevención de riesgos locativos, utilizar adecuadamente los EPP), entrega de elementos de protección personal por reposición.

4.Inspeccion de equipos de emergencia consiste en revisar los extintores que no estén vencidos y la parte física del mismo no este deteriorada, en relación con el botiquín revisar cada uno de los elementos que lo contienen una vez revisado la respuesta es satisfactoria, se continúa utilizando en el vehículo de placa SXX-226.

5.Gestión administrativa anexo en soporte del informe mensual # 4 correspondiente a julio 2025 Consorcio Sofan se entregara el día 5 de agosto del 2025 a la interventoría

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para estas fases I y II de caracterización contrató los servicios de un laboratorio de suelos certificado, para la toma de muestras y realización de ensayos in situ, además, cuenta con equipos de geoposicionamiento y topografía para dichas actividades.

5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -10,67%, ya que el avance programado era del 14,99% y solo se ha ejecutado el 4,32%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina se han iniciado con retraso las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, lo que dificultó la logística para el ingreso del personal a la zona.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se recibió el Modificatorio No. 1 al Contrato No. ICCU-219 de 2025, mediante el cual se formalizó la sustitución de la fuente de financiación inicialmente asignada al contrato. Esta modificación, necesaria para viabilizar el giro del anticipo pactado, consistió en el cambio del recurso "Ordinario Capital" por la fuente Crédito Interno Excedente", por un valor de $300.000.000 COP. Con esta actualización presupuestal se espera que el proceso de desembolso avance sin más contratiempos. A la fecha se está tramitando la actualización las garantías reconociendo este modificatorio.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El anticipo contractual correspondiente al contrato de obra 138 de 2025 aún no ha sido desembolsado y esta condición está generando impactos operativos reales, en especial considerando que las actividades previstas en la Fase III requieren recursos financieros que no han sido aún transferidos a las respectivas fiducias. Y el anticipo del contrato de interventoría contrato 219 de 2025, tampoco ha sido girado, situación que, afecta la operación regular del contrato y la disponibilidad de mayores recursos para la ejecución eficiente de las actividades previstas.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia y reprogramación	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Ajuste de CDPs y RPs correspondiente a la sustitución de la fuente de financiación del recurso asignado para el anticipo	ICCU	Lo antes posible
Pago de anticipos de los contratos de obra e interventoría	ICCU	Lo antes posible

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en los municipios de Fosca, Chipaque y Quetame en la provincia de oriente, en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha y en el municipio de Medina en la provincia de Medina. Se inicia instalación de tubería de 36" y la construcción de la alcantarilla en cruce de vía en el k0+407 aprox. donde se presenta aposamiento de agua en la vía en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá en la provincia del Guavio.
*Se continua a la espera de la entrega total de resultados de laboratorios de la fase II del contrato, que permita evaluar lo manifestado por el contratista de obra, sobre la dificultad de amparo de 2 años en la garantía de estabilidad del proyecto, ya que los productos estabilizantes según mencionan los mismos proveedores no garantizan dicho periodo esto podría llegar a requerir una modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.
*Se deberá ir evaluando la terminación del contrato dentro del plazo contractual, ya que hoy no se cuenta con resultados completos de las provincias y se vienen desarrollando nuevas pruebas con dosificaciones diferentes, esto determinaría una posible modificación del alcance de los recursos existentes que podrían llegar a ser menores de los planificados en la etapa precontractual.
* Se recomendó al contratista implementar mayores recursos asociados a un plan de contingencia que aumenten los rendimientos del levantamiento de información topográfica y de toma de información de caracterización por apiques, así mismo que se manejen diferentes dosificaciones desde el inicio, que permitan evaluar al tiempo las nuevas tecnologías.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)







PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)








PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)

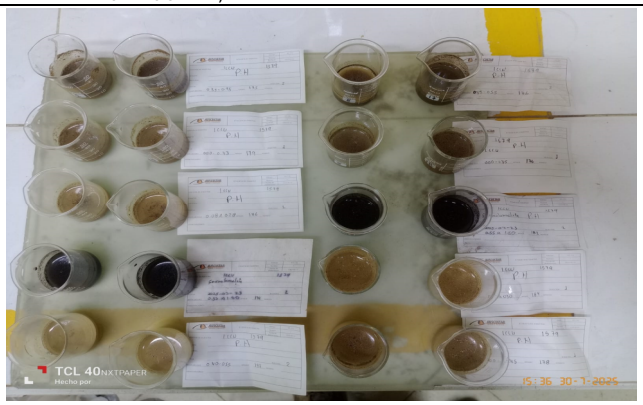




FOSCA (FOSCA-QINCHITA-SANAME)







QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)

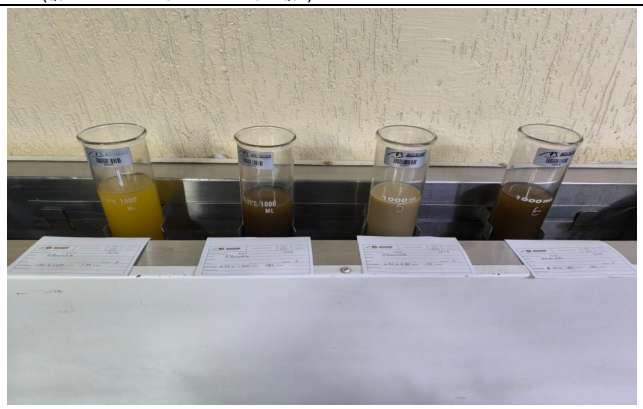



ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**

UBALA (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ALCANTARILLA EN K0+407 APROX. (DONDE HAY ACUMILACIÓN DE AGUA EN LA VÍA)






EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ALCANTARILLA EN K0+407 APROX. (DONDE HAY ACUMILACIÓN DE AGUA EN LA VÍA)





COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 12 - 30 DE JULIO

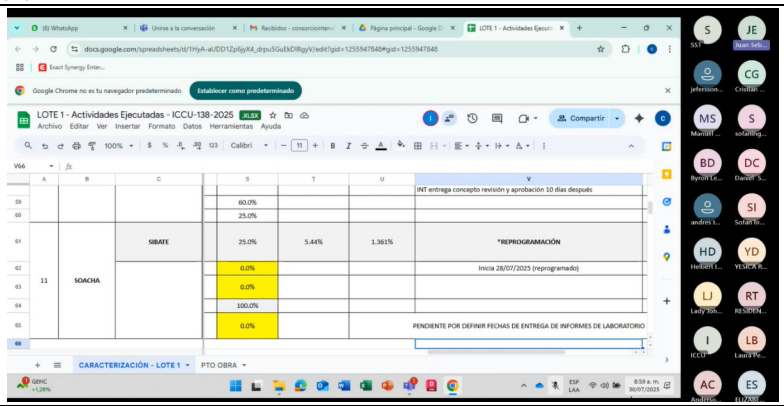

REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 2. MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA DEL GUAVIO - 31 DE JULIO



ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 2 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**26-jul-25**	AL	**1-ago-25**

DISTRIBUCIÓN DEL FOLLETO No. 1 - INICIO DE ACTIVIDADES HIDRÁULICAS Y PMT - MUNICIPIO DE UBALÁ (PROVINCIA DEL GUAVIO) - 31 DE JULIO



Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.08.05 20:01:33 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
