ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 9 de agosto de 2025	SEMANA No.	17	DEL	2-ago-25	AL	8-ago-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	122 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	122 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:
PROVINCIA DE SOACHA:
SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
PROVINCIA DE MEDINA:
MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
PROVINCIA DEL GUAVIO:
GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:
PROVINCIA DE ORIENTE:
CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
FOSCA (FOSCA-QINCHITA-SANAME)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
PROVINCIA DE SOACHA:
SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
PROVINCIA DE MEDINA:
MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)
- APIQUES Y ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA SUBRASANTE

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	9-ago-25	122	0	-32
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	20-ago-25	133	7	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176			no iniciado	24	no iniciado

Plazo del proyecto: 266 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	14,99%	4,32%	-10,67%
Durante el periodo	2,75%	0,18%	-2,57%
Acumulado Actual	17,75%	4,50%	-13,24%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

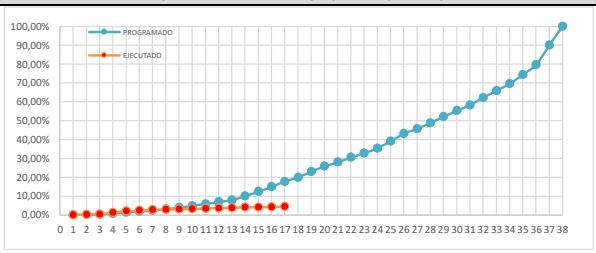

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	122,00	145	-35,36

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 5.300.337.070	$ 1.527.308.860	29%
Durante el periodo	$ 972.953.608	$ 64.246.380	7%
Acumulado Actual	$ 6.273.290.678	$ 1.591.555.240	25%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 4.681.735.438

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 9 de agosto de 2025	SEMANA No.	17	DEL	2-ago-25	AL	8-ago-25


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-13,24%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

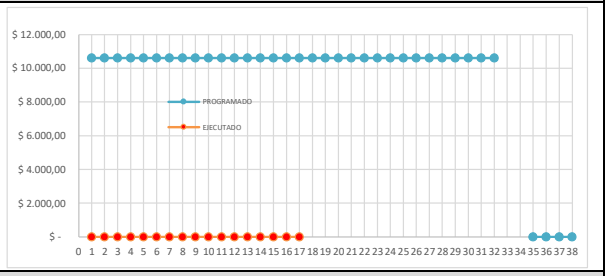

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El lunes 04 de agosto mediante comunicado 766-138-ICCU se da RESPUESTA COMUNICADO FOR-CO-03-ICCU031-130 RESPUESTA A OFICIO 766-130 – OBSERVACIONES A PRODUCTOS TOPOGRÁFICOS Y CAPAS GEOGRÁFICAS – TRAMO UBALÁ y se da por recibido este producto el cual complementa los insumos topográficos previamente entregados del tramo Casa Rosada – Laguna Azul, en el municipio de Ubalá, provincia del Guavio, y se deja constancia de que no se cuenta con la totalidad del registro fotográfico de los puentes, porque de los nueve (9) puentes identificados, solo se han recibido fotografías de cinco (5), por lo que restan cuatro (4) imágenes por entregar.

El lunes 04 de agosto mediante comunicado 766-139-ICCU se da RESPUESTA A OFICIO DE SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-132, SOLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN – GIRO 1 DEL ANTICIPO en el cual se solicita la complementación de la documentación presentada a la interventoría y se aclara que, los dineros provenientes del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato, especificados en el plan de inversión del anticipo, entre otros a la compra, arriendo o mantenimiento de equipos, compra de insumos y materiales, traslado de equipo, pago de trabajadores vinculados al proyecto, es decir, la inversión de dichos recursos debe estar limitada al plan detallado de inversión debidamente aprobado por la interventoría y el supervisor.

El martes 05 de agosto se remite al ICCU el informe semanal No.15 del contrato de interventoría.

El miércoles 6 de agosto se llevó a cabo una reunión entre los especialistas de interventoría de los cuatro lotes y los profesionales del ICCU, con el objetivo de revisar las propuestas existentes para la estabilización de la subrasante. No obstante, no se presentaron propuestas sólidas, dado que los resultados de los ensayos no estaban arrojando los valores esperados.

Durante la reunión se concluyó que el artículo 237 del INVÍAS no resulta aplicable a los suelos identificados en los sectores asignados para los cuatro lotes. En consecuencia, la ingeniera Daniela Nieto, junto con el ingeniero Jair, solicitaron reprogramar una reunión presencial para el próximo 13 de agosto, con el fin de presentar propuestas más acertadas que no afecten de manera significativa el alcance de las obras ni el presupuesto asignado.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Sibaté 4,91 km de la provincia de Soacha, en el tramo de Medina 1,1 km de la provincia de Medina y en el tramo de Gama 0,4 km de la provincia del Guavio.

- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Fosca 3,3 km, en el tramo de Chipaque 1,8 km y en el tramo de Quetame 1,0 km en la provincia de oriente.

- Apiques; 10 un. en el tramo de Medina 2,84 km de la provincia de Medina.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el componente ambiental con las actividades correspondientes del 02 al 09 de agosto del 2025.

1. El día 06 de agosto en recorrido de obra ambiental se inspecciona las actividades de obras de drenaje.

2. Está en revisión por parte de la interventoría el informe N° 4 Julio del contratista Consorcio Sofan.

3. Orden y aseo en campamento, baterías sanitarias y oficina de contratista el 07 al 08 de agosto del 2025.

4. El componente ambiental participa en reuniones internas del contratista Consorcio Sofan el día 05 de agosto y externas con supervisión e interventoría 06 de agosto.

5. El día 8 de agosto se realiza acopio de materiales y señalización.

6. Señalización móvil de PMT para las obras de drenaje del 02 al 09 de agosto.

7. Se realiza seguimiento al PAGA, el día 3 de julio la entidad solicito hacer ajustes, indicando que, se debe entregar 4 PAGA, es decir, uno por cada provincia. El día 14 de julio se hace mesa de trabajo con asistencia del contratista e interventoría informando lo solicitado por la entidad.

El día 5 de agosto, en mesa de trabajo se dejaron observaciones que deben realizar para la correcta elaboración del PAGA, se programa mesa de trabajo para el día 11 de agosto haciendo seguimiento al contratista Consorcio Sofan al cumplimiento de la guía ambiental con el acompañamiento de la supervisión.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 9 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**17**	DEL	**2-ago-25**	AL	**8-ago-25**

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 4 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico acuso enterado de la respuesta enviada al secretario de Planeación respecto a la ubicación de las alcantarillas a intervenir/construir en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul, en el municipio de Ubalá.

El 4 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico acuso recibido del acta de la reunión preliminar, por lo que se dará inicio al proceso de la recolección de firmas del Consorcio Intervención AC y la Entidad.

El 4 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 1 observada para atención del Contratista.

El 4 de agosto, desde la Interventoría se remitieron mediante correo electrónico las cartas personalizadas proyectadas para socializar el inicio de actividades hidráulicas en los tramos de los municipios de Junín y Gama, con observaciones para que estas sean atendidas por el Contratista.

El 5 de agosto, desde la Interventoría se remitió el acta de la reunión preliminar No. 1 – provincia del Guavio a la subdirectora de Caminos Vecinales y a la supervisora Social del ICCU, para su revisión y firma.

El 5 de agosto, el Contratista remitió el informe mensual No. 4 Versión 1 para revisión de la Interventoría, mediante correo electrónico.

El 5 de agosto, el Contratista remitió el oficio FOR-CO-03-135 Respuesta al Oficio No. 766-140 – Observaciones Informe Mensual Social No. 3 Versión 2.

El 6 de agosto, se compartió mediante correo electrónico la lista de chequeo con los indicadores propuestos desde la Interventoría, para revisión del Contratista con el fin de llegar a acuerdos al respecto.

El 6 de agosto el componente social del Contratista, Interventoría y de la Entidad asistió al Comité de seguimiento semanal No. 13.

El 8 de agosto, se remitió al Contratista el acta de la mesa de trabajo No. 17 para su verificación y firma.

El 8 de agosto, el Contratista remitió los volantes y las cartas de invitación para las reuniones preliminares de la provincia de Medina, en los municipios Medina y Paratebueno, para revisión de la Interventoría.

El 8 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta proyectada para dar aceptación y confirmación de asistencia por parte de la Interventoría y Contratista al recorrido programado entre la Alcaldía de Ubalá y la Entidad, para el 13 de agosto.

El 8 de agosto, se llevó acabo la mesa de trabajo No. 19 del componente social, la cual contó con el acompañamiento de la dirección técnica del Contratista y la Interventoría.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

ACTIVIDADES SST DE LA SEMANA 03 AL 09 AGOSTO 2025

1.Se participa en comités internos y externos:

- Interno el día 5/08/2025 con la participación de todos los componentes del consorcio SOFAN.
- Externa el día 6/08/2025 entre el ICCU, la Interventoría y el Consorcio SOFAN con la participación de todos los componentes con el fin de validar los avances y cumplimiento d

compromisos y/o entregables.

2.Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades en campo sector San Luis y Casa Rosada.

- Se valida uso de elementos de protección personal
- Verificación de delimitación y señalización
- Orden y aseo en área de trabajo
- Se realizan pausas activas
- Se brinda charla de 5 minutos

FachaTemas a tratar
4/08/2025Implementación PMT.
5/08/2025Diligenciamiento preoperacional para herramienta.
6/08/2025Riesgo Mecánico (atrapamiento)
8/08/2025Línea de fuego – Reglas de seguridad de la maniobra de izaje de carga

3.Se realiza seguimiento a aseo de US (Unidad Sanitaria) en bodega y en oficina.

4.Gestión y apoyo administrativo a diario.

- Actualización de base de datos control diario del personal tanto del Consorcio Sofan como de los Subcontratistas.
- Envío de informe a la interventoría del mes N° 4 de Julio 2025.
- Elaboración de cronograma de charlas mes de agosto y ATS semanales 03 al 09 de agosto.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para estas fases I y II de caracterización contrató los servicios de un laboratorio de suelos certificado, para la toma de muestras y realización de ensayos in situ, además, cuenta con equipos de geoposicionamiento y topografía para dichas actividades.

5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -13,24%, ya que el avance programado era del 17,75% y solo se ha ejecutado el 4,50%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina se han iniciado con retraso las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, lo que dificultó la logística para el ingreso del personal a la zona.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se recibió el Modificatorio No. 1 al Contrato No. ICCU-219 de 2025, mediante el cual se formalizó la sustitución de la fuente de financiación inicialmente asignada al contrato. Esta modificación, necesaria para viabilizar el giro del anticipo pactado, consistió en el cambio del recurso "Ordinario Capital" por la fuente Crédito Interno Excedente", por un valor de $300.000.000 COP. Con esta actualización presupuestal se espera que el proceso de desembolso avance sin más contratiempos. A la fecha se está tramitando la actualización las garantías reconociendo este modificatorio.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El anticipo contractual correspondiente al contrato de obra 138 de 2025 aún no ha sido desembolsado y esta condición está generando impactos operativos reales, en especial considerando que las actividades previstas en la Fase III requieren recursos financieros que no han sido aún transferidos a las respectivas fiducias. Y el anticipo del contrato de interventoría contrato 219 de 2025, tampoco ha sido girado, situación que, afecta la operación regular del contrato y la disponibilidad de mayores recursos para la ejecución eficiente de las actividades previstas.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 9 de agosto de 2025	SEMANA No.	17	DEL	2-ago-25	AL	8-ago-25

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 9 de agosto de 2025	SEMANA No.	17	DEL	2-ago-25	AL	8-ago-25

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia y reprogramación	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Ajuste de CDPs y RPs correspondiente a la sustitución de la fuente de financiación del recurso asignado para el anticipo	ICCU	Lo antes posible
Pago de anticipos de los contratos de obra e interventoría	ICCU	Lo antes posible

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en los municipios de Fosca, Chipaque y Quetame en la provincia de oriente, en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha y en el municipio de Medina en la provincia de Medina. Se continúa la construcción de la alcantarilla en cruce de vía en el k0+407 aprox. donde se presenta aposamiento de agua en la vía y se inicia la limpieza de tuberías y alcantarillas en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá en la provincia del Guavio.
*Se continua a la espera de la entrega total de resultados de laboratorios de la fase II del contrato, que permita evaluar lo manifestado por el contratista de obra, sobre la dificultad de amparo de 2 años en la garantía de estabilidad del proyecto, ya que los productos estabilizantes según mencionan los mismos proveedores no garantizan dicho periodo esto podría llegar a requerir una modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.
*Se deberá ir evaluando la terminación del contrato dentro del plazo contractual, ya que hoy no se cuenta con resultados completos de las provincias y se vienen desarrollando nuevas pruebas con dosificaciones diferentes, esto determinaría una posible modificación del alcance de los recursos existentes que podrían llegar a ser menores de los planificados en la etapa precontractual.
* Se recomendó al contratista implementar mayores recursos asociados a un plan de contingencia que aumenten los rendimientos del levantamiento de información topográfica y de toma de información de caracterización por apiques, así mismo que se manejen diferentes dosificaciones desde el inicio, que permitan evaluar al tiempo las nuevas tecnologías.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)





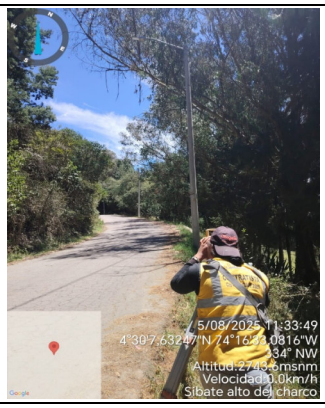

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)







PROVINCIA DEL GUAVIO:

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)








ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 9 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**17**	DEL	**2-ago-25**	AL	**8-ago-25**







PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 9 de agosto de 2025	SEMANA No.	17	DEL	2-ago-25	AL	8-ago-25

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)






FOSCA (FOSCA-QINCHITA-SANAME)





QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)



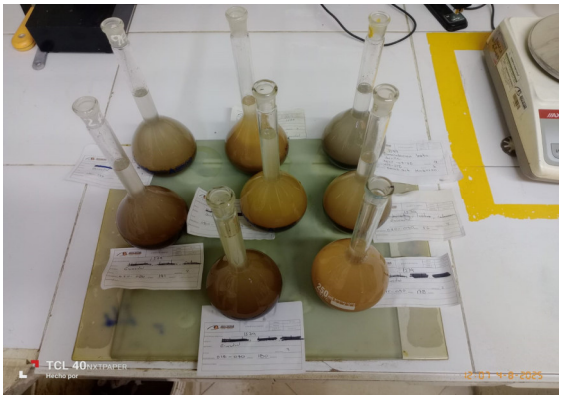

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)





PROVINCIA DE MEDINA:

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 9 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**17**	DEL	**2-ago-25**	AL	**8-ago-25**

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)







ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 9 de agosto de 2025	SEMANA No.	17	DEL	2-ago-25	AL	8-ago-25

UBALA (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN ALCANTARILLA DE DESCOLE EN K5+900 APROX. (DONDE HUBO PÉRDIDA DE LA BANCA DE LA VÍA)




LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EXISTENTE #2 EN PR6+500 APROX.



CONTROL TOPOGRÁFICO DE NIVELES, AMARRE DE REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA EN ALCANTARILLA No.2 K0+407 APROX.



MESA DE TRABAJO No. 19 - COMPONENTE SOCIAL

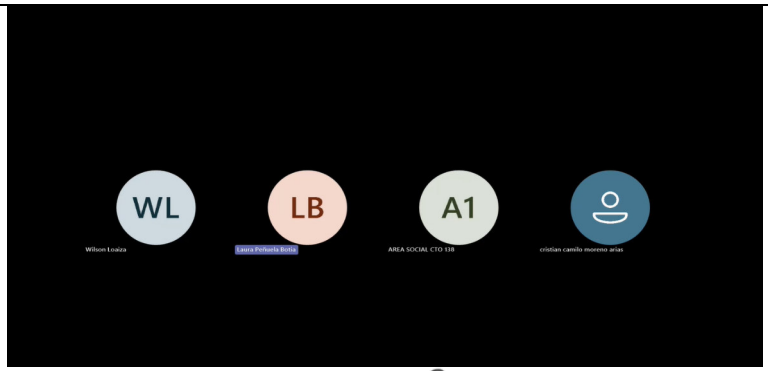

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
