piv ingeniería
PROYECTOS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

PIV INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA-013-2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 4"

CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA, RISARALDA Y QUINDÍO

INFORME MENSUAL No. 2
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
Versión 2

BOGOTÁ D.C., 02 DE JULIO DE 2025

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle	Elaboró
1	16/06/2025	Documento original	Maryeth Vanegas / Ing. Ambiental Estefanía Osorio / Tecnólogo SST
2	02/07/2025	Atención de observaciones	Maryeth Vanegas / Ing. Ambiental Estefanía Osorio / Tecnólogo SST

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




Responsable de elaboración			PIV Ingeniería S.A.S		PIV Ingeniería S.A.S	
Título Documento			INFORME MENSUAL No. 2		INFORME MENSUAL No. 2	
Documento No.			001OPV-INT-ZO4-IFM-GAM-002-InformeMensualASSTN2-V001		001OPV-INT-ZO4-IFM-GAM-002-InformeMensualASSTN2-V002	
REVISIÓN Y APROBACIÓN	**Versión**		**1**		**2**	
	Elaboró	**Firma**				
		Nombre	Estefanía Osorio	Maryeth Vanegas	Estefanía Osorio	Maryeth Vanegas
		Cargo	Tecnólogo SST	Ing. Ambiental	Tecnólogo SST	Ing. Ambiental
		Fecha	16/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
	Revisó y Aprobó	**Firma**				
		Nombre	Javier Bastidas		Javier Bastidas	
		Cargo	Director		Director	
		Fecha	16/06/2025		02/07/2025	

TABLA DE CONTENIDO

1. Información general de los contratos 6
1.1. Datos generales del contrato de interventoría 6
1.2. Datos generales del contrato de obra 7
1.3. Personal aprobado componente ambiental y SST 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
3. actividades generales 9
4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 10
4.1. Novedades del Informe de Gestión SST y Ambiental 10
4.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 10
4.2.1 COPASST 10
4.2.2 Comité de convivencia laboral 10
4.2.3 Gestión de talento humano 11
4.2.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales 11
4.2.5 Incapacidades 12
4.2.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes 12
4.2.7 Indicadores SST 12
4.2.8 Inducciones y notificaciones de riesgo 13
4.2.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal 13
4.2.10 Seguimiento plan de trabajo 13
4.2.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones 14
4.3. Gestión ambiental 15
4.3.1 Plan de Manejo Ambiental 15
4.3.2 Comités y mesas de trabajo 15
4.3.3 Recorridos y visitas de inspección 16
4.3.4 Estado de permisos, tramites y licencias ambientales. 16
4.3.5 Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio 16
4.3.6 Generación, manejo y disposición de residuos (RCD-RESPEL-ORDINARIOS Y RECICLABLES) 16
4.3.7 Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y alcantarillado. 17
4.3.8 Manejo de la vegetación y paisajismo. 17
4.3.9 Unidades sanitarias 17
4.3.10 Seguimiento cronograma de actividades. 17
5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE LA INTERVENTORÍA 18
5.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 18
5.1.1 COPASST 18
5.1.2 Comité de convivencia laboral 18
5.1.3 Gestión de talento humano 19
5.1.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales 20
5.1.5 Incapacidades 20
5.1.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes. 20

5.1.7 Indicadores SST. 21
5.1.8 Inducciones y notificaciones de riesgo 21
5.1.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal 22
5.1.10 Seguimiento plan de trabajo 22
5.1.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones 22
6. Seguimiento ambiental y SST de interventoría al contratista de obra 23
6.1 Estado de productos, informes semanales, informes mensuales 23
6.2 Relación de reuniones y mesas de trabajo desarrolladas en el periodo 24
6.3 Relación de correspondencia enviada y recibida entre las partes 24
6.4 Información sobre atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas. 31
6.5 Información relacionada con incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios, etc. 31
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32
8 Anexos 32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información contrato de Interventoría 6
Tabla 2 Información Contrato de obra 7
Tabla 3 Personal ambiental y SST - Interventoría 7
Tabla 4 Personal ambiental y SST – Contratista de obra 8
Tabla 5. Municipios Por Intervenir 9
Tabla 6 Reporte de personal – Contratista de obra 11
Tabla 7 Registro de accidentes laborales – Contratista de obra 12
Tabla 8 Registro de incapacidades – Contratista de obra 12
Tabla 9 Reporte de personal -Interventoría 19
Tabla 10 Registro de accidentes - Interventoría 20
Tabla 11 Registro de incapacidades – Interventoría 20
Tabla 12 Productos ambientales y SST- Interventoría 22
Tabla 13 Productos ambientales y SST – Contratista de obra 23
Tabla 14 Relación de reuniones y mesas de trabajo 24
Tabla 15. Correspondencia enviada 24
Tabla 16. Correspondencia recibida 27

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1. Datos generales del contrato de interventoría

Tabla 1 Información contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PA 013 DE 2025	
Datos del Contratante y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT. 800.159.998-0
Nombre del Contratista y documento de identificación:	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S PIV INGENIERIA S.A.S NIT: 860.510.291-5 Representante Legal Principal NELSON FERNANDO HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ C.C. No 19.453.780 de Bogotá D.C. Representante Legal Suplente TERESA DEL PILAR GUZMAN LOZANO C.C. No 65.586.376
Objeto del contrato:	¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 4¨
Valor del contrato:	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($1.245.506.647)** incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia Definitivos.
Plazo del contrato:	Diez meses y medio (10.5 meses)
Fecha de suscripción:	Veintisiete (27) de diciembre de 2024.
Fecha de inicio:	Ocho (8) de Abril del 2025.
Fecha fin:	Veintidós (22) de febrero de 2026.
Supervisor del contrato:	William Andrés Pedraza Bedoya
Póliza de cumplimiento:	CBO-100024767 Anexo 2 Vigencia hasta el 22/12/2026 Expedida por Compañía Mundial De Seguros S. A
Póliza R.C.E. No.:	CBO-100006344 Anexo 3 Vigencia hasta el 22/02/2026 Expedida por Compañía Mundial De Seguros S.A

1.2. Datos generales del contrato de obra

Tabla 2 Información Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No. PA-026-2025	
Datos del Contratante y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.- NIT. 800.159.998-0.
Nombre del Contratista y documento de identificación:	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA NIT.: 901888448-5. Representante Legal: JULIO ANDRES RODRIGUEZ VILLEGAS C.C. No. 79.722.972 de Bogotá
Objeto del contrato:	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, zona 4.
Valor del contrato:	El valor del contrato será por un valor de hasta SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000), incluidos costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y en su propuesta económica presentada en la plataforma SECOP II. El valor del contrato será ejecutado a monto agotable.
Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión:	532 del 23 de mayo de 2024.
Plazo del contrato:	Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
Póliza de cumplimiento:	Póliza de cumplimiento No. 18-45-101179525. Vigencia hasta 07/12/2026 Expedidas por Seguros del Estado S.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 18-40-101076801 Vigencia hasta 07/02/2026 Expedidas por Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de garantías:	Catorce (14) de marzo de 2025.
Fecha de inicio:	Ocho (8) de Abril del 2025.
Fecha terminación:	Siete (7) de febrero de 2026.

1.3. Personal aprobado componente ambiental y SST

Tabla 3 Personal ambiental y SST - Interventoría

PERSONAL AMB Y SST APROBADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRE	**CARGO**	**CONCEPTO ENTIDAD**
Maryeth Vanegas	Ingeniera ambiental	Radicado No. 20253000019741 del 05 de marzo 2025
Estefanía Osorio	Tecnólogo SST	

Tabla 4 Personal ambiental y SST – Contratista de obra

PERSONAL AMB Y SST APROBADO - CONTRATO DE OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**CONCEPTO INTERVENTORÍA**
Vanesa Yuliana García	Tecnólogo SST	PIV-012-MAR-2025 del 19 de marzo del 2025
Miguel Ángel Briceño	Tecnólogo SST	PIV-063-Z4-142 del 05 de junio del 2025
Daniel Eduardo Ariza	Ingeniero ambiental	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El objetivo principal de la implementación del Programa de Obras por la Vida, tiene como propósito implementar intervenciones en la infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a lo largo del territorio nacional para la zona 4 abarcando tanto la red vial urbana como rural, en la jurisdicción de los municipios, departamentos o del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, a lo largo del territorio nacional.

En el periodo del presente informe se han llevado a cabo las actividades de supervisión, verificación, control y evaluación estipulados en los términos de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, los estándares ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos. Este informe detalla el avance de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra y de Interventoría, el seguimiento a los productos entregables, el cumplimiento de los cronogramas establecidos, así como las observaciones, recomendaciones e incidencias detectadas durante el desarrollo del periodo evaluado. Adicionalmente, se presenta el estado actual del componente ambiental y SST.

Esta interventoría se basa en el principio de la *buena fe*, consagrada en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia para la revisión y aprobación de los productos del contratista de obra.

La distribución de las intervenciones del programa de Obras por la Vida se llevará a cabo en las cinco (5) zonas señaladas del territorio nacional, sin embargo, el Contrato de obra PA-026-2025 y el contrato de interventoría PA-013-2025, ejecutaran actividades en la zona cuatro (4) ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima, y Quindío.

Figura 1. Zonas de intervención

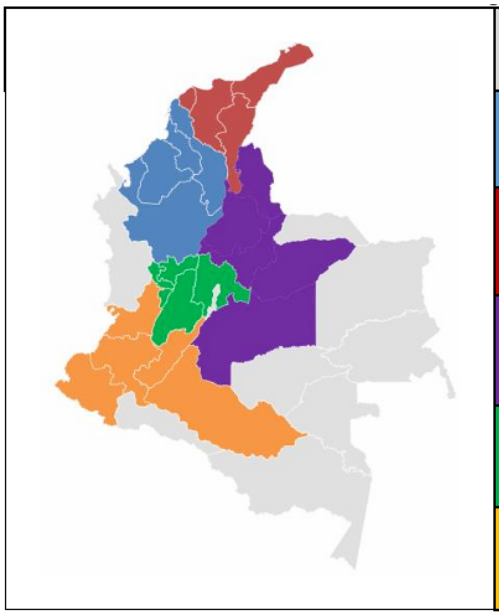

Zona de intervención	Departamentos en que se encuentran los tramos viales
1	Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
2	Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.
3	Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Meta.
4	Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío.
5	Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá.

Fuente: Estudios Previos – Contrato de Obra PA-026-2025.

Para efectos de la ejecución del contrato principal, los departamentos donde se encuentran ubicados los puntos a atender se han agrupado en cuatro (4) zonas, como se muestran a continuación:

Tabla 5. Municipios Por Intervenir

Departamento	Municipio de Intervención
Caldas	Manizales
	Supía
Cundinamarca	Caparrapí
	Girardot
	Soacha
	Mosquera
	Yacopí
Quindío	Armenia
	Circasia
Tolima	Espinal
	Honda

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

3. ACTIVIDADES GENERALES

El presente informe mensual de interventoría corresponde al seguimiento para las actividades del componente ambiental y SST, por lo tanto, se describen las actividades realizadas por el Contratista de obra Consorcio Señalizadores de Colombia y el Contrato de Interventoría PIV Ingeniería SAS, durante el periodo del informe mensual No. 2 correspondiente al periodo del 08 de mayo al 07 de junio del 2025, en cumplimiento con las obligaciones contractuales adquiridas para los contratos en mención.

Durante el periodo presentado, se iniciaron las visitas de inspección de campo en conjunto, Contratista de obra, Interventoría y ANSV, por lo tanto, se reportarán las visitas realizadas, adicionalmente se relacionarán las actividades administrativas correspondientes a:

- Procesos de inducción del personal reportado como ingreso
- Comités de seguimiento quincenal del componente ambiental y SST.
- Mesas de trabajo.
- Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (Contratista de obra).
- Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (Contratista de obra – e Interventoría)
- Gestión de documentos de ingreso del personal de plantilla mínima.
- Ejecución de informes semanales.

4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1. Novedades del Informe de Gestión SST y Ambiental

El día 15 de junio de 2025 por medio del comunicado CE-CSC-ADM-0161, se recibió el informe de Gestión SST y Ambiental numero 2 correspondiente al periodo del 08 de mayo al 07 junio de 2025, fue revisado por esta interventoría y OBSERVADO, por lo anterior NO FUE APROBADO, toda vez que no cuenta con el LLENO DE REQUISITOS solicitados en la lista de chequeo suministrado por la ANSV y que son objeto de revisión de esta interventoría, en consecuencia en el ANEXO 1.11 se adjunta la certificación de trazabilidad correspondiente a las labores de seguimiento, verificación y control.

4.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

4.2.1 COPASST

Dando cumplimiento a la normatividad que establece la resolución 2013 de 1986., decreto 1072 de 2015, y resolución 0312 de 2019. El Contratista de obra, reporta que para el periodo del informe, se realiza la selección de representantes por parte del empleador y la convocatoria de representantes por parte de los trabajadores, proceso para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, culminado y conformado el día 20 de mayo de 2025, aunque el Contratista adjunta en el informe mensual No 2 los soportes de la conformación, la Interventoría genera la observación ya que no se evidencia acta de reunión del periodo reportado.

4.2.2 Comité de convivencia laboral

Para el periodo del informe, el Contratista de obra, adjunta los soportes de conformación del Comité de Convivencia Laboral el cual está conformado desde el 20 de mayo de 2025 e indica que a partir de la fecha serán realizadas de manera trimestral las correspondientes reuniones, sin embargo, la interventoría genera observación ya que no se evidencia acta de reunión correspondiente para el informe mensual No 2.

4.2.3 Gestión de talento humano

Durante el periodo, el Contratista de obra reporta el ingreso de (6) profesionales (10) antiguos, (1) retiros, (0) ingreso / retiro, (0) inactivos.

Tabla 6 Reporte de personal – Contratista de obra

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO SSTA-11	ESTADO	APROBACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN DOC. DE INGRESO
1	Daniel Eduardo Ariza Rodríguez	Ingeniero Ambiental	08/05/2025	Ingreso	PIV-063-Z4-142 del 05/06/2025	PIV-063-Z4-147 del 07/06/2025
2	Miguel Ángel Briceño Velosa	Tecnólogo SST	08/05/2025	Ingreso	PIV-063-Z4-142 del 05/06/2025	PIV-063-Z4-147 del 07/06/2025
3	Belky Daniela Alejandra Téllez Ibáñez	Profesional Social	08/05/2025	Ingreso	PIV-063-Z4-171 del 12/06/2025	PIV-063-Z4-171 del 12/06/2025
4	Madeleine Porras Meza	Tecnólogo SIG	08/05/2025	Ingreso	PIV-063-Z4-224 del 27/06/2025	Pte aprobación
5	Mónica Lorena Aponte Marín	Dibujante	08/05/2025	Ingreso	PIV-063-Z4-224 del 27/06/2025	Pte aprobación
6	Anyi Katherine Neira Castañeda	Profesional Social	01/06/2025	Ingreso	PIV-063-Z4-142 del 05/06/2025	PIV-063-Z4-147 del 07/06/2025
7	Jairo Andrés Acosta Aristizábal	Director De Obra	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
8	Yuli Jaramillo Bolaño	Especialista Seguridad Vial 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
9	Javier Humberto González Cucaita	Especialista Seguridad Vial 2	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
10	Fernando Jaimes Tarazona	Especialista En Pavimentos	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
11	Billy Yoel Martínez Vargas	Residente De Obra 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
12	Juan Sebastián Pachón García	Residente De Obra 2	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
13	Camilo Andrés Villamizar Castellano	Auxiliar De Ingeniería 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
14	Jisela Rojas Mendoza	Auxiliar De Ingeniería 2	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
15	Vanesa Yuliana García Peña	Tecnólogo SST 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
16	Santiago Andrés Jaimes Blanco	Dibujante 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
17	Jennifer Johana Suarez Mendoza	Profesional Social 2	08/04/2025	Retiro	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

4.2.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Informe mensual No. 2 - Durante el periodo, el Contratista de obra no reportó ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Tabla 7 Registro de accidentes laborales – Contratista de obra

No.	Fecha	Trabajador	Cargo	Incapacidad (Días)	Estado
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2					

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

4.2.5 Incapacidades

Informe mensual No. 2 Durante el periodo, el Contratista de obra no reportó novedades de incapacidades en el personal activo.

Tabla 8 Registro de incapacidades – Contratista de obra

Nombre del colaborador	Cargo	Origen de incapacidad	Días generados
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2			

4.2.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes

El Contratista de obra, para el periodo del informe, relaciona en el formato SSTA -11 el reporte de personal, 6 ingresos, 10 antiguos, 1 retiro, para los profesionales se verifica el pago de aportes al SGSS, por parte de la interventoría, así como los pagos de cotización a la ARL del personal de prestación de servicios, a la fecha se encuentran observados los anexos reportados por el contratista de obra.

En el informe mensual del Contratista de obra, se entrega la respectiva certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales del personal reportado, firmada por el representante legal, no obstante, se solicitó que se adjunte la trazabilidad de pagos salarios u honorarios y aportes.

4.2.7 Indicadores SST

El contratista reporta los indicadores reportados en la figura, sin embargo, se encuentran observados por esta Interventoría, toda vez que los valores no son consecuentes con la realidad:

Figura 2 Indicadores de gestión – Contratista de obra

INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre	Fórmula	Variables	Valor	Variables
IGA (Indice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	Número ausentistas en el mes	0	Número de trabajadores en el mes
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	Número de trabajadores en el mes
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes	0	Número de trabajadores en el mes
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	0	Capacitaciones programadas
%Inducciones	# de personas con inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	Número de personas con inducciones realizada en el periodo	1	Personal que ingreso en el periodo
%Inspecciones	No de inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	Número inspecciones realizadas	3	Número de inspecciones programadas
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	15	Número de actividades programadas
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	Número de afiliados al SGSSI	6	Número de trabajados contratados
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	Número de participantes en actividades de capacitación	6	Número de personas con necesidades de capacitación
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos

Fuente Contratista de obra

4.2.8 Inducciones y notificaciones de riesgo

El Contratista de obra durante el periodo del informe presentado, realiza el proceso de inducción y notificación de riesgo al personal reportado como ingreso, por lo tanto, adjunta el certificado de cumplimiento de documentos de ingreso en el formato SSTA-14, adicionalmente adjunta los soportes para efectos de validación de esta Interventoría, el anexo se encuentra observado por esta interventoría.

4.2.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal

Durante el periodo evaluado, el Contratista de obra no presenta soportes de entrega de elementos de protección personal a los colaboradores vinculados, sin embargo, se generó la observación, solicitando los soportes correspondientes de entrega al personal que realizó las visitas en campo, con el fin de verificar la entrega de los EPP y dotación de acuerdo con la matriz de EPP establecida para el contrato.

4.2.10 Seguimiento plan de trabajo

El contratista remitió el plan de trabajo tal como se muestra en la figura 3 reportando para el periodo que programó (15) actividades, de las cuales (15) fueron ejecutadas, para un cumplimiento del plan de trabajo SGSST del 100%, sin embargo, el anexo fue observado por esta interventoría.

Figura 3 Plan de trabajo – Contratista de obra


ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	T/E	INF N°1					INF N°2			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	Representante legal	E					1				1
Actualizar matriz de identficación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Responsable del SGSST/Direccion de obra/ Representante legal	P					1				
		E					1				
Revisar y ajustar formatos para inspecciones de seguridad, acorde a necesidad	Responsable del SGSST/Direccion de obra/ Representante legal	P					1				
		E					1				
Documentar control de entrega (cargos que aplique)	Responsable del SGSST/Direccion de obra/ Representante legal	P									1
		E									1
Definir y documentar el Plan de emergencias	Responsable del SGSST/Direccion de obra/ Representante legal	P					1				
		E					1				
Definir y desarrollar simulacro de emergencia	Responsable del SGSST/Direccion de obra/ Representante legal	P									
		E									
Entrega de informe mensual de obra	Responsable del SGSST/Direccion de obra/	P					1				1
		E					1				1
Desarrollo del programa de inspecciones de seguridad: Inspeccion de áreas / equipos de control de emergencia / EPP / acordes a los programas de prevencion.	Responsable del SGSST/Direccion de obra/ Representante legal	P					3				3
		E					3				3
otros	Responsable del SGSST	P									
		E									
	Programado		0	0	0	2	23	0	4	0	11
	Ejecutado		0	0	0	2	23	0	4	0	11

Fuente Contratista de obra

4.2.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones

El contratista remitió el plan de capacitación tal como se muestra en la figura 4 reportando que programó 4 actividades y ejecuta 4, para un cumplimiento del cronograma de capacitaciones del 100%, sin embargo, el mismo cuenta con observaciones.

Figura 4 Cronograma de capacitaciones – Contratista de obra

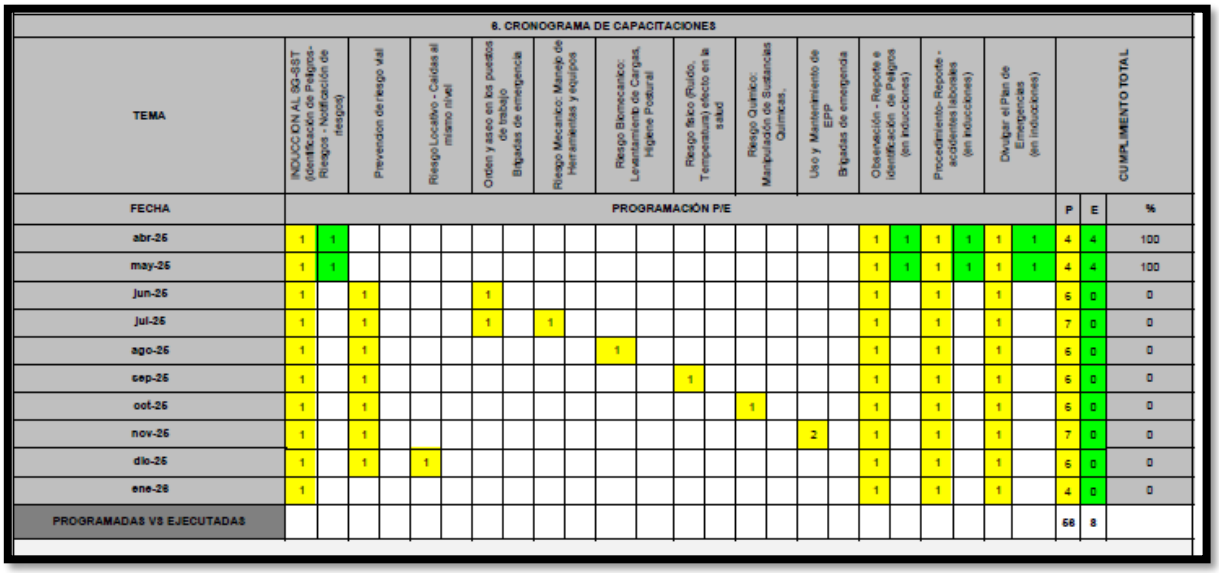

8. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES																										
TEMA	INDUCCION AL SG-SST (Identificación de Peligros-Riesgos - Notificación de riesgos)		Prevencion de riesgo Vial		Riesgo Locativo - Caidas al mismo nivel		Orden y aseo en los puestos de trabajo Brigadas de emergencia		Riesgo Mecanico: Manejo de Herramientas y equipos		Riesgo Biomecanico: Levantamiento de Cargas, Higiene Postural		Riesgo fisico (Ruido, Temperatura) efecto en la salud		Riesgo Quimico: Manipulación de Sustancias Químicas,		Uso y Mantenimiento de EPP Brigadas de emergencia		Observación - Reporte e Identificación de Peligros (en inducciones)		Procedimiento- Reporte - accidentes laborales (en inducciones)		Divulgar el Plan de Emergencias (en inducciones)		CUMPLIMIENTO TOTAL		
FECHA	PROGRAMACIÓN P/E																								P	E	%
abr-26	1	1																	1	1	1	1	1	1	4	4	100
may-26	1	1																	1	1	1	1	1	1	4	4	100
jun-26	1		1				1												1		1		1		6	0	0
jul-26	1		1				1		1										1		1		1		7	0	0
ago-26	1		1								1								1		1		1		6	0	0
sep-26	1		1										1						1		1		1		6	0	0
oct-26	1		1												1				1		1		1		6	0	0
nov-26	1		1														2		1		1		1		7	0	0
dic-26	1		1		1														1		1		1		6	0	0
ene-28	1																		1		1		1		4	0	0
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS																									68	8	

4.3. Gestión ambiental

4.3.1 Plan de Manejo Ambiental

El día 15 de junio de 2025 por medio del comunicado CE-CSC-ADM-0161, se recibió el informe de Gestión SST y Ambiental numero 2 correspondiente al periodo del 08 de mayo al 07 junio de 2025, fue revisado por esta interventoría y OBSERVADO, por lo anterior NO FUE APROBADO, toda vez que no cuenta con el LLENO DE REQUISITOS solicitados en la lista de chequeo suministrado por la ANSV y que son objeto de revisión de esta interventoría, en consecuencia en el ANEXO 1.11 se adjunta la certificación de trazabilidad correspondiente a las labores de seguimiento, verificación y control

4.3.2 Comités y mesas de trabajo

El Contratista de obra y la interventoría, asisten a los comités semanales con ANSV, de igual forma asiste a los comités del componente ambiental y SST programados quincenalmente, para el periodo se ejecutaron los siguientes:

Tabla 9 Seguimiento a comités y mesas de trabajo.

Participantes	Fecha	Tema
Contratista -Interventoría	12-05-2025	Revisión de pendientes del componente ambiental y SST
Contratista- Interventoría	26-05-2025	Se revisan los pendientes del componente ambiental y SST y se resuelven dudas en cuanto a documentos de vinculación del personal.

4.3.3 Recorridos y visitas de inspección

Durante el presente periodo, para las actividades del Contratista de obra, e Interventoría se iniciaron visitas de inspección de campo para identificar la viabilidad de la implementación de los diseños en cada punto a intervenir.

Desde el componente ambiental se inició la identificación de sumideros y zonas arbóreas en las zonas de influencia, y desde el componente SST se suministraron los EPP necesarios para las actividades de inspección, de igual forma, se verificó que el personal del Contratista contara con la previa aprobación por parte de esta Interventoría y adicionalmente, que contarán con la dotación y EPP mínimos necesarios.

4.3.4 Estado de permisos, tramites y licencias ambientales.

Durante el periodo evaluado, no se realizaron trámites, renovaciones ni modificaciones relacionados con licencias o permisos ambientales, debido a que no se llevaron a cabo actividades que lo requirieran conforme a la normativa ambiental vigente. Por tal motivo, este apartado no aplica para el periodo reportado.

Previo al inicio de actividades de obra, la Interventoría verificará la gestión realizada ante las AAC por parte del Contratista para la solicitud de las licencias o autorizaciones necesarias.

4.3.5 Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio

Durante el periodo evaluado, no se realizó seguimiento a manejo ambiental de campamentos y centros de acopio, debido a que no se llevaron a cabo actividades que lo requirieran en el presente periodo. Por tal motivo, este apartado no aplica para el periodo reportado.

4.3.6 Generación, manejo y disposición de residuos (RCD-RESPEL-ORDINARIOS Y RECICLABLES)

Durante el periodo reportado, el Contratista de obra no realiza manejo de materiales de construcción, generación, manejo y disposición final de residuos sólidos (RCD y peligrosos), de acuerdo con la etapa del contrato, no aplica la reutilización y/o aprovechamiento de RCD y otros residuos / materiales, ni se requirió gestión en cuanto al control de emisiones atmosféricas.

En cuanto al manejo y disposición de residuos ordinarios y reciclables, el Contratista de obra, cuenta con el punto ecológico de acuerdo con el código de colores y la normatividad en materia ambiental, para la oficina administrativa y para el taller / bodega presentada a la Interventoría.

Figura 5 Punto Ecológico bodega



Fuente: Contratista de obra – Informes semanales

4.3.7 Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Durante el periodo reportado, no se realizaron actividades relacionadas con el manejo integral de cuerpos de agua ni con la infraestructura de acueducto y alcantarillado. Esto, ya que no se han iniciado actividades de obra o situaciones que requirieran acciones en este ámbito. En consecuencia, este ítem no aplica para el presente periodo.

4.3.8 Manejo de la vegetación y paisajismo.

Durante el periodo evaluado, no se realizaron actividades de manejo de vegetación, control de cobertura vegetal, ni intervenciones de paisajismo, debido a que no se han iniciado actividades de obra. Por tanto, este ítem no aplica para el periodo reportado.

4.3.9 Unidades sanitarias

El Contratista de obra, de acuerdo con lo reportado a esta Interventoría, cuenta con unidades sanitarias disponibles para el uso del personal. Estas se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento y limpieza, tanto en las instalaciones del taller como en la oficina administrativa.

En cuanto a las unidades requeridas para los frentes de obra, aun no aplica de acuerdo con la fase en la que se encuentra el contrato, una vez se requiera, la Interventoría realizará el respectivo seguimiento para garantizar las condiciones de los colaboradores.

4.3.10 Seguimiento cronograma de actividades.

Durante el periodo, el cronograma de actividades para el componente ambiental se encuentra aprobado por esta Interventoría, sin embargo, el Contratista de obra no incluye el avance de la gestión del cronograma en el informe de gestión Ambiental y SST No 2, ítem el cual se encuentra observado a la fecha.

5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE LA INTERVENTORÍA

5.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.1.1 COPASST

Dando cumplimiento con lo estipulado en la normatividad legal vigente, el comité se encuentra conformado por 2 integrantes por parte de los colaboradores y 2 integrantes por parte del empleador, de igual forma, los miembros del COPASST de PIV Ingeniería SAS, se encuentran capacitados en aspectos relacionados con sus funciones y responsabilidades.

La última reunión del Comité se llevó a cabo el 30 de mayo del 2025.

A continuación, se presentan los integrantes que conforman el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo:

Figura 6 Integrantes del COPASST



5.1.2 Comité de convivencia laboral

Dando cumplimiento con lo estipulado en la normatividad legal vigente, el comité de convivencia laboral de PIV Ingeniería SAS se encuentra conformado por 2 integrantes por parte de los colaboradores y 2 integrantes por parte del empleador, de igual forma, los miembros del Comité se encuentran capacitados en el marco legal de la Ley 1010 de 2006 y medidas de prevención de conductas de hostigamiento y/o acoso laboral.

La última reunión del comité se realizó el 30 de abril 2025, por lo tanto, para el presente periodo no aplica, la misma se encuentra programada para el mes de julio 2025.

A continuación, se presentan los integrantes que conforman el comité de convivencia laboral:

Figura 7 Integrantes del CCL



5.1.3 Gestión de talento humano

Para el periodo presentado, se adjunta el formato SSTA-11 Reporte de personal **(**Ver anexo 1.3**),** de igual forma, a continuación, se presenta los profesionales activos

Tabla 10 Reporte de personal -Interventoría

REPORTE DE PERSONAL INTERVENTORÍA					
ACTIVO DURANTE EL PERIODO					
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Fecha de ingreso**	**Aprobación Hoja de vida**	**Aprobación Doc. de ingreso**
1	KAREN LORENA NAVARRO PEREZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	8/05/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000048291 del 27/05/2025
2	JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	08/04/2025	Radicado No. 20253000040681 del 12/05/2025	Radicado No. 20253000048291 del 27/05/2025
3	OCTAVIO ALFONSO MILLAN FLECHAS	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	08/04/2025	Radicado No. 20253000043931 del 16/05/2025	Radicado No. 20253000048291 del 27/05/2025
4	JASMIN JEZENIA RINCÓN VILLEGAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000036891 del 28/04/2025
5	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ HENAO	ING. AUXILIAR Y DE APOYO	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000036891 del 28/04/2025
6	ALEXANDRA GIRALDO RUIZ	PROFESIONAL SOCIAL	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No 20253000042211 del 13/05/2025

REPORTE DE PERSONAL INTERVENTORÍA					
ACTIVO DURANTE EL PERIODO					
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Fecha de ingreso**	**Aprobación Hoja de vida**	**Aprobación Doc. de ingreso**
7	ESTEFANÍA OSORIO CUARTAS	TECNÓLOGO SST	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000036891 del 28/04/2025
8	ANGIE MARYETH VANEGAS SAENZ	INGENIERA AMBIENTAL	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No 20253000042211 del 13/05/2025

En el anexo 1.5 se encuentran adjuntos los documentos de ingreso del personal relacionado anteriormente.

Durante el periodo, la Interventoría, reporta el ingreso de (1) profesional (7) antiguos, (0) retiros, (0) ingreso / retiro y (0) inactivos.

5.1.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Informe mensual No. 2 - Durante el periodo, la Interventoría no presentó accidentes, incidentes ni enfermedades laborales

Tabla 11 Registro de accidentes - Interventoría

No.	Fecha	Trabajador	Cargo	Incapacidad (Días)	Estado
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2					

5.1.5 Incapacidades

Informe mensual No. 2 Durante el periodo, la Interventoría, no reporta incapacidades con el personal activo.

Tabla 12 Registro de incapacidades – Interventoría

Nombre del colaborador	Cargo	Origen de incapacidad	Días generados
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2			

5.1.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes.

Durante el periodo, la interventoría se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre PIV ingeniería y los profesionales que hacen parte de la plantilla mínima con quienes se ha firmado compromisos para el cumplimiento del objeto del contrato en mención, pagos de salarios u honorarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones, adicionalmente PIV ingeniería

manifiesta estar al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo tanto, se adjunta la certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales en el formato SSTA-12. **(**Ver anexo 1.1**)**.

De igual forma se adjuntan planillas de seguridad social del personal activo de Interventoría, incluyendo el pago de aportes a ARL para cada profesional, planillas vigentes a la fecha de presentación del informe mensual No 2. **(**Ver anexo 1.2**)**.

5.1.7 Indicadores SST.

A continuación, se presentan los principales indicadores de cumplimiento de la Interventoría para este periodo, los cuales se puede evidenciar en el anexo 1.7:

Figura 8 Indicadores SST de la Interventoría

Indicadoreso SST - Contrato de Interventoría PA-013-2025

Año	2025
Contrato	Contrato de Interventoría PA-013-2025
Periodo	08 de mayo del 2025 al 07 de junio 2025
Número de trabajadores en el mes	8

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	Número ausentistas en el mes	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes	154	0,00%
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	0	Número de días cargados en el mes	0	0,00%
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	0	Total de accidentes de trabajo que se	0	0,00%
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	0	Promedio de trabajaodores	8	0,00%
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	0	Promedio de trabajaodores	8	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	4	Capacitaciones programadas	4	100%
%Inducciones	No. de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	Número de personas con Inducciones realizada en el periodo	1	Personal que ingreso en el periodo	1	100%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo /No de inspecciones programadas en el mismo periodo	Número Inspecciones realizadas	3	Número de Inspecciones programadas	3	100%
% Cumplimiento del plan de trabajo SST	No. actividades ejecutadas en el periodo / No. actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	14	Número de actividades programadas	14	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	Número de afiliados al SGSSI	8	Número de trabajados contratados	8	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos	0	0%

5.1.8 Inducciones y notificaciones de riesgo

Durante el periodo, se realizaron las actividades correspondientes al proceso de inducción para el personal reportado como ingreso, así como la notificación formal de los riesgos asociados a las labores a desarrollar en cada área operativa o administrativa. **(**Ver anexo 1.5**)** Se adjunta certificado SSTA-10 de la realización de la inducción.

5.1.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal

Durante el periodo del informe presentado se realiza entrega de EPP y dotación para el personal de PIV Ingeniería que así lo requiere, en el anexo 1.6 se incluyen los soportes correspondientes de la entrega realizada.

5.1.10 Seguimiento plan de trabajo

En el marco del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la Interventoría, se planearon un total de 14 actividades, estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo con lo previsto. De este modo, se logró completar satisfactoriamente lo planificado, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos. (Ver anexo 1.6)

5.1.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones

Para el Contrato de Interventoría, se ejecutaron un total de 4 actividades de capacitación dentro del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las cuales fueron planificadas previamente. Estas actividades se llevaron a cabo según lo establecido, cumpliendo con el objetivo de formar al personal en los aspectos fundamentales de la seguridad y salud laboral. (Ver anexo 1.6)

5.1.12 Estado de productos, informes semanales e informes mensuales de la Interventoría.

Tabla 13 Productos ambientales y SST- Interventoría

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO - INTERVENTORÍA	No. Y FECHA DE RESPUESTA ANSV	CONCEPTO DE LA ANSV
SG SST	PIV-063-Z4-085 con radicado ANSV No. 20256600036382 del 12/05/2025	Radicado No. 20253000043831 del 16/05/2025	Aprobado v2
Informe mensual ambiental y SST No 1	PIV-063-Z4-149 con radicado ANSV No. 20256600045602 del 10/06/2025	Radicado No 20253000054011 10/06/2025	Aprobado v2
Informe mensual ambiental y SST No 2	En proceso	En proceso	Pendiente concepto
Informe semanal 1	PIV-063-Z4-016 con radicado ANSV No. 20256600029502 del 15/04/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 2	PIV-063-Z4-024 con radicado ANSV No 20256600030612 del 22/04/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 3	PIV-063-Z4-034 con radicado ANSV No 20256600032532 del 29/04/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 4	PIV-063-Z4-056 con radicado ANSV No	Entregado	Sin observaciones

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO - INTERVENTORÍA	No. Y FECHA DE RESPUESTA ANSV	CONCEPTO DE LA ANSV
	20256600034292 del 06/05/2025		
Informe semanal 5	PIV-063-Z4-088 con radicado ANSV No 20256600036812 del 13/05/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 6	PIV-063-Z4-101 20/05/2025 Con copia José Hugo Bocarejo	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 7	PIV-063-Z4-126 27/05/2025 Con copia José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada Luisa Yañez	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 8	PIV-063-Z4-129 03/06/2025 José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada Luisa Yañez	Entregado	Sin observaciones

6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA

6.1 Estado de productos, informes semanales, informes mensuales

Tabla 14 Productos ambientales y SST – Contratista de obra

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO CONTRATISTA DE OBRA	ESTADO	No. Y FECHA DE RESPUESTA INTERVENTORÍA	CONCEPTO DE LA ANSV
SG SST	CE-CSC-ADM-0106 del 29/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-127 30/05/2025	No aplica
PMA	CE-CSC-ADM-0109 del 01/06/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-136 del 03/06/2025	No aplica
Informe mensual ambiental y SST No 1	CE-CSC-ADM-0116 y CE-CSC-ADM-0127 del 06/06/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-148 del 08/06/2025	No aplica
Informe semanal 1	CE-CSC-ADM-0033 del 26/04/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-038 del 28/04/2025	No aplica
Informe semanal 2	CE-CSC-ADM-0034 del 27/04/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-039 del 28/04/2025	No aplica
Informe semanal 3	CE-CSC-ADM-0063 del 09/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-092 del 15/05/2025	No aplica
Informe semanal 4	CE-CSC-ADM-0095 del 22/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-114 del 29/05/2025	No aplica
Informe semanal 5	CE-CSC-ADM-0085 del 16/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-111 del 21/05/2025	No aplica
Informe semanal 6	CE-CSC-ADM-0087 del 19/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-165 del 12/06/2025	No aplica

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO CONTRATISTA DE OBRA	ESTADO	No. Y FECHA DE RESPUESTA INTERVENTORÍA	CONCEPTO DE LA ANSV
Informe semanal 7	CE-CSC-ADM-0118 del 05/06/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-166 del 12/06/2025	No aplica
Informe semanal 8	CE-CSC-ADM-0110 03/06/2025	Observado	Pendiente concepto	No aplica

6.2 Relación de reuniones y mesas de trabajo desarrolladas en el periodo

Tabla 15 Relación de reuniones y mesas de trabajo

Participantes	Fecha	Tema
Contratista -Interventoría	12-05-2025	Revisión de pendientes del componente ambiental y SST
Contratista- Interventoría	26-05-2025	Se revisan los pendientes del componente ambiental y SST y se resuelven dudas en cuanto a documentos de vinculación del personal.

6.3 Relación de correspondencia enviada y recibida entre las partes

Tabla 16. Correspondencia enviada

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	NO. RADICADO
PIV-063-Z4-075	12/05/2025	Presentación de instalaciones físicas del Contrato de Obra PA-026 de 2025	20256600037132
PIV-063-Z4-076	9/05/2025	Respuesta a su comunicados CE–CSC–ADM–0052. Observaciones al Plan de Manejo Ambiental	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-077	9/05/2025	Remisión del manual de identidad visual para el Contrato de obra No PA-026-2025	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-085	12/05/2025	Respuesta al comunicado 20253000039601 del 06 de mayo del 2025. Atención de observaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Contrato de Interventoría PA-013-2025	20256600036382
PIV-063-Z4-086	20/05/2025	Respuesta a su comunicados CE–CSC–ADM–0076. Observaciones al Plan de Manejo Ambiental	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-087	13/05/2025	Respuesta oficio 20253000040681Cambio de personal. Especialista en Tránsito y Seguridad Vial, contrato de interventoría No. PA-013-2025	20256600037102

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	NO. RADICADO
PIV-063-Z4-089	16/05/2025	Respuesta a comunicado CE-CSC-ADM-0057 – Instalaciones físicas Contrato de Obra PA-026-2025	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-090	13/05/2025	Respuesta a comunicado CE-CSC-ADM-0059 – Solicitud autorización cambio de personal	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-091	14/05/2025	Respuesta a su comunicados CE-CSC-ADM-00066 del 09 de mayo del 2025. Observaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo V2 del Contrato de obra.	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-097	15/05/2025	Remisión de Artes para dotación y aclaración uso de logos	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-098	16/05/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0072 – Solicitud autorización cambio personal	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-102	20/05/2025	Respuesta a sus comunicados CE-CSC-ADM-0077 del 14 de mayo del 2025 y CE-CSCADM-0079 del 15 de mayo del 2025. Observaciones al Informe mensual Integral No 1 v1, correspondiente al periodo del 08 de abril del 2025 al 07 de mayo del 2025	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-104	19/05/2025	Entrega Informe mensual No.1 de Interventoría – Contrato de Interventoría PA-013-2025	20256600038642
PIV-063-Z4-108	20/05/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0081 del 16 de mayo del 2025. Observaciones a los documentos de ingreso personal Contrato de obra	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-116	22/05/2025	Recomendaciones previas - Visitas de campo	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-117	22/05/2025	Respuesta a los comunicados 20253000040681 del 12 de mayo del 2025, 20253000042211 del 13 de mayo del 2025 y 20253000043931 del 16 de mayo del 2025. Documentos de ingreso personal plantilla mínima de interventoría, Director de interventoría, Especialista en Tránsito y seguridad vial, Especialista de pavimentos	20256600040052)1Egv9
PIV-063-Z4-120	23/05/2025	Respuesta a sus comunicado CE-CSC-ADM-0089 del 20 de mayo y CE-CSC-ADM0097 del 23 de mayo. Observaciones a las hojas de vida propuestas	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada Luisa Yañez

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	NO. RADICADO
PIV-063-Z4-121	23/05/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0092 del 21 de mayo del 2025. Concepto de aprobación a los documentos de ingreso personal Contrato de obra	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-122	23/05/2025	Remisión de documentos de personal de plantilla mínima del Contrato de obra No. PA – 026 - 2025	20256600040552
PIV-063-Z4-125	23/05/2025	Aprobación Profesional social y comunicaciones – Contrato de obra PA-026-2025	20256600040752
PIV-063-Z4-127	30/05/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0100 del 24 de mayo del 2025 y al comunicado CE-CSC-ADM-0106 del 29 de mayo del 2025. Aprobación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo v3 del Contrato de obra.	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-130	3/06/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0096. Observaciones al Informe mensual Integral No. 1 V002. Componentes Técnico y Social.	CC José Hugo Bocarejo Luisa Yañez
PIV-063-Z4-136	3/06/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0109 del 01 de junio del 2025. Aprobación PMA v4 del Contrato de obra.	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-137	4/06/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0103 del 26 de mayo del 2025. Observaciones al Informe ambiental y SST No. 1 del Contrato de obra.	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-139	4/06/2025	Solicitud respuesta comunicado PIV-063-Z4-015 del 15 de abril	CC José Hugo Bocarejo
PIV-063-Z4-142	6/06/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0107 del 30 de mayo. Aprobación a las hojas de vida de personal de plantilla mínima del contrato de obra.	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada
PIV-063-Z4-143	5/06/2025	Remisión aprobación Plan Manejo Ambiental V4 y SG-SST V3 Contrato de obra No. PA-026-2025	20256600044712
PIV-063-Z4-147	7/06/2025	Respuesta a su comunicados CE-CSC-ADM-0124 y CE-CSC-ADM-0128 del 06 de junio del 2025. Concepto de aprobación a los documentos de ingreso personal Contrato de obra.	CC José Hugo Bocarejo Luz Eliana Villada

Tabla 17. Correspondencia recibida

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
CE-CSC-ADM-0057	8/05/2025	RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-042 OBSERVACIONES INSTALACIONES FÍSICAS.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0059	8/05/2025	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PROFESIONALES DESIGNADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0066	9/05/2025	ALCANCE OFICIO CE-CSC-ADM-0052 - RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-045 OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. COMPONENTE AMBIENTAL	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0072	15/05/2025	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PROFESIONALES DESIGNADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal director de Proyecto
20253000040681	14/05/2025	Respuesta a la comunicación con radicado ANSV No. 20256600033522 y asunto: “Respuesta oficio 20253000035601 Cambio de personal. Director de Interventoría y Especialista en Tránsito y Seguridad Vial, contrato de interventoría No. PA-013-2025”.	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
CE-CSC-ADM-0076	14/05/2025	Atención de observaciones Oficio PIV-063-Z4-076 de 09 de mayo de 2025. Plan de Manejo Ambiental versión No. 02	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0077	14/05/2025	RADICACIÓN INFORME MENSUAL No.1	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0079	15/05/2025	ALCANCE COMUNICADO CE-CSC-ASM-077 INFORME MENSUAL No.1 – RADICACIÓN ANEXO FALTANTE	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
CE-CSC-ADM-0081	15/05/2025	ALCANCE OFICIO CE-CSC-ADM-0052 - RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-045 OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. COMPONENTE AMBIENTAL	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
20253000044031	16/05/2025	La comunicación No. PIV-063-Z4-083 con radicado en la ANSV No. 20256600037112 y asunto: “Respuesta a Radicado No. 20253000039541 Observaciones “Plan de Inspección y Ensayos – Contrato de Interventoría PA-013-2025” versión 01” versión 2.	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
20253000043931	19/05/2025	Respuesta a la comunicación con radicado ANSV No. 20256600037102 y asunto: “Respuesta oficio 20253000040681 Cambio de personal. Especialista en Tránsito y Seguridad Vial, contrato de interventoría No. PA-013-2025.”.	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
CE-CSC-ADM-0089	20/05/2025	RESPUESTA COMUNICADO PIV-063-Z4-097 SOLICITUD AUTORIZACION CAMBIO DE PERSONAL - ALCANCE CECSC-ADM-0072	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0092	21/05/2025	RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-108 - RESPUESTA A SU COMUNICADO CE-CSC-ADM-0081 DEL 16 DE MAYO DEL 2025. OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0096	25/05/2025	RESPUESTA A COMUNICADO PIV-063-Z4-102. RADICACIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No.1 V2	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
CE-CSC-ADM-0097	23/05/2025	ALCANCE COMUNICADO CE-CSC-ADM-0072 CAMBIO DE PERSONAL	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0098	23/05/2025	PRESENTACIÓN PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0100	24/05/2025	RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-091 - RESPUESTA A SU COMUNICADOS CE-CSC-ADM-00066 DEL 09 DE MAYO DEL 2025. OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO V2 DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0101	26/05/2025	RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-086 Observaciones al Plan de Manejo Ambiental versión No. 03 – Contrato de obra PA-026-2025.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0103	26/05/2025	ALCANCE COMUNICADO CE-CSC-ADM-096 INFORME MENSUAL No.1 V002– RADICACIÓN ANEXO FALTANTE	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0104	27/05/2025	RESPUESTA COMUNICADO PIV-063-Z4-120 – subsanación a las observaciones de las hojas de vida propuestas	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0105	28/05/2025	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PROFESIONALES DESIGNADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0106	29/05/2025	ALCANCE OFICIO CE-CSC-ADM-0100 - RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-091 - RESPUESTA A SU COMUNICADOS CE-CSC-ADM-00066 DEL 09 DE MAYO DEL 2025. OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
		EN EL TRABAJO V2 DEL CONTRATO DE OBRA	
CE-CSC-ADM-0107	30/05/2025	ALCANCE OFICIO CE-CSC-ADM-104-COMUNICADO PIV063-Z4-120 Respuesta a sus comunicado CE-CSC-ADM-0089 del 20 de mayo y CE-CSC-ADM-0097 del 23 de mayo. Observaciones a las hojas de vida propuestas.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0109	31/05/2025	Alcance oficio CE-CSC-ADM-0101 Plan de Manejo Ambiental versión No. 04 – Contrato de obra PA-026-2025.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0116	5/06/2025	RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL No.1 V003. RESPONDE A COMUNICADOS PIV-063-Z4-130 Y PIV-063-Z4-137.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0117	5/06/2025	RESPUESTA COMUNICADO PIV-063-Z4-015 SOLICITUD DE TRUMENTOS Y VEHÍCULOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0123	6/06/2025	Solicitud concepto medidas de manejo alternativas para disposición de RCD en puntos de intervención.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0124	6/06/2025	RESPUESTA PARCIAL A SU COMUNICADO 001OPV-INT-ZO4-COE-GEA-150-RtaCSC0107HVCO, DOCUMENTACION PROFESIONAL SOCIAL ANYI K. NEIRA C.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0127	6/06/2025	ALCANCE COMUNICADO CE-CSC-ADM-0116 INFORME MENSUAL No.1 - COMPONENTE TÉCNICO	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
CE-CSC-ADM-0128	6/06/2025	ALCANCE COMUNICADO CE-CSC-ADM-0124 DANDO RESPUESTA A SU COMUNICADO PIV-063-Z4-142 - DEL 30 DE MAYO DEL 2025. APROBACIÓN A LAS HOJAS DE VIDA DE PERSONAL DE PLANTILLA MINIMA DEL CONTRATO DE OBRA – Y RESPUESTA A COMUNICADO PIV-013-MAR-2025 RESPUESTA RADICADO N° 20253000019741 – APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATO DE obra n° pa- 026-2025	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

6.4 Información sobre atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas.

En el marco del cumplimiento de los compromisos establecidos en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), durante el periodo presentado, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente para someter a revisión de la interventoría los avances y productos relacionados con los componentes. Esta acción tiene como propósito garantizar la verificación, validación y seguimiento técnico por parte del equipo interventor, con el fin de asegurar la conformidad con la normativa aplicable y los requisitos contractuales vigentes.

Dado lo anterior, durante el periodo, la Interventoría realiza las observaciones pertinentes al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra, una vez se atienden por parte del Contratista, se generan los respectivos conceptos de aprobación a los productos contractuales mencionados.

De igual forma, el Contratista de obra, presenta los documentos de vinculación del personal de plantilla mínima, la interventoría genera concepto de aprobación y traslada los documentos aprobados a la ANSV para su conocimiento y fines pertinentes.

6.5 Información relacionada con incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios, etc.

Durante el periodo presentado no se reportan incumplimientos, ni procesos sancionatorios tanto para la Interventoría, como para el Contratista de obra.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista de obra no reportó novedades de accidentes, incidentes, ni enfermedades laborales durante el periodo.
- La interventoría no reportó novedades de accidentes, incidentes, ni enfermedades laborales durante el periodo
- Se ejecutaron todas las actividades planeadas en el plan de trabajo del SG-SST, tanto para el Contratista de obra como para la Interventoría, demostrando un cumplimiento total con las acciones previstas.
- Las actividades de capacitación, tanto para el Contratista como para la Interventoría, fueron completadas con éxito, logrando que el personal recibiera la formación necesaria en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Cumplimiento normativo: Las acciones realizadas estuvieron alineadas con el Apéndice D para el componente y la normatividad legal aplicable sobre seguridad y salud en el trabajo.
- La interventoría y el contratista de obra han participados en comités y mesas de trabajo en pro al cumplimiento contractual y seguimiento de los productos correspondientes.
- Para el periodo las actividades que aplican del componente ambiental fueron cumplidas por parte del contratista de obra.
- Se logró una buena participación del personal en las capacitaciones y actividades, lo cual es fundamental para asegurar la efectividad de las acciones de prevención.
- Como recomendación, se planea realizar un monitoreo continuo de las condiciones laborales y de seguridad en los diferentes espacios de trabajo para detectar posibles riesgos y aplicar medidas correctivas de manera oportuna.

8 ANEXOS

- Anexo 1.1 – Formato SSTA-12. Certificación pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales de interventoría.
- Anexo 1.2 – Planillas de seguridad social de trabajadores de interventoría.
- Anexo 1.3 – Formato SSTA-11. Formato de reporte de personal.
- Anexo 1.4 – Formato SSTA-13. Paz y salvo del personal.
- Anexo 1.5 – Soportes de vinculación (personal nuevo del periodo).
- Anexo 1.6 – Plan de trabajo SST y Cronograma de Capacitaciones SST.
- Anexo 1.7 – Indicadores de gestión SST.
- Anexo 1.8 – Reporte de accidentalidad
- Anexo 1.9 – Formato SSTA-07. Listado de vehículos.
- Anexo 1.10 – Formato registro fotográfico.
- Anexo 1.11 – Estado de informe mensual del Contratista de obra
