piv ingeniería
PROYECTOS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

PIV INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA-013-2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 4"

CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA, RISARALDA Y QUINDÍO

INFORME MENSUAL No. 4
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
Versión 2

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 01 DE 2025

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle	Elaboró
1	13/08/2025	Documento original	Maryeth Vanegas / Ing. Ambiental Estefanía Osorio / Tecnólogo SST
2	01/09/2025	Atención de observaciones	Maryeth Vanegas / Ing. Ambiental Estefanía Osorio / Tecnólogo SST

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN





Responsable de elaboración			PIV Ingeniería S.A.S		PIV Ingeniería S.A.S	
Título Documento			INFORME MENSUAL No. 4		INFORME MENSUAL No. 4	
Documento No.			001OPV-INT-ZO4-IFM-GAM-004-InformeMensualASSTN4-V001		001OPV-INT-ZO4-IFM-GAM-004-InformeMensualASSTN4-V002	
REVISIÓN Y APROBACIÓN	**Versión**		**1**		**2**	
	Elaboró	**Firma**				
		Nombre	Estefanía Osorio	Maryeth Vanegas	Estefanía Osorio	Maryeth Vanegas
		Cargo	Tecnólogo SST	Ing. Ambiental	Tecnólogo SST	Ing. Ambiental
		Fecha	13/08/2025	13/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
	Revisó y Aprobó	**Firma**				
		Nombre	Javier Bastidas		Javier Bastidas	
		Cargo	Director		Director	
		Fecha	13/08/2025		01/09/2025	

TABLA DE CONTENIDO

1. Información general de los contratos 6
1.1. Datos generales del contrato de interventoría 6
1.2. Datos generales del contrato de obra 7
1.3. Personal aprobado componente ambiental y SST 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
3. actividades generales 9
4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 10
4.1. Novedades del Informe de Gestión SST y Ambiental 10
4.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 10
4.2.1 COPASST 10
4.2.2 Comité de convivencia laboral 11
4.2.3 Gestión de talento humano 11
4.2.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales 13
4.2.5 Incapacidades 14
4.2.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes 14
4.2.7 Indicadores SST 14
4.2.8 Inducciones y notificaciones de riesgo 15
4.2.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal 15
4.2.10 Seguimiento plan de trabajo 15
4.2.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones 16
4.3. Gestión ambiental 16
4.3.1 Plan de Manejo Ambiental 16
4.3.2 Comités y mesas de trabajo 17
4.3.3 Recorridos y visitas de inspección 17
4.3.4 Estado de permisos, tramites y licencias ambientales. 17
4.3.5 Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio 18
4.3.6 Generación, manejo y disposición de residuos (RCD-RESPEL-ORDINARIOS Y RECICLABLES) 18
4.3.7 Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y alcantarillado. 18
4.3.8 Manejo de la vegetación y paisajismo. 18
4.3.9 Unidades sanitarias 19
4.3.10 Seguimiento cronograma de actividades. 19
5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE LA INTERVENTORÍA 19
5.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 19
5.1.1 COPASST 19
5.1.2 Comité de convivencia laboral 20
5.1.3 Gestión de talento humano 21
5.1.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales 22

5.1.5 Incapacidades 22
5.1.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes. 23
5.1.7 Indicadores SST. 23
5.1.8 Inducciones y notificaciones de riesgo 24
5.1.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal 24
5.1.10 Seguimiento plan de trabajo 24
5.1.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones 25
5.1.12 Estado de productos, informes semanales e informes mensuales de la Interventoría. 26
6. Seguimiento ambiental y SST de interventoría al contratista de obra 27
6.1 Estado de productos, informes semanales, informes mensuales 27
6.2 Relación de reuniones y mesas de trabajo desarrolladas en el periodo 28
6.3 Relación de correspondencia enviada y recibida entre las partes 29
6.4 Información sobre atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas. 35
6.5 Información relacionada con incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios, etc. 36
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36
8. Anexos 37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información contrato de Interventoría 6
Tabla 2 Información Contrato de obra 7
Tabla 3 Personal ambiental y SST - Interventoría 7
Tabla 4 Personal ambiental y SST – Contratista de obra 8
Tabla 5. Municipios Por Intervenir 9
Tabla 6 Reporte de personal – Contratista de obra 11
Tabla 7 Registro de accidentes laborales – Contratista de obra 14
Tabla 8 Registro de incapacidades – Contratista de obra 14
Tabla 9 Seguimiento a comités y mesas de trabajo 17
Tabla 10 Reporte de personal -Interventoría 21
Tabla 11 Registro de accidentes - Interventoría 22
Tabla 12 Registro de incapacidades – Interventoría 22
Tabla 13 Plan de trabajo - Interventoría 24
Tabla 14 Plan de acción - Interventoría 25
Tabla 15 Cumplimiento cronograma de capacitaciones – Interventoría 25
Tabla 16 Productos ambientales y SST- Interventoría 26
Tabla 17 Productos ambientales y SST – Contratista de obra 27
Tabla 18 Relación de reuniones y mesas de trabajo 28
Tabla 19. Correspondencia enviada 29
Tabla 20. Correspondencia recibida 32

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1. Datos generales del contrato de interventoría

Tabla 1 Información contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PA 013 DE 2025	
Datos del Contratante y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT. 800.159.998-0
Nombre del Contratista y documento de identificación:	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S PIV INGENIERIA S.A.S NIT: 860.510.291-5 Representante Legal Principal NELSON FERNANDO HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ C.C. No 19.453.780 de Bogotá D.C. Representante Legal Suplente TERESA DEL PILAR GUZMAN LOZANO C.C. No 65.586.376
Objeto del contrato:	¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 4¨
Valor del contrato:	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($1.245.506.647)** incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia Definitivos.
Plazo del contrato:	Diez meses y medio (10.5 meses)
Fecha de suscripción:	Veintisiete (27) de diciembre de 2024.
Fecha de inicio:	Ocho (8) de Abril del 2025.
Fecha fin:	Veintidós (22) de febrero de 2026.
Supervisor del contrato:	William Andrés Pedraza Bedoya
Póliza de cumplimiento:	CBO-100024767 Anexo 2 Vigencia hasta el 22/12/2026 Expedida por Compañía Mundial De Seguros S. A
Póliza R.C.E. No.:	CBO-100006344 Anexo 3 Vigencia hasta el 22/02/2026 Expedida por Compañía Mundial De Seguros S.A

1.2. Datos generales del contrato de obra

Tabla 2 Información Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No. PA-026-2025	
Datos del Contratante y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.- NIT. 800.159.998-0.
Nombre del Contratista y documento de identificación:	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA NIT.: 901888448-5. Representante Legal: JULIO ANDRES RODRIGUEZ VILLEGAS C.C. No. 79.722.972 de Bogotá
Objeto del contrato:	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, zona 4.
Valor del contrato:	El valor del contrato será por un valor de hasta SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000), incluidos costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y en su propuesta económica presentada en la plataforma SECOP II. El valor del contrato será ejecutado a monto agotable.
Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión:	532 del 23 de mayo de 2024.
Plazo del contrato:	Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
Póliza de cumplimiento:	Póliza de cumplimiento No. 18-45-101179525. Vigencia hasta 07/12/2026 Expedidas por Seguros del Estado S.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 18-40-101076801 Vigencia hasta 07/02/2026 Expedidas por Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de garantías:	Catorce (14) de marzo de 2025.
Fecha de inicio:	Ocho (8) de Abril del 2025.
Fecha terminación:	Siete (7) de febrero de 2026.

1.3. Personal aprobado componente ambiental y SST

Tabla 3 Personal ambiental y SST - Interventoría

PERSONAL AMB Y SST APROBADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRE	**CARGO**	**CONCEPTO ENTIDAD**
Maryeth Vanegas	Ingeniera ambiental	Aprobado con Radicado No. 20253000019741 del 05 de marzo 2025
Estefanía Osorio	Tecnólogo SST	

Tabla 4 Personal ambiental y SST – Contratista de obra

PERSONAL AMB Y SST APROBADO - CONTRATO DE OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**CONCEPTO INTERVENTORÍA**
Yuri Rocío Pérez Salamanca	Tecnólogo SST	Aprobado con comunicado PIV-063-Z4-227 del 27 de junio del 2025
Miguel Ángel Briceño	Tecnólogo SST	Aprobado con comunicado PIV-063-Z4-142 del 05 de junio del 2025
Daniel Eduardo Ariza	Ingeniero ambiental	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El objetivo principal de la implementación del Programa de Obras por la Vida, tiene como propósito implementar intervenciones en la infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a lo largo del territorio nacional para la zona 4 abarcando tanto la red vial urbana como rural, en la jurisdicción de los municipios, departamentos o del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, a lo largo del territorio nacional.

En el periodo del presente informe se han llevado a cabo las actividades de supervisión, verificación, control y evaluación estipulados en los términos de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, los estándares ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos. Este informe detalla el avance de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra y de Interventoría, el seguimiento a los productos entregables, el cumplimiento de los cronogramas establecidos, así como las observaciones, recomendaciones e incidencias detectadas durante el desarrollo del periodo evaluado. Adicionalmente, se presenta el estado actual del componente ambiental y SST.

Esta interventoría se basa en el principio de la *buena fe*, consagrada en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia para la revisión y aprobación de los productos del contratista de obra.

La distribución de las intervenciones del programa de Obras por la Vida se llevará a cabo en las cinco (5) zonas señaladas del territorio nacional, sin embargo, el Contrato de obra PA-026-2025 y el contrato de interventoría PA-013-2025, ejecutaran actividades en la zona cuatro (4) ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima, y Quindío.

Figura 1. Zonas de intervención

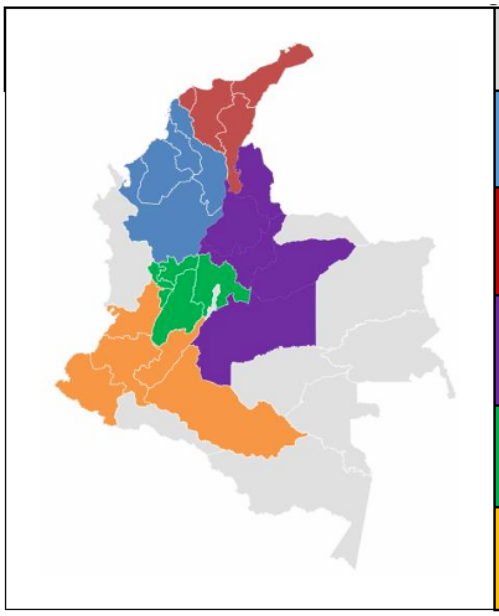

Zona de intervención	Departamentos en que se encuentran los tramos viales
1	Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
2	Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.
3	Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Meta.
4	Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío.
5	Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá.

Fuente: Estudios Previos – Contrato de Obra PA-026-2025.

Para efectos de la ejecución del contrato principal, los departamentos donde se encuentran ubicados los puntos a atender se han agrupado en cuatro (4) zonas, como se muestran a continuación:

Tabla 5. Municipios Por Intervenir

Departamento	Municipio de Intervención
Caldas	Manizales
	Supía
Cundinamarca	Caparrapí
	Girardot
	Soacha
	Mosquera
	Yacopí
Quindío	Armenia
	Circasia
Tolima	Espinal
	Honda

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

3. ACTIVIDADES GENERALES

El presente informe mensual de interventoría corresponde al seguimiento para las actividades del componente ambiental y SST, por lo tanto, se describen las actividades realizadas por el Contratista de obra Consorcio Señalizadores de Colombia y el Contrato de Interventoría PIV Ingeniería SAS, durante el periodo del informe mensual No. 4 correspondiente al periodo del 08 de julio al 07 de agosto del 2025, en cumplimiento con las obligaciones contractuales adquiridas para los contratos en mención.

Durante el periodo presentado, se inicia la ejecución de actividades de obra en el municipio de Honda Tolima, por lo tanto, la Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento por parte del Contratista, en cuanto a las condiciones mínimas de seguridad en los frentes de trabajo activos, para la Intervención de 2.14 km en Honda, en dónde se realizó la instalación de señales verticales: reglamentarias, preventivas e informativas, demarcación horizontal: marcas viales zona de pasos peatonales, velocidad máxima, zonas de carga; Instalación de dispositivos de regulación para el tránsito: construcción de resaltos parabólicos, instalación de estoperoles, de la misma forma, se reportan las actividades administrativas realizadas durante el periodo:

- Seguimiento a la presentación de documentos de vinculación de personal mínimo operativo. (Contratista de obra para el municipio de Honda)
- Seguimiento a la presentación de documentos de maquinaria, equipos y vehículos mínimos requeridos y de apoyo, para la ejecución del contrato de obra.
- Seguimiento a procesos de inducción del personal reportado como ingreso. (Contratista de obra para el municipio de Honda)
- Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito de acuerdo con el documento aprobado, en los frentes de obra del municipio de Honda.
- Comités de seguimiento quincenal del componente ambiental y SST.
- Mesas de trabajo.
- Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (Contratista de obra).
- Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (Contratista de obra – e Interventoría)
- Gestión de documentos de ingreso del personal de plantilla mínima.
- Elaboración de informes semanales.

4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1. Novedades del Informe de Gestión SST y Ambiental

A la fecha de presentación del informe mensual ambiental y SST de la Interventoría No 4 v1, el informe correspondiente del Contratista de obra se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, teniendo en cuenta que fue radicado el 18 de agosto del 2025, en consecuencia, en el ANEXO 1.13 se adjunta la certificación de trazabilidad correspondiente a las labores de seguimiento, verificación y control.

4.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

4.2.1 COPASST

Dando cumplimiento a la normatividad que establece la resolución 2013 de 1986., decreto 1072 de 2015, y resolución 0312 de 2019. El Contratista de obra, cuenta con la conformación vigente del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo con los representantes por parte del empleador y representantes por parte de los trabajadores, en el informe correspondiente al periodo No. 4 del Contratista, se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría el acta correspondiente de la reunión realizada durante el periodo.

4.2.2 Comité de convivencia laboral

Para el periodo del informe, El Contratista de obra, cuenta con la conformación vigente del comité de convivencia laboral, con los representantes por parte del empleador y representantes por parte de los trabajadores, en el informe correspondiente al periodo No. 4, se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría el acta correspondiente de la reunión realizada durante el periodo.

4.2.3 Gestión de talento humano

Durante el periodo, el Contratista de obra reporta el ingreso de (21) profesionales (25) antiguos, (4) retiros, (2) ingreso / retiro, (0) inactivos.

Tabla 6 Reporte de personal – Contratista de obra

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO SSTA-11	ESTADO	APROBACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN DOC. DE INGRESO
1	William Sebastián Cuchivague Buitrago	Residente De Obra - Apoyo	10/07/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
2	Lina María Cruz Sutachan	Residente De Obra - Apoyo	16/07/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
3	Herni Arley Sánchez	Coordinador De Proyectos - Apoyo	10/07/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
4	John Jairo Arbeláez Mejía	Especialista Seguridad Vial 2	21/07/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
5	Ana Milena Cruz Sutachan	Profesional Social - Apoyo	14/07/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
6	Diógenes Bolaño Mejia	Obrero / Auxiliar De Transito	10/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
7	Carlos Alfredo Galvis Contreras	Obrero / Auxiliar De Transito	10/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
8	Deibg Duran Barchilon	Jefe De Cuadrilla	10/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
9	Diego Armando Bojacá Mendoza	Obrero / Auxiliar De Transito	10/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
10	Angela Patricia Amaya Velásquez	Obrero / Auxiliar De Transito	10/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
11	Alejandro Tabares Quintero	Obrero / Auxiliar De Transito	25/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
12	Jaider Humberto Salinas	Obrero / Auxiliar De Transito	25/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
13	Juan Bautista García Quintero	Obrero / Auxiliar De Transito	25/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
14	Edgar Fabian Perdomo	Obrero / Auxiliar De Transito	30/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO SSTA-11	ESTADO	APROBACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN DOC. DE INGRESO
15	Fabio Yesid Mazuela	Obrero / Auxiliar De Transito	30/07/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
16	Jorge Enrique Amórtegui Barreto	Obrero / Auxiliar De Transito	2/08/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
17	Marlon Enrique Amórtegui Tovar	Obrero / Auxiliar De Transito	2/08/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
18	Miguel Ángel Amórtegui Barreto	Obrero / Auxiliar De Transito	2/08/2025	Ingreso	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
19	Angie Ilioneth Jaimes Fuentes	Tecnólogo Sst - Apoyo	1/08/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
20	Gustavo Andrés Salinas Bayona	Residente De Obra - Apoyo	6/08/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
21	Roberto Carlos Heredia Galvis	Asistente Administrativo De Obra - Apoyo	4/08/2025	Ingreso	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
22	Jefferson Sebastián Cristancho Correa	Operador De Equipo	10/07/2025	Ingreso / Retiro	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
23	Orlando González	Obrero / Auxiliar De Transito	10/07/2025	Ingreso / Retiro	No aplica - MONC	Aprobados correo electrónico
24	Maira Andrea Villarreal Ortiz	Profesional Social - Apoyo	14/06/2025	Antiguo	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
25	Laura Camila Achurry Lozano	Tecnólogo SST - Apoyo	20/06/2025	Retiro	No aplica Personal apoyo	Aprobados correo electrónico
26	Yuri Rocío Pérez Salamanca	Tecnólogo SST 2	20/06/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-227 del 27/06/2025	PIV-063-Z4-312 del 15/07/2025
27	Verónica Diaz Peña	Especialista Seguridad Vial - Apoyo	21/06/2025	Antiguo	No aplica Personal apoyo	En revisión interventoría
28	Juan Carlos Sanín Jurado	Jefe De Cuadrilla - Conductor	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
29	Ronald David Amaya Arias	Operador De Equipo	26/06/2025	Retiro	No aplica - MONC	En revisión interventoría
30	Neyder Yesid Morantes Leal	Obrero / Auxiliar De Transito	26/06/2025	Retiro	No aplica - MONC	En revisión interventoría
31	John Jairo Pinzón Montes	Jefe De Cuadrilla	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
32	Cesar Alberto Prieto Acosta	Jefe De Cuadrilla - Conductor	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
33	Rodrigo Losada Ostos	Obrero / Auxiliar De Transito	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
34	Juan Daniel Triana Moreno	Obrero / Auxiliar De Transito	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
35	Luis Roberto Tamara Melo	Jefe De Cuadrilla - Conductor	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO SSTA-11	ESTADO	APROBACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN DOC. DE INGRESO
36	Dainer José Gutiérrez Olivares	Operador De Equipo	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
37	Alexander Mancilla Arrieta	Obrero / Auxiliar De Transito	26/06/2025	Antiguo	No aplica - MONC	En revisión interventoría
38	Daniel Eduardo Ariza Rodríguez	Ingeniero Ambiental	08/05/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-142 del 05/06/2025	PIV-063-Z4-147 del 07/06/2025
39	Miguel Ángel Briceño Velosa	Tecnólogo SST	08/05/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-142 del 05/06/2025	PIV-063-Z4-147 del 07/06/2025
40	Belky Daniela Alejandra Téllez Ibáñez	Profesional Social	08/05/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-171 del 12/06/2025	PIV-063-Z4-171 del 12/06/2025
41	Madeleine Porras Meza	Tecnólogo SIG	08/05/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-224 del 27/06/2025	PIV-063-Z4-276 del 07/07/2025
42	Mónica Lorena Aponte Marín	Dibujante	08/05/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-224 del 27/06/2025	PIV-063-Z4-276 del 07/07/2025
43	Anyi Katherine Neira Castañeda	Profesional Social	01/06/2025	Antiguo	PIV-063-Z4-142 del 05/06/2025	PIV-063-Z4-147 del 07/06/2025
44	Jairo Andrés Acosta Aristizábal	Director De Obra	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
45	Yuli Jaramillo Bolaño	Especialista Seguridad Vial 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
46	Javier Humberto González Cucaita	Especialista Seguridad Vial 2	08/04/2025	Retiro	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
47	Fernando Jaimes Tarazona	Especialista En Pavimentos	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
48	Billy Yoel Martínez Vargas	Residente De Obra 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
49	Juan Sebastián Pachón García	Residente De Obra 2	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
50	Camilo Andrés Villamizar Castellano	Auxiliar De Ingeniería 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-012-MAR-2025 del 19/03/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
51	Jisela Rojas Mendoza	Auxiliar De Ingeniería 2	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025
52	Santiago Andrés Jaimes Blanco	Dibujante 1	08/04/2025	Antiguo	PIV-010-FEB-2025 del 28/02/2025	PIV-063-Z4-121 del 23/05/2025

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

4.2.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Informe mensual No. 4 - Durante el periodo, el Contratista de obra no reportó ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Tabla 7 Registro de accidentes laborales – Contratista de obra

No.	Fecha	Trabajador	Cargo	Incapacidad (Días)	Estado
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 3					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 4					

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

4.2.5 Incapacidades

Informe mensual No. 4 Durante el periodo, el Contratista de obra no reportó novedades de incapacidades en el personal activo.

Tabla 8 Registro de incapacidades – Contratista de obra

Nombre del colaborador	Cargo	Origen de incapacidad	Días generados
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 3			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 4			

4.2.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes


El Contratista de obra, para el periodo del informe, relaciona en el formato SSTA -11 el reporte de personal, (21) profesionales (25) antiguos, (4) retiros, (2) ingreso / retiro, (0) inactivos., para los profesionales se verifica el pago de aportes al SGSS, por parte de la interventoría, así como los pagos de cotización a la ARL del personal de prestación de servicios, a la fecha se encuentran observados los anexos reportados por el contratista de obra.

En el informe mensual del Contratista de obra, se entrega la respectiva certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales del personal reportado, firmada por el representante legal, no obstante, se solicitó que se adjunte la trazabilidad de pagos salarios u honorarios y aportes.

4.2.7 Indicadores SST

El contratista reporta los indicadores reportados en la figura, sin embargo, se encuentran en revisión por esta Interventoría:

Figura 2 Indicadores de gestión – Contratista de obra

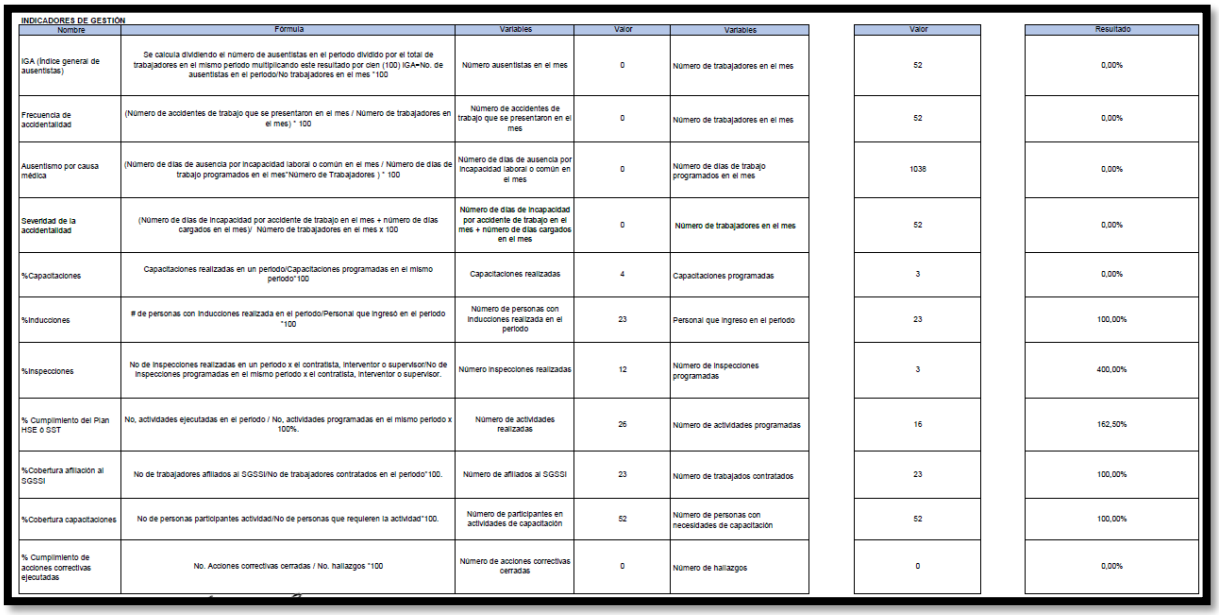

INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre	Fórmula	Variables	Valor	Variables	Valor	Resultado
IGA (Indice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	Número ausentistas en el mes	0	Número de trabajadores en el mes	52	0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	Número de trabajadores en el mes	52	0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes	1038	0,00%
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes	0	Número de trabajadores en el mes	52	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	4	Capacitaciones programadas	3	0,00%
%Inducciones	# de personas con inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	Número de personas con inducciones realizada en el periodo	23	Personal que ingreso en el periodo	23	100,00%
%Inspecciones	No de inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	Número inspecciones realizadas	12	Número de inspecciones programadas	3	400,00%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	26	Número de actividades programadas	16	162,50%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	Número de afiliados al SGSSI	23	Número de trabajados contratados	23	100,00%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	Número de participantes en actividades de capacitación	52	Número de personas con necesidades de capacitación	52	100,00%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos	0	0,00%

Fuente Contratista de obra

4.2.8 Inducciones y notificaciones de riesgo

El Contratista de obra durante el periodo del informe presentado, realiza el proceso de inducción y notificación de riesgo al personal reportado como ingreso, por lo tanto, adjunta el certificado de cumplimiento de documentos de ingreso en el formato SSTA-14, adicionalmente adjunta los soportes para efectos de validación de esta Interventoría, el anexo se encuentra en revisión por esta interventoría.


4.2.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal

Durante el periodo evaluado, el Contratista de obra no presenta soportes de entrega de elementos de protección personal a los colaboradores vinculados, sin embargo, se generó la observación, solicitando los soportes correspondientes de entrega al personal que realizó las visitas en campo, con el fin de verificar la entrega de los EPP y dotación de acuerdo con la matriz de EPP establecida para el contrato.

4.2.10 Seguimiento plan de trabajo

El contratista remitió el plan de trabajo tal como se muestra en la figura 2 reportando para el periodo que se programaron (16) actividades, y (26) fueron ejecutadas, para un cumplimiento del plan de trabajo SGSST del 162,50%, sin embargo, el anexo se encuentra en revisión por esta interventoría.

Figura 3 Plan de trabajo – Contratista de obra

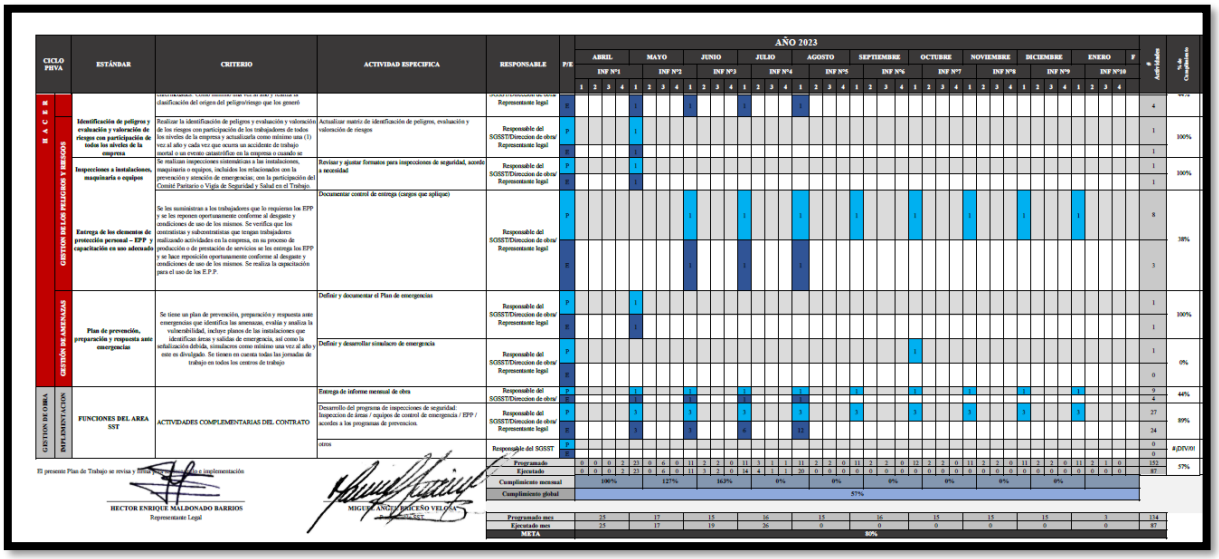


Fuente Contratista de obra

4.2.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones

El contratista remitió el plan de capacitación tal como se muestra en la figura 4 reportando que programaron 7 actividades y se ejecutan 7, para un cumplimiento del cronograma de capacitaciones del 100%, sin embargo, el mismo se encuentra en revisión

Figura 4 Cronograma de capacitaciones – Contratista de obra

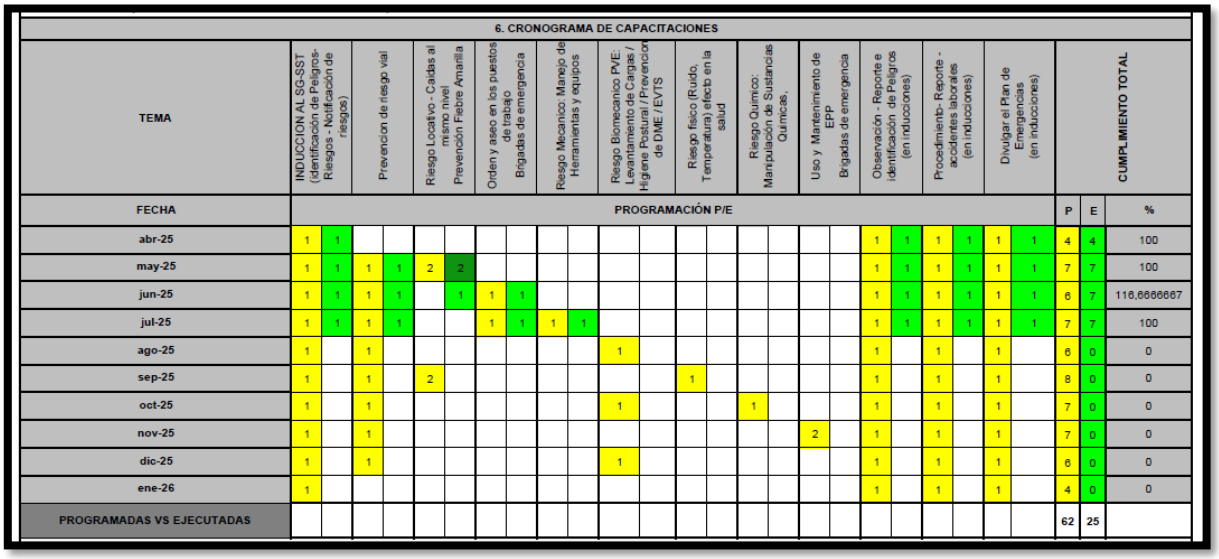

6. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

TEMA	INDUCCION AL SG-SST (Identificación de Peligros-Riesgos - Notificación de riesgos)		Prevencion de riesgo vial		Riesgo Locativo - Caidas al mismo nivel Prevención Fiebre Amarilla		Orden y aseo en los puestos de trabajo Brigadas de emergencia		Riesgo Mecanico: Manejo de Herramientas y equipos		Riesgo Biomecanico PVE: Levantamiento de Cargas / Higiene Postural / Prevención de DME / EVTS		Riesgo fisico (Ruido, Temperatura) efecto en la salud		Riesgo Quimico: Manipulación de Sustancias Químicas.		Uso y Mantenimiento de EPP Brigadas de emergencia		Observación - Reporte e identificación de Peligros (en inducciones)		Procedimiento- Reporte - accidentes laborales (en inducciones)		Divulgar el Plan de Emergencias (en inducciones)		CUMPLIMIENTO TOTAL		
FECHA	PROGRAMACIÓN P/E																								P	E	%
abr-25	1	1																	1	1	1	1	1	1	4	4	100
may-25	1	1	1	1	2	2													1	1	1	1	1	1	7	7	100
jun-25	1	1	1	1		1	1	1											1	1	1	1	1	1	6	7	116,6666667
jul-25	1	1	1	1			1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	7	7	100
ago-25	1		1								1								1		1		1		6	0	0
sep-25	1		1		2								1						1		1		1		8	0	0
oct-25	1		1								1				1				1		1		1		7	0	0
nov-25	1		1														2		1		1		1		7	0	0
dic-25	1		1								1								1		1		1		6	0	0
ene-26	1																		1		1		1		4	0	0
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS																									62	25	

4.3. Gestión ambiental

4.3.1 Plan de Manejo Ambiental

El día 18 de agosto de 2025 por medio del comunicado CE-CSC-ADM-0502, se recibió el informe de Gestión SST y Ambiental numero 4 correspondiente al periodo del 08 de julio al

07 agosto de 2025, se encuentra en revisión por esta interventoría, con el fin de validar que cuente con el LLENO DE REQUISITOS solicitados en la lista de chequeo suministrado por la ANSV y que son objeto de revisión de esta interventoría, en consecuencia en el ANEXO 1.13 se adjunta la certificación de trazabilidad correspondiente a las labores de seguimiento, verificación y control.

4.3.2 Comités y mesas de trabajo

El Contratista de obra y la interventoría, asisten a los comités semanales con ANSV, de igual forma, se realizan los comités del componente ambiental y SST programados quincenalmente, para el periodo se ejecutaron los siguientes:

Tabla 9 Seguimiento a comités y mesas de trabajo.

Participantes	Fecha	Tema
Contratista -Interventoría	21-07-2025	Revisión de pendientes del componente ambiental y SST.
Contratista- Interventoría	04-08-2025	Se revisan los pendientes del componente ambiental y SST.

4.3.3 Recorridos y visitas de inspección

Durante el presente periodo, para las actividades del Contratista de obra, e Interventoría continúan las visitas de inspección de campo ya que se realiza inicio de actividades de obra

Así mismo, desde el componente ambiental se continua con la identificación de sumideros y zonas arbóreas en las zonas de influencia, para el periodo presentado se cuenta con concepto de aprobación por parte de la interventoría, del inventario de sumideros y especies forestales emitidos por el Contratista, de 5 municipios Espinal, Honda, Supía, Girardot y Soacha, este último de los puntos identificados como 25754-016 y 25754-026 (Ver Anexo 1.11 – Inventario de sumideros.)

Desde el componente SST se verifica el suministro de los EPP necesarios para las actividades de inspección, se verificó que el personal del Contratista contara con la previa aprobación por parte de esta Interventoría y adicionalmente, que contarán con la dotación y EPP mínimos necesarios, de igual forma, se realizan visitas de inspección para validar la maquinaria, equipo y vehículos presentados por el Contratista.

4.3.4 Estado de permisos, tramites y licencias ambientales.

Durante el periodo evaluado, el Contratista de obra realiza los respectivos trámites ante las autoridades ambientales competentes (AAC), con el fin de verificar la necesidad de contar con licencias o permisos ambientales para la ejecución del proyecto. Como resultado de dicha gestión, las entidades informaron que no se requieren licencias ni permisos, en atención a la naturaleza de las actividades y conforme a la normativa ambiental vigente.

En cuanto a las respuestas obtenidas en periodos anteriores por parte de las Autoridades Ambientales Competentes (AAC) corresponden a los municipios de Manizales, Supía,

Soacha, Caparrapí, Yacopí, Girardot y Mosquera, sin embargo, para el periodo comprendido entre el 08 de julio del 2025 al 07 de agosto 2025, se presentan los conceptos emitidos ante las respuestas de las AAC, los cuales fueron aprobados por la Interventoría y se realizó el traslado a la entidad ANSV para sus fines pertinentes de los municipios de Espinal, Armenia, Circasia, (Ver Anexo 1.12 Gestión AAC)

La Interventoría continúa realizando el seguimiento a la gestión adelantada por el Contratista ante la autoridad ambiental competente (AAC), con el fin de verificar la respuesta remitida por el municipio de Honda, el cual se encuentra pendiente.

4.3.5 Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio

Durante el periodo evaluado, se realizó seguimiento a manejo ambiental de campamentos y centros de acopio, en el municipio de Honda, mediante el informe remitido el día 18 de agosto de 2025 por medio del comunicado CE-CSC-ADM-0502, se revisarán los soportes correspondientes remitidos por el Contratista.

4.3.6 Generación, manejo y disposición de residuos (RCD-RESPEL-ORDINARIOS Y RECICLABLES)

Durante el periodo reportado, la Interventoría realiza seguimiento al manejo de materiales de construcción, generación, manejo y disposición final de residuos sólidos (RCD y peligrosos), sin embargo, una vez el Contratista de obra radique los soportes de disposición final de los residuos correspondientes, serán remitidos a la entidad.

En cuanto al manejo y disposición de residuos ordinarios y reciclables, el Contratista de obra, cuenta con el punto ecológico de acuerdo con el código de colores y la normatividad en materia ambiental, para la oficina administrativa, para el taller / bodega presentada a la Interventoría en Bogotá y en el taller utilizado como acopio de materiales en el municipio de Honda.

4.3.7 Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Durante el periodo reportado, no se realizaron actividades relacionadas con el manejo integral de cuerpos de agua; sin embargo, se efectuó seguimiento en el Informe Mensual Ambiental y SST No. 4 presentado por el Contratista, en lo referente a la infraestructura de acueducto y alcantarillado, precisando que durante el periodo presentado se garantizaron condiciones óptimas, su funcionamiento y las acciones de mantenimiento o mejora requeridas por la construcción de resaltos parabólicos e implementación de medidas de seguridad vial

4.3.8 Manejo de la vegetación y paisajismo.

Durante el periodo evaluado, no se realizaron actividades de manejo de vegetación, control de cobertura vegetal, ni intervenciones de paisajismo, durante la intervención de las actividades de obra. Por tanto, este ítem no aplica para el periodo reportado.

4.3.9 Unidades sanitarias

El Contratista de obra, de acuerdo con lo reportado a esta Interventoría, cuenta con unidades sanitarias disponibles para el uso del personal. Estas se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento y limpieza, tanto en las instalaciones del taller como en la oficina administrativa.

En cuanto a las unidades requeridas para los frentes de obra, se realiza seguimiento a la unidad sanitaria presentada en las instalaciones de Honda, sin embargo, en la revisión y verificación del informe mensual ambiental y SST No 4 se revisarán los soportes requeridos de la evidencia de cumplimiento del ítem presentado.

4.3.10 Seguimiento cronograma de actividades.

Durante el periodo, el cronograma de actividades para el componente ambiental se encuentra aprobado por esta Interventoría, sin embargo, el avance de la gestión del cronograma en el informe de gestión Ambiental y SST No 4 del Contratista de obra, se encuentra en proceso de revisión.

5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE LA INTERVENTORÍA

5.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.1.1 COPASST

Dando cumplimiento con lo estipulado en la normatividad legal vigente, el comité se encuentra conformado por 2 integrantes por parte de los colaboradores y 2 integrantes por parte del empleador, de igual forma, los miembros del COPASST de PIV Ingeniería SAS, se encuentran capacitados en aspectos relacionados con sus funciones y responsabilidades.

La última reunión del Comité se llevó a cabo el 31 de julio del 2025.

A continuación, se presentan los integrantes que conforman el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo:

Figura 5 Integrantes del COPASST



5.1.2 Comité de convivencia laboral

Dando cumplimiento con lo estipulado en la normatividad legal vigente, el comité de convivencia laboral de PIV Ingeniería SAS se encuentra conformado por 2 integrantes por parte de los colaboradores y 2 integrantes por parte del empleador, de igual forma, los miembros del Comité se encuentran capacitados en el marco legal de la Ley 1010 de 2006 y medidas de prevención de conductas de hostigamiento y/o acoso laboral.

La reunión trimestral se realiza durante el periodo presentado (Ver anexo 1.6)

A continuación, se presentan los integrantes que conforman el comité de convivencia laboral:

Figura 6 Integrantes del CCL



5.1.3 Gestión de talento humano

Para el periodo presentado, se adjunta el formato SSTA-11 Reporte de personal **(**Ver anexo 1.3**),** de igual forma, a continuación, se presenta los profesionales activos

Tabla 10 Reporte de personal -Interventoría

REPORTE DE PERSONAL INTERVENTORÍA					
ACTIVO DURANTE EL PERIODO					
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Fecha de ingreso**	**Aprobación Hoja de vida**	**Aprobación Doc. de ingreso**
1	KAREN LORENA NAVARRO PEREZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	8/05/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000048291 del 27/05/2025
2	JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	08/04/2025	Radicado No. 20253000040681 del 12/05/2025	Radicado No. 20253000048291 del 27/05/2025
3	OCTAVIO ALFONSO MILLAN FLECHAS	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	08/04/2025	Radicado No. 20253000043931 del 16/05/2025	Radicado No. 20253000048291 del 27/05/2025
4	JASMIN JEZENIA RINCÓN VILLEGAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000036891 del 28/04/2025
5	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ HENAO	ING. AUXILIAR Y DE APOYO	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000036891 del 28/04/2025
6	ALEXANDRA GIRALDO RUIZ	PROFESIONAL SOCIAL	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No 20253000042211 del 13/05/2025

REPORTE DE PERSONAL INTERVENTORÍA					
ACTIVO DURANTE EL PERIODO					
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Fecha de ingreso**	**Aprobación Hoja de vida**	**Aprobación Doc. de ingreso**
7	ESTEFANÍA OSORIO CUARTAS	TECNÓLOGO SST	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No. 20253000036891 del 28/04/2025
8	ANGIE MARYETH VANEGAS SAENZ	INGENIERA AMBIENTAL	08/04/2025	Radicado No. 20253000019741 del 05/03/2025	Radicado No 20253000042211 del 13/05/2025
9	HEYDER ANDREY QUINTERO GIRALDO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	16/06/2025	Radicado No. 0253000055631 del 13/06/2025	Radicado No 20253000060231 del 26/06/2025

Durante el periodo, la Interventoría, no reporta ingreso de profesionales, se reportan (9) antiguos, (0) retiros, (0) ingreso / retiro y (0) inactivos.

5.1.4 Accidentes, incidentes y enfermedades laborales

Informe mensual No. 4 - Durante el periodo, la Interventoría no presentó accidentes, incidentes ni enfermedades laborales

Tabla 11 Registro de accidentes - Interventoría

No.	Fecha	Trabajador	Cargo	Incapacidad (Días)	Estado
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 3					
NO SE REPORTAN ACCIDENTES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 4					

5.1.5 Incapacidades

Informe mensual No. 4 Durante el periodo, la Interventoría, no reporta incapacidades con el personal activo.

Tabla 12 Registro de incapacidades – Interventoría

Nombre del colaborador	Cargo	Origen de incapacidad	Días generados
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 1			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 2			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 3			
NO SE REPORTAN INCAPACIDADES DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST No 4			

5.1.6 Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes.

Durante el periodo, la interventoría se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre PIV ingeniería y los profesionales que hacen parte de la plantilla mínima con quienes se ha firmado compromisos para el cumplimiento del objeto del contrato en mención, pagos de salarios u honorarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones, adicionalmente PIV ingeniería manifiesta estar al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo tanto, se adjunta la certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales en el formato SSTA-12. **(**Ver anexo 1.1**)**.

De igual forma se adjuntan planillas de seguridad social del personal activo de Interventoría, incluyendo el pago de aportes a ARL para cada profesional, planillas vigentes a la fecha de presentación del informe mensual No 4. **(**Ver anexo 1.2**)**.

5.1.7 Indicadores SST.

A continuación, se presentan los principales indicadores de cumplimiento de la Interventoría para este periodo, los cuales se puede evidenciar en el anexo 1.7:

Figura 7 Indicadores SST de la Interventoría

Indicadoreso SST - Contrato de Interventoría PA-013-2025

Año	2025
Contrato	Contrato de Interventoría PA-013-2025
Periodo	08 de julio del 2025 al 07 de agosto 2025
Número de trabajadores en el mes	9

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	Número ausentistas en el mes	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes	189	0,00%
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	0	Número de días cargados en el mes	0	0,00%
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	0	Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el	0	0,00%
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	0	Promedio de trabajaodores	9	0,00%
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	0	Promedio de trabajadores	9	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	1	Capacitaciones programadas	1	100%
%Inducciones	No. de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	Número de personas con Inducciones realizada en el periodo	0	Personal que ingresó en el periodo	0	
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo /No de inspecciones programadas en el mismo periodo	Número inspecciones realizadas	1	Número de inspecciones programadas	1	100%
% Cumplimiento del plan de trabajo SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	17	Número de actividades programadas	18	94%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	Número de afiliados al SGSSI	9	Número de trabajados contratados	9	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos	0	0%

5.1.8 Inducciones y notificaciones de riesgo

Durante el periodo, no aplica la realización de actividades correspondientes al proceso de inducción ya que no se presenta personal de ingreso. **(**Ver anexo 1.5**)** Se adjunta soporte de no aplicabilidad durante el periodo del informe presentado

5.1.9 Entrega / reposición de elementos de protección personal

Durante el periodo del informe presentado se realiza la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de actividades en obra, con el fin de garantizar la protección de los colaboradores que se encuentran ejecutando actividades de campo. (Ver anexo 1.6)

5.1.10 Seguimiento plan de trabajo

En el marco del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la Interventoría, se planearon un total de 17 actividades de 18 planeadas, cumpliendo con un porcentaje de cumplimiento del 94%. De este modo, se reprograma la ejecución de 1 actividad para los meses posteriores, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos. (Ver anexo 1.6)

Tabla 13 Plan de trabajo - Interventoría

MES 4			
Ítem	Actividad/ Tema	Julio	
		Planeado	Ejecutado
1	Inducción	1	1
2	Realización de exámenes de ingreso, retiro y post incapacidad y recomendaciones médicas ocupacionales	1	1
3	Realización de exámenes médicos periódicos y entrega de recomendaciones médicas ocupacionales	1	1
4	Seguimiento a recomendaciones de salud	1	1
5	Asesoría profesional ARL, reunión de seguimiento de ejecución de actividades	1	1
6	Entrega de EPP	1	1
7	Inspección de EPP	1	1
8	Revisión y actualización de inventario de sustancias químicas	1	1
9	Gestión del cambio	1	1
10	Dotación de la brigada	1	1
11	Inspección de vehículos	1	1
12	Reunión Comité de convivencia laboral	1	1
13	Reunión Comité COPASST	1	1
14	Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo	1	1
15	Seguimiento a reporte mensual de actos y condiciones inseguras	1	1

MES 4			
Ítem	Actividad/ Tema	Julio	
		Planeado	Ejecutado
16	Pausas Activas	1	1
17	Rumboterapia- Actividades Dinámicas - Kick boxing	1	R
18	Medición de indicadores y toma acciones correspondientes	1	1
TOTAL DE ACTIVIDADES		18	17
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		94%	

Tabla 14 Plan de acción - Interventoría

Análisis de cumplimiento plan de trabajo	Periodo evaluado	Plan de Acción				
		Actividad	Responsable	Fecha máxima	Seguimiento	Eficacia de las acciones
Durante el mes de julio del 2025 se ejecutaron 17 actividades de 18 programadas para un cumplimiento del 94% 1 actividad reprogramada	Julio 2025	Reprogramar Rumboterapia- Actividades Dinámicas - Kick boxing	Maryeth Vanegas	Septiembre del 2025	Octubre del 2025	Gestionar con proveedor de la ARL la realización de la actividad pendiente por ejecutar

5.1.11 Seguimiento cronograma de capacitaciones

Para el Contrato de Interventoría, se ejecutó una (1) capacitación dentro del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual fue planificada previamente. La actividad se llevó a cabo según lo establecido, cumpliendo con el objetivo de formar al personal en los aspectos fundamentales de la seguridad y salud laboral. (Ver anexo 1.6)

Tabla 15 Cumplimiento cronograma de capacitaciones – Interventoría

Objetivo	Contenido temático	Capacitación	Dirigida a	Programa	Capacitador	Programado	ejecutado
Brindar herraminetas suficientes para el manejo del riesgo biologico por contagio de fiebre amarilla	Manejo del cuadro infeccioso Sintomas comunes Reporte de sintomas Manejo	Modos de transmisión reporte de síntomas de la fiebre amarilla	Trabajadores-contratistas-subcontratistas	Riesgo biologico	ARL	1	1
TOTAL						1	1
Porcentaje de Cumplimiento						100%	
Meta						85%	

5.1.12 Estado de productos, informes semanales e informes mensuales de la Interventoría.

Tabla 16 Productos ambientales y SST- Interventoría

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO - INTERVENTORÍA	No. Y FECHA DE RESPUESTA ANSV	CONCEPTO DE LA ANSV
SG SST	PIV-063-Z4-085 con radicado ANSV No. 20256600036382 del 12/05/2025	Radicado No. 20253000043831 del 16/05/2025	Aprobado v2
Informe mensual ambiental y SST No 1	PIV-063-Z4-149 con radicado ANSV No. 20256600045602 del 10/06/2025	Radicado No 20253000054011 10/06/2025	Aprobado v2
Informe mensual ambiental y SST No 2	PIV-063-Z4-297 con radicado ANSV 20256600053982 del 11/07/2025	Radicado No 20253000066671 del 11/06/2025	Aprobado v2
Informe mensual ambiental y SST No 3	PIV-063-Z4-425 con radicado ANSV 20256600062042 Del 08/08/2025	Radicado No 20253000078701 del 08/08/2025	Aprobado v2
Informe mensual ambiental y SST No 4	Correo electrónico 13/08/2025	Obs correo electrónico 29/08/2025	En atención de observaciones Interventoría
Informe semanal 1	PIV-063-Z4-016 con radicado ANSV No. 20256600029502 del 15/04/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 2	PIV-063-Z4-024 con radicado ANSV No 20256600030612 del 22/04/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 3	PIV-063-Z4-034 con radicado ANSV No 20256600032532 del 29/04/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 4	PIV-063-Z4-056 con radicado ANSV No 20256600034292 del 06/05/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 5	PIV-063-Z4-088 con radicado ANSV No 20256600036812 del 13/05/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 6	PIV-063-Z4-101 20/05/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 7	PIV-063-Z4-126 27/05/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 8	PIV-063-Z4-129 03/06/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 9	PIV-063-Z4-156 10/06/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 10	PIV-063-Z4-187	Entregado	Sin observaciones

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO - INTERVENTORÍA	No. Y FECHA DE RESPUESTA ANSV	CONCEPTO DE LA ANSV
	17/06/2025		
Informe semanal 11	PIV-063-Z4-204 24/06/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 12	PIV-063-Z4-237 01/07/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 13	PIV-063-Z4-284 08/07/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 14	PIV-063-Z4-309 08/07/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 15	PIV-063-Z4-347 22/07/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 16	PIV-063-Z4-393 29/07/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 17	PIV-063-Z4-424 07/08/2025	Entregado	Sin observaciones
Informe semanal 18	PIV-063-Z4-458 12/08/2025	Entregado	Sin observaciones

6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA

6.1 Estado de productos, informes semanales, informes mensuales

Tabla 17 Productos ambientales y SST – Contratista de obra

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO CONTRATISTA DE OBRA	ESTADO	No. Y FECHA DE RESPUESTA INTERVENTORÍA	CONCEPTO DE LA ANSV
SG SST	CE-CSC-ADM-0106 del 29/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-127 30/05/2025	No aplica
PMA	CE-CSC-ADM-0109 del 01/06/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-136 del 03/06/2025	No aplica
Informe mensual ambiental y SST No 1	CE-CSC-ADM-0116 y CE-CSC-ADM-0127 del 06/06/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-148 del 08/06/2025	No aplica
Informe mensual ambiental y SST No 2	CE-CSC-ADM-0340 del 18/07/2025 Alcance oficio CE-CSC-ADM-0319 de 16/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-333 del 21/06/2025	No aplica
Informe mensual ambiental y SST No 3	CE-CSC-ADM-0434 del 08/08/2025	Observado	PIV-063-Z4-441 del 08/08/2025	No aplica
Informe mensual ambiental y SST No 4	CE-CSC-ADM-0588 del 26/08/2025	En revisión v2	Pendiente	No aplica
Informe semanal 1	CE-CSC-ADM-0033 del 26/04/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-038 del 28/04/2025	No aplica
Informe semanal 2	CE-CSC-ADM-0034 del 27/04/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-039 del 28/04/2025	No aplica

PRODUCTO	No. Y FECHA DE RADICADO CONTRATISTA DE OBRA	ESTADO	No. Y FECHA DE RESPUESTA INTERVENTORÍA	CONCEPTO DE LA ANSV
Informe semanal 3	CE-CSC-ADM-0063 del 09/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-092 del 15/05/2025	No aplica
Informe semanal 4	CE-CSC-ADM-0095 del 22/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-114 del 29/05/2025	No aplica
Informe semanal 5	CE-CSC-ADM-0085 del 16/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-111 del 21/05/2025	No aplica
Informe semanal 6	CE-CSC-ADM-0087 del 19/05/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-165 del 12/06/2025	No aplica
Informe semanal 7	CE-CSC-ADM-0118 del 05/06/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-166 del 12/06/2025	No aplica
Informe semanal 8	CE-CSC-ADM-0242 del 01/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-271 del 14/07/2025	No aplica
Informe semanal 9	CE-CSC-ADM-0236 del 01/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-272 del 14/07/2025	No aplica
Informe semanal 10	CE-CSC-ADM-0235 del 1/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-304 del 14/07/2025	No aplica
Informe semanal 11	CE-CSC-ADM-0274 del 04/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-305 del 15/07/2025	No aplica
Informe semanal 12	CE-CSC-ADM-0343 del 18/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-389 del 28/07/2025	No aplica
Informe semanal 13	CE-CSC-ADM-0419 del 31/07/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-412 del 04/08/2025	No aplica
Informe semanal 14	CE-CSC-ADM-0424 del 01/08/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-413 del 04/08/2025	No aplica
Informe semanal 15	CE-CSC-ADM-0425 del 01/08/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-481 del 21/08/2025	No aplica
Informe semanal 16	CE-CSC-ADM-0470 del 11/08/2025	Aprobado	PIV-063-Z4-482 del 21/08/2025	No aplica
Informe semanal 17	CE-CSC-ADM-0435 del 28/07/2025	Observado	PIV-063-Z4-520 del 29/08/2025	No aplica
Informe semanal 18	CE-CSC-ADM-0472 del 11/08/2025	Observado	PIV-063-Z4-521 del 29/08/2025	No aplica

6.2 Relación de reuniones y mesas de trabajo desarrolladas en el periodo

Tabla 18 Relación de reuniones y mesas de trabajo

Participantes	Fecha	Tema
Contratista -Interventoría	21-07-2025	Revisión de pendientes del componente ambiental y SST.
Contratista- Interventoría	04-08-2025	Se revisan los pendientes del componente ambiental y SST.

6.3 Relación de correspondencia enviada y recibida entre las partes

Tabla 19. Correspondencia enviada

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
PIV-063-Z4-278	8/07/2025	Remisión de documentos de personal de plantilla mínima del Contrato de obra No. PA – 026 – 2025	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-280	8/07/2025	Respuesta comunicados CE-CSC-ADM-0275 Estado solicitudes elevadas a Autoridades Ambientales Competentes	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-282	8/07/2025	Respuesta comunicado CE-CSC-ADM-0280. Permisos de Autoridad Ambiental Competente para los puntos de Manizales y Supía.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-289	9/07/2025	Respuesta al comunicado CE-CSC-ADM-0293 del 09 de julio del 2025. Visitas de inspección de maquinaria y equipos del 11 de julio	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-290	10/07/2025	Respuesta comunicado CE-CSC-ADM-0294. Permisos de Autoridad Ambiental Competente para los puntos de Armenia y Circasia	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-291	10/07/2025	Aprobación gestión de permisos Autoridades Ambientales Competentes (AAC) de los puntos a intervenir	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-292	10/07/2025	Aprobación gestión de permisos Autoridades Ambientales Competentes (AAC) de los puntos a intervenir	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
PIV-063-Z4-312	15/07/2025	Respuesta al comunicado CE-CSC-ADM-0295 del 10 de julio del 2025. Aprobación documentos de ingreso Yuri Rocío Pérez Salamanca – Tecnólogo SST del Contratista de obra	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-313	15/07/2025	Remisión de documentos de personal de plantilla mínima del Contrato de obra No. PA – 026 – 202	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-315	15/07/2025	Vinculación de personal no calificado de la región.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-316	15/07/2025	Respuesta comunicado CE-CSC-ADM-0299 y Alcance comunicado CE-CSC-ADM-0302 Inventario de Sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes municipio de Supía versión 1, Departamento de Caldas.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-335	21/07/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0350 del 21 de julio. Aprobación a la hoja de vida del Especialista en Tránsito y Seguridad Vial No. 2.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-337	21/07/2025	Respuesta a los comunicados CE-CSC-ADM-00317 del 16 de julio 2025, CE-CSC-ADM 0293 del 09 de julio 2025. Documentos maquinaria, equipos y vehículos del Contratista de obra.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-350	23/07/2025	Respuesta comunicado CE-CSC-ADM-0345 Inventario de Sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes municipio de Girardot versión 1, Departamento de Cundinamarca	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
PIV-063-Z4-351	23/07/2025	Aprobación Inventario de Sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes Municipio de Girardot versión 1, Departamento de Cundinamarca	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-352	23/07/2025	Aprobación Inventario de Sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes Municipio de Supía versión 1, Departamento de Caldas	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-372	25/07/2025	Respuesta al comunicado CE-CSC-ADM-0368 del 23 de julio del 2025. Observaciones en los documentos de ingreso John Jairo Arbeláez Mejía – Especialista de Tránsito y Seguridad Vial del Contrato de obra	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-378	25/07/2025	Respuesta a su comunicado 20253000062721 del 03 de julio del 2025. Remisión examen médico ocupacional Director de Interventoría	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-379	25/07/2025	Respuesta a sus comunicados CE-CSC-ADM-0313 del 15 de julio del 2025 y CE-CSCADM-0380 del 24 de julio del 2025. Concepto personal de cuadrillas para la implementación de medidas de seguridad vial	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-380	25/07/2025	Remisión de documentos de personal de plantilla mínima del Contrato de obra No. PA – 026 – 2025	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-382	25/07/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0381 del 24 de julio del 2025. Concepto documentos maquinaria, equipos y vehículos	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-399	31/07/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0417 del 30 de julio. Documentos de ingreso de vehículo de apoyo EQQ389 del Contrato de Obra PA-026-2025	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
PIV-063-Z4-400	31/07/2025	Respuesta a su comunicado CE-CSC-ADM-0399 del 28 de julio del 2025. Concepto personal de cuadrillas para la implementación de medidas de seguridad vial	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-401	31/07/2025	Remisión de documentos de personal de plantilla mínima del Contrato de obra No. PA – 026 – 2025	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos
PIV-063-Z4-414	5/08/2025	Llamado de atención Acopio y disposición de RCD – Municipio de Honda	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-417	5/08/2025	Respuesta al comunicado CE-CSC-ADM-0436 del 05 de agosto del 2025. Aprobación documentos de ingreso John Jairo Arbeláez Mejía – Especialista de Tránsito y Seguridad Vial del Contratista de obra	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Héctor Enrique Maldonado Barrios Representante Legal Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
PIV-063-Z4-418	5/08/2025	Remisión de documentos de personal de plantilla mínima del Contrato de obra No. PA – 026 – 2025.	ANSV WILLIAM ANDRÉS PEDRAZA BEDOYA Supervisor del Contrato Dirección de infraestructura y vehículos

Tabla 20. Correspondencia recibida

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
CE-CSC-ADM-0293	9/07/2025	OBSERVACIONES MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATISTA DE OBRA. RESPONDE COMUNICADO PIV-063-Z4-253	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0294	9/07/2025	Estado de solicitudes elevadas a Autoridades Ambientales Competentes. Remisión concepto CRQ, Municipios Armenia y Circasia.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0295	10/07/2025	RESPUETA COMUNICADO PIV-063-Z4-277 DEL 7 DE JULIO DE 2025 - RESPUESTA AL	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
		COMUNICADO CE-CSC-ADM-0267 DEL 03 DE JULIO DEL 2025. OBSERVACIONES EN LOS DOCUMENTOS DE INGRESO YURI ROCÍO PÉREZ SALAMANCA – TECNÓLOGO SST DEL CONTRATO DE OBRA.	
CE-CSC-ADM-0299	10/07/2025	Inventario de sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes de la zona de influencia, previa intervención, Municipio de Supía, Departamento de Caldas.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0300	10/07/2025	Respuesta comunicado PIV-063-Z4-289 visitas de inspección de maquinaria y equipos	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0302	11/07/2025	Alcance oficio CE-CSC-ADM-0299 de 10 de julio de 2025. Inventario de sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes de la zona de influencia, previa intervención, Municipio de Supía, Departamento de Caldas.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0303	11/07/2025	Alcance oficio CE-CSC-ADM-0300 de 10 de julio de 2025. Visita inspección maquinaria y Equipos.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0313	15/07/2025	RESPUESTA COMUNICADO PIV-063Z4-257 DEL 3 DE JULIO DE 2025 - RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CSC-ADM-0229 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025. OBSERVACIONES PERSONAL DE CUADRILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL. :	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0317	16/07/2025	PRESENTACIÓN DOCUMENTOS DE INGRESO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0340	18/07/2025	Alcance oficio CE-CSC-ADM-0319 de 16 de julio de 2025. Respuesta a su comunicado PIV-063-Z4-286 de 08 de julio de 2025. Observaciones Informe	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
		mensual ambiental y SST No. 2 versión 2.	
CE-CSC-ADM-0345	18/07/2025	Inventario de sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes de la zona de influencia, previa intervención, Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0350	21/07/2025	RESPUESTA COMUNICADO PIV-063-Z4-226 RESPUESTA A SU COMUNICADO CE-CSC-ADM-0203 DEL 20 DE JUNIO. OBSERVACIONES A LA HOJA DE VIDA DEL ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NO. 2.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0368	23/07/2025	RESPUETA COMUNICADO PIV-063-Z4-335 DEL 21 DE JULIO DE 2025 - RESPUESTA A SU COMUNICADO CE-CSC-ADM-0350 DEL 21 DE JULIO. APROBACIÓN A LA HOJA DE VIDA DEL ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NO. 2.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0373	23/07/2025	SOLICITUD DE REGISTRO DE VACANTES LABORALES PARA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. MUNICIPIO DE MOSQUERA	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Belky Daniela Alejandra Téllez Ibáñez Profesional social y de comunicaciones
CE-CSC-ADM-0374	24/07/2025	SOLICITUD DE REGISTRO DE VACANTES LABORALES PARA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. MUNICIPIO DE SOACHA.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Belky Daniela Alejandra Téllez Ibáñez Profesional social y de comunicaciones
CE-CSC-ADM-0379	24/07/2025	Establecimiento fechas presentación de Inventarios de sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes de la zona de influencia, previa intervención, Municipios de Soacha y Mosquera, Departamento de Cundinamarca.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0380	24/07/2025	PRESENTACIÓN PERSONAL DE CUADRILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
CE-CSC-ADM-0381	24/07/2025	RESPUESTA A COMUNICADO PIV-063-Z4-337 DEL 21 DE JULIO DE 2025 - DOCUMENTOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0392	28/07/2025	Estado de solicitudes elevadas a Autoridades Ambientales Competentes. Remisión concepto CORTOLIMA, Municipio de Espinal y estado solicitud Municipio de Honda.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0399	28/07/2025	PRESENTACIÓN PERSONAL OPERATIVO DE CUADRILLAS	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0417	31/07/2025	PRESENTACION DOCUMENTOS DE INGRESO DE VEHICULO DE APOYO EOQ389	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0436	5/08/2025	RESPUETA COMUNICADO PIV-063-Z4-372 DEL 21 DE JULIO DE 2025 - RESPUESTA A SU COMUNICADO CE-CSC-ADM-0350 DEL 21 DE JULIO. APROBACIÓN A LA HOJA DE VIDA DEL ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NO. 2	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0441	5/08/2025	Inventario de sumideros y registro fotográfico de especies vegetales y zonas verdes de la zona de influencia, previa intervención, Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca.	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto
CE-CSC-ADM-0443	6/08/2025	RESPUETA COMUNICADO PIV-063-Z4-398 DEL 31 DE JULIO DE 2025 - LLAMADO DE ATENCIÓN IMPLEMENTACIÓN PMT APROBADO – MUNICIPIO DE HONDA	CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA Jairo Andrés Acosta Aristizábal Director de Proyecto

6.4 Información sobre atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas.

En el marco del cumplimiento de los compromisos establecidos en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), durante el periodo presentado, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente para someter a revisión de la interventoría los avances y productos relacionados con los componentes. Esta acción tiene como propósito garantizar

la verificación, validación y seguimiento técnico por parte del equipo interventor, con el fin de asegurar la conformidad con la normativa aplicable y los requisitos contractuales vigentes.

Dado lo anterior, durante el periodo, la Interventoría realiza el seguimiento pertinente al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra, validando los soportes remitidos por el Contratista dentro del informe mensual, correspondiente al periodo presentado.

De igual forma, se realizó seguimiento a la correcta implementación del Plan de Manejo de Tránsito, con el fin de garantizar la seguridad de los actores viales involucrados durante las actividades de implementación de medidas de seguridad vial, el Contratista de obra, presenta los documentos de vinculación del personal de plantilla mínima, la interventoría genera concepto de aprobación y traslada los documentos aprobados a la ANSV para su conocimiento y fines pertinentes, del mismo modo durante el periodo, la interventoría genera concepto de aprobación en documentos de vinculación de personal de apoyo del Contratista y Mano de obra no calificada mediante correo electrónico.

6.5 Información relacionada con incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios, etc.

Durante el periodo presentado no se reportan incumplimientos, ni procesos sancionatorios tanto para la Interventoría, como para el Contratista de obra.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las actividades de instalación de señalización vertical, demarcación horizontal y colocación de dispositivos de regulación de tránsito se ejecutaron bajo condiciones de seguridad, garantizando el uso de EPP, señalización temporal e implementación de planes de manejo de tránsito.
- Durante el periodo del informe, se realiza seguimiento al almacenamiento de productos químicos (pinturas y disolventes) los cuales se encuentran en lugares ventilados y rotulados, lejos de fuentes de calor, de igual forma se realiza seguimiento a la manipulación usando guantes y protección visual.
- El contratista de obra no reportó novedades de accidentes, incidentes, ni enfermedades laborales durante el periodo.
- La interventoría no reportó novedades de accidentes, incidentes, ni enfermedades laborales durante el periodo
- Para la interventoría se ejecutó un 94% de cumplimiento en las actividades establecidas en el plan de trabajo.
- Para el Contratista de obra, se ejecutaron todas las actividades planeadas en el plan de trabajo del SG-SST, con un cumplimiento del 163%
- Las actividades de capacitación, tanto para el Contratista como para la Interventoría, fueron completadas con éxito, logrando que el personal recibiera la formación necesaria en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- Cumplimiento normativo: Las acciones realizadas estuvieron alineadas con el Apéndice D para el componente y la normatividad legal aplicable sobre seguridad y salud en el trabajo.
- La interventoría y el contratista de obra han participados en comités y mesas de trabajo en pro al cumplimiento contractual y seguimiento de los productos correspondientes.
- Para el periodo las actividades que aplican del componente ambiental fueron cumplidas por parte del contratista de obra.
- Se logró una buena participación del personal en las capacitaciones y actividades, lo cual es fundamental para asegurar la efectividad de las acciones de prevención.
- Como recomendación, se planea realizar un monitoreo continuo de las condiciones laborales y de seguridad en los diferentes espacios de trabajo para detectar posibles riesgos y aplicar medidas correctivas de manera oportuna.
- Durante el periodo del informe, se solicita al Contratista de obra, realizar con el proveedor autorizado, la gestión correspondiente a la disposición final de Residuos peligrosos y RCD.

8. ANEXOS

- Anexo 1.1 – Formato SSTA-12. Certificación pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales de interventoría.
- Anexo 1.2 – Planillas de seguridad social de trabajadores de interventoría.
- Anexo 1.3 – Formato SSTA-11. Formato de reporte de personal.
- Anexo 1.4 – Formato SSTA-13. Paz y salvo del personal.
- Anexo 1.5 – Soportes de vinculación (personal nuevo del periodo).
- Anexo 1.6 – Plan de trabajo SST y Cronograma de Capacitaciones SST.
- Anexo 1.7 – Indicadores de gestión SST.
- Anexo 1.8 – Reporte de accidentalidad.
- Anexo 1.9 – Formato SSTA-07. Listado de vehículos.
- Anexo 1.10 – Formato registro fotográfico.
- Anexo 1.11 – Inventario de sumideros.
- Anexo 1.12 – Gestión AAC.
- Anexo 1.13 – Estado de informe mensual del Contratista de obra.
