PIV INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA-013-2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 4"

CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA, RISARALDA Y QUINDÍO

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 05
Versión 02

BOGOTÁ D.C., 29 SEPTIEMBRE DE 2025.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle	Elaboró
1	17/09/2025	Documento original	Alexandra Giraldo Ruiz
2	29/09/2025	Documento original	Alexandra Giraldo Ruiz

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Responsable de elaboración			**PIV Ingeniería S.A.S**		
Título Documento			Informe mensual No. 05		
Documento No.			001OPV-INT-ZO4-IFM-GSO-005-SocialN5-V002		
Revisión y aprobación	**Versión**		**1**	**2**	**3**
	Elaboró	**Firma**			
		Nombre	Alexandra Giraldo Ruiz	Alexandra Giraldo Ruiz	
		Fecha	17/09/2025	29/09/2025	
	Revisó y Aprobó	**Firma**			
		Nombre	Javier Bastidas Campaña	Javier Bastidas Campaña	
		Fecha	17/09/2025	29/09/2025	

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
1. Introducción. 8
2. Objetivos. 9
2.1. Objetivo general. 9
2.2. Objetivos específicos. 9
3. Marco normativo y legal. 10
4. Generalidades del contrato. 11
5. Localización geográfica del proyecto. 13
6. Beneficiarios del proyecto. 14
7. Metodología para seguimiento a la ejecución del componente social del contratista. 16
7.1. Revisión y aprobación hojas de vida contratista de obra. 19
8. Componente de lectura territorial. 19
8.1. Visita o recorrido inicial y elaboración de directorio de actores. 19
8.2. Cartografía Social. 22
9. Componente comunicación y divulgación. 22
9.1. Reuniones informativas. 23
9.1.1. Reunión de inicio de obra 23
9.1.2. Reunión de cierre de obra. 27
9.1.3. Reuniones extraordinarias. 30
9.2. Volantes. 30
9.2.1. Volante de convocatoria a reunión de inicio de obra. 30
9.2.2. Volante de convocatoria a reunión de finalización de obra. 34
9.2.3. Volante socialización PMT 37
9.3. Afiches. 39
9.4. Valla móvil. 43
9.5. Monitoreo de medios de comunicación. 46
9.6. Talleres de sensibilización. 48
10. Gestión humana y contratación de mano de obra regional. 51
11. Acompañamiento social a actividades técnicas en intervención. 53
11.1. Levantamiento actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre. 53
11.2. Actas de aceptación. 59

11.3. Actas de entorno. 65
11.4. Actas de vecindad de cierre. 67
12. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias. (PQRSD). 70
13. Monitoreo, evaluación y seguimiento. 72
13.1. Entrega Plan de Gestión Social contratista de obra. 72
13.2. Cronograma de actividades. 72
13.3. Informe y /o reporte semanal. 73
13.4. Comités integrales. 74
13.4.1. Mesas de trabajo. 74
13.4.2. Capacitaciones. 74
13.4.3. Comités sociales con el contratista de obra. 74
13.5. Comités sociales con ANSV. 75
13.6. Informe mensual. 75
13.7. Informe final. 75
14. Estado de productos. 76
15. Trazabilidad de la correspondencia. 76
16. Conclusiones. 80
17. Recomendaciones. 82
18. Anexos. 83

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1 Datos generales del Contrato 11
Tabla 2 Beneficiarios del proyecto 14
Tabla 3 Puntos priorizados-zona 4-del proyecto 15
Tabla 4 Entregables 16
Tabla 5 Personal Social de Interventoría 19
Tabla 6 Seguimiento entrega de directorio de actores del período (puntos viables). 20
Tabla 7 Indicador de cumplimiento directorio de actores. 21
Tabla 8 Seguimiento socializaciones de inicio en el periodo. 24
Tabla 9 Indicador de cumplimiento reunión de inicio en el periodo. 25
Tabla 10 Indicador de cumplimiento reunión de cierre en el periodo. 28
Tabla 11 Trazabilidad aprobación de volantes 32
Tabla 12 Entrega de volantes de inicio a la comunidad en el período 32
Tabla 13 Indicador de cumplimiento entrega de volantes reuniones de inicio 33
Tabla 14 Trazabilidad aprobación de volante 35

Tabla 15 Entrega de volantes de finalización a la comunidad en el período..... 35
Tabla 16 Indicador de cumplimiento entrega de volantes reuniones de finalización..... 35
Tabla 17 Trazabilidad aprobación de volantes..... 37
Tabla 18 Entrega de volantes PMT..... 37
Tabla 19 Indicador de cumplimiento entrega de volante PMT 38
Tabla 20 Relación instalación de afiches en el periodo. 40
Tabla 21 Indicador afiches..... 41
Tabla 22 Instalación de valla móvil. 44
Tabla 23 Indicador productividad vallas móviles..... 44
Tabla 24 Monitoreo de medios de comunicación..... 47
Tabla 25 Indicador de cumplimiento medios de comunicación 47
Tabla 26 Consolidado desarrollo de sensibilizaciones en buenas prácticas de seguridad vial..... 49
Tabla 27 Indicador de cumplimiento talleres de sensibilización..... 49
Tabla 28 Seguimiento contratación de MONC..... 52
Tabla 29 Indicador de cumplimiento contratación mano de obra..... 52
Tabla 30 Trazabilidad entrega de inventario para elaboración actas de vecindad..... 54
Tabla 31 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25754-026 durante la ejecución del contrato..... 54
Tabla 32 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25754-011 durante la ejecución del contrato..... 55
Tabla 33 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25473-002 durante la ejecución del contrato..... 56
Tabla 34 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25473-003 durante la ejecución del contrato..... 56
Tabla 35 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 17777-T30 durante la ejecución del contrato. 56
Tabla 36 Indicador de cumplimiento actas de vecindad de inicio 57
Tabla 37 Actas de aceptación realizadas en el punto 25754-026..... 60
Tabla 38 Actas de aceptación realizadas en el punto 25754-026..... 61
Tabla 39 Actas de aceptación realizadas en el punto 25473-002..... 62
Tabla 40 Actas de aceptación realizadas en el punto 25473-003..... 62
Tabla 41 Actas de aceptación realizadas en el punto 17777-T30..... 63
Tabla 42 Actas de aceptación en el periodo. 63
Tabla 43 Indicador de cumplimiento actas de aceptación en el periodo. 63
Tabla 44 Actas de entorno..... 65
Tabla 45 Indicador de cumplimiento elaboración actas de entorno en el periodo..... 66
Tabla 46 Consolidado actas de cierre en el periodo. 68
Tabla 47 indicadores de cumplimiento..... 68
Tabla 48 Seguimiento PQRSD del contrato..... 70
Tabla 49 Indicador de cumplimiento (PQRSD). 71
Tabla 50 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales 73
Tabla 51 Seguimiento comités Integrales. 74
Tabla 52 Consolidado comités sociales contratista de obra 75
Tabla 53 Estado de productos fase 1-contratista de obra..... 76
Tabla 54 Relación correspondencia enviada. 76

Tabla 55 Relación correspondencia recibida. 78

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Zonas de intervención, programa “Obras Por la Vida”..... 13
Ilustración 2 Zona 4 de intervención, programa “Obras Por la Vida”. 13
Ilustración 3 Productividad directorio de actores..... 21
Ilustración 4 Indicador de gestión directorio de actores. 22
Ilustración 5 Indicador reunión de inicio para el periodo. 25
Ilustración 6 Indicador de participación en reunión de inicio. 26
Ilustración 7 Indicador de gestión reunión de inicio en el periodo..... 26
Ilustración 8 Productividad reuniones de cierre en el periodo..... 29
Ilustración 9 Participación en reuniones de cierre en el periodo. 29
Ilustración 10 Gestión en reunión de cierre en el periodo. 30
Ilustración 11Gestión volantes de inicio..... 33
Ilustración 12 Productividad volantes de inicio en el periodo..... 34
Ilustración 13 Indicador de gestión volantes de cierre en el periodo..... 36
Ilustración 14 indicadores entrega de volantes de cierre 36
Ilustración 15 Indicador de productividad volantes PMT 38
Ilustración 16 Indicador de gestión afiches en el periodo 42
Ilustración 17 indicador productividad afiches..... 42
Ilustración 18 Indicador de productividad..... 45
Ilustración 19 Indicador de gestión 45
Ilustración 20 Productividad de monitoreo de medios de comunicación. 48
Ilustración 21 Productividad de talleres de sensibilización 50
Ilustración 22 Gestión de talleres de sensibilización..... 50
Ilustración 23 Participación de talleres de sensibilización..... 51
Ilustración 24 Indicador de cumplimiento contratación mano de obra. 52
Ilustración 25 Indicador de gestión actas de vecindad..... 57
Ilustración 26 Indicador de productividad actas de vecindad en el periodo. 58
Ilustración 27 Indicador de gestión actas de aceptación en el periodo 64
Ilustración 28 Indicador de productividad actas de aceptación en Tolima. 64
Ilustración 29 Indicador de gestión actas de entorno..... 66
Ilustración 30 Productividad actas de entorno. 67
Ilustración 31 indicador de gestión actas de cierre 69
Ilustración 32 indicador de productividad actas de cierre..... 69
Ilustración 33 Indicador de gestión PQRDS (canales oficiales). 71
Ilustración 34 Indicador de productividad PQRDS totales del contrato. 72

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 Reunión de inicio en Soacha y Mosquera y de cierre en Honda..... 27
Foto 2 Registro fotográfico entrega de volantes Supía (Caldas), Mosquera (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca) y Honda (Tolima). 39
Foto 3 instalación de afiches 43
Foto 4 Valla móvil municipios de El Espinal y Girardot 46
Foto 5 Actas de vecindad Mosquera y Soacha. 58

Foto 6 Firma de acta de aceptación..... 65
Foto 7 acta de entorno..... 67

1. Introducción.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se gestó el programa "Obras Por la Vida" cuyo propósito es mitigar la accidentalidad en las vías de orden nacional y municipal a través de la implementación de señalización vial y acciones pedagógicas tendientes al fortalecimiento en la cultura del cuidado e importancia del uso adecuado de la señalización vial.

En virtud de esta necesidad la ANSV suscribe los contratos de interventoría contrato No. PA 013 DE 2025 cuyo objeto REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 4 con PIV Ingeniería S.A.S. y el contrato de obra asignado al Consorcio Señalizadores de Colombia contrato de obra No. PA-026-2025 cuyo objeto es: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL- ANSV, ZONA 4"

En el marco de cumplimiento a las obligaciones contractuales estimadas para los contratos en mención y tomando como referencia el Apéndice E "especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas" el presente informe mensual de gestión social de Interventoría detalla las acciones y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista de obra en el periodo comprendido del 08 agosto al 07 de septiembre 2025.

El presente documento detalla en tres (3) momentos las acciones que se realizaron para el seguimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo, las cuales se describen a continuación:

- Generalidades: Dentro de este aparte se detalla los objetivos, los datos generales del proyecto, marco normativo, datos generales del equipo social, localización del proyecto, beneficiarios y metodología para seguimiento a los productos de gestión.
- Componentes de la gestión social: se relacionan las actividades contempladas con la ciudadanía tales como; lectura territorial, comunicación y divulgación gestión humana y contratación de mano de obra regional y acompañamiento a las actividades técnicas en intervención y gestión para atención de PQRSD.
- Monitoreo, evaluación y seguimiento: Se describe lo concerniente con los comités de seguimiento, mesas de trabajo, informes semanales.

2. Objetivos.

2.1. Objetivo general.

Garantizar el cumplimiento de las actividades adelantadas en el periodo correspondiente del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2025, del contratista donde prevalezca los principios de calidad, oportunidad y veracidad de la información brindada por el equipo de profesionales sociales dispuestos para el contrato de obra No. PA-026-2025 de 2025.

2.2. Objetivos específicos.

- Establecer actividades de control ante la gestión, verificación y aprobación del material elaborado y presentado por el contratista.
- Realizar acompañamiento y verificación de las acciones efectuadas por el contratista para cumplimiento de la elaboración del Plan de Gestión Social y cronograma de actividades.
- Establecer actividades de control ante la gestión, verificación y aprobación del material elaborado y presentado por el contratista relacionado con la actividad de lecturas territoriales.
- Verificar la gestión y desarrollo de actividades relacionadas al programa de acompañamiento social, mediante el seguimiento a las acciones proyectadas y revisión de soportes dispuestos para la entrega de información.
- Verificar el diligenciamiento y entrega de soportes, presentados por el promotor, así como, la relación y remisión oportuna de los documentos contractuales ante la ANSV.

3. Marco normativo y legal.

En el marco de la ejecución del contrato, la totalidad de sus acciones se desarrollarán bajo el marco normativo establecido desde la ANSV el cual se relaciona a continuación:

- Constitución Política de 1991, artículos Nos. 01, 02, 13, 49, 95, 79, 103,104, 105, 310 y 365.
- Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la O.I.T., Ginebra 1989.
- Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.
- Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo - Ley de Planeación Participativa.
- Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la Ley 142 de 1994 (control social).
- Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial. Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento.
- Ley 472 de 1998 que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia sobre el ejercicio de las acciones populares y de grupo.
- Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa.
- Derechos Humanos de Tercera Generación o Derechos Colectivos. Ley 743 de 2002, Organismos de Acción Comunal.
- Ley 1381 de 2010, Ley de Lenguas Nativas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
- Ley 1755 de 2015 que regula el Derecho Fundamental de Petición.
- Ley 850 de 2003 que regula las Veedurías Ciudadanas.
- Decreto 2623 de 2009, por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
- Ley 23 de 1982, por el cual se regula el derecho de autor.

4. Generalidades del contrato.

A continuación, se brindan los datos generales de los participantes del programa “Obras por la Vida” zona 4:

Tabla 1 Datos generales del Contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DATOS DEL CONTRATANTE	
COORDINACIÓN TÉCNICA ANSV	José Hugo Bocarejo Rodríguez
COORDINACIÓN SOCIAL ANSV	Luisa Fernanda Yáñez Agudelo
DATOS DE LA INTERVENTORIA- PIV INGENIERÍA S.A.S.	
No. DEL CONTRATO	PA-013-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 4
VALOR DEL CONTRATO	**MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.245.506.647)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez meses y medio (10.5)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 febrero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 febrero 2026
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Ing. Javier Fernando Bastidas Campaña
RESIDENTE TÉCNICO	Ing. Jasmín Jezenia Rincón Villegas
PROFESIONAL SOCIAL	T.S Alexandra Giraldo Ruiz


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	Angie Maryeth Vanegas Sáenz
PROFESIONAL SST	Estefanía Osorio Cuartas
DATOS DEL CONTRATISTA – CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA	
No. DEL CONTRATO	PA-026-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad vial-ANSV, ZONA 4".
VALOR DEL CONTRATO	Diez meses (10)
PLAZO DE EJECUCIÓN	**SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000)**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero 2026
DIRECTOR DE OBRA	Ing. Jairo Andrés Acosta Aristizábal
RESIDENTE TÉCNICO	Billy Yoel Martínez Vargas
PROFESIONAL SOCIAL	Belky Daniela Alejandra Téllez Ibáñez
PROFESIONAL SOCIAL	Jennifer Johana Suárez Mendoza
PROFESIONAL AMBIENTAL	Fernando Alexis García Quintero
PROFESIONAL SST	Vanesa Yuliana García.

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

5. Localización geográfica del proyecto.

El programa "Obras Por la Vida" de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos de obra No. PA-026-2025 e Interventoría PA-013-2025 se contempló la entrega de la zona 4 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío. A continuación, se detalla los puntos entregados en cada departamento.


Ilustración 1 Zonas de intervención, programa "Obras Por la Vida".

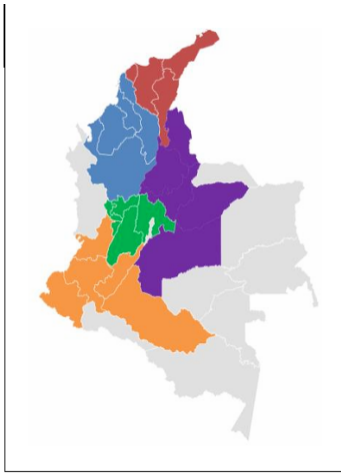

Zona de intervención	Departamentos en que se encuentran los tramos viales
1	Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
2	Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.
3	Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Meta.
4	Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío.
5	Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá.

Fuente: *Estudios Previos – Contrato de Obra PA-026-2025*

Ilustración 2 Zona 4 de intervención, programa "Obras Por la Vida".

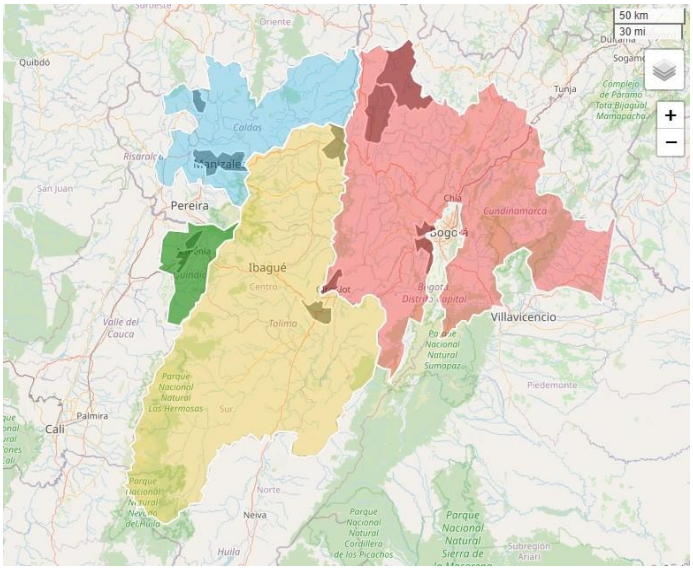

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S*

6. Beneficiarios del proyecto.

El programa "Obras por la Vida" busca favorecer la totalidad de actores viales involucrados en la dinámica de los diferentes departamentos del país, para el caso puntual de la zona 4 otorgada al CONSORCIO SEÑALIZADORES DE COLOMBIA y PIV INGENIERIA S.A.S. se adelantarán labores en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima y Quindío. En virtud de las garantías del proceso se determinó como población beneficiaria directa a los habitantes residentes de estos departamentos y como población beneficiada indirecta a las personas que hacen uso de las vías nacionales y su tránsito es esporádico. A continuación, se detalla los beneficiarios directos del proyecto.

Tabla 2 Beneficiarios del proyecto

Departamento	Municipio	No habitantes
Caldas	Supía	29,990
	Manizales	462,027
Cundinamarca	Caparrapí	23,209
	Girardot	123,142
	Mosquera	808,288
	Soacha	645.605
	Yacopí	10.887
Quindío	Armenia	275.641
	Circasia	27.135
Tolima	Espinal	67.983
	Honda	23.616

Fuente: DANE

Nota aclaratoria: las cifras fueron tomadas desde la página oficial del DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

En el contrato PA-026-2025 -zona 4- relacionamos en la tabla 3 los once (11) municipios priorizados con la cantidad de puntos críticos a intervenir y los supervisores de cada convenio.

Tabla 3 Puntos priorizados-zona 4-del proyecto

Departamentos	Puntos priorizados	Supervisor del convenio
Caldas	Manizales (8 puntos)	Juan Felipe Álvarez Castro Juan.alvarez@manizales.gov.co
	Supía (1 punto)	A cargo del Instituto Nacional de Vías – Territorial Caldas
Cundinamarca	Caparrapí (1 punto)	A cargo del Instituto Nacional de Vías – Territorial Cundinamarca
	Girardot (1 puntos)	Jaime Adolfo Romero Perdomo transitoytransporte@girardot-cundinamarca.gov.co
	Mosquera (6 puntos)	Ivy Yojana Sepúlveda Aguirre secretariademovilidad@mosquera-cundinamarca.gov.co
	Soacha (7 puntos)	Edison Jair Velásquez Acosta contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
	Yacopí (1 punto)	A cargo del Instituto Nacional de Vías – Territorial Cundinamarca
Quindío	Armenia (4 puntos)	Daniel Jaime Castaño Calderón Secretariotransito@armenia.gov.co
	Circasia (1 punto)	Julián Andrés Peña Sierra infraestructura@circasia-quindio.gov.co
Tolima	Espinal (1 punto)	A cargo del Instituto Nacional de Vías – Territorial Tolima
	Honda (1 punto)	A cargo del Instituto Nacional de Vías – Territorial Tolima

Fuente: *Oficio ANSV 20253000032231 del 08-04-25.*

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra No. PA 026-2025.

7. Metodología para seguimiento a la ejecución del componente social del contratista.

PIV INGENIERÍA S.A.S en su ejercicio de interventor, brindara constante vigilancia durante la ejecución del contrato de obra No. PA-026-2025 cuyo objeto es "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV", siendo garantes de los principios de calidad, oportunidad y correlación con la ciudadanía, a partir de la puesta en marcha de actividades sociales realizadas con la ciudadanía donde se entregue información oportuna, así como, resolución a las inquietudes, solicitudes y requerimientos que conciernen al objeto contractual.

La profesional del área social de Interventoría de acuerdo con los lineamientos de Gestión Social de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las exigencias consignadas en los términos de referencia dispuestos para los contratos de obra No. PA 026-2025 e Interventoría No. PA 013-2025, realizarán el seguimiento a las diferentes actividades que deberá ejecutar el contratista para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales teniendo como apoyo, comunicados emitidos al contratista que irán con copia a la supervisión social de la entidad contratante y reportados de manera periódica dentro de los informes semanales y mensuales.

A continuación, se detalla los entregables contractuales durante la vigencia del contrato de obra PA-026-2025:

Tabla 4 Entregables

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice E	Actividades	Responsable
Construcción	Metodología	Propuesta metodológica plan de gestión social	15 días calendario	Elaboración plan metodológico	Profesionales sociales
				Remisión datos para atención a la ciudadanía	
	Lectura Territorial	Visita inicial a los puntos de intervención	3 días calendario posterior a la visita a los puntos	Elaboración del directorio de actores	
		Cartografía social	3 días calendario posterior al desarrollo de la actividad en cada punto	Cartografía social	
	Comunicación y Divulgación	Reuniones de inicio	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de inicio	Profesionales sociales
		Reuniones de cierre	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de cierre	

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice E	Actividades	Responsable
		Reuniones extraordinarias	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Solo en caso de ser requeridas	
		Volantes de inicio	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	
		Volantes de cierre	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	
		Afiches	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Instalación de 10 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	
		Vallas	Durante la implementación	Instalación de 1 unidad por punto activo	
		Talleres de sensibilización	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con niños	
			3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con adultos	
		Monitoreo de medios	Semanal y mensual en los reportes formales	Seguimiento a noticias relacionadas con el programa	
	Gestión humana y contratación de mano de obra	Certificados de residencia de entidades locales	10% del personal vinculado debe ser residente de la zona de influencia del proyecto su relación se detallará de manera semanal y mensual en los reportes formales	Gestión ante entidades locales para emisión de certificados de residencia del personal vinculado a la obra.	Profesionales sociales
	Acompañamiento social actividades técnicas en intervención	Inventario para actas	3 días calendario posterior a la visita a los puntos	Inventario para actas	Profesionales sociales
		Actas de vecindad de inicio	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de inicio	

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice E	Actividades	Responsable
		Actas de aceptación	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de aceptación	
		Actas de entorno	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de entorno	
		Actas de vecindad de cierre	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de cierre	
		Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Semanal y mensual en los reportes formales	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	
	Gestión para atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Registro de PQRSD	15 días calendario, posterior a la recepción de la PQRSD	Registro en el formato y entrega de respuesta a los peticionarios	Profesionales sociales
	Seguimiento y reportes	Comités de obra semanales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités de obra semanales	Profesionales sociales
		Comités sociales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités sociales	
		Mesas de trabajo	Semanal y mensual en los reportes formales	Mesas de trabajo	
		Informe semanal	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe semanal	
		Informe mensual	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe mensual	
		Informe final	Una vez finalizado el proceso constructivo y acorde a lo determinado entre la interventoría y el contratista	Informe final	

Fuente: *Elaborado a partir de la información contractual*

Así, para seguir el cumplimiento del contratista de obra en sus actividades y sus respectivos entregables, contenidos en el apéndice E, desde la Interventoría se cuenta con la profesional social, la cual se relaciona a continuación.

Tabla 5 Personal Social de Interventoría

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
Alexandra Giraldo Ruiz	Profesional Social	alexandra.giraldo@pivingenieria.com	3207702876	100%

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S*

7.1. Revisión y aprobación hojas de vida contratista de obra.

Con el propósito de garantizar la realización a cabalidad de las actividades sociales durante el programa "Obras por la Vida", se estableció la participación de profesionales sociales que contribuyeron a la recolección y entrega de los soportes de seguimiento a las acciones adelantadas por parte de la empresa contratista, donde se contempló la transparencia y trazabilidad a la ejecución de actividades dadas desde el apéndice E "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas".

Para el período comprendido entre el 08 de agosto y el 07 de septiembrede 2025 referente al personal del contratista no realizó contratación del área social, ya que no se presentaron cambios al respecto.

8. Componente de lectura territorial.

Este programa, incluido en el apéndice E, pretende conocer de fuentes primarias las problemáticas viales de los lugares donde se ejecutará el proyecto. Razón por la cual, el Contratista a través de la actividad de cartografía social permitirá obtener una mejor visión de los puntos de intervención, así como, las características de la población residente y transeúnte en los tramos incluidos en el proyecto a partir de ejercicios participativos que contribuyan a la elaboración de diseños pertinentes para implementación de señalización vial acorde a sus necesidades.
Desde la Interventoría se garantiza que todas las actividades programadas por el contratista se realicen con los parámetros requeridos por la ANSV, donde se brindan garantías para la adecuada atención y comunicación con la ciudadanía. A continuación, se detallan las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8.1. Visita o recorrido inicial y elaboración de directorio de actores.

Para el período del 8 de agosto al 7 de septiembre de 2025, no se adelantaron actividades en campo relacionadas con las visitas de inspección de los puntos entregados por la Agencia, ya que estas se desarrollaron en períodos anteriores, pero desde la interventoría se hizo revisión al directorio de

actores generando observaciones como diligenciar espacios en blanco y diligenciar los formatos, estas observaciones se realizaron mediante comunicado PIV-063-Z4-459.

En el presente informe se consolidan los treinta y un (31) directorios de actores sociales

El consolidado del directorio de actores se encuentra en el informe social mensual del contratista en el anexo -001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-046-DirectorioActoresInfMen5-V001 directorio de actores informe 5 del contratista.

Tabla 6 Seguimiento entrega de directorio de actores del período (puntos viables).

Dpto.	Municipio	Fecha de radicación	Comunicado de entrega	Puntos viables	Estado	Comunicado interventoría
Quindío	Armenia	22 agosto 2025	CE-CSC-ADM-0548-Respuesta a oficio PIV-063—Z4-459	4	Observaciones	PIV-063-Z4-459
	Circasia			1		
Cundinamarca	Yacopí			1		
	Caparrapí			1		
	Mosquera			6		
	Soacha			6		
	Girardot			1		
Tolima	El Espinal			1		
	Honda			1		
Caldas	Manizales			8		
	Supia			1		

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Nota. El contratista remite la totalidad de directorio de actores.


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 7 Indicador de cumplimiento directorio de actores.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad	N° de directorios realizados en el cto (31) *100% / N° de directorios requeridos en el contrato (31)	100%
Productividad	N° de directorio de actores realizados por municipio Depto. Quindío (5) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Quindío (5)	100%
Productividad	N° de directorio de actores realizados por municipio Depto. Cundinamarca (15) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Cundinamarca (15)	100%
Productividad	N° de directorio de actores realizados por municipio Depto. Tolima (2) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Tolima (2)	100%
Productividad	N° de directorio de actores realizados por municipio Depto. Caldas (9) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Caldas (9)	100%
Gestión	N° total de puntos a intervenir con directorio de actores (31) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (38)	81,6%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 3 Productividad directorio de actores

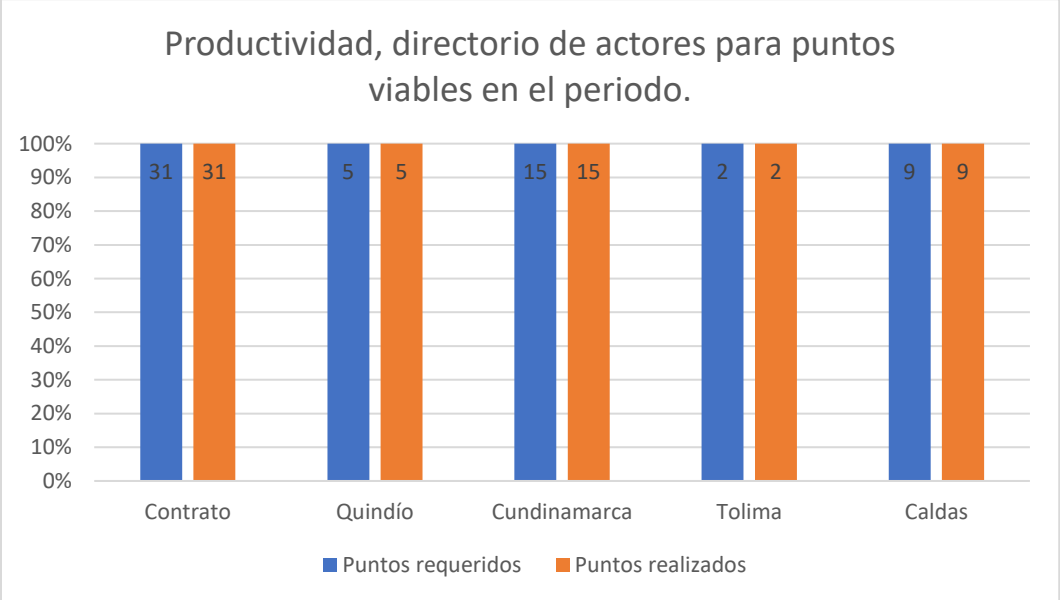

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Ilustración 4 Indicador de gestión directorio de actores.

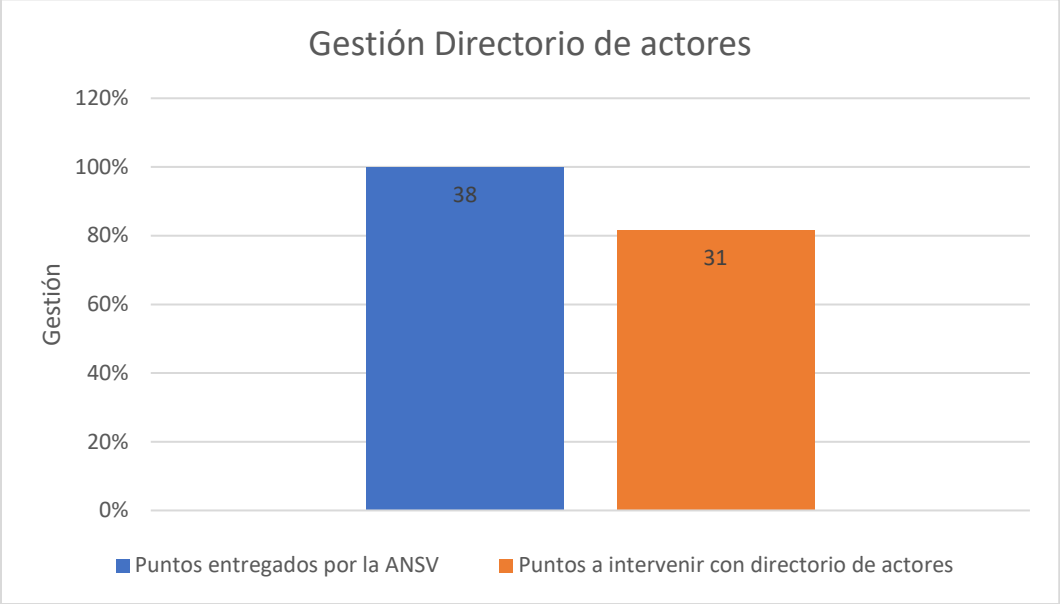

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: para el presente periodo se tiene la entrega de los treinta y un directorios de actores de los 31 puntos viabilizados a intervenir en el contrato (Quindío 5 puntos 100%, Cundinamarca 15 puntos 100%, Tolima 2 puntos 100%, caldas 9 puntos 100%) para un porcentaje total de productividad del 100%. La Agencia inicialmente entregó un total de 38 puntos a intervenir de los cuales se viabilizaron 31 puntos dando como resultado un indicador de gestión del 81,6%

8.2. Cartografía Social.

El programa Obras por la Vida, desde el componente social, contempla una cartografía social por cada punto de implementación, para garantizar que la comunidad reconozca e identifique su entorno y, mediante un medio físico, evidencie sus necesidades de señalización vial, para determinar que el diseño responda a ellas.
De esta manera, teniendo en cuenta que los a puntos a intervenir cuentan con diseños integrales en su versión 1 y solo se contempla la implementación de estos, esta actividad específica no aplica ya que el proceso no implica la apropiación de nuevos diseños.

9. Componente comunicación y divulgación.

Con la ejecución de este componente se busca mantener informada a la comunidad constantemente sobre el desarrollo del proyecto, dando cuenta de los avances y toda situación que sea de importancia para el proyecto y de impacto a la ciudadanía.
Este ítem contempla la entrega de información a la comunidad tanto escrita como verbal donde permita al contratista ser garante de la transparencia del proceso a partir de la entrega de datos verídicos, oportunos y de primera mano. Durante el período del presente informe el contratista de obra llevó a

cabo el desarrollo de actividades relacionadas con este componente, dichas actividades hacen parte de la etapa de implementación.

9.1. Reuniones informativas.

9.1.1. Reunión de inicio de obra

Desde el apéndice E se establece la socialización inicial de los diseños a implementar en cada punto otorgado por la ANSV, la actividad se debe realizar en la totalidad de puntos, se aclara que en algunos casos se acordó la unión de puntos por cercanía o condición de ruralidad de los tramos, esto con el propósito de favorecer los principios de calidad y oportunidad de la información a brindar a la comunidad.

Durante el presente mes de ejecución del contrato, el Consorcio señalizadores de Colombia llevó a cabo tres (03) reuniones de inicio de obra en el departamento de Cundinamarca: dos (02) reuniones en los puntos 25754-016 y 25754-026 del municipio de Soacha y una (01) reunión para los puntos 25473-002 y 25473-003 del municipio de Mosquera conforme a lo descrito a continuación:

- El 6 de agosto 2025 el contratista remitió mediante correo electrónico a la interventoría la propuesta del contenido de la presentación de la reunión de inicio de obra para el punto identificado con el código 25754-016 del municipio de Soacha, esta se remitió a la ANSV por parte de la interventoría mediante correo electrónico y el mismo día la ANSV da la aprobación y emite concepto favorable de la (PPT) vía correo electrónico. Ver Anexo2Correos 1AproPPT.

- El 15 de agosto 2025 el contratista remite mediante correo electrónico a la interventoría la propuesta de contenido de la presentación de inicio de obra para el punto 25754-026 del municipio de Soacha, el día 16 de agosto la interventoría remite esta propuesta mediante correo electrónico a la ANSV y el día 19 de agosto la ANSV emite mediante correo electrónico la aprobación de la (PPT). Ver Anexo2Correos 1AproPPT.

- El día 3 de septiembre 2025 el contratista remite mediante correo electrónico a la interventoría la propuesta de contenido de la presentación de reunión de inicio de obra para los puntos identificados como 25473-002 y 25473-003 del municipio de Mosquera. El día 3 de septiembre la interventoría remite mediante correo electrónico a la ANSV la propuesta y la Agencia da aprobación el día 3 de septiembre mediante correo electrónico. Ver Anexo2Correos 1AproPPT.

- Según la programación de obra para implementar los diseños de seguridad vial en el punto crítico priorizado 25754-016. El día 09 de agosto se realizó acompañamiento a la reunión de inicio de obra de manera presencial en el salón social del conjunto residencial El Trébol de la ciudadela Ciudad Verde a las 2:00 p. m., el contratista procedió con la verificación del quórum confirmándose el cumplimiento adecuado con la asistencia de dieciocho (18) personas de la comunidad. Durante el desarrollo de la reunión no se presentaron PQRSD y los profesionales del Consorcio señalizadores de Colombia presentaron las características generales del proyecto, así como los aspectos técnicos, de tránsito y transporte y de gestión social del contrato. Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-004-ActainicioObraSOC25754026-V001-InicioSoacha25754016-V001.

El día 20 de agosto 2025 se realizó la reunión de inicio de obra presencial en el punto crítico 25754-026- Soacha (Cundinamarca), dicha reunión se llevó a cabo, en el salón comunal del barrio la Despensa a las 2:00 p.m. La sesión inicio con la verificación del quórum, confirmándose la asistencia de diecisiete personas de la comunidad, cumpliendo con lo establecido en el apéndice E, en el desarrollo de la reunión no se presentaron PQRSD y los profesionales del Consorcio señalizadores de Colombia presentaron las características generales del proyecto, así como los aspectos técnicos de tránsito y transporte y de gestión social. Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-008-ActaInicioObraMsq022y003-V001.

Puntos críticos 25473-002 y 25473-003- municipio Mosquera (Cundinamarca). De acuerdo con la programación de obra para la implementación de los diseños de seguridad vial en los puntos críticos conceptuados como viables, identificados con los códigos 25473-002 y 25473-003, y considerando su cercanía geográfica se determinó realizar una sola reunión de inicio en un punto central y de fácil acceso para las comunidades habitantes del área de influencia directa del proyecto.

Posteriormente el día 05 de septiembre se realizó acompañamiento en la reunión de inicio de obra de manera presencial de los puntos 25473-002 y 25473-003, en el salón social del Conjunto Residencial Súper Manzana 13, a las 2:30 p.m. El encuentro conto con la participación de treinta (30) asistentes. Durante la sesión no se presentaron PQRSD y los profesionales del Consorcio señalizadores de Colombia expusieron las características generales del proyecto, así como los aspectos técnicos de tránsito y transporte y de gestión social asociados al contrato. Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-048-CumplimientoComSocMsq002y003-V001

Tabla 8 Seguimiento socializaciones de inicio en el periodo.

Fecha	Tipo de reunión	Convocados	Asistentes	% de participación	Observaciones
09/08/2025	Reunión de inicio Soacha Punto 25754-016	15	18	120%	Se superó el quórum mínimo requerido por el apéndice E. En la reunión no se presentaron PQRSD.
20/08/2025	Reunión de inicio Soacha Punto 25754-026	15	17	113%	Se superó el quórum mínimo requerido por el apéndice E. En la reunión no se presentaron PQRSD.
05/09/2025	Reunión de inicio Mosquera Puntos 25473-002/25473-003	30	30	100%	Se cumplió con el quórum mínimo requerido por el apéndice E. En la reunión no se presentaron PQRSD.

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.


- Indicadores de cumplimiento.

Tabla 9 Indicador de cumplimiento reunión de inicio en el periodo.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad Soacha	N° de reuniones de inicio realizadas en el periodo Soacha (2) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas en el periodo Soacha (2)	100%
Participación Soacha punto 25754-016	Total, asistentes (18) * 100 / Total, requerido en apéndice E (15)	120%
Participación Soacha punto 25754-026	Total, asistentes (17) * 100 / Total, requerido en apéndice E (15)	113%
Productividad Moquera puntos 25473-002 y 25473-003	N° de reuniones de inicio realizadas en el periodo Mosquera (1) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas en el periodo Mosquera (1)	100%
Participación Mosquera puntos 25473-002 y 25473-003.	Total, asistentes (30) * 100 / Total, requerido en apéndice E (30)	100%
Gestión	N° total de reuniones de inicio realizadas en el periodo. (3) *100 / N° total de reuniones programadas en el periodo (3)	100%
Gestión	N° de puntos con reunión de inicio del CTO (7) *100 / N° de puntos con reunión de inicio requeridos (31)	22,6%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 5 Indicador reunión de inicio para el periodo.

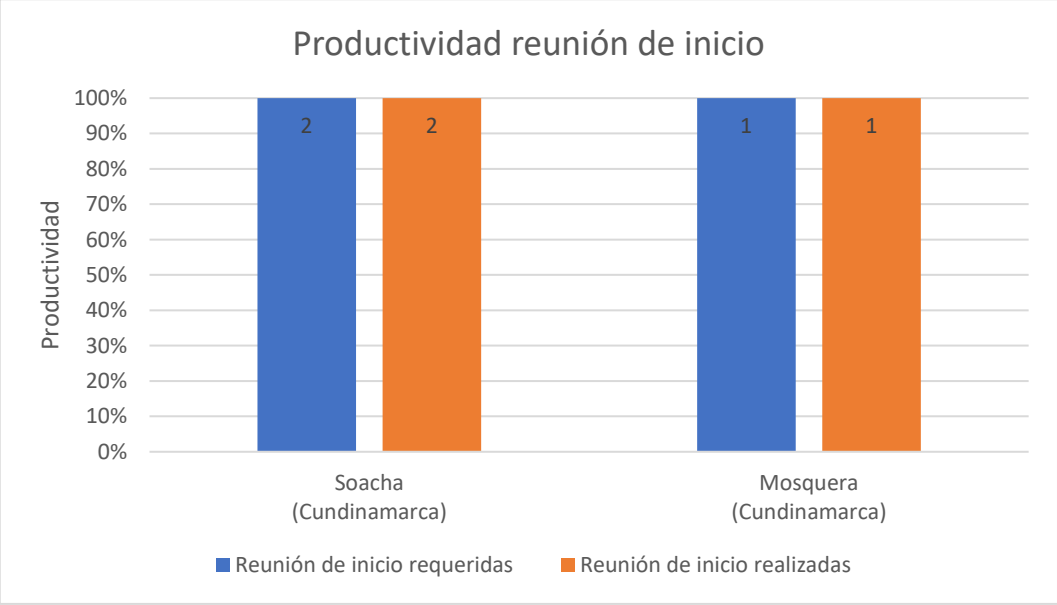


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 6 Indicador de participación en reunión de inicio.

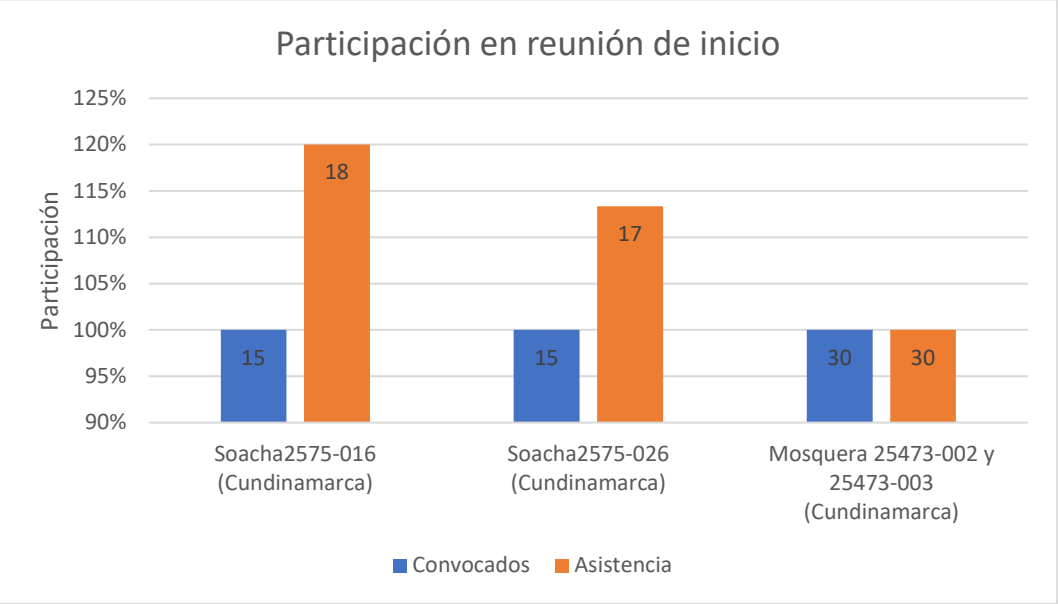

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 7 Indicador de gestión reunión de inicio en el periodo

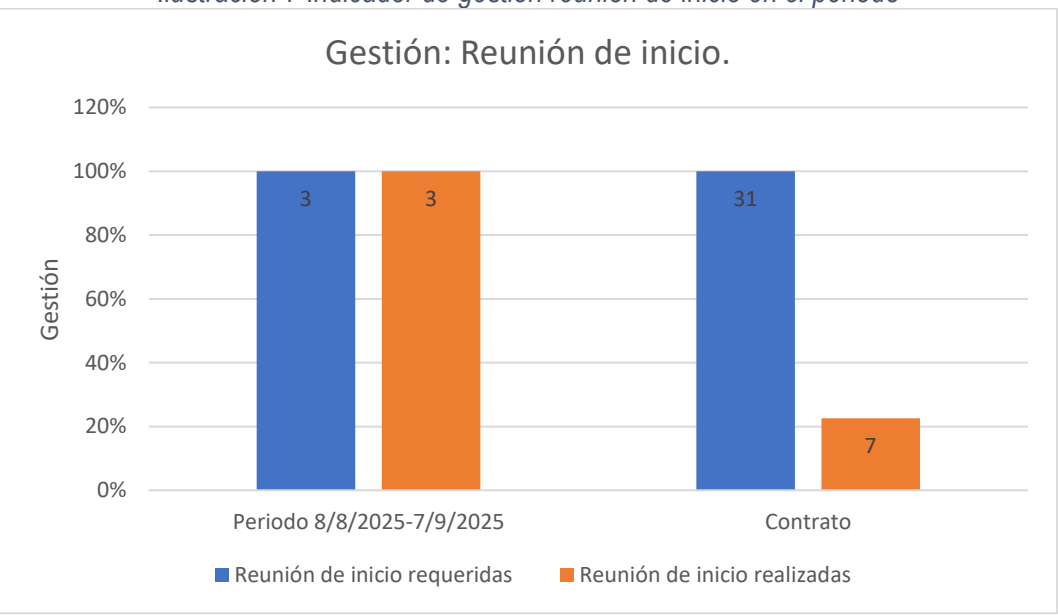

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: En el presente periodo se realizaron tres (03) reuniones de inicio, dos en el municipio de Soacha (Cundinamarca) puntos críticos 25754-016 ciudadela ciudad verde y 25754-026 barrio la Despensa y la tercera en el municipio de Mosquera (Cundinamarca). Donde se realizó la unión de los puntos 2473-002 y 25473-003 dándose un cumplimiento en el indicador de productividad del 100% y en el de gestión del 100%. En cuanto a la asistencia de la comunidad a las reuniones se superó la requerida por el apéndice E (15 asistentes) con un porcentaje en el indicador de participación de 120% y 123% en los puntos del municipio de Soacha y 100% en la unión de puntos del municipio de

Mosquera. En cuanto al indicador de gestión para el contrato, a la fecha se cuenta con un cumplimiento del 23%

Foto 1 Reunión de inicio en Soacha y Mosquera y de cierre en Honda.









Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

9.1.2. Reunión de cierre de obra.

Desde el Apéndice E se establece la socialización de cierre de las actividades adelantadas en cada punto otorgado por la ANSV, la actividad se debe realizar en la totalidad de puntos, se aclara que en algunos casos se acordará la unión de puntos por cercanía o condición de ruralidad de los tramos, esto con el propósito de favorecer los principios de calidad y oportunidad de la información a brindar a la comunidad.

Durante el periodo del presente informe, teniendo en cuenta la finalización de las implementaciones de los diseños en seguridad vial en el punto crítico priorizado identificado con el código SS_73349_001 del municipio de Honda, departamento de Tolima, el contratista de obra remitió vía correo electrónico el día 28 de agosto la presentación a implementar en la reunión final o cierre de obra, de esta manera,

el día 28 de agosto de 2025 mediante correo electrónico la interventoría y entidad contratante brindan aprobación y aval respectivos a la versión 1.0 de la propuesta de contenido de la presentación de la reunión de socialización de finalización de obra, remitida por el contratista. Ver anexo 2 6PPTFinHonda

El 29 de agosto de 2025 se llevó a cabo acompañamiento al contratista en las instalaciones de la Sociedad de Empleados, de manera presencial a la reunión de socialización de finalización de obra en el municipio de Honda punto con el código SS_73349_001. El encuentro contó con la participación de los profesionales de la interventoría, del contratista Consorcio Señalizadores de Colombia, así como de representantes de la comunidad, miembros de organizaciones comunales y delegados de la administración municipal, interesados en conocer los resultados de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra para el mejoramiento de la seguridad vial en este territorio.

Durante el desarrollo de la jornada, los profesionales del Consorcio Señalizadores de Colombia presentaron a los asistentes las características generales de las implementaciones del proyecto, abordando aspectos técnicos, de tránsito y transporte, así como las acciones implementadas desde la gestión social en el municipio. Después, se abrió un espacio de diálogo ciudadano donde se atendió a las inquietudes de los asistentes, sobre todo relacionadas con elementos del diseño ejecutado.


Es importante resaltar que, en el marco de este espacio de relacionamiento, los integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio La Sonrisa entregaron de manera escrita una (1) PQRSD, en la cual expresan su inconformidad respecto a la construcción de un reductor de velocidad parabólico, argumentando afectaciones a la movilidad y posibles riesgos asociados. En dicho documento, los solicitantes piden la revisión de las medidas adoptadas y el retiro del dispositivo, para garantizar la seguridad de peatones y conductores, considerando las condiciones del sector. Las especificaciones de esta actividad se pueden detallar en el presente informe mensual, en el ítem Gestión para atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-005-FinalizaciónHonda-V001.

Tabla 10 Indicador de cumplimiento reunión de cierre en el periodo.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad	N° de reuniones de cierre realizadas Honda (1) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Honda (1)	100%
Participación	Total, asistentes (24) * 100% / Total, requerido en apéndice E (15)	160%
Gestión	N° total de reuniones de cierre realizadas en el periodo. (1) *100 / N° total de reuniones cierre programadas en el periodo (1)	100%
Gestión	N° de puntos con reunión de finalización del CTO (1) *100 / N° de puntos con reunión de finalización requeridos (31)	3,2%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 8 Productividad reuniones de cierre en el periodo

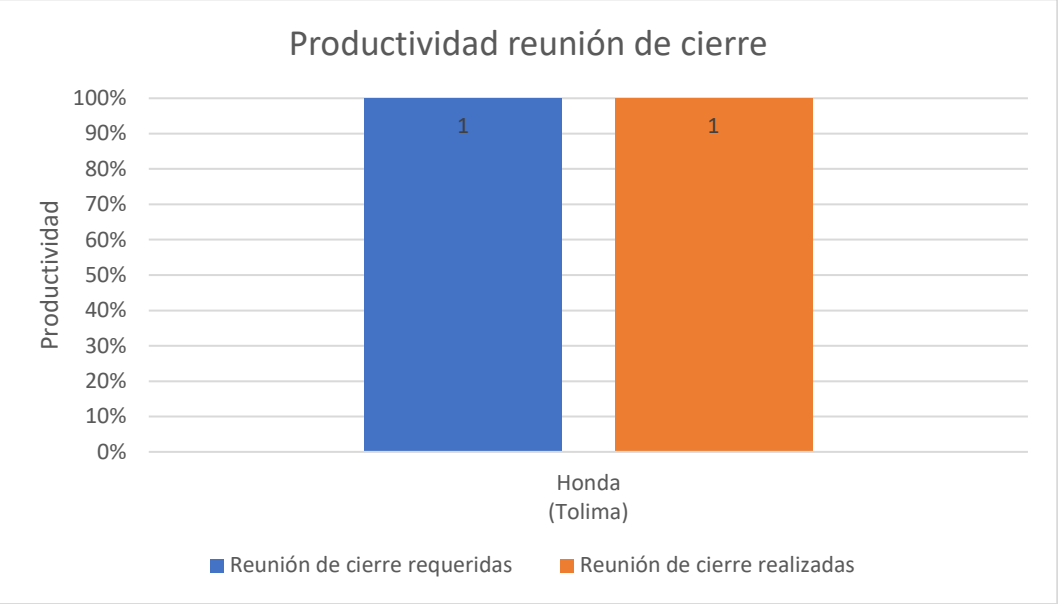


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 9 Participación en reuniones de cierre en el periodo.

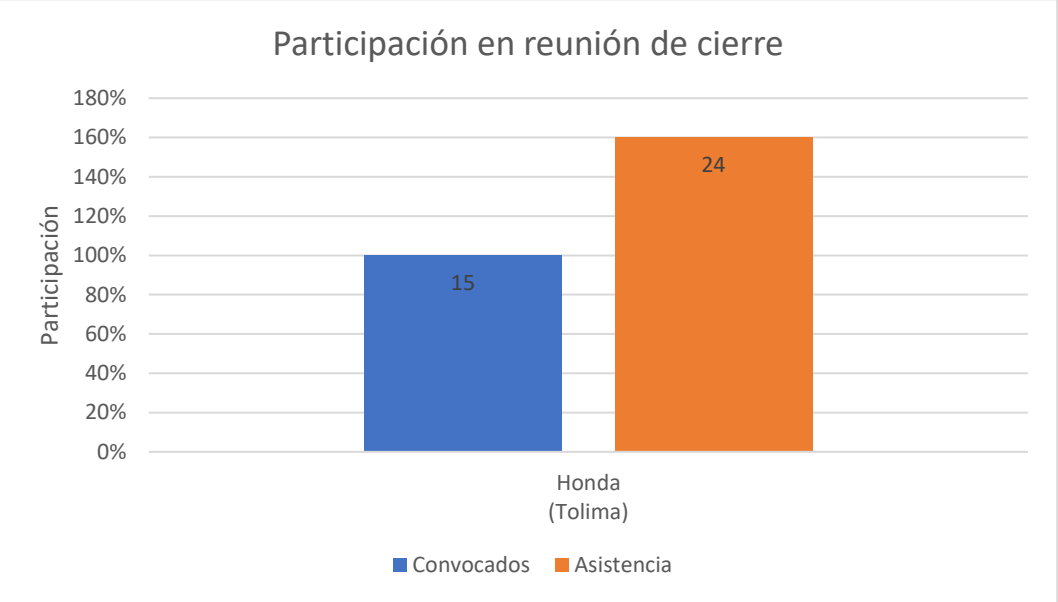

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 10 Gestión en reunión de cierre en el periodo.

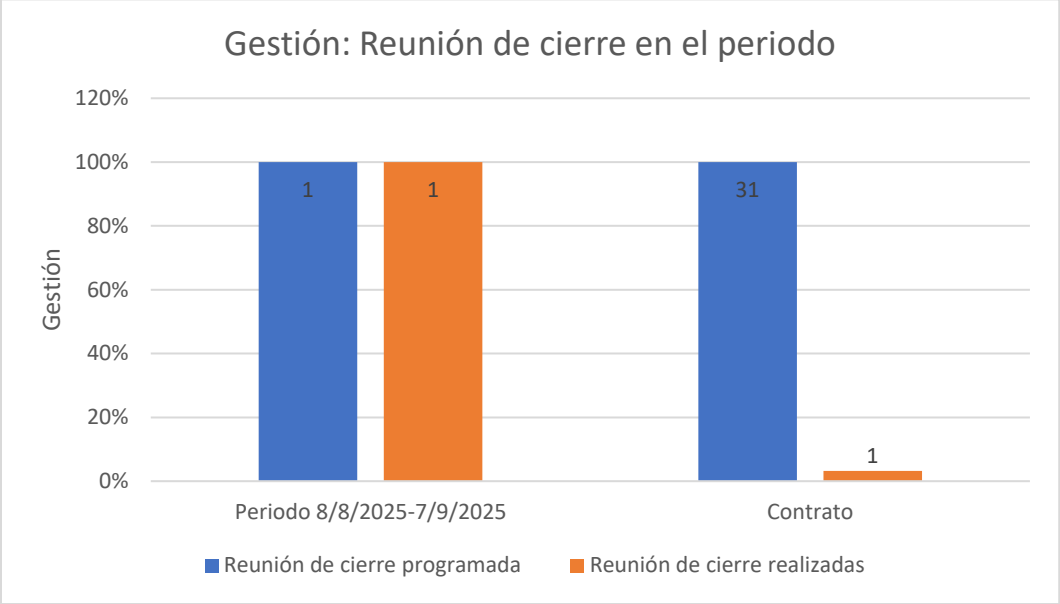

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: En el presente periodo se realizó reunión de cierre en el municipio de Honda, para este municipio se tiene un solo punto de intervención teniendo así un indicador de productividad del 100%. El indicador de asistencia tiene un porcentaje de participación de 160% ya que se superó el quórum requerido en el apéndice E. Se da cumplimiento al indicador de gestión en el periodo para el municipio de Honda con un porcentaje del 100% y en relación con el contrato se tiene una gestión del 3% siendo el municipio de Honda el único que cuenta con reunión de cierre.

9.1.3. Reuniones extraordinarias.

Desde el Apéndice E se contempla este espacio si la comunidad o entidades locales solicitan información puntual sobre el proyecto y se requieren espacios adicionales a los ya mencionados para socialización del proyecto. Estos serán consignados en los informes correspondientes a los periodos donde se desarrolle la actividad. Sin embargo, durante el periodo del presente informe no se adelantaron reuniones de este tipo.

9.2. Volantes.

9.2.1. Volante de convocatoria a reunión de inicio de obra.

El contratista deberá garantizar la emisión de material informativo concerniente a la obra, un total de 100 unidades por punto intervenido.

Durante el periodo de reporte, se realizó el acompañamiento y seguimiento al contratista en cuanto a la distribución de diversas piezas divulgativas con el fin de informar a la ciudadanía de los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Tolima sobre aspectos relevantes del proyecto. A continuación, se detalla la ejecución de esta actividad realizada por el área social del Consorcio señalizadores de Colombia.

Volante informativo No 8 - Socialización inicio de obra Soacha, Cundinamarca. Punto crítico priorizado con código 25754-026: El 14 de agosto de 2025, el contratista remite mediante correo electrónico a la interventoría la propuesta de contenido del volante de obra N.º 8, correspondiente a la convocatoria para la reunión de inicio de obra del punto crítico identificado con el código S25754-026. El 14 de agosto la interventoría remite mediante correo electrónico la propuesta a la ANSV y el día 15 de agosto la Agencia y la interventoría remiten mediante correo electrónico la aprobación al contratista. Ver anexo 2AproVolant.

Una vez el contratista contó con la aprobación de dicho volante, el día 15 de agosto de 2025 se llevó a cabo el proceso de convocatoria a la reunión de inicio en el área de influencia directa del punto crítico priorizado. En esta jornada, el contratista distribuyó el volante Informativo en cada predio del área de influencia directa, y en los principales establecimientos comerciales y equipamientos comunitarios. En total, se distribuyeron cien (101) volantes de manera presencial y cinco (5) mediante radicación virtual, para un consolidado de ciento seis (106) piezas. Ver 001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-023-RegDivVolanteInicioSoc026-V001. Informe No 5 contratista.

Volante informativo No 10: - Socialización inicio de obra Mosquera, Cundinamarca. Puntos críticos priorizados con código 25473-002 y 25473-003: El día 2 de septiembre de 2025, el contratista remite mediante correo electrónico a la interventoría para revisión y fines pertinentes, la propuesta de contenido del volante de obra No 10, a partir del cual se invitaría a los actores sociales y habitantes del área de influencia directa de los puntos críticos objeto de intervención en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, identificados con los códigos 25473-002 y 25473-003, a participar en la reunión de socialización de inicio de obra. El día 2 de septiembre la interventoría remite a la ANSV la propuesta del volante No.10 y se da aprobación el mismo día por parte de la Agencia y de la interventoría al volante a través de correo electrónico, ver anexo 2AproVolant.

Una vez el contratista contó con la aprobación de dicho volante, el día 3 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el proceso de convocatoria a la reunión de inicio en el área de influencia directa de los puntos críticos priorizados. En esta jornada, se distribuyó el volante Informativo en cada predio del área de influencia directa, y en los principales establecimientos comerciales y equipamientos comunitarios. El día 4 de septiembre de 2025 se efectuó la radicación virtual de la pieza de divulgación previamente aprobada, la cual fue enviada a las entidades de orden municipal, así como a los actores sociales vinculados a organizaciones comunales y demás personas identificadas en el directorio de actores sociales del municipio. En total, se realizó la entrega de 267 volantes. Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-025-RegDivVolanteInicioMsq002y003-V001

Volante informativo No 11 - Socialización inicio de obra Supía, Caldas. Punto crítico priorizado con código 17777_T30: El 4 de septiembre de 2025, el contratista remite mediante correo electrónico para revisión de la interventoría, la propuesta de contenido del volante de obra No 11, a partir del cual se invita a los actores sociales y habitantes del área de influencia directa del punto crítico objeto.de intervención en el municipio de Supía, departamento de Caldas, a participar en la reunión de socialización de inicio de obra. El día 5 de septiembre la interventoría remite a la ANSV la propuesta del volante No.11 y el mismo día se da aprobación por parte de la Agencia y la interventoría mediante correo electrónico al volante No.11. Ver anexo 2AproVolant.

Una vez el contratista conto con la aprobación de dicho volante, los días 6 y 7 de septiembre de 2025 el contratista realizó el proceso de convocatoria en el área de influencia directa, realizando la

distribución del material informativo en los predios del sector, así como en los principales establecimientos comerciales y equipamientos comunitarios. De esta manera, se distribuyeron setenta (70) piezas informativas.

La consolidación del total de volantes entregados y sus respectivos soportes se visualizan en la tabla 12.

Tabla **11** Trazabilidad aprobación de volantes

Tipo de volante	Fecha de envío contratista	Fecha de remisión a la ANSV	Fecha visto bueno	Fecha de aprobación
Volante No8 (Socialización inicio de obra Soacha 25754-026)	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
Volante No9. (Socialización fin de obra Honda)	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
Volante No10. (Socialización inicio de obra Mosquera puntos 25473-002 y 25473-003)	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025
Volante No11. (Socialización inicio de obra Supia)	04/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 12 Entrega de volantes de inicio a la comunidad en el período

Dpto.	Municipio	Punto	Fecha de entrega	Volantes requeridos	Volantes entregados	% de cumplimiento
Cundinamarca	Soacha	25754-026	15 de agosto 2025	100	106	106%
Cundinamarca	Mosquera	25473-002 y 25473-003	03 septiembre 2025	200	267	134%
Caldas	Supia	17777_T30	6 y 7 septiembre 2025.	100	70	70%
Total, Volantes reunión de inicio					443	

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 13 Indicador de cumplimiento entrega de volantes reuniones de inicio

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión en el periodo	No. volantes de inicio entregados en el período (443) *100 / No de volantes de inicio programados para entrega en el período (400)	99%
Productividad Soacha punto 25754-026	N° de volantes de início entregados (106) *100 / N° de volantes de início requeridos (100)	105%
Productividad Mosquera puntos 25473-002 y 25473-003	N° de volantes de início entregados (267) *100 / N° de volantes de início requeridos (200)	111%
Productividad Supía	N° de volantes de início entregados (70) *100 / N° de volantes de início requeridos (100)	70%
Productividad	N° de volantes de inicio entregados en el CTO (1755) *100 / N° de volantes de inicio requeridos en el CTO (3100)	56%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 11Gestión volantes de inicio

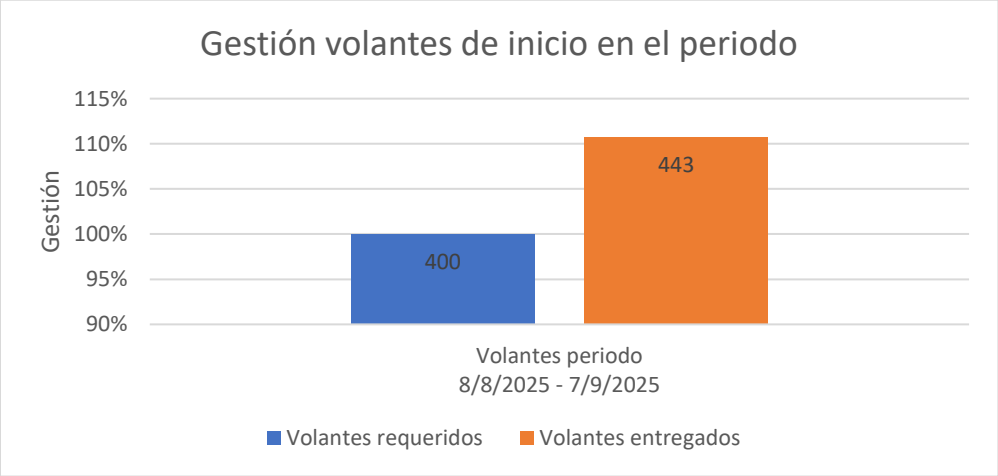

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S*

Ilustración 12 Productividad volantes de inicio en el periodo

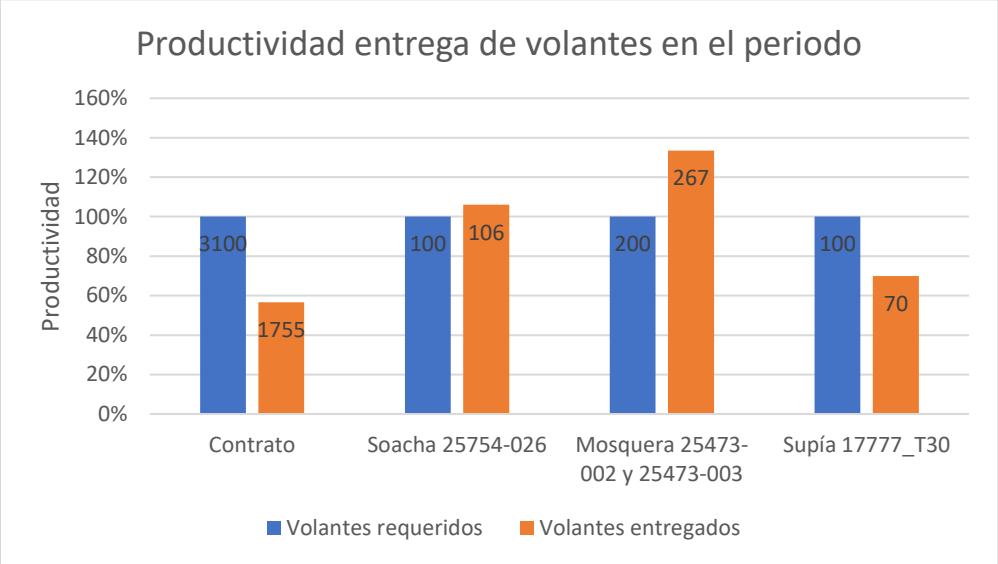

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S*

Análisis: en el presente periodo el contratista presentó un porcentaje de gestión del 99% y una productividad para los puntos de Soacha de 105%, Mosquera (2 puntos) de 111% y para el municipio de Supía se tuvo una productividad del 70% dado que para el periodo no se alcanzó a distribuir la totalidad de volantes que serán entregados y reportados en el siguiente periodo.

9.2.2. Volante de convocatoria a reunión de finalización de obra.

El contratista deberá garantizar la emisión y entrega de 100 unidades de esta pieza informativa, el mismo contará con oportuna revisión y aprobación por parte de Interventoría y será de conocimiento de la entidad contratante previa entrega a la comunidad.

Volantes informativos No 9 - Socialización fin de obra Honda, Tolima. Punto crítico priorizado con código SS_73349_001: El día 26 agosto de 2025, el contratista remite mediante correo electrónico, la propuesta de contenido del volante de obra No 9 a la interventoría, el 26 de agosto la interventoría remite vía correo electrónico la propuesta a la ANSV y el mismo día la Agencia y la interventoría dan aprobación vía correo electrónico al volante 9 mediante el cual se invita a los actores sociales y habitantes del área de influencia directa del punto crítico objeto de intervención en el municipio de Honda, departamento de Tolima, a participar en la reunión de socialización de finalización de obra. Ver anexo 2AproVolant.

Una vez el contratista contó con la aprobación de dicho volante, los días 26, 27 y 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo el proceso de convocatoria a la reunión de finalización por parte del área social del contratista en el área de influencia directa del punto crítico priorizado. En estas jornadas, se distribuyó el volante Informativo en cada predio dentro del área de influencia directa, y en los principales establecimientos comerciales y equipamientos comunitarios. Además, se entregó el volante a actores sociales estratégicos del municipio, como presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes comunitario. En total, se realizó la entrega de 167 volantes. Ver anexo001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-024-EntregaVolanteFinalHonda-V001. Informe No 5 contratista.

Tabla 14 Trazabilidad aprobación de volante

Tipo de volante	Fecha de envío contratista	Fecha de remisión a la ANSV	Fecha visto bueno	Fecha de aprobación
Volante No9 (Socialización fin de obra Honda SS_73349_001)	26/8/2025	26/8/2025	26/8/2025	26/8/2025

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S

Durante el periodo se llevó a cabo por parte del contratista la entrega de ciento 167 volantes para llevar a cabo la reunión de finalización del municipio de Honda (Tolima)

Tabla 15 Entrega de volantes de finalización a la comunidad en el período

Dpto.	Municipio	Punto	Fecha de entrega	Volantes requeridos	Volantes entregados	% de cumplimiento
Tolima	Honda	SS_73349_001	26,27 y 28 de agosto 2025	100	167	167%
Total, Volantes reunión de finalización					167	


Fuente: PIV Ingeniería S.A.S

Tabla 16 Indicador de cumplimiento entrega de volantes reuniones de finalización.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad Honda	N° de volantes entregados (167) *100 / N° de volantes requeridos (100)	167%
Gestión	No. volantes de finalización entregados en el período (167) *100 / No de volantes de finalización programados para entrega en el período (100)	167%
Productividad	N° de volantes de finalización entregados en el CTO (167) *100 / N° de volantes de finalización requeridos en el CTO (3100)	5%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 13 Indicador de gestión volantes de cierre en el periodo

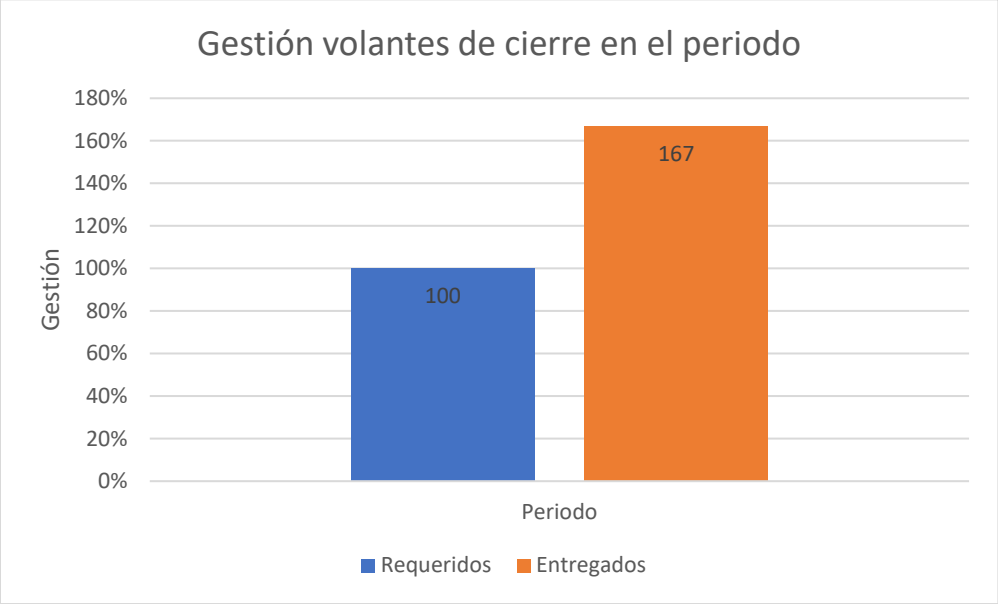

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 14 indicadores entrega de volantes de cierre

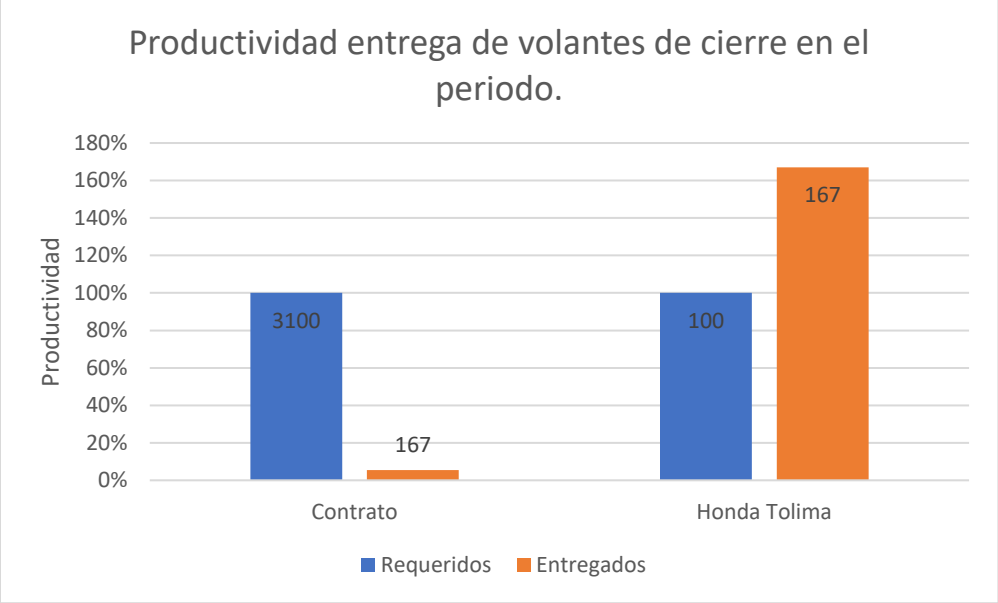

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: Para el presente periodo se efectuó la entrega de volantes de cierre para un punto en el municipio de Honda con un indicador de productividad de 167%. Igualmente, el indicador de gestión con cumplimiento del 167% siendo Honda el único punto hasta el momento que requirió de reunión de finalización en el contrato.

9.2.3. Volante socialización PMT

Volante informativo No 7 - Socialización PMT Supía, Caldas. El día 14 de agosto de 2025 el contratista remitió mediante correo electrónico para revisión de la interventoría la propuesta de contenido del volante informativo No 7, la interventoría remitió la propuesta vía correo electrónico el 14 de agosto 2025 siendo finalmente aprobado por la Agencia y la interventoría el 14 de agosto 2025 mediante correo electrónico ver anexo 3AprobVolantPMT. El 17 y 18 de agosto de 2025, el componente de gestión social del contratista distribuyó este volante informativo, en el área de influencia directa del punto crítico 17777-T30 priorizado por la entidad contratante y conceptuado como viable para que el componente técnico en el municipio de Supía intervenga, para socializar las medidas contempladas en el PMT con la comunidad y actores territoriales. En total, se distribuyeron ciento cincuenta y cinco (155) volantes en establecimientos, espacios comunitarios y demás predios del sector, asegurando la cobertura informativa a la población directamente impactada por las obras proyectadas. Es importante mencionar que durante la ejecución de esta actividad se contó con el acompañamiento de un delegado por parte de la Secretaría de Tránsito del municipio de Supía. Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-016-RevDivVolantePmtSupia-001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-017-EntregaVolantePmtSupia-V001. Informe No 5 contratista.

A continuación, en la Tabla 17 se relaciona la trazabilidad al respecto.

Tabla 17 Trazabilidad aprobación de volantes

Tipo de volante	Fecha de envío contratista	Fecha de remisión a la ANSV	Fecha visto bueno	Fecha de aprobación
Volante 7 (socialización PMT de Supia)	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 18 Entrega de volantes PMT

Dpto.	Municipio	Punto	Fecha de entrega	Volantes requeridos	Volantes entregados	% de cumplimiento
Caldas	Supia	17777_T30	17 y 18 agosto 2025	100 (PMT)	155	155%
Total, Volantes PMT					155	

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 19 Indicador de cumplimiento entrega de volante PMT

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad Supia 17777_T30	N° de volantes PMTentregados en el período (155) *100 / N° de volantes PMT requeridos en el período (100)	155%
Productividad	N° de volantes PMT entregados en el CTO (523) *100 / N° de volantes de finalización requeridos en el CTO (3100)	17%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 15 Indicador de productividad volantes PMT

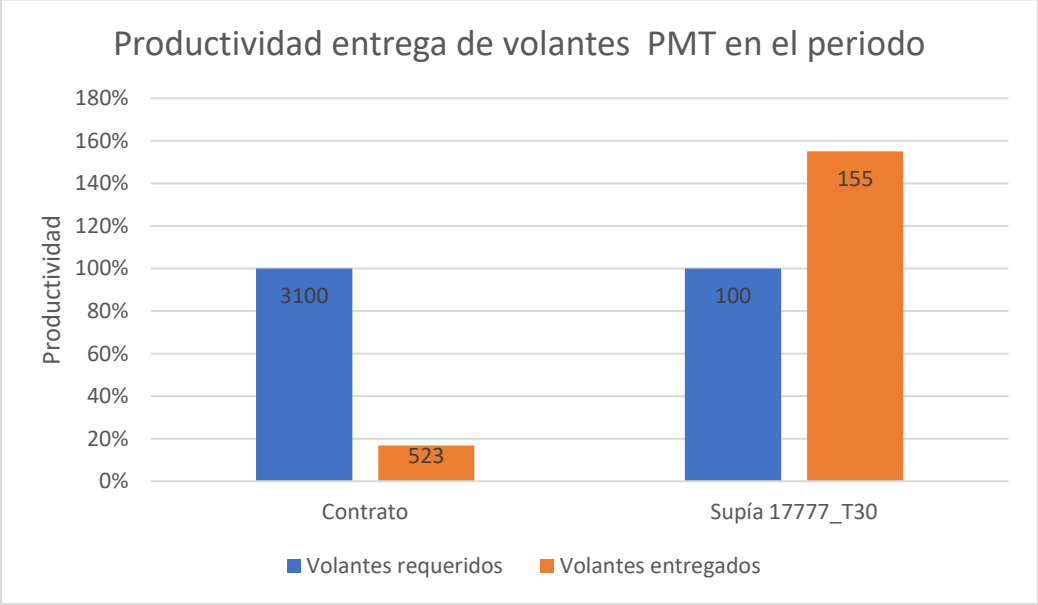

Análisis: Para el presente periodo se realizó la entrega de volantes PMT en un solo punto del municipio de Supía con una productividad fue del 155%.

Foto 2 Registro fotográfico entrega de volantes Supía (Caldas), Mosquera (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca) y Honda (Tolima).

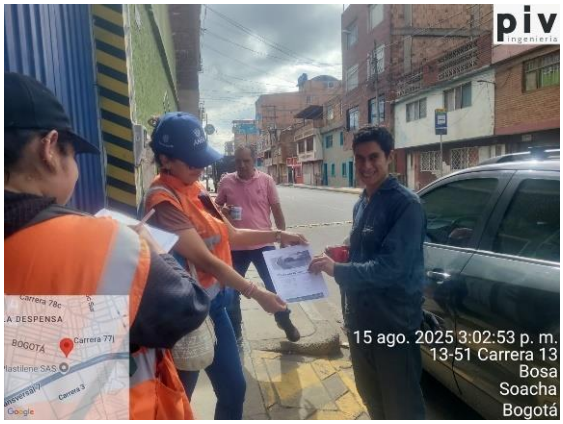







Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

9.3. Afiches.

El Contratista deberá garantizar la emisión de material informativo concerniente a la obra, un total de diez (10) unidades por punto intervenido, este contará con oportuna revisión y aprobación por parte de interventoría y será de conocimiento de la entidad contratante previa entrega a la comunidad. De esta manera en el periodo anterior el contratista remitió a la interventoría vía correo electrónico el día 15 julio de 2025 la propuesta de contenido del afiche informativo para el departamento de Cundinamarca (municipios de Soacha y Mosquera). El día 25 de julio la interventoría remite mediante correo electrónico la propuesta a la ANSV y esta es aprobada el 28 de julio vía correo electrónico. Ver anexo 2 7AprobAfiche.

Durante el periodo del presente informe se realizó la instalación de 40 afiches informativos en el departamento de Cundinamarca, distribuidos de la siguiente manera:

- Municipio de Soacha, el 9/8/2025 el contratista efectuó la instalación de diez (10) afiches informativos en el área de influencia directa del tramo priorizado, identificado con el código 25754-016. Posteriormente el 20/8/2025, se dispusieron diez (10) afiches adicionales en predios y establecimientos de alta concurrencia ubicados en el área de influencia directa del punto crítico identificado con el código 25754-026.
- Municipio de Mosquera, en este municipio el contratista realizó la instalación de veinte (20) afiches informativos, distribuidos en igual proporción (diez por punto), en los puntos con los códigos 25473-002 y 25473-003. Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-049-SoporteAficheSoc016-V001 001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-050-SoporteAficheSoc026-V001

Tabla 20 Relación instalación de afiches en el periodo.

Tipo de pieza	Municipio	Punto	Lugar de instalación	Fecha de instalación	Cantidad
Afiche	Soacha	25754-016.	Carrera 34ª#37 Calle 34ª#66-77 Calle 35 #35-27 Calle 37#36-121 Carrera 36#33-25 Carrera 36#34-95 Carrera36#37-73 Carrera 37#36-61 Carrera 36#37-73 Carrera 36#37-63	9/8/2025	10
		25754-026.	Carrera 13#58-94 Carrera 13#58-97 Carrera 7#13-79 Carrera 7#55-51 Carrera 13#58-97 Carrera 7#13-153 Carrera 13#58-102 Carrera 13#58-181 Carrera 13#59-190 Carrera 7#58-116	15/8/2025	10
Afiche	Mosquera	25473-002	Parque el trébol calle 10#1B-00 CR El Trébol Manz 12 Carrera 3 Est#12ª-85 Calle 10#4E-23 Calle 10#4E-23 Carrera 5Est#13-03 Calle 10#4E-50 Carrera 3Est#11-60 Colegio compartir carrera 3Est#10-77 Calle 10#1ª-18	5/9/2025	10

Tipo de pieza	Municipio	Punto	Lugar de instalación	Fecha de instalación	Cantidad
		25473-003	Carrera 2#12ª-66 CR El Trébol Manz 12 Calle 15 #11-35 Calle 12ª#1BE-85 Calle 15#1-28 Carrera 3Est#10-77 Calle 15 #2BE-22 Carrera 3Est#11-60 Carrera 3#11-55 Calle 15#1ª-06	5/9/2025	10

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 21 Indicador afiches.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión	N° de afiches instalados en el periodo (40) *100 N° de afiches programados en el periodo (40)	100%
Productividad Soacha 25754-016 y 25754-026.	No. afiches instalados en el municipio de Soacha (20) * 100 No de afiches programados en Soacha (20)	100%
Productividad Mosquera 25473-002 y 25473-003	No. afiches instalados en el municipio de Mosquera (20) * 100 No de afiches programados en Mosquera (20)	100%
Productividad	N° de afiches instalados en el CTO (70) *100 N° de afiches requeridos en el CTO (310)	23%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 16 Indicador de gestión afiches en el periodo

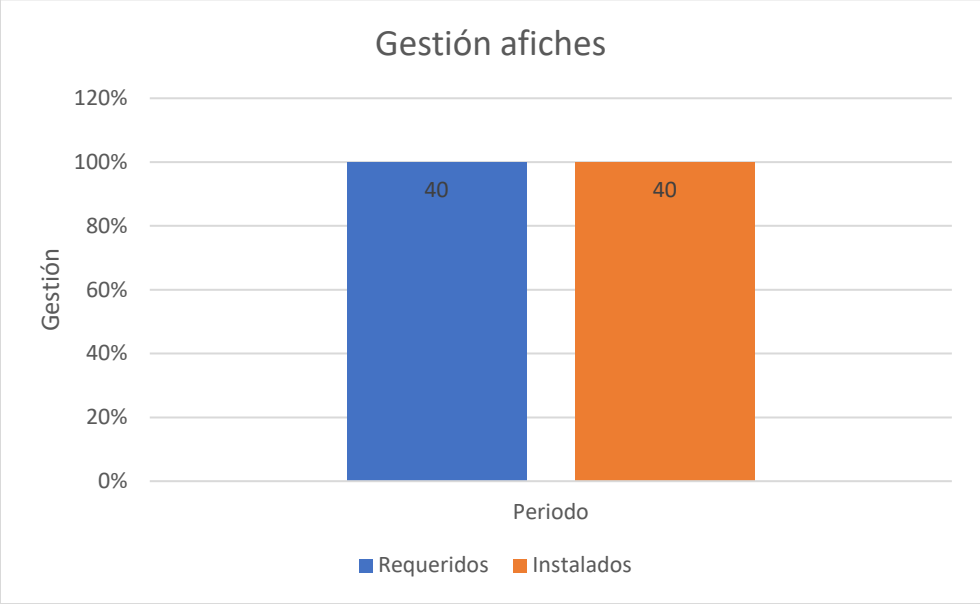

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 17 indicador productividad afiches.

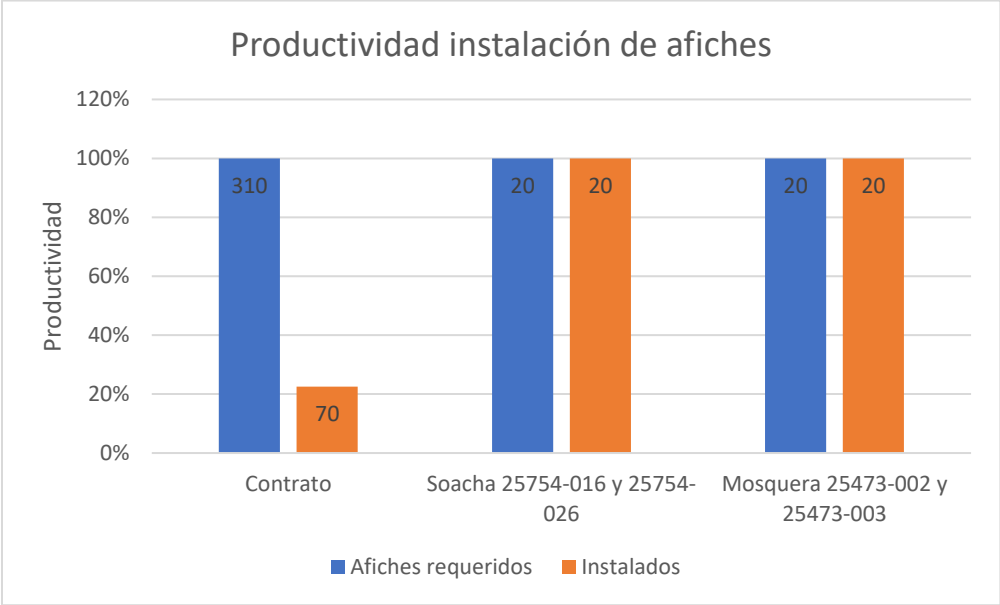

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: Para el presente periodo el indicador de gestión fue del 100%. Se llevó a cabo la instalación cuarenta (40) afiches en cuatro (4) puntos, dos en Soacha y dos en Mosquera, con un indicador de productividad del 100% para los cuatro (4) puntos. La productividad de afiches instalados en el contrato fue del 73%.

Foto 3 instalación de afiches









Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

9.4. Valla móvil.

El contratista deberá garantizar la emisión de material informativo concerniente a la obra, un total de una (1) unidad por punto intervenido, este contará con oportuna revisión y aprobación por parte de Interventoría y será de conocimiento de la entidad contratante previa entrega a la comunidad. El 20 de junio 2025 el contratista remitió por correo electrónico a la interventoría la propuesta de contenido de la valla móvil para el departamento de Tolima, la interventoría remite la propuesta de la valla a ANSV el 20 de junio 2025 por correo electrónico y se aprobó por correo electrónico el 21 de junio de 2025. El día 21 de julio 2025 el contratista remitió a la interventoría vía correo electrónico el contenido de la valla para el departamento de Cundinamarca, el 21 de julio la interventoría remite a la ANSV vía correo electrónico la propuesta de valla y este la aprueba vía correo electrónico el día 22 de julio de 2025. Ver anexo 4AprobVallas.

El día 12 de agosto 2025, el contratista realizó la instalación de una valla informativa en el municipio del Espinal punto SS-73268-002.

El día 05 de septiembre 2025 el contratista realizó la instalación de una valla informativa en el municipio de Girardot en el punto crítico identificado con el código 25307-008.

Tabla 22 Instalación de valla móvil.

Cantidad	Tramo	Fecha reportada	Fecha de verificación	Observaciones
1	El Espinal. SS-73268-002	12/08/2025	12/08/2025	Instalación de la segunda valla del contrato.
2	Girardot SS-73268-002	05/09/2025	05/08/2025	Instalación de la tercera valla del contrato.

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 23 Indicador productividad vallas móviles

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión	N° de vallas aprobadas para el contrato (2) *100 / N° de vallas requeridas en el contrato (4)	50%
Productividad El Espinal	No. vallas instaladas (1) * 100 / No de vallas requeridas (1)	100%
Productividad Girardot	No. vallas instaladas (1) * 100 / No de vallas requeridas (1)	100%
Gestión	No. vallas instaladas en el periodo (2) * 100 / No de vallas requeridas en el periodo (2)	100%
Productividad	N° de vallas instaladas en el CTO (2) *100 / N° de vallas requeridas por tramo activo (2)	100%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 18 Indicador de productividad

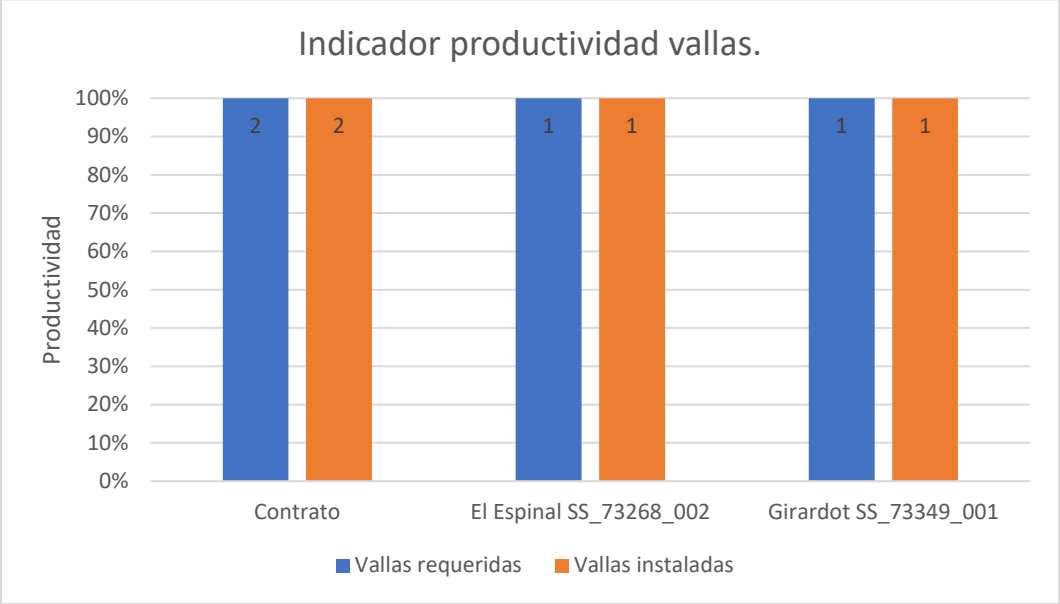

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 19 Indicador de gestión

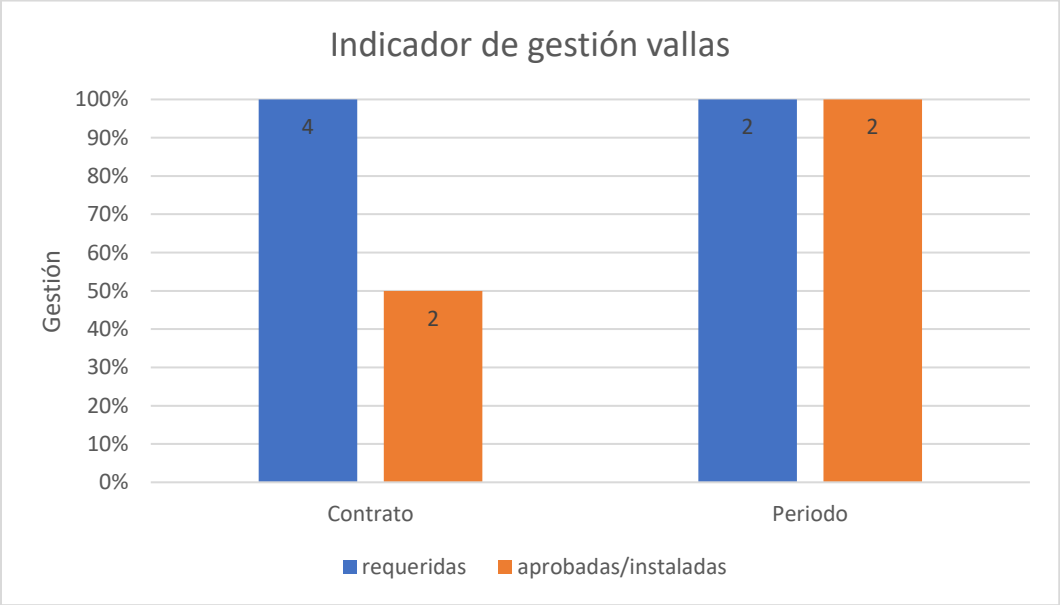

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: En este periodo se instalarán dos vallas para dos puntos activos en el contrato para una productividad del 100% para el contrato y para cada punto en intervención. En cuanto a gestión se tienen aprobadas dos (2) vallas de las 4 requeridas para el contrato dando un indicador de gestión del 50% y para el periodo del 100% ya que se cuenta con una valla por punto intervenido.

Foto 4 Valla móvil municipios de El Espinal y Girardot





Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

9.5. Monitoreo de medios de comunicación.

El contratista presentará el seguimiento hecho a las noticias positivas y negativas que se generen en los medios locales entorno a las intervenciones realizadas para facilitar el manejo de crisis y visualizar las labores realizadas de la manera adecuada.

De esta manera, el día 19 de agosto el área de gestión social del contratista adelantó un ejercicio sistemático de monitoreo diario de los seis (6) medios de comunicación locales más representativos del municipio de Honda por su alcance, nivel de audiencia y pertinencia para la difusión de información comunitaria e institucional. Como resultado de este seguimiento, se identificaron tres notas periodísticas en formato audiovisual publicadas en redes sociales, en las que se abordaron aspectos relacionados con el impacto de las medidas de seguridad vial implementadas, recomendaciones para su sostenibilidad y la comunicación de una contingencia surgida durante el proceso constructivo. Ver tabla 242.

Por su parte, en el municipio de El Espinal, se aplicó la misma metodología de monitoreo, verificando la información difundida por los seis medios locales más relevantes. Como resultado se identificó una nota divulgada en la red social oficial de la alcaldía municipal, en la que se resaltaron los impactos positivos de la intervención y los beneficios generados para la movilidad y la seguridad vial de la comunidad. Este tipo de publicación constituye un insumo valioso para fortalecer la legitimidad social del proyecto y para evidenciar la apropiación institucional de las acciones realizadas.

En cuanto al municipio de Girardot el monitoreo se desarrolló manteniendo la misma frecuencia y parámetros, sin embargo, para el período del presente informe no se identificaron publicaciones, notas, ni contenidos relacionados con la ejecución del contrato

001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-053-MonitoreoComuniHonda-V001 InfMen5-v001.
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-054-MonitoreoComuniEspinal-V001 InfMen5-v001.
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-055-MonitoreoComuniGirardot-V001 InfMen5-v001.

Tabla 24 Monitoreo de medios de comunicación

Municipio	Tipo de medio	Fecha	Difusión	Enlace
Honda SS_73349_001	R&T Producciones	15/8/2025	Red social Facebook	https://n9.cl/o414r
	Lo último de Honda y la región.	19/8/2025	Red social Facebook	https://n9.cl/qfapi
	Alcaldía de Tolima	20/8/2025	Red social Facebook	https://www.facebook.com/reel/769642098952583
El Espinal SS_73268_002	Alcaldía del Espinal	04/09/2025	Red social Facebook	https://www.tacebook.com/share/v/1GMUpSBF6T/
Girardot 25307_008	Durante el periodo de ejecución no se registraron comunicaciones, notas periodísticas, ni contenidos alusivos.			


Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Tabla 25 Indicador de cumplimiento medios de comunicación

Indicador	Fórmula	% cumplimiento
Productividad	No total de noticias Reportadas en el período 4 *100% No, total de noticias emitidas en medios de comunicación en el período 4	100%

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Ilustración 20 Productividad de monitoreo de medios de comunicación.

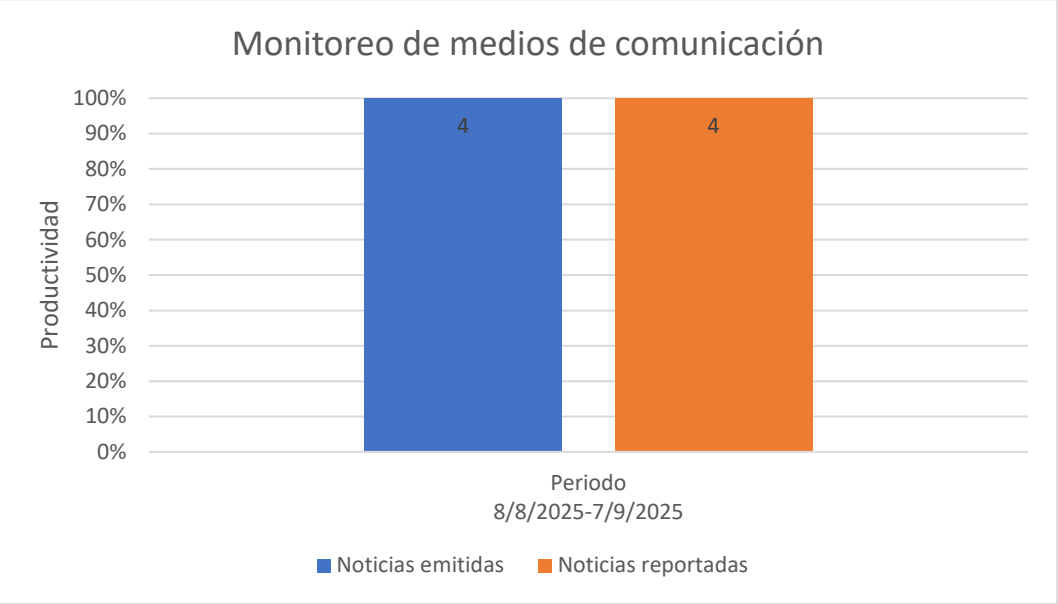

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Análisis: En el presente periodo se emitieron cuatro noticias en medios oficiales las cuales fueron reportadas por el contratista para un cumplimiento del 100%

9.6. Talleres de sensibilización.

El Contratista desarrollará talleres de sensibilización en buenas prácticas de seguridad vial, donde se garantice la participación de personas residentes de las áreas de influencia del proyecto, en donde se priorizará dos tipos de población, la primera relacionada con menores de edad y la segunda con adultos.

De esta manera, es de aclarar las metodologías a implementar para el desarrollo de los talleres en el municipio de Honda departamento del Tolima fueron remitidas por el contratista de obra el 1 de septiembre vía correo electrónico a la interventoría y esta lo remite a la ANSV mediante el mismo medio el día 1 de septiembre 2025 y esta metodología es aprobada mediante correo electrónico el día 1 de septiembre de 2025. Ver anexo 5AproTalleres

Para el período del presente informe, el contratista realizó dos talleres de seguridad vial en el municipio de Honda Tolima, los cuales se relacionan a continuación

- Taller para estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa Juan Manuel Rudas, la metodología incluyó actividades lúdicas orientadas a facilitar la comprensión de las normas de tránsito y fomentar hábitos seguros en la movilidad cotidiana. Se realizó el día 3 de septiembre de 2025, en horario de 2:10 p. m. a 3:10 p. m., contando con la participación de veintisiete (27) estudiantes con edad promedio de 9 años que participaron en una actividad simbólica comprometiéndose a aplicar lo aprendido y a compartirlo en su entorno familiar y comunitario

- Taller para padres de familia. Se realizó el día 3/9/2025 en horario de 8:00 a. m. -9:00 a.m., la jornada contó con la participación de un total de dieciocho (18) adultos entre padres, madres y acudientes, quienes trabajaron en torno al tema "prevención de riesgo vial"

001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-007-TallerSensMenoresHND-V001 InfMen5-v001.
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-006-TallerSensAdultosHND-V001 InfMen5-v001.

Tabla 26 Consolidado desarrollo de sensibilizaciones en buenas prácticas de seguridad vial.

Fecha	Municipio y punto	Tema	Convocados	Asistentes	% de participación	Observaciones
3/9/2025	Honda	prevención de riesgo vial	18	18	100%	Talleres adultos
3/9/2025	Honda	prevención de riesgo vial	27	27	100%	Taller Niños
Total, asistentes				45		

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

- Indicador de cumplimiento


Tabla 27 Indicador de cumplimiento talleres de sensibilización.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad	N° de Talleres de sensibilización con niños ejecutados en el período (1) *100 / N° de Talleres de sensibilización con menores programados (1)	100%
Productividad	N° de Talleres de sensibilización con adultos ejecutados en el período (1) *100 / N° deTalleres de sensibilización con adultos programados en el período (1)	100%
Gestión	N° total de puntos con talleres de sensibilización niños y adultos ejecutados en el municipio de Honda (1) *100 / N° total de puntos con tallares de sensibilización niños y adultos programados en el municipio de Honda (1)	100%
Participación	Total, asistentes talleres niños y adultos (45) * 100 / Total, convocados talleres niños y adultos (45)	100%
Gestión	No. de Talleres de sensibilización con niños ejecutados para el Cto (1) * 100 / No de Talleres de sensibilización con niños requeridos para el Cto (11)	9%

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión	No. de Talleres de sensibilización con adultos ejecutados para el Cto (1) * 100 N° de Talleres de sensibilización con adultos requeridos para el Cto (11)	9%


Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Ilustración 21 Productividad de talleres de sensibilización

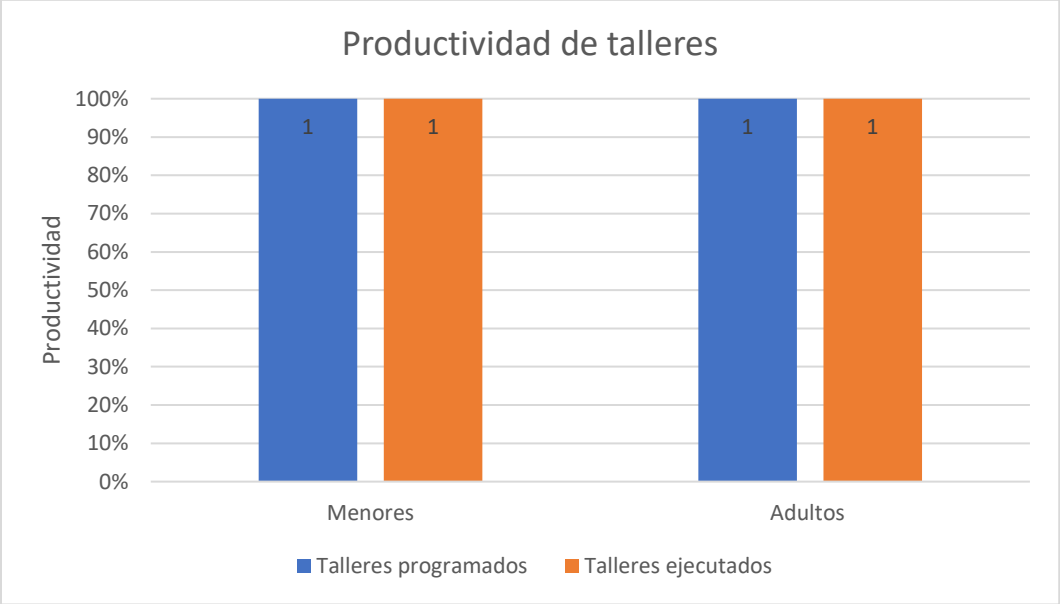


Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Ilustración 22 Gestión de talleres de sensibilización

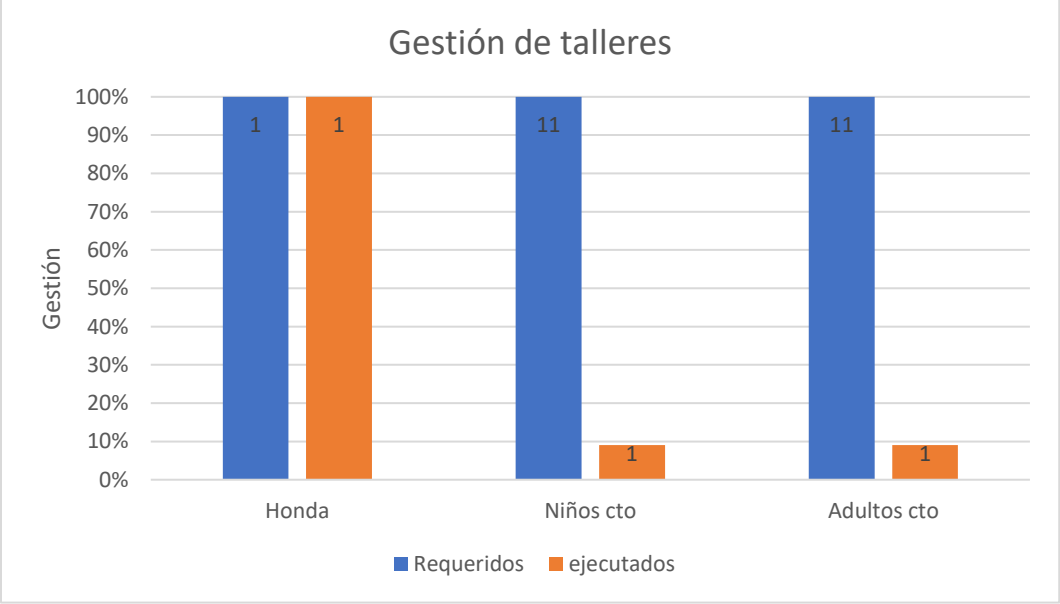

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Ilustración 23 Participación de talleres de sensibilización

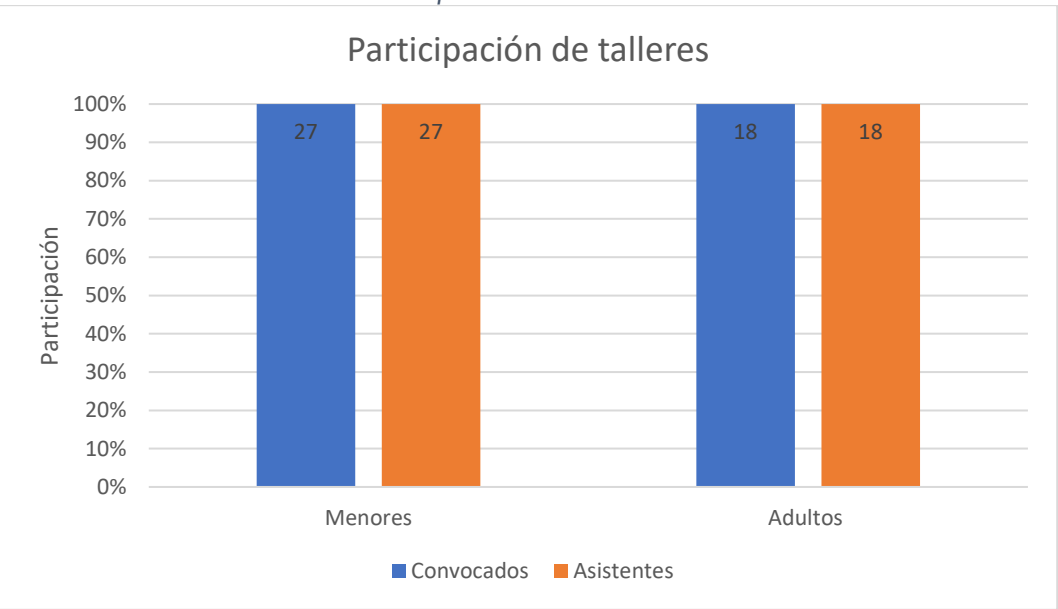

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Análisis: En el presente periodo se realizaron dos talleres uno para adultos con una productividad del 100% y uno para menores con una productividad del 100% y con un indicador de gestión en el punto Honda del 100% y del 9% de los talleres requeridos en el contrato para adulto y para niños. Estos talleres contaron con una participación en la convocatoria del 100%.

10. Gestión humana y contratación de mano de obra regional.

En aras de favorecer la empleabilidad en los diferentes puntos de intervención, el Contratista vinculará formalmente a personas residentes de los diferentes municipios y garantizará como mínimo el diez por ciento (10%) sobre el total vinculado, donde primará la inclusión de personas en condición de vulnerabilidad, comunidad LGTBI, mujeres cabeza de hogar, personas en condición de pobreza extrema, pertenecientes a grupos étnicos, reinsertados, expresidiarios, personas en condición de discapacidad toda vez que esta no sea limitante para el ejercicio de labores asociadas al cargo, jóvenes, desplazados y víctimas del conflicto armado o de desastres naturales.

De esta manera, para el período el presente informe, el contratista reportó la vinculación de 17 trabajadores al contrato, de los cuales 9 residentes de las áreas de influencia directa del proyecto. Este resultado representa un cumplimiento del 53% en la contratación mano de obra regional tal como se presenta en la tabla 286.
Ver anexo 001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-056-RegManObrInfMen5-v001.

Tabla 28 Seguimiento contratación de MONC.

Periodo	Total, de mano de obra no calificada vinculada al contrato	Total, mano de obra no calificada de la región	Porcentaje de cumplimiento
8/8/2025-7/9/2025	17	9	53%

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.


Tabla 29 Indicador de cumplimiento contratación mano de obra.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad	N° total de personal contratada del AIDP (9) *100 N° total de personal vinculado al contrato (17)	53%

Fuente: PIV Ingeniería S.A.S.

Nota aclaratoria: AIDP Área de influencia directa del proyecto.

Ilustración 24 Indicador de cumplimiento contratación mano de obra.

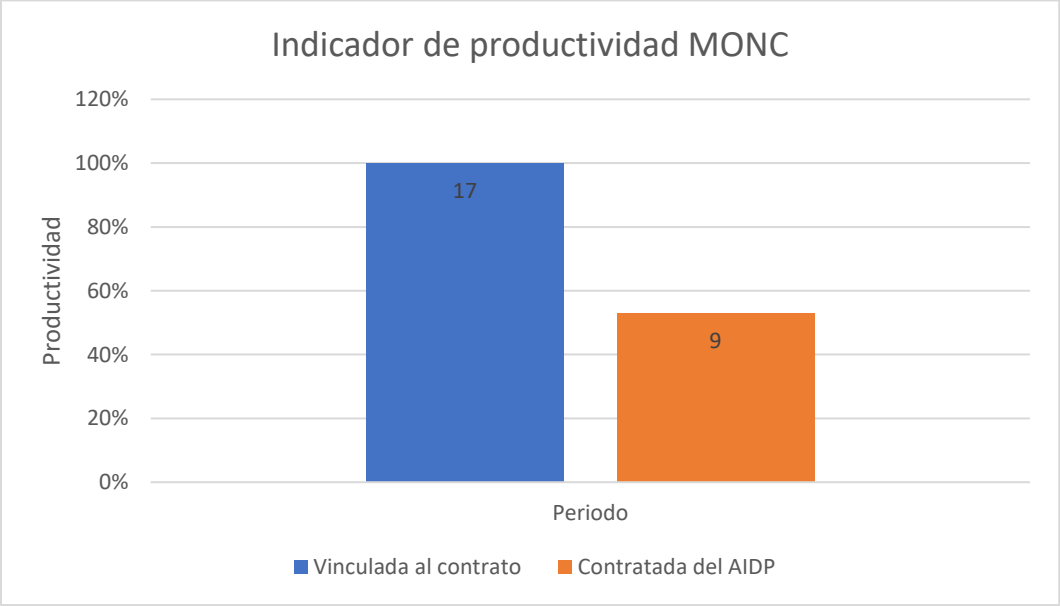

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: Para el presente periodo se hizo contratación de mano de obra en el contrato y se obtuvo un indicador de productividad del 53% de MONC dando cumplimiento a los requerimientos del apéndice E.

11. Acompañamiento social a actividades técnicas en intervención.

Este componente permite al Contratista facilitar la labor del área técnica y la interlocución con la comunidad donde el área social cumple el papel facilitador para la consecución de actividades de obra. Para el proyecto "Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad vial-ANSV, ZONA 4" se tiene contemplado los siguientes ítems para acompañamiento de parte de las profesionales sociales al área técnica.

11.1. Levantamiento actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre.

El levantamiento de actas de vecindad se realizará en dos momentos, el primero previo a la intervención y el segundo posterior a esta, donde el Contratista garantizará la elaboración de la totalidad de actas que cada punto requiera, el inventario deberá ser concertado con Interventoría, quien dará aprobación al mismo para su realización, de igual manera desde el ente interventor se verificará que la totalidad de actas iniciales cuenten con su respectiva acta de cierre.

De esta manera, para el período del 8 de agosto al 7 de septiembre, se llevaron a cabo actividades de acompañamiento al contratista para el levantamiento de actas de vecindad en cuatro puntos críticos priorizados del departamento de Cundinamarca, específicamente dos en el municipio de Soacha (ID25754-016 y ID25754-026) y dos en el municipio de Mosquera (ID25473-002 e ID 25473-003), de acuerdo con la programación y cronograma establecidos. A continuación, se describen los resultados:

- ID25754-026/ Soacha: El 8 de agosto se realizó acompañamiento al área de gestión social y técnico del contratista en la elaboración de tres (3) actas de vecindad de inicio, el día 11 de agosto se realizaron siete (7) actas de vecindad y el 12 de agosto dos (2) para un total de ejecución de doce (12) actas.

- ID25754-011/ Soacha: Los días 21 y 22 de agosto se realizó acompañamiento al área social y técnico del contratista en el levantamiento de doce (12) actas de vecindad de inicio, por lo cual, de acuerdo con ello se da por finalizado el proceso de levantamiento de actas en este frente de obra.

- ID25473-002/Mosquera: Los días 19 y 21 de agosto y 3 de septiembre se realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de seis (6) actas de vecindad. Con ello se dio por concluida la actividad en este frente de obra

- ID 25473-003/Mosquera: El día 25 de agosto se realizó la suscripción de tres (3) actas de vecindad de inicio, finalizado el procedimiento de verificación y registro social de esta actividad para este punto.

- ID17777-T30/Supía: los días 4, 5 y 6 de septiembre se realizó el levantamiento de treinta y seis (36) actas de vecindad. Finalizado el procedimiento de verificación y registro técnico social, de esta esta actividad para este punto.

En este punto es importante mencionar que, para el período del presente informe, el contratista realizó un total de sesenta y nueve (69) actas de vecindad de inicio que están en proceso de sistematización para entrega a la interventoría.

Tabla 30 Trazabilidad entrega de inventario para elaboración actas de vecindad.

Departamento/punto de intervención	Oficio contratista	Fecha de radicación contratista	Oficio de interventoría	Fecha de aprobación interventoría	Observaciones
Cundinamarca/ ID25754-026 Soacha	No entregado	NA	NA	NA	El contratista está en proceso de entrega
Cundinamarca/ID25754-011 Soacha	No entregado	NA	NA	NA	El contratista está en proceso de entrega
Cundinamarca/ID25473-002 Mosquera	No entregado	NA	NA	NA	El contratista está en proceso de entrega
Cundinamarca/ID25473-003 Mosquera	No entregado	NA	NA	NA	El contratista está en proceso de entrega
Caldas/ID17777-T30 Supía	No entregado	NA	NA	NA	El contratista está en proceso de entrega

Tabla 31 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25754-026 durante la ejecución del contrato.

Departamento		Cundinamarca		
Municipio / Punto		Soacha/ 25754-026		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
01	Kr 13 # 58-05	8/8/2025	No entregado a interventoría	Fachada
02	Kr 7 # 58-149	8/8/2025		Fachada
03	Kr 3 # 58-06	8/8/2025		Fachada
04	Kr 7 # 58-99/101	11/8/2025		Fachada
05	Kr 7 # 58-111/113	11/8/2025		Fachada
06	Kr 3 # 58- 181/191	11/8/2025		Fachada
07	Kr 13 # 60 - 09	11/8/2025		Fachada

Departamento		Cundinamarca		
Municipio / Punto		Soacha/ 25754-026		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
08	Kr 7 # 58-107	11/8/2025		Fachada
09	Kr 3 # 58-79/81	11/8/2025		Fachada
10	Kr 13 # 58-73/75	11/8/2025		Fachada
11	Kr 13 # 58-151/153	12/8/2025		Fachada
12	Kr 13 # 58-74	12/8/2025		Fachada

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 32 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25754-011 durante la ejecución del contrato.

Departamento		Cundinamarca		
Municipio / Punto		Soacha/ 25754-011		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
01	Cl 7 D # 8-60 Este	21/8/2025	No entregado a interventoría	Fachada
02	CL 7 D # 8 A- 07 ESTE	21/8/2025		Fachada
03	CL 7 D # 8- 41 ESTE	21/8/2025		Fachada
04	CL 7 D # 8 A-04 ESTE	21/8/2025		Fachada
05	Cl 7 D # 8-35 ESTE	21/8/2025		Fachada
06	CL 7 D # 8A - 13 ESTE	21/8/2025		Fachada
07	CL 7 D # 8-54 ESTE	21/8/2025		Fachada
08	CL 7 D # 8A- 12 ESTE	21/8/2025		Fachada
09	CR 7 A ESTE # 7C 37	22/8/2025		Fachada
10	CL 7 D # 6 -64 ESTE	22/8/2025		Fachada

Departamento		Cundinamarca		
Municipio / Punto		Soacha/ 25754-011		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
11	Cl 7 D # 8-60 Este	21/8/2025		Fachada
12	CL 7 D # 8 A- 07 ESTE	21/8/2025		Fachada

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 33 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25473-002 durante la ejecución del contrato.

Departamento		Cundinamarca		
Municipio / Punto		Mosquera/25473-002		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
Se suscribe seis (6) actas, cuya caracterización se está consolidando.				

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 34 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 25473-003 durante la ejecución del contrato.

Departamento		Cundinamarca		
Municipio / Punto		Mosquera/25473-003		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
Se suscribe tres (3) actas cuya caracterización se está consolidando.				

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 35 Consolidado de actas de vecindad realizadas en el punto 17777-T30 durante la ejecución del contrato.

Departamento		Caldas		
Municipio / Punto		Supía/17777-T30		
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado	Alcance Fachada/Interna
Se suscribe un total de treinta y seis (36) actas, cuya caracterización se encuentra en proceso de consolidación.				

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 36 Indicador de cumplimiento actas de vecindad de inicio

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión	N° Total de actas realizadas en el periodo (69) *100% / N° Total actas programadas en el periodo (69)	100%
Productividad	N° Total de actas realizadas en Mosquera (9) *100) / N° Total actas inventariadas Mosquera (9)	100%
Productividad	N° Total de actas realizadas en Soacha (24)*100) / N° Total actas inventariadas en Soacha (24)	100%
Productividad	N° Total de actas realizadas en Supia (36)*100) / N° Total actas inventariadas en Supía (36)	100%
Gestión	N° Total de actas realizadas en el Cto (128) *100% / N° Total actas programadas para el Cto (128)	100%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 25 Indicador de gestión actas de vecindad.

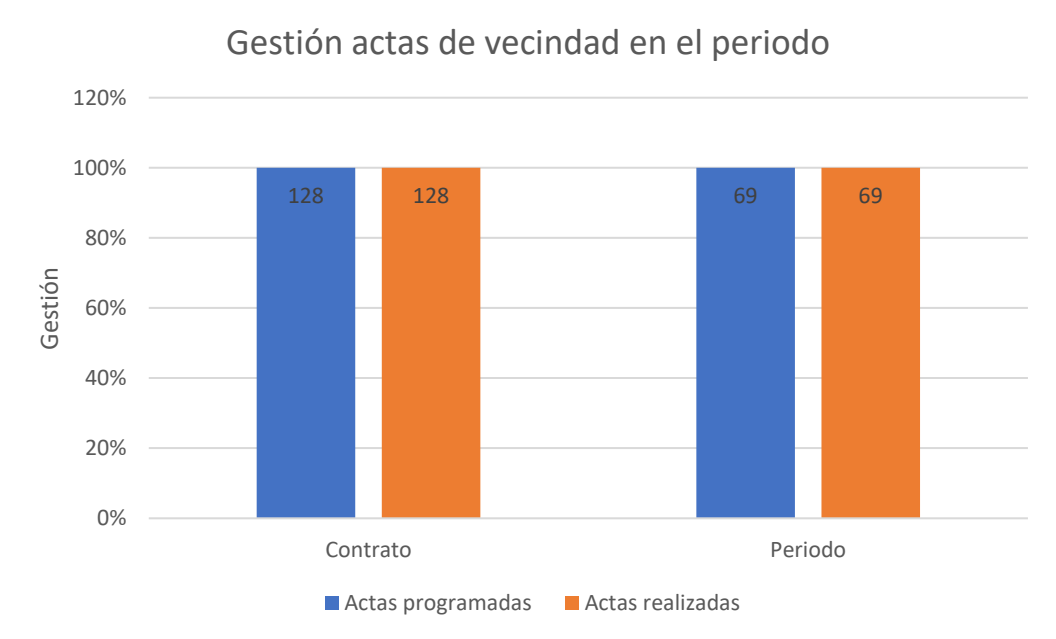

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 26 Indicador de productividad actas de vecindad en el periodo.

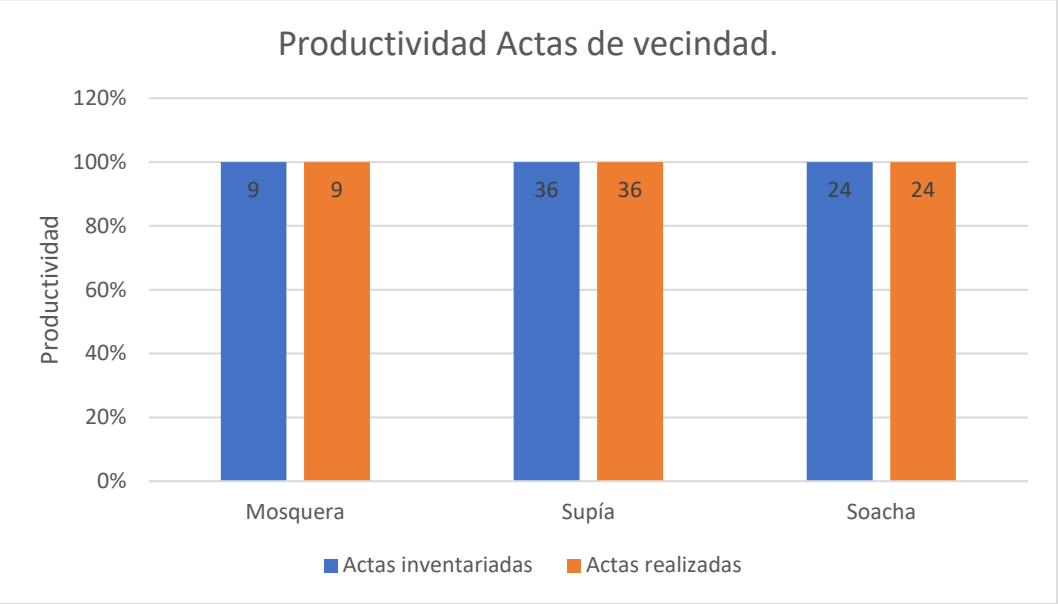

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: Se cumplió con las actividades del componente en los municipios de Mosquera, Supía y Soacha con un indicador de productividad del 100% en los tres (3) municipios y un indicador de gestión en el periodo del 100%.

Foto 5 Actas de vecindad Mosquera y Soacha.









Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

11.2. Actas de aceptación.

La gestión social del contratista comprende la socialización a la comunidad de las implementaciones a realizar por cada punto garantizando el entendimiento de estas. Para respaldar el componente técnico y generar la durabilidad de los elementos, para ello es necesario obtener la aceptación de la ciudadanía de las implementaciones en cada punto, que se realizará de conformidad con el desarrollo de cada uno. Desde la Interventoría se realizará acompañamiento constante a cada socialización, así como se verificará los soportes de gestión elaborados por el contratista donde se evidencie que la comunidad cuenta con la información relacionada a los diseños.

De esta manera, desde la interventoría se realizó acompañamiento al contratista para la socialización y suscripción de actas de aceptación en cuatro (4) puntos del departamento de Cundinamarca, distribuidos así: dos (2) puntos en Soacha (ID25754-026 y ID25754-011) y dos (2) puntos en Mosquera (ID25473-022 e ID25473-003), de acuerdo con la programación establecidos, a continuación, se describen los resultados:

- ID 25754-026 / Soacha: Los días 13,14 y 15 de agosto se realizaron cincuenta y tres (53) actas de aceptación, con lo cual se dio por finalizada la actividad en este punto.
- ID 25754-011 / Soacha: Los días 21 y 22 de agosto el contratista realizó el levantamiento de treinta y ocho (38) actas, con lo cual se dio por culminada la actividad en este frente de obra.
- ID 25473-002/ Mosquera: Los días 1,2,3,4 y 5 de septiembre, el contratista suscribió un total de once (11) actas de aceptación.
- ID 25473-003/ Mosquera: El contratista realiza el levantamiento de ocho (8) actas de aceptación.
- ID 17777_T30 / Supía: Los días 5,6 y 7 de septiembre se realizó el levantamiento de cincuenta y nueve (59) actas de aceptación en este punto.

Según lo expuesto, se realizaron 169 actas de aceptación en las cuales el contratista se encuentran en proceso de sistematización para entrega a la interventoría.

Tabla 37 Actas de aceptación realizadas en el punto 25754-026.

Departamento		Cundinamarca	
Municipio / Punto		Soacha/ID 25754-026	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
01	Kr 7 # 58- 99/101	13/8/2025	No entregado a interventoría
02	Kr 13 # 58-142	13/8/2025	
03	Kr 13 # 58-86/84	13/8/2025	
04	Kr 13 # 58-73/75	13/8/2025	
05	Kr 13 # 58-171	13/8/2025	
06	Kr 13 # 58-130	13/8/2025	
07	Kr 13 # 58- 102/100	13/8/2025	
08	Kr 13 # 58-06	13/8/2025	
09	Kr 7 # 58-149	13/8/2025	
10	Kr 7 con calle 57	13/8/2025	
11	Kr 13 # 58-36	13/8/2025	
12	Kr 7 # 58-137	13/8/2025	
13	Kr 13 # 58-38	13/8/2025	
14	Kr 13 # 58-24/26/22	13/8/2025	
15	Kr 13 # 58-09/11	13/8/2025	
16	Kr 13 # 58-06	13/8/2025	
17	Kr 13 # 58-91	13/8/2025	
18	Kr 13 # 58-99	13/8/2025	
19	Kr 13 # 58-108/110	13/8/2025	
20	Kr 13 # 58-133	13/8/2025	
21	Kr 13 # 58-141	13/8/2025	
22	Kr 13 # 58-157	13/8/2025	
23	Kr 13 # 58-85/87	13/8/2025	
24	Kr 13 # 58-29	13/8/2025	
25	Kr 13 # 58-05	13/8/2025	
26	Kr 13 # 58-42	13/8/2025	
27	Kr 13 # 58-59	13/8/2025	
28	Kr 13 # 58-181	14/8/2025	
29	Kr 13 # 59-190	14/8/2025	
30	Kr 7 # 58-133	14/8/2025	
31	Kr 7 # 58-138	14/8/2025	
32	Kr 7 # 58-154	14/8/2025	
33	Kr 13 # 58-191	14/8/2025	
34	Kr 4 # 60-53	14/8/2025	
35	Kr 77 H # 65 b -09 Sur	14/8/2025	
36	Kr 77 H # 65 G 23 Sur	14/8/2025	
37	Cl 65 G # 77 G-23	14/8/2025	
38	Kr 13 # 58-181	14/8/2025	

Departamento		Cundinamarca	
Municipio / Punto		Soacha/ID 25754-026	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
39	Kr 14 # 60-08	14/8/2025	
40	Kr 7 # 58-170	14/8/2025	
41	Kr 7# 58-132	14/8/2025	
42	Kr 7 # 65 G sur -12 / kr 14 # 60-24	14/8/2025	
43	Cl 65 G bis # 77 G-23	14/8/2025	
44	Cl 65 G bis A sur # 77 G 15	14/8/2025	
45	Cl 65 G bis A # 77 H 16 Sur	14/8/2025	
46	Kr 4 # 58-95	14/8/2025	
47	Kr 4 # 58-101	14/8/2025	
48	Kr 7 # 58 -110	14/8/2025	
49	Kr 7 # 58-121	14/8/2025	
50	Kr 7 # 58-146	14/8/2025	
51	Kr 7 # 58-164	14/8/2025	
52	Kr 7 # 58-180	15/8/2025	
53	Kr 7 # 58-116	15/8/2025	

Tabla 38 Actas de aceptación realizadas en el punto 25754-026

Departamento		Cundinamarca	
Municipio / Punto		25754-011	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
01	Kr 9 este # 7c 32	21/8/2025	No entregado a la interventoría.
02	Kr 9 este # 7 c 26	21/8/2025	
03	Cl 7 d # 8a 26 este	21/8/2025	
04	Cl 7 d # 8a 19 este	21/8/2025	
05	Kr 7 d # 8a 33 este	21/8/2025	
06	Cl 7 d # 8a 12 este	21/8/2025	
07	Cl 7 d # 8 54 este	21/8/2025	
08	Cl 7 d # 8c 54 este	21/8/2025	
09	Cl 7 d # 8 41 este	21/8/2025	
10	Cl 7 d # 8a 04 este	21/8/2025	
11	Cl 7 d # 8b 14 este	21/8/2025	
12	Cl 7 d # 8 29 este	21/8/2025	
13	Kr 7 d # 8a 23 este	21/8/2025	
14	Cl 7 d # 8b 03 este	21/8/2025	
15	Kr 9 # este # 7c 50	21/8/2025	
16	Cl 7d # 8a 24 este	21/8/2025	
17	Cl 7d #6 52 este	21/8/2025	
18	Cl 7g # 8 06 este	21/8/2025	

Departamento		Cundinamarca	
Municipio / Punto		25754-011	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
19	Cl 7d # 8 60 este	21/8/2025	
20	Cl 7d # 8a 07 este	21/8/2025	
21	Kr 8 este # 7d 38	22/8/2025	
22	Kr 8 este # 7d 32	22/8/2025	
23	Kr 8 este # 7d 24	22/8/2025	
24	Kr 8 este # 7d 12	22/8/2025	
25	Cl 7d # 8 30 este	22/8/2025	
26	Cl 7d # 8 42 este	22/8/2025	
27	Cl 7d # 6 69 este	22/8/2025	
28	Kr 8 este # 7g 29	22/8/2025	
29	Kr 8 este # 7g 11	22/8/2025	
30	Kr 8 este # 7g 05	22/8/2025	
31	Kr 8 este # 7d 49	22/8/2025	
32	Kr 8 este # 7 d 39	22/8/2025	
33	Cl 7g # 8 05 este	22/8/2025	
34	Kr 8 este # 7d 09	22/8/2025	
35	Cl 7d # 8 26 este	22/8/2025	
36	Cl 7 d # 8 24 este	22/8/2025	
37	Cl 7d # 6 64 este	22/8/2025	
38	Cl 7 d # 8 38 este	22/8/2025	

Tabla 39 Actas de aceptación realizadas en el punto 25473-002

Departamento		Cundinamarca	
Municipio / Punto		Mosquera/ 25473-002	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
Se suscribieron once (11) actas, cuya caracterización está en proceso de consolidación y se presentará en el próximo informe.			

Tabla 40 Actas de aceptación realizadas en el punto 25473-003

Departamento		Cundinamarca	
Municipio / Punto		Mosquera/ 25473-003	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
Se suscribieron ocho (8) actas, cuya caracterización está en consolidación y se presentará en el próximo informe.			

Tabla 41 Actas de aceptación realizadas en el punto 17777-T30

Departamento		Caldas	
Municipio / Punto		Supia / 17777_T30	
N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha de realización	Estado
Hasta la fecha de corte, se han suscrito un total de cincuenta y nueve (59) actas, cuya caracterización se encuentra en proceso de consolidación y será presentada en el próximo informe.			

Tabla 42 Actas de aceptación en el periodo.

Periodo	Municipio	Código punto	Fecha	Estado de la actividad	Número de actas suscritas
8 de agosto al 7 de septiembre de 2025	Soacha	25754-026	13/08/2025 14/08/2025	Finalizada	51
		25754-011	21/08/2025 22/08/2025	Finalizada	40
	Total				**91**
	Mosquera	25473-002	1/09/2025 2/09/2025 3/09/2025 4/09/2025 5/09/2025	Finalizada	11
		25473-003	1/09/2025 2/09/2025 3/09/2025 4/09/2025 5/09/2025	Finalizada	8
	Total				**19**
	Supía	17777_T30	5/09/2025 6/09/2025 7/09/2025	En proceso	59
	Total				**59**
Total, de actas de vecindad suscritas durante el periodo					**169**

- Indicadores de cumplimiento.


Tabla 43 Indicador de cumplimiento actas de aceptación en el periodo.

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión	N° total de actas de aceptación realizadas en el periodo (169) * 100 / N° total de actas de aceptación programadas en el periodo (169)	100%
Productividad Soacha	N° total de actas de aceptación realizadas (91) *100 / N° total de actas de aceptación inventariadas (91)	100%
Productividad Mosquera	N° total de actas de aceptación realizadas (19) *100 / N° total de actas de aceptación inventariadas (19)	100%

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Productividad Supía	N° total de actas de aceptación realizadas (59) *100 / N° total de actas de aceptación inventariadas (59)	100%
Gestión	N° Total de actas de aceptación realizadas en el Cto (431) *100 / N° Total de actas de aceptación programadas para el Cto 431	100%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 27 Indicador de gestión actas de aceptación en el periodo

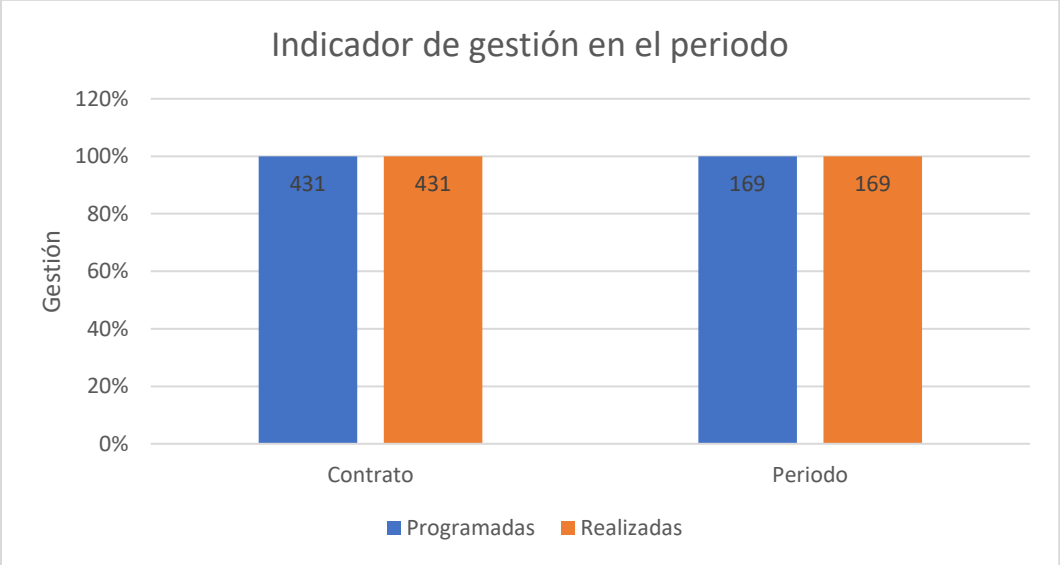

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 28 Indicador de productividad actas de aceptación en Tolima.

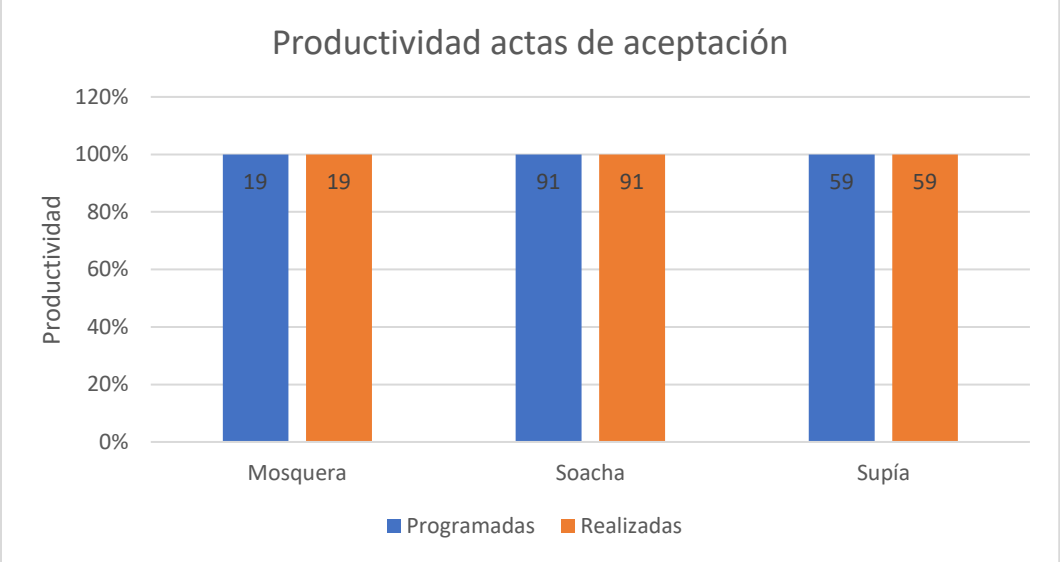

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: Se cumplió con las actividades del componente con un 100% en los indicadores de gestión y productividad para los municipios de Mosquera Soacha y Supía.

Foto 6 Firma de acta de aceptación





Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

11.3. Actas de entorno.

El desarrollo de esta actividad por parte del contratista de obra comprende la realización de actas de entorno las cuales buscan realizar antes del inicio de las implementaciones un recorrido en el cual se realice un diagnóstico del estado del espacio público (pavimento, escalinatas y escaleras, accesos a predios, sumideros, zonas verdes, etc.), por lo cual, desde la Interventoría se realizará acompañamiento constante al desarrollo de esta actividad, así como se verificará los soportes de gestión elaborados por el Contratista.

Así, para este informe el área de gestión social acompañó en el levantamiento de doce (12) actas de entorno en los municipios de Mosquera, Supía y Soacha.

Tabla 44 Actas de entorno

Municipio	Fecha	Elemento caracterizado	Número de actas levantadas.
Supía	5/09/2025 y 6/9/2025	Espacios públicos y mobiliarios	7
Mosquera	20/8/2025 y 27 /8/2025	Espacios públicos y mobiliarios	4
Soacha	04/08/2025 y 8/8/2025	Espacios públicos y mobiliarios	1
Total			**12**

*". **Fuente:** PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicadores de cumplimiento.

Tabla 45 Indicador de cumplimiento elaboración actas de entorno en el periodo.

Indicador	Fórmula.	Cumplimiento
Gestión	N° total de actas de entorno en el periodo (12) *100 / N° total de actas de entorno programadas en el periodo (12)	100%
Productividad Mosquera	N° total de actas de entorno realizadas (7) *100 / N° total de actas de entorno inventariadas (7)	100%
Productividad Supía	N° total de actas de entorno realizadas (4) *100 / N° total de actas de entorno inventariadas (4)	100%
Productividad Soacha	N° total de actas de entorno realizadas (1) *100 / N° total de actas de entorno inventariadas (1)	100%
Gestión	N° Total de actas de entorno realizadas en el Cto (17) *100 / N° Total de actas de entorno programadas para el Cto (17)	100%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 29 Indicador de gestión actas de entorno

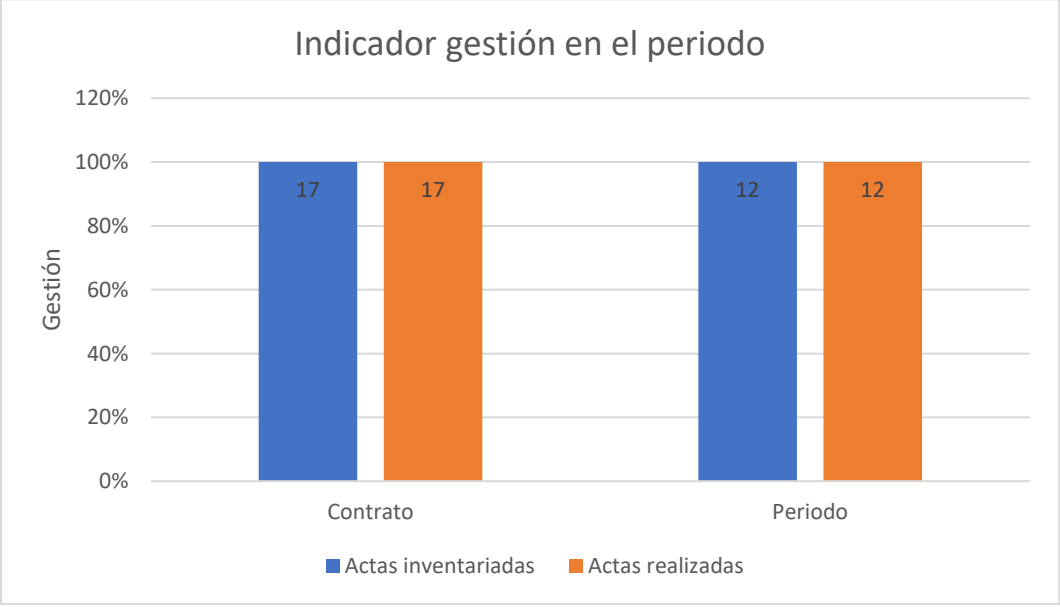

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 30 Productividad actas de entorno.

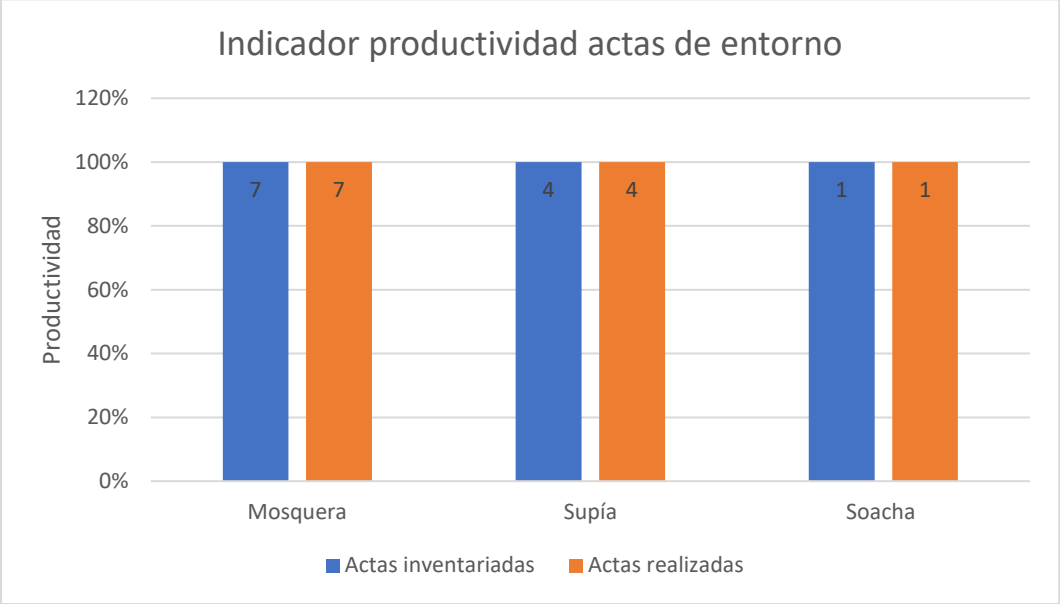

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis Se cumplió con las actividades del componente en los municipios de Mosquera, Supía y Soacha con un indicador de productividad del 100% para los tres municipios, y un indicador de gestión del periodo del 100%.

Foto 7 acta de entorno.





11.4. Actas de vecindad de cierre.

Finalizadas las implementaciones, el profesional del área técnica del contratista, en compañía de un miembro del equipo de gestión social levantarán un acta de vecindad de cierre en los mismos predios en donde se elaboró el acta de inicio, con el fin de verificar el estado final del inmueble y constatar si hubo o no afectaciones durante la ejecución de las obras.

El 25, 27 y 28 de agosto de 2025 el contratista adelantó el proceso de cierre de siete (7) actas de vecindad, porque los propietarios o responsables de los predios manifestaron que, por las intervenciones ejecutadas por el consorcio Señalizadores de Colombia en el contrato PA-0262025, no hubo afectaciones en las fachadas de sus inmuebles. Concluido el proceso de verificación, la actividad se reporta como finalizada para este frente de obra.
El 3 de septiembre 2025, el contratista remitió, mediante comunicación C-CSC-ADM-0612, la documentación correspondiente a las actas de vecindad de cierre elaboradas en los predios localizados en el área de influencia directa del punto crítico priorizado en Honda, Tolima identificado con el código SS_73349_001. En total, se radicaron siete (7) actas de cierre.

Tabla 46 Consolidado actas de cierre en el periodo.

Departamento		**Tolima**		
Municipio / Punto		**Honda / SS_73349_001**		
N° de acta	**Dirección del inmueble**	**Fecha de realización**	**Estado**	**Alcance Fachada/Interna**
01	DG 12 # 18-102	25/8/2025	Entregado a interventoría mediante oficio CE-CSC-ADM-0612	Fachada
02	CL 23 entre KR 14 y 16 Estación de Servicio Terpel	25/8/2025		Fachada
03	KR 12 con CL 17 esquina, Avenida Soto Camero	27/8/2025		Interna
04	CL 17 # 12 A-25	27/8/2025		Fachada
05	DG 14 # 18-55	28/8/2025		Fachada
06	CL 12 entre KR 11 y 12 (Antiguo Hotel Ondama)	28/8/2025		Fachada
07	CL 17 # 12-33	28/8/2025		Fachada


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Tabla 47 indicadores de cumplimiento

Indicador	Fórmula.	Cumplimiento
Gestión	N° total de actas de cierre en el periodo (7) *100 N° total de actas de cierre programadas en el periodo (7)	100%
Productividad Honda	N° total de actas de cierre realizadas (7) *100 N° total de actas de cierre inventariadas (7)	100%
Gestión	N° Total de actas de vecindad de cierre realizadas en el Cto (X)*100 N° Total de actas de vecindada de cierre programadas para el Cto	


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 31 indicador de gestión actas de cierre

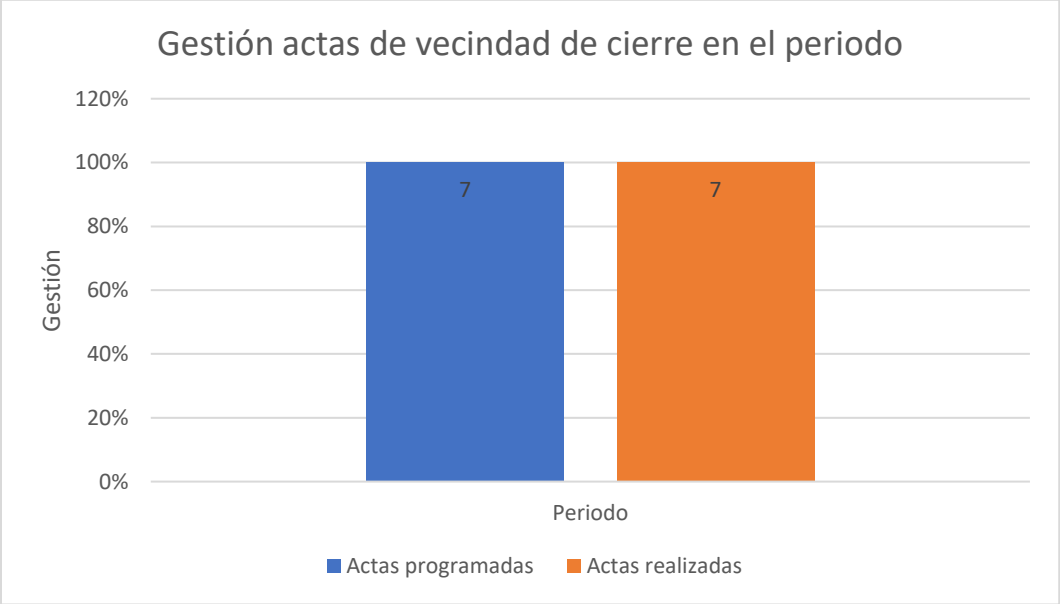

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 32 indicador de productividad actas de cierre.

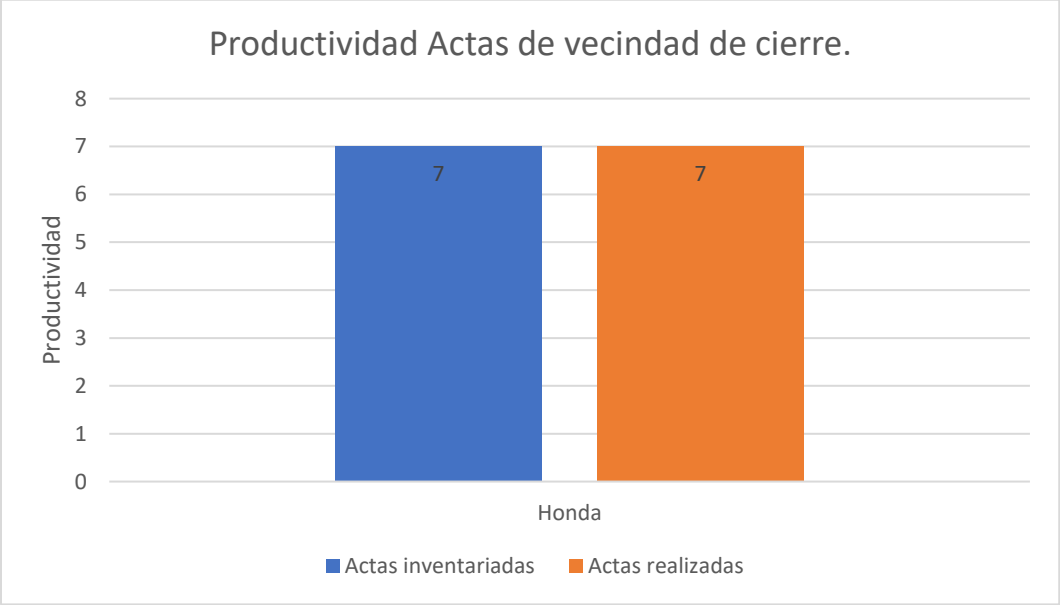

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: En el periodo se elaboraron actas de vecindad de cierre en el municipio de onda presentando un cumplimiento en la productividad y gestión del 100%.

12. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias. (PQRSD).

Durante el periodo se dio apertura a dos (2) PQRSD del municipio de Honda una presentada el 27 de agosto mediante correo electrónico, solicitando información sobre normatividad vigente en medidas de señalización vial y solicitan claridad de estudios previos del contrato, la otra el 29 de agosto presentada por integrantes de la JAL barrio La Sonrisa solicitan retiro de resaltos parabólicos.
A continuación, en la Tabla 485 se evidencia el seguimiento de las PQRSD del período.
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-058-ApertPqrsSecTranHnd-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-059-ApertPqrsJacLaSonrisaHnd-V001

Tabla 48 Seguimiento PQRSD del contrato.

N°	Fecha De recepción	Canal de recepción	Nombre del peticionario	Tipo de requerimiento	Estado (abierta-cerrada)	Fecha de cierre	Observación
1	27/08/2025	Correo electrónico	Siomara Parra Secretaría de tránsito y transporte	Solicitud	Abierta		Solicitud de información sobre el avance de las obras de implementación y su impacto en la movilidad del municipio. En revisión del área técnica del contratista y la interventoría
2	29/8/2025	Escrita	Junta de Acción Comunal barrio La Sonrisa	Petición interés general y particular	Abierta		Inconformidad con la construcción de un reductor de velocidad parabólico, argumentando afectaciones a la movilidad y posibles riesgos asociados. Actualmente el contratista adelanta el proceso de atención para la evaluación de la solicitud y la definición de las medidas pertinentes.

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*


- Indicador de cumplimiento.

Tabla 49 Indicador de cumplimiento (PQRSD).

Indicador	Fórmula	Cumplimiento
Gestión	N° de PQRSD registradas en el cto 4 *100) / N° de PQRSD recibidas canales oficiales (4)	100%
Gestión	N° de PQRSD cerradas en el periodo (0) * 100 / N° de PQRSD abiertas en el período (2)	0%
Gestión	N° de PQRSD cerradas en el periodo de periodos anteriores (0) *100 / N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento de periodos anteriores (0)	0%
Productividad	N° total de PQRSD cerradas en el contrato (2) *100 / N° total de PQRSD recibidas en el contrato (4)	50%


Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 33 Indicador de gestión PQRDS (canales oficiales).

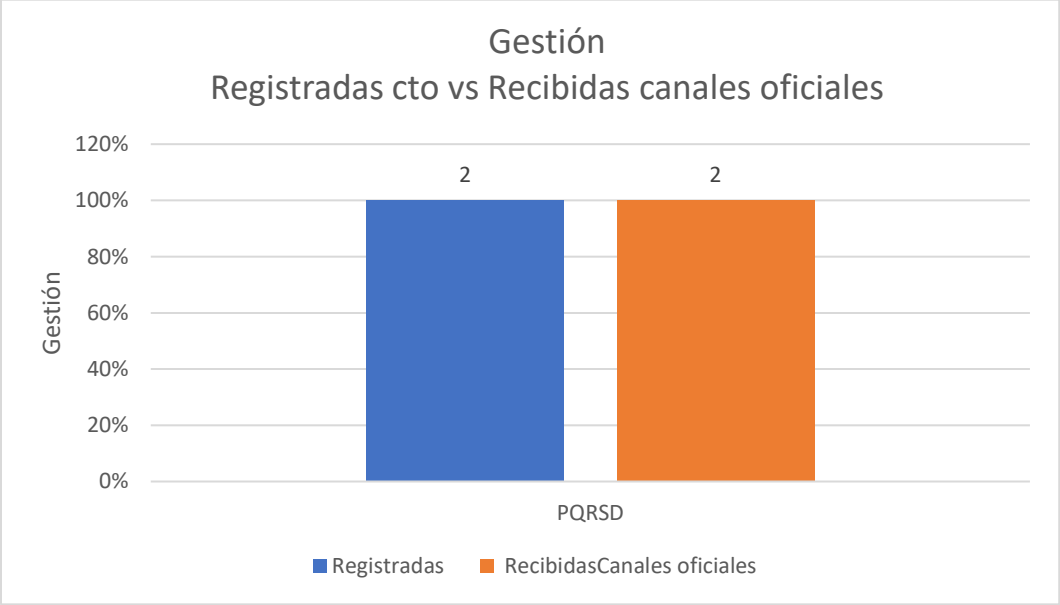

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Ilustración 34 Indicador de productividad PQRDS totales del contrato.

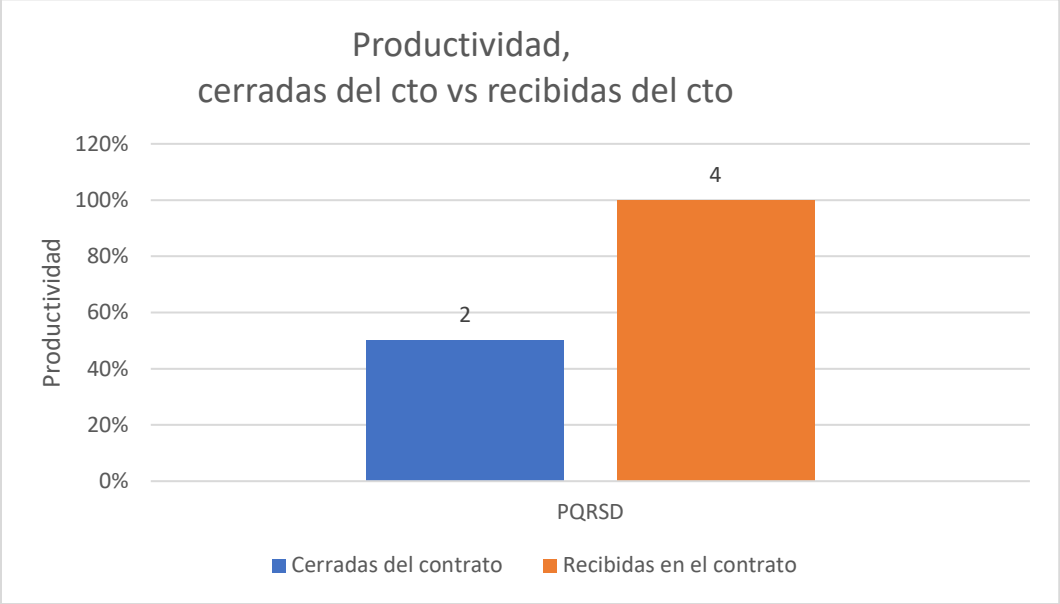

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Análisis: Para el periodo informado el contratista registro dos (2) PQRSD por los canales oficiales dispuestos para el contrato que están abiertas reflejando un porcentaje de gestión del 100% de cumplimiento. Para el indicador de productividad se tienen dos (2) PQRSD cerradas de las cuatro abiertas en el contrato para un cumplimiento del 50%.

13. Monitoreo, evaluación y seguimiento.

13.1. Entrega Plan de Gestión Social contratista de obra.

Dentro de las actividades a desarrollar por parte del contratista y de esta manera dar cumplimiento al numeral **Monitoreo, evaluación y seguimiento**, el contratista de obra tres (3) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, asistió una reunión la cual tuvo como objetivo informar al contratista de obra la fecha de entrega del Plan de Gestión Social y Comunicación Estratégica-cronograma. Por lo cual, dicha reunión se llevó a cabo 9 de mayo 2025, y tuvo como resultado la entrega por parte del contratista del Plan de Gestión Social y Comunicación Estratégica – Cronograma, de esta manera, dicho plan en V2 tuvo aprobación por parte del componente social de la interventoría en el segundo período comprendido del 8 de mayo2025 al 7 junio de 2025.

13.2. Cronograma de actividades.

Durante el periodo del presente informe no se realizó esta actividad.

13.3. Informe y /o reporte semanal.

Tanto Contratista como Interventoría elaboraron reportes semanales de actividades. En estos se visualizan las acciones adelantadas para dar cumplimiento al Plan de Gestión Social presentado ante la ANSV y conforme a lo requerido desde el Apéndice E de Gestión Social y Comunicaciones.
De esta manera, la Interventoría realizó la revisión y emitió concepto ante los reportes enviados por el contratista de manera semanal. De igual manera se remitió a la ANSV a través de correo electrónico las acciones realizadas como Interventoría. A continuación, en la Tabla 5047 se relaciona cada informe semanal con el detalle de los reportes enviados.

Tabla 50 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales

N°	Semana reportada	Fecha de entrega	Nomenclatura para localización	Programación de actividades
18	04 al 10 de agosto 2025.	12/08/2025	001OPV-INT-Z04-ISM-GEA-018-InformeSemanalN 18-V001	Realizar acompañamiento para la elaboración de actas de aceptación en el municipio de Mosquera
19	11 al 17 de agosto 2025	19/08/2025	001OPV-INT-Z04-ISM-GEA-019-InformeSemanalN19-V001	Realizar acompañamiento actas de vecindad, entorno y aceptación en el municipio de Mosquera.
20	18 al 24 de agosto 2025	26/08/2025	001OPV-INT-Z04-ISM-GEA-020-InformeSemanalN20-V001	Realizar seguimiento a la socialización del municipio de Mosquera.
21	25 al 31 de agosto 2025	02/08/2025	001OPV-INT-Z04-ISM-GEA-021-InformeSemanalN21-V001	Realizar seguimiento a la socialización del municipio de Mosquera.

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Nota: En el siguiente enlace se encuentra la documentación aquí registrada:
https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO4/DGP/ISM?csf=1&web=1&e=uRQzmP
Ver Anexo3Infosema.

13.4. Comités integrales.

En este informe se realizaron los comités integrales de seguimiento semanal, en los que participaron ANSV, la Interventoría y el Contratista. Así, los comités integrales de seguimiento semanal se programaron para todos los miércoles y durante la duración del contrato de obra.
A continuación, en la Tabla 5148 se evidencia la relación de dichos comités.

Tabla 51 Seguimiento comités Integrales.

N°	Fecha	Modalidad	Nomenclatura para localización	Entidades participantes	Temas tratados
18	13 agosto 2025	Virtual	001OPV-INT-ZO4-ARE-GEA-068-comitéSemanalN18	ANSV, Interventoría y Contratista.	Seguimiento a los compromisos, programación detallada de obra, actividades componente técnico, actividades componente social, actividades componente ambiental y SST y varios.
19	20 agosto 2025	Virtual	001OPV-INT-ZO4-ARE-GEA-077-comitéSemanalN19	ANSV, Interventoría y Contratista.	Revisión avances del componente social, compromisos pendientes y ajustes requeridos, temas legales
20	27 agosto 2025	Virtual	001OPV-INT-ZO4-ARE-GEA-020-comitéSemanalN20	ANSV, Interventoría y Contratista.	Revisión avances del componente social, compromisos pendientes y ajustes requeridos, temas legales
21	03 septiembre	Virtual	001OPV-INT-ZO4-ARE-GEA-021-comitéSemanalN21	ANSV, Interventoría y Contratista.	Revisión avances del componente social, compromisos pendientes y ajustes requeridos

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Nota: En el siguiente enlace se encuentra la documentación aquí registrada:
https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO4/DGL/ARE?csf=1&web=1&e=YvyP2m
Ver Anexo4ComiInte.

13.4.1. Mesas de trabajo.

Para puntualizar y dar claridad sobre temas específicos del contrato de obra y de interventoría, se generarán espacios de trabajo aparte de los comités semanales. Pero en este informe no hubo mesas de trabajo.

13.4.2. Capacitaciones.

Durante este informe no se realizaron capacitaciones.

13.4.3. Comités sociales con el contratista de obra.

Para desarrollar los componentes de la gestión social y comunicaciones, se desarrollaron comités semanales para tratar solo los temas del componente social entre el Contratista y la Interventoría.

Dichos comités se realizaron de manera virtual, cada ocho días los lunes, dado que el lunes se festivo se realiza el martes.

A continuación, en la Tabla 5249 se relacionan dichos comités.

Tabla 52 Consolidado comités sociales contratista de obra

N° de comité	Fecha de realización	Modalidad	Nomenclatura para localización	Asistentes	Tema
9	19 de agosto 2025	Virtual	001OPV-INT-Z04-ARE-GEA-ComitesSociales	Contratista Interventoría	Revisión avances del componente social, compromisos pendientes y ajustes requeridos.
10	01 de septiembre 2025	Virtual	001OPV-INT-Z04-ARE-GEA-ComitesSociales	Contratista Interventoría	Revisión avances del componente social, compromisos pendientes y ajustes requeridos.

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Nota: En el siguiente enlace se encuentra la documentación aquí registrada:
https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO4/DGL/ARE?csf=1&web=1&e=YvyP2m
Ver Anexo5Comicon

13.5. Comités sociales con ANSV.

Durante este informe no se realizaron.

13.6. Informe mensual.

Para este periodo, el contratista entregó el informe mensual de gestión social 5 (periodo 8/8/2025 al 7/9/2025 al que el contratista subsana las observaciones de la interventoría en comunicado PIV-063-Z4-634 del 19/7/2025 ver Anexo1Infocon. Cuando se apruebe el informe 5 de interventoría, se referirá a la respectiva carta de aprobación.

13.7. Informe final.

Tras culminar las acciones constructivas, desde el área de Gestión Social se elaborará un informe final que incluirá la trazabilidad de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato, según los parámetros entregados por la ANSV.

14. Estado de productos.

A continuación, se relaciona en la tabla 530 el estado de los productos del PGSCA entregados por el contratista de obra en fase 1 para el periodo del presente informe.

Tabla 53 Estado de productos fase 1-contratista de obra.

Producto	Entrega realizada	Fecha	Documento No.	Estado
Informe mensual 5	Versión 1	16/09/2025	CE-CSC-ADM-0705	En revisión

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

15. Trazabilidad de la correspondencia.

A continuación, en las tablas 541 y 552 se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

Tabla 54 Relación correspondencia enviada.

No	Consecutivo	Enviada	Nomenclatura De localización	Asunto	Remitente	Destinatario
1	PIV-063-Z4-459	14/8/2025	001OPV-INT-Z04-COE-GEA-467-ObsDirectorioActores	Respuesta a comunicados remisión directorio de actores	PIV INGENIERÍA SAS	Consorcio Señalizadores de Colombia
2	PIV-063-Z4-460	14/8/2025	001OPV-INT-Z04-COE-GEA-468-RtaCSC0467MONCTolima	Respuesta comunicado CE-CSC-ADM-0467remision registro de mano de obra no calificada regional periodo junio a julio 2025.	PIV INGENIERÍA SAS	Consorcio señalizadores de Colombia
3	PIV-063-Z4-477	21/8/2025	001OPV-INT-Z04-COE-GEA-485-RtaCSCO498ObsIMSocialN4V-	Respuesta a su comunicado CE-CSC_ADM-0498 del 15 de agosto de 2025 Observaciones al informe mensual social 4 v1	PIVINGENIERIA SAS	Consorcio señalizadores de Colombia.

No	Consecutivo	Enviada	Nomenclatura De localización	Asunto	Remitente	Destinatario
4	PIV-063-Z4-478	20/8/2025	001OPV-INT-Z04-COE-GEA-486-Rta-atenciónPQRGirardot	Respuesta a PQRSD con relación a la modificación del sentido bidireccional en la carrera 7ª entre calles 34 y 34 A vía contigua a la cede Manuela Beltrán de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo	PIVINGENIERIA SAS	Consorcio señalizadores de Colombia.
5	PIV-063-Z4-495	22/8/2025	001OPV-INT-Z04-COE-GEA-503-SolEntregablesComponensocial	Solicitud productos entregables de actividades ejecutadas desde el área social de cada uno de los componentes establecidos en el apéndice E. Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas del municipio de Honda Tolima punto SS_73349-001	PIVINGENIERIA SAS	Consorcio señalizadores de Colombia.

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Nota: En el siguiente enlace se encuentra la documentación aquí registrada:
https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO4/DGL/COE?csf=1&web=1&e=kffxlK
Ver Anexo6Corres

Tabla 55 Relación correspondencia recibida.

No	Consecutivo	Recibida	Nomenclatura De localización	Asunto	Remitente	Destinatario
1	CE-CSC-ADM-0423	1/8/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-423-AvisoInicioSociaPmtCaparrapiYacopi	Aviso de inicio de actividades de socialización del plan de manejo de tránsito en los municipios de Caparrapí y Yacopí	Consorcio señalizadores de Colombia	PIV Ingeniería
2	CE-CSC-ADM-0451	08/08/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-451-TrasladoEntidadPetiGirardot	Traslado a la entidad contratante de peticiones de la comunidad – reunión de inicio de obra municipio de Girardot	Consorcio Señalizadores de Colombia	PIV Ingeniería
3	CE-CSC-ADM-0467	11/08/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-467-CertificadoManoObra	Remisión registro mano de obra no calificada regional periodo junio a julio de 2025.	Consorcio Señalizadores de Colombia	Agencia pública de empleo
4	CE-CSC-ADM-0490	13/08/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-490-AvisoInicioSociaPmtSupía	Aviso de inicio de actividades de socialización del plan de manejo de tránsito en el municipio de Supía	Consorcio Señalizadores de Colombia	PIV Ingeniería
5	CE-CSC-ADM-0491	13/08/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-491-AvisoInvPredialMosquera	Aviso de inicio de actividades de inventario predial municipio de Mosquera	Consorcio Señalizadores de Colombia	PIV Ingeniería
6	CE-CSC-ADM-0498	15/08/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-498-AlcanceCsc497InformeSocialMen4	Alcance comunicado CE-CSC-ADM-0497 radicación informe mensual No4 v1 componente social.	Consorcio Señalizadores de Colombia	PIV Ingeniería
7	CE-CSC-ADM-0548	22/08/2025	001OPV-CTA-Z04-COE-GEA-0548-RtaPiv459RmDirecActores	Remisión directorio de actores sociales municipios Espinal, Honda, Girardot, Caparrapí, Yacopí, Soacha, Mosquera, Supía, Manizales, Circasia y Armenia. Responde comunicado PIV-063-Z4-459, Honda, Girardot, Caparrapí, Yacopí, Soacha, Mosquera, Supía, Manizales, Circasia y Armenia. Responde comunicado PIV-063-Z4-459	Consorcio Señalizadores de Colombia	PIV Ingeniería

Fuente: *PIV Ingeniería S.A.S.*

Nota: En el siguiente enlace se encuentra la documentación aquí registrada: https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO4/DGL/COE?csf=1&web=1&e=juXTLl
Ver Anexo6Corres

16. Conclusiones.

- El contratista cumplió con la totalidad de actividades programadas en el periodo, alcanzando indicadores de productividad y gestión del 100% en componentes clave como reuniones de inicio y cierre, desarrollo de directorios de actores, actas de vecindad, entorno y aceptación.

- Se superaron los requerimientos en la entrega de volantes y afiches, con indicadores de cumplimiento superiores al 100% en la mayoría de los puntos. La estrategia de comunicación fue efectiva en informar a la comunidad sobre el desarrollo del proyecto.

- El monitoreo de medios evidenció una cobertura positiva en municipios como Honda y El Espinal, fortaleciendo la legitimidad del proyecto. No se registraron publicaciones en Girardot.

- Se vinculó un 53% de trabajadores de las áreas de influencia directa, superando el mínimo requerido del 10%, lo que refleja una gestión social incluyente y territorialmente pertinente.

- Se realizaron talleres con niños y adultos en Honda, logrando una participación del 100% y cumpliendo con los objetivos pedagógicos de seguridad vial.

- Se recibieron y gestionaron solicitudes ciudadanas, incluyendo una petición formal sobre infraestructura vial en Honda, lo que demuestra apertura al diálogo y capacidad de respuesta.

- La interventoría realizó acompañamiento constante en campo y en comités virtuales, garantizando trazabilidad, calidad y oportunidad en la ejecución del componente social.

- Se emitieron recomendaciones al contratista para fortalecer la planeación, comunicación y entrega de productos, que se atendieron oportunamente.

- El área de gestión social avanzó en la ejecución de las actividades previstas dentro del periodo del 08 de agosto de 2025 al 7 septiembre de 2025, conforme al apéndice E del contrato y el plan de gestión social y comunicación estratégica aprobado por la ANSV. Las acciones desarrolladas permitieron dar continuidad al cumplimiento progresivo de las obligaciones sociales del proyecto.

- La Interventoría realizó el seguimiento al componente de acompañamiento social a visitas técnicas como actas de vecindad, actas de aceptación y actas de entorno. En el municipio de Soacha y Mosquera

- En cuanto al componente de información y divulgación, la interventoría realizó el seguimiento y aprobación de las piezas de divulgación: volantes, vallas, afiches para los municipios de Soacha, Mosquera y Honda en el departamento de Cundinamarca con previa aceptación por parte de ANSV.

- La interventoría realizó el seguimiento a la socialización del Plan de Manejo de Tránsito PMT en el municipio de Supia.

- En el municipio de Supia se realizó las actividades de gestión social como actas de vecindad, actas de aceptación, actas de entorno y reunión de socialización de inicio de obra.

- Se realizan comités de seguimiento social entre contratista e interventoría cada 15 días

- Se da por finalizado actividades en el municipio de Honda en cuanto actas de vecindad de cierre. Reunión de socialización, talleres en buenas prácticas de seguridad vial dirigido adultos y menores de cuarto grado de la Institución educativa Juan Manuel Rudas.

- En este mes se ejecutó el componente de monitoreo y seguimiento, que realizaba informes semanales, participación a los comités de seguimiento social quincenal entre contratista e interventoría, comités semanales integrales considerando las sugerencias realizadas en estos espacios por el contratista y la ANSV.

17. Recomendaciones.

- Se le recomienda al contratista de obra en el desarrollo del componente social Conocer y aplicar correctamente la metodología del apéndice E, especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas y aplicarlo en todos los componentes del proyecto.

- Se recomienda al contratista de obra informar con suficiente anterioridad las actividades a ejecutar en cada uno de los componentes del programa de gestión social y comunicaciones con el fin de programar eficientemente el acompañamiento por parte de la interventoría.

- Se recomienda al contratista de obra entregar las piezas de divulgación como vallas, volante y afiches en los tiempos establecidos por el apéndice E para verificar las áreas técnica y social de la interventoría.

- Se recomienda al contratista de obra utilizar un lenguaje más coloquial en las reuniones y demás socializaciones que se tengan con la comunidad para un mejor entendimiento de las actividades a realizar en el contrato.

- Se recomienda la entrega oportuna por parte del contratista de obra de los entregables que corresponden a cada componente: actas de vecindad, actas de entorno, actas de aceptación actas de reunión y todas aquellas consignadas en el apéndice E con el fin de no generar atrasos a los inicios de obra.

- Desarrollar talleres en más municipios, especialmente en aquellos con alta población beneficiaria, para cumplir con el total de talleres requeridos en el contrato (11 para niños y 11 para adultos).

- Fortalecer el seguimiento y cierre de las peticiones, quejas y reclamos recibidas, asegurando respuesta oportuna y registro completo en los formatos establecidos

- Se recomienda que cuando la Entidad realice un requerimiento lo atienda en el menor tiempo posible para no atrasar procesos.

- Se recomienda al contratista realizar el proceso de socialización en cada uno de los puntos de los municipios de Mosquera y Soacha (Cundinamarca) antes de iniciar obra.

- Se recomienda al contratista incluir en el cronograma de actividades la realización de las entrevistas semiestructuradas ex ante de la evaluación de impacto.

18. Anexos.

Anexo1Infocon Informe mensual No 5 del contratista-carta aprobación.
Anexos del informe 5 del contratista de obra
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-046-DirectorioActoresInfMen5-V001
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-003-InicioSoacha25754016-V001
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-004-ActainicioObraSOC25754026-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-047-CumplimientoComSocSoach026-V001
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-008-ActaInicioObraMsq022y003-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-048-CumplimientoComSocMsq002y003-V001
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-005-FinalizacionHonda-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-016-RegDivVolantePmtSupia-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-017-EntregaVolantePmtSupia-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-023-RegDivVolanteInicioSoc026-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-022-EntregaVolanteInicioSoc026-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-024-EntregaVolanteFinalHonda-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-023-RegDivVolanteFinalHonda-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-025-RegDivVolanteInicioMsq002y003-V001
001OPV-CTA-ZO4-DGL-GSO-026-EntregaVolIniMsq002y003-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-049-SoporteAficheSoc016-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-050-SoporteAficheSoc026-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-051-SoporteAficheMsq002-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-052-SoporteAficheMsq003-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-053-MonitoreoComuniHonda-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-054-MonitoreoComuniEspinal-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-055-MonitoreoComuniGirardot-V001
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-007-TallerSensMenoresHND-V001
001OPV-CTA-ZO4-ARE-GSO-006-TallerSensAdultosHND-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-056-RegManObrInfMen5-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-057-AtencPqr2JacSanJorgeGir-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-058-ApertPqrsSecTranHnd-V001
001OPV-CTA-ZO4-ANX-GSO-059-ApertPqrsJacLaSonrisaHnd-V001
Anexo2Correos Aprobación (PPT), volantes afiches, vallas, (PPT) talleres.
Anexo3Infosema Informes semanales.
Anexo4ComiInte ComitesSemanales integrales
Anexo5Comicon ComitesSociales Contratista.
Anexo6Corres CorresEnviaday recibida
