
CONTRATO FDLAN 1202 DE 2024 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USME

Id	ITEM	COD	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**V4**		**CONTRATO 1202 - 2024**		**45153.38**	**$ 3,108,643,000**	**252 días**	**lun 27/01/25**	**sáb 15/11/25**	
2	**0**		**ACTIVIDADES PREVIAS O ALISTAMIENTO**		**9**	**$ 0**	**56 días**	**lun 27/01/25**	**jue 27/03/25**	
3			Consultas a terceras entidades	GL	1	$ 0	10 días	lun 27/01/25	mié 5/02/25	
4			Presentación V0 Plan de gestión calidad	UN	1	$ 0	15 días	lun 27/01/25	lun 10/02/25	3CC
5			Presentación V0 Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Traba	UN	1	$ 0	15 días	lun 27/01/25	lun 10/02/25	3CC
6			Presentación V0 Plan de Gestión Social	UN	1	$ 0	15 días	lun 27/01/25	lun 10/02/25	3CC
7			Presentación V0 Manejo Ambiental de Obra	UN	1	$ 0	15 días	lun 27/01/25	lun 10/02/25	3CC
8			Realización recorrido general parques entre las partes interesada	GL	1	$ 0	3 días	lun 3/02/25	mié 5/02/25	3CC+7 días
9			Priorización intervenciones a realizar	GL	1	$ 0	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	8FC+21 días
10			Presentación V0 presupuesto general y posibles precios no previstos	GL	1	$ 0	15 días	jue 27/02/25	lun 17/03/25	9
11			Aprobación etapa general Actividades previas con todos los documentos correlacionados	UN	1	$ 0	56 días	lun 27/01/25	jue 27/03/25	3CC
12	**I**		**05-476 NUEVO MILENIO**		**27356.41**	**$ 1,238,089,784**	**148 días**	**jue 27/02/25**	**lun 25/08/25**	
13			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**25 días**	**jue 27/02/25**	**vie 28/03/25**	
14			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	15 días	jue 27/02/25	lun 17/03/25	9
15			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	14
16			Gestion PMT	UN	1	$ 0	18 días	vie 7/03/25	vie 28/03/25	14CC+7 días
17	**1**		**PRELIMINARES**		**3388.25**	**$ 43,886,418**	**22 días**	**mar 20/05/25**	**vie 13/06/25**	
18	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2495.5	$ 26,472,264	14 días	jue 22/05/25	lun 9/06/25	24CC+3 días
19	1.4	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	427.75	$ 639,914	15 días	mar 27/05/25	vie 13/06/25	24CC+7 días
20	1.5	10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70	UN	5	$ 571,200	2 días	vie 6/06/25	lun 9/06/25	24
21	1.6	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc)	ML	460	$ 16,203,040	20 días	mar 20/05/25	jue 12/06/25	24CC
22			**DEMOLICIONES**		**43.78**	**$ 11,134,504**	**55 días**	**lun 31/03/25**	**vie 6/06/25**	
23			Caracterización suelos canchas	GL	1	$ 0	8 días	lun 31/03/25	mié 9/04/25	16FC+2 días
24	1.16	15963	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	M3	42.78	$ 11,134,504	15 días	mar 20/05/25	vie 6/06/25	23FC+32 días
25			**DESMONTES Y RETIROS**		**175**	**$ 9,112,408**	**38 días**	**jue 22/05/25**	**mar 8/07/25**	
26	1.18	10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	3	$ 309,672	21 días	jue 22/05/25	mar 17/06/25	18CC
27	1.20	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML	85.8	$ 2,147,059	21 días	sáb 24/05/25	mié 18/06/25	26CC+2 días
28	1.22	10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r	ML	28	$ 1,751,680	21 días	sáb 24/05/25	mié 18/06/25	27CC
29	1.23	10860	Desmonte y retiro de canecas	UN	2	$ 108,800	21 días	sáb 24/05/25	mié 18/06/25	26CC+2 días
30	1.24	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UNI	18	$ 2,580,192	21 días	sáb 24/05/25	mié 18/06/25	27CC
31	1.25	11271	Desmonte CerramMalla eslabón. h=0,5 a 2 m + retiro	ML	19.2	$ 428,237	21 días	jue 12/06/25	mar 8/07/25	27CC+15 días
32	1.29	15807	Desmonte equipos biosaludables (demolc+retiro)	UN	6	$ 1,068,960	21 días	sáb 24/05/25	mié 18/06/25	30CC
33	1.31	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	13	$ 717,808	21 días	sáb 24/05/25	mié 18/06/25	30CC
34	**2**		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		**727.18**	**$ 105,376,383**	**32 días**	**mar 27/05/25**	**sáb 5/07/25**	
35			**EXCAVACIONES CON RETIRO**		**513.3**	**$ 61,431,744**	**15 días**	**mar 27/05/25**	**vie 13/06/25**	
36	2.1	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(< 50m	M3	513.3	$ 61,431,744	15 días	mar 27/05/25	vie 13/06/25	24CC+7 días
37			**RELLENOS**		**213.88**	**$ 43,944,639**	**17 días**	**vie 13/06/25**	**sáb 5/07/25**	
38	2.7	10909	Relleno rajón (mecánico)	M3	128.33	$ 32,740,327	15 días	vie 13/06/25	jue 3/07/25	36
39	2.9	10080	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego	M3	85.55	$ 11,204,312	10 días	mar 24/06/25	sáb 5/07/25	38CC+7 días
40	**5**		**PISOS Y ENCHAPES**		**427.99**	**$ 417,741,326**	**7 días**	**mar 24/06/25**	**jue 3/07/25**	
41	5.5	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	181.99	$ 135,138,494	7 días	mar 24/06/25	jue 3/07/25	68CC+23 días
42	5.10	16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	246	$ 282,602,832	7 días	mar 24/06/25	jue 3/07/25	41CC
43	**6**		**PINTURAS**		**101**	**$ 4,011,320**	**7 días**	**mar 24/06/25**	**mié 2/07/25**	
44			**PINTURAS EXTERIORES**		**101**	**$ 4,011,320**	**7 días**	**mar 24/06/25**	**mié 2/07/25**	
45	6.10	12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	100	$ 3,196,000	7 días	mar 24/06/25	mié 2/07/25	39CC
46	6.14	13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	1	$ 815,320	7 días	mar 24/06/25	mié 2/07/25	45CC
47	**7**		**EXTERIORES**		**41.7**	**$ 1,950,893**	**7 días**	**vie 15/08/25**	**lun 25/08/25**	
48			**EMPRADIZACIÓN ARBORIZACIÓN Y OTROS**		**41.7**	**$ 1,950,893**	**7 días**	**vie 15/08/25**	**lun 25/08/25**	
49	7.2	11151	EmpradizacionCanchas y zonas especiales	M2	41.7	$ 1,950,893	7 días	vie 15/08/25	lun 25/08/25	66
50	**8**		**MOBILIARIO**		**97.5**	**$ 181,269,164**	**42 días**	**vie 6/06/25**	**vie 25/07/25**	
51			**MOBILIARIO URBANO**		**87.5**	**$ 174,699,684**	**42 días**	**vie 6/06/25**	**vie 25/07/25**	
52	8.3	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5	ML	29	$ 60,260,376	7 días	mié 18/06/25	vie 27/06/25	28
53	8.4	10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5	ML	29.5	$ 38,382,804	7 días	mié 18/06/25	vie 27/06/25	28
54	8.11	13013	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Columpio-STPM	UN	1	$ 153,136	5 días	sáb 28/06/25	sáb 5/07/25	26FC+10 días
55	8.12	13012	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM	UN	1	$ 96,424	5 días	sáb 28/06/25	sáb 5/07/25	26FC+10 días
56	8.20	14651	Canecas acero inoxidable (SUM+ INST)	UN	2	$ 1,626,288	7 días	mié 2/07/25	jue 10/07/25	30FC+10 días
57	8.23	14656	Banca M-31 (SUM + INST)	UN	18	$ 10,239,984	7 días	mié 2/07/25	jue 10/07/25	46
58	8.26	14670	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	1	$ 6,843,792	4 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	67
59	8.27	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1	$ 2,706,264	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	32FC+10 días
60	8.36	16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UN	2	$ 12,997,248	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	81CC
61	8.38	16066	Modulo Banca Abd. Cronch Gimn .aire libre(Sumi+Instal)	UN	1	$ 4,145,688	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	81CC
62	8.54	010587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (S	UN	2	$ 37,247,680	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	59CC
63			**SEÑALIZACIÓN**		**10**	**$ 6,569,480**	**7 días**	**mié 2/07/25**	**jue 10/07/25**	
64	8.57	14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	5	$ 2,954,600	7 días	mié 2/07/25	jue 10/07/25	59CC
65	8.58	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	5	$ 3,614,880	7 días	mié 2/07/25	jue 10/07/25	59CC
66	**9**		**IMPREVISTOS**		**22351.01**	**$ 463,607,368**	**71 días**	**jue 22/05/25**	**vie 15/08/25**	
67	NP-03	N/A	CONCRETO 3000 PSI PARA ACTIVIDADES DE PARQUES	M3	88.5	$ 81,268,276	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25	83
68	NP-05	N/A	Retiro manual de caucho o césped sintético incluye Cargue, r	M2	427.99	$ 30,468,266	14 días	mar 27/05/25	jue 12/06/25	36CC
69	NP-06	IDRD 30-1	Baranda Patinodromo+Viga Conc.(Tub. Galvanizada)	ML	83	$ 52,551,284	4 días	mié 18/06/25	mar 24/06/25	27
70	NP-07	IDRD 30-1	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m (Ítem 15	UN	1	$ 8,345,893	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	59CC
71	NP-09	IDU 4869	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLU	UN	1	$ 72,941	7 días	vie 13/06/25	sáb 21/06/25	36CC+15 días
72	NP-10	IDU 4598	SELLO DE GRIETAS	ML	6.6	$ 103,296	2 días	mar 24/06/25	jue 26/06/25	69
73	NP-11	IDU 8471	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm (INC	KG	2954	$ 28,061,818	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25	67CC
74	NP-12	IDU 6402 '	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1	ML	649.87	$ 29,782,921	7 días	mar 15/07/25	mar 22/07/25	67CC+1 día
75	NP-13	IDU 4032	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION M	M2	941.05	$ 12,629,343	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	39
76	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	15000	$ 10,220,400	20 días	jue 22/05/25	lun 16/06/25	26CC
77	NP-15	IDU 6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye s	M3	88.5	$ 6,731,735	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25	67CC
78	NP-16	IDU 3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APL	M2	885	$ 3,073,994	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25	67CC
79	NP-17	IDRD 146	MÓDULO FALTANTE MALLA PARA BARANDAS M-83	UN	24	$ 6,859,329	7 días	mar 24/06/25	mié 2/07/25	45CC
80	NP-18	IDRD 138	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISE	UN	1	$ 7,590,818	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	59CC
81	NP-19	IDRD 165	MÓDULO BICICLETA ESTÁTICA DE ALTO RENDIMIENTO	UN	1	$ 6,487,834	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	59CC-21 días
82	NP-21	IDRD 106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE ENTREN	UN	1	$ 26,077,944	5 días	mar 24/06/25	mar 1/07/25	81CC+15 días
83	NP-23	IDU 4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B CON MATERIAL RECICLA	M3	342	$ 75,319,972	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25	75
84	NP-25		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE PARA CA	M2	855.5	$ 77,961,304	14 días	mar 29/07/25	vie 15/08/25	67FC+7 días
85	**II**		**05-026 DESARROLLO USMINIA**		**8880.7**	**$ 568,616,734**	**189 días**	**lun 31/03/25**	**mar 11/11/25**	
86			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**36 días**	**lun 31/03/25**	**mié 14/05/25**	
87			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	7 días	lun 31/03/25	mar 8/04/25	14FC+12 días
88			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	sáb 3/05/25	lun 5/05/25	87FC+19 días
89			Gestion PMT	UN	1	$ 0	10 días	sáb 3/05/25	mié 14/05/25	88CC
90	**1**		**PRELIMINARES**		**2032.2**	**$ 25,334,229**	**30 días**	**lun 14/07/25**	**mar 19/08/25**	
91	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	842.3	$ 8,935,118	14 días	lun 14/07/25	mar 29/07/25	83
92	1.3	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	150	$ 2,917,200	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25	96CC
93	1.4	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	686.3	$ 1,026,705	2 días	vie 8/08/25	lun 11/08/25	105
94	1.6	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	353.6	$ 12,455,206	30 días	lun 14/07/25	mar 19/08/25	96CC
95			**DEMOLICIONES**		**686.3**	**$ 18,854,034**	**7 días**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/25**	
96	1.17	10806	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	686.3	$ 18,854,034	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25	91CC
97			**DESMONTES Y RETIROS**		**96**	**$ 9,642,128**	**50 días**	**lun 14/07/25**	**mié 10/09/25**	
98	1.22	10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r	ML	51	$ 3,190,560	5 días	jue 4/09/25	mié 10/09/25	96CC+45 días
99	1.24	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UNI	3	$ 430,032	15 días	mar 22/07/25	vie 8/08/25	96CC+7 días
100	1.31	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1	$ 55,216	5 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25	96CC
101	1.32	12414	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	1	$ 646,000	5 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25	100CC
102	1.35	10536	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	ML	40	$ 5,320,320	5 días	mar 22/07/25	sáb 26/07/25	96
103	**2**		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		**137.26**	**$ 16,427,277**	**15 días**	**mar 22/07/25**	**vie 8/08/25**	
104			**EXCAVACIONES CON RETIRO**		**137.26**	**$ 16,427,277**	**15 días**	**mar 22/07/25**	**vie 8/08/25**	
105	2.1	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(< 50m	M3	137.26	$ 16,427,277	15 días	mar 22/07/25	vie 8/08/25	96
106	**3**		**ESTRUCTURA**		**0.32**	**$ 381,110**	**4 días**	**jue 4/09/25**	**mar 9/09/25**	
107			**CIMENTACIÓN**		**0.32**	**$ 381,110**	**4 días**	**jue 4/09/25**	**mar 9/09/25**	
108	3.2	10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	0.32	$ 381,110	4 días	jue 4/09/25	mar 9/09/25	118CC
109	**5**		**PISOS Y ENCHAPES**		**30**	**$ 7,013,520**	**7 días**	**jue 4/09/25**	**vie 12/09/25**	
110			**PISOS**		**30**	**$ 7,013,520**	**7 días**	**jue 4/09/25**	**vie 12/09/25**	
111	5.11	10445	Anden en concreto reforz e=.10 3000psi sin estr	M2	30	$ 7,013,520	7 días	jue 4/09/25	vie 12/09/25	122CC+7 días
112	**7**		**SENDEROS Y ADENES EN ADOQUIN**		**60**	**$ 2,807,040**	**7 días**	**vie 12/09/25**	**vie 19/09/25**	
113	7.2	11151	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	60	$ 2,807,040	7 días	vie 12/09/25	vie 19/09/25	116
114	**8**		**MOBILIARIO**		**97**	**$ 264,165,448**	**7 días**	**jue 4/09/25**	**vie 12/09/25**	
115			**MOBILIARIO URBANO**		**95**	**$ 262,719,496**	**7 días**	**jue 4/09/25**	**vie 12/09/25**	
116	8.3	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	91	$ 189,092,904	7 días	jue 4/09/25	vie 12/09/25	122
117	8.22	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	UN	3	$ 3,535,320	5 días	jue 4/09/25	mié 10/09/25	116CC
118	8.55	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UN	1	$ 70,091,272	5 días	jue 4/09/25	mié 10/09/25	117CC
119			**SEÑALIZACIÓN**		**2**	**$ 1,445,952**	**2 días**	**jue 4/09/25**	**sáb 6/09/25**	
120	8.58	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	2	$ 1,445,952	2 días	jue 4/09/25	sáb 6/09/25	118CC
121	**9**		**IMPREVISTOS**		**5738.62**	**$ 223,991,948**	**96 días**	**mar 22/07/25**	**mar 11/11/25**	
122	NP-03	N/A	CONCRETO 3000 PSI PARA ACTIVIDADES DE PARQUES	M3	68.63	$ 63,021,941	7 días	mié 27/08/25	jue 4/09/25	129
123	NP-11	IDU 8471	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm (INC	KG	2700.8	$ 25,656,520	7 días	mié 27/08/25	jue 4/09/25	122CC
124	NP-12	IDU 6204 '	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1	ML	542	$ 24,839,470	7 días	jue 28/08/25	vie 5/09/25	122CC+1 día
125	NP-13	IDU 4032	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION M	M2	748.7	$ 10,047,913	7 días	lun 11/08/25	mié 20/08/25	93
126	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	100	$ 68,136	10 días	mar 22/07/25	vie 1/08/25	102CC
127	NP-15	IDU 6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye s	M3	68.63	$ 5,220,327	7 días	mié 27/08/25	jue 4/09/25	122CC
128	NP-16	IDU 3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APL	M2	686.3	$ 2,383,822	7 días	mié 27/08/25	jue 4/09/25	122CC
129	NP-23	IDRD 106	SUBBASE GRANULAR CLASE B CON MATERIAL RECICLA	M3	137.26	$ 30,211,629	7 días	mié 20/08/25	mié 27/08/25	125
130	NP-25		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE PARA CA	M2	686.3	$ 62,542,190	12 días	mar 28/10/25	mar 11/11/25	122FC+46 días
131	**III**		**05-025 DESARROLLO USMINIA**		**2790.63**	**$ 447,385,082**	**145 días**	**mar 20/05/25**	**jue 6/11/25**	
132			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**12 días**	**mar 20/05/25**	**mar 3/06/25**	
133			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	7 días	sáb 24/05/25	mar 3/06/25	87CC+45 días
134			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	135
135			Gestion PMT	UN	1	$ 0	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	89CC+14 días
136	**1**		**PRELIMINARES**		**912.41**	**$ 15,790,854**	**30 días**	**mar 29/07/25**	**mié 3/09/25**	
137	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	436.17	$ 4,626,891	14 días	mar 29/07/25	vie 15/08/25	91CC+14 días
138	1.4	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	170.52	$ 255,098	2 días	mié 6/08/25	sáb 9/08/25	141
139	1.6	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	102.4	$ 3,606,938	30 días	mar 29/07/25	mié 3/09/25	141CC
140			**DEMOLICIONES**		**170.52**	**$ 4,684,525**	**7 días**	**mar 29/07/25**	**mié 6/08/25**	
141	1.17	10806	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	170.52	$ 4,684,525	7 días	mar 29/07/25	mié 6/08/25	137CC
142			**DESMONTE Y RETIROS**		**32.8**	**$ 2,617,402**	**18 días**	**mar 29/07/25**	**jue 21/08/25**	
143	1.20	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML	7.7	$ 192,685	4 días	mar 29/07/25	sáb 2/08/25	137CC
144	1.22	10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r	ML	9.9	$ 619,344	4 días	sáb 2/08/25	vie 8/08/25	143
145	1.23	10860	Desmonte y retiro canecas	UN	1	$ 54,400	4 días	vie 8/08/25	mié 13/08/25	144
146	1.24	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. De bases y retiro)	UNI	1	$ 143,344	2 días	mié 13/08/25	vie 15/08/25	145
147	1.25	11271	Desmonte CerramMalla eslabón. h=0,5 a 2 m + retiro	ML	9.2	$ 205,197	4 días	vie 15/08/25	jue 21/08/25	146
148	1.31	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	2	$ 110,432	2 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	141CC
149	1.32	12414	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	2	$ 1,292,000	2 días	jue 31/07/25	sáb 2/08/25	148
150	**3**		**ESTRUCTURA**		**0.22**	**$ 254,073**	**4 días**	**mar 12/08/25**	**vie 15/08/25**	
151			**CIMENTACIÓN**		**0.22**	**$ 254,073**	**4 días**	**mar 12/08/25**	**vie 15/08/25**	
152	3.2	10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	0.22	$ 254,073	4 días	mar 12/08/25	vie 15/08/25	182CC
153	**5**		**PISOS Y ENCHAPES**		**170.52**	**$ 195,892,012**	**10 días**	**vie 24/10/25**	**jue 6/11/25**	
154			**PISOS**		**170.52**	**$ 195,892,012**	**10 días**	**vie 24/10/25**	**jue 6/11/25**	
155	5.10	16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	170.52	$ 195,892,012	10 días	vie 24/10/25	jue 6/11/25	182FC+60 días
156	**6**		**PINTURAS**		**186.75**	**$ 6,760,560**	**7 días**	**sáb 16/08/25**	**mar 26/08/25**	
157			**PINTURAS EXTERIORES**		**186.75**	**$ 6,760,560**	**7 días**	**sáb 16/08/25**	**mar 26/08/25**	
158	6.1	10021	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	116.25	$ 2,940,660	4 días	sáb 16/08/25	jue 21/08/25	159CC
159	6.10	12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	68.5	$ 2,189,260	4 días	sáb 16/08/25	jue 21/08/25	182

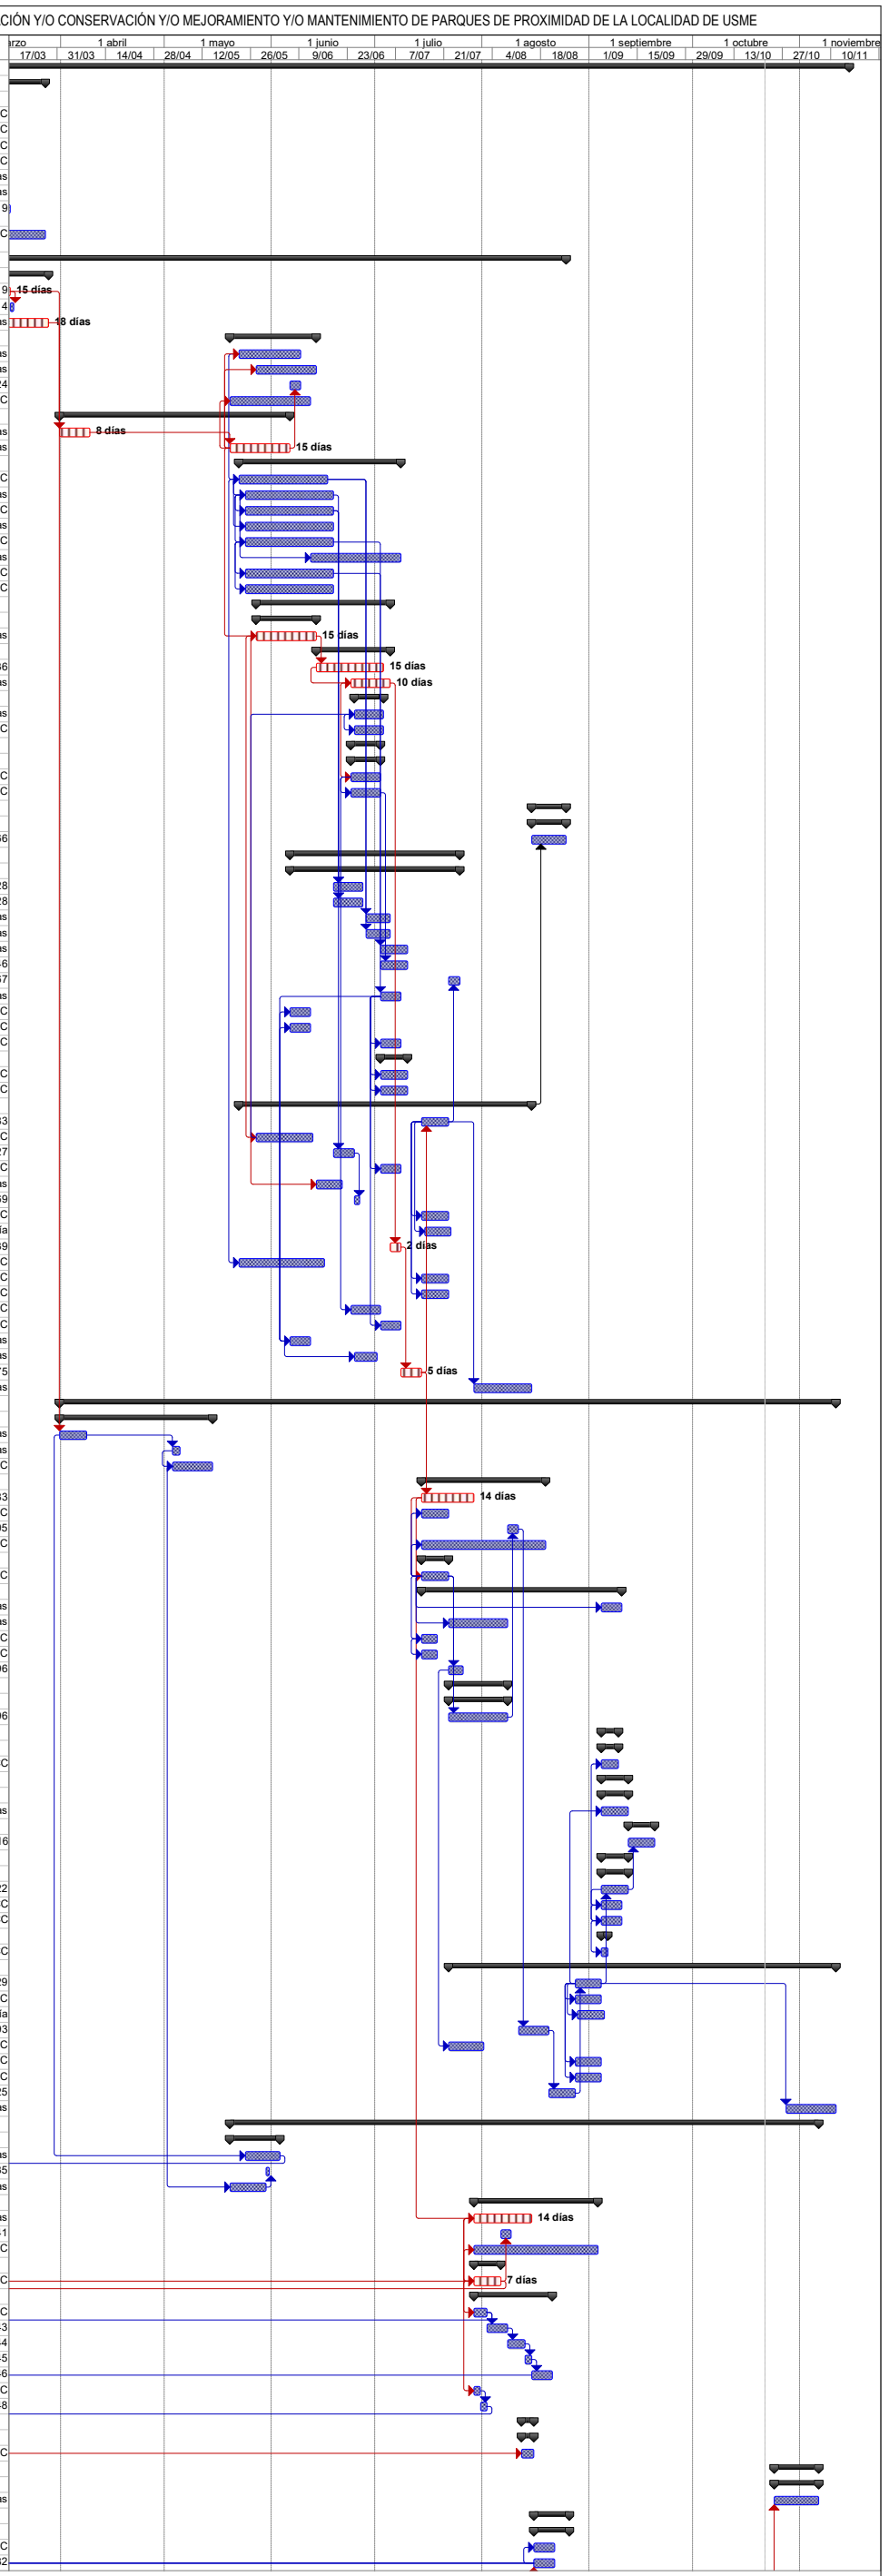


PROGRAMACIÓN V1

Tarea	Tarea crítica resumida	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo
Tarea crítica	Hito resumido	Agrupar por síntesis	Tarea manual	Sólo fin
Hito	Progreso resumido	Tarea inactiva	Sólo duración	Progreso
Resumen	División	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Fecha límite
Tarea resumida	Tareas externas	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual

CONTRATO FDLAN 1202 DE 2024 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USME

Id	ITEM	COD	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
160	6.14	13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	2	$ 1,630,640	7 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25	182
161	**7**		**EXTERIORES**		**25.6**	**$ 1,290,830**	**22 días**	**mar 29/07/25**	**mar 26/08/25**	
162			**EMPRADIZACIÓN ARBORIZACIÓN Y OTROS**		**5**	**$ 74,800**	**1 día**	**mar 29/07/25**	**mié 30/07/25**	
163	7.4	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML	5	$ 74,800	1 día	mar 29/07/25	mié 30/07/25	141CC
164			**SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN**		**20.6**	**$ 1,216,030**	**7 días**	**sáb 16/08/25**	**mar 26/08/25**	
165	7.22	12001	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	5	$ 1,175,720	7 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25	182
166	7.25	IDU-4589	Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquín incl	M2	15.6	$ 40,310	7 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25	165CC
167	**8**		**MOBILIARIO**		**86**	**$ 178,247,026**	**31 días**	**sáb 2/08/25**	**mar 9/09/25**	
168			**MOBILIARIO URBANO**		**82**	**$ 175,619,234**	**31 días**	**sáb 2/08/25**	**mar 9/09/25**	
169	8.2	10529	Estruc. Microfutbol con malla (Sum+Inst)	JGO	1	$ 5,558,048	4 días	sáb 16/08/25	jue 21/08/25	159CC
170	8.3	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5	ML	9.9	$ 20,571,646	7 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25	159CC
171	8.5	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)	UN	7.7	$ 2,745,758	7 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25	159CC
172	8.6	12499	Malla Protección Cerram.Nylon Imperm.H=2m(Sum+Inst	M2	50	$ 714,000	4 días	vie 22/08/25	mar 26/08/25	169
173	8.16	14625	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)	ML	9.4	$ 3,855,654	4 días	lun 25/08/25	jue 28/08/25	147CC+7 días
174	8.20	14651	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)	UN	1	$ 813,144	10 días	lun 25/08/25	jue 4/09/25	173CC
175	8.22	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	UN	1	$ 1,178,440	4 días	jue 4/09/25	mar 9/09/25	174
176	8.55	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UN	2	$ 140,182,544	7 días	sáb 2/08/25	mar 12/08/25	149
177			**SEÑALIZACIÓN**		**4**	**$ 2,627,792**	**2 días**	**mar 12/08/25**	**jue 14/08/25**	
178	8.57	14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	2	$ 1,181,840	2 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25	176
179	8.58	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	2	$ 1,445,952	2 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25	178CC
180	**9**		**IMPREVISTOS**		**1406.13**	**$ 49,149,727**	**22 días**	**sáb 2/08/25**	**vie 29/08/25**	
181	NP-02	IDU 6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	300	$ 170,952	4 días	mar 26/08/25	vie 29/08/25	166
182	NP-03	N/A	CONCRETO 3000 PSI PARA ACTIVIDADES DE PARQUES	M3	13.64	$ 12,526,885	4 días	mar 12/08/25	vie 15/08/25	189
183	NP-04	N/A	REJILLA PARA CANAL AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SUMIN	ML	5	$ 653,235	2 días	sáb 16/08/25	mié 20/08/25	166CC
184	NP-11	IDU 8471	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm (INC	M2	274.87	$ 2,611,127	4 días	mar 12/08/25	vie 15/08/25	182CC
185	NP-12	IDU 6204 `	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1	ML	82.63	$ 3,786,873	4 días	mié 13/08/25	mar 19/08/25	182CC+1 día
186	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	100	$ 68,136	15 días	sáb 2/08/25	jue 21/08/25	143
187	NP-15	IDU 6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye s	M3	13.64	$ 1,037,646	4 días	mar 12/08/25	vie 15/08/25	182CC
188	NP-16	IDU 3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APL	M2	330.52	$ 1,148,041	4 días	mar 12/08/25	vie 15/08/25	182CC
189	NP-23	IDU 4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B CON MATERIAL RECICLADO	M3	8.53	$ 1,876,616	4 días	mié 6/08/25	mar 12/08/25	141
190	NP-25	N/A	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE PARA CA	M2	277.3	$ 25,270,216	7 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25	182
191	**IV**		**05-165 ANTONIO JOSE DE SUCRE**		**2321.29**	**$ 275,025,346**	**89 días**	**vie 25/07/25**	**vie 7/11/25**	
192			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**22 días**	**vie 25/07/25**	**jue 21/08/25**	
193			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	7 días	vie 25/07/25	sáb 2/08/25	133FC+45 días
194			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	sáb 2/08/25	lun 4/08/25	193
195			Gestion PMT	UN	1	$ 0	15 días	sáb 2/08/25	jue 21/08/25	193
196	**1**		**PRELIMINARES**		**912.49**	**$ 14,708,683**	**15 días**	**mar 26/08/25**	**jue 11/09/25**	
197	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	495.69	$ 5,258,282	14 días	mar 26/08/25	mié 10/09/25	182FC+7 días
198	1.4	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	134.8	$ 201,661	2 días	mar 2/09/25	jue 4/09/25	201
199	1.6	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	131.4	$ 4,628,434	14 días	mar 26/08/25	mié 10/09/25	201CC
200			**DEMOLICIONES**		**134.8**	**$ 3,703,231**	**7 días**	**mar 26/08/25**	**mar 2/09/25**	
201	1.17	10806	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	134.8	$ 3,703,231	7 días	mar 26/08/25	mar 2/09/25	197CC
202			**DESMONTES Y RETIROS**		**15.8**	**$ 917,075**	**8 días**	**mar 2/09/25**	**jue 11/09/25**	
203	1.23	10860	Desmonte y retiro canecas	UN	2	$ 108,800	4 días	mar 2/09/25	sáb 6/09/25	201
204	1.25	11271	Desmonte CerramMalla eslabón. h=0,5 a 2 m + retiro	ML	9.8	$ 218,579	2 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	203
205	1.29	15807	Desmonte equipos biosaludables (demolc+retiro)	UN	3	$ 534,480	2 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	204CC
206	1.31	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1	$ 55,216	2 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	205
207	**2**		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		**6.74**	**$ 806,644**	**7 días**	**mar 2/09/25**	**mié 10/09/25**	
208			**EXCAVACIONES CON RETIRO**		**6.74**	**$ 806,644**	**7 días**	**mar 2/09/25**	**mié 10/09/25**	
209	2.1	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(< 50m	M3	6.74	$ 806,644	7 días	mar 2/09/25	mié 10/09/25	201
210	**3**		**ESTRUCTURA**		**0.4**	**$ 465,801**	**4 días**	**mar 23/09/25**	**vie 26/09/25**	
211			**CIMENTACIÓN**		**0.4**	**$ 465,801**	**4 días**	**mar 23/09/25**	**vie 26/09/25**	
212	3.2	10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	0.4	$ 465,801	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	226CC
213	**5**		**PISOS Y ENCHAPES**		**134.8**	**$ 154,857,391**	**7 días**	**mié 29/10/25**	**vie 7/11/25**	
214	5.10	16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	134.8	$ 154,857,391	7 días	mié 29/10/25	vie 7/11/25	232
215	**6**		**PINTURAS**		**279.4**	**$ 8,920,308**	**7 días**	**sáb 13/09/25**	**lun 22/09/25**	
216			**PINTURAS EXTERIORES**		**279.4**	**$ 8,920,308**	**7 días**	**sáb 13/09/25**	**lun 22/09/25**	
217	6.1	10021	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	236.5	$ 5,982,504	7 días	sáb 13/09/25	lun 22/09/25	232
218	6.10	12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	40.9	$ 1,307,164	7 días	sáb 13/09/25	lun 22/09/25	217CC
219	6.14	13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	2	$ 1,630,640	7 días	sáb 13/09/25	lun 22/09/25	218CC
220	**8**		**MOBILIARIO**		**21.2**	**$ 36,751,443**	**15 días**	**sáb 13/09/25**	**mar 30/09/25**	
221			**MOBILIARIO URBANO**		**19.2**	**$ 35,437,547**	**15 días**	**sáb 13/09/25**	**mar 30/09/25**	
222	8.4	10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	ML	6	$ 7,806,672	4 días	sáb 13/09/25	jue 18/09/25	232
223	8.14	10203	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	ML	9.2	$ 4,674,483	4 días	sáb 13/09/25	jue 18/09/25	222CC
224	8.20	14651	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)	UN	2	$ 1,626,288	7 días	sáb 13/09/25	lun 22/09/25	222CC
225	8.27	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1	$ 2,706,264	7 días	mar 23/09/25	mar 30/09/25	205CC+14 días
226	8.54	10587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (S	UN	1	$ 18,623,840	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	225CC
227			**SEÑALIZACIÓN**		**2**	**$ 1,313,896**	**1 día**	**vie 19/09/25**	**lun 22/09/25**	
228	8.57	14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1	$ 590,920	1 día	vie 19/09/25	lun 22/09/25	217FF
229	8.58	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1	$ 722,976	1 día	vie 19/09/25	lun 22/09/25	228CC
230	**9**		**IMPREVISTOS**		**963.26**	**$ 58,515,076**	**55 días**	**mar 2/09/25**	**mié 5/11/25**	
231	NP-02	IDU 6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	300	$ 170,952	4 días	sáb 13/09/25	jue 18/09/25	218CC
232	NP-03	N/A	CONCRETO 3000 PSI PARA ACTIVIDADES DE PARQUES	M3	10.78	$ 9,902,807	4 días	mar 9/09/25	sáb 13/09/25	240
233	NP-04	N/A	REJILLA PARA CANAL AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SUMIN	UN	5.4	$ 705,494	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	212CC
234	NP-12	IDU 6204 `	RETIRO MANUAL DE CAUCHO O CÉSPED SINTÉTICO, IN	ML	23.4	$ 1,072,534	4 días	mar 2/09/25	sáb 6/09/25	209CC
235	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	100	$ 68,136	10 días	mar 2/09/25	sáb 13/09/25	209CC
236	NP-15	IDU 6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye s	M3	10.78	$ 820,284	4 días	mar 9/09/25	sáb 13/09/25	232CC
237	NP-16	IDU 3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APL	M2	134.8	$ 468,220	4 días	mar 9/09/25	sáb 13/09/25	232CC
238	NP-18	IDU 13808	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISE	UN	1	$ 7,590,818	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	225CC
239	NP-22	IDU 10413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS ADULTOS MAYOR	UN	1	$ 2,572,720	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	225CC
240	NP-23	IDU 4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B CON MATERIAL RECICLA	M3	6.74	$ 1,483,511	4 días	jue 4/09/25	mar 9/09/25	198
241	NP-25	N/A	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE PARA CA	M2	369.36	$ 33,659,600	10 días	jue 23/10/25	mié 5/11/25	232FC+35 días
242	**V**		**05-172 VILLA ISRAEL**		**2291.97**	**$ 307,338,641**	**74 días**	**vie 22/08/25**	**sáb 15/11/25**	
243			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**22 días**	**vie 22/08/25**	**mar 16/09/25**	
244			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	7 días	vie 22/08/25	vie 29/08/25	193FC+15 días
245			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	vie 29/08/25	sáb 30/08/25	244
246			Gestion PMT	UN	1	$ 0	15 días	vie 29/08/25	mar 16/09/25	244
247	**1**		**PRELIMINARES**		**954.78**	**$ 17,114,452**	**14 días**	**lun 22/09/25**	**mar 7/10/25**	
248	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	493.26	$ 5,232,502	7 días	lun 22/09/25	lun 29/09/25	232FC+7 días
249	1.4	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	147.46	$ 220,600	2 días	jue 25/09/25	sáb 27/09/25	252
250	1.6	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	127.7	$ 4,498,105	14 días	lun 22/09/25	mar 7/10/25	252CC
251			**DEMOLICIONES**		**147.46**	**$ 4,051,021**	**4 días**	**lun 22/09/25**	**jue 25/09/25**	
252	1.17	10806	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	147.46	$ 4,051,021	4 días	lun 22/09/25	jue 25/09/25	248CC
253			**DESMONTES Y RETIROS**		**38.9**	**$ 3,112,224**	**5 días**	**lun 22/09/25**	**vie 26/09/25**	
254	1.18	10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	2	$ 206,448	5 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25	252CC
255	1.22	10808	Desmonte CerramMalla eslabón. h=2 a 5 m+cargue y r	ML	22.9	$ 1,432,624	2 días	lun 22/09/25	mar 23/09/25	254CC
256	1.23	10860	Desmonte y retiro canecas	UN	6	$ 326,400	2 días	lun 22/09/25	mar 23/09/25	254CC
257	1.24	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UNI	8	$ 1,146,752	2 días	lun 22/09/25	mar 23/09/25	254CC
258	**2**		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		**7.37**	**$ 882,401**	**4 días**	**jue 25/09/25**	**mar 30/09/25**	
259			**EXCAVACIONES CON RETIROS**		**7.37**	**$ 882,401**	**4 días**	**jue 25/09/25**	**mar 30/09/25**	
260	2.1	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(< 50m	M3	7.37	$ 882,401	4 días	jue 25/09/25	mar 30/09/25	252
261	**3**		**ESTRUCTURAS**		**0.04**	**$ 42,346**	**2 días**	**lun 29/09/25**	**mié 1/10/25**	
262			**CIMENTACIÓN**		**0.04**	**$ 42,346**	**2 días**	**lun 29/09/25**	**mié 1/10/25**	
263	3.2	10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	0.04	$ 42,346	2 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25	279CC
264	**5**		**PISOS Y ENCHAPES**		**147.46**	**$ 169,400,868**	**8 días**	**jue 6/11/25**	**sáb 15/11/25**	
265			**PISOS**		**147.46**	**$ 169,400,868**	**8 días**	**jue 6/11/25**	**sáb 15/11/25**	
266	5.10	16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	147.46	$ 169,400,868	8 días	jue 6/11/25	sáb 15/11/25	286FC+25 días
267	**6**		**PINTURAS**		**165.38**	**$ 5,144,741**	**7 días**	**mié 24/09/25**	**mié 1/10/25**	
268			**PINTURAS EXTERIORES**		**165.38**	**$ 5,144,741**	**7 días**	**mié 24/09/25**	**mié 1/10/25**	
269	6.1	10021	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	138.68	$ 3,508,049	5 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	255
270	6.10	12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	25.7	$ 821,372	7 días	mié 24/09/25	mié 1/10/25	255
271	6.14	13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	1	$ 815,320	2 días	mié 24/09/25	jue 25/09/25	255
272	**7**		**EXTERIORES**		**3**	**$ 44,880**	**1 día**	**jue 25/09/25**	**vie 26/09/25**	
273			**EMPRADIZACIÓN ARBORIZACIÓN Y OTROS**		**3**	**$ 44,880**	**1 día**	**jue 25/09/25**	**vie 26/09/25**	
274	7.4	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML	3	$ 44,880	1 día	jue 25/09/25	vie 26/09/25	260CC
275	**8**		**MOBILIARIO**		**39.9**	**$ 59,295,225**	**10 días**	**mié 24/09/25**	**sáb 4/10/25**	
276			**MOBILIARIO URBANO**		**37.9**	**$ 57,849,273**	**10 días**	**mié 24/09/25**	**sáb 4/10/25**	
277	8.4	10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	ML	22.9	$ 29,795,465	7 días	mié 24/09/25	mié 1/10/25	270CC
278	8.20	14651	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)	UN	6	$ 4,878,864	5 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	277CC
279	8.23	14656	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN	8	$ 4,551,104	1 día	lun 29/09/25	mar 30/09/25	278
280	8.54	10587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (S	UN	1	$ 18,623,840	5 días	lun 29/09/25	sáb 4/10/25	279CC
281			**SEÑALIZACIÓN**		**2**	**$ 1,445,952**	**4 días**	**mar 30/09/25**	**sáb 4/10/25**	
282	8.58	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	2	$ 1,445,952	4 días	mar 30/09/25	sáb 4/10/25	279
283	**9**		**IMPREVISTOS**		**971.04**	**$ 55,413,728**	**19 días**	**mié 24/09/25**	**jue 16/10/25**	
284	NP-01	IDU 3007	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL	ML	44.1	$ 4,813,734	2 días	mar 30/09/25	jue 2/10/25	260
285	NP-02	IDU 6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	500	$ 284,920	2 días	jue 25/09/25	sáb 27/09/25	274CC
286	NP-03		CONCRETO 3000 PSI PARA ACTIVIDADES DE PARQUES	M3	11.8	$ 10,832,832	4 días	jue 2/10/25	mar 7/10/25	289
287	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	41.77	$ 28,459	10 días	jue 25/09/25	mar 7/10/25	260CC
288	NP-17	IDRD 1464	MÓDULO FALTANTE MALLA PARA BARANDAS M-83	UN	23	$ 6,573,523	4 días	mié 24/09/25	sáb 27/09/25	278CC
289	NP-23	IDU 4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B CON MATERIAL RECICLA	M3	7.37	$ 1,622,835	4 días	lun 29/09/25	jue 2/10/25	249
290	NP-25		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE PARA CA	M2	343	$ 31,257,425	7 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25	286
291	**VI**		**05-106 EL VIRREY**		**1103.38**	**$ 242,929,406**	**59 días**	**lun 8/09/25**	**sáb 15/11/25**	
292			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**23 días**	**lun 8/09/25**	**vie 3/10/25**	
293			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	7 días	lun 8/09/25	mar 16/09/25	242CC+15 días
294			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	mar 16/09/25	mié 17/09/25	293
295			Gestion PMT	UN	1	$ 0	15 días	mié 17/09/25	vie 3/10/25	294
296	**1**		**PRELIMINARES**		**661.59**	**$ 8,248,894**	**10 días**	**mar 7/10/25**	**lun 20/10/25**	
297	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	611.59	$ 6,487,694	7 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25	286
298	1.6	11646	CERRAMIENTO Lona h=2.20 mts(Exc)	ML	50	$ 1,761,200	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	297CC
299	**5**		**PISOS Y ENCHAPES**		**135.59**	**$ 155,758,963**	**7 días**	**vie 7/11/25**	**sáb 15/11/25**	
300			**PISOS**		**135.59**	**$ 155,758,963**	**7 días**	**vie 7/11/25**	**sáb 15/11/25**	
301	5.10	16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	135.59	$ 155,758,963	7 días	vie 7/11/25	sáb 15/11/25	306FC+24 días
302	**8**		**MOBILIARIO**		**51.2**	**$ 67,900,285**	**27 días**	**mar 7/10/25**	**sáb 8/11/25**	
303			**MOBILIARIO URBANO**		**51.2**	**$ 67,900,285**	**27 días**	**mar 7/10/25**	**sáb 8/11/25**	
304	8.3	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	17.2	$ 35,740,637	4 días	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	298CC
305	8.16	14625	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)	ML	33	$ 13,535,808	7 días	jue 30/10/25	sáb 8/11/25	304CC+20 días
306	8.54	010587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (S	UN	1	$ 18,623,840	2 días	mar 7/10/25	jue 9/10/25	304CC
307	**9**		**IMPREVISTOS**		**252**	**$ 11,021,264**	**30 días**	**mar 7/10/25**	**mié 12/11/25**	
308	NP-02	IDU 6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	150	$ 85,476	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	301CC
309	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	100	$ 68,136	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	298CC
310	NP-20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO CORTO EN	UN	1	$ 8,294,932	4 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25	305CC
311	NP-22	IDRD 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS ADULTOS MAYOR	UN	1	$ 2,572,720	4 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25	305CC
312	**VII**		**05-280 BETÁNIA**		**400**	**$ 29,258,007**	**42 días**	**lun 8/09/25**	**lun 27/10/25**	
313			**ACTIVIDADES PREVIAS**		**3**	**$ 0**	**23 días**	**lun 8/09/25**	**vie 3/10/25**	
314			Identificación actores sociales, actas de vecindad	GL	1	$ 0	7 días	lun 8/09/25	mar 16/09/25	293CC
315			Reunión de inicio	UN	1	$ 0	1 día	mar 16/09/25	mié 17/09/25	314
316			Gestion PMT	UN	1	$ 0	15 días	mié 17/09/25	vie 3/10/25	315
317	**1**		**PRELIMINARES**		**104**	**$ 1,940,176**	**10 días**	**mar 7/10/25**	**lun 20/10/25**	
318	1.1	00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	70	$ 742,560	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	297CC

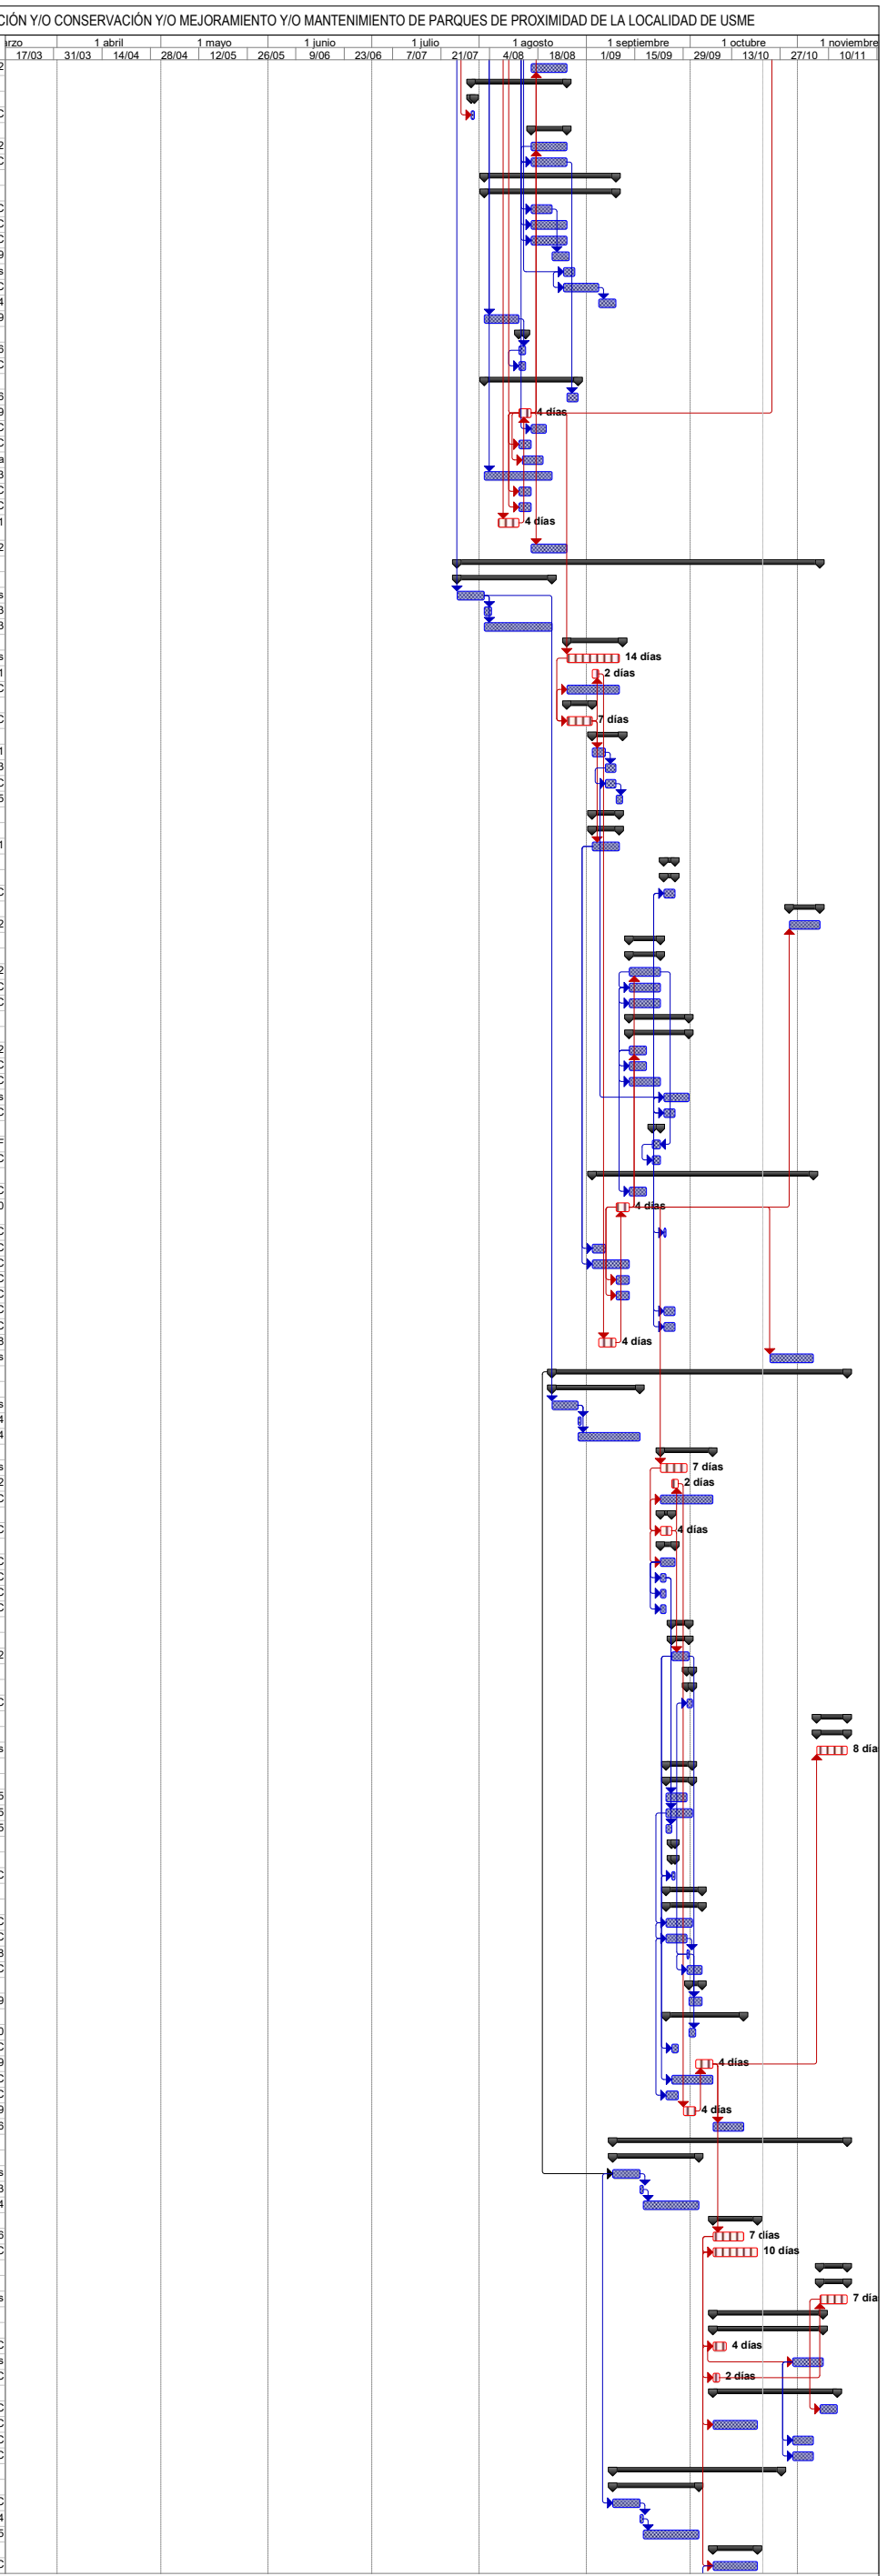


PROGRAMACIÓN V1

Tarea	Tarea crítica resumida	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo
Tarea crítica	Hito resumido	Agrupar por síntesis	Tarea manual	Sólo fin
Hito	Progreso resumido	Tarea inactiva	Sólo duración	Progreso
Resumen	División	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Fecha límite
Tarea resumida	Tareas externas	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual

CONTRATO FDLAN 1202 DE 2024 “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USME

Id	ITEM	COD	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
319	1.6	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	34	$ 1,197,616	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	318CC
320	**6**		**PINTURAS**		**70**	**$ 904,400**	**4 días**	**lun 20/10/25**	**jue 23/10/25**	
321			**PINTURAS EXTERIORES**		**70**	**$ 904,400**	**4 días**	**lun 20/10/25**	**jue 23/10/25**	
322	6.9	10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1	M2	70	$ 904,400	4 días	lun 20/10/25	jue 23/10/25	319
323	**8**		**MOBILIARIO**		**3**	**$ 19,937,736**	**4 días**	**mar 7/10/25**	**sáb 11/10/25**	
324			**MOBILIARIO URBANO**		**1**	**$ 18,623,840**	**4 días**	**mar 7/10/25**	**sáb 11/10/25**	
325	8.54	010587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (S	UN	1	$ 18,623,840	4 días	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	319CC
326			**SEÑALIZACIÓN**		**2**	**$ 1,313,896**	**4 días**	**mar 7/10/25**	**sáb 11/10/25**	
327	8.57	14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1	$ 590,920	4 días	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	325CC
328	8.58	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1	$ 722,976	4 días	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	325CC
329	**9**		**IMPREVISTOS**		**220**	**$ 6,475,695**	**16 días**	**mar 7/10/25**	**lun 27/10/25**	
330	NP-02	IDU 6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	50	$ 28,492	4 días	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	319CC
331	NP-14	N/A	TRASIEGO MANUAL SUPERIOR A 50M, MÁXIMO 200M	KG	100	$ 68,136	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	325CC
332	NP-25	N/A	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE PARA CA	M2	70	$ 6,379,067	6 días	lun 20/10/25	lun 27/10/25	322CC

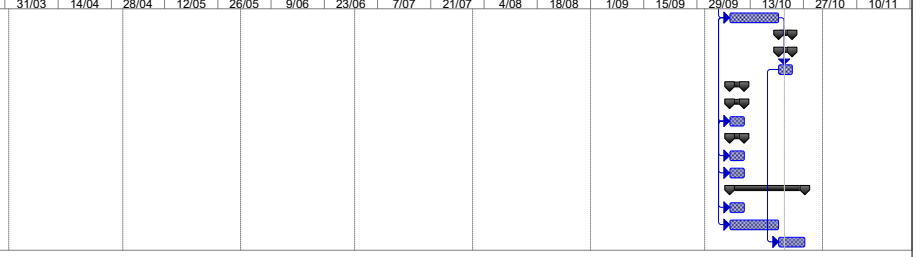

PROGRAMACIÓN V1

Tarea	Tarea crítica resumida	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo
Tarea crítica	Hito resumido	Agrupar por síntesis	Tarea manual	Sólo fin
Hito	Progreso resumido	Tarea inactiva	Sólo duración	Progreso
Resumen	División	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Fecha límite
Tarea resumida	Tareas externas	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
