- SE HACEN TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS.
- SE HACEN TRABAJOS DE ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.

01 DE ABRIL DE 2022 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO.
- EQUIPOS EN OBRA: MOTONIVELADORA 120K, MINICARGADOR CASE 220.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: SE PRESENTAN FUERTE LLUVIA EN HORAS DE LA MADRUGADA Y TODA LA MAÑANA 7:00 AM A 12:00 MD

02 DE ABRIL DE 2022 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: MOTONIVELADORA 120K, MINICARGADOR CASE 220.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR SISO, 2 PALETEROS 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: EVACUACIÓN DE AGUAS EN VIA DE MARTINEZ.

SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA, 7AM A 12:00 MD.

Escaneado con CamScanner

03 DE ABRIL DE 2022 (DOMINGO)
- No se realizan trabajos en la OBRA.

04 DE ABRIL DE 2022 (LUNES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en OBRA: Motoniveladora 120K, Minicargador CASE 220.
- Personal en OBRA: Ingeniero residente de OBRA, Auxiliar Social, Siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 topografía.
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el quemado.
Excavación de aguas en vía Martínez.
En horas de la tarde se retira el lodo con minicargador en la excavación vía Martínez entre el K0+000 al K0+080.
Se realizan trabajos de topografía levantamiento de la vía Martínez, eje de la vía.

05 DE ABRIL DE 2022 (MARTES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en OBRA: Motoniveladora 120K, Minicargador CASE 220.
- Personal en OBRA: Ingeniero residente de OBRA, Auxiliar Social, 2 paleteras, Siso, 2 oficios varios, 2 operadores, 1 Volquetero.
- Actividades: Se saca material Cobso en la vía Martínez entre el K0+000 al K0+080, con minicargador y volqueta doble troque.

Escaneado con CamScanner

Se Hacen trabajos actas de vecindad en el quemado.
Se reciben niveles por parte de la topografía de interventoría, los niveles de la subrasante, para poder suministrar material de afirmado entre el KO+000 al KO+050, vía martínez.

06 de Abril de 2022 (Miércoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra: Motoniveladora 120K, Minicargador Case 220.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, Siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 topografía.
- Actividades: Se Hacen trabajos actas de vecindad en el quemado.
Suministro e instalación de material para afirmado del KO+000 al KO+080 (Martínez)
Se Hacen trabajos de topografía levantamiento de vía martínez para replantear el eje.

07 de Abril de 2022 (Jueves)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Motoniveladora 120K, Minicargador Case 220.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de Obra, Auxiliar Social, Siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 topografía.
- Actividades: Se Hacen trabajos actas de vecindad en el quemado.
Se Hacen trabajos de topografía levantamiento

Escaneado con CamScanner

DE VIA MARTINEZ, REPLANTEO DEL EJE DE LA VIA.
SE HACEN TRABAJOS DE EVACUACION DE AGUAS EN LAS EXCAVACIONES DE LA VIA EN MARTINEZ POR MOTIVO DE LLUVIAS.
SE HACE RETIRO DE LODO EN LA EXCAVACION DE LA VIA MARTINEZ DEL KO+280 AL KO+400.
Nota: SE PRESENTAN FUERTE LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE 3:00 p.m. SALE DE OBRA MOTONIVELADORA 120K CAT.

08 DE ABRIL DE 2022 (VIERNES)
- Estado del tiempo: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA: MINICARGADOR CASE 220, 2 VOLQUETAS.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, 2 TOPOGRAFIA.
- Actividades: TERMINAR ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.
EVACUACION DE AGUAS EMPOSADAS POR MOTIVO DE LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA DE 8:30 AM A 12:00 MD
SE HACEN TRABAJOS DE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION DE LA VIA MARTINEZ DEL K1+565 AL K1+420.

09 DE ABRIL DE 2022 (SABADO)
- Estado del tiempo: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: MINICARGADOR CASE 220, 2 VOLQUETAS
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, 2 TOPOGRAFO,

Escaneado con CamScanner

2 conductores idQuetas doble troque.
-Actividades: Se hace trabajo social con los propietarios de las fincas que se ven afectadas por la construcción del pavimentos, en los puntos donde la vía no da los anchos de diseño. aproximadamente entre el K1+300 al K1+565. Se llega al acuerdo ~~que~~ ~~las~~ entre el contratista y propietario de los predios que las cercas afectadas sean reemplazadas por postes en concreto y alambres de puas.
Además a esto el contratista se compromete a intervenir el canal recolector de aguas que se encuentra perimetral a la vía aproximadamente del K1+200 hasta el final del proyecto el K1+565.
Se hacen trabajos de cargue y retiro de material proveniente de la explanación de la vía Martinez entre el K1+490 al K1+400.
Nota: El minicargador se bajo por la tarde. (problema electrico). Se cancelan actividades por la tarde.

10 de abril de 2022 (Domingo)
-Estado del tiempo: Soleado
-Equipos en obra: Minicargador case 220
2 Volquetas doble troque.
-Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 1 operador, 2 topografos, 2 conductores de volqueta.

Escaneado con CamScanner

- Actividades: Excavación, cargue y retiro del material proveniente de la explanación en la vía Martimez entre el KI+400 al KI+360.

11 de Abril de 2022 (Lunes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Mini cargador CASE 226.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, SISO, 2 paleteras, 2 oficios varios, 1 operador, 2 conductores de volquetas, 2 topografía.
- Actividades: Excavación, cargue y retiro de material proveniente de la explanación de la vía Martimez del KI+360 al KI+270.
Se hacen chequeos de niveles y anchos de vía en Martimez por parte de la topografía del contratista.

12 de Abril de 2022 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Mini cargador CASE 220, 2 Volquetas doble troque.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de Obra, Auxiliar social, SISO, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 conductores de volquetas, 1 operador.
- Actividades: Excavación, cargue y retiro de material proveniente de la explanación de la vía Martimez entre el KI+270 al KI+140.
En la vía de la vereda el quemado se

Escaneado con CamScanner

encuentra la topografía replizando trabajos de replanteo de la vía
Se Hacen trabajos de corte capa de subrasante en la vía del corrimiento de mantos entre el KO+620 al KO+420.
Nota: En Horas del medio día llega a la Obra Motoniveladora CASE 86iB y vibrocompactador CAT CS533E.

x [signature] x [signature]
2

13 de Abril de 2022 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra: Minicargador CASE 220, Motoniveladora CASE 86iB, Vibrocompactador CAT CS533E.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 3 operadores, 2 topografía.
- Actividades: Se Hace liberación de subrasante por parte de la interventoría entre el KO+390 al KO+390. Se Hacen las observaciones que en este tramo se encuentran algunos fallos (KO+310) los cuales deben ser intervenidos al momento de entregar la capa de afirmado.
Se Hacen trabajos de suministro e instalación de material de afirmado entre el KO+290 al KO+390. Nivelado y compactado
Nota: El minicargador se detiene por avería (fuga de aceite Hidraulico)

x [signature] x [signature]
2

Escaneado con CamScanner

14 DE ABRIL DE 2022 (JUEVES)
NO SE HACEN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA.

15 DE ABRIL DE 2022 (VIERNES)
NO SE HACEN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA.

16 DE ABRIL DE 2022 (SABADO)
NO SE HACEN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA

17 DE ABRIL DE 2022 (DOMINGO)
NO SE HACEN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA.

18 DE ABRIL DE 2022 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA: MINICARGADOR CASE 220, MOTONIVELADORA CASE 865B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 3 OPERADORES, 2 TOPOGRAFOS.
- ACTIVIDADES:

NOTA: SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS EL DIA DE AYER Y TODA LA MADRUGADA DEL DIA DE HOY EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MANTINICA.

Escaneado con CamScanner

Se Hacen trabajos de evacuación de aguas en el cajón de la vía en el corregimiento de Martínez.
Replanteo topográfico de la vía en la vereda el Quemado.
Continua inactivo minicargador por fuga hidráulica.

19 de Abril de 2022 (Martes)
- Estado del tiempo: Nublado
- Equipos en obra: Minicargador Case 220, Motoniveladora Case 865B, Vibrocompactador CAT CS533E.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, SISO, 2 paleteros, 2 topografía, 3 operadores, 2 oficios varios.
- Actividades:
Se presentan lluvias de 7:00 AM a 10:30 AM en el corregimiento de Martínez.
Se hace recorrido de obra en presencia del contratista y esta interventoría en la vía del corregimiento de Martínez para dar solución a ciertas observaciones que ayudan al progreso de la obra. El contratista se compromete a lo siguiente:
1. Poner a disposición de la obra otro personal alterno al que se encuentra en obra, para la evacuación de las aguas en caso de lluvias, así como la implementación de más equipos para evacuar las aguas (motobomba o sumergible).
2. El contratista se compromete a dar prioridad al tramo entre el K0+000 al K0+380, el cual se encuentra en material

Escaneado con CamScanner

DE AFIRMADO, SER ENTREGADO Y LIBERADO POR TOPOGRAFIA DE LA INTERVENTORIA Y PODER COLOCAR SUB BASE ESTA SEMANA EN CURSO.

3. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PONER A DISPOSICIÓN DE LA OBRA, MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN (RETROCARGADOR O PAJARITA) PARA EXCAVAR Y RETIRAR EL MATERIAL EN LOS PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN FALLAS EN LA VIA Y ADEMAS PONER PIEDRA RAJON PARA ESTABILIZAR LOS FALLOS EN LA VIA.

SE HACEN TRABAJOS DE CERTEO CAPA DE AFIRMADO EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARIMES Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA.

SE HACEN TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA VIA EN LA VEREDA EL QUEMADO.

x

20 DE ABRIL DE 2022 (MIERCOLES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA: MINICARGADOR CASE 220, MOTONIVELADORA CASE 865B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E, 2 VOLQUETAS DOBLETROQUE.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 3 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: REPLANTEO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA VIA DE LA VEREDA EL QUEMADO.
- CERTEO DE CAPA DE AFIRMADO EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARIMES ENTRE EL K0+000 AL K0+360.
- SE OBSERVAN FALLOS EN LA CAPA DE AFIRMADO A LO LARGO DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARIMES, LAS CUALES SE EVIDENCIARON AL MOMENTO DE LA -

Escaneado con CamScanner

compactación con el vibrocompactador especificamente en los K0+030, K0+080, K0+110, K0+140, K0+320, K0+390 y en la subrasante en el K0+420.

- El contratista se comprometió hacer las excavaciones pertinentes en los fallos y estabilizarlos con piedra rajón.
- En recorrido realizado con esta interventoría y el contratista el día de ayer 19/ABRIL/2022, otro tema que se habló, fue que el contratista sugiere subir los niveles del diseño de la estructura del pavimento en la vía del corregimiento de Martínez, esto debido a que se está excavando y retirando un material que ya está consolidado para obtener un material suelto y en malas condiciones, además se están presentando fuertes lluvias que afectan la excavación. Esta interventoría está a la espera de la modificación de los niveles, esta modificación se presentaría del K0+420 en adelante, es decir al K1+565.

21 DE ABRIL DE 2022 (JUEVES)


- Estado del tiempo: Nublado.
- Equipos en Obra: 1 Minicargador CASE 220SR, Motoniveladora CASE 865B, Vibrocompactador CAT CS533E, Retrocargador CAT 428F.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, SISO, 2 paleteras, 4 operadores, 2 oficios varios, 2 topógrafos.
- Actividades:

Escaneado con CamScanner

- Se presentan lluvias al medio día entre la 1:00 pm y 2:00 pm en la vía del corregimiento Martínez
- 8:00 AM visita a la obra en el corregimiento de la vía Martínez por parte del especialista en estructuras Víctor Hernandez, especialista de la Interventoría. Se hace un recorrido con el contratista, donde son representados por el Ingeniero Evin Cuartas y el Ingeniero Cesar Hernandez, por parte de la Interventoría el Ingeniero Miguel Díaz (Director de Interventoría), Carlos Carvajal (Residente de Interventoría y el Ingeniero Víctor Hernandez (especialista estructural de la Interventoría).
En el recorrido se evidencia nuevamente fallos en la capa del afirmado comprendido del K0+000 al K0+380.
Esta Interventoría sugiere por recomendación del especialista implementar un mecanismo para manejar las aguas subterraneas y tuberías que se ven replejadas en un nivel freatico muy superficial, a una excavación aproximada de 80 cm. Se sugiere la implementación de geotextil para tratar el nivel freático de la vía o un filtro tipo frances a lo largo de la vía mas exactamente en las zona donde hay presencia de fincas.
Se solicita al contratista presentar una solución con respecto al inconveniente del nivel freatico lo mas antes posible, ya que estamos en temporada invernal y la afectación por lluvias en la zona es alta.
- Nota: 3:30 pm llega a la obra retrocargador CAT 428F en la vía Martínez.
- Retrocargador esta inactivo por daño de manguera del hidraulico.

Escaneado con CamScanner

- 4:15 PM ES REPARADO RETROCARGADOR, SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA HACER CAJEO DONDE SE ENCUENTRA EL FALLO EN LA CAPA DE AFIRMADO KO + 080.

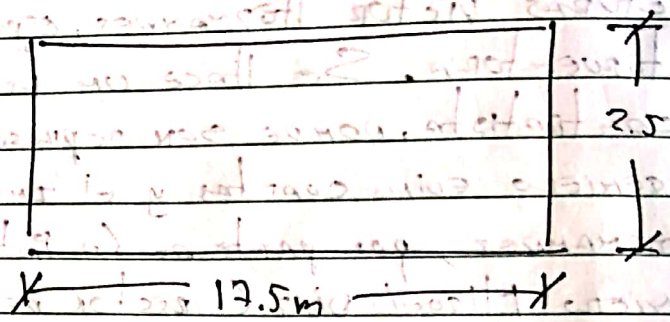

PROFUNDIDAD 0,90m

- **Nota:** EL CONTRATISTA A SUMINISTRADO UN MATERIAL ROCOSO, EL CUAL A LLEGADO A OBRA CON DEMASIADOS FINOS, HUMEDAD EN EXCESO Y ES UN MATERIAL QUE SE FRACTURA CON FACILIDAD. SE EVIDENCIA EN CAMPO QUE ESTE MATERIAL NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA PODER SER UTILIZADO COMO MEJORAMIENTO A LOS FALLOS EXPUESTO EN EL CAPITULO 2. EXPLANACIONES DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES DEL INVIAS; ARTICULO 221. TERRAPLENES, NUMERAL 221.2 MATERIALES. DONDE SE EXPONE QUE LOS MATERIALES PROVENDRAN DE FUENTES APROBADAS Y DE CANTOS ROCOSOS Y ROCA SANA; COMPACTAS, RESISTENTES Y DURABLES. EL CONTRATISTA HACE CASO OMISO A LAS OBSERVACIONES ANTERIORMENTE MENSIONADAS, POR TAL RAZON SE HACE RESPONSABLE DE ACTIVIDAD DE RETIRO DEL MATERIAL SI ESTE NO CUMPLE CON SU FUNCION, LA CUAL ES ESTABILIZAR LOS FALLOS PRESENTE EN LA CAPA DE AFIRMADO O SUBBASE.

22 DE ABRIL DE 2022 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO
- EQUIPOS EN OBRA: MINICARGADOR CASE SR 220, MOTONIVELADORA CASE 865B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E, RETROCARGADOR 428F CAT.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 4 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: **Nota:** SE PRESENTAN PUENTE LLUVIAS LA MADRUGADA DEL DIA DE HOY Y PARTE DE LA MAÑANA, APROXIMADAMENTE DE 2:00 AM A 6:00 AM (MARTINEZ)
- SE HACEN TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS EMPOSADAS EN EL CAJÓN DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ.
- EN HORAS DEL MEDIO SE RETIRA DE LA OBRA MOTONIVELADORA CASE 865B.

Nota: SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE DEBE CUMPLIR CON LA MAQUINARIA MINIMA ESTABLECIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN OBRA.

23 DE ABRIL DE 2022 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E, RETROCARGADOR CAT 428F.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- ACTIVIDADES:

SE HACEN TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN CON

Escaneado con CamScanner

piedra, falla presente en la capa de afirmado en el KO+080, de la vía del corregimiento de Martínez.


- **Nota:** 7:00 AM se retira de la OBRA en la vía del corregimiento de Martínez vibrocompactador CS 533E por parte del contratista.
- Se le comunica al contratista, en este caso a su representante en OBRA, su ingeniero residente que deben cumplir con los equipos mínimos en OBRA, para dar cumplimiento a las actividades a realizar.
- Actualmente se están haciendo actividades de mejoramiento con piedra, pollos en la capa de afirmado en la vía del corregimiento de Martínez.

Se le informa que todo material puesto debe ser extendido y compactado (vibrocompactador). Siendo las 11:30 AM, en OBRA no se encuentra un equipo de compactación que desarrolle esta función.

- Toda implicación que genere el no cumplimiento de la función del mejoramiento en la capa de afirmado, correrá por parte del contratista. Al no comprobar el terreno al cual se le está realizando el mejoramiento.

Desde el retiro del material puesto, geotextil utilizado para manejar el nivel freático y así mismo suministro nuevamente de material rocoso.

- 11:30 AM se reparan retrocargador 428F.



Escaneado con CamScanner

- Se le informa al contratista que el material puesto en obra para estabilizar los fallos en la capa de afirmado no cumple con las especificaciones del manual de INVIAS, Articulo 221. Hasta que este no presente los informes pertinentes donde se corrobore que el material cumple. Este no sera Aceptado y el contratista corre con todas las responsabilidad Ocasion tenga.
- Nota: El contratista hizo caso omiso a las indicaciones sugeridas por esta interventoria con respecto al material utilizado para estabilizar los fallos.

Fallo del KO+080, no sera resibido hasta tanto no se entreguen los resultados pertinentes de laboratorio.

x

24 de Abril de 2022 (Domingo)
No se realizan trabajos en la obra.

x

25 de Abril de 2022 (Lunes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra: Minicargador case sr220, retrocargador cat 428f.
- Personal en obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, piso, 2 paleteros, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 topografia.
- Actividades: trabajos de excavacion con retrocargador 428f, en fallo en la via del corregimiento de martinez en el KO+300 y KO+420.
- 9:00 AM ingresa a la obra en martinez motoniveladora case 865b.


Escaneado con CamScanner

- 12:00 MD INGRESA LA OBRA EN MARTINEZ VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E.
Nota: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ 1:30PM A 2:30PM.
- SE INICIAN TRABAJOS DE EVACUACION DE AGUA POR LLUVIA EN MARTINEZ, SE ENCUENTRAN 2 SUMERGIBLES EVACUANDO LAS AGUAS
- 10:00 AM QUEDA INHABILITADA RETROCARGADORA CASE 86TB POR LLANTA PINCHADA.
- 5:00 PM ES REPARADA RETROCARGADORA CASE 86TB.

x

26 DE ABRIL DE 2022 (MARTES)
- Estado del tiempo: SOLEADO
- Equipos en Obra: MINICARGADOR CASE SR220, RETROCARGADOR CAT 428F, RETROCARGADORA CASE 86TB, VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E
- Personal en Obra: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 4 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA
- Actividades: EVACUACION DE AGUAS ESTANCADAS POR LLUVIA EL DIA DE AYER 25 DE ABRIL EN OBRA 2 SUMERGIBLES EVACUANDO LAS AGUAS.
- SE HACEN TRABAJOS DE GEORREFERENCIACION DEL EJE DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA.
- SE HACEN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA ESTABILIZAR FALLA CON PIEDRA EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ DEL KO+340.

Escaneado con CamScanner

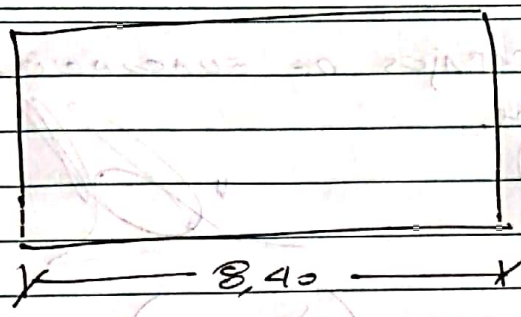

27 DE ABRIL DE 2022 (MIERCOLES)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra: Minicargador CASE SR220, Retrocargador CAT 428F, Motoniveladora CASE 845B, Vibrocompactador CAT CS533E.
- Personal en obra: Auxiliar Social, SISO, 2 paleteros, 4 operadores, 2 topografia, 2 oficios varios.
- Actividades: Visita de obra 8:00 AM por parte de personal del INVIAS Ingeniero: Nestor Eleam Lemos Vilhabiego, se hace recorrido en la via del corregimiento de Martinez, en presencia del director de interventoria Miguel Diaz, por parte del contratista Ingeniero Cesar Hernandez.
- Se hacen trabajos de excavación para estabilizar fallas en la capa de afirmado en la via del corregimiento de Martinez, ubicados en el KO+390 y KO+420.
- Se realiza capa de afirmado con motoniveladora del KO+000 al KO+390, para retirar lodo presente en la capa de afirmado por motivo de lluvias presentes en la zona de la via del corregimiento de Martinez.
- 5:10 PM Se detienen actividades en Martinez por fuerte lluvias.

Escaneado con CamScanner

- Se hacen trabajos de evacuación de aguas estancadas.

x [signature]

[signature] 2

28 de Abril de 2022 (Jueves)

- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra: Minicargador Case SR220, Retrocargador CAT 428F, Motoniveladora 865B Case, Vibrocompactador CAT CS533E.
- Personal en Obra: Auxiliar Social, Siso, 2 paleteros, 2 oficios varios, 4 operadores, 2 topografía.
- Actividades: Se hacen trabajos de evacuación de aguas estancadas por motivo de lluvias la tarde del día de ayer.
- Estabilización con piedra fallo presente en la vía ubicado en el KO+390 vía del corregimiento de Martinez.
- Se hacen trabajos de georeferenciación de la vía en el corregimiento de Martinez por parte de la topografía.
- Se retienen actividades por motivo de lluvias presentes en la zona. Sigue lluvias
- En horas del medio día el contratista repertila nuevamente capa de afirmado entre el KO+000 al KO+310 para retirar ~~el~~ material contaminado y leroso por las lluvias.

x [signature] [signature]


29 de Abril de 2022 (Viernes)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Minicargador Case SR220, Retrocargador CAT 428F, Motoniveladora

Escaneado con CamScanner

CASE 885B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E.
- PERSONAL EN OBRA: AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 4 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: SE HACEN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALLO PRESENTE EN EL K0+420, EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ.

- NUEVAMENTE EL CONTRATISTA HACE TRABAJOS DE CERO EN LA CAPA DE AFIRMADO PARA BUSCAR LOS NIVELES DE DISEÑO DE DICHA CAPA.
- SE HACEN TRABAJOS DE CERO CAPA DE AFIRMADO ENTRE EL K0+000 AL K0+200 EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ.



Escaneado con CamScanner
