
SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	31/01/2022	A	16/08/2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
CONTRATO No.	180-2021	SUPERVISOR PROYECTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MPAL		
CONTRATISTA	CONSORCIO CRT PROGRESA				
INTERVENTOR	CONSORCIO ACI-3B				
ITEM	Excavación en material común de la explanación y canales		UNIDAD	M3	

FECHA aaaa-mm-dd	ABSCISA	AREA	AREA PROMEDIO	LONGITUD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	K2+000	1,23	1,205	10	12,1		12,05
	K2+010	1,16	1,195	10	12,0		24,00
	K2+020	1,12	1,14	10	11,4		35,40
	K2+025	1,12	1,12	5	5,6		41,00
	K2+030	1,17	1,145	5	5,7		46,73
	K2+035	1,28	1,225	5	6,1		52,85
	K2+040	1,37	1,325	5	6,6		59,48
	K2+050	1,44	1,405	10	14,1		73,53
	K2+060	1,35	1,395	10	14,0		87,48
	K2+065	1,27	1,31	5	6,6		94,03
	K2+070	1,23	1,25	5	6,3		100,28
	K2+075	1,22	1,225	5	6,1		106,40
	K2+080	1,2	1,21	5	6,1		112,45
	K2+090	1,19	1,195	10	12,0		124,40
	K2+095	1,15	1,17	5	5,9		130,25
	K2+100	1,2	1,175	5	5,9		136,13
	K2+105	1,25	1,225	5	6,1		142,25
	K2+110	1,19	1,22	5	6,1		148,35
	K2+120	1,3	1,245	10	12,5		160,80
	K2+125	1,26	1,28	5	6,4		167,20
	K2+130	1,17	1,215	5	6,1		173,28
	K2+135	1,14	1,155	5	5,8		179,05
	K2+140	1,13	1,135	5	5,7		184,73
	K2+150	1,15	1,14	10	11,4		196,13
	K2+160	1,34	1,245	10	12,5		208,58
	K2+170	1,43	1,385	10	13,9		222,43
	K2+180	1,67	1,55	10	15,5		237,93
	K2+185	1,88	1,775	5	8,9		246,80
	K2+190	1,66	1,77	5	8,9		255,65
	K2+195	1,21	1,435	5	7,2		262,83
	K2+200	1,16	1,185	5	5,9		268,75
	K2+205	1,17	1,165	5	5,8		274,58
	K2+210	1,15	1,16	5	5,8		280,38
	K2+215	1,25	1,2	5	6,0		286,38
	K2+220	1,29	1,27	5	6,4		292,73
	K2+225	1,32	1,305	5	6,5		299,25
	K2+230	1,38	1,35	5	6,8		306,00

ESQUEMA



	K2+240	1,3	1,34	10	13,4		319,40
	K2+250	1,87	1,585	10	15,9		335,25
	K2+260	2,55	2,21	10	22,1		357,35
	K2+270	2,09	2,32	10	23,2		380,55
	K2+280	1,86	1,975	10	19,8		400,30
	K2+290	2,07	1,965	10	19,7		419,95
	K2+300	2,37	2,22	10	22,2		442,15
	K2+310	2,56	2,465	10	24,7		466,80
	K2+315	1,91	2,235	5	11,2		477,98
	K2+320	1,28	1,595	5	8,0		485,95
	K2+325	1,1	1,19	5	6,0		491,90
	K2+330	1,12	1,11	5	5,6		497,45
	K2+340	1,66	1,39	10	13,9		511,35
	K2+350	2,38	2,02	10	20,2		531,55
	K2+360	2,02	2,2	10	22,0		553,55
	K2+370	1,68	1,85	10	18,5		572,05
	K2+380	1,43	1,555	10	15,6		587,60
	K2+390	1,32	1,375	10	13,8		601,35
	K2+400	1,22	1,27	10	12,7		614,05
	K2+410	1,25	1,235	10	12,4		626,40
	K2+420	1,21	1,23	10	12,3		638,70
	K2+430	1,3	1,255	10	12,6		651,25
	K2+435	1,37	1,335	5	6,7		657,93
	K2+440	1,4	1,385	5	6,9		664,85
	K2+445	1,27	1,335	5	6,7		671,53
	K2+450	1,26	1,265	5	6,3		677,85
	K2+455	1,46	1,36	5	6,8		684,65
	K2+460	1,6	1,53	5	7,7		692,30
	K2+470	1,58	1,59	10	15,9		708,20
	K2+480	1,26	1,42	10	14,2		722,40
	K2+490	1,2	1,23	10	12,3		734,70
	K2+500	1,32	1,26	10	12,6		747,30
	K2+510	1,35	1,335	10	13,4		760,65
	K2+520	1,27	1,31	10	13,1		773,75
	K2+530	1,31	1,29	10	12,9		786,65
	K2+535	1,32	1,315	5	6,6		793,23
	K2+540	1,35	1,335	5	6,7		799,90
	K2+545	1,37	1,36	5	6,8		806,70
	K2+550	1,38	1,375	5	6,9		813,58
	K2+555	1,21	1,295	5	6,5		820,05
	K2+560	1,12	1,165	5	5,8		825,88
	K2+565	1,1	1,11	5	5,6		831,43
	K2+570	1,1	1,1	5	5,5		836,93
	K2+580	1,11	1,105	10	11,1		847,98
	K2+590	1,1	1,105	10	11,1		859,03
	K2+600	1,1	1,1	10	11,0		870,03

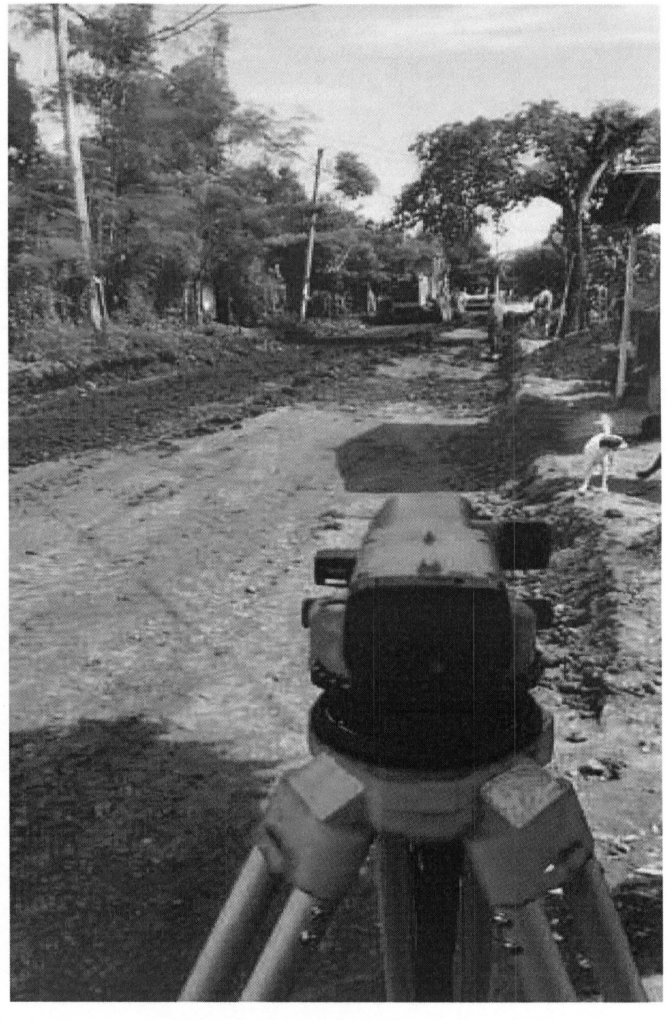

	K2+605	1,1	1,1	5	5,5		875,53
	K2+610	1,1	1,1	5	5,5		881,03
	K2+615	1,1	1,1	5	5,5		886,53
	K2+620	1,1	1,1	5	5,5		892,03
	K2+625	1,1	1,1	5	5,5		897,53
	K2+630	1,11	1,105	5	5,5		903,05
	K2+640	1,17	1,14	10	11,4		914,45
	K2+650	1,29	1,23	10	12,3		926,75
	K2+655	1,35	1,32	5	6,6		933,35
	K2+660	1,37	1,36	5	6,8		940,15
	K2+665	1,51	1,44	5	7,2		947,35
	K2+670	1,62	1,565	5	7,8		955,18
	K2+675	1,71	1,665	5	8,3		963,50
	K2+680	1,83	1,77	5	8,9		972,35
	K2+685	1,91	1,87	5	9,4		981,70
	K2+690	1,98	1,945	5	9,7		991,43
	K2+695	1,95	1,965	5	9,8		1001,25
	K2+700	1,91	1,93	5	9,7		1010,90
	K2+710	1,67	1,79	10	17,9		1028,80
	K2+720	1,32	1,495	10	15,0		1043,75
	K2+730	1,1	1,21	10	12,1		1055,85
	K2+740	1,1	1,1	10	11,0		1066,85
	K2+745	1,1	1,1	5	5,5		1072,35
	K2+750	1,1	1,1	5	5,5		1077,85
	K2+755	1,1	1,1	5	5,5		1083,35
	K2+760	1,1	1,1	5	5,5		1088,85
	K2+770	1,1	1,1	10	11,0		1099,85
	K2+780	1,12	1,11	10	11,1		1110,95
	K2+790	1,29	1,205	10	12,1		1123,00
	K2+800	1,46	1,375	10	13,8		1136,75
	K2+805	1,42	1,44	5	7,2		1143,95
	K2+810	1,27	1,345	5	6,7		1150,68
	K2+815	1,36	1,315	5	6,6		1157,25
	K2+820	1,24	1,3	5	6,5		1163,75
	K2+825	1,19	1,215	5	6,1		1169,83
	K2+830	1,14	1,165	5	5,8		1175,65
	K2+840	1,42	1,28	10	12,8		1188,45
	K2+850	1,68	1,55	10	15,5		1203,95
	K2+860	1,28	1,48	10	14,8		1218,75
	K2+870	1,1	1,19	10	11,9		1230,65
	K2+875	1,1	1,1	5	5,5		1236,15
	K2+880	1,1	1,1	5	5,5		1241,65
	K2+885	1,1	1,1	5	5,5		1247,15
	K2+890	1,1	1,1	5	5,5		1252,65
	K2+900	1,1	1,1	10	11,0		1263,65
	K2+910	1,1	1,1	10	11,0		1274,65

	K2+915	1,1	1,1	5	5,5		1280,15
	K2+920	1,14	1,12	5	5,6		1285,75
	K2+925	1,21	1,175	5	5,9		1291,63
	K2+930	1,73	1,47	5	7,4		1298,98
	K2+935	1,61	1,67	5	8,4		1307,33
	K2+940	1,53	1,57	5	7,9		1315,18
	K2+945	1,31	1,42	5	7,1		1322,28
	K2+950	1,54	1,425	5	7,1		1329,40
	K2+955	1,36	1,45	5	7,3		1336,65
	K2+960	1,39	1,375	5	6,9		1343,53
	K2+970	1,49	1,44	10	14,4		1357,93
	K2+980	1,74	1,615	10	16,2		1374,08
	K2+990	1,8	1,77	10	17,7		1391,78
	K2+995	1,81	1,805	5	9,0		1400,80
	K3+000	1,99	1,9	5	9,5		1410,30
	K3+005	2,22	2,105	5	10,5		1420,83
	K3+010	2,12	2,17	5	10,9		1431,68
	K3+015	2,57	2,345	5	11,7		1443,40
	K3+020	2,41	2,49	5	12,5		1455,85
	K3+023	2,69	2,55	2,52	6,4		1462,28
						M3	1462,28

Elaboró
EL CONTRATISTA:

210,89

Firma:
Nombre:
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA
