CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 5 de abril de 2023

Ingeniero
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
R/L
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com

Asunto: Observación Plan de trabajo final M-Q-CH

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su contrato de obra: construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

El pasado viernes 31 de marzo de 2023, en instalaciones de la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Cereté, se realizó comité de obra para verificar el estado en el cual se encuentra el proyecto. Esta reunión contó con la presencia del director de interventoría, representante del contratista, secretaria de infraestructura y apoyo de la supervisión.


Para dar cumplimiento en los tiempos contractuales de terminación del contrato, el contratista se comprometió con los siguientes puntos:

1. Plan de trabajo de actividades faltantes en el Quemado y Martínez. Fecha de entrega 31 de marzo de 2023.
2. Balance final del contrato, con sus respectivos soportes. Fecha de entrega 3 de abril de 2023.

Cabe resaltar que en la plataforma de esta interventoría fue radicado oficio OFIC-CRT-166, el cual describe plan de trabajo de actividades faltantes en el Quemado y Martínez.

Este documento describe las actividades del frente del Quemado (celda color gris), frente Martínez (celda color amarillo) y nuevamente frente Martínez (celda color verde). Se supondría que las actividades en la celda de color verde deberían ser las actividades faltantes del tramo Chuchurubi, y si ese es el caso se deben incluir las actividades de relleno de espaldares las cuales en este tramo no han sido terminadas en su totalidad.

CONSORCIO ACI-3B

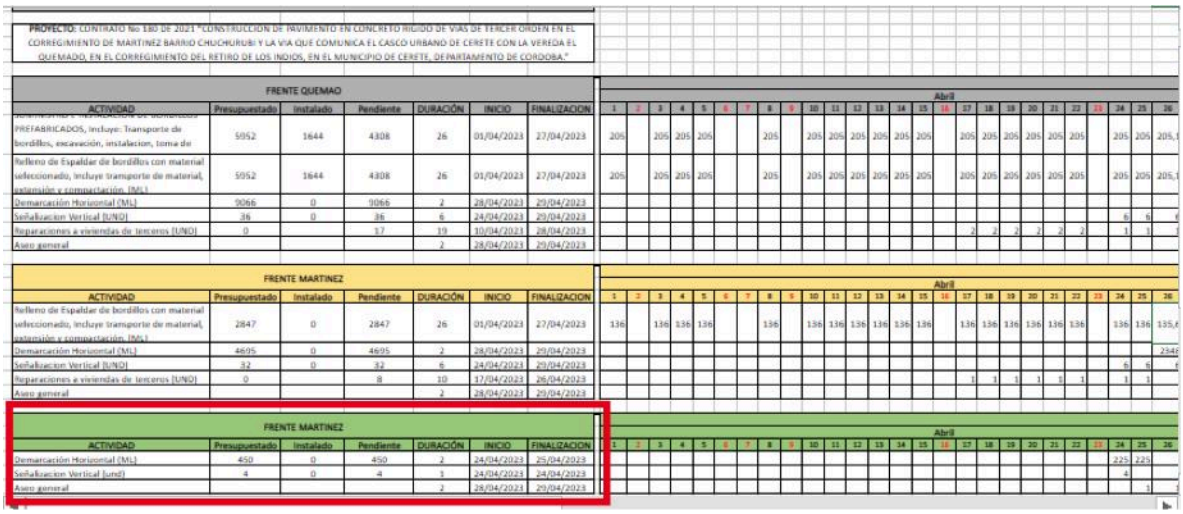

PROYECTO: CONTRATO No 180 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."

FRENTE QUEMAO

ACTIVIDAD	Presupuestado	Instalado	Pendiente	DURACIÓN	INICIO	FINALIZACION
PREFABRICADOS, Incluye: Transporte de bordillos, excavación, instalacion, toma de	5952	1644	4308	26	01/04/2023	27/04/2023
Relleno de Espaldar de bordillos con material seleccionado, incluye transporte de material, extensión y compactación. (ML)	5952	1644	4308	26	01/04/2023	27/04/2023
Demarcación Horizontal (ML)	9066	0	9066	2	28/04/2023	29/04/2023
Señalizacion Vertical (UND)	36	0	36	6	24/04/2023	29/04/2023
Reparaciones a viviendas de terceros (UND)	0		17	19	10/04/2023	28/04/2023
Aseo general				2	28/04/2023	29/04/2023

FRENTE MARTINEZ

ACTIVIDAD	Presupuestado	Instalado	Pendiente	DURACIÓN	INICIO	FINALIZACION
Relleno de Espaldar de bordillos con material seleccionado, incluye transporte de material, extensión y compactación. (ML)	2847	0	2847	26	01/04/2023	27/04/2023
Demarcación Horizontal (ML)	4695	0	4695	2	28/04/2023	29/04/2023
Señalizacion Vertical (UND)	32	0	32	6	24/04/2023	29/04/2023
Reparaciones a viviendas de terceros (UND)	0		8	10	17/04/2023	26/04/2023
Aseo general				2	28/04/2023	29/04/2023

FRENTE MARTINEZ

ACTIVIDAD	Presupuestado	Instalado	Pendiente	DURACIÓN	INICIO	FINALIZACION
Demarcación Horizontal (ML)	450	0	450	2	24/04/2023	25/04/2023
Señalizacion Vertical (und)	4	0	4	1	24/04/2023	24/04/2023
Aseo general				2	28/04/2023	29/04/2023

Esta interventoría solicita hacer las respectiva aclaración o en su defecto hacer las correcciones pertinentes en el archivo, para poder hacer el correcto seguimiento. Esta información debe ser entregada en un plazo no mayor a un (1) día del radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
5/04/2023 9:05:21 a. m.
