CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: placas agrietadas

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.


De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramos Martínez**


El pasado 1 de noviembre del presente año, de ejecuto la actividad fundida de concreto hidraulico MR 38, entre el tramo K0+840 al K1+035. Se alcanzaron a fundir 65.10ml de concreto los dos (2) carriles, el cual dio inicio de actividades a las 2:00pm. Por falta de no emplear a tiempo el antisol y las brisas en la zona, se generaron grietas en el pavimento, un aproximado de 20 losas.


Anexo registro fotografico:





CONSORCIO ACI-3B

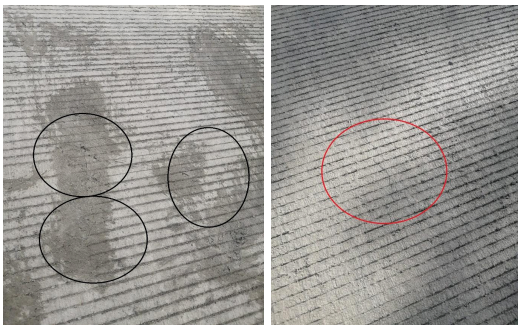

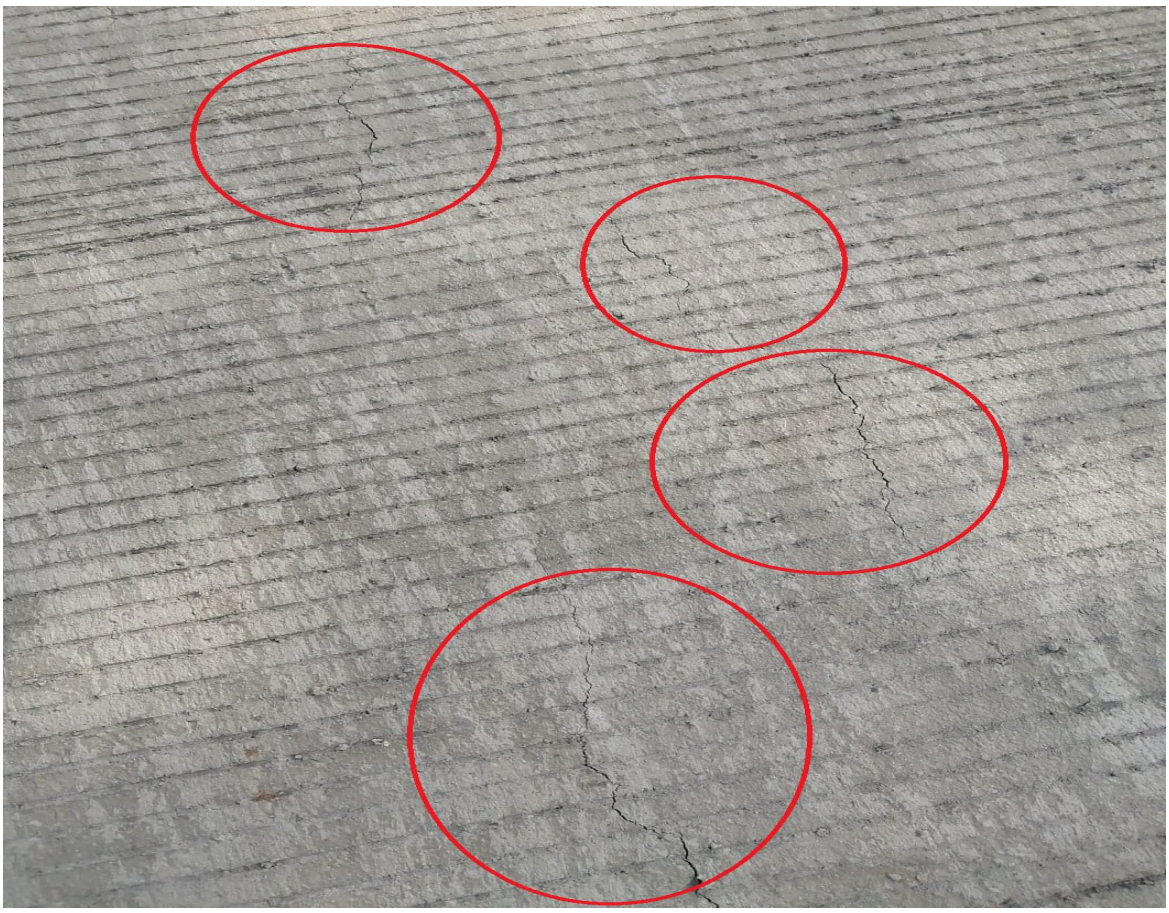

Se solicita presentar una propuesta tecnica y solucionar lo mas antes posible estas fisuras presentes en el pavimento entre el K0+840 al K1+035. Un plazo no mayor a cinco (5) dias del radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

CONSORCIO ACI-3B

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
4/11/2022 2:56:01 p. m.
