* Sabado 1 de Abril de 2023.

Frente chuchurubí y 20 de julio
Este frente continuan sin realizar ningun tipo de actividad. Se le Solicita al contratista celeridad e inicio en estos frentes. Para mitiger el atraso que llevan en obra.

Frente Media Tapa

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica, 1 Raso, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 nivel, 1 estación y Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se realizo retiro de Material proveniente de la Excavación.
El Vibro Compactador y Motoniveladora se encuentran varados.

* Domingo 2 de Abril de 2023.

No se realizo ninguna Actividad

* Lunes 3 de Abril de 2023.

Frente Chuchurubi y 20 de julio.
Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad, Se le Solicita al Contratista inicio y Celeridad en las actividades de estos frentes.

+ Maula Gil

Frente Media tapa:

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 ing Residente, 3 oficios Varios, 1 operador Motoniveladora, 1 Comision topografica, 1 Siso, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 nivel, 1 estación y Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con el Suministro e instalación de Sub base, humectación y Compactación entre absc Km 290 a la Km 190.
- Se Continuo Con la excavación Mecanica entre absc Km 120 a la Km 080.
- Se Continuo con el retiro de material proveniente de la excavación.

+ Maula Gil

* Martes 4 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.
Se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad en estos frentes de obra, Se Solicita inicio y Celeridad.

+ Maula Gil

Powered by CamScanner

Frente Medio Tapa.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 3 oficios Varios, 6 Ayud
1 maestro, 1 oper Motoniveladora, 1 Cuadrill
topografica, 1 Siso, 1 oper Bobcat, 1 oper
Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibro Compactador, 1 Bobcat
1 nivel, 1 estacion y Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo liberacion por topografia a Sub base granular y niveles por interventoria entre absc Km+290 a la Km+200.
- Tambien se realizo liberacion por topografia a excavacion mecanica por interventoria entre absc Km+120 a la Km+090.
- Se realizo toma de densidades por el Contratista en los Sgtes obscisas Km+250 el cual dio el 95,1% Cumpliendo y en la Km+200 el cual dio 95.4% Cumpliendo.
- Se Continuo con el Suministro e instalacion de material afirmado en primera y Segunda Capa a 0,45m entre las abscisas Km+160 a la Km+120.
- Se realizo fundida de pavimento Hidraulico entre las abscisas Km+240 a la Km+250.
- Se tomaron 2 vigas para Verificacion de la resistencia por Parte de la interventoria.

+. Paula Ortiz

* Miercoles 5 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.
Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista Tecnico y Calidad en estos frentes.

+. Paula Ortiz

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing. Residente, 3 Oficios Varios, 3 ayudantes, 1 Oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica, 1 Piso, 1 Oper Bobcat, 1 Oper Vibro Compact.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 estación y Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con el Suministro e instalación de material afirmado entre Absc Km 1+160 a la Km 0+90 en Primera Capa de 0,25m.
- Tambien se realizaron Cortes de juntas de pavimento entre absc Km 0+290 a la Km 0+250.

Fernando Quezada + Paula Gallardo

* Del jueves 6 al 9 de Abril de 2023.

No se realizo ningun tipo de actividad en ninguno de los frentes. esto debido a la Semana Mayor! (Vacaciones).

Fernando Quezada + Paula Gallardo

* Lunes 10 de Abril de 2023.

Frente Chochoubi y 20 de Julio.

Estos frentes Continuan sin realizar ningun tipo de actividad, se Solicita al Contratista inicio y celeridad en estos frentes, para mitigar el atraso que llevan a la fecha segun Inf Semanal #37 es del 1-20,24%.

Fernando Quezada + Paula Gallardo

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 3 oficios Varios, 6 ayudantes, 1 maestro, 1 oper motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 Comision topografica, 1 SISO, 1 oper Vibro Comp

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 estacon, y Herramientas Menores.

Actividades: Se Continuo Con la excavación Mecanica entre absc Ko+090 a la Ko+000.
- Se realizo Suministro e instalación de Material afirmado entre absc Ko+150 a la Kot 090 en Segunda Capa a 0,45m y su debida conformación
- Se realizo humectación de material afirmado entre absc Kot150 a la Kot090.
- Se realizo chequeo de niveles a retiro por topografia de la interventoria entre abs Kot250 a la Kot200.
- Se realizo toma de densidades en afirmado por Parte del Contratista en la abs Kot140 la Cual dio 86% no Cumplio. Se le recomendo humedecer y volver a darle Vibro esto Por Parte de la Interventoria.
- Se Realizo fundida de Pavimento hidraulico entre absc Kot250 a la Kot200.
- Se tomaron 12 vigas Para Verificar la resistencia del Concreto.

* Martes 11 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes siguen Sin realizar ningun tipo de Actividad.

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 3 oficios Varios, 3 ayudantes, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision topografica, 1 SISO, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 estación, y herramientas Menores.

Actividades: Se realizaron Cortes de juntas en Pavimento entre absc Ko+250 a la Ko+200.

- Se realizo liberación en afirmado Por topografica entre las abcisas Ko+160 a la Ko+100 por interventoria.
- Se realizo toma de densidad en afirmado Por Parte de la Interventoria en la absc ko+140 lado Izquierdo el Cual dio 95% Cumplio.
- Se realizo Suministro e instalación de Sub base granular entre absc ko+ a la ko+ uno Se extendiero.

+ Paula

* Miercoles 12 de Abril de 2023.

Frente Chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le solicita al Contratista iniciar y dar celeridad a estos frentes.

+ Paula

Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing. Residente, 2 oficios Varios,

Powered by CamScanner

1 operador Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 Siso, 1 comision topografica,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 estación y Herramental Menores.

Actividades: Se Continuo con la excavacion Mecanica entre abscisas Ko+090 a la Ko+000.

- Se realizo Cargo de Sub base entre absc Ko+200 a la Ko+100.
- El vibro Compactador Se encuentra dañado.

+ Manuela Gil

*Jueves 13 de Abril de 2023

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le Solicita al contratista iniciar actividades,

+ Manuela Gil

Frente Media Tapa

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 8 ayudantes

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 Estación, y Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se Continuo Con la Excavación mecanica entre absc. Ko+090 a la Ko+000.

- Se realizo liberación por topografia de interventoria.

en excavación entre absc. Ko+090 a la Ko+030 y

Powered by CamScanner

- Se realizo arrega del Vibro Compactador ya quedo operativo.
- Se realizo humectacion y vibrado a capa final de Sub Base granular entre absc. Ko+200 a la Ko+100.
- Se realizo liberacion por Sub base y rieles a topografia de la Interventoria entre absc Ko+200 a la Ko+110.
- Se realizaron toma de densidades en capa de Sub base granular en los absc. Ko+160 Centro la Cual dio 99% Cumplio y en la abscisa Ko+120 LI. la Cual dio 98% Cumplio.
- Se realizo fundida de Pavimento en Concreto hidraulico entre abscisas Ko+200 a la Ko+150.
- Se realizo Suministro e instalación de Metrial afirmado en primera Capa entre absc. Ko+090 a la Ko+050. no se

T. Maria Cruz

* Viernes 14 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio

Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos frentes debido a que el atraso que llevan a la fecha es del -23,88% a inf semanal #38.

T. Maria Cruz

Frente Media Tapa

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 3 Oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 comision topografica, 1 siso, 8 ayudantes Pav.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 estacion y Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El dia de hoy se continuo con la fundida de pavimento en Concreto hidraulico MR-38 entre obsc Ko+150 a la Ko+110.
- Se tomaron 2 vigas para resistencia del Material.
- Se realizaron cortes de juntas en Pavimento entre abs Ko+200 a la Ko+150.
- Se continuo con el Suministro e instalacion de Platino afinado. entre obsc Ko+090 a la Ko+030. en primera capa., se compacto.
- Se continuo con la Excavacion Mecanica entre obsc Ko+050 a la Ko+030.

+. Manuel Ortiz

* Sabado 15 de Abril de 2023.

Frente churchurubi y 20 de julio.
Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad, se solicita al Contratista iniciar en estos tramos debido a que el atraso que llevan a la fecha de informe # 38 es del -23,88%. se le pide celeridad en las actividades.

+. Manuel Ortiz

Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 3 oficios Varios, 2 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 Piloto, 1 Comision topografia,
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Retro excavadora, 1 vibro Compactador, 1 nivel, 1 estacion y Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El dia de hoy se continuo con el suministro e instalacion de material afirmado en Segunda Capa entre absc Ko+090 a la Ko+030.

- Se Continuo Con la excavacion mecanica entre abs Ko+030 a la Ko+000.
- Se libero por interventoria topografica en excavacion mecanica entre absc Ko+030 a la Ko+010.
- Llego a obra Pato excavadora, en las horas de la mañana,
- Se realizaron Cortes de juntas a paramento entre abs Ko+150 a Ko+140.
- Se realizo Suministro y extendida de material afirmado en primera Capa entre absc Ko+030 a la Ko+010.

* Domingo 16 de Abril de 2023..

No se realizo ninguna actividad.

* Lunes 17 de Abril de 2023

Frente Chuchurubi y 20 de Julio

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad.

Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado,
Personal en obra: 1 Ing Residente, Bayudantes Varios,

1 oper Motoniveladora, 1oper Vibro Compactador, 1oper Bobcat,
1 Comision Topografica, 1 Piso

Actividades: El dia de hoy se realizo suministro e instl.
de Sub base granular entre abse Kot100 a la Ko+040.
del Cual quedo Compactada y no se recibio por interventoria
- Se realizo liberacion por topografia en material
afirmado entre abscisas Ko+100 a la Ko+030 por
interventoria.
- Se realizaron toma de densidades por parte del
Contratista en capa final afirmado en las abscisas
Ko+080 la Cual dio 91,2% Cumplendo y en
la absc Ko+040 la Cual dio 91,5% Cumplio.
- Se realizo liberacion por topografia de la interventoria
en excavacion mecanica entre absc Ko+010 a la Ko+000.

+. Maria Ozla

Frente Martinez Trama T5.

El dia de hoy Se dio inicio con la excavacion
Mecanica Con retro excavadora entre abse Kot 261 a la
Kot 231.
este actividad Se realizo Con una retro excavadora y
1 Volquete Votando el Material producto de la excavacion.

+. Maria Ozla

* Martes 18 de Abril de 2023

Frente chuchunbi y 20 de julio.

Estos frentes Continuan sin realizar ningun
tipo de actividad.

+. Maria Ozla

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 3 Oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 comision Topografica, 15Pso. 8 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 nivel, 1 estación y Herramientas Menores.

Actividades: Se Continuo Con el Suministro e instalación entpatrol afirmado entre obsc Ko+010 a la Ko+000.

- Se realizo liberación por topografia de interventoria entre absc Ko+100 a la Ko+040 en Material Sub base granular.
- Se realizo liberación por topografia de interventoria en niveles entre absc Ko+110 a la Ko+040.
- Se realizo fundida de pavimento en Concreto Hidraulico entre obsc Ko+110 a la Ko+080.
- Se Continuo Con excavacion Mecanica entre obs Ko+030 a la Ko+00.
- Se realizo ntt de niveles entre obs Ko+100 a la Ko+040.

Frente Martinez Tramo 15.

Personal en Obra: 1 oper Retro excavadora, 1 oper Volqueta, 1 Comision topografica.

Equipos: 1 Retro excavadora, 1 Volqueta.

Actividad: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica. entre obs Ko+261 a la Ko+281 pero esta actividad fue Suspendida por el Siso de la interventoria debido a que el operador no estaba afiliado.

* Miercoles 19 de Abril de 2023.

Frente chuchurbi y 20 de Julio.
Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad.

+. Manuela Ch.

Frente Media Tapa.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Oper Vibro Compactador, 1 Fwo, 3 oficiales varios, 2 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 nivel, 1 estación y Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo demolicion excavacion de 2 placas del Pavimento existente esto debido a que las placas se partieron cuando se estaba haciendo la excavacion para llegar al Kotaxo, Por lo tanto toca demoler, estas no tenian ninguna clase de refuerzo, y tambien Por los niveles Para evacuar los aguas lluvias.
- Se realizo liberacion Por topografia por Parte de la Interventoria a excavacion mecanica entre la abs Ko+000 - Ko+007. de las 2placas. que se Partieron.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en Primera Segunda Capa entre abs Ko+000 a la Ko+006. No se libero por topografia aun.
- Se realizaron Cortes de juntas en pavimento entre absc Ko+110 a la Ko+090.

+. Manuela Ch.


Powered by CamScanner

Frente Martinez Tramo T5

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: 1oper Retroexcavadora, 1ofica Varios, 1oper volqueta, 1Comision Topografia.


Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta doble.

Actividades: El dia de hoy se volvio a retomar la actividad de excavacion mecanica entre el abs K0+231 a la K0+211, ya el Contratista presento afiliacion a la interventoria.

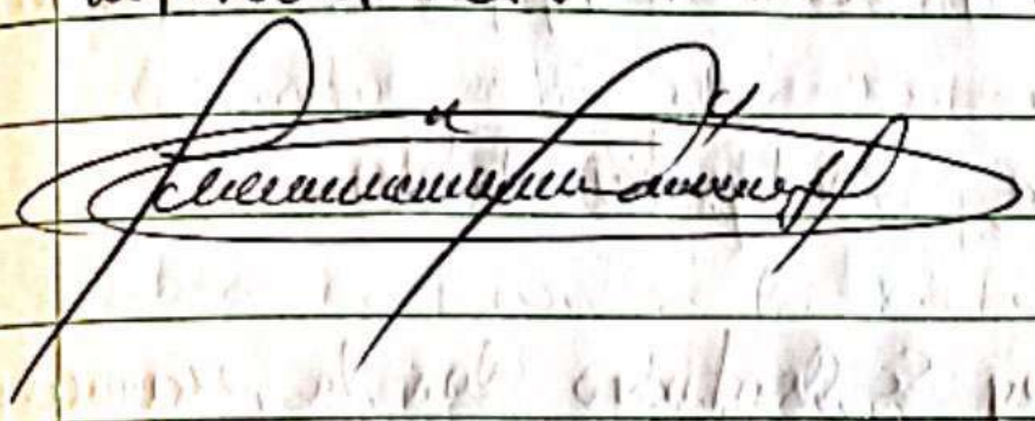

* Jueves 20 de Abril de 2023.

Frente Chuchurubi Y 20 de Julio.
Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad.



Frente Media Tapa.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1ing Residente, 2 ofiaos Varios, 8 ayudantes, 1oper Motoniveladora, 1oper Vibro Compactador, 1oper Bobcat, 1 Siso, 1 Comision topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 nivel, 1 estacion y Herramientas Menores.

Actividades: Se realizo Suministro e instalacion de Sub base granular y su respectivo Serco y Compactacion entre absc K0+00 a Cr K-0+007. punto donde se Demolieron los Placas.

Powered by CamScanner

- Se realizo liberación por topografía de interventoría a Material Sub base granular entre absc K0+040 a la K0+000.
- Se realizo instalación de rieles entre absc K0+040 a la K0+000.
- No se recibio por topografía de interventoría.
- Se realizaron actividades por el Contratista en absc K0+020 del 100,7%.

+ Maria Ospina

Frente Martinez Tramo T5.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 oper Retroexcavadora, 2 ope Volquetas, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica, 1 ofical Varios

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 volquetas dobles.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica y Perfilacion entre abs K0+211 a la K0+180.
- Se realizo liberacion por topografia de interventoria en excavacion entre absc K0+261,1 a la K0+190.

+ Maria Ospina

* Viernes 21 de Abril de 2023

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estas frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad.

+ Maria Ospina

Frente Media Tapia.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 oper Motoniveladora 1 Sisa, 1 oficios Varios, 6 ayudantes. 1 comision topografica. 1 sisa.

Equipos: 1 Nivel, 1 Estación y Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo liberación a niles por topografía de Interventoría entre absc K0+040 a la K-0+007.
- Se Continuo y finalizo con la fundido de Pavimento hidraulico entre absc K0+090 a la K0+007. empalmando con el pavimento existente.

Firma

Frente Martinez - Tramo T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1oper Motoniveladora, 1oper Retroexcavadora, 1oper Bobcat, 1oper Vibro Compactador, 1sso. 2ofras Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 2 Volquetas dobles.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Manual entre absc K0+180 - K0+150.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en primera capa entre absc K0+261.1 a la K0+190.

Firma

* Sabado 22 de Abril de 2023.

Frente Chuchurubi y Zoi de julio.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad. Se le Solicita al Contratista iniciar las labores Para asi mitigar el atraso que representan a la fecha que es del 27 %.

Firma

Frente Media Tapa.

Estado del Tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 3 ayudantes, 2 oficios Varios.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo Corte de juntas a pavimento entre abscisa Ko+090 a la Ko+007. este tramo en lo que concierne a losa de pavimentación queda terminado, falta instalacion de bordillos Prefabricados Sello de juntas, y actividades de construccion de Cunetas.

Frente Martinez T5.

Estado del Tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Retro excavadora, 1 fiso, 1 Comision topografica, 1 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 nivel, 1 Estación y Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo Con la excavacion Mecanica entre absc Kot150 a la Ko+120.
Se Continuo Con el Suministro de Material afirmado entre absc Kot261 a la Kot190. en primera Capa, y Su debida Compactación

* Domingo 23 de Abril de 2023.

No se realizo ninguna actividad.

+ Paula

* Lunes 24 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de Actividad,

+ Paula

Frente Media tapa.

En este frente no se realizo ningun tipo de actividad debido a que el Contratista fundido lo que el pavimento contiene, le faltan bordillos; sellado de juntas, cuneta y desbot.

+ Paula

Frente Martinez T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado, en la noche anterior se presentaron lluvias.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 3 oficios Varios, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision topografica.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Hidrobomba, 1 Vibro Compact, 1 nivel, 1 Estacion, 2 Bobcat, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El día de hoy el Contratista realizo Riego de agua con motobomba, producto de la lluvia del dia domingo por la noche, afectando los avances del Proyecto.
- Se realizo Compactacion a capa de afinado entre obsc Km+261 a la Km+210.

* Martes 25 de Abril de 2023.

Frente chuchunbi y 25 de julio.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad.

Frente Media Tapa.

Se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad. debido a que el Contratista termino en lo que Concierne a Pavimento, falta bordillos, cunetas y Sellado de juntas y drenes.

Frente Martinez T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Comision topografica, 3 oficiales varios, 1 oper Retro excavadora, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 fiso, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Retro excavadora, 1 Nivel, 1 Estación, Herramienta Menor

Actividades: El día de hoy se realizo Suministro e inst. de Material afirmado en Segunda Capa entre absc Ko+261 a la Ko+180. en Segunda Capa y se Compacto.

- Se realizo liberación en excavacion por topografia de interventoria entre absc Ko+190 a la Ko+130.
- Se Continuo con la Excavacion mecanica entre absc Ko+130. a la Ko+100.

+ Manuela Gil

* Miercoles 26 de Abril de 2023.

Frente Chuchorubi y 20 de Julio.

Estos frentes Continuan sin realizar ningun tipo de actividad.

+ Manuela Gil

Frente Medio Topa.

No se realizo ningun tipo de actividad en este frente.

+ Manuela Gil

Frente Martinez T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Boso, 1 Comision topografica, 1 Oper Motoniveladora, 1 oper Retro excavdora, 1 oper vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 3 Oficios Varios,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Retro excavdora, 1 Nivel, 1 estacion, Herramientas Menor.

Powered by CamScanner

Actividades: El día de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre abscisas Ko+100 a la Ko+050.
- Se realizo suministro e instalacion de Material afirmado en prime capa entre absc Ko+180 a la Ko+140.
- Se realizo liberación por topografia de interventoria en Capa afirmado entre absc Ko+201 a la Ko+200.
- Se realizaron densidades por el Contratista en Capa afirmado en las absc. Ko+240 la Cual dio 92.6% Cumpliendo: y en la absc Ko+210 le Cual dio 98% Cumpliendo
- Tambien se realizaron toma de densidades por la interventoria entre absc Ko+240 la Cual dio 99% Cumpliendo y en la absc Ko+260 la Cual dio 96% Cumpliendo, y liberando para Suministro de Material sub base.

+ Maria Ortiz

* Jueves 27 de Abril de 2023.

Frente Chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes Continuan sin realizar ninguna tipo de actividad.

+ Maria Ortiz

Frente Media Tapa.

Se Continua sin realizar ninguna tipo de actividad, falta por ejecutar bordillos, cunetas, descoles y sellado de juntas a pavimento.

+ Maria Ortiz

Powered by CamScanner

Frente Martinez 115

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 3 oficios Varios, 1 oper Retroexcavadora, 1 Comision Topografica,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, 1 Retro-excavadora, Herramientas Menors.

Actividades: El dia de hoy se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base granular, y Su debida Compactacion entre absc Ko+261 a la Ko+190.

- Se continuo con la excavacion Mecanica entre absc Ko+100 a la Ko+030.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en Segunda Capa entre absc Ko+180. a la Ko+140.
- Se realizo liberacion por topografia de la interventoria a Capa de afirmado entre absc Ko+200 a la Ko+170.
- Se realizo liberacion por topografia de interventoria en Sub base granular entre absc Ko+261,1 a la Ko+190.
- Se realizo liberacion por topografia de interventoria en excavación Mecanica entre absc Ko+130 a la Ko+060.

+ Paula Ortiz

Frente Frente de Lucha.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 6 ayudantes

Equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se reiniciaron las actividades en el box Cadvert. de absc Ko+010. en la Noche. Se fundio Concreto ciclopeo

+ Paula Ortiz

Powered by CamScanner

* Viernes 28 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad. Se le pide al Contratista reforme actividades debido a que el avance de atraso cada dia aumenta mas hasta la fecha el atraso es de -31,21 %. a corte del informe Semanal #40.

+ Manuela Ozlo

Frente Media Tapa.

Se continua sin realizar ningun tipo de actividad, falta por ejecutar bordillos, cunetas descoles y sellado de juntos.

+ Manuela Ozlo

Frente Martinez Tramo T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado., lluvias en la tarde 2

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 3 oficios Varios, 6 ayudantes, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Retro excavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Retro excavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: Se realizo liberacion por topografia de interventoria a niveles entre absc Km+261,1 a la Km+190.

Powered by CamScanner

- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en primera Capa entre abs Ko+140 a la Ko+
- Se realizo instalación de rieles entre abscl Ko+201,1 a la Ko+190.
- Se realizo liberacion de vias por topografia de la interventoria entre absc Ko+201 a la Ko+190.
- Se Continuo excavacion Mecanica entre absc Ko+100 a la Ko+020.
- Se presentaron lluvias por la tarde de 2 a 4 pm por lo que se suspendio la fundida de Concreto.

+ Paula Gil

Frente Tramo La Lucha.

El dia de hoy no se realizo ninguna actividad en obra.

+ Paula Gil

* Sabado 29 de Abril de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad.

+ Paula Gil

Frente Medio Tapao.

Se Continua sin realizar ningun tipo de actividad.

+ Paula Gil

Powered by CamScanner

Frente Martinez tramo T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 3 oficios Varios, 6 ayudantes, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 Comision topografica, 1 Vibro Compactador, 1 oper Retroexcavadora,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 estacion, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista realizo actividades de Lavado de agua con Motobomba de las Muros del dia de ayer.

- Se realizo chequeo por topografia de interventoria a redes entre abs Km+211 a la Km+190.
- Se realizo fundida de Pavimento hidraulico entre abscisa Km+190 a la Km+ . .
- Se tomaron 2 Muestras para Resistencia.

+ Maria Ospina

Frente Tramo La Lucha.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 3 ayudantes.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte, figuracion y armada de acero de Losa de fondo y Cuerpo del Box de absc Km+010.

+ Maria Ospina

Powered by CamScanner

* Domingo 30 de Abril de 2023.

No se Realizo Ninguna Actividad.

+ . Maula Gil

* Domingo 30 de Abril de 2023.

No se Realizo Ninguna Actividad.

+. Maula Gil

* Lunes 1 de Mayo de 2023.

No se realizo Ninguna Actividad dia festivo.

+. Maula Gil

* Martes 2 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estos frentes Continuan sin realizar ningun tipo de actividad.

+. Maula Gil

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado sin realizar ningun tipo de actividad.

+. Maula Gil

Frente Martinez. tramo T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 ing Residente, 1 Piso, 3 ofcios Varios,
1 oper Motoniveladora, 1 oper Retroexcavadora,
1 Bobcat, 1 Vibro Comp, 1 Cuadrilla topografica.

Powered by CamScanner

Equipos: 1 Motomveledora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Motobomba, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista realizo actividades de evacuacion de aguas de la via con motobomba, esto producto del fuerte aguacero del dia domingo.

+ Maria Gil

Frente Tramo la Lucha

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 3 Ayudante, 1 Maestro.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con el armado de acero de refuerzo del Cuerpo del box-Coulvert de la absc Km 0+010. en el sector la lucha. y ~~Se fundio~~

+ Maria Gil.

* Miercoles 3 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.
En estos frentes se Continua sin realizar ningun tipo de actividad, en el Comite # de fecha se dejo el compromiso de reiniciar las actividades el dia 2 de mayo en el tramo 20 de julio el cual no se inicio, incumpliendo el Contratista el compromiso, esta interventoria le pide celeridad e inicio urgente en este tramo 20 de julio.

+ Maria Gil

Powered by CamScanner

Frente Media Taper.

Este frente Continua abandonado Sin realizar ningn tipo de actividad.

Frente Martinez Tramos T5 y T4.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Diso, 1 oper Retroexcavadora, 1 Oper Motoniveladora, 1 opr Bobcat, 1 Comision Topografica, 3 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se dio inicio al tramo T4 el cual Se realizo excavacion Mecanica entre absc Ko+075,19 a la Ko+040.
- Se realizo liberación por topografia de la interventoria a excavacion Mecanica entre absc Ko+075,19 a la Ko+040.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en Primer y Segunda capa entre absc Ko+075,19 a la Ko+040.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en frente T5 Martinez en primer Capa entre abs Ko+030 a la Ko+040. en afirmado.

Frente Tramo la Lucha.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 3 ayudantes, 1 Maestro

Equipos: Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: Se continuo con el armne de acero de Cuerpo de Box - Cabezal de obra Kot 010, Sector la lucha.

+ Maria Cruz

* Jueves 4 de Mayo de 2023.

Frente Chuchunsi y 20 de Julio.

Estos frentes continuan abandonados sin realizar ningun tipo de actividades.

Se le pide celeridad al Contratista en el inicio de estos tramos.

+ Maria Cruz

Frente Media Tapa.

Este frente continua abandonado no se ha realizado ningun tipo de actividad de los cuales estan pendientes por realizar Cuyo son: Sellado de juntas, construccion de Canal para evacuacion de aguas lluvias, descoles e instalacion de bordillos prefabricados.

Se le pide celeridad al Contratista e inicie de manera Urgente estas actividades.

+ Maria Cruz

Frentes Martinez Tramos T5 y T4.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Cuadrilla Topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Retroexcavadora, 3 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: Se Continuo Con la Excavacion Mecanica en el tramo T4 de Martinet entre absc Ko+040 a la Ko+010.
- Se realizo liberación por topografia de interventoria en excavación mecanica en tramo T4 entre absc. Ko+040 a la Ko+010.
- Se Continuo Con el Suministro e instalacion de Material afirmado en Ee Primera y Segunda Capa entre absc Ko+040 a la Ko+010.
- Se Continuo Con Suministro e instalacion de Material afirmado en Primer Capa en tramo T5 entre absc Ko+030 a la Ko+040.

+ Maula Ozla

Frente Tramo la Lucha

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Maestro, 3 ayudantes.

Equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se Continuo Con el armada de acero del cuerpo, Aletas, Sobre y Viga Zuntellon en el box de absc Ko+010 tramo la Lucha.
- Se realizo chequeo de Pendiente de Box Por topografia interventoria.

+ Maula Ozla

* Viernes 5 de Mayo de 2023

Frente Chuchurubi y 20 de Julio.

Estos frentes Continuan abandonados Sin realizar ninguna tipo de actividad

Se le pide ranchas urgente al Contratista en estos tramos Para asi mitigar el atraso que llevan al dia de hoy que es del -33,7# %

+ Maula Ozla

Powered by CamScanner

Frente Media tapa.

Este frente Continua abandonado, se le Solicita al Contratista iniciar de manera urgente Con el Sellado de juntos ya que tienen todo el pavimento fundido, y tambien debido a que se esten Presentando lluvias para evitar penetracion de agua a las losas, tambien inicie Con la inst de Sardineles, construccion de Cunetas y descoles.

+ Maria Cely

Frentes Mortiñez T4 y T5.

Estado del Tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Sisa, 3 Oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Mini Cargador, 1 Comision topografia.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion Mecanica en tramo T4 entre absc K0+010 a le K0+000.

- Se realizo liberacion por topografia de interventoria a excavacion Mecanica entre absc K0+010 a la K0+000.
- Se Continuo Con el Suministro e instalacion de material afirmado en primera y Segunda Capa entre abs K0+010 a la K0+000
- Se realizo Perfilacion y Sireo a Material afirmado entre abs K0+075,19 a la K0+000.
- Se realizo liberacion por topografia de interventoria a Capa de Material afirmado entre absc K0+075,19 a la K0+010.
- Se realizaron toma de densidades por Parte del Contratista en los Siguientes absc K0+020 la Cual dio 92.7% Cumpliendo y en la absc K0+060 la Cual dio 90,5% Cumpliendo.
- Se realizo Suministro e inst. de Material Sub base entre absc K0+075,19 a la K0+000, esta no se ejecutaron

Powered by CamScanner

debido a que la Motoniveladora Presento fallas Mecanicas
Se le Partio una Mangera.
- Se Continuo Con el Suministro e instalacion de Material afirmado en Primera Capa entre absc Ko+040 ala Ko+060.

+ Maula Bl

Frente Tramo la lucha.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 3 ayudantes.
Equipos: Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy Se Continuo Con el arme de acero de Soleras y viga dentellon del box-Coulvert de absc Ko+010 en la lucha.

+ Maula Bl

* Sabado 6 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.
Estos frentes Continuan abandonados Sin realizar ningun tipo de actividad.
Se le solicita al contratista reiniciar de manera urgente estos frentes de obra.

+ Maula Bl

Frente Media Tapa.
Este frente Continua abandonado, se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades tales como Sellado de juntas, Instalacion de bordillos Prefabricados, Construccion de Cunetas y descoles.

+ Maula Bl

Powered by CamScanner

Frentes Martinez Tramos T4 y T5.
Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sso, 1 Comision Topografica, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 3 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se realizo Extendido y Sarco de Material Sub base granular entre absc Kot075,19 a la Kot000 tramo T4.

- Se realizo liberacion por ticks y Sub base granular entre absc Ko1075,19 a la Kot000. Por Parte de la Interventoria T4
- Se realizaron toma de densidades. por Parte de la Interventoria en el tramo T4 en los Siguientes abscesos. en la Ko+060 la Cual dio 98%. Cumpliendo y en la absc Ko+020. la Cual dio 98% Cumplendo.
- Se realizo fundida de Pavimento en Concreto hidraulico en el tramo T4 de Martinez entre absc Ko+075,19 a la Kot000
- Se tomaron 2 Muestras de Vigas Para resistencia del Concreto.
-

+. Maria Cruz

Frente Tramo la lucha.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 3 oyudantes.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con armada de acero y formaleteado Para fundida de losa de fondo del Box. de Kot010 en la Lucha.

+ Maria Cruz

* Domingo 7 de Mayo de 2023.

No se realizo ninguna Actividad.

+ Maria Gil

* lunes 8 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 dejulio

El dia de hoy se realizo levantamiento topografico por la interventoria topografia inicial en el Sector 20 de julio entre abs. Ko+445 a la Ko+310.

—Tambien el Contratista ingreso Retroexcavadora en horas de tarde para dar inicio el dia de mañana las actividades de Excavacion en el Sector 20 de julio.

+ Maria Gil

Frente Medio Tepa.

Este frente continua abandonado, se le Solicita al Contratista iniciar urgente Con el Fallado de juntas, instalacion de bordillos, Construccion de cuneta y desobr.

+ Maria Gil

Frentes Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comisión topografica, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat 2 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,

Powered by CamScanner

1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de junta longitudinal de pavimento T4.
- Se realizo excavacion Mecanica en el tramo T5 entre abs c Kotoco a la Kotoco.
- Se realizo liberación por topografia de interferencia a excavación Mecanica del tramo T5 entre abs Kotoco a la Kot 000.
- Se realizo Perfilación y Cerco de Material afinado en tramo T5 entre obs Kot 190. a la Kot 070.

+ [illegible]

Frente Tramo la lucha.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sstro, 1 Maestro, 4 ayudantes
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo fundido de losa de fondo de Box y Soleras. en la Abs Kot 010 del Sector la lucha.
- se tomaron 3 muestras Cilindricos para resistencia del Concreto.

+ [illegible]

* Martes 9 de Mayo de 2023.

Frente Chuchurubi y 20 de Julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sso, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios, 1 oper Retroexcavadora.

Powered by CamScanner

Equipos: 1 Retroexcavadora, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se dio inicio con la excavación Mecanica en el tramo 20 de julio entre absc Ko+445 a la Ko+425.

+

Frente Media Tapa

Este frente continua abandonado, se le Solicita al Contratista iniciar urgente las actividades de Sello de juntas a Pavimento, Instalacion de bordillos, Construccion de cunetas y deroles.

+

Frentes Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Fiso, 1 Ing Residente, 1 Oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 comision topografica, 1 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores

Actividades: Se Continuo con la perfilación y perfilado de afirmado entre absc Ko+170 a la Ko+130.

- Se Realizo liberación por topografia de la interventoria a Material afirmado entre absc Kof170 - la Ko f130
- Se realizo toma de densidades por parte del Contratista en la absc Ko+160 la Cual dio 92.6% Cumpliendo.

+

Frente Tramo la lucha.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 3 ayudantes.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con el armado de acero de cuerpo box para losa Superior y aletas.

+. Maula Gil

*Miercoles 10 de Mayo de 2023

Frente Chuchurubi y 20 de julio.
Estado del Tiempo: Huvias por la noche - Dia Soleado.
Personal en obra: 1 oper Retroexcavadora, 1 oficios Varios.
Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Motobomba.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuación de aguas lluvias producto de las lluvias que se presentaron por la noche en el tramo 20 de julio.

+. Maula Gil

Frente Media Tapa.
Este frente continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad.

+ Maula Gil.

Frentes Martinez T4 y T5.
Estado del Tiempo: Lluvias por la noche - Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Piso, 1 Comision Topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, oper 1 Bobcat, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat,

Powered by CamScanner

1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuacion de aguas lluvias con motobomba esto producto de los lluvias que se presentaron por la noche en el tramo Martinez T5.

+ Manuel Ortiz

Frente Tramo la Lucha.

Estado del tiempo: Lluvias por la noche - Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Maestro, 3 ayudantes.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con el armado de acero de Cuerpo de Box Para losa Superior y aletas.

+ Manuel Ortiz

* Jueves 11 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en oba: 3 oficios Varios, 1 comision Topografica, 1 operador Retroexcavadora, 1 Fiso.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la Excavación Mecanica en el Tramo 20 de julio entre absc Ko+425 a la Ko+415.

- Esta Interventoria le ha manifestado al contratista en Comites anteriores que tramo que ellos excaven deben ser protegidos con material afirmado el mismo dia esto con el fin de evitar derrumbes en la Subrasante debido a las lluvias que se estan presentando en la Zona.

+ Manuel Ortiz

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, Sin realizar ningun tipo de actividad.

- Esta interventoria Solicita al contratista iniciar Con urgencia el Sellado de juntas ya que tienen mas de 15 dias de haber terminado los fundidos del pavimento, esto Para evitar daños en la losa debido a que esta lloviendo y el agua penetra por la junta.

Frentes Martines T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 2 oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: Se Continuo Con la Conformación de afirmado en el tramo T5 entre absc Ko+130 a la Ko+000.

- Se realizo liberación Por topografia de interventoria entre absc Ko+130 a la Ko+090 en afirmado.
- Se realizaron toma de densidades por parte del Contratista en la absc Ko+120 la Cual dio 93,3%. Cumpliendo.
- Se realizaron densidades por Parte de la interventoria en capa de afirmado entre las absc Ko+130 la Cual dio 92% todo derecho la cual Cumplio y en la absc Ko+090 la de izquierdo la Cual dio 94%. Cumpliendo.

Frente Tramo la Lucha

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Maestro, 2 ayudantes

Equipos: Herramientas Menores

Powered by CamScanner

Actividades: Se Continua Con el arme de acero de Box.
Coolvet. la Lucha. abs. Kot010.

+ Mauricio Ozeli

Viernes 12 de Mayo de 2023

Frente Chuchurubi y 20 de Julio.

Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal en Obra: 1 Siso, 1 Comision Topografica, 1oper Retroxcavadora 2 oficios Varios.
Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo Con la excavación mecanica en el tramo 20 de julio entre absc Kot415 a la Kot 390.
- Se realizo liberacion a excavacion mecanica Por interventoría topografia entre absc. Kot455 a la Kot390.
Se le recomienda al Contratista que una vez liberada la excavacion haga Suministro e instalación de material afirmado y Compactar, esto Con el fin de Proteger el terreno debido a las lluvias que se vienen Presentado en la zona. y evitar daños en la Sub rasante.

+. Mauricio Ozeli

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, Sin realizar ningun tipo de actividad,
De nuevo se le Solicita al Contratista el inicio urgente del Sellado de juntas, esto Con el fin de evitar daños en la losa debido a que en la zona esta lloviendo y el agua Penetra Por los Cortes de la junta.

+. Mauricio Ozeli

Powered by CamScanner

Frentes Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 2 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper vibro Compct, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se dio inicio con el Suministro e instalación de Sub base granular en el frente T5 entre absc. Ko+170 a la Ko+100.

- Se realizaron Sqres de fallos entre obsc Ko+170 a Ko+160 lado derecho de la via. en frente T5.
- Se realizo Compactacion y humectación del terreno de la Sub base entre absc Ko+170 a la Ko+100. frente T5.
- En el frente T4 no se ha realizado ninguna actividad esta abandonado y le falta sellado de juntas, instalacion de bordillos y descoles.

+. Manuela Bl

Frente Tramo da lucha.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Maestro, 2 ayudantes.

Equipos: Herramientas Menores-

Actividades: El dia de hoy se continuo con el armado de acero y formaleteria de Box. de lucha abs Ko+010.

+. Manuela Bl

* Sabado 13 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo:

Personal en obra: 1 siso, 1 oper Retroexcavadora, 2 oficios Varios,

Powered by CamScanner

1 Comision topografica.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavación Mecanica en el tramo 20 de julio entre absc Ko+390 a la Ko+350.

- Se realizo liberación en excavacion mecanica Por topografia de la interventoria entre absc Ko+390 a la Ko+360.
- Se dio inicio al Suministro e instalacion de material afirmado en el tramo 20 de julio entre abs Ko+360. a la Ko+390 en primera Capa.

Ing. Manuel Ortiz

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, sin realizar ningun tipo de actividad.

Se le pide Calendad al Contratista e inicie Con las actividades pendientes.

Ing. Manuel Ortiz

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Inso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 2 ofiwos Varios, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menor.

Actividades: El dia de hoy se realizo Cereo en Sub base granular entre absc. Ko+170 a la Ko+090. en tramo T5. Se realizo Compactación y humectacion en tramo Seriado.

Ing. Manuel Ortiz

Powered by CamScanner

Frente Tramo 2a Lucha.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 2 Oficiales.
Equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se Continuo Con la Formaleteria de Muros y losa Superior de 30x — Cortvert la Lucha abs Kotolo Para su debida fundida.

+. Nuñez Ozl

* Domingo 14 de Mayo de 2023.

No se realizo ningun tipo de actividad.

+. Nuñez Ozl

* Lunes 15 de Mayo de 2023.

Frente Chuchunbi y 20 de julio
Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana 7-9 am — Tarde Soleada.
Personal en obra: 1 Oper Retroexcavadora, 1 Oficio.
Equipos: 1 Retroexcavadora, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy no se realizo ninguna Actividad en el tramo 20 de julio debido a las lluvias presentes en la Mañana.

+. Nuñez Ozl

Frente Media Tapa.
Este frente Continua abandonado, sin realizar ningun tipo actividad.
Se le Pide Celeridad al Contratista e inicie Con las actividades Pendientes.

+. Nuñez Ozl.

Powered by CamScanner

Frentes Martinez Tramos T4 y T5.

Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7-9 am, tarde soleada.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Diso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper vibro Compactador, 3 oficios varios, 1 Comision Topografica, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de Material Sub base granular. entre abs Ko+170. a la Ko+135 en tramo T5.
- Se realizo liberacion de Sub base y niveles por topografia de interventoria entre absc Ko+190 a la Ko+135.
- Se realizo instalacion de niveles para fundida de Concreto entre absc Ko+190 a la Ko+140. tramo martinez T5.
- Se realizo toma de densidades por laboratorio del Contratista en la absc Ko+160 la Cual dio 96% Cumpliendo.
- Se realizo fundida de Pavimento en Concreto Hidraulico de HR 38 entre absc Ko+190 a la Ko+140. en tramo T5 martinez.
- Se le hizo observacion al Contratista que Solo hasta el dia de hoy se le libero para fundida por la noche no se liberara mas para estas fundidas debido a que en la noche el acabado no esta quedando en los mejores Condiciones.
- Se tomaron 2 vigas para Verificacion de Resistencia.

+ Manuela Gil

Frente tramo la Lucha.

Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7-9 am. tarde soleada.
Personal en obra: 1 Maestro, 4 ayudantes.
Equipos: Herramientas Menores, Vibro de Concreto.

Actividades: El dia de se realizo fundida de Muros y Losa Superior de Box - Culvert de la Lucha Ko+010.
- Se tomaron muestras cilindricas 3. para Verificar. Resistencia

+ Manuela Gil

Powered by CamScanner

* Martes 16 de Mayo de 2023.

Frente chuchunbi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Mañana Soleada - lluvias en la tarde 2:30 - 3:30 pm

Personal en obra: 1 Oper Retroexcavadora, 1 fiso.

Equipos: 1 Retroexcavodora, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad en el frente 20 de julio.

El Contratista ingreso a obras 1 viaje de piedra Para mejoramiento entre abs Km+440 a la Km+330. por subrasante con mal estado.

Frente Media Tapa.

Este frente continua abandonado, Sin realizar ningun tipo de actividad.

Se le pide celeridad al Contratista e inicie con las actividades pendientes como lo son: Sello de juntas, Instalacion de Bordillos, Construccion de cuneta y descoles.

Frentes Martinez Tramos T4 y T5.

Estado del tiempo: Mañana Soleado - lluvias en la tarde 2:30 - 3:30 pm

Personal en Obras: 1 ing Residente, 1 sso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 comision topografica, 3 oficios Varios, 2 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 estacion, Heramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de juntas a pavimento en frente T5 entre absc Km+190 a la Km+140.

- Se realizo Cargue de Material afirmado entre absc Km+170 a la Km+000. en frente Martinez T5.

Powered by CamScanner

En el tramo T4 se encuentra abandonado, no se han realizado Sellado de juntas ni instalacion de bordillos prefabricados teniendo en Cuenta que ya esta finalizado en su totalidad todo el pavimento.
- Se realizo Suministro de material Srb base granular en el tramo T5 no se extendio debido a las lluvias que se presentaron en la tarde en la zona.

+ Maria Cruz

* Frente Tramo la Lucha.

Estado del tiempo: Diurno Soleado - lluvias en la tarde de 2:30 - 3:30pm
Personal en obra: 1 Siso, 1 Maestro, 3 ayudantes
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo desencofre de formaletas de Muros y losa superior del Box - la lucha Katolo.

+ Maria Cruz

* Miercoles 17 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de Julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 oper Retroexcavadora, 1 Siso, 20 raws Varios.
Equipos: 1 Retroexcavadora, Herramientas Menores, 1 Motobomba.

Actividades: El dia de hoy no se realizo ninguna actividad. esto debido a las fuertes lluvias del dia de ayer. Solo se realizo evacuacion de aguas lluvias de la Via Con motobomba en el Sector 20 de julio.
Se llego a acabo Veeduria con Veedores, Contratista, alcaldia. Interventoria.

+ Maria Cruz

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.
Este frente continua abandonado, Sin realizar ningun tipo de actividad.
- Se le ha Solicitado al Contratista Celeridad en las actividades de Sellado de Juntas Instalacion de bordillos, Construccion de Cunetas y descoles.

Fernando Gonzalez + Manuel Gz.

Frentes Martinez Tramos T4 y T5.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 2 oficios Varios, 1 Comision Topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramienta Menor.

Actividades: El dia de hoy el Contratista no se realizo ninguna actividad en el tramo T5 esto debido a las fuertes lluvias del dia de ayer.
- Solo realizo evacuacion de aguas lluvias de la via en el tramo T5 y Por la tarde con la Motoniveladora saco el barro para avanzar.

Fernando Gonzalez + Manuel Gz

Frente Tramo La Lucha
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Maestro, 2 ayudantes, 1 Siso
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se realizo encofre de Formaleta a aletas del Box - la lucha Katolo.

Fernando Gonzalez + Manuel Gz

Powered by CamScanner

* Jueves 18 de Mayo de 2023

Frente Chuchurubi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Oper Retroexcavadora, 1 oficios Varios, 1 Piro, 1 Comisionat.

Equipos: 1 Retroexcavadora, Herramientas Menores, 1 Nivel, 1 Estación

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la exavación Mecanica entre absc K0+360 a la K0+320 en el tramo 20 de julio.

+. [illegible]

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, Sin realizar ningun tipo de actividad.

- Se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades de Sellado de juntas, instalación de bordillos, Construccion de Cunetas y Sardineles.

+. [illegible]

Frentes Martinez Tramos T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Piso, 2 oficios Varios, 1 Comisión Topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Amputador, 6 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Suministro e instalación de Material Sub base granular entre absc K0+135 a la K0+090.

- Se realizo cerco e instalacion de rieles entre absc K0+135 a la K0+090 en el tramo T5.
- Se realizo toma de densidades por laboratorio del Contratista al Material Sub base en la absc K0+110 la Cual dio 95,6% Cumpliendo.
- tambien Se realizaron toma de densidades por el laboratorio del Contratista en afirmado entre las absc K0+075 la Cual

dio 92.8%. Compliendo y en la absc Ko+022 la Cual dio 90,2%. Compliendo.
- Se realizo fundida de Concreto hidraulico de MR 38 entre absc Ko+140 a la Ko+090. en el tramo T5 martinez.
- Se fomaron 2 Vigas para la resistencia al Concreto.

+ [illegible]

Frente Tramo la Lucha
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Maestro, 3 ayudantes.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo y finalizo Con el encofre de formaleteria de los aletas y Cuerdurvedas del Box-Coulvert del sector la lucha Kotorio dejando listo para su respectiva fundida.

+ [illegible]

* Viernes 19 de Mayo de 2023

Frente Chuchunbi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Ubicana Nublada - Lluvias de 3:30 - 4:30 pm.
Personal en Obra: 3 oficios Varios, 1 Oper Retroexcavadora, 1 Sijo
1 Comision Topografica, 1 Ing Residente.
Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Nivel, 1 Estacas, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continua Con la excavacion Mecanica
- Se realizo liberacion excavacion Por topografia de la interventoria entre absc Ko+360 a Ko+330
- Se realizo Suministro e instalacion de material afirmado en Primera Capa entre absc Ko+360 - Ko+330.
Se suspenden actividades por las lluvias en la zona.

+ [illegible]

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Este frente continua abandonado, Sin realizar ningun tipo de actividad.

Frentes Martinez Tramo T4 y T5.

Estado del Tiempo: Mañana Nublado - Lluvias desde 3:30 - 4:30 pm.
Personal en Obras: 1 Ing Residente, 1 Fiso, 2 oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: Se realizo extendida de material Sub base granular entre abse Km 0+030 a la Km 0+010. Se humedeció y realizo Compactación.
- Estas actividades Se vieron afectadas Por las fuertes lluvias Presentadas por la tarde en la zona.

Frente tramo la lucha.

Estado del tiempo: Mañana Nublada - Lluvias desde 3:30 - 4:30 pm.
Personal en Obra: 1 Fiso, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ing Residente.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se finaliza Con el descapote de aletas y guardaneles del Box - Coulvert. la lucha y se finaliza fundida Con esas Actividades. Se fundieron aletas y Guardaruedas.

* Sabado 20 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: lluvias
personal en obra: 1ing Residente, 1siso, 1oper Retroexcavadora, 1ofical
Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy no se realizaron actividades debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

+ .

Frente Media tapa.
Este frente Continua abandonado, no se realizo ningun tipo de actividad debido a las lluvias presentadas en la zona.

+ .

Frentes Ramos Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Lluvias.
Personal en obra: 1ing Residente, 1 Sisso, 1oper Motoniveladora, 1oper Vibro Compactador, 1oper Bobcat, 1 comision topografica 2 oficios Varios.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona:

+

Frente la lucha.
Estado del tiempo: lluvias
Actividades: No se realizo ningun tipo de actividad debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

+

Powered by CamScanner

* Domingo 21 de Mayo de 2023.

No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes. 22 de Mayo de 2023.

No se realizo ningun tipo de actividad. lunes festivo.

* Martes 23 de Mayo de 2023.

Frente chuchunbi y 20 de julio.

Estado del Tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1ing Residente, 1siso, 1oper Retroexcavadora, 2 oficiales Varios.

Equipos: 1 Motobomba, 1 Retroexcavadora, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuación de aguas lluvias de la via con motobomba ato producto de las fuertes lluvias presentadas en la zona el fin de semana, lo cual afecta directamente las actividades.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, no se realizo ningun tipo de actividad debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

Estado del Tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1ing Residente, 1siso, 1oper Motoniveladora, 2oficiales Varios, 1oper Bobcat, 1oper Vibro Compactador, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Motobomba, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El dia de hoy el Contratista realizo evacuacion de aguas lluvias Con motobomba de la via Producto de las fuertes lluvias presentadas el fin de semana en la zona, lo cual afecta directamente las actividades.

+ [illegible]

Frente Tramo la lucha.

En este frente no se esta realizando ningun tipo de actividad debido a que finalizo Con la Construccion del Box-Coulver de obra Katoro, queda por realizar el relleno del Box.

+ [illegible].

* Miercoles 24 de Mayo de 2023.

Frente chochorubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Nublado - lluvias Tarde de 3:00 - 4:00 pm

Personal en obra: 1 Piso, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Motoniveladora 1 ing Residente, 2 oficios Varios, 1 Comision topografia

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 nivel, 1 Estacon Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad en este tramo 20 de julio esto debido a las lluvias que se vienen presento, ademas de eso la Comunidad tambien echa las aguas a la via y esto afecta el material, ya se le ha dicho a los personas alrededores que por favor colaboren, al igual que se dejo en la Veeduria que se hizo en este mes. en el Sector.

+ [illegible].

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, no se le realizo ningun tipo de actividad.

+ [illegible].

Powered by CamScanner

Frentes tramos Martinez T4 y T5.


Estado del tiempo: Dia Nublado - lluvias por la tarde de 3:00 - 4:00 pm.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 2 Oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro compactador

Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores.


Actividades: Se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base granular entre absc K0+030 a la K0+000 en el tramo T5.

- Se realizo Compactacion y humectación.
- Estas actividades se vieron afectados debido - Ler lluvias.



Frente tramo la ludria.

En este frente no se esta realizando ningun tipo de actividad. esta pendiente el relleno al Box-Coulvert.



* Jueves 25 de Mayo de 2023

Frente chuchurubi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 siso, 1 Comision Topografica, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Motoniveladora.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy en el tramo A2 no se realizo ninguna actividad, se estan presentado problemas con los Conos aledaños a la via ya que estos estan echando el agua a la via que se esta Construyendo en el material afirmado y lo estan Contaminando - y no hacen dejado avanzar los trabajos. este esta acercando en el tramo A3.

- Por otro lado se realizo trazado y replanteo del tramo A4 Por la topografia de interventoria en conjunto con la del

Powered by CamScanner

Contratista, se realizo alineamiento al nuevo diseño proyectado. Tambien se hizo con descapote entre absc K0+410,5 - K0+300. en el frente A4.

Frente Media Tapa

Este frente se encuentra abandonado, no se esta realizando ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes como son: instalacion de bordillos, Sellado de juntas, Construccion de Cunetas y descoles.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 SISO, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 2 oficios varios, 1 Comisión topografica, 6 ayudantes.

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores,

Actividades: El dia de hoy se continuo y finalizo con la fundida de Concreto hidraulico entre absc K0+030 a la K0+000 en el tramo T5. quedando al 100% en pavimento.

Frente Tramo la Lucha.

En este frente no se esta realizando ningun tipo de actividad esta pendiente el relleno del box - Culver K0+010.

Powered by CamScanner

* Viernes 26 de Mayo de 2023.

Frente Chochorubi y 20 de julio.

Estado del Tiempo: Mañana Soleada - lluvias en la tarde 3:00 - 4:00 pm.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Retroexcavadora, 1 Comision Topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper vibro Compactador, 3 ofias Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Retroexcavadora, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy en el tramo A3 no se realizo ningun tipo de actividad, hay Problema Con el agua de las Cercas que la Comunidad arroja a la via.

- Se realizo levantamiento topografico por topografia de la interventoria en el tramo A4.
- Se realizo excavación mecanica entre absc Ko+410,5 a la Ko+380. en el tramo A4., esta actividad se vio afectada Por las lluvias.
- Se realizo liberacion Por topografia de interventoria a excavación mecanica entre absc Kot 410,5 a la Kot en el tramo A4 Sector 20 de julio.

Frente Media Tapa.

Este frente se encuentra abandonado, no se esta realizando ningun tipo de actividad, se le pide Calendad al Contratista. en las actividades.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Mañana Soleada - lluvias en la tarde 3:00 - 4:00 pm.

Personal en obra: 1 ing Residente, 2 ayudantes, 1 oficios Varios.

Equipos: Herramientas Menors, Cortadora de pavimento.

Powered by CamScanner

Actividades: El día de hoy se realizo corte de finos a Pavimento entre absc Ko+030 - Ko+000, en el frente T5.

Frente Tramo la lucha.
En este frente no se esta realizando ningun tipo de actividad, esta pendiente el relleno del Box-coulvert de abs Ko+010.

* Sabado 27 de Mayo de 2023.

Frente Chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Lluvias por la noche - Dia Nublado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sso, 1 oper Bobcat, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Retroexcavadora, 1 Comision topografica, 1 oper Vibro Compactador.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientos Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista Suministro piedra rajon Para mejoramiento, Se le hace observacion al Contratista Sobre el material piedra rajon ya que esta llegando un poco Contaminada Se le requiere Sea mas limpia y Seleccionada.
- Se realizo cuja Para fallo el Arl se presento entre abs Ko+347 a la Ko+353. en el frente A3 y Se realizo su debido proceso.
- En el frente A4 no se pudo realizar ningun tipo de actividad el terreno estaba muy humedo debido a las lluvias presentadas en la noche en la Zona.

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.
Este frente Continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.
En estos frentes no se esta realizando ningun tipo de actividad debido a que el Contratista en lo que Corresponde a Pavimento formicas, falta por ejecutar el Sellado de juntas, instalación de bordillos Contracion de descoles.

Frente Tramo la lucha.
Este frente se encuentra abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, falta el relleno del Box-Colvert Patolo. Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades.

* Domingo 28 de Mayo de 2023

No se realizo ningun tipo de Actividad.


* Lunes 29 de Mayo de 2023


Frente Chuchunbi y 20 de julio
Estado del Tiempo:: Dia Nublado.
Personal en obra: 2oper Retroexcavadora, 4 Oficios Varios, 2oper Bobcat, 1oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica, 1 Ing Residente, 1 Sisa.
Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 Motoniveladora, 1 Vibro Ampact. 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El dia de hoy se realizaron actividades de evacuación de aguas debido a las fuertes lluvias presentadas el dia 28 de Mayo domingo.


- Se realiza trazado y replanteo de alineamientos en el frente A4 por topografia de interventoria en conjunto con el topografo del contratista.
- Se realiza Caja para Mejoramiento de la Sub rasante en Piedra rajon entre abs. K0+403 a la K0+393. Sector A4, esto por lluvias afectación.






Frente Media tapa.

Este frente continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad.






Frentes Tramo Martinez T4 y T5.


En estos frentes no se esta realizando ningun tipo de actividad. falta por ejecutar la instalación de bordillos, Sellado de juntas y Construcción de andenes.






Frente Tramo la Lucha.

Este frente se encuentra abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, falta relleno del Box-Coulvert. K0+910 se le pide celeridad al Contratista en las actividades





* Martes 30 de Mayo de 2023.

Frente chuchunubi 7 20 de julio.

Estado del tiempo: Mañana soleada - Lluvias en la tarde de 4-5 pm.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sro, 4 oficios varios,

Powered by CamScanner

1 oper Retroexcavadora, 1 oper Vibrocompactador, 2 oper Bobcat, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores, Motobomba.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuación de aguas del tramo A4, la Cual Presenta filtraciones por nacimiento de aguas. entre abs. Km+403 - Km+393.

- Se realizo instalacion de Piedra rajon Para filtro mejoramiento de Sub rasante. entre absc Km+403 - Km+393.
- En el tramo A3 no Se realizo ninguna actividad.
- Se realizo Visita Por el INVIAS, al ing Nestor Lemus, Por la ALCALDIA, al Secretario de planeación Ag DIONISIO R., Por al Contratista Ing Cesar hernandez y Por la interventoria el ing Eduardo toro.

Frente Medio tapa.

Este frente Continua abandonado, no Se ha realizado ningun tipo de actividad.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5

Estos frentes Continuan abandonados, no Se ha realizado ningun tipo de actividad, falta instalacion de bordillos y Sellado de juntas.

Frente tramo La Lucha.

Este frente Se encuentra abandonado, no Se esta realizando ningun tipo de actividad, falta relleno del Box-Culvert Km+010

Powered by CamScanner

* Miércoles 31 de Mayo de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Sisa, 4 Oficios Varios, 1 oper Retroexcavadora, 2 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compact 1 Comision topografica

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuacion de aguas- esto producto de las lluvias del dia 30 de mayo por la tarde, en el tramo A3.

- Se realizo excavación y se cubrio con topografia de Interventoria Para mejoramiento de Sub rasante con piedra rajon entre absc Kot 347,5 – Kot 352,5. en el tramo A3. Sector 20 de julio.

+ Manuela Ortiz

Frente Media Tapa.

Este frente continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad. se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

+ Manuela Ortiz.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

En estos frentes no se ha realizado ningun tipo de actividad este pendiente el sellado de juntas, instalacion de bordillos.

Frente Tramo la lucha

Este frente se encuentra abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, falta el relleno del Box+Coulvert del abs. Ko+010 la lucha.

+ Manuela Ortiz.

Powered by CamScanner

* Jueves 1 de Junio de 2023

Frente Chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Llovio toda la Mañana - Tarde Nublada.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Fiso, 4 oficios Varios, 2 oper Bobcat, 1 oper Retroexcavadora, 1 Oper Vibro Compactador, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy Solo & realizo evacuación de aguas Lluvias producto de las lluvias presentadas en la Mañana. esto en los frentes. A3 y A5. del Sector 20 de julio.

+ - Maria Ogle.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, este pendiente el Sellado de juntas, instalacion de bordillos, Construccion de Canal y descoles.

Se le pide Calendad al Contratista en estas actividades.

+ Maria Ogle.

Frentes tramo Martinez T4 y T5.

Estos frentes Continuan abandonados sin realizar ningun tipo de actividad, estan pendientes Por Sellado de juntas, instalacion de bordillos.

Se le pide Calendad al Contratista en estas actividades.

+ Maria Ogle.

Frente Tramo La Lucha.

Este frente se encuentra abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad Solo se Construyo el Box-Coulvert a la abscisa 0+010, y falta el relleno del mismo.

Se le pide al Contratista realice relleno del Box lo antes posible para evitar socavaciones ya que las lluvias estan siendo fuertes en la zona.

+ Maria Ogle

Powered by CamScanner

* Viernes 2 de junio de 2023.

Frente chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 4 Oficiales Varios, 2 oper Bobcat, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo limpieza a excavacion de mejoramiento con piedra rajon entre absc. Ko+349 - Ko+355.

- Se realizo Suministro e instalacion de piedra rajon en mejoramiento de Sub rasante. Con piedra rajon fallo entre absc Ko+349 - Ko+355. en el tramo 13 Sector 20 de julio. el cual quedo Superado el fallo.

Frente Media Tapa.

Este frente continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frentes tramo Martinez T4 y T5

En estos frentes no se ha realizado ningun tipo de actividad, este pendiente por ejecutar el Sellado de juntas y inst. de bordillos, se le Pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frente tramo la lucha

Este frente se encuentra abandonado, no se esta realizando ningun tipo de actividad, falta relleno del Box-Coulvert Ko+010 de la lucha.

Powered by CamScanner

* Sabado 3 de junio de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 4 oficios Varios, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat.

Equipos:

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación.

Actividades: El dia de hoy se realizo Mejoramiento Con Piedra rajon a fallas presentadas en el tramo A3. Sector 20 de julio. entre abs K0+450 a la K0+435.6.

Frente Medio tapa.

Este frente continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

En estos frentes no se ha realizado ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista Celeridad en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frente Tramo la lucha.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista Celeridad en las actividades.

Powered by CamScanner

* Domingo 4 de junio de 2023
No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 5 de junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado - Lluvias por la noche.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 4 oficios Varios, 1oper Retroexcav, 1oper Vibro Compactador, 1oper Bobcat, 1oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica, 1 Sipo.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Retroexcavadora, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuacion de aguas lluvias en los tramos A3 y A4 del Sector 20 de julio esto debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche del dia domingo.

Frente Medio Tupa
Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad, ademas se vio afectado por las lluvias presentadas en la zona el dia domingo.

Frentes Martines Tramos T4 y T5.
Estos frentes Continuan sin realizar ningun tipo de actividad tambien se presentaron lluvias el dia domingo. por la noche.

Powered by CamScanner

Frente Tramo la lucha

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se Presentaron lluvias el domingo Por la noche.

* Martes 6 de junio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sso, 1 Comision Topografica, 4 ofiaos Varios, 1 operador Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores

Actividades: Se dio inicio Con el Suministro de bordillos en el tramo chuchurubi.

- Se realizo liberación Por topografia de interventoria en excavacion mecanica en el tramo A4 entre absc Km+390 a la Km 410,5. Sector 20 de julio.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado entre absc Km+390 a la Km+410,5 tramo A4 Sector 20 de julio.
- En el tramo A3 no se realizo ningun tipo de actividad ya que este tramo se encuentra Saturado de las agua lluvias y las que las casas aledaños echan a la vía.

Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad. Se le pide Calendad al Contratista en las actividades Pendientes Por ejecutar.

Powered by CamScanner

Frentes Tramo Martinez T4 y T5

Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes Por ejecutar.

Frente Tramo Martinez. T2 T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 comision topografica.

Equipos: 1 Nivel, 1 Estación.

Actividades: El dia de hoy se dio inicio con el replanteo y trazado en Conjunto Con la topografia del Contratista y la Interventoria en los tramos T2, T2' y T7.

* Miercoles 7 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sso, 4 oficios Varios, 3 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1oper Retroexcavadora, 1 Vibro Compactador, 1 Comisión topografica,

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: Se realizo instalación de Sub base granular entre absc Ko+390 a la Ko+410,5 en el tramo A4 del sector 20 de julio.

- Se realizo Perfilado de la Intervention Por niveles y sub base entre absc Ko+390 a la Ko+410,5 en el tramo A4.
- Se realizo fundida de Pavimento entre absc Ko+390 a la Ko+410,5 en el tramo A4 Seccion 5mts - Sector 20 de julio

- Se Continuo Con el Suministro de bordillos en el tramo chuchurubi.
- tambien Se dio inicio Con la excavacion manual Para instalacion de bordillos entre absc K0+450 a la K1+320 lado derecho en el tramo chuchurubi.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes Como Son: Sellado de juntas, Instalacion de bordillos Prefabricados y demas.

Frentes Tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Sso, 1 Ing Residente, 1 oper Motoniveladora, 2 peleteros, 1 oper Bobcat, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion.

Actividades: El dia de hoy Se dio inicio con la excavacion Mecanica entre absc K0+240 a la K0+180 en el tramo T2. Sector Martinez.

* Jueves 8 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Nublado con lluvias a partir de 10-12pm - Tarde Nublada.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 6 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 Siso, 1 oper vibro Compactador.

Equipos: 1 vibro Compactador, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo Corte de juntas entre absc. Km+390 a la Km+410,5 tramo A4 sector 20 de julio.

- Se realizo evacuacion de aguas lluvias con motobomba en el tramo A3 sector 20 de julio.
- Se Continuo con el Suministro de bordillos en el tramo Chuchurubi.
- Tambien se realizo excavación Manual para instalacion de bordillos entre absc Km+320 a la Km+230 lado derecho tramo Chuchurubi.

Frente Media tapa.

Este frente continua Sin realizar ningun tipo de actividad se le pide celeridad al contratista en las actividades Pendientes Por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades Pendientes por ejecutar.

Powered by CamScanner

Tramos Martinez T2, T2' y T7

Estado del tiempo: lluvias en la mañana de 10-12pm - tarde Nublada.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 Camion topografica, 2 peleteros, 2 oficios Varios

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre obs Ko+240 a la Ko+180 en el tramo T2 Sector Martinez.

* Viernes 9 de Junio de 2023.

Frentes chuchunbi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 4 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 Siso.

Equipos: 1 Motobomba, Herramientes Menores.

Actividades: Se realizo evacuación de aguas lluvias en los tramos A3 y A4 del Sector 20 de julio esto debido a las lluvias del dia de ayer.

- Se Continuo con el Suministro de bordillos al tramo chuchunbi.
- Se Continuo con la excavacion mecanica Para instalacion de bordillos entre obs Ko+230 a la Ko+084 lado en el tramo chuchunbi.

Frente Media Tapa

Este frente continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades pendientes Por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad.

Frentes Tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 2 peloteros, 2 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision topografica

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continua con la excavación Mecanica entre absc Kot 240 a la Ko + 180 tramo T2 Sector Martinez.

* Sabado 10 de Junio de 2023

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Sabado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 4 oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador 4 ayudantes, 1 Comision topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientes menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo liberacion por topografia de interventoria a excavacion mecanica entre absc Kot 240 a la Ko + 200. tramo T2 martinez.

- Tambien se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en Primera y Segunda Capa entre abs Kot 240 a la Ko + 200 tramo T2 martinez.

Powered by CamScanner

- Se Continuo excavación Mecanica entre absc Ko+200 a la Ko+160. trawo T2 Martinez.

+. Humberto Ojeda

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1ing Residente, 1sso, 4ayudantes., 20 fierros Varios.
Equipos: 1 Motobomba, Herramientas menores.

Actividades: En los frentes A3 y A4 no se realizo ningun tipo de actividad debido a que el terreno Presenta mucha humedad debido a las fuertes lluvias que se han Venido Presentando en la zona, ademas de eso la Comunidad no Para de evacuar los aguas de Sus Casas a la via la Cual esta en ejecución.

- En el trawo de chuchurubi se Continuo Con el Suministro de bordillos y excavación Para instalacion de bordillo entre absc K1+084 a la K0+970. lado derecho. Sector Chuchurubi'.

+. Humberto Ojeda

Frente Medio tape.
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se Solicita al Contratista celeridad en las actividades pendientes. por ejecutar.

+ Humberto Ojeda

Frentes trawos Martinez T4 y T5.
Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad.

+ Humberto Ojeda

Powered by CamScanner

* Domingo 11 de Junio de 2023.

No se realizo ningun tipo de actividad

+.

* Lunes 12 de Junio de 2023. F-

Nose realizo ningun tipo de actividad.

+.

* Martes 13 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 siso, 2 oficios Varios, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo el Suministro de material afirmado en el tramo A3 Sector 20 de julio.

- Se Continuo con el Suministro de Bordillos en el tramo de chuchurubi.

+.

Frente Medio Tapa

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad se le pide Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

+

Frentes Martinez Tramos T4 y T5.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Pide Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes Por ejecutar.

+.

Powered by CamScanner

Frentes Tramos Marina T2, T2' y T7.
Estado del Tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 3 oficios Varios, 6 ayudantes,
1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compact.
1 Comisión topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel,
1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo cargo y liberacion por topografia de interventoria a capa de afirmado entre abs Ko+240 a la Ko+200.
- Se realizo toma de densidad por parte del contratista en la abs Ko+210 la Cual Cumplio 92,2% en Capa afirmado. T2
- Se realizo instalacion de material Sub base granular entre abs Ko+240 a la Ko+200. T2
- Se realizo toma d densidades por parte del Contratista en la abs Ko+225 la Cual Cumplio a 96% en Capa de Sub base T2
- Se realizo liberación por parte de la topografia de la intraventoria a Sub base y riegos entre abs Ko+240 a la Ko+200, T2.
- Se realizo fundida de Pavimento entre abs Ko+240 a la Ko+210. en el tramo T2 Martinez.
- Se realizaron 2 Muestras para resistencia del Concreto. T2.

+ .

* Miercoles 14 de Junio de 2023.

Frentes Tramo: La Lucha
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Siso, 1 oficios Varios, 2 ayudantes
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy no realizo ningun tipo de actividad en este tramo, se le solicita al Contratista celeridad en las actividades pendientes por ejecutar.

+ .

Powered by CamScanner

Frente Media Tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide Celeridad al Contratista en los actividades Pendientes Por Ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad se le Solicitel al Contratista Celeridad en los actividades Pendientes, Por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 3 oficios Varios,

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de juntas en el tramo T2 pavimento, entre absc Ko+240 a la Ko+210.

Frentes: Chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper. Bobat, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Sureo de Mofrol afirmado entre abs Ko+455.67 al Ko+420 tramo A3.

Powered by CamScanner

- Se realizo liberación por topografia de Interventoria a Capa de enfirmado entre absc K0+445,67 a la K0+420 tramo A3.
- Se realizo toma de densidades por Parte del Contratista en la abs K0+ la Cual dio 90% Cumpliendo.
- Se realizo Suministro e instalacion de material Sub base granular entre absc K0+445,67 a la K0+420 tramo A3.
- Se realizo toma de densidades por Parte del Contratista en la dasc K0+ la Cual dio % Cumpliendo
- Se realizo Suministro de bordillos en tramo chuchurubi.

* jueves 15 de Junio de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de Julio.
Estado del tiempo: Dia Nublado.
Personal en obra: 1ing Residente, 1 Sso, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios, 1oper Motoniveladora, 1oper Bobcat, 1oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo instalacion de Bordillos entre absc K1+350 a la K1+290 lado derecho Chuchurubi.
- En el tramo A3 y A4 del Sector 20 de julio se realizo evacuación de aguas debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche en la zona, esto impidio el avance de las actividades.

Frente Media Tapa
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Powered by CamScanner

Frentes frente Martínez T4 y T5.
Estado del tiempo: Día Nublado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 fisio, 1 insp. de Obra Superb
Equipos: Herramientas Menores, 1 Bobcat.

Actividades: El día de hoy se dio inicio con el Suministro de bordillos en el frente T4 de Martínez.

Frentes Martínez tramos T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Día Nublado
Personal en obra: 2 oficios Varios, 1 fisio.
Equipos: 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo evacuacion de aguas lluvias debido a los fuertes lluvias presentados en la noche en la zona impidiendo el avance de las actividades.

* Viernes 16 de Junio de 2023

Frentes chuchunbi y 20 de Julio.
Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 ing Residente, 4 ayudantes, 1 insp de obras, 1 fisio, 20 oficios Varios.

Equipos: Herramientas Menores, 1 Motobomba.

Actividades: El día de hoy en el frente A3 y A4 del Sector 20 de Julio. se continuo con la evacuacion de aguas, esto debido a las lluvias presentadas en la zona el día Miercoles. Tambien debido aque el terreno esta muy Saturado ya que el nivel freatico esta muy Cerca.

Powered by CamScanner

- Se continuo con la instalación de bordillos entre abs K1+210 a la K1+140 lado derecho frefor chuchurubí.

Frente Media tapa.

Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al contratista en los actividades pendientes por ejecutar.

Frentes tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 8 ayudantes, 1 inp. Obra.

Equipos: Herramientas Menores, 1 Bobat

Actividades: El dia de hoy se continuo con el suministro e instalacion de bordillos en el tramo T4 lado izquierdo entre abs K0+075,19 a la K0+050 - .

Frentes Martinez tramos T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Bobat, 1 oper. Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comisión topografica, 3 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobat, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo. liberacion por topografia de interventoria a excavacion entre abs K0+200 a la K0+180 - Se realizo suministro e instalacion de Material afirmado entre abs K0+200 a la K0+180 tramo T2.

Powered by CamScanner

* Sabado 17 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Mañana Soleada - lluvias en la tarde.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 SISO, 4 ayudantes, 1 oficios Varios.
Equipos: Herramientas Menores, 1 motobomba.

Actividades: El día de hoy se realizo extracción de aguas lluvias en los tramos A3 y A4 del Sector 2B de justo debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche del viernes. afectando las actividades.
- Se Continuo Con la instalación de bordillos Prefabricados entre absc K0+140 a la K1+120. tramo chuchurubí lado derecho..

Frente Media Tapa:
Este frente Continue Sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Mañana Soleada - lluvias por la tarde.
Personal en obra: 1 insp. de obra, 1 SISO, 2 oficios Varios, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo Con la instalacion de Bordillos prefabricados en el tramo T4 en ambos lados entre absc K0+075,19 - K0+030
- tambien se Continuo Con el formaleteo de bordillos en tramo T5.

Powered by CamScanner

Frentes Martinez Tramos T2, T2' y T7.
Estado del Tiempo: Mañana Soleada, lluvias por la tarde.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 SISO, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat, 1 opr Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora 2 ofiaos Viás, 8 ayudantes.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 estacas, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo liberación de Capa afirmado por topografia a la interventoria entre absc K0+200 a la k0+180. T2
- Se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base granular entre absc K0+200 a la K0+190. tramo T2
- Se realizo liberación por topografia a Sub base y Fieles entre absc K0+200 a la k0+190 Interventoria tramo T2.
- Se realizo fundida de Primario entre absc K0+210 a la K0+190. tramo T2 Martinez.
- Se realizaron 2 Muestras de toma de resistencia.

* Domingo 18 de Junio de 2023
No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 19 de Junio de 2023. F.
No se realizo ningun tipo de actividad.

Powered by CamScanner

* Martes. 20 de junio de 2023.

Frentes chuchumbi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 ing Residente, 1 Sso, 2 oficios Varios, 4 ayudantes
1 inspector de obras.
Equipos: Herramientas Menores, Motobomba.

Actividades: El dia de hoy se realizaron excavación de aguas del tramo A3 sector N 20 de julio, el cual el Producto de aguas lluvias y aguas del nivel freatico, estas actividades se han visto afectados. Sus rendimientos.
- Se Continua Con la instalación de bordillos Prefabricados en el tramo chuchumbi lado derecho desde Km + 1+0. y lado izquierdo desde Km +450 a la Km +350.

Frente Media tapa
Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 insp. de obra, 1 Sso, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menor.

Actividades: El dia de hoy se inicio excavacion Manual Para instalacion de bordillos en el tramo T5 martinez.
- tambien se Continuo Con el Suministro de bordillos.
En el tramo T4 se Continuo Con la pega de juntas. a bordillos de ambos lados.

Powered by CamScanner

Frentes frentes Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica,
2 oficiales Varios, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat,
1 oper Motoniveladora.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel,
1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion Mecanica entre cbs Km+180 a la Km+150 frente T2.

* Miercoles 21 de Junio de 2023

Frentes chuchunbi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 inspector de Obras, 4 ayudantes, 2 oficiales Varios,
1 oper. Bobcat,
Equipos: 1 Bobcat, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuacion de aguas en el Sector A3 20 de julio, y se retiro material lodo.
- En el frente de chuchunbi no se realizo ningun tipo de actividad.
Se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frente Media Tapa.
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad,
Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades pendientes Por ejecutar Como Son: instalacion de bordillos, Sellado de juntas, Construccion de Aceras y drenes.

Powered by CamScanner

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 insp. de obra, 8 ayudantes, 1 Siso, 1 oper Bobcat, 1 oficios Varios.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo y finalizo Con la instalacion de bordillos en el tramo T4, y sus respectivos Pegues de juntas.
- En el tramo T5 se Continuo Con el Suministro e instalacion de bordillos prefabricados.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 2 oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compct, 1 oper Motoniveladora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Edicion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se recibio por topografia de la interventoria nivel de exavacion entre absc K0+180 a la K0+150.
- Tambien se realizo Suministro e instalacion de material afirmado en primera Capa entre absc K0+180 a la K0+150 tramo T2. martinez.

* Jueves 22 de Junio de 2023

Frentes chuchumbi y 20 de Julio.


Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 insp. de Obra, 1 Siso, 6 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 oper Bobcat,

Powered by CamScanner

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.


Actividades: El día de hoy se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base entre obra Km+455,67 a la Km+420.
- Se realizo instalación de geotextil en el tramo A3 entre obra Km+370 a la Km+350 con todo el ancho de la via, y se Suministro e instalo Material afirmado.
- En el tramo de alcantarilla se continuo con la instalación de bordillos prefabricados en el lado izquierdo.





Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le Pide Celeridad al Contratista en las actividades faltantes por ejecutar.






Frentes tramos Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 insp. de obra, 8 ayudantes, 1 Bobcat oper, 1 oficios Varios.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con el Suministro e instalación de bordillos Prefabricados en el tramo T5 lado izquierdo.





Frentes tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: Se Continuo y fundito con la extension y Suministro de Material afirmado en Segundo Capa entre obsc Ko+180 a la Ko+150. tramo T2 mortinez

- Se Realizo toma de densidad a afirmado por el Contratista en la abs Ko+160. la Cual dio 94.7% Cumpliendo. tramo T2
- Se recibio por Parte de la interventoria a Capa de afirmado entre abs Ko+180 a la Ko+150.
- Se realizo Suministro e instalacion de Sub base granular entre abs Ko+180 a la Ko+150. en tramo T2.
- Se recibio por parte de la interventoria a capa de Sub base y niels entre obsc Ko+190 a la Ko+150.
- Se realizo fundida de Pavimento en tramo T2 entre obsc Ko+190 a la Ko+150.
- Se tomaron 2 Vigas Para resistencia del Concreto.
- Se toma densidad en Sub base en la abs Ko+150 la Cual dio 98.5% Cumplio

* Viernes 23 de Junio de 2023.

Frentes chuchumbi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 8 ayudantes, 1 insp de obras, 1 Sisa, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 ComisionTopografia

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Compactacion a Sub base granular en el tramo A3 del 20 de julio entre obsc Ko+455,67 a la Ko+420.

- Se Continuo con la instalacion de bordillos en el tramo chuchumbi Lado izquierdo
- las actividades se vieron afectadas debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche.

unicamente actividades despues de medio dia.

Powered by CamScanner

Frente Media Tepe.

Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 insp. de Obra, 1 fiso, 2 cayudantes, 1 oficios Varios.

Equipos: Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la instalacion de bordillos lado izquierdo tramo T5.

Frentes Tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del Tiempo: Dia Nublado

Personal obra: 1 ing Residente, 1 fiso, 1 Comision topografica, 2 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 Bobcat, 2 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientes Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de juntes a primera entre absc Kot190 a Kot150. tramo T2.

- Tambien se Continuo Con la excavacion mecanica entre absc Kot150 a la Kot100.
- Estas actividades se vieron afectadas por las lluvias Presentadas en la noche ya que iniciaron despues de medio dia las labors de excavación.

Powered by CamScanner

*Sabado 24 de Junio de 2023.

Frente chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica,
20 focos Varios, 12 ayudantes, 1 insp de obras,
1 opr Vibro Compactador, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación,
Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se recibio Por Parte de la topografia de interventoria nivel de rieles y Sub base granular entre abs- Km 455,67 a la Km 420 en el tramo A3.
- Tambien se realizo toma de densidad por parte del Contratista en la abs. Km de Cop Sub base la Cual dio Cumpliendo.
- Se realizo fundido de pavimento hidraulico entre abs Km 455,67 a la Km 425. en el tramo A3.

- Se continuo con el suministro e instalacion de bordillos en el tramo chuchurubi lado izquierdo.

Frente Media tapa.
En este frente no se este realizando ningun tipo de actividad. Se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades pendientes x ejecutar.

Frentes tramos Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 6 ayudantes, 1 insp de obra, 1 siso

Equipos: Herramientas menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con el suministro e instalación de bordillos prefabricados en el lado izquierdo tramo T5. martinez.

Frentes trabajo: Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 SISO, 2 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 comision topografica.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la excavación mecanica en el tramo T2 entre absc K0+150 a la K0+100.

* Domingo 25 de junio de 2023
No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 26 de junio de 2023

Frentes chuchunubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Nublado.
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 SISO, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat, 1 insp. de obra, 4 ayudantes, 3 oficios Varios, 1 oper Vibro Compactador.


Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación,


Powered by CamScanner

1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo excavacion manual para instalacion de bordillos en el tramo de chuchurubi.


- En el tramo 13. sector 20 de julio en la mañana se realizo evacuacion de aguas debido a las lluvias presentadas en la noche, por la tarde se retiro el material lodo y se suministro y extendio material afirmado entre absc Ko+420 a la Ko+375.





Frente Media Tapa

En este frente se continua sin realizar ningun tipo de actividad.

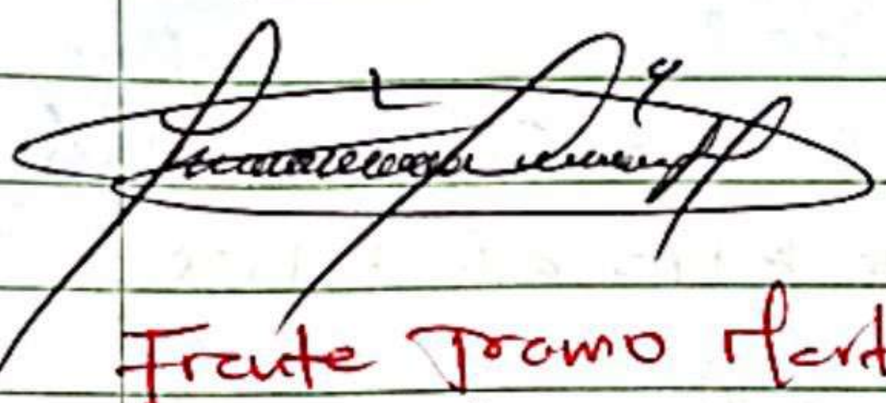




Frente Tramo Martinez T4 y T5.


Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 Insp. de obra, 1 oper Bobcat, 8 ayudantes, 1 Chofer.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.


Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalacion de bordillos lado derecho en el tramo T5 martinez.





Frente tramo Martinez T2, T2' y T7.

El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad en este frente, se realizo evacuacion de aguas debido a las lluvias presentadas en la noche del domingo.

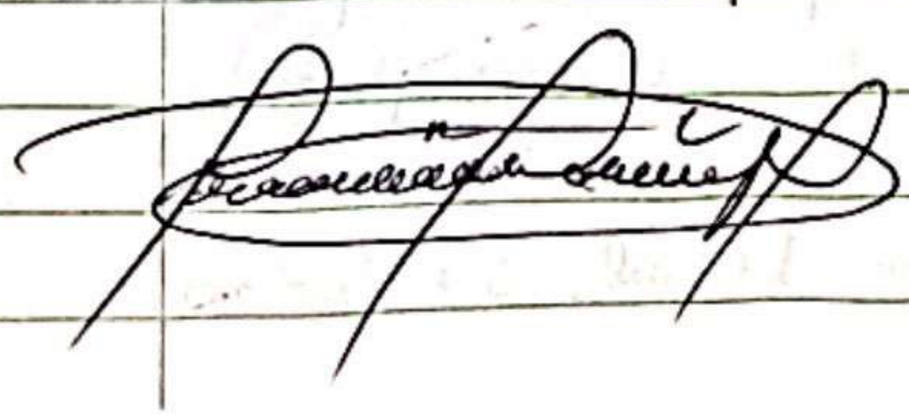



Powered by CamScanner

* Martes 27 de junio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en Obra: 1 ing Residente, 1 Fiso, 1 Comision Topografica, 1 oper. Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 8 ayudantes, 2 focos Varios, 1 insp de Obra, 4 ayudantes Bordillos.

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: Se Continuo Con la excavación e instalación de bordillos en el tramo chuchurubi ambos lados.

- El dia de hoy Se realizo liberación a nivel de afirmado Por topografia de intervención entre absc Ko+420 a la Ko+385 en el tramo A3 de 20 de julio.
- Se realizo instalacion de Sub base granular entre abs- Ko+420 - K+385 en el tramo A3. de 20 de julio.
- Se realizo liberación a nivel de Sub base y niveles Por topografia de intervención entre absc Ko+420 a la Ko+385 en el tramo A3 de 20 de julio.
- Se realizaron toma de densidades en Capa de afirmado en la absc Ko+390. la Cual dio 70,2% Cumpliendo.
- Se realizo toma de densidades en Capa de Sub base en la absc. Ko+390. la Cual dio 96,5% Cumpliendo.
- Se realizo fundida de Pavimento hidraulico entre absc Ko+425 a la Ko+385. en el tramo A3 de 20 de julio.

Frente Media Tapa.

En este frente se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad.

Powered by CamScanner

Frente tramo Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal en obra: 1 insp. de obra, 6 ayudantes, 1 fiso.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo con la instalacion de bordillos prefabricados lado derecho tramo T5 martinez.

Frente tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal en obra: 1 Oper. Motoniveladora, 1 ing Residente, 1 fiso.
1 Comisión topografica, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro.
1 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel,
1 Estación, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se recibio exoxcion por topografia de interventoria entre absc K0+150 a la K0+110.

- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en primera y Segunda capa entre absc K0+150 a la K0+110. tramo T2. Martinez.

* Miercoles 28 de junio de 2023.

Frentes chuchumbi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal en obra: 1 insp de obra, 1 fiso, 6 ayudantes, 1 oficios Varios,
1 oper Bobcat, 1 Comision topografica, 1 ing Residente

Equipos: Herramientas Menores; 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion e instalacion de bordillos Prefabricados en ambos lados en el tramo.

Powered by CamScanner

de Chuchurubi.

- Se Continuo con el Suministro e instalacion de Material afirmado en el tramo A3 20 de julio entre absc Ko+380 a la Ko+340.

Frente Media Tapa.

En este frente se Continua sin realizar ninguna tipo de actividad.

Frente Tramo Martinez TA y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 insp de obra, 4 ayudantes, 1 Siso

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con el Suministro e instalacion de bordillos prefabricados lado izquierdo tramo T5 martinez.

- Nota: Se le Solicita al SST del Contratista que señalice los bordillos que se encuentran al lado de la via para asi evitar un accidente.

Frente Tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en Obra: 1 Oper Motoniveladora, 1 ing Residente, 1 oper Vibro Compactador, 1 Siso, 1 Comision topografica, 6 ayudantes, 2 fiscales Viños. 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se recibio a Capa de afirmado por topografia de interventoria entre absc Ko+150 a la ko+110, tramo T2

- Se realizo toma de densidad por Parte del Contratista a Capa de afirmado la Cual dio 94,7% en la absc Ko+130. la Cual Cumplio.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base granular entre absc Ko+150 a la Ko+110 tramo T2. nivelizar.

Powered by CamScanner

- Se recibio capa de sub base granular y nivel por topografia de interventoria entre absc Ko+150 a la Ko+110 en tramo T2. Martinez.
- Se realizo toma de densidades a capa de sub base granular Por Parte del Contratista en la absc Ko+125. la Cual dio 98,1% Cumplido.
- Se realizo fundida de Pavimento hidraulico entre absc Ko+150 a la Ko+110 tramo T2. Martinez.
- Se tomaron 2 vigas Para resistencia de Concretos.

+ Humberto Soler

* Jueves 29 de junio de 2023.

Frentes Chuchuvbi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 oper Bobcat, 1 ing Residente, 12 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 Comision topografica, 1 oper Vibro Compactador,

Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continua Con la excavacion e instalacion de Bordillos prefabricados en el lado derecho tramo Chuchuvbi.

- Se realizo liberación de Capa afirmado por interventoria topografia entre abs Kot 310 a la Ko+340.
- Se tomo densidad por Parte del Contratista en la absc Ko+350 en Capa de afirmado la Cual dio 94.0% Cumpliendo.
- Se realizo Suministro e instalación de Material Sub base granular y Se debida Compactación entre absc Ko+380 a la Ko+340.
- Se tomo densidad por Parte del Contratista en la abs Ko+ en Capa Sub base granular. la Cual dio % Cumplicudo.
- Se realizo liberación a Sub base granular y nivel por interventoria topografia entre abse Kot 380 a la Ko+340.
- Se realizo fundida de Pavimento hidraulico entre abs Ko+385 a Ko+340 tramo A3 20 de julio.

+ Humberto Soler

Powered by CamScanner

Frente Media tapa.

En este frente se continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frente tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 resp. de obras, 6 ayudantes, 1 fino.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continua con la instalacion de bordillos prefabricados lado Izquierdo tramo T5. Martinez.

Frente tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing. Residente, 1 SSO, 1 oper Motoniveladora, 1 oper. Bobcat, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacas, Herramientas Menores.


Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre absc Ko+100 a la Ko+060. tramo T2 Martinez.

Powered by CamScanner


* Viernes 30 de junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 insp. de obras, 1 Siso, 5 ayudantes, 1 ofic. Varios, 2 ayudantes, 1 Comisión topográfica.
Equipos: Herramientas Manuales, 1 nivel, 1 Estación.

Actividades: El día de hoy se continuo con la toma de juntas y excavación para instalación de bordillos prefabricados en el tramo de chuchurubí.
- Se realizo corte de junta a permanente entre abs Km 3+315 a la Km 3+340 tramo A3 sector 20 de julio.




Frente Media Tapa.
Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad.



Frente Tramo Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 insp. de obra, 6 ayudantes, 1 Siso.
Equipos: Herramientas Manuales

Actividad: El dia de hoy se continuo con la instalacion de bordillos prefabricados lado izquierdo en el tramo T5. martinez.



Frente Tramo Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador 1 oper Bobcat, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre abs Km+100 a la Km+060 en el frente T2 martinez.

* Sabado 1 de julio de 2023

Frentes Chuchunubi y 20 de Julio
Estado del tiempo:

Powered by CamScanner

Frente Tramo Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 comision Topografica, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre abs Km 100 a la Km 060 en el tramo T2 martinez.

* Sabado 1 de julio de 2023.

Frentes Chuchurubi y 20 de Julio
Estado del tiempo: lluvias en la Mañana de 7-8 am - Dia Soleado.
Personal en obra: 6 ayudantes, 1 insp de obras, 1 Siso.
Equipos en obra: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la instalación y toma de juntas de bordillos en el tramo chuchurubi ambos lados.
- En el Sector A3 del 20 de julio Se realizo excavación de aguas lluvias

Frente Media Tapa.
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se Solicita al Contratista iniciar Con las actividades pendientes Por ejecutar como Son: Inst. de Bordillos, Sellado de juntas, Construccion de Cuneta y descoles. Se le pide celeridad en las actividades.

Powered by CamScanner

Frente Tramo Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Lluvias en la mañana de 7-8 am - dia Soleado.
Personal en obra: 1 resp de obra, 6 ayudantes, 1 Sisa.
Equipos: Herramientes Menores

Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalación y forma de juntos a Sardillos en tramo T5 lado izquierdo.

Frente Martinez Tramo T2, T2' y T7.
Estado del tiempo; Lluvias en la Mañana de 7-8 am - Dia Soleado.
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Comision topografica, 1 sisa,
1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 2 @ Fcos Varios,
1 oper Vibro Compactador.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Motobomba
Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuación de aguas lluvias producto de las fuertes lluvias que se vienen Presentado en la zona, esto afectado el avance del Proyecto.

* Domingo 2 de julio ok 2023.
N/O Se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 3 de julio de 2023 F.
No se realizo ningun tipo de actividad.

* Martes 4 de julio de 2023.

Frentes chucherubi y 20 de julio.


Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 SISO, 6 ayudantes, 1 insp de obras, 2 oficios varios.

Equipos: Herramientas menors, 1 Motobomba.


Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalación y toma de juntas de bordillos en el tramo de Chucherubi.

- En el tramo A3 de 20 de julio se realizo evacuación de aguas lluvias, esto debido a las fuertes lluvias presentada en la madrugada del dia lunes, las actividades se veron afectadas.

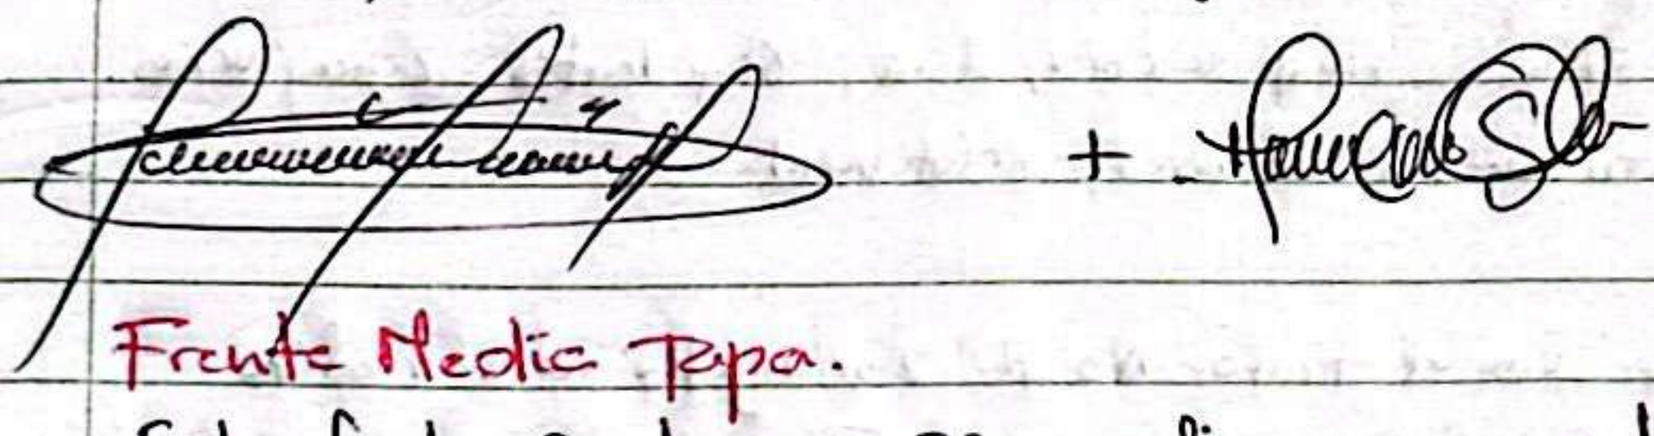

Frente Media Tapa.

Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad.




Frente tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 insp de obras, 1 SISO, 6 ayudantes.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalación y toma de juntas a bordillos prefabricados en el tramo T5.



Frente Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 SISO, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador,

Powered by CamScanner

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo evacuacion de aguas lluvias en el tramo T2, Producto de las lluvias de la madrugada del día lunes, esto afecto directamente el avance de las activ.

* Miercoles 5 de julio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio:

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Insp de obra, 1 Siso, 8 ayudantes, 2 fiscalizadores.

Equipos: Herramientas, Menores, 1 Motobomba.

Actividades: En el tramo A3 de 20 de julio no se realizo ningun tipo de actividad, El terreno Tiene mucha humedad debido a las lluvias que se vienen Presentando en la zona.

- En el tramo de chuchurubi se Continuo con la instalación y toma de juntas en bordillos en ambos lados.

Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad.

Frente Tramo Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Insp de Obra, 1 Siso, 6 ayudantes.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la instalacion y toma de juntas de bordillos Prefabricados en ambos

todos en el tramo T5. - Martinez.

Frentes Tramos Martinez. T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Sso, 1 comision topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 2 ofiaes Varios.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre abs Ko+110 a la Ko+070. tramo T2 - Martinez.

* Jueves 6 de julio de 2023.

Frentes chucherubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: lluvias en la Mañana de 7-10 am - Tarde nublada.
Personal en obra: 6 ayudantes, 1 insp de Obras, 1 Sso, 2 ofaes Varios.
Equipos: Herramientas Menores, 1 Motobomba.

Actividades: Se Continuo con la instalación y toma de juntas de bordillos en tramo chucherubi
- Se realizo demolición de monholes Con observaciones Pendientes en el tramo de chucherubi.
- En el tramo A3 de 20 de julio se realizo evacuación de aguas lluvias debido a las fuertes lluvias Presentados en la Zona.

Frente Media tapa
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad.

Frente Tramo Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: lluvias en la Mañana de 7-10 am - Tarde Nublada
Personal en obra: 1 insp de obra, 1 Siso, 6 ayudantes.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se Continuo Con la excavacion e instalación de bordillos Prefabricados lado derecho en el tramo T5 - Martinez.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7-10 am - Tarde Nublada
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 2 Oficios Varios, 1 Oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobat, 1 Vibro Compactador, 1 motobomba, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy Se realizo excavacion de aguas lluvias debido a los fuertes lluvios Presentados en la Zona, afectando el avance del Proyecto y rendimiento de las actividades.

* Viernes 7 de julio de 2023.

Frentes Cauchon bi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 8-9 am - tarde Soleada
Personal en obra: 8 ayudantes, 1 insp de obra, 1 Siso, 1 oper Bobat.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalación y toma de juntas a bordillos tramo Chuchurubi.
- llego Suministro de bordillos a tramo Chuchurubi.
- Se continuo con la demolición de manholes con observacion en el tramo Chuchurubi.
- En el tramo A3 del 20 de julio se realizo evacuación de aguas lluvias debido a los fuertes lluvias presentados en la zona.

Frente Media Tapa

Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al contratista para iniciar las actividades.

Frente Tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: lluvias en la mañana de 8-9 am - Tarde Soleada
Personal en obra: 1 Insp de obra, 1 Siso, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: Se continuo con el Suministro e instalación de bordillos Prefabricados, en el tramo T5 - Martinez.
- Tambien se realizo toma de juntas a bordillos tramo T5.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: lluvias en la mañana, de 8-9 am - tarde Soleada.
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 2 oficios Varios.
Equipos: 1 Motobomba, 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuacion de aguas lluvias debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Powered by CamScanner

* Sábado 8 de Julio de 2023.

Frentes Chuchurubi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 9 ayudantes bordillos, 1 oper Bobcat, 1 insp de Obra, 1 Siso.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: Se Continua Con la instalación de bordillos y toma de juntas en el tramo chuchurubi.

- Se realizo encofrado para fundida de manholes con observaciones en el tramo chuchurubi.
- En el tramo A3 del 20 de Julio no se realizo ningun tipo de actividad el terreno aun se encuentra muy humedo.

Frente Media Tapia

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad

Frente Tramos Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 5 ayudantes bordillos, 1 insp de obra, 1 Siso.

Equipos: Herramientes Menores

Actividad: Se Continua En la instalación y toma de juntas y bordillos en tramo T5 - Martinez.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.


Estado del tiempo: Dia Soleado


Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 3 Oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 Cuadrilla Topografica,

Powered by CamScanner


1 Oper Vibro Compactador,
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel,
1 Estación, Herramientas menores, 1 Motobomba, 1 Pyonita.


Actividades: Se Continuo Con la excavación mecanica entre obra Km+110 a la Km+070 frente 72,
- Se libero excavación mecanica Por topografia de interventoria entre obs Km+110 a la Km+070.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en Primera y Segunda capa entre obra Km+110 a la Km+070.





* Domingo 9 de julio de 2023.
NO Se realizo ningun tipo de actividad.







* Lunes 10 de julio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Insp de Obra, 9 ayudantes bordillos, 1 Oper Bobat,
1 Siso.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: Se Continua con la instalación y toma de juntas a bordillos Prefabricados tramo chuchurubi-
- tambien llego Suministro de bordillos frente Chuchurubi.
- Se realizo fundida de monholes tapas. Chuchurubi.
- En el frente A3 del 20 de julio se realizo evacuacion de aguas tanto lluvias Como aguas Servidas esto debido a que los viviendas aledañas a la via evacuan las aguas Servidas a esta.
impactado así afecto en las actividades.





Powered by CamScanner

Frente Medio Tapa.
Este frente Continua sin realizar ninguna actividad.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en Obra: 6 ayudantes bordillos, 1 insp de obra, 1 fisio
Equipos: Herramientas Menores.

Actividad: Se Continuo Con el suministro e instalacion y torno de juntas a bordillos Prefabricados en tramo T5.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sso, 1 Comision Topografica, 2 oficios Veños, 1 ope Bobcat, 1 oper Motoniveladora, 1 oper vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Pajarita, 1 Bobat, 1 Nivel, 1 Estacion, 1 Motobomba, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Cereo de Material Afirmado entre absc Kot 110 a la Kot 070.
- Se realizo toma de densidades por el Contratista a Capa de afirmado en la absc Kot 090. la Cual dio 91,2%. Cumpliendo.
- Se realizo liberacion a Capa de afirmado por topografia de la interventoria entre abs Kot 110 a la Kot 090.
- Se realizo Suministro e instalacion de material Sub base granular entre obs Ko+110 a la Kot 070 y Su debida Compct.
- Se realizo toma de densidad a Capa de Sub base en la abs Kot 090 la Cual dio 95%. Cumplendo.
- Se realizo liberacion por topografia de la interventoria a rieles y Sub base entre abs Kot 110 a la Kot 070

Powered by CamScanner

- Se realizo fundida de Pavimento hidraulico entre obra Km 110 a la Km 070 tramo T2.
- Se realizaron 2 Vigas para resistencia por interventoria.

* Martes 11 de julio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 insp de obra, 1 fiero.
1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: Se Continua Con la excavacion manual y instalación de bordillos Prefabricados en el tramo chuchurubi.

- llego suministro de bordillos a tramo chuchurubi.
- En el tramo A3. de 20 de julio, se Continua Con la evacuación de aguas Servidas y lluvias.

Frente Medio tapa.

Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 6 ayudantes bordillos, 1 fiero, 1 insp de obra.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividad: El día de hoy Se Continua Con la toma de juntas a bordillos Lado izquierdo tramo T5 - Martinez.

Powered by CamScanner

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en Obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Comisión Topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 2 oficios Varios.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobat, 1 Vibro Compactador, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de juntas a pavimento entre obsc Ro+110 a la Ro+070 tramo T2-Martinez.
- Se Continuo Con la excavación mecanica entre obsc Ro+070 a la Ro+000 del tramo T2. martinez.

* Miercoles 12 de julio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en Obra: 12 ayudantes bordillos, 1 insp de Obras, 1 Siso. 1 oper Bobcat, 1 oficios Varios.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividad: Se Continuo Con la excavacion e instalacion de bordillos Prefabricados. en el tramo de Chuchurubi.
- Se recibio Suministro de bordillos tramo chuchurubi.
- En el tramo A3 del 20 de julio no se realizo ninguna tipo de actividad el frente se encuentra muy Saturado debido a las lluvias y a los aguas Servidos que la Comunidad arroja a la Vía, se Presentaron lluvias en la madrugada.

Frente Media tapa.
Este frente Continua Sin realizar ninguna tipo de actividad.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 6 ayudantes bordillos, 1 insp de obras, 1 fiso.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: Se Continuo Con la toma de juntas a Bordillos Prefabricados lado derecho tramo T5 - Martinez.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 fiso, 1 Comision topografica, 1 oper Bobcat, 3 oficios Varios, 1 oper Pajarita, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 pajarita, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas menores.

Actividades: Se Continuo Con la excavacion mecanica entre absc Km 0+070 a la Km 0+020 en el tramo T2 - martinez.

* Jueves 13 de julio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 insp. de obras, 1 fiso, 12 ayudantes bordillos, 1 oper Bobcat,
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: Se Continua Con la excavación e instalación de bordillos tramo Chuchurubi.
- Llega Suministro de bordillos tramo Chuchurubi.
- Se inician trabajos en Sobre ancho de Curva absc. Km 0+010 - Km 0+034.

Powered by CamScanner

-En el trumo A3 del 20 de julio no se realizo ningun tipo de actividad, el terreno se encuentra aun muy Saturado

Frente Media tapa.

Este frente continua Sin realizar ningun tipo de actividad Se le pide celeridad al Contratista en las actividades faltantes Por ejecutar Como Son: instalacion de bordillos, Sellado de juntas, Construccion de Cuneta y descole.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 6ayudantes bordillos, 1insp de obras, 1Sstro.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se Continuo y finalizo Con la toma de Pega de juntas en bordillos en tramo T5 - martinez quedando esta actividad de instalación al 100%. de su ejecución.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 comision topografica, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Pajarita, 1 oper Bobcat, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, 1 pajarita, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se realizo liberación Por topografia de interventoria a excavación entre dosc Kot 070 a la Ko+020 en el tramo T2 - martinez.

Powered by CamScanner

- Se realizo instalacion de Material afirmado en Primera Capa entre abs Ko+070 - Ko+020. tramo T2.

* Viernes 14 de julio de 2023

Frentes chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: lluvias en la mañana de 7-9 am - Tarde Nublado.

Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 insp de obras, 1 oper Bobcat, 1 Oficios Varios, 1 Siso.

Equipos: 1 Bobcat, 1 Motobomba, Herramientas menores.

Actividades: De Continuo con la excavación e instalacion de bordillos prefabricados en el tramo chuchurubí.

- En el frente A3 del 20 de julio se realizo evacuacion de aguas lluvias y servidas.

Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ninguna tipo de actividad se le Pide Celeridad al Contratista en iniciar actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez TA y T5.

El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad en estos frentes.

Frentes Tramos Martinez. T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: lluvias en la Mañana de 7-9 am - tarde Nublado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Comision Topografica, 1 Siso,

1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 2 oficios Varios,

1 oper libro Compactador, 1 oper Pajarita.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuación de aguas lluvias debido a las fuertes lluvias que se vienen presentado en la zona.

* Sabado 15 de julio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 insp de Obra, 1 Siso, 12 ayudantes bordillos, 1 oficios varios, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: Se Continuo con la excavacion e instalacion de bordillos Prefabricados en el tramo chuchurubi.

- Se realizo forma de juntas tramo chuchurubi a bordillos.
- En el tramo A3 del 20 de julio no se ha realizado ningun tipo de actividad - el terreno se encuentra muy Saturado debido a las lluvias y al vertimiento de las aguas servidas de las viviendas aledañas a la vía.

Frente Medio Tipa -

Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad se le Solicita al Contratista Calendad en el inicio de las actividades pendientes por ejecutar en este tramo.

Frentes tramos Martinez T4 y T5.

En estos frentes no se realizo ningun tipo de actividad Se espera realizar toma de juntas a Pavimento.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siro, 1 Comision Topografica, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Pajarita, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, 1 pajarita, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con el Suministro e instalación de material afirmado en Segunda Capa entre absc Km 0+070 - Km 0+020 tramo Martinez T2.

* Domingo 16 de julio de 2023.
No se realizo ninguna actividad.

* Lunes 17 de julio de 2023.

Frentes Chuchunubi y 20 de julio
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 9 ayudantes Bordillos, 1 oper Bobcat, 1 Siro, 1 inspector de obra.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo, Con la excavacion e instalación de bordillos Prefabricados, tambien se realizo junta a bordillos a tramo chuchunubi.
- Se realizo Suministro de bordillos prefabricados a Chuchunubi
- Se realizo Suministro e instalacion de Material relleno a espalder de bordillos en tramo Chuchunubi.
- En el tramo A3 de 20 de julio no se realizo ningun tipo de actividad, el tramo aun se encuentra muy Saturado

Powered by CamScanner

debido a las aguas lluvias y aguas servidas vertidas a la vía de los viviendas aledaños.

Frente Media Tapa.

Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades faltantes por ejecutar. en el tramo.

Frentes Tramos Alternos T4 y T5

En estos frentes no se realizo ningun tipo de actividad se esta a la espera de la toma de juntas a pavimento, y relleno de espaldon de bordillos en ambos tramos T4 y T5.

Frentes tramos Alternos T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado


Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 SISO, 1 comision Topografia, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 2 fiscs Pròs.-

Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte a afirmado entre absc Kotoco a la Kot020. tramo T2.

- Se realizo liberación por topografia de interventoria a Capa de afirmado entre absc Kotoco a la kot020 tramo T2
- Se realizo toma de densidades por interventoria en las absc Kot020 Coml Izquierdo la Cual dio 111%. Cumplendo. y en la abs Kot020 Coml Derecho la Cual dio 110%. cumpliendo.
- Se realizo Suministro e instalación de material Sub base granular entre abs kotoco a la kot020 en el

frente T2 + maritima.





* Martes 18 de julio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.


Estado del tiempo: Dia Sabado


Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 oper Bobcat, 1 insp de obra,

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores

Actividades: Se Continuo Con la excavación e instalación de bordillos en el tramo chuchurubi.


- Se reforman trabajos de arreglo de frente en el Sobreancho de la Curva de absc Ko+034 - Ko+010. chuchurubi.
- En el tramo A3 de 20 de julio no se realizo ningun tipo de actividad.






Frente Media Tapa:


Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad Se le Solicita al Contratista Celridad en las actividades faltantes por ejecutar en este tramo.

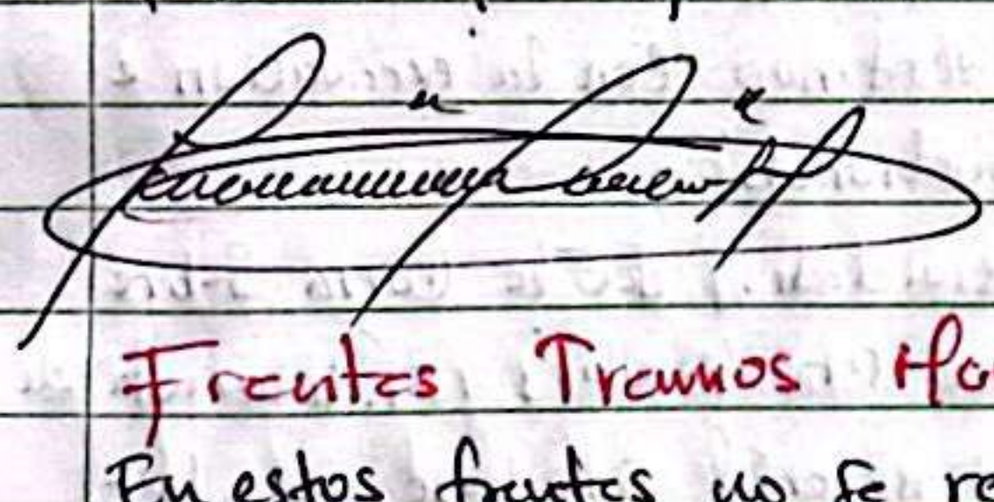




Frentes Tramos Martinez T4 y T5

En estos frentes no se realizo ningun tipo de actividad Se esta a la espera de la toma de juntas a pavimento y relleno de espaldones de bordillos en ambos tramos T4 y T5.





Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 1 ope Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 3 oficios Varios.

Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 pajarita, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores

Actividades: El dia de hoy se realizo Cerco de material Sub base granular, Compactación y regado. tramo T2
- Se realizo instalacion de rieles entre obsc Km 0+070 a la Km 0+020 tramo T2 martinez.

* Miercoles 19 de Julio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de Julio

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: Dia Soleado, 1 insp de obras, 1 Siso, 8 ayudantes bordillos, 4 ayudantes Concreto, 1 oper Bobcat, 2 oficios Varios, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores, 1 Nivel.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion e instalacion de bordillos tramo chuchurubí.
- Se realizaron las Siguientes actividades en la Curva Sobre ancho entre abs Km 0+034 - Km 0+010 Chuchurubí: Instalacion de rieles y recuperación del terreno. con material Sub base: granular, Se realizo liberacion a rieles y Sub base por topografia de interventoria.
- Se realizo armre de acero de refuerzo y se realizo fundida de Sobre ancho Curva entre obs Km 0+034 - Km 0+010 tramo Chuchurubi.

Powered by CamScanner

- En el tramo A3 del 20 de julio no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide Colaridad al contratista en las actividades.

Frente Media tapa

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 insp de obra, 6 ayudantes bordillos.

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se da inicio con la excavacion manual para instalacion de bordillos del lado izquierdo tramo Media tapa.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

En estos frentes no se esta realizando ningun tipo de actividad, se le Pide Olendad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estedo del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Sisio, 1 Comision Topografica, 6 ayudantes Concreto, 3 Oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 pajonita, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas menors.

Actividades: El dia de hoy se realizo toma de densidades Por Parte de interventoria en los abs Km0+20 lado izq y Der. los cuales Cumplieron.

- Se realizo fundida de Pavimento entre abs Km 0+70 - Km 0+20 tramo T2.

* Jueves 20 de Julio de 2023

No se realizo ningun tipo de Actividad.

* Viernes 21 de Julio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de Julio

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 insp de obras, 2 oficios varios, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la excavación e instalación de bordillos en el tramo chuchurubi.

- En el tramo A3 del 20 de julio no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frente Media tapa.

El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide Celeridad al Contratista en las actividades.

Frentes tramos Martinez T4 y T5

En estos frentes se Continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Ramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sisso, 1 Comision Topografica,
2 ofeios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Pajarita.
1 Oper vibro Compactador.
Equipos: 1 Pajarita, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel,
1 Estación, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy se recibio excavacion mecanica
Por interventoria hasta abs Katoooo tramo T2.
- Se realizo Suministro e instalacion de material afirmado
hasta absc Katooo del tramo T2.
- Se dio inicio con la excavacion mecanica en el tramo T7
entre absc Ko+137,75 en adelante.

* Sabado 22 de julio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio
Estado del Tiempo: Lluvias de 7-8am - Tarde nublada
Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 2 ofiaos Varios,
1 inspector de obra, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion e
instalacion de bordillos en el tramo de chuchurubi.
- En el tramo A3 del 20 de julio se Continua sin realizar
ningun tipo de actividad, se le pide al Contratista
retomar las actividades.

Frente Media Tapa

El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide Calendad al Contratista en las actividades.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.

En estos frentes se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide Calendad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos. Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7-8 am- tarde nublada.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 oper Payenta, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision Topografica, 2 oficios varios, 1 SISO.

Equipos: 1 payenta, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la instalación de material afirmado hasta dasc katooo tramo T2.

Domingo 23 de julio de 2023

No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 24 de julio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 10 por bobcat, 1 insp de obra, 2 oficios Varios

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion e instalacion de bordillos Frente chuchurubi.

- Se Continuo con instalación de material Para espaldon Para bordillos frente Chuchurubi

y se realizo tomo de juntas a bordillos frente chuchurubi.

- En el frente A3 del 20 de julio Continua Suspendida las actividades, Se le pide Celeridad al Contratista en el reinicio de estas.

Frente Media Tapa.

El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al contratista en retomar las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

En estos frentes se Continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide Celeridad al Contratista, en las actividades pendientes Por ejecutar.

Frentes Tramos Mortmez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografia,
4 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora,
1 oper Vibro Compactador, 6 ayudantes Concreto,
1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobat,
1 Retrita, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas menores.

Actividades: Se realizo liberacion por topografia de interventoria a material afirmado hasta la abs Kotoxx

Tramo T2
- Se realizo Suministro e instalación de material Sub base granular y su debida Compactación, hasta abs Kotoxx T2.
- Se realizo instalación de riels en tramo T2 hasta abs Kotoxx T2.
- Se realizo toma de densidades por topografia de el Contratista en la abs Kotoxx la Cual dio Ok Cumple.
- Se realizo liberacion a riels y Capa de Sub base por topografia de interventoria hasta abs Kotoxx. tramo T2.
- Se realizo fundida de pavimento en el tramo T2 hasta abs Kotoxx.
- Se tomaron 2 vigas para resistencia del Concreto.

Powered by CamScanner

*Martes 25 de julio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 insp de obra,
1 oper Bobcat, 2 oficios varios.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientos menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavación e instalación de bordillos prefabricados en el tramo Chuchurubi
- llego a obra Suministro de bordillos tramo chuchurubi.
- En el tramo A3 del 20 de julio las actividades continuan Suspendidos, se le pide celendad al Contratista. en reiniciar.

Frente Media Tapa
El dia de hoy no se realizo ninguna tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en retomar las actividades Pendients por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.
En estos frentes se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar Como Son:
Sello de juntas a pavimento, relleno espaldar de bordillos y descales.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1ing Residente, 1Comision Topografica, 1 Siso,
4 oficios Varios, 2ayudantes, 1oper Motoniveladora,
1oper Vibro Compactador, 1opor Bobcat,
1 oper Pajorita.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 pajorita, 1 Vibro Compactador,
1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de juntas a pavimento en el tramo T2 hasta absc Km 0+000.
- Se Continuo Con la excavacion mecanica en el tramo T7 hasta la absc. Km 0+100.

* Miercoles 26 de julio de 2023.

Frentes Chuchurubí y 20 de julio
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1oper Bobcat,
1 insp de Obras 2oficios Varios

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion e instalacion de bordillos Prefabricados en el tramo Chuchurubi.
- Llego Suministro de bordillos Prefabricados. y se realizo toma de juntas a bordillos en el tramo Chuchurubi.
- En el tramo A3 del 20 de julio aun Continua los actividades Suspendidos el Contratista a la fecha no reinicia actividades no ha dado explicacion alguna el porque estan Parados se le Solicita Celeridad en las actividades.

Frente Media Tapa.
El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide Celeridad al Contratista en las actividades y el Porque no ha Continuado con los mismos.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5
En estos frentes se Continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar como Asi: Sellado de juntas a Pavimentos, relleno de espaldar de bordillos y descole.

Frentes Tramos Martinez T2, T2 y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Comision topografica, 1 Siso, 4 oficios Varios, 1 opr vibro Compactador, 1 Bobcat,
Equipos: 1 Bobat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion mecanica hasta abs Kot 100. tramo T7.
- Se realizo liberación por interventoria en topografia en excavación entre abs Kot 137,75 - Kot 100 tramo T2
- Se realizo Suministro e instalacion de material afirmado entre abs Kot 137,75 a la Kot 100 tramo T7. Martinez.
- Se Averio la Maquina Motoniveladora Por que se Varo.

* Jueves 27 de julio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día Soleado - lluvias tarde de 3:30 - 5:00 pm
Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 oper Bobcat, 1 insp de obra, 2 oficios varios.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: El día de hoy se realizo toma de juntas a bordillos tramo chuchurubí
- Se continuo con la instalacion de relleno de espaldon de bordillos en el tramo chuchurubí.
- En el tramo A3 del sector 20 de julio las actividades continuan suspendidos, el contratista a la fecha no reanuda labores. se le pide celeridad en las actividades.

Frente Media tapa.
El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frentes tramos Martinez T4 y T5.
En estos frentes se continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes tramos Martinez T2, T6 y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado - lluvia en la tarde 3-5 pm.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografia, 6 ayudantes Concreto, 4 oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper. Vibro Compactador.

Equipos: 1 Bobcat, 1 pajarita, 1 vibro compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas menores

Actividades: El dia de hoy se recibio afirmado por topografia de la interventoria a nivel entre absc Km+137,76 - Km+100.T7.
- Se realizo toma de densidades a afirmado en la abs Km+ la Cual dio % Cumpliendo. T7.
- Se realizo Suministro e instalacion de material Sub base granular entre abs Km+137,76 a la Km+100 y Su debida Compactacion. Turno T7.
- Se realizo instalacion de niveles entre absc Km+137,76 - Km+102
- Se realizo chequeo de niveles a Sub base granular y niveles por topografia de interventoria entre abs Km+137,76 a la Km+102 T7.
- Se realizo fundida de pavimento entre abs Km+137,76 - Km+102 Turno T7 nocturno.

+

* Viernes 28 de Julio de 2023.

Frentes. Chuchunbi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 12 ayudantes bordillos, 1 op. Bobcat, 2 oficios Varios, 1 insp de obras.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la toma de juntas a bordillos fuera Chuchunbi.
- tambien se Continuo con la instalacion de relleno a espaldon de bordillos fuera Chuchunbi.
- En el turno A3 del 20 de julio las actividades Continuan Sus pendientes el Contratista esta fecha no inicio labores Se le pide iniciar actividades del viernte.

+

Frente Media Tpa.
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide Calendario al Contratista y anexar urgente.

Frentes tramos Martinez T4 y T5.
En estos frentes Se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide Calendario al Contratista en iniciar urgente los actividades faltantes por ejecutar.

Frentes tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 2 ayudantes Concreto, 1 oper Pajarita, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision Topografica, 4 Oficios Varios.
Equipos: 1 Pajarita, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se realizo. Corte a juntas pavimento. entre abs Ko+137,7 a la Ko+102 tramo T7.
- tambien Se Continuo Con la excavacion mecanica entre absc Ko+100 a la Ko+070 tramo T7. Martinez.

* Sabado 29 de julio de 2023.

Frentes chuchunbi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 12 ayudantes Bordillos, 1 insp de obra, 1 oper Bobcat, 2 oficios Varios.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la toma de juntas a bordillos Prefabricados frente churubusbi.
- tambien se Continuo Con la instalacion de material relleno para espaldon de bordillos en el frente churubusbi.
- En el frente A3 del 20 de julio las actividades Continuan Sin iniciar, se le Pide Celeridad al Contratista reiniciar urgentemente, de igual forma el Contratista no ha dicho el Porque tiene las actividades Suspendidas.

+.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Pide celeridad al Contratista y iniciar actividades.

+.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5.

En estas frentes se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, & le Pide Celeridad al Contratista en iniciar urgente las actividades faltantes en estos tramos.

+.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Sisso, 1 Comision Topografica, 4 oficios Varios, 1 oper Pajarita, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat,

Equipos: 1 pajarita, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavacion Mecanica entre abs Km100 - Km070 tramo T7 Martinez.

+.

Powered by CamScanner

* Domingo 30 de julio de 2023

El día de hoy, se labora en el frente 17 realizando excavación Mecánica entre abs Ko+100 - Ko+060, para adelantar y seguir avanzando.

* Lunes 31 de julio de 2023

Frentes chuchurubí y 20 de julio

Estado del tiempo: Dia Soleado - lluvias en la Madrugada.

Personal en obra: 4 auxiliares, 1 oper Bobcat, 1 insp de obras, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo Con la instalacion de material afirmado para espaldar de bordillos frente chuchurubí.

- Se realizaron diales en la abs Ko+310 frente chuchurubí.
- En el frente A3 y A4 del 20 de julio los actividades Continuan Suspendidas, se le pide celeridad al Contratista realizar de manera urgente.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad.

Frentes frentes Martinez T4 y T5.

En estos frentes se Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en ejecutar las actividades Pendientes Como son: Sellado de juntas a pavimento, relleno de espaldar de bordillos, discoles etc -

Powered by CamScanner

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Día Soleado. Lluvias en la Madrugada.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Comision topografica, 1 Sisa,
1 Oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Pajarita,
1 oper Vibro Compactador.
Equipos: 1 Pajarita, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel,
1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy en la Mañana se realizo excavación de aguas del tramo T7, debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona la madrugada del domingo.
- En horas de la tarde se continuo con la Excavacion Mecanica entre ejes Km+070 - Km+060 tramo T7 - Martinez.

Martes 01 de Agosto de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo:
Personal en obra:

Powered by CamScanner
