MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
GRUPO BIENES RAÍCES

Fecha:	Medellín, 14 de octubre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo Bienes Raíces Meval		

ACTA - - AREAD - GUBIR – 33.7

QUE TRATA DEL CUARTO COMITÉ DE OBRA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES No. 12-6-10043-25 DEL 17 DE JUNIO DE 2025, CON EL FIN DE HACER LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS Y TRAMITAR LA FACTURACIÓN DEL TERCER CORTE DE OBRA.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Lectura acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar:
   - 4.1 Verificación de avances físicos del contrato.
   - 4.2 Presentación de observaciones por parte del señor Subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá al Contratista y Supervisores.
   - 4.3 Evaluación de cumplimiento de cronograma.

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

Se hizo la verificación de asistentes quienes plasmaron las firmas y demás datos como se muestra en la planilla anexa al final del contenido.

2. Lectura del acta anterior

No aplica

3. Verificación de los compromisos

Con el propósito de fortalecer el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los proyectos en ejecución, se acordaron los siguientes compromisos adquiridos en el segundo comité de obras, así:

Compromiso	Cumplimiento / Observación
1. El supervisor técnico debe informar anticipadamente el monto estimado de facturación del tercer corte de obra al área financiera para facilitar la planificación y el trámite oportuno del pago.	Se confirma que el supervisor técnico cumplió con informar anticipadamente al área financiera el monto estimado de facturación correspondiente al tercer corte de obra, lo que permitió una adecuada planificación y trámite oportuno del pago.
2. Solo el equipo de supervisión está autorizado para tomar decisiones sobre la ejecución; cualquier instrucción debe canalizarse exclusivamente por su conducto.	Se deja constancia de que se cumplió a cabalidad con la directriz establecida, en el sentido de que únicamente el equipo de supervisión ha tomado decisiones sobre la ejecución del contrato, y todas las instrucciones han sido canalizadas exclusivamente a través de dicho equipo.

3. Se debe garantizar la ejecución continua de los recursos asignados a la MEVAL, cumpliendo con la recepción de necesidades y órdenes de trabajo para avanzar según el cronograma.	Se confirma que se ha garantizado la ejecución continua de los recursos asignados al MEVAL, cumpliendo con la recepción de necesidades y órdenes de trabajo conforme al cronograma establecido.
4. Se intervendrán los frentes de obra de forma organizada y continua, evitando inactividad prolongada para optimizar recursos y facilitar el seguimiento técnico.	Se confirma que se ha cumplido con el compromiso de intervenir los frentes de obra de manera organizada y continua, evitando inactividad prolongada y facilitando el seguimiento técnico.

4. Temas a tratar:

4.1. Verificación de avances físicos del contrato.

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Aspectos generales del contrato

CONTRATO No. 12-6-10043-25

CONTRATANTE: Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

CONTRATISTA: CONVÍAS SAS

OBJETO: *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*

Rec. 10 **$ 1.262.450.000,00**
Rec. 16 **$ 559.293.575,08**

TOTAL: **$ 1.821.743.575,08**

Total ejecutado: **$ 1.663.375.014,34** 91,31 %
Valor pendiente por ejecutar: **$ 158.368.560,74** 8,69%

FECHA INICIO: 17/06/2025
FECHA FINAL: 29/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 165 DÍAS CALENDARIO

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Estación de Policía Santa Cruz

Inicio: Del 15 de julio hasta 10 de octubre
Total: 87 días
Tiempo transcurrido: 84 días
Avance esperado: 96,55%
Avance ejecutado: 96,65 %

Actividades realizadas:


- ☐ Mantenimiento de redes hidrosanitarias
- ☐ Mantenimiento de redes eléctricas
- ☐ Mantenimiento muros y mampostería
- ☐ Mantenimiento de acabados de pintura
- ☐ Mantenimiento de acabados de pisos
- ☐ Mantenimiento de otros acabados
- ☐ Mantenimiento de carpintería metálica
- ☐ Mantenimiento de concretos, morteros y pañetes.

ACTA No. 1	
COSTO TOTAL	$ 33.046.994,64

ACTA No. 2	
COSTO TOTAL	$ 258.525.005,05

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 97.682.261,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 19.536.452,20
IMPREVISTOS	1%	$ 976.822,61
UTILIDAD	5%	$ 4.884.113,05
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 927.981,48
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 26.325.369,34
COSTO TOTAL		$ 124.007.630,34

Baterías sanitarias

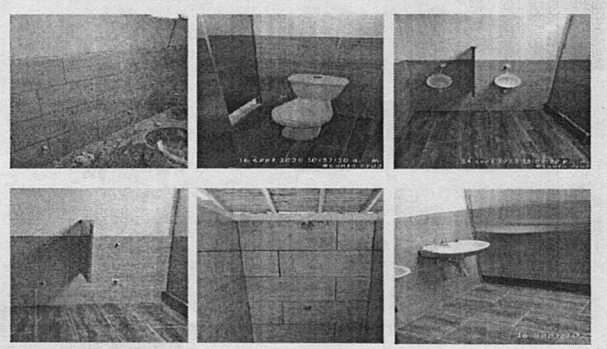

Valor: **$ 430.000.000,00**

Valor faltante por ejecutar: **$ 14.420.369,97**
Valor ejecutado a 07/10/2025: **$ $ 415.579.630,03**
Porcentaje ejecutado a 07/10/2025: **96,65%**

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Región de Policía No. 6

Inicio: Del 25 de agosto hasta 28 de noviembre
Total: 95 días
Tiempo transcurrido: 43 días
Avance esperado: 45.26%
Avance ejecutado: 100.00 %

Actividades realizadas:

- ❑ Mantenimiento de redes eléctricas
- ❑ Mantenimiento de redes de voz y datos
- ❑ Mantenimiento muros y mampostería
- ❑ Mantenimiento de acabados de pintura
- ❑ Mantenimiento de acabados de pisos
- ❑ Mantenimiento de carpintería madera


ACTA No. 2	
COSTO TOTAL	$ 14.828.124,90

TOTAL COSTO DIRECTO		$	46.767.920,51
ADMINISTRACIÓN	20%	$	9.353.584,10
IMPREVISTOS	1%	$	467.679,21
UTILIDAD	5%	$	2.338.396,03
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	444.295,25
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	12.603.954,59
COSTO TOTAL		**$**	**59.371.875,10**

Suministro e instalación de Panel Led redondo 9 y 24 w



Mantenimiento de redes de voz y datos



Valor: **$ 74.200.000,00**

Valor faltante por ejecutar: **$ 0,00**
Valor ejecutado a 07/10/2025: **$ 74.200.000,00**
Porcentaje ejecutado a 07/10/2025: **100,00 %**

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.026.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Comando MEVAL

Inicio: Del 18 de agosto hasta 15 de noviembre.
Total: 89 días
Tiempo transcurrido: 50 días
Avance esperado: 56.18 %
Avance ejecutado: 61.97%


Actividades realizadas:

- ❑ Mantenimiento de cubiertas y cielo rasos
- ❑ Mantenimiento de redes hidrosanitarias
- ❑ Mantenimiento de redes eléctricas
- ❑ Mantenimiento de redes de voz y datos
- ❑ Mantenimiento muros y mampostería
- ❑ Mantenimiento de acabados de pintura
- ❑ Mantenimiento de acabados de pisos
- ❑ Mantenimiento de otros acabados

ACTA No. 2	
COSTO TOTAL	$ 32.716.236,01

TOTAL COSTO DIRECTO		$	110.053.456,41
ADMINISTRACIÓN	20%	$	22.010.691,28
IMPREVISTOS	1%	$	1.100.534,56
UTILIDAD	5%	$	5.502.672,82
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	1.045.507,84
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	29.659.406,50
COSTO TOTAL		**$**	**139.712.862,91**

Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio



Mantenimiento de redes hidrosanitarias



Valor: **$ 278.250.000,00**

Valor faltante por ejecutar: **$ 105.820.901,08**
Valor ejecutado a 07/10/2025: **$ 172.429.098,92**
Porcentaje ejecutado a 07/10/2025: **61,97%**

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.026.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Estación de San Antonio de Prado

Inicio: Del 09 de julio hasta 11 de octubre
Total: 94 días
Tiempo transcurrido: 61 días
Avance esperado: 95,74 %
Avance ejecutado: 95,80 %

Actividades realizadas:

- ❑ Mantenimiento de cubiertas y cielo rasos
- ❑ Mantenimiento de acabados de pintura
- ❑ Mantenimiento de concretos, morteros y pañetes
- ❑ Mantenimiento de redes hidrosanitarias
- ❑ Mantenimiento de redes eléctricas
- ❑ Mantenimiento de acabados de pisos
- ❑ Mantenimiento de otros acabados

ACTA No. 1		ACTA No. 2	
COSTO TOTAL	$ 108.677.230,16	COSTO TOTAL	$ 118.247.847,30

TOTAL COSTO DIRECTO		$	55.184.283,92
ADMINISTRACIÓN	20%	$	11.036.856,78
IMPREVISTOS	1%	$	551.842,84
UTILIDAD	5%	$	2.759.214,20
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	524.250,70
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	14.872.164,52
COSTO TOTAL		**$**	**70.056.448,44**

Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente



Mantenimiento de acabados de pintura en cubierta



Valor: **$ 310.000.000,00**

Valor faltante por ejecutar: **$ 13.018.474,10**
Valor ejecutado a 07/10/2025: **$ 296.981.525,90**
Porcentaje ejecutado a 07/10/2025: **95,80%**

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.026.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Colegio Santo Domingo de Guzmán

Inicio: Del 25 de agosto hasta 28 de noviembre.
Total: 95 días
Tiempo transcurrido: 43 días
Avance esperado: 45,26%
Avance ejecutado: 84,24%


Actividades realizadas:

- ❑ Mantenimiento de redes eléctricas
- ❑ Mantenimiento de acabados de pintura
- ❑ Mantenimiento de otros acabados
- ❑ Mantenimiento de carpintería madera
- ❑ Mantenimiento de cerraduras
- ❑ Mantenimiento de otros acabados

ACTA No. 2	
COSTO TOTAL	$ 32.705.663,66

TOTAL COSTO DIRECTO		$	79.936.270,84
ADMINISTRACIÓN	20%	$	15.987.254,17
IMPREVISTOS	1%	$	799.362,71
UTILIDAD	5%	$	3.996.813,54
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	759.394,57
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	21.542.824,99
COSTO TOTAL		$	**101.479.095,83**

Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,

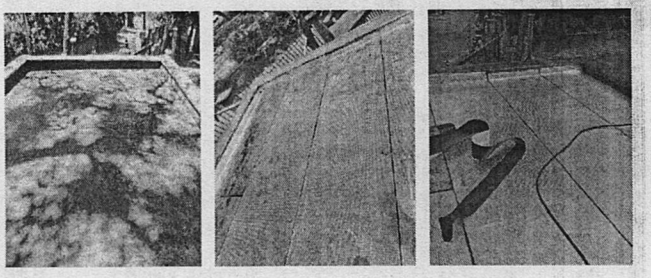

Valor : **$ 159.293.575,08**

Valor faltante por ejecutar: **$ 25.108.815,59**
Valor ejecutado a 07/10/2025: **$ 134.184.759,49**
Porcentaje ejecutado a 07/10/2025: **84,24%**

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Avance de obra

MEVAL	VALOR DEL CONTRATO	ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3	TOTAL 1, 2, 3 CORTES	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
REGION No. 6	$ 74.200.000,00		$ 14.828.124,90	$ 59.371.875,10	$ 74.200.000,00	$ -	100%	0%
MANRIQUE	$ 220.000.000,00		$ 220.000.000,00		$ 220.000.000,00	$ -	100%	0%
MEVAL	$ 278.250.000,00		$ 32.716.236,01	$ 139.712.862,91	$ 172.429.098,92	$ 105.820.901,08	61,97%	38,03%
GIRARDOTA	$ 350.000.000,00	$ 148.415.327,81	$ 201.584.672,19		$ 350.000.000,00	$ -	100%	0%
SANTA CRUZ	$ 430.000.000,00	$ 33.046.994,64	$ 258.525.005,05	$ 124.007.630,34	$ 415.579.630,03	$ 14.420.369,97	96,65%	3,35%
SAN A PRADO	$ 310.000.000,00	$ 108.677.230,16	$ 118.247.847,30	$ 70.056.448,44	$ 296.981.525,90	$ 13.018.474,10	95,80%	4,20%
COLEGIO	$ 159.293.575,08		$ 32.705.663,66	$ 101.479.095,83	$ 134.184.759,49	$ 25.108.815,59	84,24%	15,76%
TOTALES	**$ 1.821.743.575,08**	**$ 290.139.552,61**	**$ 878.607.549,11**	**$ 494.627.912,62**	**$ 1.663.375.014,34**	**$ 158.368.560,74**	**91,31%**	**8,69%**

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

- ✓ Estación de Policía Girardota
  Avance actual 100%
- ✓ Estación de Policía San Antonio de Prado
  Avance actual 95,80%
- ✓ Estación de Policía Santa Cruz
  Avance actual 96.65%
- ✓ UNDEMO 22 (Estación de Policía Manrique)
  Avance actual 100%

- ✓ Oficina de Planeación de la Región de Policía Seis
  Avance actual 100%

- ✓ Comando MEVAL
  Avance actual 61,97%

- ✓ Colegio Santo Domingo de Guzmán (COSDO)
  Avance actual 84,24%

Avance total del contrato: **91,31%**

4.2. Presentación de observaciones por parte del señor Subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá al Contratista y Supervisores.

El señor Subcomandante de la Policía Metropolitana señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ solicitó al comité definir con claridad el tema relacionado con la entrega de actividades por parte del supervisor del contrato. Expresó su preocupación por los saldos presupuestales menores que, al finalizar los procesos de ejecución, generan dudas sobre su destinación. No obstante, se aclaró en este comité que ya se definieron todas las actividades contempladas en el alcance del contrato y fueron entregadas por el supervisor, por lo que no existen tareas pendientes por definir ni por asignar.

Enfatizó que desde el inicio se establecieron los tiempos de ejecución de las obras, y que no es oportuno reconsiderar nuevas intervenciones fuera de lo planeado, ya que esto afecta la claridad del proceso para del contratista. Señaló que las demoras generan costos adicionales para ellos, por lo que insistió en mantener la objetividad y respetar lo acordado.

Adicionalmente, manifestó su preocupación por la dependencia de los recursos asignados desde el Ministerio de Hacienda. Explicó que cualquier intermitencia en la ejecución puede afectar directamente al contratista, especialmente si se presentan retrasos en la asignación de recursos.

Recordó que, en una ocasión anterior, el anterior supervisor del contrato no proyectó adecuadamente el valor del segundo pago, lo que obligó a solicitar recursos adicionales a Bogotá para cumplir con un pago cercano a los $ 878.607.549,11 millones de pesos, cuando inicialmente se había proyectado solo $ 364.348. |715,02 millones.


Por esta razón, insistió en la necesidad de finalizar oportunamente las actividades proyectadas, evitando decisiones basadas en preferencias individuales o cambios de último momento. Señaló que dejar decisiones a discreción de los comandantes de estaciones, podría generar inconsistencias y sobrecostos, además de posibles observaciones por parte de entes de control como la Contraloría.

Finalmente, reiteró la importancia de cerrar los procesos conforme a lo planeado, agradeciendo el compromiso de todos los actores involucrados y recordando que el objetivo es cumplirle al contratista de manera oportuna, especialmente ante las restricciones presupuestales que se presentan al cierre del año fiscal.

4.3. Evaluación de cumplimiento de cronograma.

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Cronograma de obra

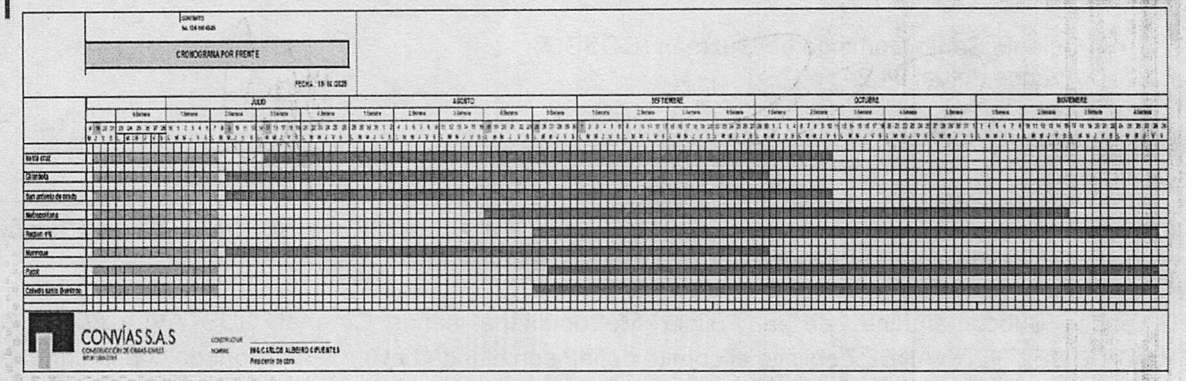

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Plazo de ejecución


LÍNEA DE TIEMPO Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

ITEM	DIAGNÓSTICO	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	TOTAL
% MINIMO EJECUCIÓN	0%	15%	35%	60%	85%	100%	100%
DÍAS	20	30	30	30	30	25	165

VALOR FACTURA POR PERIODO							
ITEM	DIAGNÓSTICO	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	TOTAL
% MINI EJECUCIÓN	0%	15%	20%	25%	25%	15%	100%
DÍAS	20	30	30	30	30	25	165
VALOR A EJECUTAR	$ 0,00	$ 273.261.536,26	$ 364.348.715,02	$ 455.435.893,77	$ 455.435.893,77	$ 273.261.536,26	$ 1.821.743.575,08
VALOR EJECUTADO	-	$ 290.139.552,61	$ 878.607.549,11	$ 494.627.912,62	-	-	$ 1.663.375.014,34

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

REGISTRO FOTOGRAFÍCO

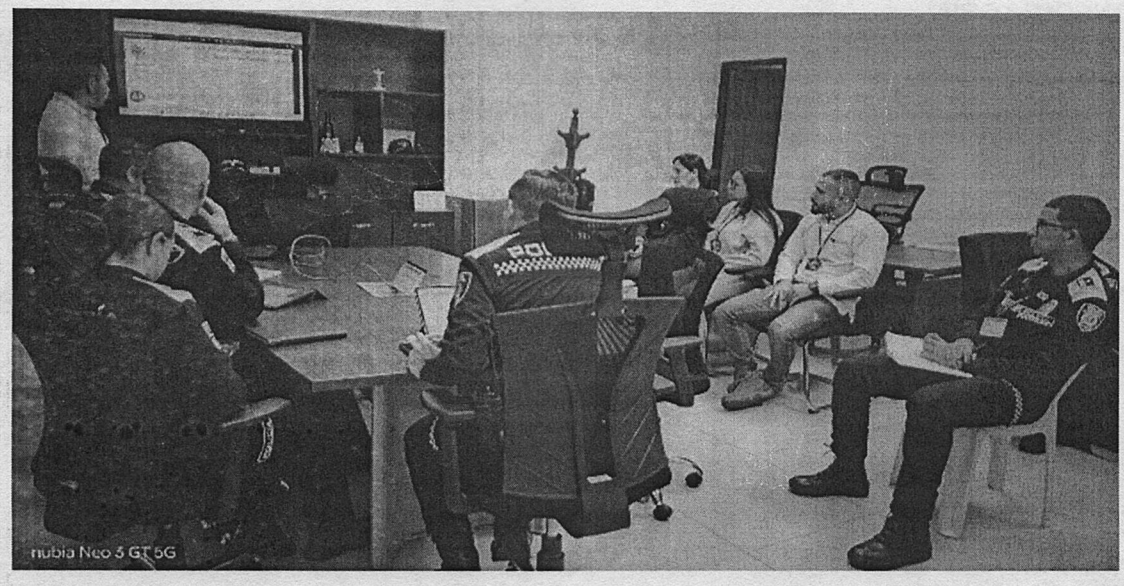

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Se establece el compromiso de que el supervisor técnico deberá brindar la debida seriedad y seguimiento a las actividades pendientes por ejecutar por parte del contratista, con el fin de evitar posibles traumatismos en el desarrollo del proyecto y garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.	Supervisor técnico	permanente
2. Ninguno de los comandantes de los frentes de obra, ni el personal ajeno a la supervisión del contrato, está autorizado para tomar decisiones relacionadas con la ejecución de las actividades. Toda instrucción o modificación deberá ser canalizada exclusivamente a través del equipo de supervisión, con el fin de garantizar el cumplimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto.	Contratista	permanente
3. Se deberá garantizar la continuidad en la ejecución de los recursos asignados a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), conforme a lo proyectado. Para ello, es indispensable cumplir con la recepción detallada de las necesidades y las órdenes de trabajo, lo cual permitirá avanzar según el cronograma establecido y asegurar una gestión eficiente y ordenada de los recursos disponibles.	Contratista	permanente
4. Finalizar oportunamente las actividades proyectadas, evitando decisiones basadas en preferencias individuales o cambios de último momento.	Contratista	permanente

CONVOCATORIA:

La próxima reunión se realizará el día 08 de noviembre de 2025; con el fin que el contratista presente el avance en cuanto a la ejecución del cronograma para el seguimiento y control del contrato de obra.

SI. JOVANNY A. CALLEJAS JARAMILLO
Supervisor Técnico

IJ. REINEL ARBEY RESTREPO BEDOYA
Jefe Grupo Bienes Raíces MEVAL (E)

Anexo: uno (lista de asistencia en 1 folio)

Elaborado por: SI. Jovanny Arbey Callejas Jaramillo
Revisado por: IJ. Reinel Arbey Restrepo Bedoya
Fecha de elaboración: 15-10-2025
Ubicación: D:\IT. RESTREPO\TRD GUBIR - 2025\2 - ACTAS\2.25 - Acta de Reuniones de Trabajo

Calle 48 45 – 58, Medellín
Teléfono 5905900 - Ext. 31354
meval.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ

Fecha:	Medellín, 14 de octubre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	11:00 horas
Lugar:	Oficina Subcomando MEVAL		

ACTA – - AREAD - GUBIR – 2.25

QUE TRATA DEL CUARTO COMITÉ DE OBRA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES No. 12-6-10043-25 DEL 17 DE JUNIO DE 2025, CON EL FIN DE HACER LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS Y TRAMITAR LA FACTURACIÓN DEL TERCER CORTE DE OBRA.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CR	Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández	SUBCO	meval.subco@policia.gov.co	86.059.886	3214281294	
MY	Yonatan Bedoya Gómez	JEFAT	yonatan.bedoya1016@correo.policia.gov.co	1.020.406.190	3046285560	
MY	Martha Cecilia Robayo Leal	GRUFI	martha.robayo2838@correo.policia.gov.co	43.925.242	3017341694	
SC	John Alberto Barrios Maldonado	TAHUM	Alberto.barrios@correo.policia.gov.co	79811629	3122575179	
IJ	Reinel Arbey Restrepo	GUBIR	Reinel.restrepo@correo.policia.gov.co	8.032.790	3043851743	
IT	Catalina Arcila Gómez	GUTAH	cindy.arcila@correo.policia.gov.co	1128278234	3116850097	Catalina A.
SI	John Edison Gómez Orrego	GRUFI	edison.gomez1268@correo.policia.gov.co	15374039	3124318645	
SI	Jovanny Callejas Jaramillo	GUBIR	giovanny.callejas@correo.policia.gov.co	71.389.997	3108403282	
	Gabriel Jaime Gomez.	convias SAS		98'562.644	3146319423.	
	Juan David Martinez R	convias SAS		1017227903	3052205625	
	Jherson J. Bocanegra R	convias sas.	convias.policia2025@gmail.com	1037667035	3178628089	

ACTA – - AREAD - GUBIR – 2.25 QUE TRATA DEL CUARTO COMITÉ DE OBRA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES No. 12-6-10043-25 DEL 17 DE JUNIO DE 2025, CON EL FIN DE HACER LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS Y TRAMITAR LA FACTURACIÓN DEL TERCER CORTE DE OBRA.

	Anyli Paola Restrepo	Convivasas	convivas.policia@gmail	1035676675	1035676675	
SI	José Manuel Garcia Pedraza	PLANE	Meval.plane-sga@policia.gov.co	1077147803	3112850080	

Calle 48 No. 45 – 58, Medellín - Antioquia
Teléfono 5905900 – Ext. 31354
Meval.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co
