ACTA PARCIAL N° 01
CONTRATO DE OBRA N° 192 DE 2025.

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	402 (06-06-2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1477 (05-09-2025)
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 24 DE OCTUBRE DE 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio, **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de contratista de obra y **JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS** R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S., en su calidad de interventoría de obra, con el fin de recibir el suministro parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 505.178.175,50
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 505.178.175,50
VALOR EJECUTADO		$ 0,00
VALOR ACTA PRESENTE	24/10/2025	$ 285.993.155,84
SALDO POR EJECUTAR		$ 219.185.019,68

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social SOI N°7991870274, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PAEZ SÁNCHEZ
Supervisor

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
Contratista de Obra

JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS
R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S
Contratista de Interventoría

Elaboró: Edwin Vargas, Contratista Apoyo Profesional secretaria de Planeación e infraestructura
Revisó: Alex Páez, Secretario de Planeación e infraestructura

CONTRATO DE SUMINISTRO		ACTA DE SUPERVISIÓN No:		1	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
192	2025	X			24	10	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA **NATURAL** **JURÍDICA X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.: 1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
DIRECCIÓN: N/A
TELÉFONO: N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
VALOR ADICIÓN N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: N/A
PERIODO REPORTADO: DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDAD
4.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
	 Se realiza verificación a actividades de localización y replanteo realizadas por el contratista de obra.
4.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	



Se realiza supervisión a actividades de excavación manual

4.03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)



Se realiza inspeccion a actividades de instalacionde subbase granular.

4.04	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).



Se realiza inspeccion a actividades de instalacionde subbase granular.

4.04	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).



Supervision a actividades de instalacion de afirmado, donde se verifica su correcta instlacion.

5.01	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)








Se realiza seguimiento a actividades de suministro e instalación de aceros, tanto para huellas, cunetas, riostras y bordillos en sentido longitudinal y transversal.

5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES

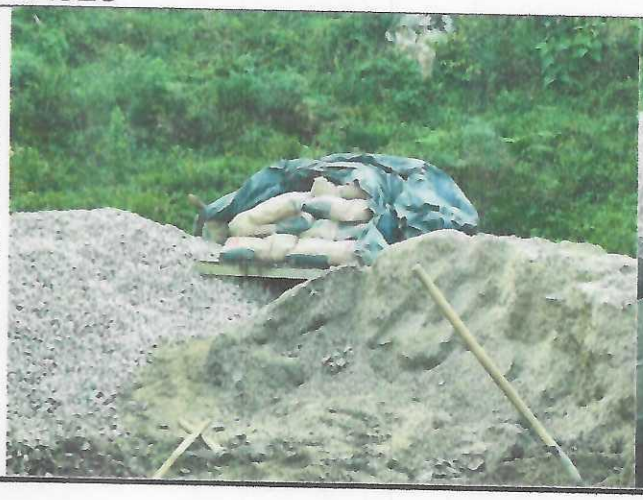




Se realizo seguimiento y verificacion a actividades de instalacion de concreto para huellas y riostras.

5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPA (3000 PSI), 60% RAJÓN PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS



	 Se hizo supervisión a actividades de instalación de concreto ciclópeo donde se verifico espesores y dimensiones que cumplieran con las especificaciones técnicas.
5.04	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
	



Se realizo seguimiento a actividades de fundición de concreto tanto para cunetas como para bordillo, verificando dimensiones.

5.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.





Se verifico el traslado de material al sitio de obra mediante el transporte en volqueta.

5.06	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)




Verificación y seguimiento a fundición de rampa de inicio y fin del tramo intervenido.

5.07	SOLADO DE LIMPIEZA PARA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO ESPESOR E = 0.03 M. 14MPa (2500PSI)
	  Se hizo seguimiento a instalación de soldado de limpieza para las rampas.
7.01	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN Y ROCA (75% ROCA) SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)
	



Se realiza seguimiento a actividades de excavación mecánica en roca y suelo natural, con el fin de ampliar la geometría de la vía a intervenir.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social con planilla SOI N°7991870274, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2025, el cual se adjunta a la presente acta y al expediente contractual.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

NR	x

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PAGO PRESENTE	SALDO POR EJECUTAR
01	$ 505.178.175,50	$ 0,00	$ 285.993.155,84	$ 219.185.019,68

SUPERVISOR

NOMBRE: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

FIRMA

Elaboro: Edwin Vargas / Contratista apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y aprobó: Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura
