JARDIN INFANTIL VERBENAL
Personal de obra. 4 oficiales
Medio caño en granillo lavado
Resanes y Estuco en Fachadas
Pintura bronzer en Fachada

Jardin INFANTIL Lugar de Recreo
Personal en obra oficiales 2.
Retiro de Polycarbonato de cubierta de Patio

R.O
Ing. Juan Rodríguez.

Residente de obra
Ing. Jhan Palomino

Asa Veces Con
Nadel de inspección

MARTES 11 de FEBRERO de 2025 Clima. Mayormente Nublado
Personal de Intervención Residente INSPECTOR Aux. SST
Personal obra 2Residentes Aux. SST

Jardin INFANTIL. EL NOGAL. Clima. Lluvias Intensas 1-3pm.
Personal en obra. oficiales.
Pintura en muro Patio interior. Resane de cielo raso Drywall
Retiro de Manto en cubierta.
Impermeabilización y aplicación de Manto en Cubierta.

Jardin INFANTIL Juan XXIII
Personal en obra. oficiales 3
Pintura de Estructuras de cubierta

Jardin INFANTIL EL VERBENAL
Personal en obra. oficial. 5
Medio caño en granillo lavado
Resanes y Estuco en Muros de Fachada.

Jardín Infantil Lugar de Niños
Personal en obra. oficiales 2
Retiro de polvo carbonato de calcio.
Instalación de Polvo carbonato de calcio.

R.O.
Ing. Juan Rodríguez

Residente obra
Ing. Jhon Palomino

Ale Valdés Cruz
Residente de Inventario

Miércoles 12 de Febrero de 2025. Clima Mayormente nublado
Personal Inventario. Residente. Inspector Aux. SST
Personal obra 2 Residentes Aux. SST.

Jardín Infantil El Vergel.
Personal en obra oficiales. clima: lluvias intensas: 2-5pm.
Resanes de cielo raso Drywall en sótano
Retoques de Pintura en Muros interiores
Despunte de fierro en cubierta
Impermeabilización y colocación de fierro en cubierta.

Jardín Infantil El Verbenal.
Personal en obra. oficiales 5
Media Caña en gradas lavada
Mantenimiento de cubierta.
Resanes y Pinturas de Muros Fachada.

Jardín Infantil Juan XXIII
personal en obra. oficiales 2
Pinturas de Estructura de cubierta.

Centro Dio. Maria Goretti
Personal en obra Vanguardia 2.
Medidas de Puerto. de contenedor. Segun. Nota. 16

R.O
Ing. Juan Rodriguez

Ing. Nelson Cano
Residente de Interventoria

DIR. OBRA

Jueves 13 de Febrero de 2025 Clima. Mayor Parte Nublado
Personal Interventoria Residente. Inspector. Aux SST
Personal obra. 2 Residentes Aux. SST.

Jardin Infantil El Negrito
Personal en obra. oficiales 7 clima: lluvias intensas 1-3pm
Inicio demolicion de enchape piso baldosas
Pintura pato interior muros
Destronque de ponton en cubierta.
Instalacion de ponton en cubierta.
Retiros de cielo raso Dry wall en sotano

Jardin Infantil Verbenal.
Personal en obra oficiales
Media caña de grasvillo lavada
Resanes y Pintura vinilo en Fachadas
Mantenimiento de Cubierta.

Jardin Infantil. Juan XXIII
Personal en obra oficiales 2
Pintura de Estructuras en Cubierta.
Retiros de Refuerzo de Estructuras.

Jornada Intensiva. Lugar de Reunión
Personal en obra 2 oficiales.
Retiro de Polisombra Cubierta.
Instalación Polisombra en cubierta.

R.O.
Ing. Juan Rodriguez.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino

Por Helios Construcciones
Representante de Interventoría

♥ VIERNES 14 de FEBRERO de 2024. Clima. Mayormente Nublado
Personal de Trabajadores Residente Inspector Aux SST
Personal obra 2Residente Aux SST. ♥

Jornada Intensiva. El Nogal. Clima. Lluvias intensas de 2-4pm.
Personal en obra oficiales
- Continuan actividades de demolición y excavación en zonas humedas
- Retiro de Mortero, y aplicación de Nuevo Mortero en alberca.
- Pintura de cuarto baño principal en sótano
- Pintura de Muros en Patio interior.

Jornada Intensiva El Verbenal
Personal en obra oficiales
- Se realizan compromisos en Cano Verde para Protejer Zona de Trabajo
- Mantenimiento de cubierta.
- Resanes y Pintura Pendiente en Fachadas.

Jornada Intensiva Arco Iris.
- Personal en obra oficiales y
Desmonte de Tejas de cubierta.

Jardín Infantil Lugar de Recreo
Personal en obra 8 oficiales
Retiro de láminas Policarbonato de cubierta.
Instalación de láminas de Policarbonato nuevas en Cubierta.

R.O.
Ing. Juan Rodríguez.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino

Ana Nelson Cruz
Residente de seguridad

Sábado 15 febrero de 2025.
Personal 1 maestro 2 oficiales 6 ayudantes
sst profesional y auxiliar sst 2 directores 2 residentes

Jardín Infantil el Nogal de la esperanza. clima: despejado
1 maestro 5 Oficiales 3 ayudantes.

Se continua con actividades de manto en cubierta cumpliendo con los protocolos SST, Instalación de enchape en zona de lavacolas, pintura de rejas con esmalte y pintura en vinilo en patio posterior.

R.O.
Ing. Juan Rodríguez.

Ana Nelson Cruz

Jardín Infantil El Recreo.: Se realiza desmonte de cubierta en policarbonato existente para instalar a totalidad los nuevos en la zona del patio y el acceso principal.

J.I. Juan XXIII: Se inicia con retiro de escombros de residuos existententes en el patio para dar la disposición solicitada.

(D) Jardin Verbenal

Se presenta en obra un personal compuesto por: 1 maestro general, 1 oficial, 1 ayudante, 2 pintores. Se continua con el mantenimiento de cubierta, pintura en fachada costado sur, y cerramiento provisional de polisombra color verde.

Jardin Arcoiris.

Existe en obra 4 personas, discriminadas así: 1 soldador, 1 pintor, y 2 ayudantes. Se continua con el corte, soldadura de perfiles 4X4 cm, para reforzamiento de cubierta, pintura sobre las mismas e instalación de teja ecoroof. Se trabajo en el pasillo del 2° piso del Jardin, entre salón de reuniones y punto fijo escalera.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino

Aux. Veliz Cen
Residente de interventoria

Domingo 16 febrero 2025

Jardín Arcoiris.

Se continua con 4 personas, en la obra, Así: 1 soldador, 1 pintor y 2 ayudantes. Se continua con pintura sobre perfiles y montaje de teja ecoroof.

J.I. El Nogal de la Esperanza.

Se realiza el cambio de enchape en lavacolas solo en zona horizontal, dejamos la claridad que al dejar existente el vertical de los soportes no va a dar escuadra en sus esquinas.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino.

Asesor técnico Cam
Pedro de Intervenciones

Lunes 17. febrero 2025.

Jardín verbenal
Se cuenta con 3 personas en obra, así. 1 maestro general, 1 oficial, 1 ayudante. Se inicia con la instalación de tubería Sanitaria.
Jardín Buena vista
Se registran 3 personas así: 1 maestro general, 2 ayudantes Se inicia con el mantenimiento de cerramiento perimetral en malla eslabonada.

J.I. El Nogal de la Esperanza. Se recibe visita técnica de personal especialista del ascensor para ver la posibilidad de iniciar el funcionamiento de este. Se finaliza instalación de enchape en zona de lavacolas.

J.I Maria Goretti. Se instalan mediacañas esquineros en cocina y se instala puerta en coll-roll en acceso

C.D.I. Maria Goretti. Se instalan mediacañas esquineros en cocina y Puerta en collroll en acceso de Cocina.

C.J. Nasgua. Se realiza visita técnica para instalación de tanque de 500 lts. y válvula cheque

R.O.
Ing. Juan Rodriguez.

DIR. OBRA

Martes 18 febrero 2025

Jardín Verbenal
Se registran 3 personas en obra así: 1 maestro general, 1 oficial, 1 ayudante. Se hace recepción de recebo B-600, para los rellenos, en el cárcamo existente. El material, se acopia de manera parcial, en la esquina nor-occidental del Jardín. Se continua con instalación tubería sanitaria 6".
Jardín Buenavista
Se registran 3 personas, en obra así: 1 maestro general, 2 ayudantes; Se continua con el mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada.
JI. SAN LUIS: Llega cubierta ecoroof suministra para reemplazar la zona central.
JI El Nogal de la Esperanza. Continua instalación de Manto Asfáltico, retiramos el existente en lonas acumulando para finalización y disposición como residuo peligroso.

Residente de obra
Ing. Juan Palomino.

R.O.
Ing. Juan Rodríguez.

Arq. Nelson Cruz
Residente de interventoría

Miercoles 19 febero 2025
Jardín verbenal. Existen 3 personas en oba, así: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante. Se inicia el relleno con recebo B-600 del cárcamo ubicado en el sector sur. del Jardín.
Jardín Buenavista. Existen 3 personas así: 1 maestro general, 1 oficial y 1 ayudante. Se continua con el mantenimiento del cerramiento en malla eslabonada.

JI. Maria Goretti. Se finaliza instalación de mediacaña esquineros verticales en cocina.

Jueves 20 febrero 2025

Jardín Verbenal. Se registran 3 personas en obra, así: 1 maestro general, 1 oficial, 1 ayudante. Se lleva a cabo, la instalación de malla electrosoldada 15x15 cm x 5mm, 4 sifones con rejilla en aluminio 6" x 4", y fundida en concreto 3000 de losa de piso.

Jardín Buenavista. Se tiene un total de 3 personas en obra discriminadas así: 1 maestro general, 2 ayudantes. Se realiza el desmonte de sifón y grifería de lavamanos de niño, y montaje del sifón y grifería, en el mismo aparato sanitario.

- Diagnostico Porton lote propiedad de SDIS TENSAQUILLO.
  Se realiza visita técnica para realizar el cambio del porton deteriorado del lote de tensaquillo en compañía del Ingeniero Carlos Galeano quien nos indica el alcance del diagnostico a presentar.

- JI. Nogal de la Esperanza. Se finaliza intalación de manto asfaltico en cubierta en zona de placa y ascensor adicional la zona perimetral que colinda con el parqueadero vecino. Se inicia impermeabilización de foso del ascensor para luego impermeabilizar.

JI. Maria Gaetti: Se da inicio a la demarcación de la rampa para ingreso desde el primer piso por la zona externa.

CJ. Nasqua. Se da inicio a las regatas para nuevo punto de conexión de tanque de 500 litros

JI. JUAN XXIII: Se inicia demolición de placa existente en patio de niños.

JI. SAN Luis: Se da inicio al montaje y ensamble de cubierta Ecoroof para patio de niños en zona central.

VIERNES 21 FEBRERO. de 2025. Clima: Despejado
Personal Interventoría Residente, Inspector y auxiliar SST
Ersonl Contratista: Director, 2 residentes y Aux: SST.

CENTRO DÍA GORETTI: Se inicia recorrido para entrega formal a la coordinadora de la unidad operativa, se identifica pendiente el anqueo en la zona de deposito y frutas, y el tapaluz de la puerta de acceso a la cocina. Mediacañas en cocina falta 3 y rematar empalmes. Deposito de alimentos, deposito de verduras, La puerta adicional del comedor que fue aprobada en la NOTA: 16 (12 febrero) se instalara el día lunes 24 febrero. Estos trabajos se entregaran a satisfacción el día martes 25 febrero/25.

JARDÍN INFANTIL MARÍA GORETTI: Se inicia recorrido de entrega formal a la coordinadora de la unidad operativa identificando pendientes el tapaluz de la puerta de acceso a cocina y malla de protección en baranda de acceso externo con compromiso de entrega el 25 Febrero/25 y de esta manera dejar entrega a satisfacción.

Jardín Infantil El Nogal de la Esperanza: Se inicia recorrido con la coordinadora limpieza y aseo fino de la grama del sotano en ascensor, puntos fijos escaleras se sopla la pintura en el esmalte inferior. Cielo raso de comedor donde se ve pandeado Se realizara remate en pasillos primer piso columnas metalicas Remate en baño de niños Primer piso. Segundo piso cielo raso cubierta en aula multiple, disposición de aseo general para entrega a satisfacción el día miercoles 26 de febrero/2025. Remate lavacolas: Cielo raso Rematar pintura salón caminadores. Cielo raso fachada

cambio de toma electrica en cocina, breaker en el tablero general de circuitos; como tambien se continua con el mantenimiento del cerramiento.
Jardín Tibabita. Se realiza el desmonte de 3 ventanas en el primer piso del Jardin. Esto se realiza mediante 3 operadores.
Jardín Verbenal. Se presenta un total 2 pintores en obra. Realizando pintura de fachada en la ubicada en el sector sur.

JI. JUAN XXIII: Se identifica que es necesario el reajuste o la validación del descole de aguas lluvias para redefinir los trazados de la tubería pluvial y sanitaria.

JI. SAN LUIS: Se finaliza la instalación de nueva cubierta en la zona central del patio pero se identifican goteras en las cubiertas existentes antiguas se define realizar mantenimiento una vez se aprueba por la interventoría y la entidad.
C.J. Nasgua. Se inicia ensamble de tubería para suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 500 lts.

Residente obra
Ing. Juan Palomino.

R.O.
Ing. Juan Rodriguez.

Arq. Vanessa Cano
Residente de interventoría

DIR. OBRA

Sabado 22 febrero 2025.
Jardín arcoiris. Se presenta un total de 4 operadores. 1 soldador, 1 pintor, 2 ayudante. Se realiza corte, pulido y soldadura de perfiles 4x4cm, como refuerzo de abierta, ubicada en el jardin central de arcoiris.
Jardin Tibabita. Se presenta un total de 3 operadores de

en el sur del jardín, implementando 2 pintores.

J.I Nogal: Se hace el retiro del residuo peligroso del manto asfaltico existente para la disposición adecuada por la empresa certificada.

J.I. Maria Goretti: Se entregan a satisfacción las observaciones sugeridas y adicional se intala baranda microperforada en el perimetro de la rampa.

CDC. Maria Goretti: Se entregan a satisfacción observaciones de acta de entrega.

Residente obra
Ing. Jhan Palamino.

Aux. Visita Con
Ing. Juan Rodriguez.

Domingo 23 febrero 2025
Jardín arcoiris. Se continua con instalación de la teja ecoroof en el sector central del jardín; se presenta un personal operativo, discriminado así: 1 pintor, 1 soldador, 2 ayudantes.

C.J Nasgua: Se desmonta el cielo raso existente de la cocina para el suministro y la instalación del tanque de almacenamiento de 500 lts en la placa del baño del tercer piso, Se intala tambien válvula cheque para evitar el retorno de agua en los racionamientos de agua.

Lunes 24 febrero 2025.

Jardín Buenavista. Se realiza la instalación del extractor de aire en el baño, del aula de caminadores. Se continua con el mantenimiento del cerramiento en malla eslabonada, con la instalación de tramos de malla, soldadura de angulo 2", y pintura sobre la misma. Existen 6 operadores en obra.

Jardín Verbenal.

Se realiza el desmonte del cerramiento provisional en polisombra color verde en el sector sur; también lleva a cabo el sondeo de tubería sanitaria, presente en el lavadero y poceta de lavatraperos. Existe 3 operadores de obra.

J.I. JUAN XXIII. Se realiza retiro de escombros y material de excavación a lugar certificado y apto para la disposición final. Se inicia compactacion de relleno en recebo B-200.

J.I. SAN LUIS: Inicia mantenimiento de cubierta general

J.I. El Recreo: Se realiza entrega. a coordinadora de los trabajos realizados de pintura, antideslizantes y cubierta nueva en policarbonato con el mantenimiento de la existente.

Residente de obra
Ing. Jhon Palomino

R.O
Ing. Juan Rodríguez

Por Veeduría Control
residente de interventoría

Martes. 25 febrero 2025.

Jardín Buenavista. Se realiza soldadura y tensionamiento de malla eslabonada instalada, pintura esmalte color verde; se presenta

obra civil.

J.I. JUAN XXIII: Se cumple con las densidades del relleno en recebo B-200 se solicita por parte de la interventoría diseño de mezclas y la toma de muestras de concreto en el momento de la fundida.

J.I. SAN LUIS: Se continua con el cambio de tornillería y limpieza de vigas canales y bajantes. Se solicita diseño para los piso Cauchos en patio del Jardín.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino.

Residente de Obra
Ing. Juan Rodríguez.

Ana Residente de interventoría

Miercoles 26 febrero 2025.
Jardín Buenavista. Se realiza excavación manual en el sector sur, se continua con mantenimiento de Ceramiado. Existen 6 personas en obra.
Jardín Verbenal. Se lleva a cabo la finalización de la instalación de cerramiento provisional en polisombra verde, en el sector norte. Tambien se inicia el relleno con recebo B-500, en el carcamo ubicado sector norte. Exiten 3 operadores de obra civil en el sitio.

J.I. JUAN XXIII: Continuan con pintura de Comedores segundo piso y cerchas de cubierta de color blanco, se inicia mantenimiento de cubierta existente.

J.I. SAN LUIS

J.I. El Nogal. Se solicita visita para atender nuevos requerimientos para revisar balance presupuestal y agregar nuevas actividades solicitadas por la coordinadora y supervisora del SDIS.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino.

Residente de Obra
Ing. Juan Rodríguez

Ana Nelson Cruz
Residente de Interventoría

Jueves 27 febrero 2025

Jardín Verbenal. Se presenta en obra un total de 3 personas. Se continua con el relleno B-600, en el sector norte del Jardín.

Jardín Buenavista. Existe en obra un total de 6 personas; se continua con mantenimiento de cerramiento perimetral en malla eslabonada.

J.I. La ciudad que soñamos: Se realiza visita en conjunto con la interventoría para realizar diagnóstico

J.I. JUAN XXIII: Se verifican esposores para la entrega a la interventoría e inicia instalación de malla electrosoldada.

J.I. SAN Luis: Se finaliza el mantenimiento de cobierta existente.

DIR. OBRA

Residente obra
Ing. Jhon Palomino.

Ana Nelson Cruz
Residente de Interventoría

Residente de Obra.
Ing. Juan Rodríguez.

Jardín arcoiris. Se continua con la instalación de la teja ecoroof, en el Jardín central del Jardín. arcoiris. Se presenta en obra un total de 3 operadores.
Jardín Rincon. "Centro Crecer". Se presenta en obra 3 personas. Se realiza el desmante de teja en policarbonato, y domos plasticos.

J.I JUAN XXIII: se reportan fuertes lluvias se protege recebo B-200 con plástico pero se debe disponer de buen clima para que oreé y este en óptimas condiciones previo a la fundida.

CDC. SIMON BOLIVAR: Se realiza visita para definir el alcance en esta unidad Operativa en conjunto con la Interventoría y el Coordinador.

Residente de Obra.
Ing. Juan Rodríguez.

Sábado 1 marzo 2025
Jardín Rincon "Centro crecer". Se presenta 3 personas en obra. Se realiza la instalación de cubierta en lámina policarbonato y teja plastica ecoroof.
Jardín Arcoiris. Se continuac con la instalación de teja ecoroof, y pintura sobre perfiles 4X4cm, ubicado en el jardín central de la institución.
Jardín Helvetia. Se realiza desmante de teja, e instalación de teja ecoroof. Esto se lleva a cabo con 2 personas.
Jardín Titabita. Se realiza la instalación de 4 ventanas, en el 2° piso de la institución. Se presenta un total de 5 personas en obra.

J.I. SAN LUIS: Se aprueba por parte de la interventoría y la entidad SDIS diseño para el piso caucho.

C.J. NASQUA: Se realizan remates y se subsanan observaciones de pintura por regatas realizadas.

R.O Ing. Jhon Palomino — R.O Ing. Juan Rodriguez.

Domingo 2 marzo 2025.

No se realizarón actividades en ninguna unidad operativa ya que se cumple con el cronograma y el personal ha trabajado de domingo a domingo.

Ing. Jhon Palomino. — R.O Ing. Juan Rodrig

Lunes 3 marzo 2025

Jardín Verbenal. Finaliza el relleno con recebo B-500 en el cárcamo ubicado en el sector norte del jardín. Se instaló restante de tubería sanitaria 6". Se presenta 4 personas obra. Tambien se realiza pintura de fachada en el sec norte.

Jardín Bueravista. Se realiza instalación de polietileno en excavación del costado sur. Se realiza el relleno con ma seleccionado en el mismo lugar; Se continua con mantem de cerramiento. Se presenta en obra un total de 6 p

J.I. JUAN XXIII: Se continua con pintura y mantenimi de cubierta. Se aprueba por la interventoría

J. I. El Nogal de la Esperanza: Se solicito por parte de la entidad arreglar bateria de baños de movilidad reducida por dos baños linea infantil con lavamanos.

Residente obra
Ing. Jhon Palomino.

R.O.
Ing. Juan Rodríguez

Dna Veiber Cano
Auxiliar de Interventoria

Martes 04 marzo 2025

Jardín Veiberal. Se realiza la fundida de losa de piso en concreto 3000 psi, en el costado norte. Se presenta un total 3 obreros en el lugar.

Jardín Buenavista. Se continua con el mantenimiento de cerramiento con aplicación de pintura esmalte color verde, e instalación de concertina metalica.

JI. JUAN XXIII: Se inicia fundida de placa en Concreto 3000 PSI. Con espesor de 15 cm. con malla electrosoldada de 5mm. con sus respectivos separadores para garantizar el recubrimiento. se toma prueba de asentamiento y cilindros de concreto para el laboratorio se realizarán prueba por Compresión a los 7 días, 14 días y 28 días. Se continua con mantenimiento, pintura de vigas y columnas.

JI. SAN LUIS: Se retira material sobrante de cubierta existente y se realizan actividades de orden y aseo.

DIR OBRA

Miercoles 05 marzo 2025
Jardín Verbenal. Se realiza el desmonte de enchape de lavadero, y se instala nuevo material. Lavadero ubicado en el espacio cuarto de aseo. Se continua el mantenimiento de cubierta en el sector sur.
Jardín Buenavista. Finaliza la aplicación de pintura esmalte color verde; se continua con la instalación de concertina. Se presenta un total de 6 personas en obra.

JI. JUAN XXIII: se continua con el riego de agua para el curado de la placa de concreto, continua mantenimiento de cobierta, pintura en vinilo y esmalte. Se retiran lonas de escombro para la disposición final al lugar autorizado.

CDC. SIMÓN BOLIVAR: Se realiza visita con el coordinador para autorizar nuevos trabajos y alcance de actividades de mantenimiento.

Residente obra Ing. Juan Palomino
R.O Ing. Juan Rodriguez

Jueves 06 marzo 2025.
Jardín verbenal. Construcción de caja de inspección 60x60, esquina noroccidental. Se realiza desmonte de cerramiento provisional en polisombra color verde, sector norte. Se realiza aseo general. Se presenta 3 personas en obra.
Jardín Buena vista. Se finaliza la instalación de concertina, como tambien los retoques de pintura y tensionamiento de malla eslabonada. Se realiza entrega de las obras a la coordinadora del Jardín, de igual manera el manual de mantenimiento respectivo

CDC. SIMON BOLIVAR: se solicitan permisos de acceso ya que no se permitio el acceso a la unidad operativa por ausencia del coordinador y no hay registros para autorizacion de acceso al teatro por eventos previos.
J.I. servita: Se realiza visita para determinar cobierta para diagnostico
COLISEO SIMON BOLIVAR: se realiza recorrido para realizar diagnostico de mantenimiento.

Ing. Jhon Palomino.

Ing. Juan Rodriguez.

Dic. [illegible] Comunidad [illegible]

Viernes 07 marzo 2025
Jardín Vivabita. Se realiza el desmonte de 4 ventanas, 2 en primer piso y 2 en segundo piso. Se realiza resane perimetral en los vanos de los ventanas.
Jardín Ascoris. Se realiza la instalación final de la teja ecocof en el jardín. Se continua con retoque de pintura en perfiles metalicos 4x4cm; se inicia mantenimiento en canal agua lluvias. Se presenta un total de 3 personas en obra.
Jardín Verbenal. Se realizó instalación de cinta plastica y reparación juntas de fachada norte. De igual manera aplicación de pintura de colores en el mismo sector.

C.J. Nasqua: se realiza entrega formal a la coordinadora manifiesta que tanque de almacenamiento cumplio con el abastecimiento delos días de racionamiento se firma acta de entrega con manual de mantenimiento

J.I JUAN XXIII: Se finaliza actividad de pintura y se programa instalación de piso caucho el placa

Sabado 08 marzo 2025

Jardín Arcoiris. Se continua con mantenimiento de canal agua lluvia, Se realiza pintura esmalte en fachada principal, se lleva a cabo instalación de flanche metálico y cinta asfaltica en la cubierta del Jardín central.

Jardín Tibabita. Se realiza el montaje de 4 ventanas, 2 en primer piso y dos segundo piso. Se presenta un total de 4 personas.

CDC Simon Bolivar: Se inicia con desmonte de cielo raso en teatro zona de proyección, con el inspector de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Ing. Juan Palomino — R. Obra Ing. Juan Rodriguez.

Lunes 10 marzo 2025

Jardín Verberal. Se realiza la aplicación de manto impermeable en el lavadero, ubicado en el cuarto de aseo, Se realiza mantenimiento de cubierta, en la portería. Se presenta un personal total de 3 operadores.

J. I. El Nogal de la Esperanza: Se inicia desmonte de sanitario de movilidad reducida para adaptar dos puntos de linea infantil y un lavamanos en zona de caminadores. Se solicita el enchape del lavatraperos en la zona de lavado y adicional enchapar acceso de escalera principal en la zona del sotano.

martes 11 marzo 2025.
Jardín verbenal. Se realizo la fundida de las tapas de inspección 60x60 y 80x80, y tapas de concreto para cárcamo en el sector occidental del Jardín.

J.I JUAN XXIII: se comple con el resultado del concreto con una resistencia de los 7 días = 80% para dar aprobación de la instalación del piso caucho.

J.I. Nogal de la Esperanza: se finaliza instalación de dos sanitarios linea infantil y un lavamanos se aclara que estas actividades se autorizarón una vez se habia realizado la entrega a la SDIS. Como fruto del balance. Se autorizan como nuevas actividades para este centro

Ing Jhon Palomino

Ing. Juan Rodriguez.

DIR OBRA

miercoles 12 marzo 2025
Jardín verbenal. Se inicio con la construcción de caja de inspección 60x60 cm. El personal presente en obra esta compuesto por 1 maestro, 1 oficial y 1 ayudante.

J.I. JUAN XXIII: Se inicia con la instalación de la base en caucho color negro. Se solicita a la interventoría autorizar la protección con plástico para proteger por posible lluvias presentadas en prónosticos del tiempo.

CDC. SIMÓN BOLIVAR: Se inicia instalación de cieloraso en PVC para zona de proyección en teatro. Desmonte de puerta con reja metalica y malla eslabonada existente deteriorada 3 paneles sobre el perimetro de la calle.

Jueves 13 marzo de 2025

Jardín Verbenal. Se realiza Corte, demolición de piso, para instala de tapa en concreto 60x60, ubicado en sector nororiental.

J.I. JUAN ~~XXIII~~; se procede a la instalación de piso caucho color según diseño para finalización de esta unidad operativa, se aclara que no se debe utilizar aún el área hasta en dos días calendario siguiente para lograr tiempos de secado y adherencia.

CDC. SIMÓN BOLIVAR; Se inicia instalación de nuevo portón en parqueadero de acceso y se soldan nuevos modulos de malla eslabonada en el perimetro del cerramiento autorizado 3 modulos.

Ing. Jhon Palomino

Ing. Juan Rodríguez. Residente de

Viernes 14 marzo de 2025

Jardín arcoiris. Se realiza instalación de flanche, perfil en alu en marco de acceso a patio, pintura de fachadas, mantenimien de canal agua lluvia en PVC.

Jardín Tibabita. Se realiza resane sobre marco de ventanas instaladas.

Jardín Verbenal. finaliza construcción de caja inspeccion co ubicada en sector nororiente.

J.I. JUAN ~~XXIII~~; Se realiza entrega formal con acta de entrega a la coordinadora encarguda a satisfacción en conjunto con la interventoría.

J.I. SAN LUIS: Se inicia con retiro y desmon de piso caucho existente en patio posterior.

Sábado 15 marzo de 2025

Jardín arcoiris. finaliza instalación de flanche, pintura de fachada, mantenimiento de canal agua lluvia en PVC.
Jardín Tibabita. Se realiza resane con estuco plastico en vanos de ventanas instaladas. se aplica pintura en muros interiores

J.I. SAN LUIS: Se inicia instalación de piso caucho color negro para la primera base.

CDC. SIMON BOLIVAR: se realiza pintura de portón para puerta de acceso y los 3 modulos del cerramiento perimetrial, se continua con instalación de cielo raso en zona de proyección teatro. se inicia con el lijado y estuco de paredes.

Ing. Jhon Palomino

Domingo. 16 marzo de 2025

No se realizan actividades en ningún frente.

17 marzo de 2025, Lunes.
Jardín Verbenal. Se realiza el desmonte de piso plastico módular en el aula de maternidad.

CDC: Tierra de saberes: Se inicia con visita para realizar actividades en centro día se proyecta pintura de cancha, intalación de ventanería en aluminio. cambio de Hongo extractor en cocina.

CDC. SIMÓN BOLIVAR, Se finaliza intalación de cielo raso en PVC. Se continua con pintura en muros de zona de proyección teatro.

Ing. Jhon Palomino

R.O.

Ing. Juan Rodríguez

martes 18 marzo de 2025
Jardín Verbenal. Se realiza aplicación de: Super mastico, para nivelar la superficie del piso desmontado previamente. Se instala. Sifones de piso en el Jardín costado noroccidente.
Jardín Tibabita. Se inicia pintura de fachada, con resane sobre los vanos de las Ventanas instaladas.

CDC. Tierra de Saberes: Se inicia con limpieza de dilatación de cancha múltiple.

J.I. SAN LUIS, Se inicia la instalación de color del piso caucho para zona de patio posterior del jardín.

CDC. SIMÓN BOLIVAR; Se continua con actividades

miercoles 19 marzo de 2025
Jardín Verbenal. Se realiza la instalación del tapete plastico en el aula de maternidad, tambien se aplica pintura interior en la portería
Jardín Tibabita. Se inicia la pintura de fachada del Jardín.

J.I. SAN LUIS: Se realiza entrega formal a coordinadora de la unidad operativa.

SIMÓN BOLIVAR: Se finaliza pintura de zona de proyección en teatro, se deja escotilla en PVC para el acceso a cubierta y realizar mantenimiento en cubierta,
CDC. Tierra de Saberes; se continua con limpieza de dilataciones de cancha múltiple.

Ing. Juan Palomino Ing. Juan Rodriguez. DIR. OBRA

Jueves 20 marzo de 2025
Jardín Verbenal. Se inicia con el resane sobre muros, en el aula de maternidad, como tambien instalación de cartón en el piso para protección del piso plastico instalado.
Jardín Tibabita. Se realiza aplicación de masdico sobre la superficie de piso, para realizar nivelación de la superficie; se continua con la pintura de fachada.

SIMÓN BOLIVAR: Se inicia con instalación de puertas en shut de basura,

CDC. Tierra de Saberes: se realiza desmonte de hongo extractor en cocina.

miercoles 19 marzo de 2025
Jardín Verbenal. Se realiza la instalación del tapete plastico en el aula de maternidad, tambien se aplica pintura interior en la portería
Jardín Tibabita. Se inicia la pintura de fachada del Jardín.

J.I. SAN LUIS: Se realiza entrega formal a coordinadora de la unidad operativa.

SIMÓN BOLIVAR: Se finaliza pintura de zona de proyección en teatro, se deja escotilla en PVC para el acceso a cubierta y realizar mantenimiento en cubierta,
CDC. Tierra de Saberes; se continua con limpieza de dilataciones de cancha múltiple.


Ing. Juan Palomino Ing. Juan Rodriguez. DIR. OBRA

Jueves 20 marzo de 2025
Jardín Verbenal. Se inicia con el resane sobre muros, en el aula de maternidad, como tambien instalación de cartón en el piso para protección del piso plastico instalado.
Jardín Tibabita. Se realiza aplicación de masdico sobre la superficie de piso, para realizar nivelación de la superficie; se continua con la pintura de fachada.

SIMÓN BOLIVAR: Se inicia con instalación de puertas en shut de basura,

CDC. Tierra de Saberes: se realiza desmonte de hongo extractor en cocina.

Domingo 23 marzo de 2025.
Jardín Verbenal. Se continua con la construcción de la caja de inspeccion 80x80 cm.

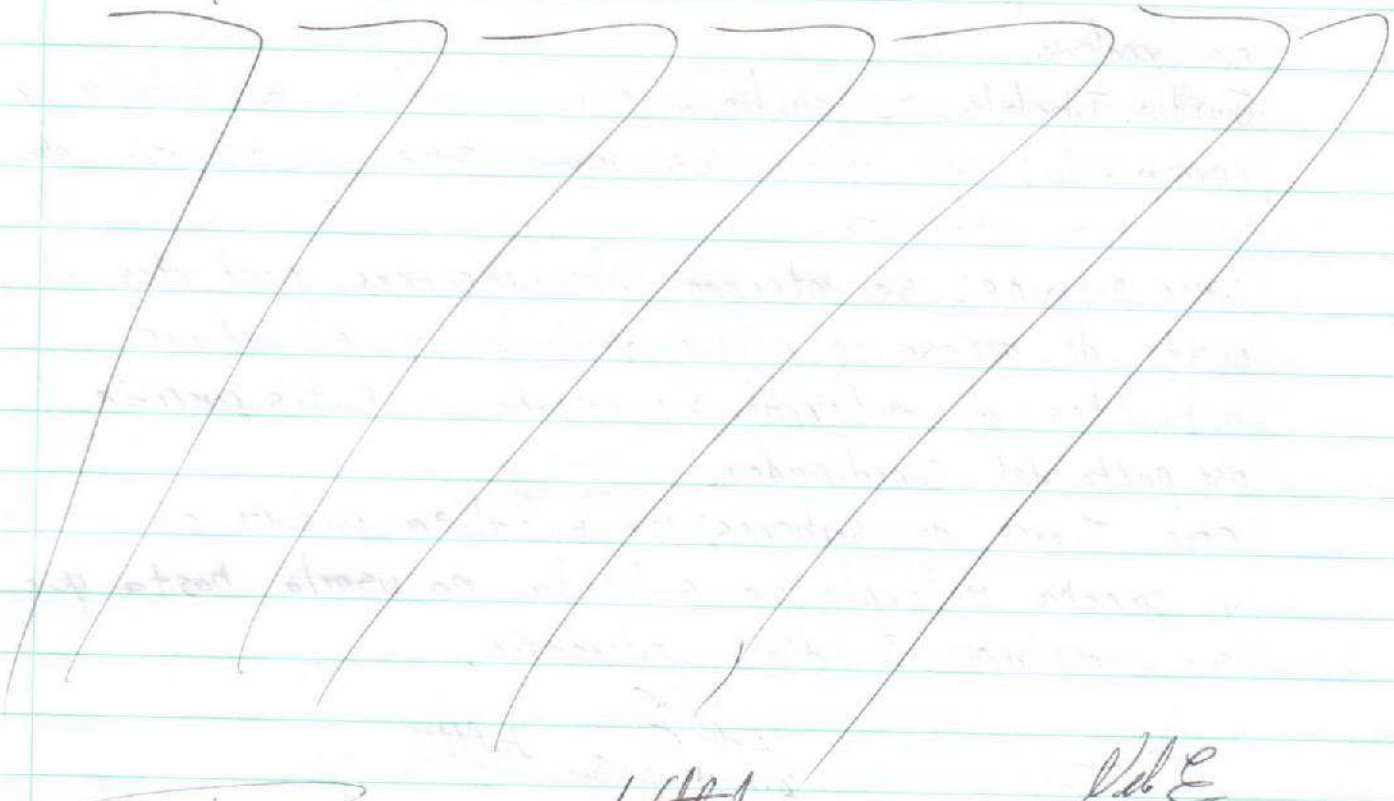

Ing. Jhon Palomino Ing. Juan Rodriguez. Ing. Nelson Cen
Residente de interventoría

Lunes 24 marzo de 2025.
Jardín Verbenal. Se finaliza la construcción de la caja de inspección en la portería. Se instala la válvula antiretorno 6".

SIMON BOLIVAR: Se realiza entrega formal a coordinador de Unidad operativa en conjunto con la interventoria con observaciones pendientes en cierre de puerta de parqueadero y retiro de material sobrante en zona de teatro.

CDC. Tierra de saberes: se inicia con pintura de cancha múltiple y fabricación de ventanería fachada interna en taller.

Martes 25 marzo de 2025.
Jardín Verbenal. Se realiza la instalación de gravilla lava sobre la tapa y perimetro de la caja de inspección Cox en portena.
Jardín. Tibabita. Se continua con la pintura de fachada y cerramiento; se instalan los rejas sobre los marcos de ventanas. instalados.
SIMON BOLIVAR: Se entregan observaciones pendientes de puerta de acceso en portón vehicular y se retiran sobrantes de material. Se recibe a satisfacción por parte del coordinador.
CDC. Tierra de saberes; Se finaliza pintura de archivo y cancha múltiple se solicita no usarla hasta que se complan 3 días calendario.

Ing. Jhon Palomino Res. Cerca. / Ing. Juan Rodríguez. R.O

miercoles 26 marzo de 2025
Jardín verbenal. se instala pirlanes pvc, en boca puerta, aula de maternidad. Se finalizan actividades
Jardín Tibabita. se finaliza pintura de fachada y cerramiento, concluye instalación de rejas sobre marco de ventanas, y se instalan pirlanes en boca puertas de las aulas donde se instaló piso plástico.

CDC. Tierra de saberes. Se finaliza con entrega de actividade a coordinadora encargada de la Unidad Operativa.

SIMON BOLIVAR. Se manifiesta que los desmontes de rejas en portón de acceso vehicular y modulos existentes se entregan al coordinador quien

EN LA PRESENTE FECHA 26/03/2025 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL, LAS UNIDADES INTERVENIDAS SE ENCUENTRAN ASÍ:

- FINALIZADAS Y ENTREGADAS: J.I. BONANSIA, CC. RINCÓN, J.I. ARCOIRES, J.I. HELVETIA, J.I. FLORES, CASA D. NASONA, J.I. EL NOGAL, C.D. MARIA GORETTI, J.I. MARIA GORETTI, J.I. EL LUGAR DEL RECREO, C.D.C. SIMÓN BOLIVAR, J.I. TIBABITA, J.I. VERBENAL Y J.I. JUAN XXIII.
- AJUSTES FINALES DE OBRA: C.D. TIERRA DE SABERES Y J.I. SAN LUIS, SERÁN FINALIZADO EL DIA 29/03/2025 PARA ENTREGA A SATISFACCIÓN.

Ing. Jhon Rabanal

Arq. Nelson C. Res. interv.

Ing. Juan Rodríguez. C.D

DR. OBRA

CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA!
