DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ACTA DE COBRO FINAL

FECHA DEL ACTA: 27 de octubre de 2025
PERIODO DE CORTE: 1 DICIEMBRE 2024 AL 30 DICIEMBRE 2024

CONTRATO No.	202204769	**FECHA ACTA DE INICIO:**	jueves, 29 de diciembre de 2022
CONTRATISTA:	BUILDER COMPANY SAS	**PLAZO INICIAL CONTRATO:**	Seis (06) Meses
		FECHA TERMINACION INICIAL:	jueves, 29 de junio de 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	**PLAZO PRÓRROGA No 1:**	Un (1) mes y 15 días
		FECHA TERMINACION No.2:	domingo, 13 de agosto de 2023
		FECHA SUSPENSIÓN No 1:	jueves, 27 de julio de 2023
		PLAZO SUSPENSIÓN No 1:	Un (01) Mes
		FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	martes, 12 de septiembre de 2023
		FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No 1:	lunes, 11 de septiembre de 2023
		PLAZO PRORROGA SUSPENSIÓN No 1:	Un (01) Mes o hasta que se celebren los contratos adicionales
		FECHA REINICIO No. 1:	lunes, 30 de octubre de 2023
		PLAZO PRÓRROGA No 2:	Un (1) mes y 15 días
FECHA DEL CONTRATO:	30 de octubre de 2022	**FECHA SUSPENSIÓN No 2:**	miércoles, 27 de diciembre de 2023
		PLAZO SUSPENSIÓN No 2:	Un (01) Mes
		FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No 2:	lunes, 1 de enero de 2024
SUPERVISOR SAPSB:	ING. EWAR TORRES	**PLAZO PRORROGA SUSPENSIÓN No 2:**	Hasta que se celebren los contratos adicionales
		FECHA REINICIO No 2:	martes, 19 de noviembre de 2024
		PLAZO PRÓRROGA No 3:	Un (1) mes y 12 días
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO	**PLAZO ACTUALIZADO CONTRATO:**	Dies punto cuatro (10.4) Meses
		FECHA FINALIZACIÓN ACTUALIZADO:	domingo, 31 de diciembre de 2023
		VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 4.587.854.286,00**
AVANCE FINANCIERO:	100,00%	**VALOR ADICIONES No. 1:**	**$ 696.524.044,00**
		VALOR ADICIONES No. 2:	**$ 145.983.312,00**
		VALOR TOTAL ADICIONES:	**$ 842.507.356,00**
		VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	**$ 5.430.361.642,00**

En Barranquilla a los veintisiete (27) dias del mes de octubre de 2025, se reúnen los firmantes del presente documento, y se suscribe la presente Acta Financiera Final con concertación de las cantidades y actividades definidas en su contenido

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES Modificatorio No 5		ACTA CANTIDADES DE OBRA No. 7						Saldos por Ejecutar	
								Acumulado Acta Anterior		Presente Acta No 7		Acumulado Ejecutado			
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
1	**FORMULARIO 1. PRESUPUESTO SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION**														
1,1	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO - LÍNEA DE IMPULSIÓN**														
1.1.1	Tubería HD ACERROJADA ESTÁNDAR CL 40 VI Ø 150mm	m	5.280,00	$ 397.141,90	$ 2.096.909.232,00	5.037,00	$ 2.000.403.750,30	5.037,00	$ 2.000.403.750,30	-	$ -	5.037,00	$ 2.000.403.750,30	-	$ -
1.1.2	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	m	410,00	$ 49.003,99	$ 20.091.634,88	442,25	$ 21.672.013,47	442,25	$ 21.672.013,47	-	$ -	442,25	$ 21.672.013,47	-	$ -
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	
1,2	**Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10**					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	
1.2.1	d = 50 mm (2")	Un	10,00	$ 445.208,75	$ 4.452.087,50	14,00	$ 6.232.922,50	14,00	$ 6.232.922,50	-	$ -	14,00	$ 6.232.922,50	-	$ -
1.2.2	d = 110 mm (4")	Un	3,00	$ 914.306,75	$ 2.742.920,25	3,00	$ 2.742.920,25	3,00	$ 2.742.920,25	-	$ -	3,00	$ 2.742.920,25	-	$ -
1,3	**Suministro de ventosa antifraude, doble cámara, triple acción bridada norma ISO PN 10**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.3.1	d =50mm (2")	Un	5,00	$ 1.058.728,13	$ 5.293.640,63	16,00	$ 16.939.650,00	16,00	$ 16.939.650,00	-	$ -	16,00	$ 16.939.650,00	-	$ -
1,4	**Suministro de Codos**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.4.1	Codo en PVC Ø 4" X 90°	Un	2,00	$ 106.387,46	$ 212.774,93	4,00	$ 425.549,85	4,00	$ 425.549,85	-	$ -	4,00	$ 425.549,85	-	$ -
1.4.2	Codo de HD 150 mm - 6" X 22.5° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE	Un	1,00	$ 1.216.180,00	$ 1.216.180,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.3	Codo de HD 150 mm - 6" X 45° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE	Un	25,00	$ 1.259.615,00	$ 31.490.375,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.4	Codo de HD 150 mm - 6" X 90° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE	Un	3,00	$ 1.389.920,00	$ 4.169.760,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1,5	**Suministro de Tees**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.5.1	Tee de HD 150 x 50 mm - ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE con ench derivación bridado	Un	10,00	$ 1.683.562,50	$ 16.835.625,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.5.2	Tee de HD 100 x 100 mm - 4" X 4" Bridado	Un	2,00	$ 568.998,50	$ 1.137.997,00	2,00	$ 1.137.997,00	2,00	$ 1.137.997,00	-	$ -	2,00	$ 1.137.997,00	-	$ -
1,6	**Suministro de Adaptadores Brida x Universal HD**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.6.1	HD 150mm	Un	10,00	$ 215.003,25	$ 2.150.032,50	236,00	$ 50.740.767,00	230,00	$ 49.450.747,50	6,00	$ 1.290.019,50	236,00	$ 50.740.767,00	-	$ -
1,7	**Suministro Elementos varios de acueducto**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.7.2	Reducción en HD 150 x 100 mm Bridado	Un	1,00	$ 387.657,38	$ 387.657,38	2,00	$ 775.314,75	2,00	$ 775.314,75	-	$ -	2,00	$ 775.314,75	-	$ -
1.7.3	Unión Universal en HD 100 mm	Un	7,00	$ 125.961,50	$ 881.730,50	2,00	$ 251.923,00	2,00	$ 251.923,00	-	$ -	2,00	$ 251.923,00	-	$ -
1,8	**Suministro de niple HD ISO PN 12.5**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.8.1	d = 50 mm (2") BXL L= 0,80 m	Un	5,00	$ 200.750,00	$ 1.003.750,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1,9	**Suministro Accesorios Macromedidor 4"**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.9.1	Válvula de compuerta elástica Bridada d= 100 mm ISO PN10	Un	3,00	$ 914.306,75	$ 2.742.920,25	3,00	$ 2.742.920,25	3,00	$ 2.742.920,25		$ -	3,00	$ 2.742.920,25	-	$ -
1.9.2	Macromedidor tipo Woltmann 4".	Un	1,00	$ 2.614.589,90	$ 2.614.589,90	1,00	$ 2.614.589,90	1,00	$ 2.614.589,90		$ -	1,00	$ 2.614.589,90	-	$ -
1.9.3	Tee de Polietileno 110mm X110x110	Un	2,00	$ 109.567,53	$ 219.135,05	2,00	$ 219.135,05	2,00	$ 219.135,05		$ -	2,00	$ 219.135,05	-	$ -
1.9.4	Niple HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10 2.0 m < L >3.0 m	Un	1,00	$ 1.923.391,23	$ 1.923.391,23		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.9.5	Niple HD, 100mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m	Un	1,00	$ 1.567.351,98	$ 1.567.351,98		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.9.6	Niple HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10 3.0 m < L >5.0 m	Un	3,00	$ 2.378.465,93	$ 7.135.397,78		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.9.7	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm	Un	8,00	$ 47.033,90	$ 376.271,20	8,00	$ 376.271,20	8,00	$ 376.271,20		$ -	8,00	$ 376.271,20	-	$ -
1.9.8	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm	Un	8,00	$ 67.324,25	$ 538.594,00	8,00	$ 538.594,00	8,00	$ 538.594,00		$ -	8,00	$ 538.594,00	-	$ -
1.9.9	Codo de Polietileno 110mm X 90°	Un	2,00	$ 106.387,46	$ 212.774,93	2,00	$ 212.774,93	2,00	$ 212.774,93		$ -	2,00	$ 212.774,93	-	$ -
1.9.10	Filtro en Yee brida x brida con válvula de purga d=110mm	Un	2,00	$ 770.971,25	$ 1.541.942,50		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.9.11	Unión de desmontaje HD D = 110 MM (4") ISO PN 10	Un	1,00	$ 693.765,54	$ 693.765,54	1,00	$ 693.765,54	1,00	$ 693.765,54		$ -	1,00	$ 693.765,54	-	$ -
1,10	**Suministro Accesorios Macromedidor 6"**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	
1.10.1	Válvula de compuerta elástica Bridada d= 150 mm ISO PN10	Un	3,00	$ 1.368.202,50	$ 4.104.607,50	8,00	$ 10.945.620,00	8,00	$ 10.945.620,00	-	$ -	8,00	$ 10.945.620,00	-	$ -
1.10.2	Macromedidor tipo Woltmann 6".	Un	1,00	$ 3.499.848,13	$ 3.499.848,13	1,00	$ 3.499.848,13	1,00	$ 3.499.848,13	-	$ -	1,00	$ 3.499.848,13	-	$ -
1.10.3	Tee de Polietileno 160mm X160x160	Un	2,00	$ 394.537,63	$ 789.075,25	2,00	$ 789.075,25	2,00	$ 789.075,25	394,00	$ -	2,00	$ 789.075,25	-	$ -
1.10.4	Niple HD, 160 mm Brida x Brida ISO PN10 2.0 m < L >3.0 m	Un	1,00	$ 2.647.797,60	$ 2.647.797,60		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.5	Niple HD, 160mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m	Un	1,00	$ 2.157.186,50	$ 2.157.186,50	2,00	$ 4.314.373,00	2,00	$ 4.314.373,00		$ -	2,00	$ 4.314.373,00	-	$ -
1.10.6	Niple HD, 160 mm Brida x Brida ISO PN10 3.0 m < L >5.0 m	Un	3,00	$ 3.372.401,99	$ 10.117.205,96		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.7	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 160mm	Un	8,00	$ 105.850,00	$ 846.800,00	7,00	$ 740.950,00	7,00	$ 740.950,00	-	$ -	7,00	$ 740.950,00	-	$ -
1.10.8	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 160mm	Un	8,00	$ 84.481,08	$ 675.848,60	7,00	$ 591.367,53	7,00	$ 591.367,53	-	$ -	7,00	$ 591.367,53	-	$ -
1.10.9	Codo de Polietileno 160mm X 90°	Un	2,00	$ 376.466,48	$ 752.932,95	3,00	$ 1.129.399,43	3,00	$ 1.129.399,43	-	$ -	3,00	$ 1.129.399,43	-	$ -
1.10.10	Filtro en Yee brida x brida con válvula de purga d=160mm	Un	1,00	$ 1.520.225,00	$ 1.520.225,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.11	Unión de desmontaje HD D = 150 MM (6") ISO PN 10	Un	2,00	$ 1.067.795,64	$ 2.135.591,28	2,00	$ 2.135.591,28	2,00	$ 2.135.591,28	-	$ -	2,00	$ 2.135.591,28	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES Modificatorio No 5		ACTA CANTIDADES DE OBRA No. 7						Saldos por Ejecutar	
								Acumulado Acta Anterior		Presente Acta No 7		Acumulado Ejecutado			
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
1.10.12	Válvula reductora de presión Ø 6" B x B.	Un	1,00	$ 12.755.773,63	$ 12.755.773,63	2,00	$ 25.511.547,25	2,00	$ 25.511.547,25	-	$ -	2,00	$ 25.511.547,25	-	$ -
1.10.13	Válvula reguladora de Caudal Ø 6" B x B.	Un	1,00	$ 13.030.500,00	$ 13.030.500,00	2,00	$ 26.061.000,00	2,00	$ 26.061.000,00	-	$ -	2,00	$ 26.061.000,00	-	$ -
1,11	**Actividades No Previstas**				$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10				$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3.2.2	d = 80 mm (3")	Un		$ 672.156,63	$ 0,00	4,00	$ 2.688.626,50	4,00	$ 2.688.626,50	-	$ -	4,00	$ 2.688.626,50	-	$ -
	Suministro Unión desmontaje Bridada. Norma ISO. PN 10				$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5.1.2.1	d= 100mm (4")	un		$ 2.578.953,13	$ 0,00	1,00	$ 2.578.953,13	1,00	$ 2.578.953,13	-	$ -	1,00	$ 2.578.953,13	-	$ -
	Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16				$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5.3.4.1.	d= 150mm (6")	un		$ 1.806.896,00	$ 0,00	34,00	$ 61.434.464,00	34,00	$ 61.434.464,00	-	$ -	34,00	$ 61.434.464,00	-	$ -
	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m				$ 0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP- 5.3.1.1	d =150 mm (6"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un		$ 1.233.282,99	$ 0,00	2,00	$ 2.466.565,98	2,00	$ 2.466.565,98	-	$ -	2,00	$ 2.466.565,98	-	$ -
SUM-NP001	Tee de HD 150 x 50 mm - BXBXB	Un		$ 1.146.920,00	$ 0,00	14,00	$ 16.056.880,00	14,00	$ 16.056.880,00	-	$ -	14,00	$ 16.056.880,00	-	$ -
SUM-NP002	Tee de HD 150 x 80 mm - BXBXB	Un		$ 1.234.040,00	$ 0,00	3,00	$ 3.702.120,00	3,00	$ 3.702.120,00	-	$ -	3,00	$ 3.702.120,00	-	$ -
SUM-NP003	Codo 45° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 10	Un		$ 867.170,00	$ 0,00	50,00	$ 43.358.500,00	50,00	$ 43.358.500,00	-	$ -	50,00	$ 43.358.500,00	-	$ -
SUM-NP004	Codo 11,25° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 10	Un		$ 873.170,00	$ 0,00	5,00	$ 4.365.850,00	5,00	$ 4.365.850,00	-	$ -	5,00	$ 4.365.850,00	-	$ -
SUM-NP005	Suministro de niple d = 50 mm (2") BXL L= 0,50 m HD ISO PN 10	Un		$ 762.100,00	$ 0,00	2,00	$ 1.524.200,00	2,00	$ 1.524.200,00	-	$ -	2,00	$ 1.524.200,00	-	$ -
SUM-NP006	Suministro de niple d = 80 mm (3") BXL L= 0,50 m HD ISO PN 10	Un		$ 889.210,00	$ 0,00	3,00	$ 2.667.630,00	3,00	$ 2.667.630,00	-	$ -	3,00	$ 2.667.630,00	-	$ -
SUM-NP007	Suministro tubería PEAD de 110mm	ML		$ 61.827,62	$ 0,00	12,00	$ 741.931,44	12,00	$ 741.931,44	-	$ -	12,00	$ 741.931,44	-	$ -
SUM-NP008	Filtro en Yee HD brida x brida con válvula de purga d=100mm	Un		$ 1.520.750,00	$ 0,00	1,00	$ 1.520.750,00	1,00	$ 1.520.750,00	-	$ -	1,00	$ 1.520.750,00	-	$ -
SUM-NP009	Suministro tubería PEAD de 160mm	ML		$ 131.242,61	$ 0,00	282,00	$ 37.010.416,02	282,00	$ 37.010.416,02	-	$ -	282,00	$ 37.010.416,02	-	$ -
SUM-NP010	Filtro en Yee HD brida x brida con válvula de purga d=150mm	Un		$ 1.966.079,00	$ 0,00	2,00	$ 3.932.158,00	2,00	$ 3.932.158,00	-	$ -	2,00	$ 3.932.158,00	-	$ -
SUM-NP011	Suministro de Tubería de PVC Ø 10"	ML		$ 97.404,65	$ 0,00	350,00	$ 34.091.627,50	350,00	$ 34.091.627,50	-	$ -	350,00	$ 34.091.627,50	-	$ -
SUM-NP012	Codo 22.5° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 10	Un		$ 876.170,00	$ 0,00	6,00	$ 5.257.020,00	6,00	$ 5.257.020,00	-	$ -	6,00	$ 5.257.020,00	-	$ -
SUM-NP014	Suministro de Niples HD con inserción roscada, PN 10 B x B d= 150 mm (6") L=0,50 m	Un		$ 2.222.980,00	$ 0,00	8,00	$ 17.783.840,00	8,00	$ 17.783.840,00	-	$ -	8,00	$ 17.783.840,00	-	$ -
SUM-NP015	Suministro de Manómetro rango: 0 - 1.000 PSI/BAR caratula 4" conexión vertical 1/2" NPT	Un		$ 324.800,00	$ 0,00	4,00	$ 1.299.200,00	4,00	$ 1.299.200,00	-	$ -	4,00	$ 1.299.200,00	-	$ -
SUM-NP016	Tee de HD 150 x 150 mm - BXBXB	Un		$ 1.296.510,00	$ 0,00	2,00	$ 2.593.020,00	2,00	$ 2.593.020,00	-	$ -	2,00	$ 2.593.020,00	-	$ -
														-	
SUMINISTROS CONDUCCIÓN (A)	**COSTO DIRECTO SUMINISTROS FORMULARIO 1**				**$ 2.263.574.924,28**		**$ 2.429.513.383,39**		**$ 2.428.223.363,89**		**$ 1.290.019,50**		**$ 2.429.513.383,39**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	20,00%			**$ 452.714.984,86**		**$ 485.902.676,78**		**$ 485.644.672,78**		**$ 258.003,90**		**$ 485.902.676,68**		**$ -**
	COSTO TOTAL SUMINISTROS FORMULARIO 1 (A)				**$ 2.716.289.909,13**		**$ 2.915.416.060,07**		**$ 2.913.868.036,67**		**$ 1.548.023,40**		**$ 2.915.416.060,07**		**$ -**
2	**FORMULARIO 2. PRESUPUESTO OBRA CIVIL REDES (LÍNEA DE CONDUCCIÓN)**													-	
2,1	**PRELIMINARES**				-		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.1.1	Trazado y replanteo	ml	5.280,00	$ 2.565,04	$ 13.543.398,00	5.742,24	$ 14.729.060,93	5.742,24	$ 14.729.060,93	-	$ -	5.742,24	$ 14.729.060,93	-	$ -
2.1.2	Demonte y limpieza	m2	2.000,00	$ 9.583,08	$ 19.166.150,00	4.460,28	$ 42.743.236,09	4.460,28	$ 42.743.236,09	-	$ -	4.460,28	$ 42.743.236,09	-	$ -
2,2	**Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto**					-		-			$ -		$ -	-	
2.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m³	630,00	$ 27.583,05	$ 17.377.321,50	1.986,08	$ 54.782.020,03	1.924,77	$ 53.090.983,02	61,31	$ 1.691.037,02	1.986,08	$ 54.782.020,03	-	$ -
	INSTALACION Y CIMENTACIÓN TUBERÍAS					-		-			$ -		$ -	-	
2.3.1	Instalación de Tuberías HD Acerrojada incluye soportes para tubería expuesta Tubería 150 mm	m	5.080,00	$ 63.656,91	$ 323.377.115,50	3.686,39	$ 234.664.205,67	3.686,39	$ 234.664.205,67	-	$ -	3.686,39	$ 234.664.205,67	-	$ -
2.3.2	Instalación de Tuberías HD Acerrojada para tubería enterrada Tubería 150 mm	m	200,00	$ 9.725,43	$ 1.945.085,00	200,00	$ 1.945.085,00	200,00	$ 1.945.085,00	-	$ -	200,00	$ 1.945.085,00	-	$ -
2.4.1	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC 4" RDE 21	m	410,00	$ 19.088,59	$ 7.826.320,88	425,24	$ 8.117.230,95	425,24	$ 8.117.230,95	-	$ -	425,24	$ 8.117.230,95	-	$ -
2,5	**Relleno de zanjas y de obras de mampostería**					-		-			$ -		$ -	-	
2.5.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	m3	120,00	$ 21.169,09	$ 2.540.290,50	1.235,77	$ 26.160.106,11	1.235,77	$ 26.160.106,11	-	$ -	1.235,77	$ 26.160.106,11	-	$ -
2.5.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor modificado	m3	875,00	$ 63.972,64	$ 55.976.057,81	354,29	$ 22.665.105,62	293,67	$ 18.786.848,11	60,62	$ 3.878.257,51	354,29	$ 22.665.105,62	-	$ -
2.5.3	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa	m3	50,00	$ 68.029,61	$ 3.401.480,63	474,94	$ 32.309.740,42	474,94	$ 32.309.740,42	-	$ -	474,94	$ 32.309.740,42	-	$ -
2,6	**Acero de Refuerzo**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.6.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	200,00	$ 5.455,84	$ 1.091.167,50	200,00	$ 1.091.167,50	200,00	$ 1.091.167,50	-	$ -	200,00	$ 1.091.167,50	-	$ -
2,7	**INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.7.1	Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga (Sumando la Válvula que va a la salida de conexión con Martillo)	un	10,00	$ 231.775,00	$ 2.317.750,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2,8	**CAJAS DE VÁLVULAS Y DE VENTOSAS**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.8.1	Caja de válvulas en mampostería para H < 2,00 m (Sumando la Válvula que va a la salida de conexión con Martillo)	Un	13,00	$ 2.704.023,11	$ 35.152.300,46	4,00	$ 10.816.092,45	4,00	$ 10.816.092,45	-	$ -	4,00	$ 10.816.092,45	-	$ -
2,9	**CONCRETO PARA ANCLAJES**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.9.1	Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)	m3	146,00	$ 399.975,21	$ 58.396.381,03	34,86	$ 13.944.671,81	32,54	$ 13.016.793,32	2,32	$ 927.878,50	34,86	$ 13.944.671,81	-	$ -
2,1	**Instalación de válvula de compuerta**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.10.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 50 mm (2")	Un	10,00	$ 108.462,49	$ 1.084.624,88	14,00	$ 1.518.474,83	14,00	$ 1.518.474,83	-	$ -	14,00	$ 1.518.474,83	-	$ -
2.10.2	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	Un	3,00	$ 187.042,43	$ 561.127,28	6,00	$ 1.122.254,55	6,00	$ 1.122.254,55	-	$ -	6,00	$ 1.122.254,55	-	$ -
2,11	**Instalación macromedición.**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.11.1	Instalacion macromedidor y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d=110 mm 4".	Un	1,00	$ 605.188,25	$ 605.188,25	1,00	$ 605.188,25	1,00	$ 605.188,25		$ -	1,00	$ 605.188,25	-	$ -
2.11.2	Instalacion macromedidor, válvula reguladora de caudal, de presión y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d = 150 mm (6")	Un	1,00	$ 1.089.854,41	$ 1.089.854,41	1,00	$ 1.089.854,41	1,00	$ 1.089.854,41		$ -	1,00	$ 1.089.854,41	-	$ -
2,12	**Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10**					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.12.1	Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, incluye tubería de polietileno (L <=9m) y accesorios d = 50 mm (2")	Un	5,00	$ 115.672,15	$ 578.360,75	12,00	$ 1.388.065,80	12,00	$ 1.388.065,80	-	$ -	12,00	$ 1.388.065,80	-	$ -
	Empalmes a red de acueducto					-		-			$ -		$ -	-	$ -
2.13.1	Suministro e Instalación de abrazadera con derivación tipo tee. Brida x Brida. Norma ISO PN 10 y PN 16, Incluye el suministro de la Tee, válvula de compuerta BxB d=6", tornillería, empaquetadura para el montaje y servicio de perforación.	Un	1,00	$ 6.623.837,50	$ 6.623.837,50	1,00	$ 6.623.837,50	1,00	$ 6.623.837,50		$ -	1,00	$ 6.623.837,50	-	$ -
2.14.1	Construcción registro macromedidor 6" y válvula reguladora de presión y caudal	Un	1,00	$ 20.923.632,30	$ 20.923.632,30	3,00	$ 62.770.896,90	3,00	$ 62.770.896,90	-	$ -	3,00	$ 62.770.896,90	-	$ -
2.15.1	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D = 200 mm	ML	36,00	$ 144.237,96	$ 5.192.566,65		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1,11	**Actividades No Previstas**				$ 0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP001	Suministro e Instalación de Niple en HD, 150 mm ISO PN10 1.0 m < L >2.0 m para enterrado de tubería en entradas	Un		$ 2.660.141,35	$ 0,00	35,00	$ 93.104.947,25	35,00	$ 93.104.947,25	-	$ -	35,00	$ 93.104.947,25	-	$ -
NP002	Encamisado de Tuberías HD 150mm En Paso De Canales de agua o arroyos (Incluye instalación de tubería PVC 10" y colocación de concreto fc=17,5 Mpa (2500 psi))	ML		$ 225.798,95	$ 0,00	350,00	$ 79.029.632,50	350,00	$ 79.029.632,50	-	$ -	350,00	$ 79.029.632,50	-	$ -
NP003	Fijación de Elementos Bridados para Integración de Dispositivo de Control de Presión y Flujo en la red de Conducción (Incluye Corte y Biselado de Tubería HD 150mm e Instalación de Elementos Bridados)	Un		$ 146.632,68	$ 0,00	17,00	$ 2.492.755,56	17,00	$ 2.492.755,56	-	$ -	17,00	$ 2.492.755,56	-	$ -
NP005	Instalación de tubería en hierro dúctil D=150mm para paso de tubería en entradas a viviendas, canales de agua y corredor vial (Incluye corte de tubería, biselado, preparación de juntas, traslado de tubería en corredor vial Burrusco-Martillo)	ML		$ 10.927,49	$ 0,00	1.150,61	$ 12.573.279,27	1.150,61	$ 12.573.279,27	-	$ -	1.150,61	$ 12.573.279,27	-	$ -
NP006	Instalación de tubería PEAD de 160mm	ML		$ 16.591,28	$ 0,00	282,00	$ 4.678.740,96	282,00	$ 4.678.740,96	-	$ -	282,00	$ 4.678.740,96	-	$ -
NP007	Suministro e instalación de aislamiento en neopreno 1/8" (en vinchas de fijación tubería) para protección de tubería HD 150mm en área de contacto con soporte en concreto y abrazadera de amarre metálica	un		$ 39.400,62	$ 0,00	670,00	$ 26.398.415,40	670,00	$ 26.398.415,40	-	$ -	670,00	$ 26.398.415,40	-	$ -
NP008	Suministro e instalación de manga en polietileno para revestimiento exterior de tubería HD 150mm en enterrados de tubería	ML		$ 29.543,37	$ 0,00	562,00	$ 16.603.373,94	562,00	$ 16.603.373,94	-	$ -	562,00	$ 16.603.373,94	-	$ -
NP012	Estabilización de corredor vial con piedra ciclópea ó similar	M3	$ -	$ 202.385,19	$ 0,00	135,00	$ 27.322.000,65	135,00	$ 27.322.000,65	-	$ -	135,00	$ 27.322.000,65	-	$ -
NP013	Mejoramiento de la subrasante con adición de material de cantera	M3	$ -	$ 159.613,43	$ 0,00	45,00	$ 7.182.604,35	45,00	$ 7.182.604,35	-	$ -	45,00	$ 7.182.604,35	-	$ -
NP015	Suministro e instalación de Restrictor HD para tubería HD DN 150mm (incluye tornillería y varilla roscada)	Un	$ -	$ 480.170,34	$ 0,00	208,00	$ 99.875.430,72	105,00	$ 50.417.885,70	103,00	$ 49.457.545,02	208,00	$ 99.875.430,72	-	$ -
														-	
OBRA CIVIL FORMULARIO 2 (B)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 2**				**$ 578.770.010,81**		**$ 908.347.475,43**		**$ 852.392.757,38**		**$ 55.954.718,05**		**$ 908.347.475,43**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	35,00%			**$ 202.569.503,78**		**$ 317.921.616,40**		**$ 298.337.465,08**		**$ 19.584.151,32**		**$ 317.921.616,40**		**$ -**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 5.787.700,11**		**$ 9.083.474,75**		**$ 8.523.927,57**		**$ 559.547,18**		**$ 9.083.474,75**		**$ -**
	UTILIDAD	5%			**$ 28.938.500,54**		**$ 45.417.373,77**		**$ 42.619.637,87**		**$ 2.797.735,90**		**$ 45.417.373,77**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 2 (B)				**$ 816.065.715,25**		**$ 1.280.769.940,36**		**$ 1.201.873.787,91**		**$ 78.896.152,45**		**$ 1.280.769.940,35**		**$ -**
3	**FORMULARIO 3. PRESUPUESTO SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN**													-	
3,1	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO**						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.1.1	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	m	60,00	$ 49.003,99	$ 2.940.239,25	40,10	$ 1.965.059,90	40,10	$ 1.965.059,90	-	$ -	40,10	$ 1.965.059,90	-	$ -
3.1.2	Tubería de PVC Ø 2" RDE 21	m	1.320,00	$ 14.820,83	$ 19.563.489,00	2.132,00	$ 31.597.998,90	2.132,00	$ 31.597.998,90	-	$ -	2.132,00	$ 31.597.998,90	-	$ -
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
3,2	**Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10**					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.1	d = 50 mm (2")	Un	10,00	$ 426.748,88	$ 4.267.488,75	10,00	$ 4.267.488,75	10,00	$ 4.267.488,75	-	$ -	10,00	$ 4.267.488,75	-	$ -
3.2.2	d = 80 mm (3")	Un	2,00	$ 672.156,63	$ 1.344.313,25	2,00	$ 1.344.313,25	2,00	$ 1.344.313,25	-	$ -	2,00	$ 1.344.313,25	-	$ -
3.2.3	d = 110 mm (4")	Un	1,00	$ 878.472,88	$ 878.472,88	1,00	$ 878.472,88	1,00	$ 878.472,88	-	$ -	1,00	$ 878.472,88	-	$ -
3,3	**Suministro de hidrante tipo milan norma ISO PN 10**						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.3.1	d = 75 mm (3")	Un	2,00	$ 2.515.972,38	$ 5.031.944,75	2,00	$ 5.031.944,75	2,00	$ 5.031.944,75	-	$ -	2,00	$ 5.031.944,75	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES Modificatorio No 5		ACTA CANTIDADES DE OBRA No. 7						Saldos por Ejecutar	
								Acumulado Acta Anterior		Presente Acta No 7		Acumulado Ejecutado			
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
3,4	**Suministro de Codos**					-	$ -							-	$ -
3,4,1	Codo en PVC Ø 4" X 90°	Un	4,00	$ 106.387,46	$ 425.549,85	4,00	$ 425.549,85	4,00	$ 425.549,85	-	$ -	4,00	$ 425.549,85	-	$ -
3,4,2	Codo en PVC Ø 2" X 90°	Un	7,00	$ 13.158,25	$ 92.107,75	8,00	$ 105.266,00	8,00	$ 105.266,00	-	$ -	8,00	$ 105.266,00	-	$ -
3,4,3	Codo en PVC Ø 2" X 45°	Un	6,00	$ 14.415,68	$ 86.494,05	20,00	$ 288.313,50	20,00	$ 288.313,50	-	$ -	20,00	$ 288.313,50	-	$ -
3,4,4	Codo en HD Ø 80 mm X 90° BxB	Un	2,00	$ 258.438,25	$ 516.876,50		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,5	**Suministro de Tees**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
3.5.1	Tee de PVC 2" x 2"	Un	12,00	$ 94.211,98	$ 1.130.544	10,00	$ 942.119,75	10,00	$ 942.119,75	-	$ -	10,00	$ 942.119,75	-	$ -
3.5.2	Tee de PVC 4" x 2"	Un	1,00	$ 561.790,66	$ 561.790,66	1,00	$ 561.790,66	1,00	$ 561.790,66	-	$ -	1,00	$ 561.790,66	-	$ -
3.5.3	Tee de HD 50 x 50 mm - 2" X 2" Extremo liso	Un	2,00	$ 102.072,25	$ 204.144,50	2,00	$ 204.144,50	2,00	$ 204.144,50	-	$ -	2,00	$ 204.144,50	-	$ -
3,6	**Suministro Elementos varios de acueducto**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
3.6.1	Tapón soldado en PVC Ø 2"	Un	3,00	$ 87.887,44	$ 263.662,31	7,00	$ 615.212,06	7,00	$ 615.212,06	-	$ -	7,00	$ 615.212,06	-	$ -
3.6.2	Adaptador Brida x Universal 50 mm	Un	21,00	$ 95.557,00	$ 2.006.697,00	18,00	$ 1.720.026,00	18,00	$ 1.720.026,00	-	$ -	18,00	$ 1.720.026,00	-	$ -
3.6.3	Adaptador Brida x Universal 80 mm	Un	6,00	$ 119.446,25	$ 716.677,50	4,00	$ 477.785,00	4,00	$ 477.785,00	-	$ -	4,00	$ 477.785,00	-	$ -
3.6.4	Adaptador Brida x Universal 110 mm	Un	2,00	$ 131.390,88	$ 262.781,75	2,00	$ 262.781,75	2,00	$ 262.781,75	-	$ -	2,00	$ 262.781,75	-	$ -
3.6.5	Unión Universal 50 mm HD	Un	2,00	$ 114.016,88	$ 228.033,75	4,00	$ 456.067,50	4,00	$ 456.067,50	-	$ -	4,00	$ 456.067,50	-	$ -
3.6.6	Buje soldado en PVC 4" x 2"	Un	1,00	$ 17.510,88	$ 17.510,88	2,00	$ 35.021,75	2,00	$ 35.021,75	-	$ -	2,00	$ 35.021,75	-	$ -
3.6.7	Reducción en HD 80 x 50 mm Liso	Un	1,00	$ 314.310,63	$ 314.310,63	2,00	$ 628.621,25	2,00	$ 628.621,25	-	$ -	2,00	$ 628.621,25	-	$ -
3.6.8	Adaptadores Hembra 2" PVC	Un	6,00	$ 10.174,38	$ 61.046,25	3,00	$ 30.523,13	3,00	$ 30.523,13	-	$ -	3,00	$ 30.523,13	-	$ -
3.6.9	Unión Universal 2" PVC	Un	3,00	$ 39.055,00	$ 117.165,00	3,00	$ 117.165,00	3,00	$ 117.165,00	-	$ -	3,00	$ 117.165,00	-	$ -
3.6.10	Válvula de Bola PCP Tipo Pesado Extremos Roscados NPT, Diámetro 2"	Un	2,00	$ 83.950,00	$ 167.900,00	2,00	$ 167.900,00	2,00	$ 167.900,00	-	$ -	2,00	$ 167.900,00	-	$ -
3,7	**Suministro Acometida domiciliaria**					-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	$ -
3.7.1	Collar de derivación con inserto metálico Ø 2" X 1/2"	UND	85,00	$ 15.831,88	$ 1.345.709,38	110,00	$ 1.741.506,25	110,00	$ 1.741.506,25	-	$ -	110,00	$ 1.741.506,25	-	$ -
3.7.2	Registro de incorporación Ø 1/2" x 20mm	UND	85,00	$ 25.458,75	$ 2.163.993,75	110,00	$ 2.800.462,50	110,00	$ 2.800.462,50	-	$ -	110,00	$ 2.800.462,50	-	$ -
3.7.3	Tubería de Polietileno Ø 20 mm PN 10	ML	680,00	$ 2.719,25	$ 1.849.090,00	880,00	$ 2.392.940,00	880,00	$ 2.392.940,00	-	$ -	880,00	$ 2.392.940,00	-	$ -
3.7.4	Válvula de corte antifraude Ø 1/2" x 20mm	und	85,00	$ 21.941,06	$ 1.864.990,31	110,00	$ 2.413.516,88	110,00	$ 2.413.516,88	-	$ -	110,00	$ 2.413.516,88	-	$ -
3.7.5	Válvula de cheque Ø 1/2"	un	85,00	$ 22.447,50	$ 1.908.037,50	110,00	$ 2.469.225,00	110,00	$ 2.469.225,00	-	$ -	110,00	$ 2.469.225,00	-	$ -
3.7.6	Suministro de válvula antifraude con seguridad (HH) 20 mm	un	85,00	$ 15.357,38	$ 1.305.376,88	110,00	$ 1.689.311,25	110,00	$ 1.689.311,25	-	$ -	110,00	$ 1.689.311,25	-	$ -
3.7.7	Adaptador Hembra PVC Ø 1/2"	un	85,00	$ 2.691,88	$ 228.809,38	110,00	$ 296.106,25	110,00	$ 296.106,25	-	$ -	110,00	$ 296.106,25	-	$ -
3.7.8	Suministro de medidor de velocidad chorro único, diámetro nominal DN 15 mm, cuerpo de composite (plástico), filtro de entrada de plástico, anillo contra fraude, rosca de entradas y salida de 7/8" x 3/4", característica metrológica R200 o superior.	Un	85,00	$ 114.016,88	$ 9.691.434,38		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7.9	Suministro de Cajilla para Medidor de Agua en Instalaciones Domiciliarias fabricada en nylon reforzado (PA) con tapa en Polipropileno reforzado incluida.	Un	85,00	$ 48.864,38	$ 4.153.471,88	110,00	$ 5.375.081,25	110,00	$ 5.375.081,25	-	$ -	110,00	$ 5.375.081,25	-	$ -
	Suministro de ventosa, triple acción.					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Suministro Válvula ventosa combinada de 2". Presión de trabajo 15 -145 psi. Extremo roscado.	un	1,00	$ 504.931,88	$ 504.931,88	1,00	$ 504.931,88	1,00	$ 504.931,88	-	$ -	1,00	$ 504.931,88	-	$ -
3.9	**Actividades No Previstas**				$ 0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
SUM-NP013	Suministro de medidor para agua con cuerpo de composite (metálico), tipo velocidad chorro único de transmisión mecánica, modelo venus, rango metrológico R200, diámetro DN 15 (1/2")*115mm de longitud, (7/8" - 3/4") Pre- Equipado para lectura. Incluye Carta de Garantía y Certificado de Calibración por Laboratorio Acreditado por la ONAC.	Un		$ 275.950,00	$ 0,00	110,00	$ 30.354.500,00	110,00	$ 30.354.500,00	-	$ -	110,00	$ 30.354.500,00	-	$ -
SUMINISTROS FORMULARIO 3 (C)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 3**				**$ 66.215.085,26**		**$ 102.161.147,37**		**$ 102.161.147,37**		**$ -**		**$ 102.161.147,37**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	20,00%			**$ 13.243.017,05**		**$ 20.432.229,47**		**$ 20.432.229,47**		**$ -**		**$ 20.432.229,47**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 3 (C)				**$ 79.458.102,32**		**$ 122.593.376,85**		**$ 122.593.376,85**		**$ -**		**$ 122.593.376,85**		**$ -**
4	**FORMULARIO 4. PRESUPUESTO OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN**							-						-	
4,1	**PRELIMINARES**										$ -		$ -	-	
4.1.1	Trazado y replanteo	ml	1.380,00	$ 2.565,04	$ 3.539.751,75	2.137,15	$ 5.481.874,74	2.137,15	$ 5.481.874,74	-	$ -	2.137,15	$ 5.481.874,74	-	$ -
4,2	**Demoliciones**					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.2.1	Demolición de anden con mona	m	120,00	$ 6.608,33	$ 792.999,00	48,83	$ 322.684,51	48,83	$ 322.684,51	-	$ -	48,83	$ 322.684,51	-	$ -
4.2.2	Demolición bordillo de concreto	m	120,00	$ 4.241,30	$ 508.956,00	51,50	$ 218.426,95	-	$ -	51,50	$ 218.426,95	51,50	$ 218.426,95	-	$ -
4,3	**Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto**					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.3.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m³	800,00	$ 27.583,05	$ 22.066.440,00	1.069,85	$ 29.509.709,38	1.069,85	$ 29.509.709,38	-	$ -	1.069,85	$ 29.509.709,38	-	$ -
4,4	**Instalación de acometidas domiciliarias con silletas para acueducto.**					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.4.1	Instalación de acometida acueducto tipo 7. en zona dura con cruce de vía pavimentada usando equipo de perforación horizontal (topo), con 0,0 m < l < 10,0 m y 16 mm < d < 50 mm.	UN	8,00	$ 723.924,58	$ 5.791.396,60	12,00	$ 8.687.094,90	12,00	$ 8.687.094,90	-	$ -	12,00	$ 8.687.094,90	-	$ -
4.4.2	Instalación de acometida acueducto tipo 9. en zona verde sin cruce de vía (a favor de la red), con 0,0 m < l < 7,0 m y 16 mm < d < 50 mm.	UN	77,00	$ 55.937,16	$ 4.307.161,51	101,00	$ 5.649.653,41	101,00	$ 5.649.653,41	-	$ -	101,00	$ 5.649.653,41	-	$ -
	INSTALACION Y CIMENTACIÓN TUBERÍAS					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.5.1	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC 4" RDE 21	m	60,00	$ 19.088,59	$ 1.145.315,25	40,10	$ 765.452,36	40,10	$ 765.452,36	-	$ -	40,10	$ 765.452,36	-	$ -
4.5.2	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC 2" RDE 21	m	1.320,00	$ 13.149,13	$ 17.356.845,00	2.094,52	$ 27.541.105,30	2.094,52	$ 27.541.105,30	-	$ -	2.094,52	$ 27.541.105,30	-	$ -
4,6	**Relleno de zanjas y de obras de mamposteria**					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.6.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	m3	257,00	$ 21.169,09	$ 5.440.455,49	818,01	$ 17.316.579,31	818,01	$ 17.316.579,31	-	$ -	818,01	$ 17.316.579,31	-	$ -
4.6.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor modificado	m3	435,00	$ 63.972,64	$ 27.828.097,31	48,26	$ 3.087.319,49	48,26	$ 3.087.319,49	-	$ -	48,26	$ 3.087.319,49	-	$ -
4.6.3	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa	m3	96,00	$ 68.029,61	$ 6.530.842,80	197,00	$ 13.402.037,11	197,00	$ 13.402.037,11	-	$ -	197,00	$ 13.402.037,11	-	$ -
4,7	**ANDENES EN CONCRETO**					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.7.1	Construcción de anden en concreto F´C = 21,0 MPA (3000 PSI) E = 0,10 M. Tamaño máximo del agregado: 25 MM (1") de central de mezclas.	M2	120,00	$ 70.101,90	$ 8.412.228,00	48,83	$ 3.423.075,78	8,00	$ 560.815,20	40,83	$ 2.862.260,58	48,83	$ 3.423.075,78	-	$ -
4,8	**BORDILLOS**					0,00		-			$ -	-	$ -	-	
4.8.1.1	Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento De 0,15 m x 0,15 m	m	120,00	$ 35.513,59	$ 4.261.630,50	51,50	$ 1.828.949,76	16,00	$ 568.217,40	35,50	$ 1.260.732,36	51,50	$ 1.828.949,76	-	$ -
4.9.	**Acero de Refuerzo**							-			$ -	-	$ -	-	
4.9.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	100,00	$ 5.455,84	$ 545.583,75	50,00	$ 272.791,88	50,00	$ 272.791,88	-	$ -	50,00	$ 272.791,88	-	$ -
4,1	**INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm**							-			$ -	-	$ -	-	
4.10.1	Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga	un	13,00	$ 231.775,00	$ 3.013.075,00	13,00	$ 3.013.075,00	13,00	$ 3.013.075,00	-	$ -	13,00	$ 3.013.075,00	-	$ -
4,11	**CAJAS DE VÁLVULAS Y DE VENTOSAS**										$ -	-	$ -	-	
4.11.1	Caja de válvulas en mampostería para H < 2,00 m	Un	13,00	$ 2.704.023,11	$ 35.152.300,46	13,00	$ 35.152.300,46	13,00	$ 35.152.300,46	-	$ -	13,00	$ 35.152.300,46	-	$ -
4,12	**CONCRETO PARA ANCLAJES**					-		-			$ -	-	$ -	-	
4.12.1	Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)	m3	34,00	$ 399.975,21	$ 13.599.157,23	5,00	$ 1.999.876,06	-	$ -	5,00	$ 1.999.876,06	5,00	$ 1.999.876,06	-	$ -
4.12.2	**Instalación de válvula de compuerta**					-		-			$ -	-	$ -	-	
4.13.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 50 mm (2")	Un	10,00	$ 108.462,49	$ 1.084.624,88	10,00	$ 1.084.624,88	10,00	$ 1.084.624,88	-	$ -	10,00	$ 1.084.624,88	-	$ -
4.13.2	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	Un	2,00	$ 159.756,85	$ 319.513,70	2,00	$ 319.513,70	2,00	$ 319.513,70		$ -	2,00	$ 319.513,70	-	$ -
4.13.3	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	Un	1,00	$ 187.042,43	$ 187.042,43	1,00	$ 187.042,43	-	$ -	1,00	$ 187.042,43	1,00	$ 187.042,43	-	$ -
4,14	**Instalación de hidrante**							-			$ -	-	$ -	-	
4.14.1	Instalación de hidrante tipo trafico norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	Un	2,00	$ 506.618,18	$ 1.013.236,35	2,00	$ 1.013.236,35	2,00	$ 1.013.236,35		$ -	2,00	$ 1.013.236,35	-	$ -
4,15	**INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR**							-			$ -	-	$ -	-	
4.15.1	Instalación de micromedidor y cajilla de micromedidor. Incluye mano de obra y suministro de accesorios (válvula de bola C/R de 1/2" HH latón, adapt hembra p/pileno 16mm x 1/2", adaptador macho pvc de 1/2", buje pvc soldado de 3/4 x 1/2, soldadura líquida	Un	85,00	$ 47.529,39	$ 4.039.997,94	110,00	$ 5.228.232,63	110,00	$ 5.228.232,63	-	$ -	110,00	$ 5.228.232,63	-	$ -
4,16	**Instalación de ventosa de triple**							-			$ -	-	$ -	-	
4.16.1	Instalación de ventosa de triple, incluye tubería y accesorios d = 2"	Un	1,00	$ 59.410,14	$ 59.410,14	1,00	$ 59.410,14	1,00	$ 59.410,14	-	$ -	1,00	$ 59.410,14	-	$ -
OBRA CIVIL FORMULARIO 4 (D)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 4**				**$ 166.996.061,08**		**$ 165.564.066,51**		**$ 159.035.728,14**		**$ 6.528.338,37**		**$ 165.564.066,51**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	35,00%			**$ 58.448.621,38**		**$ 57.947.423,28**		**$ 55.662.504,85**		**$ 2.284.918,43**		**$ 57.947.423,28**		**$ -**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 1.669.960,61**		**$ 1.655.640,67**		**$ 1.590.357,28**		**$ 65.283,38**		**$ 1.655.640,67**		**$ -**
	UTILIDAD	5%			**$ 8.349.803,05**		**$ 8.278.203,33**		**$ 7.951.786,41**		**$ 326.416,92**		**$ 8.278.203,33**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 4 (D)				**$ 235.464.446,12**		**$ 233.445.333,77**		**$ 224.240.376,67**		**$ 9.204.957,10**		**$ 233.445.333,77**		**$ -**
5	**FORMULARIO 5. PRESUPUESTO SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO**							-						-	
5.1	**LÍNEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO**							-						-	
5.1.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**						$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.1.1	d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00	$ 1.233.282,99	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99		$ -	1,00	$ 1.233.282,99	-	$ -
5.1.2	**Suministro Unión desmontaje Bridada. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES Modificatorio No 5		ACTA CANTIDADES DE OBRA No. 7						Saldos por Ejecutar	
								Acumulado Acta Anterior		Presente Acta No 7		Acumulado Ejecutado			
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
5.1.2.1	d= 100mm (4")	un	1,00	$ 2.578.953,13	$ 2.578.953,13		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.3	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.3.1	d= 100mm	m	18,00	$ 163.482,59	$ 2.942.686,58		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.4	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.4.1.	d= 100mm (4")	un	2,00	$ 1.806.896,00	$ 3.613.792,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.5	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.5.1	d= 100 mm (4") L=0,50 m	un	2,00	$ 2.080.210,74	$ 4.160.421,48		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.6	**Suministro de Tee reducida BxBxB en HD o acero . Norma ISO PN16**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.6.1	d= 100x100x50mm (4")	un	2,00	$ 4.316.353,13	$ 8.632.706,25		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2	**LÍNEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO**													-	
5.2.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.1.1	d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00	$ 1.233.282,99	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99		$ -	1,00	$ 1.233.282,99	-	$ -
5.2.2	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.2.1	d= 100mm	m	18,00	$ 163.482,59	$ 2.942.686,58		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.3	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.3.1	d= 100mm (4")	un	5,00	$ 1.806.896,00	$ 9.034.480,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.4	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.4.1	d= 100 mm (4") L=0,50 m	un	2,00	$ 2.080.210,74	$ 4.160.421,48		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.5	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.5.1	d= 100mm	m	18,00	$ 163.482,59	$ 2.942.686,58		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,3	**LÍNEA DE SALIDA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO**													-	
5.3.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.1.1	d =150 mm (6"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00	$ 1.233.282,99	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99		$ -	1,00	$ 1.233.282,99	-	$ -
5.3.3	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.3.1	d= 150mm	m	16,00	$ 163.482,59	$ 2.615.721,40		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.4	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.4.1.	d= 150mm (6")	un	4,00	$ 1.806.896,00	$ 7.227.584,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.5	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.5.1	d= 150 mm (6") L=0,20 m	un	2,00	$ 2.080.210,74	$ 4.160.421,48		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**LÍNEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO**													-	
5.4.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.1.1	d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00	$ 1.233.282,99	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99	1,00	$ 1.233.282,99		$ -	1,00	$ 1.233.282,99	-	$ -
5.4.2	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.2.1	d= 100mm	m	18,00	$ 163.482,59	$ 2.942.686,58		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.3	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.3.1	d= 100mm (4")	un	4,00	$ 1.806.896,00	$ 7.227.584,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.4	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.4.1	d= 100 mm (4") L=0,50 m	un	2,00	$ 2.080.210,74	$ 4.160.421,48		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.5	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.5.1	d= 100mm	m	16,00	$ 163.482,59	$ 2.615.721,40		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.6	**Suministro Tee BxB HD Norma ISO PN 16**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.6.1	d= 100mm (4")	un	1,00	$ 1.806.896,00	$ 1.806.896,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.7	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.7.1	d = 110 mm (4")	Un	1,00	$ 878.472,88	$ 878.472,88		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE NIVELES**													-	
5.5.1	Suministro de Válvula control nivel con flotador horizontal B xB D= 4".	un	1,00	$ 7.330.742,13	$ 7.330.742,13	1,00	$ 7.330.742,13	1,00	$ 7.330.742,13		$ -	1,00	$ 7.330.742,13	-	$ -
3.9	**Actividades No Previstas**				$ 0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
SUM-NP017	Suministro Tubería AC 4" SCH40 BxB	ML		$ 803.606,04	$ 0,00	49,50	$ 39.778.498,98	46,60	$ 37.448.041,46	2,90	$ 2.330.457,52	49,50	$ 39.778.498,98	-	$ -
SUM-NP018	Suministro Tubería AC 6" SCH40 BxB	ML		$ 1.313.524,16	$ 0,00	30,00	$ 39.405.724,80	30,00	$ 39.405.724,80		$ -	30,00	$ 39.405.724,80	-	$ -
SUM-NP019	Suministro Codo AC 4" x90° BxB	UNIDAD		$ 759.007,84	$ 0,00	12,00	$ 9.108.094,08	12,00	$ 9.108.094,08	-	$ -	12,00	$ 9.108.094,08	-	$ -
SUM-NP020	Suministro Codo AC 6" x90° BxB	UNIDAD		$ 992.224,16	$ 0,00	5,00	$ 4.961.120,80	5,00	$ 4.961.120,80		$ -	5,00	$ 4.961.120,80	-	$ -
SUMINISTROS FORMULARIO 5 (E)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 5**				**$ 86.908.217,33**		**$ 105.517.312,74**		**$ 103.186.855,22**		**$ 2.330.457,52**		**$ 105.517.312,74**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	20,00%			**$ 17.381.643,47**		**$ 21.103.462,55**		**$ 20.637.371,04**		**$ 466.091,50**		**$ 21.103.462,55**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 5 (E)				**$ 104.289.860,79**		**$ 126.620.775,28**		**$ 123.824.226,26**		**$ 2.796.549,02**		**$ 126.620.775,28**		**$ -**
6	**FORMULARIO 6. PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO**													-	
6,1	**Excavaciones a cielo abierto**										$ -	-	$ -	-	
6.1.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.)	m3	206,00	$ 27.583,05	$ 5.682.108,30	242,00	$ 6.675.098,10	242,00	$ 6.675.098,10		$ -	242,00	$ 6.675.098,10	-	$ -
6,2	**Relleno de Zanjas y obras de mamposteria**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.2.1	Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% Proctor Modificado.	m3	144,00	$ 63.972,64	$ 9.212.059,80	138,97	$ 8.889.973,56	60,97	$ 3.900.411,71	78,00	$ 4.989.561,85	138,97	$ 8.889.973,56	-	$ -
6,3	**Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.3.1	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m2	100,00	$ 22.184,70	$ 2.218.470,00	121,00	$ 2.684.348,70	121,00	$ 2.684.348,70		$ -	121,00	$ 2.684.348,70	-	$ -
6.3.2	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para Losa de fondo (cimentación incluye vigas).	m3	59,60	$ 861.568,81	$ 51.349.501,23	59,58	$ 51.330.546,71	59,58	$ 51.330.546,71		$ -	59,58	$ 51.330.546,71	-	$ -
6.3.3	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores (e = 0,20 m).	m3	4,07	$ 1.024.041,26	$ 4.167.847,94	4,20	$ 4.295.853,10	4,20	$ 4.295.853,10		$ -	4,20	$ 4.295.853,10	-	$ -
6.3.4	Concreto impermeabilizado f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa tapa tanque (Incluye vigas) .	m3	7,51	$ 1.071.244,89	$ 8.045.049,11	7,80	$ 8.351.660,82	7,80	$ 8.351.660,82		$ -	7,80	$ 8.351.660,82	-	$ -
6.3.5	Concreto impermeabilizado de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa fondo tanque. (Incluye vigas).	m3	16,95	$ 1.071.244,89	$ 18.157.600,84	19,21	$ 20.574.864,93	19,21	$ 20.574.864,93		$ -	19,21	$ 20.574.864,93	-	$ -
6.3.6	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para muros.	m3	16,47	$ 1.076.062,89	$ 17.722.755,76	18,76	$ 20.184.249,61	18,76	$ 20.184.249,61		$ -	18,76	$ 20.184.249,61	-	$ -
6.3.7	Suministro y aplicación de recubrimiento protector epóxico de alta calidad para protección de concreto contra agentes químicos y estructuras en contacto con agua potable 2 capas.	m2	75,15	$ 274.433,46	$ 20.623.674,71	82,12	$ 22.536.475,94	82,12	$ 22.536.475,94		$ -	82,12	$ 22.536.475,94	-	$ -
6,4	**VIGAS Y COLUMNAS**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.4.1	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para vigas aéreas.	m³	15,72	$ 921.833,05	$ 14.491.215,55	24,11	$ 22.227.238,50	24,11	$ 22.225.394,84	0,00	$ 1.843,67	24,11	$ 22.227.238,50	-	$ -
6.4.2	Concreto f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) para columnas	m³	24,30	$ 1.064.848,26	$ 25.875.812,78	30,97	$ 32.976.220,99	30,97	$ 32.976.220,99		$ -	30,97	$ 32.976.220,99	-	$ -
6,5	**Acero de Refuerzo**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.5.1	Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi)	kg	23.262,00	$ 5.455,84	$ 126.913.691,93	23.871,27	$ 130.237.754,76	23.871,27	$ 130.237.754,76		$ -	23.871,27	$ 130.237.754,76	-	$ -
6,6	**SELLOS Y JUNTAS**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.6.1	Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño	m	18,00	$ 66.513,04	$ 1.197.234,68	20,80	$ 1.383.471,18	20,80	$ 1.383.471,18		$ -	20,80	$ 1.383.471,18	-	$ -
6.6.2	Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tubería SikaSwell S o similar según planos y especificaciones de diseño	m	18,00	$ 61.059,94	$ 1.099.078,88	20,80	$ 1.270.046,70	-	$ -	20,80	$ 1.270.046,70	20,80	$ 1.270.046,70	-	$ -
6,7	**LÍNEA INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.7.1.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*B, L=0.75m Z= 0,30	un	1,00	$ 252.174,85	$ 252.174,85	1,00	$ 252.174,85	1,00	$ 252.174,85		$ -	1,00	$ 252.174,85	-	$ -
6.7.2.1	Instalacion de Tee reducida BxBxB en HD o acero . Norma ISO PN16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100x100x50mm (4")	un	1,00	$ 380.177,61	$ 380.177,61		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.7.3.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10 d= 100mm (4")	m	18,00	$ 44.531,83	$ 801.572,85		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.7.4.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100mm (4")	un	2,00	$ 333.696,69	$ 667.393,38		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,8	**LÍNEA SALIDA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.8.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =150 mm (6"), B*L, L=0.75m Z= 0,30 del extremo LISO	un	1,00	$ 252.174,85	$ 252.174,85	1,00	$ 252.174,85	1,00	$ 252.174,85		$ -	1,00	$ 252.174,85	-	$ -
6.8.2.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10 d= 150mm	m	16,00	$ 54.176,95	$ 866.831,20		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.8.3.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 150mm (6")	un	4,00	$ 99.242,59	$ 396.970,35		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,9	**RESPIRADEROS Y REBOSE TANQUE**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.9.1.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00	$ 28.470,00	$ 28.470,00	1,00	$ 28.470,00	1,00	$ 28.470,00		$ -	1,00	$ 28.470,00	-	$ -
6.9.2.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10 d= 100mm (4")	m	18,00	$ 44.531,83	$ 801.572,85		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.9.3.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100mm (4")	un	5,00	$ 85.315,10	$ 426.575,50		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,1	**ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE NIVELES**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.10.1	Instalación Válvula medidor de nivel d=4" BxB	un	1,00	$ 157.973,83	$ 157.973,83	1,00	$ 157.973,83	-	$ -	1,00	$ 157.973,83	1,00	$ 157.973,83	-	$ -
6,11	**INSTALACIONES METALMECÁNICAS**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.11.1	Suministro e instalación de tapa cuadrada de 1.0m x 1.0m en PRFVensamblada con tornillería en acero inoxidable con marco, de 10mm de espesor.	un	1,00	$ 752.534,19	$ 752.534,19	1,00	$ 752.534,19	-	$ -	1,00	$ 752.534,19	1,00	$ 752.534,19	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES Modificatorio No 5		ACTA CANTIDADES DE OBRA No. 7						Saldos por Ejecutar	
								Acumulado Acta Anterior		Presente Acta No 7		Acumulado Ejecutado			
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
6.11.2	Suministro e instalación de escalera Tipo gato en acero galvanizado sin canasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijación, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Según diseño planos..	ml	18,30	$ 349.273,06	$ 6.391.697,04	20,00	$ 6.985.461,25	-	$ -	20,00	$ 6.985.461,25	20,00	$ 6.985.461,25	-	$ -
6.11.3	Suministro e instalación de escalera Tipo gato en acero galvanizado con canasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijación, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Según diseño planos.	ml	5,50	$ 418.279,96	$ 2.300.539,79	10,00	$ 4.182.799,63	-	$ -	10,00	$ 4.182.799,63	10,00	$ 4.182.799,63	-	$ -
6.11.4	Suministro e instalación de pasamanos con rodapies en tubería metálica Ø1 1/4" Incluye: Platina, soldadura, y todos los elementos para su fijación, Pinturas 3 capas: Anticorrosivo, base y acabado	m	76,50	$ 177.433,80	$ 13.573.685,70	110,00	$ 19.517.718,00	110,00	$ 19.517.718,00		$ -	110,00	$ 19.517.718,00	-	$ -
6.11.5	Suministro e instalación elementos de fijación para a estructura.	un	12,00	$ 63.614,03	$ 763.368,30	46,00	$ 2.926.245,15	24,00	$ 1.526.736,60	22,00	$ 1.399.508,55	46,00	$ 2.926.245,15	-	$ -
6,12	**REGISTRO MACROMEDIDOR**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.12.1	Construcción registro para macromedidor 4" y filtro	Un	1,00	$ 12.146.361,41	$ 12.146.361,41	2,00	$ 24.292.722,83	2,00	$ 24.292.722,83	-	$ -	2,00	$ 24.292.722,83	-	$ -
6,13	**LINEA LAVADO TANQUE**					0,00		-	$ -		$ -	-	$ -	-	
6.13.1.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00	$ 1.968,86	$ 1.968,86	1,00	$ 1.968,86	1,00	$ 1.968,86		$ -	1,00	$ 1.968,86	-	$ -
6.13.2.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10V d= 100mm (4")	m	18,00	$ 44.531,83	$ 801.572,85		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.13.3.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100mm (4")	un	4,00	$ 85.315,10	$ 341.260,40		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.13.4.1	Instalacion Tee BxB HD Norma ISO PN 16 d= 100mm (4")	un	1,00	$ 380.177,61	$ 380.177,61		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.13.5.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	Un	1,00	$ 187.042,43	$ 187.042,43		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,14	**Actividades No Previstas**				$ 0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP004	Polisombra Verde para Cerramiento. Suministro e Instalación.	M2			$ 0,00	144,00	$ 995.536,80	144,00	$ 995.536,80		$ -	144,00	$ 995.536,80	-	$ -
NP009	Instalación de tubería Acero carbón SCH40 ASTM-1795	ML		$ 371.417,26	$ 0,00	81,00	$ 30.084.798,06	76,60	$ 28.450.562,12	4,40	$ 1.634.235,94	81,00	$ 30.084.798,06	-	$ -
NP011	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2		$ 46.891,31	$ 0,00	63,44	$ 2.974.784,71	63,44	$ 2.974.784,71	-	$ -	63,44	$ 2.974.784,71	-	$ -
NP014	Suministro e instalación de VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK DN 4"	Un	0,00	$ 1.328.105,19	$ 0,00	1,00	$ 1.328.105,19	-	$ -	1,00	$ 1.328.105,19	1,00	$ 1.328.105,19	-	$ -
OBRA CIVIL FORMULARIO 6 (F)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 6**				**$ 349.428.197,33**		**$ 428.351.271,79**		**$ 405.649.201,00**		**$ 22.702.070,79**		**$ 428.351.271,79**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	35,00%			**$ 122.299.869,06**		**$ 149.922.945,13**		**$ 141.977.220,35**		**$ 7.945.724,78**		**$ 149.922.945,13**		**$ -**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 3.494.281,97**		**$ 4.283.512,72**		**$ 4.056.492,01**		**$ 227.020,71**		**$ 4.283.512,72**		**$ -**
	UTILIDAD	5%			**$ 17.471.409,87**		**$ 21.417.563,59**		**$ 20.282.460,05**		**$ 1.135.103,54**		**$ 21.417.563,59**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 6 (F)				**$ 492.693.758,23**		**$ 603.975.293,23**		**$ 571.965.373,41**		**$ 32.009.919,82**		**$ 603.975.293,23**		**$ -**
7	**FORMULARIO 7. OBRA CIVIL CERRAMIENTO**							-						-	
7,1	**Excavaciones a cielo abierto**										$ -	-	$ -	-	
7.1.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.)	m3	32,00	$ 27.583,05	$ 882.657,60	31,20	$ 860.591,16	31,20	$ 860.591,16		$ -	31,20	$ 860.591,16	-	$ -
7,2	**Relleno de Zanjas y obras de mamposteria**							-			$ -	-	$ -	-	
7.2.1	Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% Proctor Modificado.	m3	20,00	$ 44.531,83	$ 890.636,50	20,00	$ 890.636,50	20,00	$ 890.636,50		$ -	20,00	$ 890.636,50	-	$ -
7,3	**OBRAS EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE**							-			$ -	-	$ -	-	
7.3.1	Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m	m2	39,62	$ 77.161,00	$ 3.056.932,71	39,47	$ 3.045.390,35	39,47	$ 3.045.390,35	-	$ -	39,47	$ 3.045.390,35	-	$ -
7,4	**VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS**							-			$ -	-	$ -	-	
7.4.1	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m2	45,00	$ 22.184,70	$ 998.311,50	45,00	$ 998.311,50	45,00	$ 998.311,50		$ -	45,00	$ 998.311,50	-	$ -
7.4.2	Concreto para pedestales f´c=21 Mpa (3000 PSI)	m3	2,81	$ 931.858,69	$ 2.618.522,91	2,40	$ 2.236.460,85	2,40	$ 2.236.460,85	-	$ -	2,40	$ 2.236.460,85	-	$ -
7.4.3	Concreto para zapatas f´c = 21,0 Mpa (3000 psi)	m3	7,80	$ 738.977,18	$ 5.764.021,97	7,20	$ 5.320.635,66	7,20	$ 5.320.635,66		$ -	7,20	$ 5.320.635,66	-	$ -
7.4.4	Concreto para vigas de amarre f´c = 21,0 Mpa (3000 psi)	m3	4,74	$ 764.654,01	$ 3.624.460,02	4,80	$ 3.670.339,26	4,80	$ 3.670.339,26		$ -	4,80	$ 3.670.339,26	-	$ -
7.4.5	Corta goteras. Diseño según planos.	ml	82,50	$ 24.324,51	$ 2.006.772,28	82,50	$ 2.006.772,28	82,50	$ 2.006.772,28		$ -	82,50	$ 2.006.772,28	-	$ -
7,5	**ACERO DE REFUERZO**							-			$ -	-	$ -	-	
7.5.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	1.025,00	$ 5.455,84	$ 5.592.233,44	1.431,29	$ 7.808.874,74	1.431,29	$ 7.808.874,74		$ -	1.431,29	$ 7.808.874,74	-	$ -
7,6	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**							-			$ -	-	$ -	-	
7.6.1	Suministro e instalación de portón de acceso de 3.70m de ancho y 2.5 m de altura en lamina galv cal. 22 y tubos galvanizados de 2", para puerta vehicular sistema de rieles, guia, topes y cerradura, con puerta peatonal de 0,7 m de ancho , bisagras y cerrad	un	1,00	$ 2.707.033,72	$ 2.707.033,72	1,00	$ 2.707.033,72	1,00	$ 2.707.033,72		$ -	1,00	$ 2.707.033,72	-	$ -
7.6.2	Suministro e instalación de concertina en acero inoxidable C18 longitud cuchilla: 65mm / Ancho cinta: 23mm, soldadura ,soporte con tubos	ml	79,00	$ 61.043,51	$ 4.822.437,49	82,50	$ 5.036.089,78	82,50	$ 5.036.089,78		$ -	82,50	$ 5.036.089,78	-	$ -
7.6.3	Suministro e Instalacion Malla Eslabonada cal. 12 para cerramiento perimetral según planos. H=2,40 mts.	m2	158,00	$ 120.855,15	$ 19.095.113,70	165,00	$ 19.941.099,75	165,00	$ 19.941.099,75		$ -	165,00	$ 19.941.099,75	-	$ -
7.7	**Actividades No Previstas**						$ -				$ -			-	$ -
NP010	Suministro e instalación de marco en tubería galvanizada como estructuración de malla eslabonada	ML		$ 125.769,53		157,60	$ 19.821.277,93			157,60	$ 19.821.277,93	157,60	$ 19.821.277,93	-	$ -
OBRA CIVIL FORMULARIO 7 (G)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 7**				**$ 52.059.133,83**		**$ 74.343.513,49**		**$ 54.522.235,56**		**$ 19.821.277,93**		**$ 74.343.513,49**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	35,00%			**$ 18.220.696,84**		**$ 26.020.229,72**		**$ 19.082.782,45**		**$ 6.937.447,27**		**$ 26.020.229,72**		**$ -**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 520.591,34**		**$ 743.435,13**		**$ 545.222,36**		**$ 198.212,78**		**$ 743.435,13**		**$ -**
	UTILIDAD	5%			**$ 2.602.956,69**		**$ 3.717.175,67**		**$ 2.726.111,78**		**$ 991.063,90**		**$ 3.717.175,67**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 7 (G)				**$ 73.403.378,71**		**$ 104.824.354,02**		**$ 76.876.352,14**		**$ 27.948.001,88**		**$ 104.824.354,02**		**$ -**
8	**FORMULARIO 8: SISTEMA ELÉCTRICO**							-						-	
8,1	**SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO**										$ -	-	$ -	-	
8.1.1	Poste en Acero Galvanizado en caliente de 5 Mts, para luminarias solares led	Un	6,00	$ 1.619.029,59	$ 9.714.177,53	6,00	$ 9.714.177,53	6,00	$ 9.714.177,53		$ -	6,00	$ 9.714.177,53	-	$ -
8.1.2	Lampara led de 90W con alimentación fotovoltaica , modulo compacto panel solar y baterías integrados, incluye brazo de soporte y tornillería de fijación, IP65.	un	11,00	$ 823.347,84	$ 9.056.826,21	10,00	$ 8.233.478,38	10,00	$ 8.233.478,38	-	$ -	10,00	$ 8.233.478,38	-	$ -
8,2	**DISTRIBUCIÓN DE CARGAS**							-			$ -	-	$ -	-	
8.2.1	Sistema de apantallamiento para tanque elevado, con altura de 20m, incluye dos (2) mástiles autosoportados sobre el tanque de 5 mts de altura: en diámetro inicial mínimo de 4", L= 3mts, un tramo de 2" L=1 mt y un tramo final de 3/4" todo en tubería IMC, d	Un	1,00	$ 10.266.469,98	$ 10.266.469,98	1,00	$ 10.266.469,98	1,00	$ 10.266.469,98		$ -	1,00	$ 10.266.469,98	-	$ -
8.2.2	Baliza de señalización para superficies fijas, Luz de obstrucción de torre incandescente doble para advertencia de aviones, faro rojo L-810 – 110VAC según normativa aeronáutica civil. acoplada a estructura metálica de tanque con alimentación fotovoltaica.	Un	2,00	$ 1.040.635,08	$ 2.081.270,15	2,00	$ 2.081.270,15	2,00	$ 2.081.270,15		$ -	2,00	$ 2.081.270,15	-	$ -
OBRA CIVIL FORMULARIO 8 (H)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 8**				**$ 31.118.743,86**		**$ 30.295.396,03**		**$ 30.295.396,03**		**$ -**		**$ 30.295.396,03**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	35,00%			**$ 10.891.560,35**		**$ 10.603.388,61**		**$ 10.603.388,61**		**$ -**		**$ 10.603.388,61**		**$ -**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 311.187,44**		**$ 302.953,96**		**$ 302.953,96**		**$ -**		**$ 302.953,96**		**$ -**
	UTILIDAD	5%			**$ 1.555.937,19**		**$ 1.514.769,80**		**$ 1.514.769,80**		**$ -**		**$ 1.514.769,80**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 8 (H)				**$ 43.877.428,85**		**$ 42.716.508,40**		**$ 42.716.508,40**		**$ -**		**$ 42.716.508,40**		**$ -**
9	**FORMULARIO 9: DEMOLICIÓN TANQUE**							-						-	
9.1.1	Demolición tanque de almacenamiento elevado en concreto reforzado existente corregimiento Burrusco.	Un	1,00	$ 18.660.771,00	$ 18.660.771,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
OBRA CIVIL FORMULARIO 9 (I)	**COSTO DIRECTO FORMULARIO 9**				**$ 18.660.771,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	35,00%			**$ 6.531.269,85**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 186.607,71**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	UTILIDAD	5%			**$ 933.038,55**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	COSTO TOTAL FORMULARIO 9 (H)				**$ 26.311.687,11**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES Modificatorio No 5		ACTA CANTIDADES DE OBRA No. 7						Saldos por Ejecutar	
								Acumulado Acta Anterior		Presente Acta No 7		Acumulado Ejecutado			
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN OBRA CIVIL + SUMINISTROS															
TOTAL (J) = SUMA FORMULARIOS	COSTO TOTAL (J) = SUMA DE COSTOS TOTALES DE (A + B + C + D + E + F + G + H + I)				$ 4.587.854.286		$ 5.430.361.642		$ 5.277.958.038		$ 152.403.604		$ 5.430.361.642		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO	$	4.587.854.286	
VR ADICIONES	$	842.507.355	
VR ACTUAL CONTRATO	$	5.430.361.642	
VR ANTICIPO	$	1.376.356.285,80	
% ANTICIPO		30,00%	
% RETEGARANTIA		0,00%	

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	RETEGARANTÍA	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	COBRO PARCIAL No. 1	23/03/2023	$ 1.439.746.777	$ 431.924.033	$ 944.432.253	$ -	$ 1.007.822.744	$ 3.990.614.865	26,51%
2	COBRO PARCIAL No. 2	25/05/2023	$ 704.436.218	$ 211.330.865	$ 733.101.387	$ -	$ 493.105.353	$ 3.286.178.647	12,97%
3	COBRO PARCIAL No. 3	26/07/2023	$ 971.809.534	$ 291.542.860	$ 441.558.527	$ -	$ 680.266.674	$ 2.314.369.113	17,90%
4	COBRO PARCIAL No. 4	8/11/2023	$ 1.457.291.510	$ 437.187.453	$ 4.371.074	$ -	$ 1.020.104.057	$ 857.077.603	26,84%
5	COBRO PARCIAL No. 5	1/12/2023	$ 536.465.662	$ 4.371.074	$ -	$ -	$ 532.094.588	$ 320.611.941	9,88%
6	COBRO PARCIAL No. 6	2/12/2024	$ 168.208.337	$ -			$ 168.208.337	$ 152.403.604	3,10%
7	COBRO PARCIAL No. 7	27/10/2025	$ 152.403.604	$ -			$ 152.403.604	-$ 0	2,81%
		TOTAL BALANCE FINANCIERO	$ 5.430.361.642	$ 1.376.356.286	$ -	$ -	$ 4.054.005.356,20	-$ 0	100,00%

Para Constancia, firman los intervinientes en la fecha indicada para este documento, siendo claro que el recibo parcial de las actividades aquí consignadas, no exime al contratista de sus obligaciones para con la eventualidad de correctivos a que exista lugar durante el desarrollo del contrato y el periodo de garantía de estabilidad de las obras tras el recibo final del contrato:

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: GLORIA CONSUELO BERMUDEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

lunes, 27 de octubre de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
Firma:

Nombre: EWAR TORRES
VoBo. SUPERVISOR DEL CONTRATO - GOBERNACIÓN DE ATLÁNTICO

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		Tubería HD ACERROJADA ESTÁNDAR CL 40 VI Ø 150mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO - LÍNEA DE IMPULSIÓN		7	1.1.1	M





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TUBO HD TYT DN150 CL40 (L:6)		582,00		582,00	1,00	582,00
TUBO STANDARD DN150 C40 L:5.5		1001,00		1001,00	1,00	1001,00
TUBO STANDARD DN150 C40 L:5.5		60,50		60,50	1,00	60,50
TUBO STANDARD DN150 C40 L:5.5		1001,00		1001,00	1,00	1001,00
TUBO STANDARD DN150 C40 L:5.5		1281,50		1281,50	1,00	1281,50
TUBO STANDARD DN150 C40 L:5.5		1001,00		1001,00	1,00	1001,00
TUBO STANDARD DN150 C40 L:5.5		110,00		110,00	1,00	110,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	5037,00
		Total acumulado pago anterior	5037,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO - LÍNEA DE IMPULSIÓN	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	7	**1.1.2**	**M**

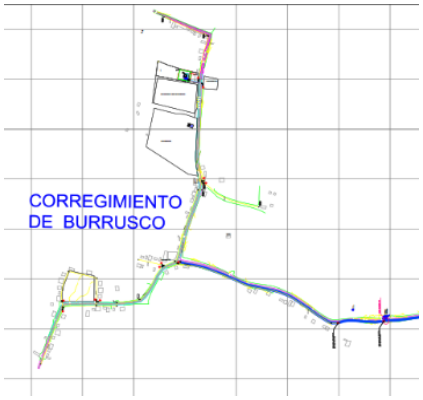

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		228,38		228,38	1,00	228,38
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19		157,26		157,26	1,00	157,26
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27		14,90		14,90	1,00	14,90
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		41,70		41,70	1,00	41,70

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	442,25
		Total acumulado pago anterior	442,25
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10 d = 50 mm (2")	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO		7	1.2.1	UN

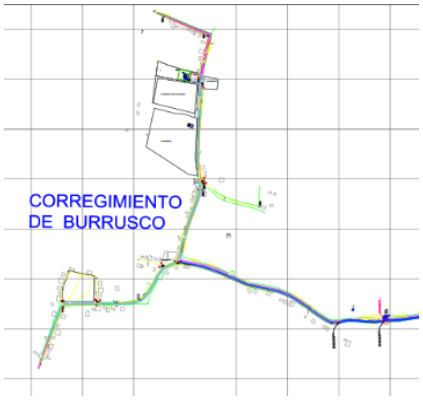

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Válvula Ventosa en K0+340				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K1+065				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K1+445				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K2+160				1,00	1,00	1,00
Válvula de purga en K2+795				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K2+975				1,00	1,00	1,00
Válvula de purga en K3+100				1,00	1,00	1,00
Valvula ventosas adicionales				1,00	7,00	7,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	14,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	14,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Atlántico para la Gente

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10 d = 110 mm (4")	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO		7	1.2.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja By-Pass red de conducción - red de distribución				3,00	1,00	3,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	3,00
		Total acumulado pago anterior	3,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de ventosa antifraude, doble cámara, triple acción bridada norma ISO PN 10 d = 50 mm (2")	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO		7	1.3.1	UN

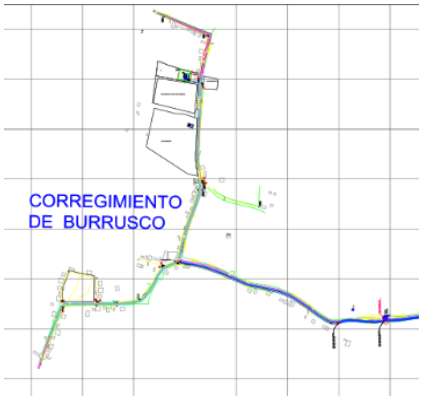

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Ventosa K0+340				1,00	1,00	1,00
Ventosa K1+065				1,00	1,00	1,00
Ventosa K1+445				1,00	1,00	1,00
Ventosa K2+160				1,00	1,00	1,00
Ventosa K2+975				1,00	1,00	1,00
Estación reguladora				1,00	4,00	4,00
Ventosas adicionales				1,00	7,00	7,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	16,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	16,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Codos	Codo en PVC Ø 4" X 90°	7	1.4.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 20					1,00	1,00
ND 23					1,00	1,00
ND 22					1,00	1,00
ND 26					1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	4,00
		Total acumulado pago anterior	4,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Tee de HD 100 x 100 mm - 4" X 4" Bridado	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Tees		7	1.5.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja By-Pass red de conducción - red de distribución				2,00	1,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	2,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	HD 150mm	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Adaptadores Brida x Universal HD		**7**	**1.6.1**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión de accesorios				236,00	1,00	236,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	**Total acumulado presente acta**	**236,00**
		Total acumulado pago anterior	**230,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**6,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Reduccion en HD 150 x 100 mm Bridado	7	**1.7.2**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Empalme tuberia HD 6" - PVC 4"				1,00	1,00	1,00
Conexión tanque elevado Tubería 6" - Macro 4"				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	2,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Union Universal en HD 100 mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto		7	1.7.3	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Empalme tuberia HD 6" - PVC 4"				1,00	1,00	1,00
Conexión PEAD - PVC				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	2,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Válvula de compuerta elástica Bridada d= 100 mm ISO PN10	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		**7**	**1.9.1**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	3,00	3,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	**Total acumulado presente acta**	**3,00**
		Total acumulado pago anterior	**3,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Macromedidor tipo Woltmann 4".	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		7	1.9.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Tee de Polietileno 110mm X110x110	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		7	1.9.3	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		7	1.9.7	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	8,00	8,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	8,00
		Total acumulado pago anterior	8,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		7	1.9.8	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	8,00	8,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	8,00
		Total acumulado pago anterior	8,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Codo de Polietileno 110mm X 90°	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		**7**	**1.9.9**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	**Dimensiones**			**Cant. Parcial** (d = b)	**No. De Elementos** (e)	**Sub Total** (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	**Largo (m)** (b)	**Alto (m)** (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Total acumulado presente acta**	**2,00**
	Daniela Jimenez	**Total acumulado pago anterior**	**2,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Unión de desmontaje HD D = 110 MM (4") ISO PN 10	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 4"		**7**	**1.9.11**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	**Dimensiones**			**Cant. Parcial** (d = b)	**No. De Elementos** (e)	**Sub Total** (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	**Largo (m)** (b)	**Alto (m)** (c)			
Caja Macromedición en nuevo tanque elevado				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**		
	Daniela Jimenez	**Total acumulado presente acta**	**1,00**
		Total acumulado pago anterior	**1,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Válvula de compuerta elástica Bridada d= 150 mm ISO PN10	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Estación Reguladora en Linea de Conducción				1,00	4,00	4,00
Conexión tee partida				1,00	1,00	1,00
Conexión macromedidor				1,00	1,00	1,00
Conexión tee de derivación				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	8,00
		Total acumulado pago anterior	8,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"	Macromedidor tipo Woltmann 6".	7	**1.10.2**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en Martillo				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Tee de Polietileno 160mm X160x160	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.3	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en Martillo				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Niple HD, 160mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.5	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en Martillo				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 160mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.7	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Empalme Pead-HD				1,00	1,00	1,00
Derivación a estación de bombeo				1,00	3,00	3,00
Empalme Caja Reguladora				1,00	1,00	1,00
Conexión Purga (Tuberia PEAD - Valvula HD)				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	7,00
		Total acumulado pago anterior	7,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 160mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.8	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Empalme Pead-HD				1,00	1,00	1,00
Derivación a estación de bombeo				1,00	3,00	3,00
Empalme Caja Reguladora				1,00	1,00	1,00
Conexión Purga (Tuberia PEAD - Valvula HD)				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	7,00
		Total acumulado pago anterior	7,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Codo de Polietileno 160mm X 90°	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.9	UN

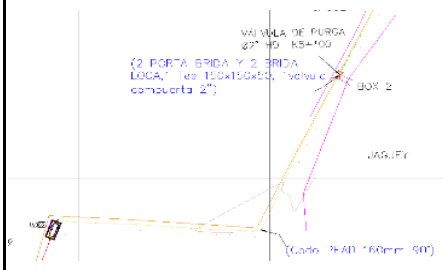

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Cambio de dirección PEAD				1,00	1,00	1,00
Conexión Caja Estación Reguladora				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	3,00
		Total acumulado pago anterior	3,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Unión de desmontaje HD D = 150 MM (6") ISO PN 10	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.11	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en Martillo				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Válvula reductora de presión Ø 6" B x B.	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.12	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en Martillo				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Válvula reguladora de Caudal Ø 6" B x B.	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Accesorios Macromedidor 6"		7	1.10.13	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Macromedición en Martillo				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10 d = 80 mm (3")	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	NP-3.2.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Valvulas Purga				1,00	4,00	4,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	4,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	4,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LINEA DE CONDUCION	Suministro Unión desmontaje Bridada. Norma ISO. PN 10 d= 100mm (4")	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: Actividades No Previstas		7	NP-5.1.2.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Macromedicion				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16 d= 150mm (6")	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	NP-5.3.4.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión a red PVC 4"				1,00	1,00	1,00
Entradas a viviendas				2,00	12,00	24,00
Cambios de dirección tuberia 150mm				1,00	2,00	2,00
Estación reguladora 6"				1,00	4,00	4,00
Conexión tee partida				1,00	2,00	2,00
K3+000				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	34,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	34,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m d =150 mm (6"). B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	NP-5.3.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Estación reguladora 6"				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Tee de HD 150 x 50 mm - BXBXB	7	SUM-NP001	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Válvula Ventosa en K0+340				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K1+065				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K1+445				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K2+160				1,00	1,00	1,00
Válvula de purga en K2+795				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K2+975				1,00	1,00	1,00
Válvula de purga en K3+100				1,00	1,00	1,00
Ventosas adicionales				1,00	7,00	7,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	14,00
Total acumulado pago anterior	14,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Tee de HD 150 x 80 mm - BXBXB	7	SUM-NP002	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
K0+425				1,00	1,00	1,00
K1+500				1,00	1,00	1,00
K2+795				1,00	1,00	1,00

Validaciones de Cantidades en Memorial

Total acumulado presente acta	**3,00**
Total acumulado pago anterior	**3,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Codo 45° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 16	7	SUM-NP003	Un



FIJACION EN PASOS ENTERRADOS DE ACUEDUCTO EN HIERRO DUCTIL DE DIAMETRO IGUAL DE 150mm



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Entradas a viviendas				1,00	50,00	50,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
	Total acumulado presente acta: 50,00
	Total acumulado pago anterior: 50,00
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7: 0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Codo 11.25° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 16	7	SUM-NP004	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
CAMBIOS DE DIRECCION				5,00	1,00	5,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**5,00**
Total acumulado pago anterior	**5,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro de niple d = 50 mm (2") BXL L= 0,50 m HD ISO PN 12.5	7	SUM-NP005	Un



CAJA PURGA SOBRE LA LINEA

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
K3+100				1,00	1,00	1,00
K5+100				1,00	1,00	1,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**2,00**
Total acumulado pago anterior	**2,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro de niple d = 80 mm (3") BXL L= 0,50 m HD ISO PN 12.5	7	SUM-NP006	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
K0+425				1,00	1,00	1,00
K1+500				1,00	1,00	1,00
K2+795				1,00	1,00	1,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**3,00**
Total acumulado pago anterior	**3,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro tubería PEAD de 110mm	7	SUM-NP007	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión de elementos en macromedidor 4"		12,00		12,00	1,00	12,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	12,00
Total acumulado pago anterior	12,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Filtro en Yee HD brida x brida con válvula de purga d=100mm	7	SUM-NP008	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Elementos en macromedidor 4"				1,00	1,00	1,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	1,00
Total acumulado pago anterior	1,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro tubería PEAD de 160mm	7	SUM-NP009	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Dimensiones Largo (m) (b)	Dimensiones Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Conexión de elementos en macromedidor 6"		282,00		282,00	1,00	282,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	282,00
Total acumulado pago anterior	282,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Filtro en Yee HD brida x brida con válvula de purga d=150mm	7	SUM-NP010	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Dimensiones Largo (m) (b)	Dimensiones Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Elementos en macromedidor 6"				2,00	1,00	2,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	2,00
Total acumulado pago anterior	2,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro de Tubería de PVC Ø 10"	7	SUM-NP011	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ENCAMISADO DE TUBERÍA		350,00		350,00	1,00	350,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	350,00
Total acumulado pago anterior	350,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Codo 22.5° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 16	7	SUM-NP012	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
K0+340				1,00	1,00	1,00
K0+435				1,00	1,00	1,00
K2+530				1,00	1,00	1,00
K3+080				1,00	1,00	1,00
K3+301				1,00	1,00	1,00
Empalme Caja Estacion Reguladora				1,00	1,00	1,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	Total acumulado presente acta	6,00
	Total acumulado pago anterior	6,00
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de medidor para agua con cuerpo de composite (metálico), tipo velocidad chorro único de transmisión mecánica, modelo venus, rango metrológico R200, diámetro DN 15 (1/2")*115mm de longitud, (7/8" - 3/4") Pre- Equipado para lectura. Incluye Carta de Garantía y Certificado de Calibración por Laboratorio Acreditado por la ONAC.	ACTA No.	Ítem de Paao	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	SUM-NP013	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**110,00**
Total acumulado pago anterior	**110,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de Niples HD con inserción roscada, PN 10 B x B d= 150 mm (6") L=0,50 m	ACTA No.	Ítem de Paao	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	SUM-NP014	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Adición Válvula ventosa simple Estación Reguladora				1,00	4,00	4,00
Adición Manómetro Estación Reguladora				1,00	4,00	4,00

Validaciones de Cantidades en Memorial

Total acumulado presente acta	8,00
Total acumulado pago anterior	8,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION	Suministro de Manómetro rango: 0 - 1.000 PSI/BAR caratula 4" conexión vertical 1/2" NPT	ACTA No.	Ítem de Paao	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	SUM-NP015	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Adición Manómetro Estación Reguladora				1,00	4,00	4,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**4,00**
Total acumulado pago anterior	**4,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 1. SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCION		ACTA No.	Ítem de Paao	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Tee de HD 150 x 150 mm - BXBXB	7	SUM-NP016	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Estación Reguladora				1,00	2,00	2,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	**Total acumulado presente acta** 2,00
	Total acumulado pago anterior 2,00
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7 0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: PRELIMINARES	Trazado y replanteo	7	**2.1.1**	**ML**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		219,60		219,60	1,00	219,60
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19		151,21		151,21	1,00	151,21
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27		14,33		14,33	1,00	14,33
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		40,10		40,10	1,00	40,10
Linea de conducción según levantamiento topografico		5317,00		5317,00	1,00	5317,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	5742,24
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	5742,24
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: PRELIMINARES	Demonte y limpieza	7	2.1.2	M2



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27 Red PVC 4"	0,60	219,60		131,76	1,00	131,76
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19 Red PVC 4"	0,60	151,21		90,73	1,00	90,73
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27 Red PVC 4"	0,60	14,33		8,60	1,00	8,60
Zona Tanque Elevado	13,00	40,10		521,30	1,00	521,30
Linea de conducción según levantamiento topografico	0,70	5297,00		3707,90	1,00	3707,90

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	4460,28
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	4460,28
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 27/10/2025

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN			ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	7	2.2.1	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,60	1,00	87,84	1,00	87,84
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19	0,40	151,21	1,00	60,48	1,00	60,48
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27	0,40	14,33	1,00	5,73	1,00	5,73
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	40,10	1,00	16,04	1,00	16,04
Linea de conducción según levantamiento topografico	0,70	1282,74	1,20	1077,50	1,00	1077,50
Excavación para instalación soportes en concreto de tuberia 150mm	0,40	0,60	0,35	0,08	670,00	56,28
Tramos en arroyos	0,70	350,00	1,80	441,00	1,00	441,00
Excavación para mejoramiento de subrasante	5,00	45,00	0,80	180,00	1,00	180,00
Excavación para instalacion de juntas restrictoras en bridas universales HD 150 mm	1,50	1,00	1,20	1,80	34,00	61,20

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimeno	Total acumulado presente acta	1986,08
		Total acumulado pago anterior	1924,77
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	61,31
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de Tuberías HD Acerrojada incluye soportes para tubería expuesta	Tubería 150 mm	7	**2.3.1**	**M**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Linea de conducción según levantamiento topografico		3686,39		3686,39	1,00	3686,39

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	3686,39
		Total acumulado pago anterior	3686,39
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de Tuberías HD Acerrojada para tubería enterrada	Tubería 150 mm	7	2.3.2	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
K0+000 a K0+420		200,00		200,00	1,00	200,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	200,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	200,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	Tubería de PVC 4" RDE 21	7	**2.4.1**	**ML**





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		219,60		219,60	1,00	219,60
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19		151,21		151,21	1,00	151,21
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27		14,33		14,33	1,00	14,33
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		40,10		40,10	1,00	40,10

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	425,24
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	425,24
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Relleno de zanjas y de obras de mampostería	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	7	2.5.1	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Linea de conducción según levantamiento topografico	0,70	1282,61	0,85	763,15	1,00	763,15
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,60	0,69	60,61	1,00	60,61
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19	0,40	151,21	0,69	41,73	1,00	41,73
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27	0,40	14,33	0,69	3,96	1,00	3,96
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	40,10	0,69	11,07	1,00	11,07
Tramos en arroyos	0,70	350,00	1,45	355,25	1,00	355,25

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1235,77
		Total acumulado pago anterior	1235,77
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Relleno de zanjas y de obras de mampostería	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	7	2.5.1	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Descuento del tubo	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)				
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,60	0,30	2,09	24,27	1,00	24,27
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19	0,40	151,21	0,30	1,44	16,71	1,00	16,71
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27	0,40	14,33	0,30	0,14	1,58	1,00	1,58
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	40,10	0,30	0,38	4,43	1,00	4,43
Linea de conducción según levantamiento topoarafico	0,70	1282,74	0,30	22,67	246,71	1,00	246,71
Excavación para instalacion de juntas restrictoras en bridas universales HD 150 mm	1,50	1,00	1,20	0,02	1,78	34,00	60,60

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	354,29
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	293,67
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	60,62
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Relleno de zanjas y de obras de mampostería	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa	7	2.5.3	M3



Localización	Dimensiones			Descuento del tubo	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)				
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,60	0,31	2,09	25,14	1,00	25,14
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 19	0,40	151,21	0,31	1,44	17,31	1,00	17,31
TRAMO ENTRE ND 28 Y ND 27	0,40	14,33	0,31	0,14	1,64	1,00	1,64
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	40,10	0,31	0,38	4,59	1,00	4,59
Linea de conducción según levantamiento topoarafico	0,70	1282,61	0,50	22,67	426,25	1,00	426,25

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Total acomulado presente acta**	**474,94**
		Total acumulado pago anterior	**474,94**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Acero de Refuerzo	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	7	2.6.1	Kg



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Construcción de anden				60,00	2,00	120,00
Construccion de bordillo				80,00	1,00	80,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	200,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	200,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Caja de valvulas en mampostería para H < 2,00 m (Sumando la Valcula que va a la salida de conexión con Martillo)	ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: CAJAS DE VALVULAS Y DE VENTOSAS		7	2.8.1	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Valvula Ventosa				1,00	1,00	1,00
Caja Valvula Purga				1,00	3,00	3,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	4,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	4,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LINEA DE CONDUCCION		ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: CONCRETO PARA ANCLAJES	Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)	7	2.9.1	Un

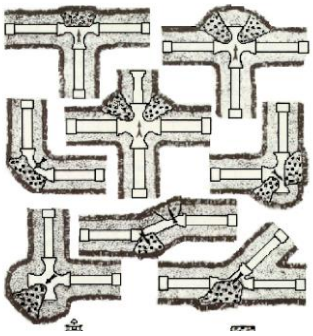

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Accesorios Linea conducción	0,60	0,40	0,50	0,14	228,00	32,83
Atraque de accesorios en conexión tee 500x150	2,00	1,70	0,60	2,45	0,83	2,03

Total acomulado presente acta	34,86
Total acumulado pago anterior	32,54
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	2,32

Validaciones de Cantidades en Memorial

Por Interventoría	Por Contratista
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing Daniella Jimenez

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de válvula de compuerta	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 50 mm (2")	7	**2.10.1**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
K0+340				1,00	1,00	1,00
K1+065				1,00	1,00	1,00
K1+775				1,00	1,00	1,00
K2+935				1,00	1,00	1,00
K3+100				1,00	1,00	1,00
K4+480				1,00	1,00	1,00
K5+100				1,00	1,00	1,00
K5+210				1,00	1,00	1,00
Ventosas adicionales				6,00	1,00	6,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	14,00
		Total acumulado pago anterior	14,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de válvula de compuerta	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	7	**2.10.2**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja By-Pass red de conducción - red de distribución				3,00	1,00	3,00
MACROMEDICIÓN				3,00	1,00	3,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	6,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	6,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación macromedición.	Instalacion macromedidor y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d=110 mm 4".	7	**2.11.1**	**UN**



INSTALACIÓN TIPICA PARA FILTRO
Y MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 90 - 200 mm

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Macromedición				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	**Total acomulado presente acta**	**1,00**
		Total acumulado pago anterior	**1,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación macromedición.	Instalacion macromedidor, válvula reguladora de caudal, de presión y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d = 150 mm (6")	7	2.11.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Macromedición				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10	Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10. Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, incluye tubería de polietileno (L <=9m) y accesorios d = 50 mm (2")	7	2.12.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Válvula Ventosa en K0+340				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K1+065				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K1+445				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K2+160				1,00	1,00	1,00
Válvula de purga en K2+795				1,00	1,00	1,00
Válvula Ventosa en K2+975				1,00	1,00	1,00
Válvula de purga en K3+100				1,00	1,00	1,00
Estación reguladora				1,00	5,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	12,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	12,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Empalmes a red de acueducto	Suministro e Instalación de abrazadera con derivación tipo tee. Brida x Brida. Norma ISO PN 10 y PN 16, Incluye el suministro de la Tee, valvula de compuerta BxB d=6", tornillería, empaquetadura para el montaje y servicio de perforacion. Tee	7	**2.13.1**	**UN**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión tuberia conduccion a tuberia principal Ponedera - Sabanalarga				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	1,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Empalmes a red de acueducto	Construccion registro macromedidor 6" y valvula reguladora de presion y caudal	7	2.14.1	UN





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Caja Estación Reguladora				1,00	1,00	1,00
Caja Macromedicion				1,00	1,00	1,00
Caja tee de derivación a Nueva estación de bombeo				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	3,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	3,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Suministro e Instalación de Niple en HD, 150 mm ISO PN10 1.0 m < L >2.0 m para enterrado de tuberia en entradas	ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	NP001	UN





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Cambio cota de batea tuberia HD d=150mm				1,00	35,00	35,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	35,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	35,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Encamisado de Tuberias HD 150mm En Paso De Canales de agua o arroyos (Incluye instalación de tuberia PVC 10" y colocación de concreto f'c=17,5 Mpa (2500 psi))	7	NP002	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Dimensiones Largo (m) (b)	Dimensiones Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Encamisado de Tubería		350,00		350,00	1,00	350,00

Total acumulado presente acta	350,00
Total acumulado pago anterior	350,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Validaciones de Cantidades en Memorial

Por Interventoría	Por Contratista
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Fijación de Elementos Bridados para Integración de Dispositivo de Control de Presión y Flujo en la red de Conducción (Icluye Corte y Biselado de Tubería HD 150mm e Iinstalación de Elementos Bridados)	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	NP003	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
K0+340				1,00	1,00	1,00
K1+065				1,00	1,00	1,00
K1+775				1,00	1,00	1,00
K2+935				1,00	1,00	1,00
K3+100				1,00	1,00	1,00
K4+480				1,00	1,00	1,00
K5+100				1,00	1,00	1,00
K5+210				1,00	1,00	1,00
K0+425				1,00	1,00	1,00
K1+500				1,00	1,00	1,00
K2+795				1,00	1,00	1,00
Valvulas ventosa adicionales				1,00	6,00	6,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	17,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	17,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	7	NP004	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CERRAMIENTO TANQUE	12,00	12,00		144,00	1,00	144,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	144,00
		Total acumulado pago anterior	144,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Instalación de tuberia en hierro ductil D=150mm para paso de tuberia en entradas a viviendas, canales de agua y corredor vial (Incluye corte de tuberia, viselado, preparación de juntas, traslado de tuberia en corredor vial Burrusco-Martillo)	7	NP005	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Dimensiones Largo (m) (b)	Dimensiones Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
TUBERIA ENTERRADA SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		1150,61		1150,61	1,00	1150,61

Total acumulado presente acta	1150,61
Total acumulado pago anterior	1150,61
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:
	Daniela Jimenez
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Instalación de tubería PEAD de 160mm	7	NP006	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Trazado lindante a jagey		282,00		282,00	1,00	282,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	282,00
		Total acumulado pago anterior	282,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro e instalación de aislamiento en neopreno 1/8" (en vinchas de fijación tuberia) para proteccion de tuberia HD 150mm en area de contacto con soporte en concreto y abrazadera de amarre metalica	7	NP007	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Soportes para tuberia construidos				670,00	1,00	670,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	670,00
		Total acumulado pago anterior	670,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 2. OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Suministro e instalación de manga en polietileno para revestimiento exterior de tuberia HD 150mm en enterrados de tuberia	ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		7	NP008	UN





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
K4+865 - K5+292		427,00		427,00	1,00	427,00
K4+715 - K4+750		35,00		35,00	1,00	35,00
K0+995 - K1+014		19,00		19,00	1,00	19,00
K0+639 - K0+720		81,00		81,00	1,00	81,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	562,00
		Total acumulado pago anterior	562,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO		ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Instalacion Tuberia Acero al Carbon	7	NP009	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
LINEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO		18,10		18,10	1,00	18,10
LINEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO		19,05		19,05	1,00	19,05
LINEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO		12,35		12,35	1,00	12,35
LINEA DE SALIDA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO		30,00		30,00	1,00	30,00
INSTALACION DE NIPLE LINEA LAVADO TANQUE ALMACENAMIENTO		0,75		0,75	1,00	0,75
INSTALACION DE NIPLE LINEA REBOSE TANQUE ALMACENAMIENTO		0,75		0,75	1,00	0,75

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	81,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	76,60
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	4,40
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro e instalación de tuberia galvanizada como estructuración de marco para instalación malla eslabonada	7	NP010	ML



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PRIEMETRO ENCERRAMIENTO		78,80		78,80	2,00	157,60

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	157,60
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	157,60
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: Actividades No Previstas	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	6	NP011	M2



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
AREA PINTURA	5,20	3,05		15,86	4,00	63,44

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**63,44**
Total acumulado pago anterior	**63,44**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	**Por Contratista**
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Valida: Ing Daniella Jimenez**

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: Actividades No Previstas	Estabilización de corredor vial con piedra ciclópea ó similar	7	NP012	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
CORREDOR VIAL CONJUNTO CEMENTERIO MARTILLO	5,00	45,00	0,60	135,00	1,00	135,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	135,00
Total acumulado pago anterior	135,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing Daniella Jimenez	

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: Actividades No Previstas	Mejoramiento de la subrasante con adición de material de cantera	7	NP013	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CORREDOR VIAL CONJUNTO CEMENTERIO MARTILLO	5,00	45,00	0,20	45,00	1,00	45,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	Total acumulado presente acta: 45,00
	Total acumulado pago anterior: 45,00
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7: 0,00

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing Daniella Jimenez	

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: Actividades No Previstas	Suministro e instalación de VALVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK DN 4"	6	NP014	un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Tubería de robose del tanque elevado				1,00	1,00	1,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	Total acumulado presente acta: 1,00
	Total acumulado pago anterior:
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7: 1,00
Por Interventoría	Por Contratista
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing Daniella Jimenez

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 2. PRESUPUESTO OBRA CIVIL REDES (LINEA DE CONDUCCION)		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro e instalación de Restrictor HD para tuberia HD DN 150mm (incluye tornilleria y varilla roscada)	7	NP015	un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Accesos a predios - línea de conducción				1,00	208,00	208,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**208,00**
Total acumulado pago anterior	**105,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**103,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	7	3.1.1	M





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		40,10		40,10	1,00	40,10

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	40,10
		Total acumulado pago anterior	40,10
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Tubería de PVC Ø 2" RDE 21	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO		7	3.1.2	M



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44		93,12		93,12	1,00	93,12
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25		77,40		77,40	1,00	77,40
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		7,04		7,04	1,00	7,04
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		223,39		223,39	1,00	223,39
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20A		178,50		178,50	1,00	178,50
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 28		24,85		24,85	1,00	24,85
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30		157,69		157,69	1,00	157,69
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42		345,10		345,10	1,00	345,10
TRAMO ENTRE ND 42 Y ND 43		24,90		24,90	1,00	24,90
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31		20,62		20,62	1,00	20,62
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23		58,91		58,91	1,00	58,91
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 32		120,76		120,76	1,00	120,76
TRAMO ENTRE ND 32 Y ND 33		53,19		53,19	1,00	53,19
TRAMO ENTRE ND 34 Y ND 35		38,34		38,34	1,00	38,34
TRAMO ENTRE ND 36 Y ND 37		49,53		49,53	1,00	49,53
TRAMO ENTRE ND 37 Y ND 38		58,81		58,81	1,00	58,81
TRAMO ENTRE ND 38 Y ND 39		67,08		67,08	1,00	67,08
TRAMO ENTRE ND 35 Y ND 39		67,28		67,28	1,00	67,28
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40		115,68		115,68	1,00	115,68
TRAMO ENTRE ND 27 Y FINCA DETRÁS DE PUESTO SALUD		122,93		122,93	1,00	122,93
PROYECCION A MARTILLO		163,86		163,86	1,00	163,86
CRUCES PLACA HUELLA		7,00		7,00	9,00	63,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	2132,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2132,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN			ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10	d = 50 mm (2")	7	3.2.1	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26 (VA3-VA2)				2,00	1,00	2,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20 (VA4)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND23 (VA6)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND32 (VA7)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND39-ND38 (VA9)				1,00	1,00	1,00
VA5				1,00	1,00	1,00
VA8				1,00	1,00	1,00
VA10				1,00	1,00	1,00
VALVULA DE PURGA				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	10,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	10,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10	d = 80 mm (3")	7	3.2.2	UND

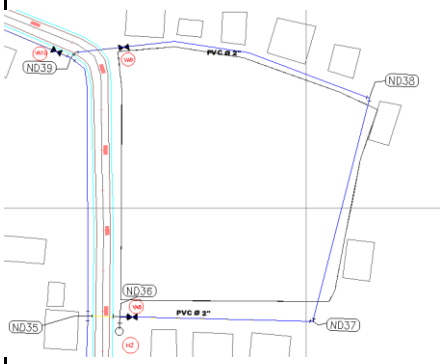

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN HIDRANTE 1				1,00	1,00	1,00
CONEXIÓN HIDRANTE 2				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10	d = 110 mm (4")	7	3.2.3	UND

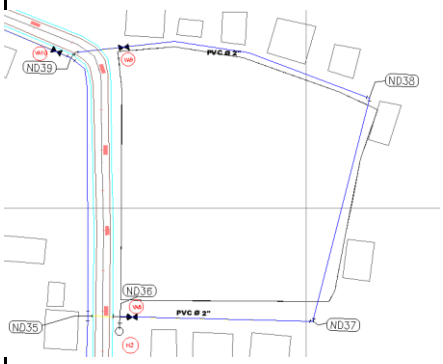

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN ACCESORIOS 4"				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de hidrante tipo milan norma ISO PN 10	d = 75 mm (3")	7	3.3.1	UND

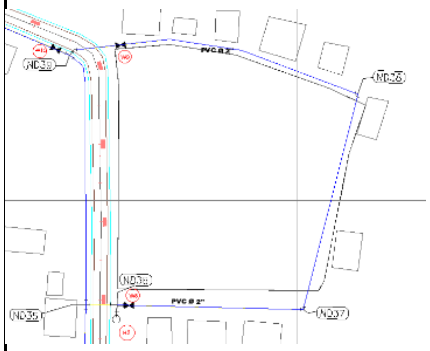

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN HIDRANTE 1				1,00	1,00	1,00
CONEXIÓN HIDRANTE 2				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	2,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Codos	Codo en PVC Ø 4" X 90°	7	3.4.1	UN

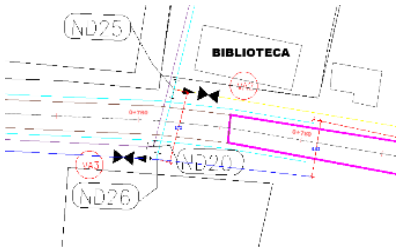

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 26					1,00	1,00
Ajustes a macro					3,00	3,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	4,00
		Total acumulado pago anterior	4,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Codo en PVC Ø 2" X 90°	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Codos		7	3.4.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 44					1,00	1,00
ND 37					1,00	1,00
Ajustes en topo					6,00	6,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	8,00
		Total acumulado pago anterior	8,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Codo en PVC Ø 2" X 45°	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Codos		7	3.4.3	UN

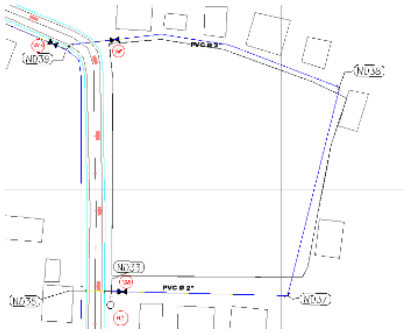

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 29 - 30 (POR OCASIÓN DESVIÓ TUBERÍA GAS NATURAL)				4,00	4,00	4,00
ND 31				1,00	1,00	1,00
ND 38				1,00	1,00	1,00
Ajustes en topo				14,00	1,00	14,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	20,00
		Total acumulado pago anterior	20,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Tees	Tee de PVC 2" x 2"	7	3.5.1	UN

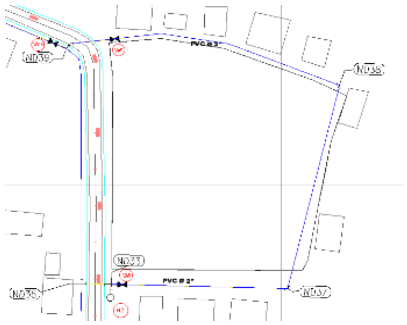

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 41					1,00	1,00
ND 35					1,00	1,00
ND 30					1,00	1,00
ND 27					1,00	1,00
ND 39					1,00	1,00
ND 34					1,00	1,00
ND 41					1,00	1,00
Puesto de salud					1,00	1,00
Conexión a topos					2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	10,00
		Total acumulado pago anterior	10,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Tee de PVC 4" x 2"	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Tees		7	3.5.2	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 25					1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Tee de HD 50 x 50 mm - 2" X 2" Extremo liso	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de Tees		7	3.5.3	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN A HIDRANTES					2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Tapón soldado en PVC Ø 2"	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto		7	3.6.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 45					1,00	1,00
ND 20A					1,00	1,00
ND 23					1,00	1,00
ND 28A					1,00	1,00
ND 43					1,00	1,00
ND 40					1,00	1,00
TRAMO FINCA DETRÁS PUESTO SALUD					1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	7,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	7,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Adaptador Brida x Universal 50 mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto		7	3.6.2	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26 (VA3-VA2)				2,00	2,00	4,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20 (VA4)				1,00	2,00	2,00
TRAMO ENTRE ND31-ND23 (VA6)				1,00	2,00	2,00
TRAMO ENTRE ND31-ND32 (VA7)				1,00	2,00	2,00
TRAMO ENTRE ND39-ND38 (VA9)				1,00	2,00	2,00
VA5				1,00	2,00	2,00
VA8				1,00	2,00	2,00
VA10				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	18,00
		Total acumulado pago anterior	18,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Adaptador Brida x Universal 80 mm	7	3.6.3	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN HIDRANTE 1				1,00	2,00	2,00
CONEXIÓN HIDRANTE 2				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	4,00
		Total acumulado pago anterior	4,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Adaptador Brida x Universal 110 mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto		7	3.6.4	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN VALVULA				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Unión Universal 50 mm HD	7	3.6.5	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN HIDRANTE 1				1,00	2,00	2,00
CONEXIÓN HIDRANTE 2				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	4,00
		Total acumulado pago anterior	4,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Buje soldado en PVC 4" x 2"	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto		7	3.6.6	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 26					1,00	1,00
ND25					1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Reducción en HD 80 x 50 mm Liso	7	3.6.7	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión VALVULA HD con tuberia PVC				1,00	2,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	2,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Adaptadores Hembra 2" PVC	7	3.6.8	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión valvula de purga				1,00	1,00	1,00
Colexión valvula ventosa				1,00	1,00	1,00
Conexión valvula de bola				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	3,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	3,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Adaptadores Hembra 2" PVC	7	3.6.9	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión valvula de purga				1,00	1,00	1,00
Colexión valvula ventosa				1,00	1,00	1,00
Conexión valvula de bola				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	3,00
		Total acumulado pago anterior	3,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Elementos varios de acueducto	Adaptadores Hembra 2" PVC	7	3.6.10	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Conexión valvula de purga				1,00	1,00	1,00
Colexión valvula ventosa				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Collar de derivación con inserto metálico Ø 2" X 1/2"	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.1	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	110,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Registro de incorporación Ø 1/2" x 20mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.2	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	110,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Tubería de Polietileno Ø 20 mm PN 10	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.3	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	8,00	64,00
ND26-ND27				4,00	8,00	32,00
ND25-ND44				7,00	8,00	56,00
ND44-ND45				8,00	8,00	64,00
ND29-ND30				11,00	8,00	88,00
ND30-ND31				1,00	8,00	8,00
ND31-ND23				9,00	8,00	72,00
ND41-ND35				9,00	8,00	72,00
ND35-ND37				3,00	8,00	24,00
ND37-ND38				5,00	8,00	40,00
ND38-ND39				7,00	8,00	56,00
ND35-ND39				2,00	8,00	16,00
ND39-ND40				10,00	8,00	80,00
ND22-ND22A				1,00	8,00	8,00
ND22A-ND22B				1,00	8,00	8,00
ND41-ND41A				17,00	8,00	136,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	8,00	16,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	8,00	40,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	880,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	880,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Valvula de corte antifraude Ø 1/2" x 20mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.4	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	110,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Valvula de cheque Ø 1/2"	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.5	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	110,00
		Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Suministro de valvula antifraude con seguridad (HH) 20 mm	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.6	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	110,00
		Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Adaptador Hembra PVC Ø 1/2"	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.7	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	110,00
		Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN	Suministro de Cajilla para Medidor de Agua en Instalaciones Domiciliarias fabricada en nylon reforzado (PA) con tapa en Polipropileno reforzado incluida.	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro Acometida domiciliaria		7	3.7.9	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	110,00
		Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 3. SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Suministro de ventosa, triple accion.	Suministro Valvula ventosa combinada de 2". Presion de trabajo 15 -145 psi. Extremo roscado.	7	3.8.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 46					1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: PRELIMINARES	Trazado y replanteo	7	**4.1.1**	**ML**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44		91,29		91,29	1,00	91,29
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25		75,88		75,88	1,00	75,88
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		6,91		6,91	1,00	6,91
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		219,01		219,01	1,00	219,01
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20A		175,00		175,00	1,00	175,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 28		24,36		24,36	1,00	24,36
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30		154,60		154,60	1,00	154,60
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42		338,33		338,33	1,00	338,33
TRAMO ENTRE ND 42 Y ND 43		24,41		24,41	1,00	24,41
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31		20,22		20,22	1,00	20,22
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23		57,76		57,76	1,00	57,76
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 32		118,39		118,39	1,00	118,39
TRAMO ENTRE ND 32 Y ND 33		52,15		52,15	1,00	52,15
TRAMO ENTRE ND 34 Y ND 35		37,59		37,59	1,00	37,59
TRAMO ENTRE ND 36 Y ND 37		48,56		48,56	1,00	48,56
TRAMO ENTRE ND 37 Y ND 38		57,66		57,66	1,00	57,66
TRAMO ENTRE ND 38 Y ND 39		65,76		65,76	1,00	65,76
TRAMO ENTRE ND 35 Y ND 39		65,96		65,96	1,00	65,96
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40		113,41		113,41	1,00	113,41
TRAMO ENTRE ND 27 Y FINCA DETRÁS DE PUESTO SALUD		122,93		122,93	1,00	122,93
PROYECCION A MARTILLO		163,86		163,86	1,00	163,86
CRUCES PLACA HUELLA		7,00		7,00	9,00	63,00
Conexión al tanque Red PVC 4"		40,10		40,10	1,00	40,10

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	2137,15
		Total acumulado pago anterior	2137,15
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Demoliciones	Demolición de anden con mona	7	4.2.1	M2



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,60	5,00		9,00	1,00	9,00
TRAMO ENTRE ND 18 Y ND 19	1,20	6,00		7,20	1,00	7,20
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30	0,45	16,50		7,43	1,00	7,43
PUESTO DE SALUD	1,20	6,00		7,20	1,00	7,20
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40	0,40	6,00		2,40	1,00	2,40
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42	0,40	12,00		4,80	1,00	4,80
PLACA PARA INSTALACIÓN DE VALVULA DE PURGA	0,50	6,00		3,00	1,00	3,00
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44	0,40	3,00		1,20	1,00	1,20
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25	0,40	4,00		1,60	1,00	1,60
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31	0,40	6,50		2,60	1,00	2,60
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23	0,40	6,00		2,40	1,00	2,40

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	48,83
		Total acumulado pago anterior	48,83
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Demoliciones	Demolición bordillo de concreto	7	4.2.2	m



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		5,00		5,00	1,00	5,00
TRAMO ENTRE ND 18 Y ND 19		6,00		6,00	1,00	6,00
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30		16,50		16,50	1,00	16,50
PUESTO DE SALUD		6,00		6,00	1,00	6,00
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40		6,00		6,00	1,00	6,00
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42		12,00		12,00	1,00	12,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	51,50
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	51,50
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN					
Subcapítulo:	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	**ACTA No.** 7	Ítem de Pago **4.3.1**	Unidad de Medida **M3**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44	0,40	91,29	1,00	36,52	1,00	36,52
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25	0,40	75,88	1,00	30,35	1,00	30,35
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	6,91	1,00	2,76	1,00	2,76
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,01	1,00	87,61	1,00	87,61
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20A	0,40	175,00	1,00	70,00	1,00	70,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 28	0,40	24,36	1,00	9,75	1,00	9,75
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30	0,40	154,60	1,00	61,84	1,00	61,84
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42	0,40	338,33	1,00	135,33	1,00	135,33
TRAMO ENTRE ND 42 Y ND 43	0,40	24,41	1,00	9,77	1,00	9,77
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31	0,40	20,22	1,00	8,09	1,00	8,09
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23	0,40	57,76	1,00	23,10	1,00	23,10
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 32	0,40	118,39	1,00	47,36	1,00	47,36
TRAMO ENTRE ND 32 Y ND 33	0,40	52,15	1,00	20,86	1,00	20,86
TRAMO ENTRE ND 34 Y ND 35	0,40	37,59	1,00	15,03	1,00	15,03
TRAMO ENTRE ND 36 Y ND 37	0,40	48,56	1,00	19,42	1,00	19,42
TRAMO ENTRE ND 37 Y ND 38	0,40	57,66	1,00	23,06	1,00	23,06
TRAMO ENTRE ND 38 Y ND 39	0,40	65,76	1,00	26,31	1,00	26,31
TRAMO ENTRE ND 35 Y ND 39	0,40	65,96	1,00	26,39	1,00	26,39
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40	0,40	113,41	1,00	45,36	1,00	45,36
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 27A	0,40	120,40	1,00	48,16	1,00	48,16
Conexión al tanque Red PVC 4"	0,40	40,10	1,00	16,04	1,00	16,04
INSTALACION DE ACOMETIDAS	0,40	8,00	0,68	2,16	110,00	237,60
EXCAVACION PARA INSTALACION DE HIDRANTE 1	0,60	3,00	1,00	1,80	1,00	1,80
EXCAVACION PARA INSTALACION DE HIDRANTE 2	0,60	3,00	1,00	1,80	1,00	1,80
TRAMO HACIA MARTILLO	0,40	163,86	1,00	65,54	1,00	65,54

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Total acomulado presente acta**	**1069,85**
	Daniela Jimenez	**Total acumulado pago anterior**	**1069,85**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de acometidas domiciliarias con silletas para acueducto.	Instalación de acometida acueducto tipo 7. en zona dura con cruce de vía pavimentada usando equipo de perforación horizontal (topo), con 0,0 m < l < 10,0 m y 16 mm < d < 50 mm.	7	4.4.1	UND





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND27-ND41				4,00	1,00	4,00
ND41-ND30				1,00	1,00	1,00
ND40-ND39				4,00	1,00	4,00
PUESTO DE SALUD				3,00	1,00	3,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	12,00
		Total acumulado pago anterior	12,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN					
Subcapítulo:	Instalación de acometidas domiciliarias con silletas para acueducto.	Instalación de acometida acueducto tipo 9. en zona verde sin cruce de vía (a favor de la red), con 0,0 m < l < 7,0 m y 16 mm < d < 50 mm.	**ACTA No.** **7**	Ítem de Pago **4.4.2**	Unidad de Medida **UND**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				7,00	1,00	7,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				8,00	1,00	8,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				6,00	1,00	6,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
VIVIENDAS ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Total acomulado presente acta**	**101,00**
	Daniela Jimenez	**Total acumulado pago anterior**	**101,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Item de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	Tubería de PVC 4" RDE 21	7	4.5.1	M





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO		40,10		40,10	1,00	40,10

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	40,10
		Total acumulado pago anterior	40,10
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	Tubería de PVC 2" RDE 21	7	4.5.2	M



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44		91,29		91,29	1,00	91,29
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25		75,88		75,88	1,00	75,88
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26		6,91		6,91	1,00	6,91
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		219,01		219,01	1,00	219,01
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20A		175,00		175,00	1,00	175,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 28		24,36		24,36	1,00	24,36
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30		154,60		154,60	1,00	154,60
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42		338,33		338,33	1,00	338,33
TRAMO ENTRE ND 42 Y ND 43		24,41		24,41	1,00	24,41
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31		20,22		20,22	1,00	20,22
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23		57,76		57,76	1,00	57,76
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 32		118,39		118,39	1,00	118,39
TRAMO ENTRE ND 32 Y ND 33		52,15		52,15	1,00	52,15
TRAMO ENTRE ND 34 Y ND 35		37,59		37,59	1,00	37,59
TRAMO ENTRE ND 36 Y ND 37		48,56		48,56	1,00	48,56
TRAMO ENTRE ND 37 Y ND 38		57,66		57,66	1,00	57,66
TRAMO ENTRE ND 38 Y ND 39		65,76		65,76	1,00	65,76
TRAMO ENTRE ND 35 Y ND 39		65,96		65,96	1,00	65,96
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40		113,41		113,41	1,00	113,41
TRAMO ENTRE ND 27 Y FINCA DETRÁS DE PUESTO SALUD		120,40		120,40	1,00	120,40
CRUCES PLACA HUELLA		7,00		7,00	9,00	63,00
TRAMO HACIA MARTILLO		163,86		163,86	1,00	163,86

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	2094,52
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	2094,52
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Relleno de zanjas y de obras de mampostería	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	7	**4.6.1**	**M3**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44	0,40	91,29	0,74	27,02	1,00	27,02
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25	0,40	75,88	0,74	22,46	1,00	22,46
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	6,91	0,74	2,04	1,00	2,04
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,01	0,74	64,83	1,00	64,83
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20A	0,40	175,00	0,74	51,80	1,00	51,80
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 28	0,40	24,36	0,74	7,21	1,00	7,21
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30	0,40	154,60	0,74	45,76	1,00	45,76
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42	0,40	338,33	0,74	100,15	1,00	100,15
TRAMO ENTRE ND 42 Y ND 43	0,40	24,41	0,74	7,23	1,00	7,23
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31	0,40	20,22	0,74	5,99	1,00	5,99
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23	0,40	57,76	0,74	17,10	1,00	17,10
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 32	0,40	118,39	0,74	35,04	1,00	35,04
TRAMO ENTRE ND 32 Y ND 33	0,40	52,15	0,74	15,44	1,00	15,44
TRAMO ENTRE ND 34 Y ND 35	0,40	37,59	0,74	11,13	1,00	11,13
TRAMO ENTRE ND 36 Y ND 37	0,40	48,56	0,74	14,37	1,00	14,37
TRAMO ENTRE ND 37 Y ND 38	0,40	57,66	0,74	17,07	1,00	17,07
TRAMO ENTRE ND 38 Y ND 39	0,40	65,76	0,74	19,47	1,00	19,47
TRAMO ENTRE ND 35 Y ND 39	0,40	65,96	0,74	19,53	1,00	19,53
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40	0,40	113,41	0,74	33,57	1,00	33,57
TRAMO ENTRE ND 27 Y FINCA DETRÁS DE PUESTO SALUD	0,40	120,40	0,74	35,64	1,00	35,64
Conexión al tanque Red PVC 4"	0,40	40,10	0,69	11,07	1,00	11,07
INSTALACION DE HIDRANTE 1	0,60	3,00	0,74	1,33	1,00	1,33
INSTALACION DE HIDRANTE 2	0,60	3,00	0,69	1,24	1,00	1,24
TRAMO HACIA MARTILLO	0,40	163,86	0,74	48,50	1,00	48,50
INSTALACION DE ACOMETIDAS	0,40	8,00	0,68	2,16	94,00	203,04

Total acomulado presente acta	**818,01**
Total acumulado pago anterior	**818,01**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Quien Recibe:	Quien Entrega:
	Daniela Jimenez
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 23 de marzo de 2023

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCCION	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: Relleno de zanjas y de obras de mamposteria		7	4.6.2	M3





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Descuento del tubo	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)				
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 4" RDE 21	0,40	6,90	0,69	0,07	1,84	1,00	1,84
TRAMO ENTRE ND37-ND38 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 2" RDE 21	0,40	57,19	0,74	0,54	16,38	1,00	16,38
TRAMO ENTRE ND38-ND39 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 2" RDE 21	0,40	68,00	0,74	0,65	19,48	1,00	19,48
RELLANO PARA INSTALACION DE HIDRANTE 1	0,60	3,00	0,74	0,03	1,30	1,00	1,30
TRAMO ENTRE ND35-ND39 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 2" RDE 21	0,40	65,70	0,70	0,62	26,28	0,35	9,25

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	48,26
		Total acumulado pago anterior	48,26
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Relleno de zanjas y de obras de mampostería	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa	7	4.6.3	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Descuento del tubo	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)				
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44	0,40	91,29	0,26	0,87	8,63	1,00	8,63
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25	0,40	75,88	0,26	0,72	7,17	1,00	7,17
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26	0,40	6,91	0,26	0,07	0,65	1,00	0,65
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,40	219,01	0,26	2,08	20,70	1,00	20,70
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20A	0,40	175,00	0,26	1,66	16,54	1,00	16,54
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 28	0,40	24,36	0,26	0,23	2,30	1,00	2,30
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30	0,40	154,60	0,26	1,47	14,61	1,00	14,61
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42	0,40	338,33	0,26	3,22	31,97	1,00	31,97
TRAMO ENTRE ND 42 Y ND 43	0,40	24,41	0,26	0,23	2,31	1,00	2,31
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31	0,40	20,22	0,26	0,19	1,91	1,00	1,91
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23	0,40	57,76	0,26	0,55	5,46	1,00	5,46
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 32	0,40	118,39	0,26	1,13	11,19	1,00	11,19
TRAMO ENTRE ND 32 Y ND 33	0,40	52,15	0,26	0,50	4,93	1,00	4,93
TRAMO ENTRE ND 34 Y ND 35	0,40	37,59	0,26	0,36	3,55	1,00	3,55
TRAMO ENTRE ND 36 Y ND 37	0,40	48,56	0,26	0,46	4,59	1,00	4,59
TRAMO ENTRE ND 37 Y ND 38	0,40	57,66	0,26	0,55	5,45	1,00	5,45
TRAMO ENTRE ND 38 Y ND 39	0,40	65,76	0,26	0,62	6,21	1,00	6,21
TRAMO ENTRE ND 35 Y ND 39	0,40	65,96	0,26	0,63	6,23	1,00	6,23
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40	0,40	113,41	0,26	1,08	10,72	1,00	10,72
TRAMO ENTRE ND 27 Y FINCA DETRÁS DE PUESTO SALUD	0,40	120,40	0,26	1,14	11,38	1,00	11,38
Conexión al tanque Red PVC 4"	0,40	40,10	0,31	0,38	4,59	1,00	4,59
EXCAVACION PARA INSTALACION DE HIDRANTE 1	0,60	3,00	0,26	0,03	0,44	1,00	0,44
TRAMO HACIA MARTILLO	0,40	163,86	0,26	1,56	15,48	1,00	15,48

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	197,00
		Total acumulado pago anterior	197,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm	ANDENES EN CONCRETO	7	4.7.1	M2



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27	0,60	5,00		9,00	1,00	9,00
TRAMO ENTRE ND 18 Y ND 19	1,20	6,00		7,20	1,00	7,20
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30	0,45	16,50		7,43	1,00	7,43
PUESTO DE SALUD	1,20	6,00		7,20	1,00	7,20
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40	0,40	6,00		2,40	1,00	2,40
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42	0,40	12,00		4,80	1,00	4,80
PLACA PARA INSTALACIÓN DE VALVULA DE PURGA	0,50	6,00		3,00	1,00	3,00
TRAMO ENTRE ND 45 Y ND 44	0,40	3,00		1,20	1,00	1,20
TRAMO ENTRE ND 44 Y ND 25	0,40	4,00		1,60	1,00	1,60
TRAMO ENTRE ND 30 Y ND 31	0,40	6,50		2,60	1,00	2,60
TRAMO ENTRE ND 31 Y ND 23	0,40	6,00		2,40	1,00	2,40

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	48,83
		Total acumulado pago anterior	8,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	40,83
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm	Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento De 0,15 m x 0,15 m	7	**4.8.1.1**	**M2**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 26 Y ND 27		5,00		5,00	1,00	5,00
TRAMO ENTRE ND 18 Y ND 19		6,00		6,00	1,00	6,00
TRAMO ENTRE ND 29 Y ND 30		16,50		16,50	1,00	16,50
PUESTO DE SALUD		6,00		6,00	1,00	6,00
TRAMO ENTRE ND 39 Y ND 40		6,00		6,00	1,00	6,00
TRAMO ENTRE ND 41 Y ND 42		12,00		12,00	1,00	12,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	51,50
		Total acumulado pago anterior	16,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	35,50
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Acero de Refuerzo	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	7	4.9.1	Kg



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Construcción de bordillo en reemplazo de demolición para instalación de red de distribución - acueducto				50,00	1,00	50,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	50,00
		Total acumulado pago anterior	50,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm	Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga	7	**4.10.1**	**UND**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26 (VA3-VA2)				2,00	1,00	2,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20 (VA4)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND23 (VA6)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND32 (VA7)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND39-ND38 (VA9)				1,00	1,00	1,00
VA5				1,00	1,00	1,00
VA8				1,00	1,00	1,00
VA10				1,00	1,00	1,00
VÁLVULA PARA HIDRANTE D=80mm				1,00	2,00	2,00
VALVULA VENTOSA				1,00	1,00	1,00
VALVULA DE PURGA				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	13,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	13,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: CAJAS DE VÁLVULAS Y DE VENTOSAS	Caja de válvulas en mampostería para H < 2,00 m	7	**4.11.1**	**UND**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26 (VA3-VA2)				2,00	1,00	2,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20 (VA4)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND23 (VA6)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND32 (VA7)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND39-ND38 (VA9)				1,00	1,00	1,00
VA5				1,00	1,00	1,00
VA8				1,00	1,00	1,00
VA10				1,00	1,00	1,00
VÁLVULA PARA HIDRANTE D=80mm				1,00	2,00	2,00
VALVULA VENTOSA				1,00	1,00	1,00
VALVULA PURGA				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	13,00
		Total acumulado pago anterior	13,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: CONCRETO PARA ANCLAJES	Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)	7	4.12.1	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ANCLAJE DE CODOS Y TEE PVC 2"	0,40	0,50	0,50	0,10	40,00	4,00
ANCLAJE DE CODOS PVC 4"	0,40	0,50	0,50	0,10	10,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	5,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	5,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Recibe:	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN			ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje	d = 50 mm (2")	7	**4.13.1**	**UND**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TRAMO ENTRE ND 25 Y ND 26 (VA3-VA2)				2,00	1,00	2,00
TRAMO ENTRE ND 27 Y ND 20 (VA4)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND23 (VA6)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND31-ND32 (VA7)				1,00	1,00	1,00
TRAMO ENTRE ND39-ND38 (VA9)				1,00	1,00	1,00
VA5				1,00	1,00	1,00
VA8				1,00	1,00	1,00
VA10				1,00	1,00	1,00
VALVULA DE PURGA				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	10,00
		Total acumulado pago anterior	10,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN			ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje	d = 80 mm (3")	7	**4.13.2**	**UND**

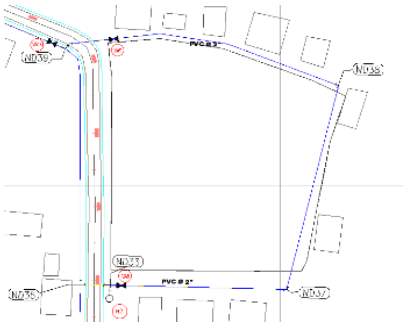

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN HIDRANTE 1				1,00	1,00	1,00
CONEXIÓN HIDRANTE 2				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de hidrante tipo trafico norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje	d = 80 mm (3")	7	**4.14.1**	**UND**

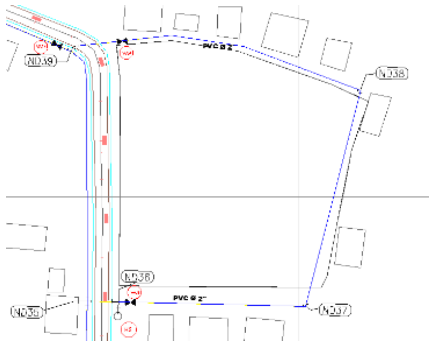

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CONEXIÓN HIDRANTE 1				1,00	1,00	1,00
CONEXIÓN HIDRANTE 2				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	**Total acomulado presente acta**	**2,00**
		Total acumulado pago anterior	**2,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR	Instalación de micromedidor y cajilla de micromedidor. Incluye mano de obra y suministro de accesorios (válvula de bola C/R de 1/2" HH laton, adapt hembra p/pileno 16mm x 1/2", adaptador macho pvc de 1/2", buje pvc soldado de 3/4 x 1/2, soldadura líquida	7	4.15.1	UND



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND26-ND28A				8,00	1,00	8,00
ND26-ND27				4,00	1,00	4,00
ND25-ND44				7,00	1,00	7,00
ND44-ND45				8,00	1,00	8,00
ND29-ND30				11,00	1,00	11,00
ND30-ND31				1,00	1,00	1,00
ND31-ND23				9,00	1,00	9,00
ND41-ND35				9,00	1,00	9,00
ND35-ND37				3,00	1,00	3,00
ND37-ND38				5,00	1,00	5,00
ND38-ND39				7,00	1,00	7,00
ND35-ND39				2,00	1,00	2,00
ND39-ND40				10,00	1,00	10,00
ND22-ND22A				1,00	1,00	1,00
ND22A-ND22B				1,00	1,00	1,00
ND41-ND41A				17,00	1,00	17,00
TRAMO HACIA MARTILLO				2,00	1,00	2,00
ADICIONALES				5,00	1,00	5,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	110,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 4. OBRA CIVIL - RED DE DISTRIBUCIÓN		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Instalación de ventosa de triple	Instalación de ventosa de triple, incluye tuberìa y accesorios d = 2"	7	4.16.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ND 46					1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	7	5.1.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	7	5.2.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d =150 mm (6"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	7	5.3.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	7	5.4.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL DE NIVELES	Suministro de Valvula control nivel con flotador horizontal B xB D= 4".	7	5.5.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
TANQUE ELEVADO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 5. SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Paao	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro Tuberia AC 4" SCH40 BxB	7	**SUM-NP017**	**Un**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
LINEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO		18,10		18,10	1,00	18,10
LINEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO		18,30		18,30	1,00	18,30
LINEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO		11,60		11,60	1,00	11,60
NIPLE TUBERÍA DE LAVADO		0,75		0,75	1,00	0,75
NIPLE TUBERÍA DE REBOSE		0,75		0,75	1,00	0,75

Validaciones de Cantidades en Memorial	Total acumulado presente acta	49,50
	Total acumulado pago anterior	46,60
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	2,90

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 5. SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Suministro Tuberia AC 6" SCH40 BxB	**ACTA No. 7**	Ítem de Paao **SUM-NP018**	Unidad de Medida **Un**
Subcapítulo: Actividades No Previstas				

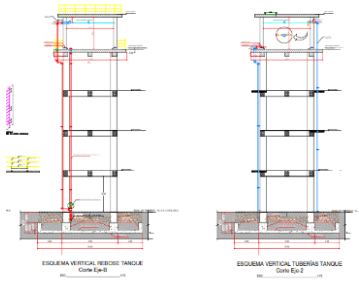

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
LINEA DE SALIDA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO		30,00		30,00	1,00	30,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**30,00**
Total acumulado pago anterior	**30,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	**Por Contratista**	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez**	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 5. SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Paao	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas	Suministro Codo AC 4" x90° BxB	7	**SUM-NP019**	**Un**

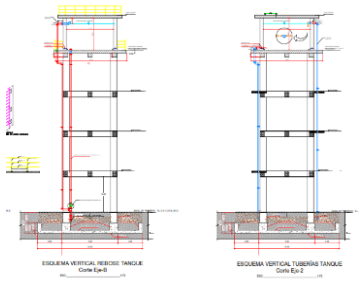

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
LINEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO				4,00	1,00	4,00
LINEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO				4,00	1,00	4,00
LINEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO				4,00	1,00	4,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	**Total acumulado presente acta**	**12,00**
	Total acumulado pago anterior	**12,00**
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	**Por Contratista**	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez**	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).


MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 5. SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Suministro Codo AC 6" x90° BxB	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Actividades No Previstas		**7**	**SUM-NP020**	**Un**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
LINEA DE SALIDA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO				5,00	1,00	5,00

Validaciones de Cantidades en Memorial	
Total acumulado presente acta	**5,00**
Total acumulado pago anterior	**5,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	**Por Contratista**	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez**	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)


b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Excavaciones a cielo abierto	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.)	7	6.1.1	M3

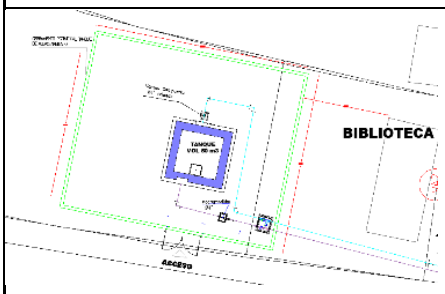



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CIMENTACIÓN TANQUE ELEVADO	11,00	11,00	2,00	242,00	1,00	242,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	242,00
		Total acumulado pago anterior	242,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Relleno de Zanjas y obras de mampostería	Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% Proctor Modificado.	7	6.2.1	M3

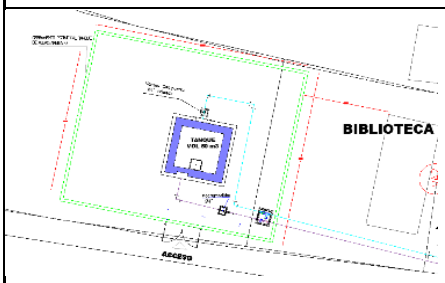



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
CIMENTACION TANQUE ELEVADO	1,95	0,70	1,95	2,66	1,00	2,66
	1,95	0,70	3,70	5,05	1,00	5,05
	3,70	0,70	3,70	9,58	1,00	9,58
	0,50	1,00	11,00	5,50	1,00	5,50
	0,50	1,00	11,00	5,50	1,00	5,50
	11,00	11,00	1,00	121,00	0,27	32,67
RELLENO NIVELACIÓN CAJAS O REGISTROS DE VALVULAS	2,00	14,00	1,50	42,00	1,00	42,00
RELLENO NIVELACIÓN CONFORMACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	2,00	2,00	1,00	4,00	9,00	36,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	138,97
		Total acumulado pago anterior	60,97
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	78,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE			ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	7	6.3.1	M2





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CIMENTACIÓN TANQUE ELEVADO	11,00	11,00		121,00	1,00	121,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
		Total acomulado presente acta	121,00
		Total acumulado pago anterior	121,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para Losa de fondo (cimentacion incluye vigas).	7	6.3.2	M3





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PLACA CIMENTACIÓN TANQUE	7,60	7,60	0,30	17,34	1,00	17,34
VIGAS VERTICALES CIMENTACIÓN TANQUE	0,80	10,00	1,00	8,00	3,00	24,00
VIGAS HORIZONTALES CIMENTACIÓN TANQUE	0,80	7,60	1,00	6,08	3,00	18,24

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	59,58
		Total acumulado pago anterior	59,58
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores (e = 0,20 m).	7	6.3.3	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PLACA LOSA PISO 2 PASARELAS INTERMEDIAS DE RECIBO Y ENTREGA ESCALERAS POR CADA NIVEL DE ENTREPISO VIGAS	0,60	1,95	0,20	0,24	2,00	0,49
	0,70	0,45	0,20	0,07	1,00	0,07
	0,70	1,95	0,20	0,28	1,00	0,28
	0,90	1,70	0,20	0,31	1,00	0,31
PLACA LOSA PISO 3 PASARELAS INTERMEDIAS DE RECIBO Y ENTREGA ESCALERAS POR CADA NIVEL DE ENTREPISO VIGAS	0,60	1,95	0,20	0,24	2,00	0,49
	0,70	0,45	0,20	0,07	1,00	0,07
	0,70	1,95	0,20	0,28	1,00	0,28
	0,90	1,70	0,20	0,31	1,00	0,31
PLACA LOSA PISO 4 PASARELAS INTERMEDIAS DE RECIBO Y ENTREGA ESCALERAS POR CADA NIVEL DE ENTREPISO VIGAS	0,60	1,95	0,20	0,24	2,00	0,49
	1,35	0,45	0,20	0,13	1,00	0,13
	1,35	1,95	0,20	0,54	1,00	0,54
	0,90	2,35	0,20	0,43	1,00	0,43
	0,90	1,70	0,20	0,31	1,00	0,31

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	4,20
		Total acumulado pago anterior	4,20
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto impermeabilizado f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa tapa tanque (Incluye vigas) .	7	**6.3.4**	**M3**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Tapa Tanque (+)	6,25	6,25	0,20	7,81	1,00	7,81
Hueco No.1 (-)	0,30	1,20	0,20	0,07	1,00	0,07
Hueco No.2 (-)	0,95	0,98	0,20	0,19	1,00	0,19
Vigas	0,12	1,26	0,40	0,06	4,00	0,24

Validaciones de Cantidades en Memorial

Total acomulado presente acta	**7,80**
Total acumulado pago anterior	**7,80**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto impermeabilizado de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa fondo tanque. (Incluye vigas).	7	6.3.5	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
LOSA PISO	1,85	1,85	0,30	1,03	4,00	4,11
	0,85	6,80	0,30	1,73	2,00	3,47
	0,85	5,10	0,30	1,31	2,00	2,62
	0,85	1,55	0,30	0,41	1,00	0,41
	0,85	2,35	0,30	0,60	1,00	0,60
VIGAS	0,40	5,25	0,70	1,47	2,00	2,94
	0,40	4,90	0,70	1,38	2,00	2,76
	0,40	4,25	0,70	1,20	1,00	1,20
	0,40	3,90	0,70	1,10	1,00	1,10

Validaciones de Cantidades en Memorial

Total acomulado presente acta	**19,21**
Total acumulado pago anterior	**19,21**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez	

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista:	BUILDER COMPANY SAS
Interventor:	CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO
	FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo:	Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para muros.	**7**	**6.3.6**	**M3**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
ÁREA EXTERNA (+)	5,20	5,20	3,05	82,47	4,00	329,89
ÁREA INTERNA (-) HUECO	5,05	5,05	3,05	77,78	4,00	311,13

Validaciones de Cantidades en Memorial	**Total acomulado presente acta** **18,76**
	Total acumulado pago anterior **18,76**
	Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7 **0,00**

Por Interventoría	**Por Contratista**	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez**	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

			ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
FORMULARIO 6. TANQUE					
Subcapítulo:	Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para muros.	7	**6.3.7**	**M3**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
ÁREA EXTERNA (+)		5,10	2,80	14,28	4,00	57,12
ÁREA INTERNA (-) HUECO		5,00	5,00	25,00	1,00	25,00

Validaciones de Cantidades en Memorial

Total acomulado presente acta	**82,12**
Total acumulado pago anterior	**82,12**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**

Por Interventoría	**Por Contratista**	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Valida: Ing. Daniela Jiménez**	

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para vigas aereas.	7	6.4.1	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Vigas externas losa tanque	0,50	3,80	0,55	1,05	16,00	16,72
Vigas internas losa tanque	0,40	8,40	0,55	1,85	4,00	7,39

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	24,11
		Total acumulado pago anterior	24,11
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE	Concreto f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) para columnas	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: VIGAS Y COLUMNAS		7	6.4.2	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PEDESTALES CIMENTACIÓN	0,70	0,70	1,00	0,49	4,00	1,96
COLUMNAS A1-A2-B1-B2 Primer Nivel	0,70	0,70	3,40	1,67	4,00	6,66
Sección de columnas en placa piso 2	0,70	0,70	0,55	0,27	4,00	1,08
COLUMNAS A1-A2-B1-B2 Segundo Nivel	0,70	0,70	3,25	1,59	4,00	6,37
Sección de columnas en placa piso 3	0,70	0,70	0,55	0,27	4,00	1,08
COLUMNAS A1-A2-B1-B2 Tercer Nivel	0,70	0,70	3,25	1,59	4,00	6,37
Sección de columnas en placa piso 4	0,70	0,70	0,55	0,27	4,00	1,08
COLUMNAS A1-A2-B1-B2 Cuarto Nivel	0,70	0,70	3,25	1,59	4,00	6,37

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	30,97
		Total acumulado pago anterior	30,97
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES


"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO

FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE	Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi)	ACTA No. 7	Ítem de Pago 6.5.1	Unidad de Medida KG


Subcapítulo: Acero de Refuerzo













ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones						FORMA	Sub Total (ℓ = d x e)
	DIÁMETRO (N°)	CANTIDAD (A)	LONG CORTE (B)	TOTAL (ML) (C= A X B)	PESO (KG)	PESO TOTAL (KG)		
VIGAS DE CIMENTACIÓN	3,00	116,00	2,40	278,40	0,56	155,90	Fleje	155,90
	3,00	264,00	3,20	844,80	0,56	473,09	Fleje	473,09
	3,00	528,00	1,07	564,96	0,56	316,38	Fleje	316,38
	4,00	56,00	6,00	336,00	0,99	332,64	Lineal	332,64
	4,00	16,00	6,00	96,00	0,99	95,04	Lineal	95,04
	4,00	16,00	6,00	96,00	0,99	95,04	Lineal	95,04
	6,00	144,00	6,00	864,00	2,24	1935,36	Lineal	1935,36
Losa de cimentación	5,00	200,00	6,00	1200,00	1,55	1860,00	Lineal	1860,00
	5,00	200,00	6,00	1200,00	1,55	1860,00	Lineal	1860,00
Columnas PRIMERA SECCIÓN	8,00	32,00	5,50	176,00	3,98	700,48	Lineal	700,48
	8,00	32,00	9,00	288,00	3,98	1146,24	Lineal	1146,24
	8,00	16,00	9,00	144,00	3,98	573,12	Lineal	573,12
	3,00	336,00	2,20	739,20	0,56	413,95	Fleje	413,95
	3,00	672,00	0,72	483,84	0,56	270,95	Fleje	270,95
Losa piso 2	4,00	8,00	1,70	13,60	0,99	13,46	Lineal	13,46
	4,00	44,00	2,10	92,40	0,99	91,48	Lineal	91,48
	4,00	16,00	1,40	22,40	0,99	22,18	Lineal	22,18
	4,00	20,00	3,80	76,00	0,99	75,24	Lineal	75,24
	4,00	8,00	3,60	28,80	0,99	28,51	Lineal	28,51
VIGAS LOSA PISO 2	8,00	20,00	5,90	118,00	3,98	469,64	Lineal	469,64
	7,00	8,00	5,80	46,40	3,05	141,52	Lineal	141,52
	3,00	65,00	1,70	110,50	0,56	61,88	Fleje	61,88
	5,00	8,00	5,60	44,80	1,55	69,44	Lineal	69,44
	3,00	18,00	1,70	30,60	0,56	17,14	Fleje	17,14
	8,00	20,00	5,90	118,00	3,98	469,64	Lineal	469,64
	7,00	7,00	5,80	40,60	3,05	123,83	Lineal	123,83
	3,00	65,00	1,70	110,50	0,56	61,88	Fleje	61,88
	5,00	8,00	5,60	44,80	1,55	69,44	Lineal	69,44
	3,00	26,00	1,70	44,20	0,56	24,75	Fleje	24,75
Columnas SEGUNDA SECCIÓN	8,00	32,00	7,30	233,60	3,98	929,73	Lineal	929,73
	8,00	32,00	3,80	121,60	3,98	483,97	Lineal	483,97
	8,00	48,00	9,00	432,00	3,98	1719,36	Lineal	1719,36
	3,00	336,00	2,20	739,20	0,56	413,95	Fleje	413,95
	3,00	672,00	0,72	483,84	0,56	270,95	Fleje	270,95
Losa piso 3	4,00	8,00	1,70	13,60	0,99	13,46	Lineal	13,46
	4,00	44,00	2,10	92,40	0,99	91,48	Lineal	91,48
	4,00	16,00	1,40	22,40	0,99	22,18	Lineal	22,18
	4,00	10,00	6,40	64,00	0,99	63,36	Lineal	63,36
	4,00	8,00	3,60	28,80	0,99	28,51	Lineal	28,51
VIGAS LOSA PISO 3	8,00	20,00	5,90	118,00	3,98	469,64	Lineal	469,64
	7,00	14,00	5,80	81,20	3,05	247,66	Lineal	247,66
	3,00	80,00	1,70	136,00	0,56	76,16	Fleje	76,16
	5,00	8,00	5,60	44,80	1,55	69,44	Lineal	69,44
	3,00	18,00	1,70	30,60	0,56	17,14	Fleje	17,14
	8,00	20,00	5,90	118,00	3,98	469,64	Lineal	469,64
	7,00	14,00	5,80	81,20	3,05	247,66	Lineal	247,66
	3,00	80,00	1,70	136,00	0,56	76,16	Fleje	76,16
	5,00	8,00	5,60	44,80	1,55	69,44	Lineal	69,44
	3,00	26,00	1,70	44,20	0,56	24,75	Fleje	24,75
LOSA PISO 4	4,00	8,00	1,70	13,60	0,99	13,46	Lineal	13,46
	4,00	14,00	2,10	29,40	0,99	29,11	Lineal	29,11
	4,00	16,00	1,40	22,40	0,99	22,18	Lineal	22,18
	4,00	10,00	7,30	73,00	0,99	72,27	Lineal	72,27
	4,00	14,00	4,50	63,00	0,99	62,37	Lineal	62,37
	4,00	42,00	2,75	115,50	0,99	114,35	Lineal	114,35
VIGAS LOSA PISO 4	8,00	20,00	5,90	118,00	3,98	469,64	Lineal	469,64
	7,00	12,00	5,80	69,60	3,05	212,28	Lineal	212,28
	3,00	80,00	1,70	136,00	0,56	76,16	Fleje	76,16
	5,00	8,00	5,60	44,80	1,55	69,44	Lineal	69,44
	3,00	18,00	1,70	30,60	0,56	17,14	Fleje	17,14
	8,00	20,00	5,90	118,00	3,98	469,64	Lineal	469,64
	7,00	12,00	5,80	69,60	3,05	212,28	Lineal	212,28
	3,00	80,00	1,70	136,00	0,56	76,16	Fleje	76,16
	5,00	8,00	5,60	44,80	1,55	69,44	Lineal	69,44
	3,00	26,00	1,70	44,20	0,56	24,75	Fleje	24,75
VIGAS LOSA FONDO TANQUE	5,00	40,00	5,60	224,00	1,55	347,20	Lineal	347,20
	3,00	106,00	2,00	212,00	0,56	118,72	Lineal	118,72
LOSA FONDO TANQUE	4,00	116,00	7,30	846,80	0,99	838,33	Lineal	838,33
	4,00	12,00	6,50	78,00	0,99	77,22	Lineal	77,22
	4,00	10,00	3,70	37,00	0,99	36,63	Lineal	36,63
	4,00	10,00	2,90	29,00	0,99	28,71	Lineal	28,71
	4,00	92,00	1,32	121,44	0,99	120,23	Lineal	120,23
MUROS TANQUE	4,00	208,00	4,50	936,00	0,99	926,64	Lineal	926,64
	4,00	128,00	5,50	704,00	0,99	696,96	Lineal	696,96
	4,00	64,00	1,32	84,48	0,99	83,64	Lineal	83,64
LOSA TAPA TANQUE	4,00	94,00	6,50	611,00	0,99	604,89	Lineal	604,89
	4,00	10,00	4,65	46,50	0,99	46,04	Lineal	46,04
	4,00	10,00	1,45	14,50	0,99	14,36	Lineal	14,36
	4,00	10,00	3,15	31,50	0,99	31,19	Lineal	31,19
	4,00	10,00	3,00	30,00	0,99	29,70	Lineal	29,70
	4,00	14,00	6,30	88,20	0,99	87,32	Lineal	87,32

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Total acumulado presente acta**	**23871,27**
		Total acumulado pago anterior	**23871,27**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE	Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño	ACTA No. 7	Ítem de Pago 6.6.1	Unidad de Medida ML
Subcapítulo: SELLOS Y JUNTAS				



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
PERÍMETRO		5,20		5,20	4,00	20,80

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	20,80
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	20,80
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE	Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tubería SikaSwell S o similar según planos y especificaciones de diseño	ACTA No. 7	Ítem de Pago 6.6.2	Unidad de Medida ML
Subcapítulo: SELLOS Y JUNTAS				



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PERÍMETRO		5,20		5,20	4,00	20,80

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	20,80
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	20,80
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*B, L=0.75m Z= 0,30	7	6.7.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA SALIDA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =150 mm (6"), B*L, L=0.75m Z= 0,30 del extremo LISO	7	6.8.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: RESPIRADEROS Y REBOSE TANQUE	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	7	6.9.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
		Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE NIVELES	Instalación Válvula medidor de nivel d=4" BxB	7	6.10.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PASAMURO ENTRADA AL POZO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	1,00
	Daniela Jimeno	Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	1,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACIONES METALMECANICAS	Suministro e instalación de tapa cuadrada de 1.0m x 1.0m en PRFVensamblada con tornillería en acero inoxidable con marco, de 10mm de espesor.	7	6.11.1	ml



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
TAPA INGRESO AL TANQUE				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
		Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	1,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACIONES METALMECANICAS	Suministro e instalación de escalera Tipo gato en acero galvanizado sin canasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijación, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Según diseño planos.	7	6.11.2	ml



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
INGRESO AL TANQUE		20,00		20,00	1,00	20,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	20,00
		Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	20,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACIONES METALMECANICAS	Suministro e instalación de escalera Tipo gato en acero galvanizado con canasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijación, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Según diseño planos.	7	6.11.3	ml



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
INGRESO AL TANQUE		10,00		10,00	1,00	10,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	10,00
		Total acumulado pago anterior	
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	10,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: INSTALACIONES METALMECANICAS	Suministro e instalación de pasamanos con rodapies en tubería metálica Ø1 1/4" Incluye: Platina, soldadura, y todos los elementos para su fijación, Pinturas 3 capas: Anticorrosivo, base y acabado	7	6.11.4	m



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
SECCIONES PERIMETRALES				110,00	1,00	110,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	110,00
		Total acumulado pago anterior	110,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).


MEMORIA CANTIDADES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS

Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
SubCapitulo: INSTALACIONES METALMECANICAS	Suministro e instalacion elementos de fijacion para a estructura.	6	**6.11.5**	**M3**

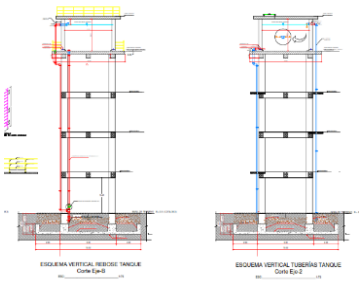

ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)	Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
Elementos de fijaccion en tanque elevado				1,00	46,00	46,00

Validaciones de Cantidades en Memorial

Total acomulado presente acta	**46,00**
Total acumulado pago anterior	**24,00**
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**22,00**

Por Interventoría	Por Contratista	Aprobado Por:
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Valida: Ing Daniella Jimenez	

a). Las memorias siempre deben contener el historico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)

b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: REGISTRO MACROMEDIDOR	Construccion registro para macromedidor 4" y filtro	7	6.12.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
MACROMEDICIÓN 4"				1,00	1,00	1,00
BYPASS -VALVULAS				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 6. TANQUE		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: LÍNEA LAVADO TANQUE	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	7	6.13.1.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PASAMURO				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Excavaciones a cielo abierto	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.)	7	7.1.1	M3





ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ZAPATAS - PEDESTALES	1,00	1,00	1,05	1,05	24,00	25,20
VIGAS DE AMARRE	0,25	3,45	0,30	0,26	24,00	6,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	31,20
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	31,20
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO	Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m	ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: OBRAS EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE		7	7.3.1	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
MAMPOSTERÍA	0,44	3,45		1,52	26,00	39,47

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acomulado presente acta	39,47
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	39,47
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	7	**7.4.1**	**M2**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ZAPATAS - PEDESTALES	1,00	1,00		1,00	24,00	24,00
VIGAS DE AMARRE	0,25	3,45		0,86	24,00	21,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	45,00
		Total acumulado pago anterior	45,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS	Concreto para pedestales f´c=21 Mpa (3000 PSI)	7	7.4.2	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
PEDESTALES	0,30	0,30	1,20	0,10	24,00	2,40

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	2,40
		Total acumulado pago anterior	2,40
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS	Concreto para zapatas f´c = 21,0 Mpa (3000 psi)	7	**7.4.3**	**M3**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ZAPATAS	1,00	1,00	0,30	0,30	24,00	7,20

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	7,20
		Total acumulado pago anterior	7,20
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS	Concreto para vigas de amarre f´c = 21,0 Mpa (3000 psi)	7	7.4.4	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
VIGAS	0,25	3,45	0,25	0,20	24,00	4,80

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	4,80
		Total acumulado pago anterior	4,80
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS	Corta goteras. Diseño según planos.	7	7.4.5	M3



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
CORTA GOTAS		82,50		82,50	1,00	82,50

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acomulado presente acta	82,50
		Total acumulado pago anterior	82,50
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO	Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi)	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: Acero de Refuerzo		**7**	**7.5.1**	**KG**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones						FORMA	Sub Total (f = d x e)
	DIÁMETRO (N°)	CANTIDAD (A)	LONG CORTE (B)	TOTAL (ML) (C= A X B)	PESO (KG)	PESO TOTAL (KG)		
ZAPATAS	4,00	240,00	1,35	324,00	0,99	320,76	Feje	320,76
PEDESTALES	4,00	192,00	1,60	307,20	0,99	304,13	Fleje	304,13
	3,00	168,00	0,80	134,40	0,56	75,26	Fleje	75,26
VIGAS	3,00	96,00	8,00	768,00	0,56	430,08	Lineal	430,08
	3,00	672,00	0,80	537,60	0,56	301,06	Lineal	301,06

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Total acomulado presente acta**	**1431,29**
		Total acumulado pago anterior	**1431,29**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: ESTRUCTURAS METÁLICAS	Suministro e instalacion de porton de acceso de 3.70m de ancho y 2.5 m de altura en lamina galv cal. 22 y tubos galvanizados de 2", para puerta vehicular sistema de rieles, guia, topes y cerradura, con puerta peatonal de 0,7 m de ancho , bisagras y cerrad	7	7.6.1	UN



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Portón				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
		Total acomulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: ESTRUCTURAS METÁLICAS	Suministro e instalación de concertina en acero inoxidable C18 longitud cuchilla: 65mm / Ancho cinta: 23mm, soldadura ,soporte con tubos	**7**	**7.6.2**	**ML**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
Perímetro		82,50		82,50	1,00	82,50

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	82,50
		Total acumulado pago anterior	82,50
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		


a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 7. CERRAMIENTO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: ESTRUCTURAS METÁLICAS	Suministro e Instalacion Malla Eslabonada cal. 12 para cerramiento perimetral según planos. H=2.40 mts.	7	**7.6.3**	**M2**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
ÁREA MALLA		82,50	2,00	165,00	1,00	165,00

Total acumulado presente acta	165,00
Total acumulado pago anterior	165,00
Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:

Aprobado Por:

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 8: SISTEMA ELECTRICO		**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	Poste en Acero Galvanizado en caliente de 5 Mts, para luminarias solares led	**7**	**8.1.1**	**Un**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
UBICACIÓN DE ACUERDO A PLANO DE CONSTRUCCIÓN				6,00	1,00	6,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	**Total acumulado presente acta**	**6,00**
		Total acumulado pago anterior	**6,00**
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	**0,00**
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO — FECHA 45957

FORMULARIO 8: SISTEMA ELECTRICO	Lampara led de 90W con alimentacion fotovoltaica , modulo compacto panel solar y baterias integrados, incluye brazo de soporte y tornilleria de fijacion, IP65.	**ACTA No.**	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		**7**	**8.1.2**	**Un**



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
UBICACIÓN DE ACUERDO A PLANO DE CONSTRUCCIÓN				10,00	1,00	10,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:	Total acumulado presente acta	10,00
	Daniela Jimenez	Total acumulado pago anterior	10,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	**Profesional de Obra**	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	**Quien Entrega:**		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del período sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 8: SISTEMA ELECTRICO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: DISTRIBUCION DE CARGAS	Sistema de apantallamiento para tanque elevado, con altura de 20m, incluye dos (2) mastiles autosoportados sobre el tanque de 5 mts de altura: en diametro inicial minimo de 4", L= 3mts, un tramo de 2" L=1 mt y un tramo final de 3/4" todo en tuberia IMC, dos (2) pararrayos Franklin tipo Blunt, bajantes en cable Cu No. 1/0 con sus respectivos aisladores y proteccion mecanica y malla a tierra conformada 8 varillas e Cu de 5/8" x 2,4 mts soldadas al cable de Cu con soldadura caldweld , tuberia de 3/4" conduit IMC con sus accesorios de fijacion.	7	8.2.1	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
UBICACIÓN DE ACUERDO A PLANO DE CONSTRUCCIÓN				1,00	1,00	1,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
	Daniela Jimenez	Total acumulado presente acta	1,00
		Total acumulado pago anterior	1,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).

MEMORIA ACTAS PARCIALES

"CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Interventor: CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO FECHA 45957

FORMULARIO 8: SISTEMA ELECTRICO		ACTA No.	Ítem de Pago	Unidad de Medida
Subcapítulo: DISTRIBUCION DE CARGAS	Baliza de señalizacion para superficies fijas, Luz de obstrucción de torre incandescente doble para advertencia de aviones, faro rojo L-810 – 110VAC según normativa aeronautica civil. acoplada a estructura metalica de tanque con alimentacion fotovoltaica.	7	8.2.2	Un



ESQUEMAS GRÁFICOS O REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE AVANCES

Localización	Dimensiones			Cant. Parcial (d = b)	No. De Elementos (e)	Sub Total (f = d x e)
	Ancho (m) (a)	Largo (m) (b)	Alto (m) (c)			
UBICACIÓN DE ACUERDO A PLANO DE CONSTRUCCIÓN				2,00	1,00	2,00

Quien Recibe:	Quien Entrega:		
		Total acumulado presente acta	2,00
		Total acumulado pago anterior	2,00
		Saldo Por Reconocer Presente Acta No 7	0,00
Profesional de Interventoría	Profesional de Obra	Aprobado Por:	
Quien Valida: Ing. Josefina Rosenstiehl	Quien Entrega:		

a). Las memorias siempre deben contener el histórico de ejecuciones del proyecto por cada actividad en cada acta de tal suerte que se reporta al final lo acumulado pagado en pagos anteriores, a fin de que deduciendo de la totalidad de la ejecución cargada a memorias, se cancelen los saldos pendientes (Esto evitará que se subestimen o sobreestimen cobros por repetición u omisión respectivamente)
b). Todas las actividades deben reportarse con memorias en cada acta parcial así el cobro del periodo sea cero (0).
