

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**	**50 días**	**lun 27/10/25**	**sáb 27/12/25**	**$ 1.489.594.211,...**
2		INICIO	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$ 0,00
3		**OBRAS PRELIMINARES**	**13 días**	**lun 27/10/25**	**mar 11/11/2**	**$ 139.766.347,...**
4		REMOCION DE PINTURA	7 días	lun 27/10/25	mar 4/11/25	$ 43.306.913,00
5		MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 5.642.840,00
6		MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 20.743.281,00
7		DESMONTE DE VENTANA METALICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO.	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 620.987,00
8		MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	8 días	lun 27/10/25	mié 5/11/25	$ 53.215.441,00
9		S/I DE PORTON PARA PATIO TRASERO DE 2,5M X 4,0M EN MALLA MODULAR	5 días	jue 6/11/25	mar 11/11/25	$ 7.212.824,00
10		DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 734.523,00
11		MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 5.979.246,00
12		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 2.310.292,00
13		**PREPARACION Y CONCRETOS**	**18 días**	**lun 27/10/25**	**mar 18/11/25**	**$ 145.362.792,00**
14		PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y SELLO.	8 días	lun 27/10/25	mié 5/11/25	$ 61.051.667,00
15		PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION, SELLOS Y EDURECEDOR	10 días	jue 6/11/25	mar 18/11/25	$ 84.311.125,00
16		**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**	**42 días**	**lun 27/10/25**	**mié 17/12/25**	**$ 166.849.341,00**
17		IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 17.274.345,00
18		ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTETICO	9 días	mié 26/11/25	vie 5/12/25	$ 87.617.252,00
19		S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5MM	5 días	sáb 6/12/25	vie 12/12/25	$ 31.146.537,00
20		MANTENIMIENTO DE CANALES DE DESAGUE DE AGUA LLUVIA. INCLUYE SONDEOS	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 2.071.508,00
21		MANTENIMIENTO DE CANAL METÁLICO PARA DRENAJE DE CUBIERTAS	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 968.162,00
22		LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA METALICA EN ACERO LAMINADO.	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 2.584.850,00
23		IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLÓN	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 1.569.674,00
24		EXCAVACION MANUAL	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 1.151.060,00
25		EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 643.289,00
26		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	4 días	vie 31/10/25	mié 5/11/25	$ 590.715,00
27		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	4 días	vie 31/10/25	mié 5/11/25	$ 729.708,00
28		SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E=5 CM)	4 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$ 929.821,00
29		ACERO DE REFUERZO Fy=420MPa	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	$ 7.772.575,00
30		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA	4 días	sáb 15/11/25	jue 20/11/25	$ 3.241.023,00
31		PEDESTALES EN CONCRETO DE 21MPa	4 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$ 2.407.756,00
32		VIGA DE CIMENTACION DE 20x25 EN CONCRETO DE 21 MPA	4 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$ 4.665.224,00

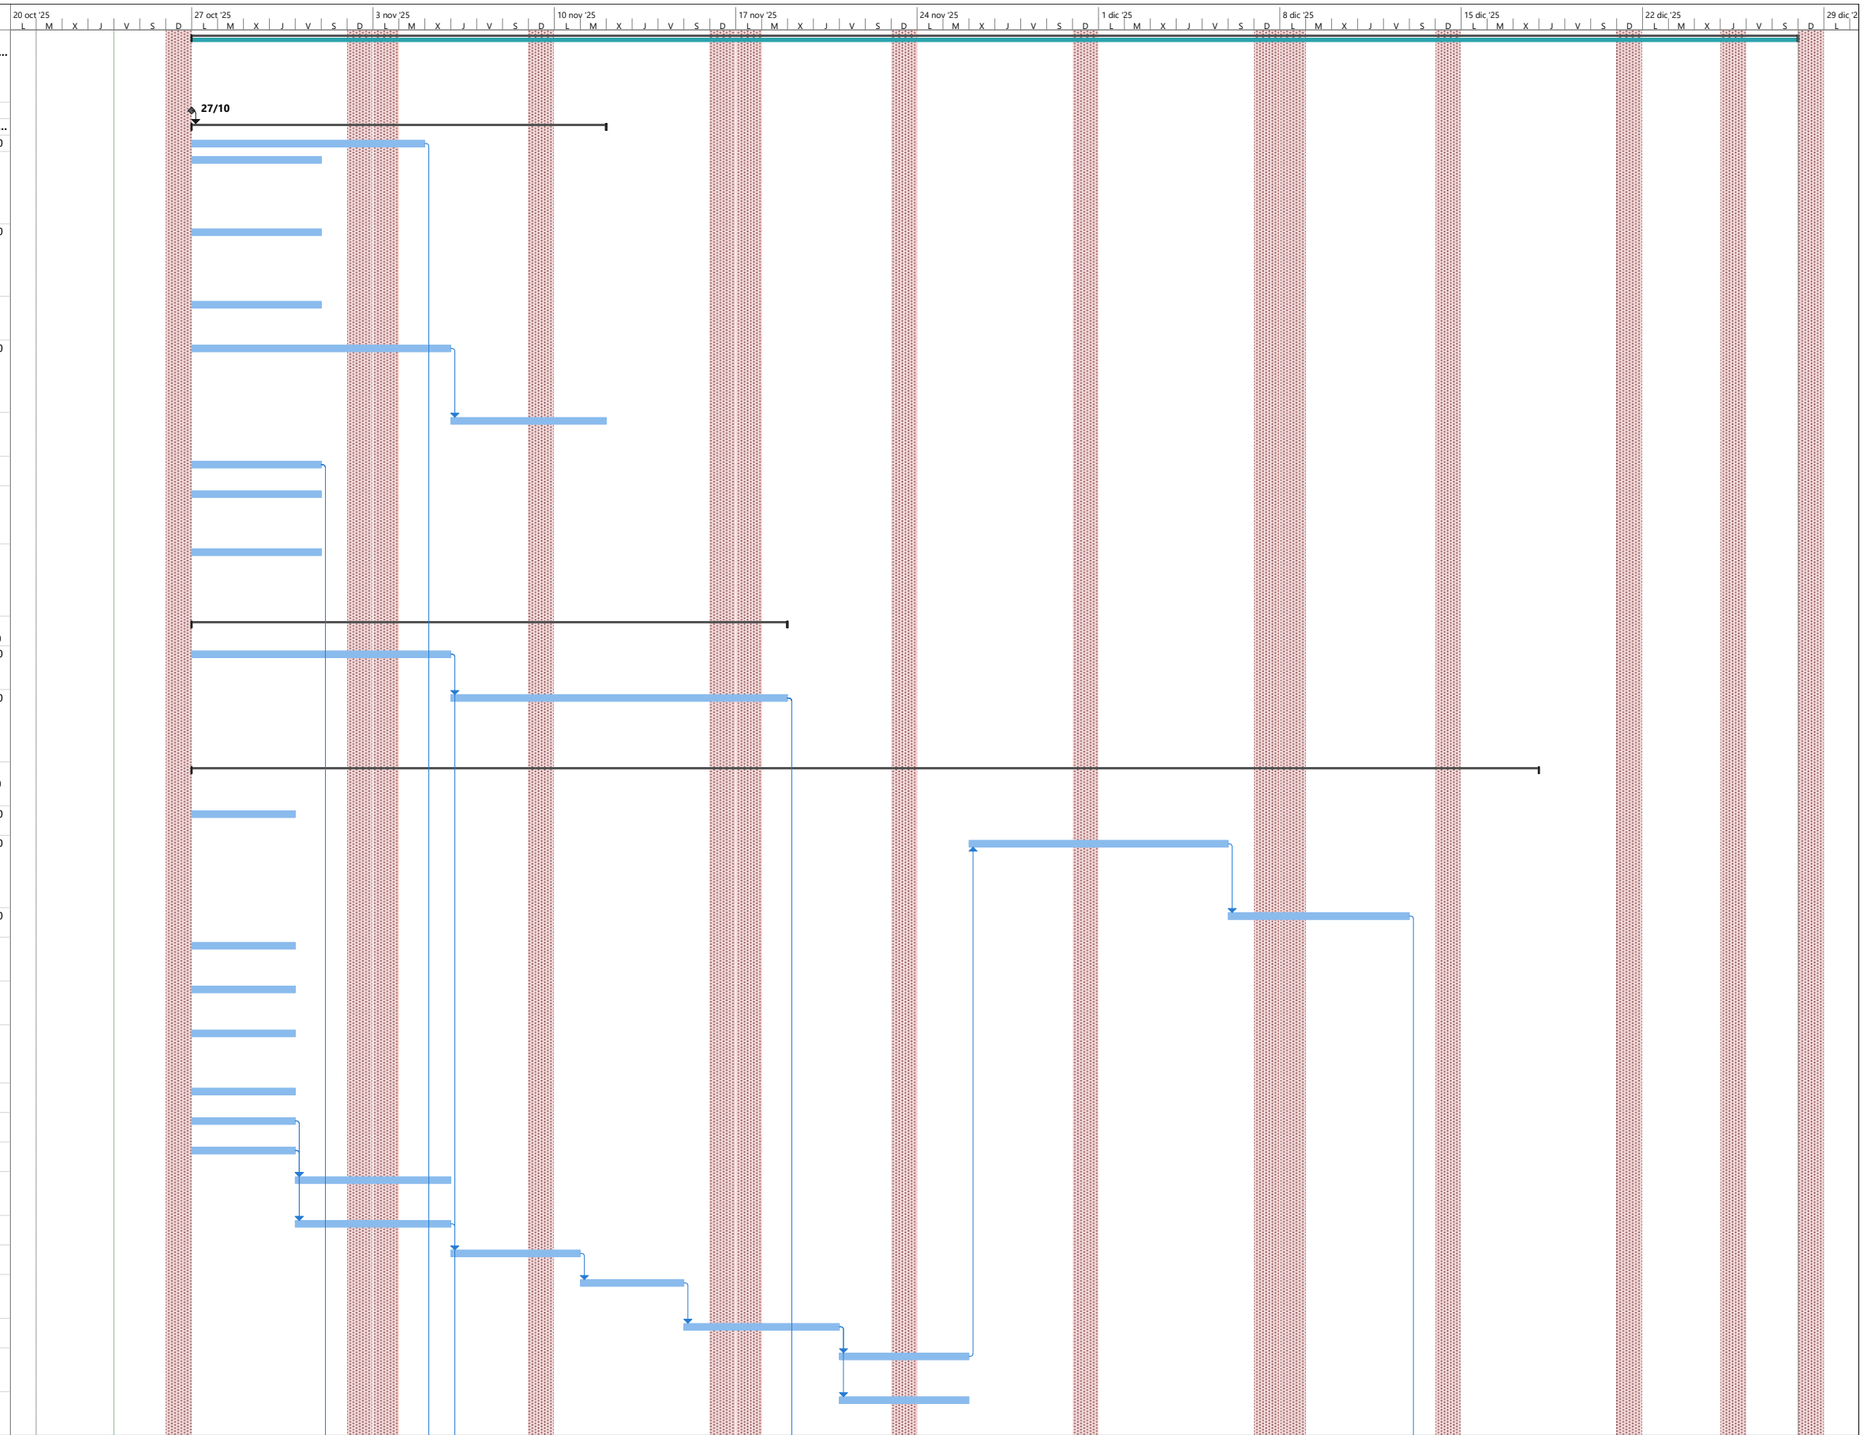

Proyecto: CRONOGRAMA ADIC
Fecha: vie 24/10/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
33		S/I DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICO BLANCO E=2,5MM	4 días	sáb 13/12/25	mié 17/12/25	$ 1.485.842,00
34		**ESTUCO**	**3 días**	**mié 5/11/25**	**vie 7/11/25**	**$ 19.561.595,00**
35		ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 19.561.595,00
36		**PINTURA**	**6 días**	**sáb 8/11/25**	**vie 14/11/25**	**$ 185.596.043,...**
37		PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	5 días	sáb 8/11/25	jue 13/11/25	$ 39.614.463,00
38		PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	4 días	sáb 8/11/25	mié 12/11/25	$ 33.960.953,00
39		PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	6 días	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 54.438.023,00
40		PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	6 días	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 57.582.604,00
41		**ENCHAPES**	**8 días**	**jue 30/10/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 49.636.073,00**
42		PISO CERAMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE	3 días	jue 6/11/25	sáb 8/11/25	$ 12.690.325,00
43		CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30M X 0,60 M BLANCO	4 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	$ 36.945.748,00
44		**PAÑETE**	**3 días**	**lun 27/10/25**	**mié 29/10/2!**	**$ 13.136.734,00**
45		PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$ 13.136.734,00
46		**RED DE DESAGUES**	**3 días**	**lun 27/10/25**	**mié 29/10/25**	**$ 10.945.264,00**
47		CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$ 10.945.264,00
48		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**11 días**	**mié 5/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 89.302.396,00**
49		S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 1.673.180,00
50		S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25	$ 24.221.648,00
51		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE GOLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTES Y GRIFERIA PUSH	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 12.410.696,00
52		S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 14.927.136,00
53		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4"	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 375.274,00
54		S/I DE GRIFERIA TELEDUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 6.184.120,00
55		S/I DE GRIFERIA PARA APARATOS SANITARIOS (INODOROS, ORINALES, LAVAMANOS) Y DUCHAS.	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$ 11.750.312,00
56		S/I DE TAPA Y ASIENTO PARA SANITARIO	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$ 11.435.382,00
57		S/I DE GRIFERIA PUSH PARA ORINALES	3 días	sáb 8/11/25	mar 11/11/25	$ 6.324.648,00
58		**ELECTRICO**	**12 días**	**mar 28/10/2**	**mar 11/11/2**	**$ 231.648.632,...**
59		S/I DE TOMACORRIENTE A 110V NORMAL . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 10.632.055,00
60		S/I DE TOMACORRIENTE A 220V CON TOMA MIRADA CHINA . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 1.512.144,00
61		S/I DE SWICHE SENCILLO .	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 6.930.900,00
62		S/I DE SWICHE DOBLE.	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 2.339.360,00
63		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 20.778.600,00
64		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 7.750.720,00
65		S/I DE LAMPARA LED T8 HERMÉTICA 2X18W COLOR BLANCO	6 días	jue 30/10/25	jue 6/11/25	$ 62.102.040,00
66		TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP USO INTERIOR/EXTERIOR	3 días	jue 30/10/25	sáb 1/11/25	$ 1.770.050,00
67		FOCO REFLECTOR LED EXTERIOR 50W	3 días	jue 30/10/25	sáb 1/11/25	$ 2.233.245,00

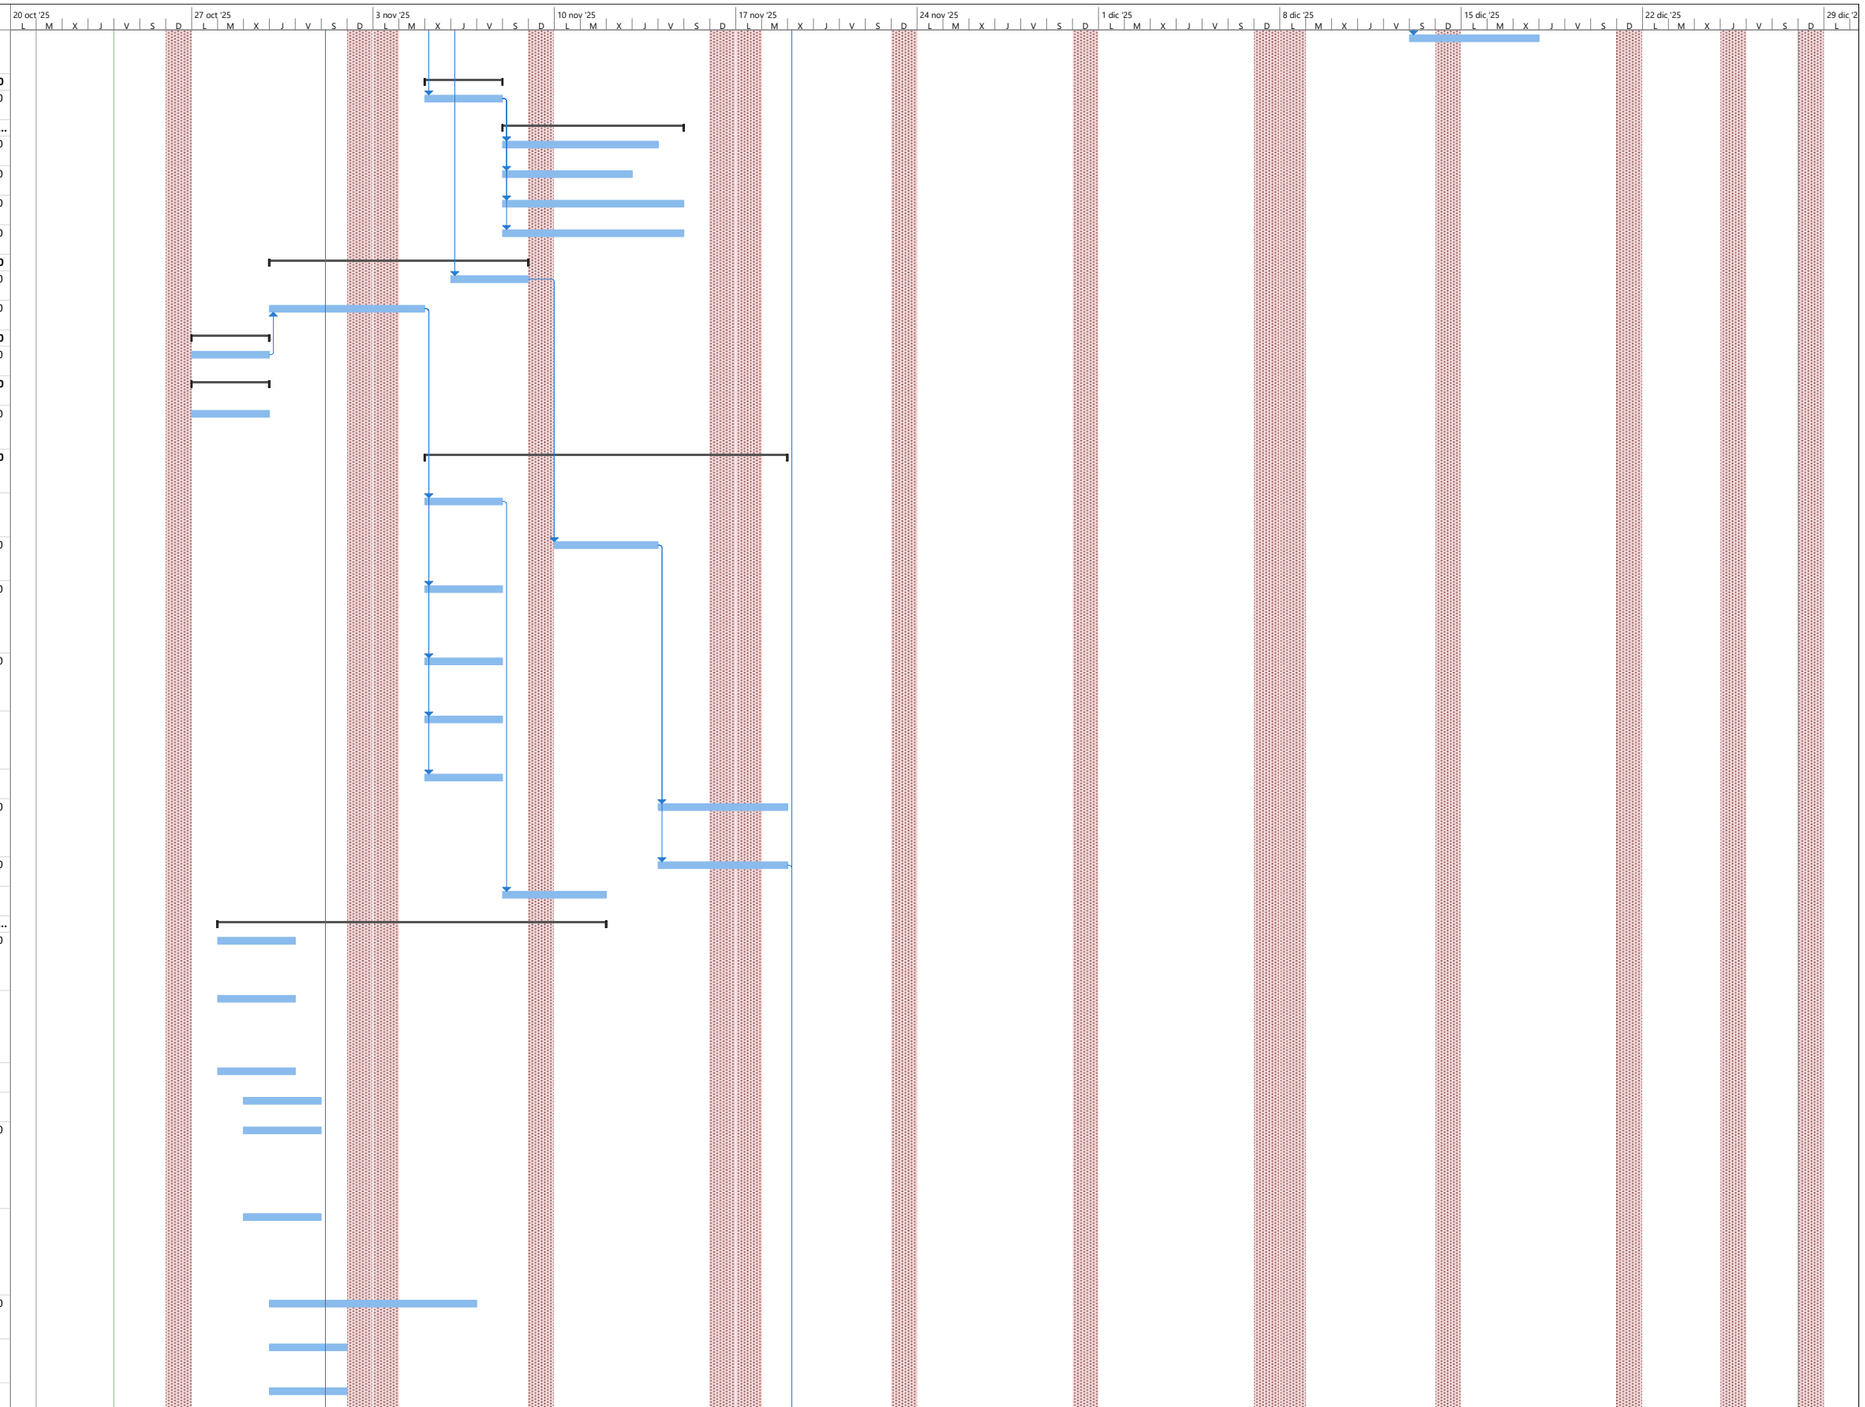

Proyecto: CRONOGRAMA ADIC
Fecha: vie 24/10/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
68		REUBICACION Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR TRIPLE	3 días	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 1.196.410,00
69		S/I DE LAMPARA TIPO JARDÌN	3 días	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 3.614.634,00
70		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO TORTUGA LED 12W PARA EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 6.877.990,00
71		S/I ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 2xNo.14 AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 5.236.012,00
72		S/I DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE.	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 446.523,00
73		S/I DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	7 días	mar 4/11/25	mar 11/11/25	$ 73.109.190,00
74		S/I DE FOTOCELDA AZUL 105-305V. INCLUYE BASE	3 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 438.604,00
75		S/I DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 7.714.000,00
76		S/I LAMPARA LED SOBREPONER 36W	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 4.311.720,00
77		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 668.524,00
78		S/I DE BOMBILLA SUPERLED DE 50W, LUZ BLANCA, 6500K	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 1.441.492,00
79		S/I DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	jue 6/11/25	sáb 8/11/25	$ 4.422.931,00
80		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CA	3 días	jue 6/11/25	sáb 8/11/25	$ 3.060.744,00
81		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,	3 días	jue 6/11/25	sáb 8/11/25	$ 3.060.744,00
82		**RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS**	**6 días**	**mié 19/11/25**	**mar 25/11/25**	**$ 27.296.433,00**
83		S/I DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 120 L RANGO DE OPERACIÓN AX 73 PSI	3 días	sáb 22/11/25	mar 25/11/25	$ 10.087.031,00
84		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. SEGÚN DISEÑO.	3 días	sáb 22/11/25	mar 25/11/25	$ 16.105.062,00
85		LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REPOSICION DE TAPA	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 1.104.340,00
86		**PUERTAS Y VENTANAS**	**16 días**	**vie 7/11/25**	**mié 26/11/25**	**$ 98.164.029,00**
87		S/I CERRADURA PARA PUERTAS	3 días	lun 24/11/25	mié 26/11/25	$ 10.304.780,00
88		MANTENIMIENTO PUERTAS Y MARCOS METALICOS, INCLUYE ALARGAMIENTO DE MARCOS, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	4 días	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	$ 36.486.565,00
89		INSTALACION DE PUERTA METALICA	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 8.943.804,00
90		INSTALACION DE VENTANAS	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 473.430,00
91		S/I VENTANA EN VIDRIO. INCLUYE MARCO.	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 5.390.441,00

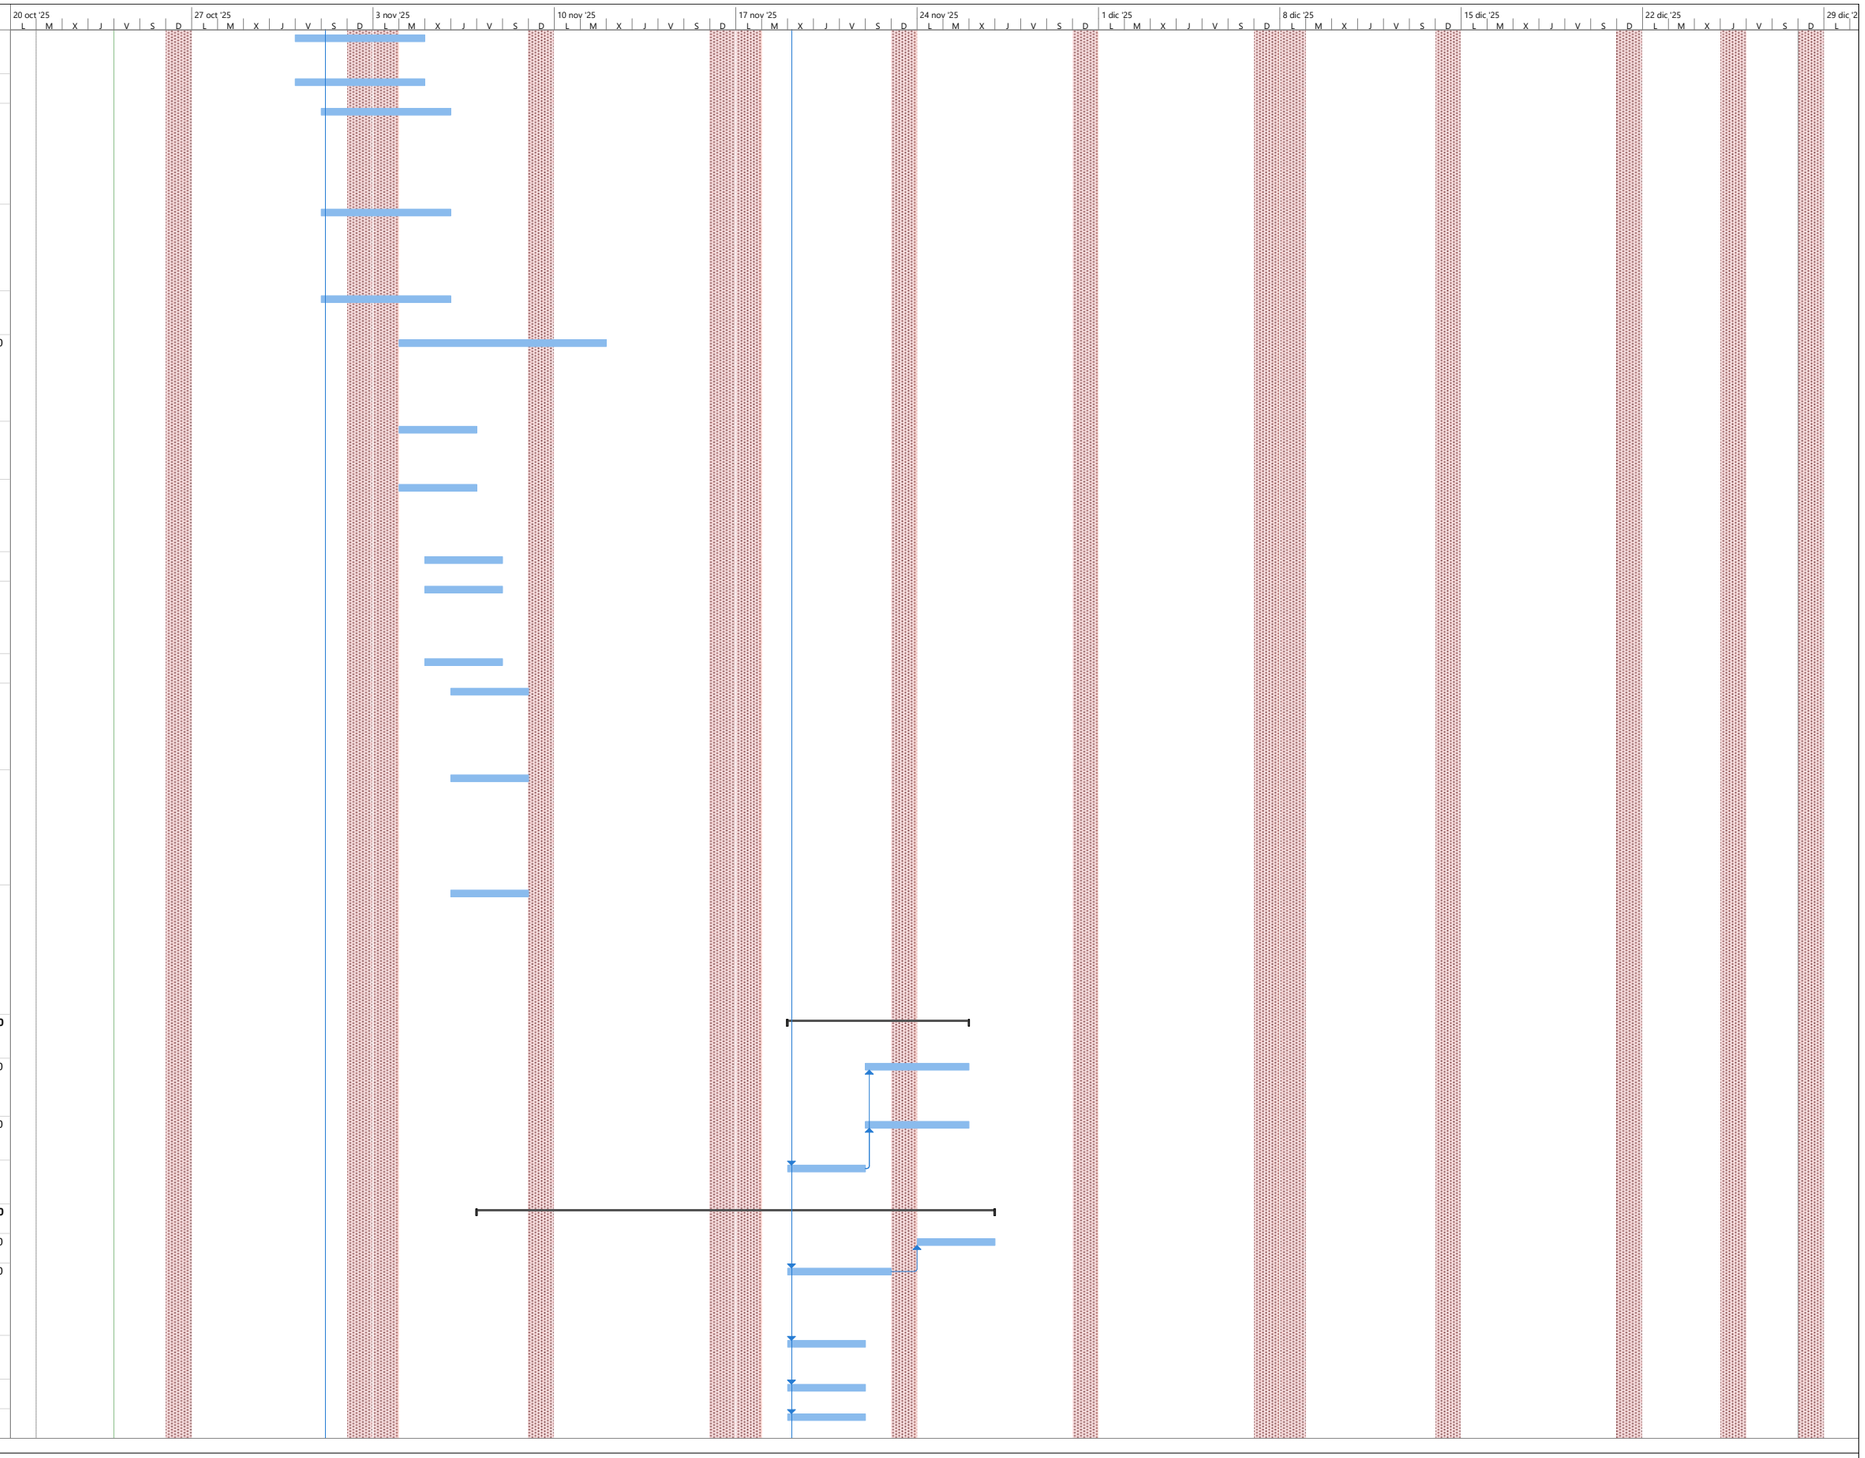

Proyecto: CRONOGRAMA ADIC
Fecha: vie 24/10/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
92		S/I DE ANGEO METÁLICO PARA SELLO DE VENTANA DE VENTILACIÓN	3 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$ 1.986.264,00
93		MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	4 días	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	$ 24.772.819,00
94		MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL.	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 6.668.695,00
95		MANTENIMIENTO DE VENTANAS TIPO PERSIANAS EN ALUMINIO NATURAL.	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 2.350.422,00
96		S/I DE VIDRIO INCOLORO 5MM	3 días	sáb 22/11/25	mar 25/11/25	$ 786.809,00
97		**CUNETAS**	**12 días**	**vie 7/11/25**	**vie 21/11/25**	**$ 10.390.292,00**
98		EXCAVACIÓN MANUAL	3 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$ 753.944,00
99		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 309.336,00
100		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 298.434,00
101		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$ 3.780.082,00
102		CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 5.248.496,00
103		**CIELO RASO**	**3 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 5/11/25**	**$ 27.973.653,00**
104		MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE PINTURA A 3 MANOS	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 21.592.587,00
105		S/I LAMINA SUPERBOARD PARA USO EXTERIOR.	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 3.216.194,00
106		S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 3.164.872,00
107		**CARPINTERIA METALICA**	**8 días**	**vie 7/11/25**	**sáb 15/11/25**	**$ 83.677.897,00**
108		S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO	8 días	vie 7/11/25	sáb 15/11/25	$ 83.677.897,00
109		**CARPINTERIA EN MADERA**	**14 días**	**mié 19/11/25**	**jue 4/12/25**	**$ 180.412.334,00**
110		S/I ENTREPAÑOS EN MADERA PARA ORGANIZADORES EN AULAS DE CLASES FONDO = 100 CM	14 días	mié 19/11/25	jue 4/12/25	$ 180.412.334,00
111		**PGIO**	**50 días**	lun 27/10/25	sáb 27/12/25	$ 9.874.356,00
112		FIN	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	$ 0,00

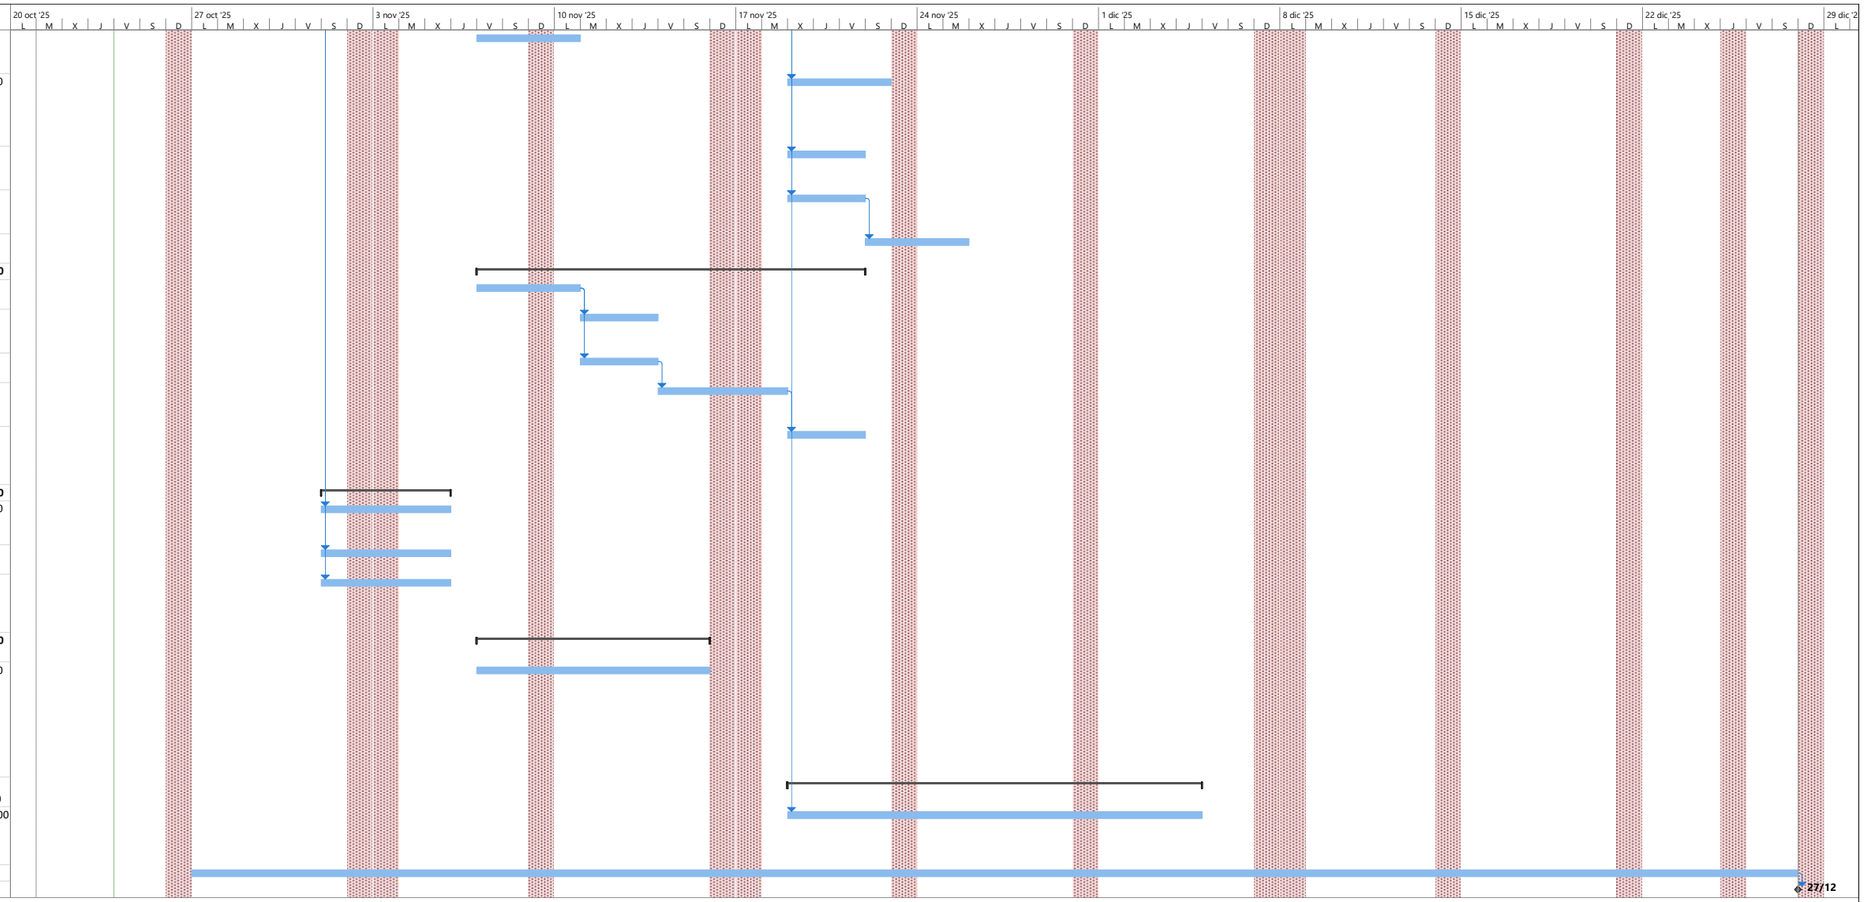

Proyecto: CRONOGRAMA ADIC
Fecha: vie 24/10/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
