ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 20 DE JUNIO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR- BOYACÁ Y EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	N° 002-2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025
OBJETO	**"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 de Chiquinquirá
CONTRATISTA	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA C.C No. 1.023.937.029 de Bogotá
SUPERVISOR	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y DOS M DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESEN CENTAVOS M/CTE ($15.772.265,60).
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LA NUEVA TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2025
FECHA REAL DE ACTA DE TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	09 DE OCTUBRE DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL(RP)

No. Registro Presupuestal	Código presupuestal	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
RP202506240003	2.3.2.02.02.009.45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municipio

	2.3.2.02.02.009.45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municipio

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 15.772.265,60
VALOR ADICION N° 1		$ 16.201.150.77
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 11.516.065,60	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 4.256.200	
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00	
TOTAL	**$** 15.772.265,60	**$** 15.772.265,60

CONSIDERACIONES GENERALES:

Una vez realizada la verificación de las obligaciones del objeto contractual, se constató la ejecución del 100% de las obligaciones del **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".** dentro del término previsto.

Que, conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias a conciliar o acordar, las partes acuerdan liquidar el **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**

Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de la SECRETRAIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS del municipio de San Pablo de Borbúr – Boyacá.

PLAZO DEL CONTRATO: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, plazo en el cual el contratista cumplió antes con las obligaciones contraídas en el **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**

CLAUSULAS:

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del "**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA**

CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025". a partir de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

SEGUNDA: Que de acuerdo con el informe de fecha 14 de octubre de 2025, expedido por el supervisor del presente contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, certifica el cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el contrato.

TERCERA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de San Pablo de Borbúr- Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**

.

CUARTA: Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.256.200)., correspondiente al 100% de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación Y Obra
Publicas Supervisor

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
C.C. No. 1.023.937.029 de Bogotá DC
Contratista

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N. º 002 DEL 20 DE JUNIO DE 2025.

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"



OCTUBRE 2025

Tabla de contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3
2. GENRALIDADES. 4
2.1. Localización. 4
2.2. Descripción del Proyecto. 5
3. ACTIVIDADES CONTRATADAS. 5
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 9
5. CONCLUSIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO

El señor EMMANUEL BRIAN PINILLA GUERRA y el Municipio de San Pablo de Borbur, suscribieron el CONTRATO DE OBRA N°. 002 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, cuyo objeto es **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".** Por un valor de **QUINCE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 15.772.265,60).**

El **CONTRATO DE OBRA No. 002 - 2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025** cuenta con un plazo de ejecución de treinta (30) días a partir de la firma del acta de iniciación, a través de este contrato se busca garantizar la estabilización del talud reduciendo el riesgo de deslizamiento de este talud según el contrato cuyo objeto es **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**

Que la administración Municipal, teniendo en cuenta la problemática presentada en la cancha de futbol por un talud donde presenta riesgo por deslizamiento o colapso debido a la inestabilidad del terreno, el talud no cuenta con un sistema de contención efectivo. Esto significa que, ante la lluvia intensa o cambios climáticos, el terreno puede perder cohesión y desencadenar un desprendimiento.

Si el talud llegara a colapsar, la caída de tierra o material rocoso podrá invadir la cancha, haciéndola quedar inoperativa y peligrosa para su uso, lo que afectaría las actividades deportivas y recreativas.
La implementación de gaviones es una solución eficaz para estabilizar el talud y proteger tanto la cancha de futbol como a las personas que lo utilizan, la combinación de estabilidad estructural, control de erosión y drenaje natural hace que los gaviones sean una elección óptima para mitigar el riesgo de deslizamientos en áreas deportivas con terrenos inestables.

Este informe resume las actividades realizadas, hallazgos obtenidos y las recomendaciones surgidas durante el proceso de supervisión, con el fin de brindar una visión integral sobre el avance y la calidad de la obra.
Posteriormente, se presenta la información general del contrato de obra, que incluye el presupuesto inicial, las garantías contractuales, la descripción de las actividades ejecutadas, el seguimiento a las actas técnicas y/o administrativas generadas, pago de aportes al sistema de seguridad social del personal de obra.


2. GENRALIDADES.

2.1. Localización.

El proyecto se realiza en el municipio de San Pablo de Borbur se encuentra situado a unos 65 km de la ciudad de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con Otanche y Pauna, al sur con Muzo, al oriente con Maripi y Pauna y al occidente con Otanche. La ejecución del proyecto se llevará a cabo en el centro poblado Santa Bárbara y en el sector de San Martin los cuales quedan a unos 20 kms del perímetro urbano del municipio.


San Pablo de Borbur también es conocido como el municipio esmeralda de Colombia, por sus numerosos yacimientos en su jurisdicción.

Ilustración 1 Localización general de municipio de san pablo de Borbur

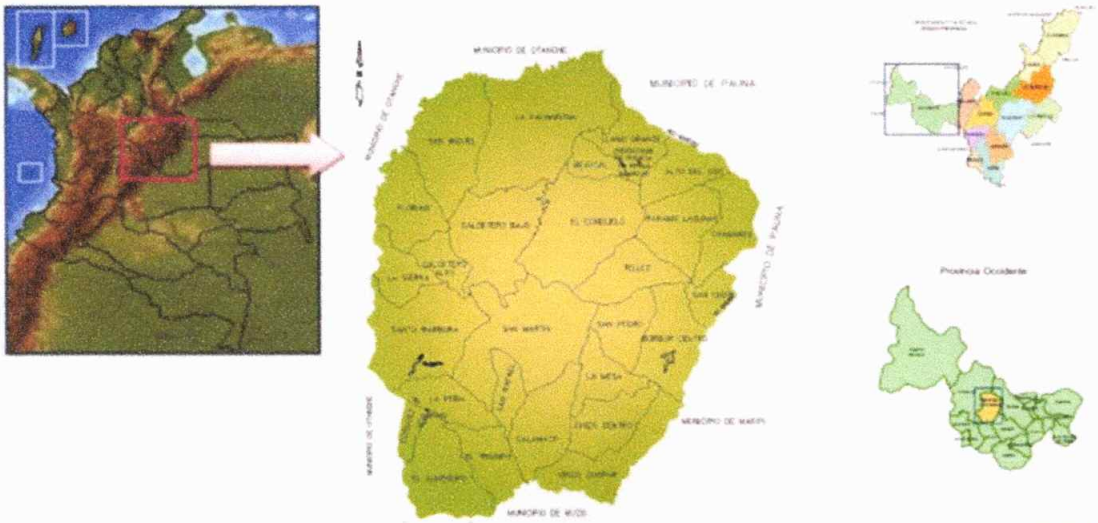

Fuente 1: Plan de desarrollo municipal

En la figura se muestra la localización del proyecto en el cual se ubica en la jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), en la cancha de futbol

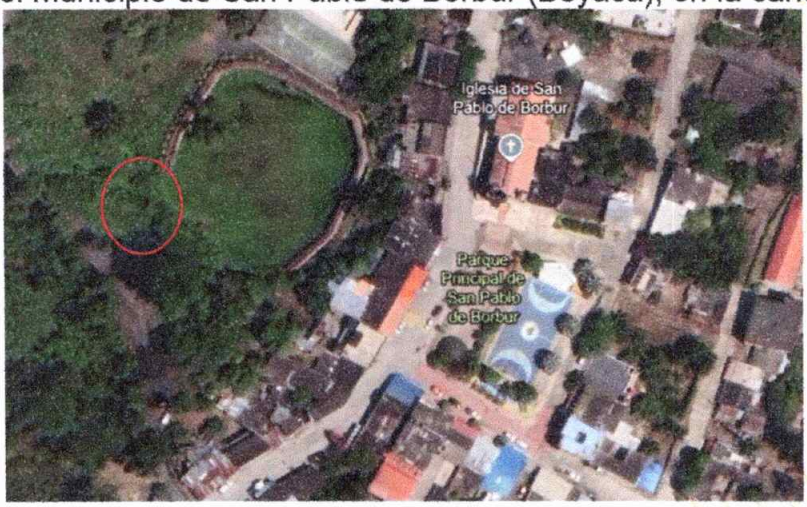

2.2. Descripción del Proyecto.

La secretaria de planeación del municipio de san pablo de Borbur es el ente encargado de la supervisión del contrato de obra No. 002 - 2025, evaluando el proceso de construcción y garantizar que se cumplan los requisitos técnicos, legales y de seguridad establecidos en el contrato y en las normativas vigentes, se tiene como objetivo:

- Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y ejecución.
- Verificar la calidad de los materiales utilizados en la construcción de muro de gaviones.
- Evaluar la implementación de medidas de seguridad y protección ambiental

La supervisión se realizó en diferentes actividades como lo son:

- **Inspecciones visuales:** se llevaron a cabo inspecciones regulares en el sitio de obra para observar las condiciones de trabajo y el cumplimiento de los estándares.
- **Revisión documental:** se revisaron las especificaciones técnicas y certificados de calidad de los materiales.
- **Reuniones de seguimiento**: se llevaron a cabo reuniones periódicas con el contratista y equipo de trabajo para discutir el avance, resolver dudas y plantear mejoras.

Aspectos Evaluados

- **Calidad de la ejecución**: se evalúa la correcta construcción de muro de contención en gaviones en la cancha de futbol.
- **Uso de materiales**: se verifico que los materiales empleados cumplieran con las especificaciones de resistencia y durabilidad.
- **Cumplimiento del cronograma:** Se monitoreo el avance físico de la obra, comparándolo con el cronograma establecido.
- **Seguridad en el trabajo:** Se revisaron las medidas de seguridad implementadas en el sitio para proteger a los trabajadores y minimizar riesgos.

3. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Tabla 1 Información general del contrato

CONTRATO DE OBRA No. 002-2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.023.937.361 EXPEDIDA EN BOGOTA DC	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT. 891.801.369-2 R/L: CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.631 DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ)
OBJETO:	**"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA C.C No. 1.023.937.029 de Bogotá
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de planeación y obras públicas
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y DOS M DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESEN CENTAVOS M/CTE ($ 15.772.265,60).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO No.01	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LA NUEVA TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION	15 DE AGOSTO DE 2025

3.1. Actividades contratadas.

Tabla 2 Estado financiero

Ítem	Ítem Gober	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	INC X DIS 8%	Valor parcial	Valor total
		CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO						
1		**CIMENTACIÓN Y DESAGUES**						
1.1	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)	m2	4,80	$ 43.000,00	8,00%	$ 222.912,00	$ 222.912,00
2		**OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS**						
2.1	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m³	20,25	$ 15.000,00		$ 303.750,00	
2.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	4,75	$ 91.000,00		$ 432.250,00	
2.3	3.03.03	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	m³	12,00	$ 375.000,00	8,00%	$ 4.860.000,00	$ 5.596.000,00
3		**EXPLANACIONES**						
3.1	APU	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO	m³	19,73	$ 320.000,00		$ 6.313.600,00	$ 6.313.600,00
		Costo directo						$ 12.132.512,00
					Administración		24%	$ 2.911.802,88
					Imprevistos		1%	$ 121.325,12
					Utilidad		5%	$ 606.625,60
		Valor total del proyecto						$ 15.772.265,60

3.2. Descripción resumida de las condiciones originales de contrato.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
2. Desarrollo el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes de servicio prestados de acuerdo al anexo técnico, el pliego de condiciones y demás documentos del proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

3.3. Relación de actas suscritas.

✓ **CONTRATO DE OBRA No. 2024 – 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Tabla 3 Actas suscritas

ACTA No.	OBJETO	FECHA	COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN
1	ACTA DE INICIO	07/07/2025	N/A

3.4. Relación de garantías.

✓ **CONTRATO DE OBRA No. 002 - 2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025.**

El ejecutor realizó la actualización de las garantías según acta de inicio, las cuales fueron aprobadas por Corpoboyacá como se evidencia en la plataforma SECOP II. A continuación, se relaciona la información consignada en las garantías aprobadas:

Tabla 4 Garantías

Número de Póliza	39-40-101045364			
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 284.700.000,00	07/07/2025	06/08/2025

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ANEXO 3	10%	$ 284.700.000,00	07/07/2025	20/08/2025

Número de Póliza	39-44-101173456			
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 1.577.226,56	07/07/2025	07/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	$ 3.154.453,12	06/08/2025	06/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNNIZACIONES LABORALES	5%	$ 788.613,28	07/07/2025	06/08/2028
ANEXO 3				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 1.577.226,56	07/07/2025	21/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	$ 3.154.453,12	06/08/2025	06/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNNIZACIONES LABORALES	5%	$ 788.613,28	07/07/2025	20/08/2028

3.5. Balance del contrato.

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0.00	**$15.772.265,60**
VALOR PAGADO ACTAS	**$ 11.516.065,60**	$0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 4.256.200,00**	$0.00
SALDO POR EJECUTAR	$0.00	$0.00
TOTAL	**$15.772.265,60**	**$15.772.265,60**

3.6. VALOR PRESENTE ACTA:

CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS ($4.256.200,00).

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS


Se han desarrollado todas las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de la ejecución del contrato de obra 002-2025 de 20 de junio de 2025 cuyo objeto tiene **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"**.

1. CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.1. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)

El solado en la construcción de muros de gaviones tiene un papel esencial en garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad del muro. Asegura una correcta distribución de cargas, mejora el drenaje, previene la erosión en la base y ayuda a mantener la estructura estable a lo largo del tiempo.



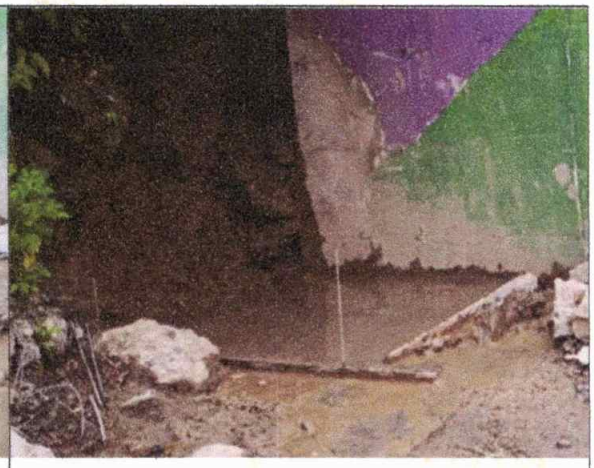

2. OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURA

2.1. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).





2.2. EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMUN.

La excavación manual es un proceso que consiste en remover tierra y otros materiales del suelo utilizando herramientas manuales, este proceso es fundamental en la preparación del terreno para la construcción de estructuras como lo son los gaviones.







2.3. CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13.

los muros de contención en gaviones son fundamentales para la protección del terreno contra deslizamientos, erosión y otros riesgos geotécnicos. Además, ofrecen ventajas en términos de sostenibilidad, coste y adaptabilidad, lo que los convierte en una opción preferida en muchas obras civiles.





3. EXPLANACIONES

3.1. EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO.

Ilustración 2 Roca No.1

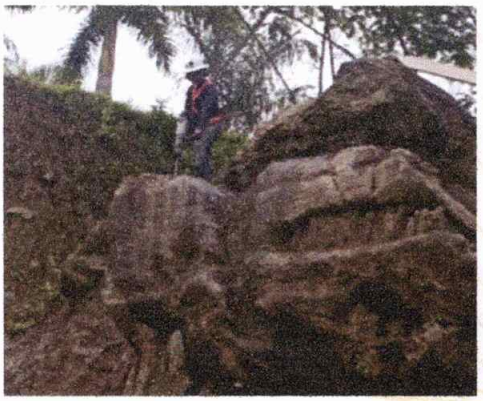


Ilustración 3 Roca No. 1

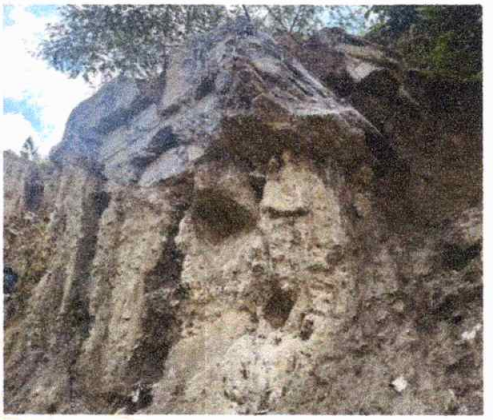


Ilustración 4 Roca No. 2

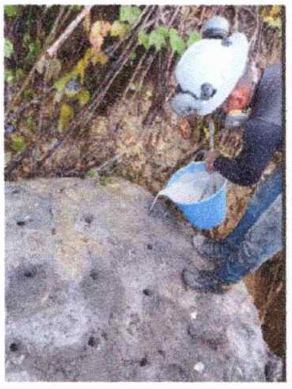



Ilustración 5 Roca No. 2



Ilustración 6 Roca No. 3



Ilustración 7 Roca No. 3

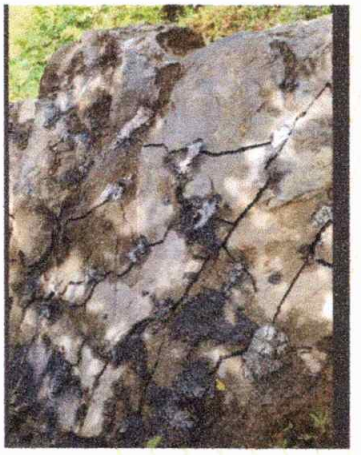

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Sec. Planeación y Obras Publicas

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N. º 002 DEL 20 DE JUNIO DE 2025.

OBJETO:
"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"

PRESENTADO POR:

EMMANUEL BRIAN GUERRAA PINILLA
CONTRATISTA



OCTUBRE 2025

INTRODUCCIÓN

El Informe corresponde al proyecto desde el acta de inicio con fecha 07 de julio de 2025, donde se analizaron los aspectos más relevantes durante el período en cuanto a: visita de supervisión, materiales, mano de obra, aspectos laborales, diseño, proceso constructivo, cronograma de trabajo (indicando estado o porcentaje de avance de las diferentes actividades).
teniendo en cuenta la problemática presentada en el talud ubicado en la cancha de fútbol, informa que dicha área presenta un alto riesgo de deslizamiento o colapso debido a la inestabilidad del terreno. Por lo mismo en el año 2024 se realizó un contrato de obra donde se realizó construcción de gaviones en el costado derecho de la cancha el cual ya se terminó y se liquidó, este contrato a realizar específicamente es para hacerlo en el talud en el costado izquierdo de la cancha de futbol la cual por la ola invernal la cual el municipio está pasando, se presenta erosión y desprendimiento de terreno porque los suelos ya están saturados de agua, esta zona carece de una estructura de contención que permita garantizar su estabilidad.


En la parte superior izquierda de este talud ya hubo desprendimiento y genero caída de tierra y material rocoso invadiendo la cancha, haciéndola quedar inoperativa y peligrosa para su uso, lo que afectaría las actividades deportivas y recreativas.

Finalmente, el proyecto contribuye al bienestar de la comunidad al proporcionar una estabilización del talud en riesgo de colapso. La participación de la comunidad en el proceso de planificación y ejecución del proyecto puede aumentar la aceptación y el compromiso con el mantenimiento futuro de la infraestructura, promoviendo un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. En resumen, la construcción de gaviones y la empradización del talud es esencial para garantizar la seguridad, funcionalidad y sostenibilidad de una infraestructura crítica que impacta significativamente el desarrollo de la comunidad.

GENERALIDADES


2.1. LOCALIZACIÓN

La zona del proyecto está ubicada en la república de Colombia, en el departamento de Boyacá, a unos 65 km del municipio de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con los municipios de Otanche y Pauna, al sur con el municipio de Muzo, al oriente con los municipios de Maripi y Pauna; y al occidente con el municipio de Otanche

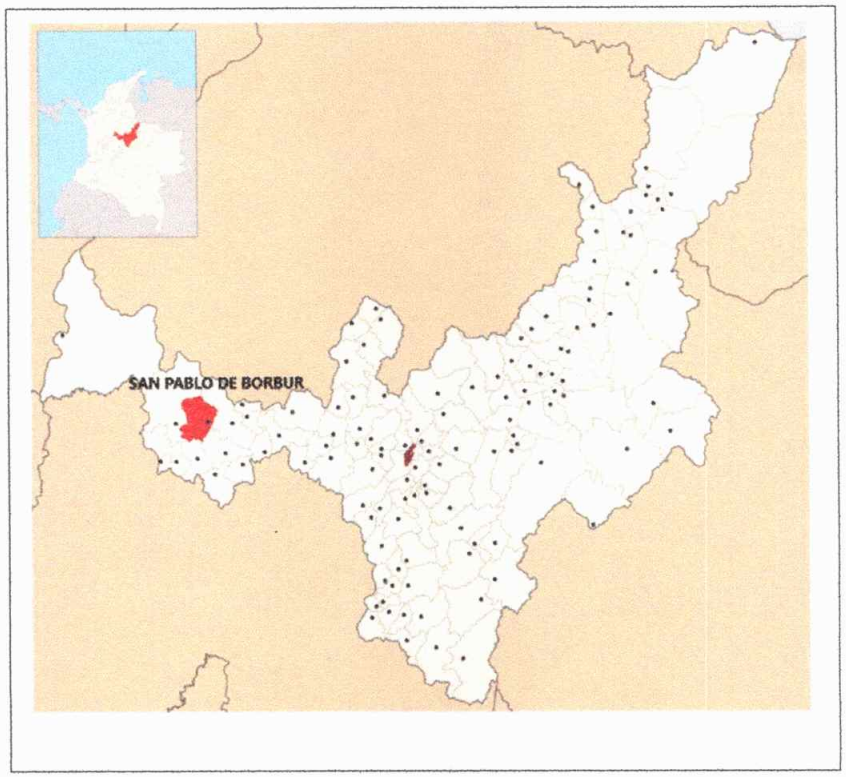

2.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

En la figura se muestra la localización del proyecto en el cual se ubica en la jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), en la cancha de futbol

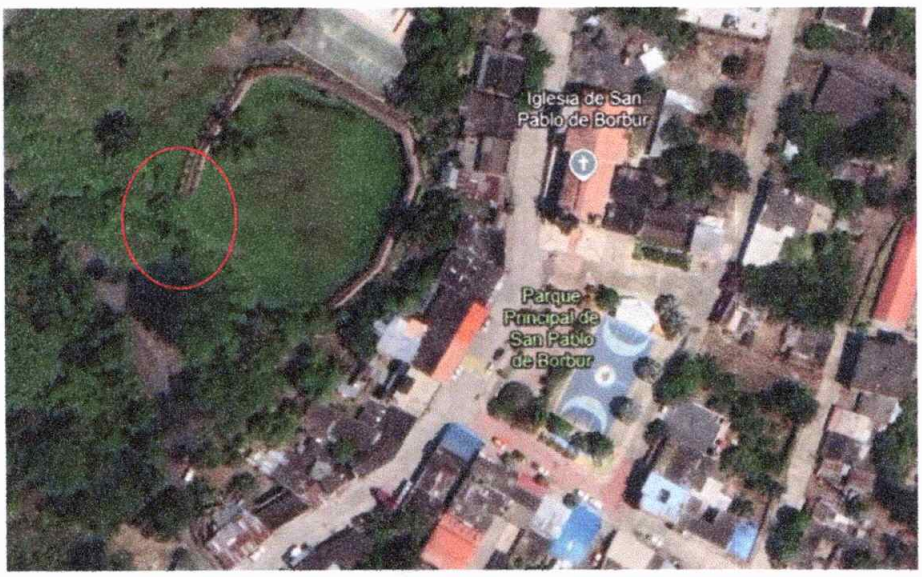

2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El municipio de San Pablo de Borbur, con el fin de cumplir su plan de desarrollo y realizando las respectivas gestiones, la administración Municipal, teniendo en cuenta la problemática presentada en la cancha de futbol por un talud donde presenta riesgo por deslizamiento o colapso debido a la inestabilidad del terreno, el talud no cuenta con un sistema de contención efectivo. Esto significa que, ante la lluvia intensa o cambios climáticos, el terreno puede perder cohesión y desencadenar un desprendimiento.
Si el talud llegara a colapsar, la caída de tierra o material rocoso podrá invadir la cancha, haciéndola quedar inoperativa y peligrosa para su uso, lo que afectaría las actividades deportivas y recreativas

Mediante visita técnica realizada en fecha 05 de mayo de 2025 por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, se evidenció la necesidad de intervenir el talud contiguo a la cancha de fútbol mediante la construcción de estructuras de gaviones. Esta intervención tiene como objetivo mitigar el riesgo asociado a la caída de material rocoso y prevenir futuros deslizamientos que puedan comprometer la seguridad del área.

El talud objeto presenta una longitud aproximada de 40 metros y una altura de 15 metros, condiciones que, junto con la pendiente natural del terreno y la evidencia de inestabilidad, por lo que hace que en el costado izquierdo de este talud presente erosión en el terreno la cual requiere ejecución de obras de contención.

Cabe destacar que en la cancha de fútbol se desarrollan de manera frecuente actividades deportivas que congregan un número considerable de personas, incluyendo la participación activa de niños y jóvenes pertenecientes a las escuelas de formación deportiva del municipio. Por tanto, la intervención proyectada busca garantizar la integridad física de los deportistas

El día 11 de abril de 2025, el Comité de Gestión del Riesgo y Desastres Municipal se reunió con el objetivo de evaluar un riesgo identificado en el costado izquierdo de la cancha de fútbol del municipio. Este talud representa un peligro potencial para la infraestructura deportiva y las zonas aledañas, Cabe recordar que en el año 2024 ya se había aprobado un contrato para la construcción de gaviones en el costado derecho de la cancha, con el fin de prevenir deslizamientos en esa área. Esta intervención demostró ser una medida eficaz, lo que ha motivado ahora a tomar acciones similares en el costado izquierdo, como resultado de la evaluación actual, se determinó la necesidad de construir un muro de contención mediante gaviones en el costado izquierdo de la cancha, con el fin de mitigar riesgos de erosión, desprendimientos de tierra y rocas, así como prevenir posibles colapsos

De acuerdo con la visita realizada de los profesionales de la secretaría de planeación municipal, realizaron los correspondientes hallazgos de las inspecciones del municipio; de acuerdo con estas visitas, se concluyó que es necesario implementar un esquema de gaviones en la zona afectada, las cuales fueron allegadas a la secretaria de planeación quien es el responsable del Comité Municipal de Gestión del Riesgo.

Es por todo lo anterior que el Municipio requiere suscribió un contrato de obra con una persona natural o jurídica legalmente constituida que cuente con la experiencia e idoneidad suficiente, capaz de cumplir con el objeto: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"**. El cual tiene como sustento legal lo consagrado en el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 de Julio del año 2011, decreto 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente y con sujeción a los principios del Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de la ley 1437 de 2011.

ACTIVIDADES CONTRATADAS.

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 002-2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.023.937.361 EXPEDIDA EN BOGOTA DC	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT. 891.801.369-2 R/L: CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.631 DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ)
OBJETO:	**"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".**
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA C.C No. 1.023.937.029 de Bogotá
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de planeación y obras públicas
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 15.772.265,60).

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO No.01	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LA NUEVA TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION	15 DE AGOSTO DE 2025

3.2. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Ítem	Ítem Gober	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	INC X DIS 8%	Valor parcial	Valor total
CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO								
1		CIMENTACIÓN Y DESAGUES						
1.1	1,02,28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)	m2	4,80	$ 43.000,00	8,00%	$ 222.912,00	$ 222.912,00
2		OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS						
2.1	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	m³	20,25	$ 15.000,00		$ 303.750,00	
2.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	4,75	$ 91.000,00		$ 432.250,00	
2.3	3.03.03	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	m³	12,00	$ 375.000,00	8,00%	$ 4.860.000,00	$ 5.596.000,00
3		EXPLANACIONES						
3,1	APU	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO	m³	19,73	$ 320.000,00		$ 6.313.600,00	$ 6.313.600,00
		Costo directo						$ 12.132.512,00
					Administración		24%	$ 2.911.802,88
					Imprevistos		1%	$ 121.325,12
					Utilidad		5%	$ 606.625,60
		Valor total del proyecto						$ 15.772.265,60

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1. VALOR PRESENTE ACTA:

CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS ($4.256.200,00).

4.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO.

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025".					
Ítem	Ítem Gober	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor total
CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO					
1		**CIMENTACIÓN Y DESAGUES**			
1.1	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)	m2	4,80	**$ 222.912,00**
2		**OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS**			
2.1	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m³	20,25	$303.750
2.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	4,75	$432.250
2.3	3.03.03	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	m³	12,00	**$ 4.860.000,00**
3		**EXPLANACIONES**			
3.1	APU	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO	m³	19,73	**$ 6.313.600,00**
		Costo directo			**$ 12.132.512,00**
					$ 2.911.802,88
					$ 121.325,12
					$ 606.625,60
		Valor total del proyecto			**$ 15.772.265,60**

Página 1

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se han desarrollado todas las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de la ejecución del contrato de obra 002-2025 20 de junio de 2025 cuyo objeto tiene **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"**.

1. CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.1. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)

El solado en la construcción de muros de gaviones tiene un papel esencial en garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad del muro. Asegura una correcta distribución de cargas, mejora el drenaje, previene la erosión en la base y ayuda a mantener la estructura estable a lo largo del tiempo.





2. OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURA

2.1. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).





2.2. EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMUN.

La excavación manual es un proceso que consiste en remover tierra y otros materiales del suelo utilizando herramientas manuales, este proceso es fundamental en la preparación del terreno para la construcción de estructuras como lo son los gaviones.







2.3. CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13.

los muros de contención en gaviones son fundamentales para la protección del terreno contra deslizamientos, erosión y otros riesgos geotécnicos. Además, ofrecen ventajas en términos de sostenibilidad, coste y adaptabilidad, lo que los convierte en una opción preferida en muchas obras civiles.







3. EXPLANACIONES

3.1. EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO.

Ilustración 1 Roca No.1

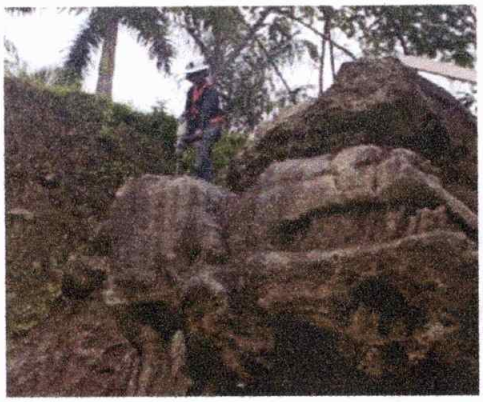


Ilustración 2 Roca No. 1



Ilustración 3 Roca No. 2

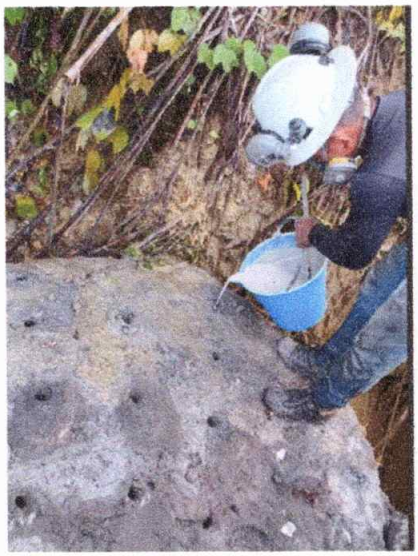


Ilustración 4 Roca No. 2



Ilustración 5 Roca No. 3



Ilustración 6 Roca No. 3





Emmanuel Brian Guerra Pinilla
cédula de ciudadanía No. 1.023.937.029 de Bogotá
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801349-3

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 002-2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR			FECHA INICIO:	07-jul-2025	FECHA DEL ACTA ANTERIOR	16-jul-25	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.772.265,60
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA	CONTRATO No.	002-2025	VALOR INICIAL:	$ 15.772.265,60	FECHA DEL CONTRATO	20-jun-2025	VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 11.516.065,60
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No.	002-2025	VALOR A ADICIONAR:	N/A	FECHA SUSPENSIÓN No. 1	1-ago-25	VALOR PRESENTE ACTA	$ 4.256.200,00
				PLAZO A ADICIONAR:	N/A	FECHA REINICIO No. 1	13-ago-25	VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ			PLAZO INICIAL:	30 DIAS CALENDARIO	FECHA A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	N/A	FECHA PRESENTE ACTA	14-oct-2025

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		OBRAS POR EJECUTAR	
ITEM	ITEM COMBINACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1		**CIMENTACION Y DESAGUES**																
1.1	1,02,08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)	m2	4,80	$ 46.440,00	$ 222.912,00			$ 0,00			$ 0,00	4,80	$ 222.912,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 222.912,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 222.912,00**		**$ 0,00**		**$ -**
2		**OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS**																
2.1	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m³	20,25	$ 15.000,00	$ 303.750,00						$ 0,00	20,25	$ 303.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	2,01,70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	4,75	$ 91.000,00	$ 432.250,00						$ 0,00	4,75	$ 432.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	3,03,03	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	m³	12,00	$ 405.000,00	$ 4.860.000,00						$ 0,00	10,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 810.000,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 5.596.000,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.786.000,00**		**$ 810.000,00**		**$ -**
3		**EXPLANACIONES**																
3,1	APU	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO	m³	19,73	$ 320.000,00	$ 6.313.600,00						$ 0,00	12,03	$ 3.849.600,00	7,70	$ 2.464.000,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 6.313.600,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		$ 3.849.600,00		**$ 3.274.000,00**		**$ 0,00**
		COSTO TOTAL OBRA CIVIL				**$ 12.132.512,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.858.512,00**		**$ 3.274.000,00**		**$ 0,00**
		ADMINISTRACION			**24%**	**$ 2.911.802,88**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.126.042,88**		**$ 785.760,00**		**$ 0,00**
		IMPREVISTOS			**1%**	**$ 121.325,12**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 88.585,12**		**$ 32.740,00**		**$ 0,00**
		UTILIDAD			**5%**	**$ 606.625,60**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 442.925,60**		**$ 163.700,00**		**$ 0,00**
		TOTAL CONTRATO				**$ 15.772.265,60**			**$ 0,0**	**$ 0,0**		**$ 0,00**		**$ 11.516.065,60**		**$ 4.256.200,00**		**$ 0,00**

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.772.265,600
VALOR ITEMS NO PREVISTOS	$ 0,00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.772.265,60

BALANCE FINANCIERO	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 4.256.200,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 15.772.265,60
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100,00%

BALANCE FINANCIERO	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 11.516.065,60
VALOR PRESENTE ACTA	$ 4.256.200,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00

En el Municipio de San Pablo de Borbúr a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron los Señores: **ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ** en calidad de Alcalde Municipal; **ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del Contrato, y el **ING. EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion final al contrato de obra **No. 002-2025**

La presente acta liquidacion final del contrato de obra 002-2025 se firma por los que en ella intervienen a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2025.

ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	14	MM	10	AA	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"				
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA	CONTRATO:	002-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO:	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO

ACTIVIDAD	1	CIMENTACION Y DESAGUES	1.1	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14 MPA (2000PSI)	UNIDAD:	m2





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total
CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA						
CANTIDADES EJECTUDAS EN ACTAS ANTERIORES						
ACTAS DE AVANCE No. 1.	2,20	2,20		4,84	1,00	**4,84**
SUBTOTAL						**4,84**

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	14	MM	10	AA	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"				
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA	CONTRATO:	002-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO:	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO

ACTIVIDAD	2	OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	2.1	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	UNIDAD:	m^3





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total
CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA						
CANTIDADES EJECTUDAS EN ACTAS ANTERIORES						
ACTAS DE AVANCE No. 1.	5,00	2,70	1,50	20,25	1,00	**20,25**
SUBTOTAL						**20,25**

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	14	MM	10	AA	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"				
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA	CONTRATO:	002-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO:	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO

ACTIVIDAD	2	OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD:	m³





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total
CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA						
CANTIDADES EJECTUDAS EN ACTAS ANTERIORES						
ACTAS DE AVANCE No. 1. Excavacion solado costado izquierdo cancha de fubol	2,20	2,20	0,30	1,45	1,00	**1,45**
ACTAS DE AVANCE No. 1. Excavacion gaviones costado izquierdo cancha de fubol	1,00	2,20	1,50	3,30	1,00	**3,30**
SUBTOTAL						**4,75**

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	14	MM	10	AA	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"				
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA	CONTRATO:	002-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO:	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO

ACTIVIDAD	2	OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	2,3	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	UNIDAD:	m³





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total
CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA						
ACTAS DE AVANCE No. 1.construccion de gaviones con malla calibre 13 de (2X1X1)- al costado izquierdo de la cancha de futbol tercera fila	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	**2,00**
CANTIDADES EJECTUDAS EN ACTAS ANTERIORES						
ACTAS DE AVANCE No. 1.construccion de gaviones con malla calibre 13 de (2X1X1)- al costado izquierdo de la cancha de futbol primera fila	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	**4,00**
ACTAS DE AVANCE No. 1. construccion de gaviones con malla calibre 13 de (2X1X1)- al costado izquierdo de la cancha de futbol segunda fila	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	**4,00**
ACTAS DE AVANCE No. 1.construccion de gaviones con malla calibre 13 de (2X1X1)- al costado izquierdo de la cancha de futbol tercera fila	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	**2,00**
SUBTOTAL						**12,00**

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	**DD**	14	**MM**	10	**AA**	2025	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ** EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"**				
CONTRATISTA:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA	CONTRATO:	002-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO:	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas


CABECERA MUNICIPAL - BORBÚR CENTRO

ACTIVIDAD	**3**	**EXPLANACIONES**	**3,1**	**EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y CEMENTO EXPANSIVO**	**UNIDAD: m³**

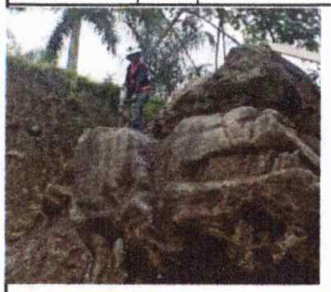





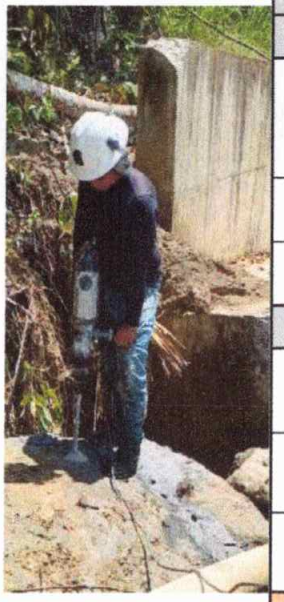

DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total
CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA						
ROCA No. 1	2,20	2,00	3,00	7,70	1,00	**7,70**
CANTIDADES EJECTUDAS EN ACTAS ANTERIORES						
ACTAS DE AVANCE No. 1.ROCA No. 1	1,20	2,00	3,00	5,50	1,00	**5,50**
ACTAS DE AVANCE No. 1. ROCA No. 2	1,80	1,00	1,00	1,80	1,00	**1,80**
ACTAS DE AVANCE No. 1.ROCA No. 3	2,10	1,50	1,50	4,73	1,00	**4,73**
SUBTOTAL						**19,73**

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

San Pablo de Borbúr, 14 de octubre 2025

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
NIT 891801 369-2

DEBE A:

Emmanuel Brian Guerra Pinilla
C.C. 1023937029

La suma de: **CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS ($4.256.200,00).**

CONCEPTO DE

Por concepto de: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 002-2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025.

OBJETO: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ 2025"**

Emmanuel

Emmanuel Brian Guerra Pinilla
Cedula de ciudadanía: 1023937029
Dirección: Calle 81 # 5 – 27
Teléfono: 3124844252
Correo: emmanuelguerra19@hotmail.com

Favor consignar en la cuenta **ahorros No. 71538670** del Banco NU (Colombia Compañía de Financiamiento S.A., NIT: 901658107).

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

RUT

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730109701

(415)7707212489984(8020) 0000014730109701

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 3 9 3 7 0 2 9	1	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 3 9 3 7 0 2 9	2 0 1 2 1 0 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRA	PINILLA	EMMANUEL	BRIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 5 25 A 36 BRR SANTA ISABEL

42. Correo electrónico: Emmanuelguerra19@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 8 4 4 2 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
45. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 2 0 0 8 2 4	7 7 1 1	2 0 2 2 0 8 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores					
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI	NO X	60. No. de Folios	0	61. Fecha	2025 - 02 - 17 / 09 : 15: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN
965. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



Certificado de Cuenta

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A., NIT: 901658107

Nombre
Emmanuel Brian Guerra Pinilla

Identificación
Cédula de ciudadanía: 1023937029

Cuenta de ahorros
Número de cuenta: 71538670

Estado
Activa

Cliente desde
20 de agosto de 2024

Esta certificación fue expedida el 24 de febrero de 2025 a solicitud del titular.

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A. asegura la autenticidad de la información aquí contenida y el uso correcto de acuerdo al reglamento de la Cuenta de Ahorros Nu.

Equipo Nu.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023937029		GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO	CALLE 1 1-1	SOGAMOSO-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-08	2025-09	1850328781	9493197578	E	2025/09/08	2025/10/14	BANCOLOMBIA	36	$60,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,400	$700	$0	$31,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$30,400	$700	$0	$31,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$300	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,300	$300	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$200	$0	$7,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$7,600	$200	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$200	$0	$7,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,600	$200	$0	$7,800
TOTAL				1	$58,900	$1,400	$0	$60,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023937029		GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN	A 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO	CALLE 1 1-1	SOGAMOSO-BOYACA	7719215	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-08	2025-09	1850328781	9493192576		2025/09/08	2025/10/14	BANCOLOMBIA	36	$60,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 9497449	PINILLA DELGADO MIGUEL ANGEL	X	X															230301	24	$189,800	$530,400	EPS041	24	$189,800	$7,600	CCF10	24	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	SI	$558,900
Total Afiliados(1)																					$189,800	$530,400			$189,800	$7,600			$189,800	$7,600			$189,800	$13,300		$0	$0		$58,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023937029		GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO	CALLE 1 1 1	SOGAMOSO-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-07	2025-08	1850323281	94931974611	E	2025/08/11	2025/10/14	BANCOLOMBIA	64	$168,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$3,400	$0	$87,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$83,600	$3,400	$0	$87,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$1,500	$0	$37,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,400	$1,500	$0	$37,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$900	$0	$21,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$20,900	$900	$0	$21,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$900	$0	$21,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$20,900	$900	$0	$21,800
TOTAL				1	$161,800	$6,700	$0	$168,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023937029		GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO	CALLE 1 # 1	SOGAMOSO-BOYACA	7719215	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1850323281	94931974610	E	2025/08/11	2025/10/14	BANCOLOMBIA	64	$168,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 9497449	PINILLA DELGADO MIGUEL ANGEL	X	23030	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
Total	Afiliados(1)					$521,950	$83,600			$521,950	$20,900			$521,950	$20,900			$521,950	$36,400		$0	$0		$161,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7777358

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA	
No.	143972673

FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	10	2025
FECHA VENCIMIENTO		
06	10	2025

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador EMMANUEL BRIAN **NIT o C.C.** 1023937029

Dirección CL 5 25A 36 **Teléfono** +57,312

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 40,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 40,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7777358(3900)000000040000(96)20251006

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 143972673

Ciudad	D	M	A	NIT 1023937029	Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: EMMANUEL BRIAN

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7777358

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 143972673		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	10	2025
FECHA VENCIMIENTO		
06	10	2025

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador EMMANUEL BRIAN **NIT o C.C.** 1023937029

Dirección CL 5 25A 36 **Teléfono** +57,312

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 40,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 40,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7777358(3900)000000040000(96)20251006

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 143972673

Ciudad	D	M	A	NIT 1023937029	Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: EMMANUEL BRIAN

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO
