CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE AGOSTO DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA

INFORME MENSUAL

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO 2025

CONTRATO No. 2017 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2

CONSORCIO VÍAS NACIONALES

CUBARA – BOYACA

AGOSTO 2025

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1 Localización 5

2.1.1 Ruta 6604 Sector LA LEJÍA - SARAVENA, PR 31+0000 (EL AMARILLÓN) – PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS). LOTE 6. 5

2.1.1.1 Criterio Técnico 5

2.1.2 Ruta 6604 Sector PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) – PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA). LOTE 4 6

2.1.2.1 Criterio Técnico 6

2.1.3 Ruta 6604 Sector PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5 6

2.1.3.1 Criterio Técnico 6

2.1.4 Ruta 6604 Sector PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). LOTE 7 6

2.1.4.1 Criterio Técnico 7

3. NECESIDADES DE LA VÍA 8

4. PUNTOS CRITICOS DE LA VIA 9

5. NECESIDADES DE LOS PUENTES 12

6. ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 04 14

7. COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA – SARAVENA 15

7.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - COOTRASERMULPAC 15

7.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA 16

7.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB 17

7.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB 18

8.0 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL 19

9.0 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 23

9.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION – COOTRASERMULPAC 23

9.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA 25

9.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB 27

9.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB 28

10. APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 31

18. CAPACITACIONES A COOPERATIVAS 32

19. EMERGENCIAS 33

20. REGISTRO FOTOGRÁFICO ADMINISTRACIÓN VIAL 35

21. REGISTRO FOTOGRÁFICO COOPERATIVAS 36

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías, mediante concurso de méritos No. CMA-DEO-SGI139-2023, del cual se deriva el Contrato No. 2017 de 2024 y cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 2. Con orden de inicio del cuatro (04) de julio 2024 y fecha de terminación de veintinueve meses y no podrá exceder el 31 de Julio de 2026; contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

Mediante proceso licitatorio cuyo objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER se establece para las vía 6604, sector El Amarillón PR 31+0000 al PR 61+0000 (Alto de Santa Inés), PR 61+0000 (Alto de Santa Inés) al PR 91+0000 (Alto La Laguna), PR 91+0000 (Alto La Laguna) al PR 121+0000 (Puente Cobaria), PR 121+0000 (Puente Cobaria) al PR 150+0000 (Saravena); por lo cual se suscriben los contratos N.º 3858 DE 2024, 3817 DE 2024, 3838 DE 2024, y 3851 DE 2024 respectivamente.

En el presente Informe, se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, evidenciando el cumplimiento de los compromisos contractuales de la Administración Vial Grupo 4, establecidas mediante el Contrato 2017 DE 2024.

Asimismo, se evidencia el cumplimiento de las actividades correspondientes a las Cooperativas de Mantenimiento rutinario que se encuentran sobre el corredor vial 6604 La Lejía – Saravena PR 31+0000 al PR 150+0000, y que se encuentran a cargo de esta Administración Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en los Departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, de la siguiente manera:



2.1.1 Ruta 6604 Sector LA LEJÍA - SARAVENA, PR 31+0000 (EL AMARILLÓN) – PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS). LOTE 6.

Este tramo de la vía inicia desde el sector El Amarillón corregimiento de San Bernardo de Bata desde el PR 31+0000 hasta el Alto de Santa Inés PR 61+0000 jurisdicción del Municipio de Toledo, Norte de Santander.

2.1.1.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta de 29,43 km en afirmado y 0,34 en pavimento rígido, inicia en el PR 31+0000, sector de El Amarillón jurisdicción del municipio de Toledo hasta el PR 61+0000 Alto de Santa Inés, el estado de la vía es regular y malo, presenta varios puntos críticos. Presenta ondulaciones, baches, cabeza dura y perdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producidos por las aguas lluvias lo que dificulta el tránsito vehicular.

2.1.2 Ruta 6604 Sector PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) – PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA). LOTE 4

Este tramo de la vía inicia desde el sector Alto de Santa Inés PR 61+0000 hasta el Alto La Laguna PR 91+0000 jurisdicción del Municipio de Toledo, Norte de Santander.

2.1.2.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta en su totalidad 30,66 km en afirmado, inicia en el PR 61+0000, sector Alto de Santa Inés hasta el PR 91+0000 Alto La Laguna, el estado de la vía es regular y malo, presenta varios puntos críticos. Presenta ondulaciones, baches, cabeza dura y perdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producidos por las aguas lluvias lo que dificulta el tránsito vehicular.

2.1.3 Ruta 6604 Sector PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

Este tramo de la vía inicia desde el sector Alto La Laguna PR 91+0000 hasta el Puente Cobaría PR 121+0000, jurisdicción del Municipio de Toledo, Norte de Santander.

2.1.3.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta de 25,07 km en afirmado y 5,02 km en pavimento flexible, inicia en el PR 91+0000, Alto La Laguna hasta el PR 121+0000 Puente Cobaría, el estado de la vía es bueno, regular y malo, presenta varios puntos críticos. Presenta ondulaciones, baches, cabeza dura y perdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producidos por las aguas lluvias lo que dificulta el tránsito vehicular.

2.1.4 Ruta 6604 Sector PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). LOTE 7

Este tramo de la vía inicia desde el sector Puente Cobaría PR 121+0000 hasta el PR 150+0000 Saravena, jurisdicción de los municipios de Cubara, Boyacá y Saravena, Arauca.

2.1.4.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta de 28,76 km pavimento flexible y 0,78 en afirmado, inicia en el PR 121+0000, Puente Cobaría hasta el PR 150+0000 Saravena, el estado de la vía en su gran mayoría es bueno con un tramo en estado malo.

3. NECESIDADES DE LA VÍA

- PR 31+0000 al PR 86+0000: Construcción de alcantarillas, aliviaderos y obras complementarias
- PR 31+0000 al PR 102+0000: Conformación y colocación de afirmado
- PR 37+0970 al PR 38+0070: Mejoramiento de la variante de 120 m y obras complementarias
- PR 34+0800 al PR 35+0800: Construcción de aliviaderos
- PR 85+0000 al PR 86+0000: Rectificación del cauce y protección de orillas
- PR 115+0800 al PR 139+0976: Mejoramiento y mantenimiento de tramos pavimentados y sin pavimentar
- PR 31+0000 al PR 121+0000: Retiro de derrumbes y rocas

4. PUNTOS CRITICOS DE LA VIA

- PR 32+0449 al PR 32+0456: Construcción de muro de contención L= 7m H= 3,5m
- PR 34+0915 al PR 35+0100: Construcción de variante y estabilización de deslizamiento en masa
- PR 36+0248 al PR 36+0298: Construcción de muro de contención H=5 m y L=50 m y filtros
- PR 38+0400 al PR 38+0800: Ampliación de la banca y obras complementarias
- PR 39+0550 al PR 39+0630: Ampliación de vía, construcción de muro reforzado y obras de arte en una longitud aprox. de 80 m
- PR 41+0245 al PR 41+0450: Ampliación de la banca y obras complementarias barranco blanco
- PR 41+0900 al PR 41+0955: Estabilización mediante muro en gaviones, trincheras drenantes, filtros y cunetas
- PR 44+0970 al PR 45+0030: Estabilización mediante variante, muro en gaviones, trincheras drenantes, filtros y cunetas
- PR 45+0420 al PR 45+0445: Construcción de muro reforzado l=25.00 y h=4.00 m, filtros
- PR 45+0600 al PR 45+0625: Construcción de muro reforzado l=25.00 y h=4.00 m
- PR 47+0400 al PR 47+0410: Construcción de muro reforzado l=10.00 y h=4.00 m
- PR 47+0500 al PR 47+0540: Construcción de muro reforzado l=40.00 y h=4.00 m
- PR 47+0930 al PR 47+0940: Construcción de muro reforzado l=10,0 y h=4.00 m y ampliación
- PR 51+0000 al PR 51+0010: Construcción de muro reforzado l=10.00 y h=4.00 m
- PR 53+0280 al PR 53+0300: Construcción de muro h=3,50 y l=20,00
- PR 54+0063 al PR 54+0113: Construcción de muro H=4 Y L=50,00 m y ampliación
- PR 59+0500 al PR 59+0530: Construcción de muro H=4,00 Y L=30,00 - Sector Santa Inés
- PR 61+0230 al PR 61+0240: Construcción de muro H=3,00 Y L=10,00 y aliviadero
- PR 62+0600 al PR 62+0612: Construcción de muro en concreto H=3,00 Mts Y L=12,00 M
- PR 63+0379 al PR 63+0388: Construcción de muro de H=3,00 m Y L=9,00 y alcantarilla.
- PR 64+0740 al PR 64+0953: Construcción de Box Coulvert De 3 X 2 m
- PR 66+0448 al PR 66+0468: Construcción muro L=20,0 m H=4,0 y obra de arte
- PR 67+0630 al PR 67+0670: Construcción de muro de contención H=4,00 m y L=40,00m

- PR 71+0100 al PR 71+0115: Construcción de muro de concreto H=3,50 Y L=15,00 m y alcantarilla, Sector La Virgen
- PR 73+0260 al PR 73+0275: Construcción de muro de concreto H=3,50 Y L=15,00 m, Sector La Virgen
- PR 77+0500 al PR 77+0510: Construcción de muro reforzado L=10.00 y H=4.00 m
- PR 83+0197 al PR 83+0203: Construcción muro de contención l=6 mts. h=5 mts
- PR 83+0500 al PR 83+0510: Construcción de muro de concreto H=4 m y L=10 m y gaviones
- PR 84+0136 al PR 84+0156: Construcción de muro de concreto H=5 m Y L=20 m, construcción de cabezote
- PR 84+0160 al PR 84+0200: Construcción de muros de concreto reforzado H= 5 m
- PR 84+0600 al PR 84+0637: Construcción de muro de contención L= 37 mts, H= 6mts
- PR 85+0128 al PR 85+0133: Construcción de Box Coulvert de 3 X 2 m., Sector Rio Negro
- PR 85+0900 al PR 85+0970: Construcción de muro de contención sobre Caisson H=8,00 m y L=70,00 - Sector Rio Negro
- PR 86+0242 al PR 86+0250: Construcción de Box Coulvert 1,5x1,5 Mts
- PR 86+0600 al PR 86+0650: Construcción de muro de contención sobre Caisson H=8,00 m Y L=50,00 - Sector Rio Negro
- PR 87+0700 al PR 87+0800: Construcción de muro de contención H=2,5 m Y L=15 m Filtros y cuneta canal
- PR 87+0830 al PR 87+0833: Construcción de Box Coulvert De 3 X 2 m y retiro de derrumbe
- PR 88+0060 al PR 88+0070: Construcción de muro de contención H=5 m Y L=10 m y obras complementarias
- PR 89+0250 al PR 89+0272: Construcción de muro sobre Caisson L=22 Mts H= 10 Mts
- PR 89+0500 al PR 89+0550: Construcción de muro de contención H=3 m Y L=50 m y obras complementarias
- PR 90+0750 al PR 90+0795: Construcción de muros de concreto reforzado H= 4 m L=45 m
- PR 90+0825 al PR 90+0875: Construcción de muros de concreto reforzado H= 4 m L=50 m
- PR 92+0900 al PR 92+0925: Construcción de muro de contención H=4 m y L=25 m
- PR 92+0940 al 92+0950: Construcción de muro de contención H=3,5 m Y L=10 m. Prolongación aleta salida
- PR 93+0000 al PR 93+0010: Construcción de muro de contención H=3,5 m y L=10 m Prolongación aleta de salida

- PR 93+0075 al 93+0125: Daño en obras de contención, construcción de muro en concreto reforzado con pilotes
- PR 94+0060 al PR 94+0081: Construcción de muro de contención H= 8mts y L=21mts alcantarilla 36"
- PR 95+0999 al PR 96+0024: Construcción de muro de contención L= 25 Mts, H= 8mts
- PR 96+0060 al PR 96+0076: Construcción de muro de contención L=16 Mts, H=4,50 Mts y alcantarilla 36"
- PR 96+0175 al PR 96+0255: Construcción de muro de contención H=8 m Y L=80 m Ampliación de calzada
- PR 97+0150 al PR 97+0170: Construcción de muro de contención de pata H=8,0 m Y L=20 m
- PR 98+0026 al PR 98+0072: Construcción de muro de contención L=46 Mts, H=3,50 Mts
- PR 104+0850 al PR 105+0450: Construcción de variante y estabilización de deslizamiento en masa
- PR 107+0200 al PR 107+0300: Ampliación, construcción de muro sobre pilotes H=3m y L=100 m
- PR 112+0010 al PR 112+0016: Construcción de muro de contención H=2.5 Mts L= 6 Mts
- PR 113+0600 al PR 113+0763: Construcción de muro de contención sobre pilotes L=163 Mts
- PR 114+0300 al PR 114+0305: Recalce De Box Coulvert, aliviadero y prolongación de aletas de salida
- PR 114+0550 al PR 114+0585: Recuperación banca mediante muro de concreto reforzado L=35 m H=3 m
- PR 114+0890 al PR 114+0916: Muro de contención sobre Caisson H=4.0 Mts L=26.0 Mts
- PR 115+0080 al PR 115+0105: Recuperación banca mediante muro de gaviones L=25 m. H=4 m
- PR 115+0300 al PR 115+0480: Recuperación banca mediante muro de concreto reforzado L=40 m H=6 m, Sector Canoas

5. NECESIDADES DE LOS PUENTES

- **Puente Zambrano PR 34+0150 – PR 34+0223**: Laminas del tablero inestables (sueltas) y presencia de fisuras en elementos estructurales (vigas transversales).
  Es necesario realizar un reforzamiento de elementos estructurales como vigas transversales y realizar el cambio de láminas, tornillos y/o pernos.
- **Puente La Honda PR 50+0910 - 50+0927:** Afectación en elementos estructurales como vigas, exposición del acero de refuerzo, socavación de estribos, barandas en mal estado y ausencia de las mismas en la margen derecha.
  Recalce de estribos, reposición y/o mantenimiento de barandas del puente,
- **Puente Las Palmas PR 84+0874 - 84+0893:** Presenta socavación en una de las aletas y evidencia afectación en la placa.
  Requiere recalce en la aleta y reconstrucción de la placa. Estudio para determinar estado global de la estructura.
- **Puente Rio Negro PR 86+0855 – PR 86+0898:** Deterioro de la losa y de las juntas de expansión, presenta exposición del acero de refuerzo y daños en la baranda de concreto margen derecho.
  Requiere protección de estribos, reposición y/o mantenimiento de juntas de expansión, reparación de losa de concreto.
- **Puente Tamarota PR 98+0110 – PR 98+0128:** Gran fisura en aleta ALI1 y parte del estribo de entrada. Socavación del lecho del afluente cerca a los estribos.
  Requiere reconstrucción de aleta y reforzamiento de estribo. Estudio para determinar condición real de toda la estructura.
- **Puente Ucacias PR 103+0572 - 103+0589:** Presenta socavación en uno de los estribos y se evidencia exposición del acero en la parte inferior de la losa.
  Protección de estribo E2 de salida
- **Puente La China PR 104+0506 – PR 104+0542:** Presenta socavación en uno de los estribos Recalce de estribo y obras complementarias.
- **Puente Cubugón PR 108+0058 – PR 108+0137:** Presenta inestabilidad en el tablero por láminas sueltas y deterioro de las mismas.
  Requiere reposición de láminas y cambio de tornillería y/o pernos
- **Puente Cedeño PR 112+0202 – PR 112+0221:** Presenta daño en la losa perdida de sección y exposición del acero de refuerzo.
  Requiere intervención en la losa de concreto y construcción de aliviaderos en concreto
- **Puente Canoas PR 115+0620 – PR 115+0641:** Presenta socavación en uno de los estribos Requiere recalce estribo y construcción de aliviaderos en concreto reforzado

- **Puente Cobaría PR 121+0182 – PR 121+0313:** Inestabilidad del cauce.
  Requiere protección de las márgenes del rio, sand blasting y pintura metálica.
- **Puente La Balastrera PR 123+0179 – PR 123+0190:** Ausencia de barandas de protección.
  Requiere instalación de barandas de protección.
- **Puente Caño Seco PR 123+0800 – PR 123+0811:** Ausencia de barandas de protección. Requiere instalación de barandas de protección
- **Puente Royota PR 134+0400 – PR 134+0459:** Presenta afectación en épocas de lluvia debido a crecimiento del caudal del rio generando arrastre de material ocasionando desbordamiento del rio. Ausencia de barandas de protección.
  Requiere placas de acceso y encausamiento del rio.
- **Puente Bojaba 1 PR 139+0011 – PR 139+0738:** Presenta erosión en la rivera aguas arriba Construcción de la sección de salida obra definitiva
- **Puente Bojaba 2 PR 139+0976 – PR 139+1056:** Presenta erosión en la rivera aguas arriba Construcción de protección en muro en gaviones
- **Puente Caño Negro PR 139+1360 – PR 139+1400:** Puente metálico provisional instalado por parte del Ejercito Nacional.
  Requiere construcción de puente de aproximadamente 35 metros
- **Puente Caño Picho PR 143+0483 – PR 143+0496:** Ausencia de barandas de protección Requiere instalación de barandas de protección
- **Puente La Pava PR 149+0952 – PR 149+0990:** Presenta erosión.
  Requiere protección de estribos y encauzamiento de quebrada

6. ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 04

CONTRATO N°: 2017 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 2.

NIT: 901.838.197-8

VALOR: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: PAULA VANESA FLOREZ SANZON

Nombre
Juan Manuel Rojas Carrillo – Ingeniero Residente
Gersón Javier Buitrago Paéz – Ingeniero Auxiliar I
Sandra Carolina Moreno Carvajal – Ingeniero Auxiliar II
Ana Xiomara Fuentes Arteaga - Inspector SISO
Mireya Silva Martínez - Auxiliar Administrativo
Franklin Erik Martínez Ortiz - Conductor I
Luis David Aponte Silva - Conductor II

7. COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA – SARAVENA

7.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - COOTRASERMULPAC

CONTRATO N°: 3858 DE 2024

OBJETO: SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 31+0000 (EL AMARILLÓN) – PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS). LOTE 6.

NIT: 807.007.087-1

VALOR: MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($1.115.032.636) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Rivero Gutiérrez

Nombre
HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ
JESUS GELVEZ CONTRERAS
JUAN ANTONIO GRANADOS SANTAFE
JOSE ARNULFO BECERRA GONZALEZ
YEISON BAUNEY DURAN BARAJAS
OSMAN RENE CONTRERAS
HUGO ALIRIO RAMON
YAMID ALBEIRO RAMIREZ RAMIREZ
ARNULFO ORTIZ CAICEDO
VICTOR MANUEL CACERES GONZALEZ
HUGO CELSO JIMENEZ CAMARGO

7.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA

CONTRATO N°: 3817 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA). LOTE 4

NIT: 807.008.112-0

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.144.279.227) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Rubiel Rincón Jaimes

Nombre
SANTOS RINCON CACERES
CIPRIANO VARGAS RANGEL
GABRIEL JAIMES SUAREZ
MANUEL BUSTOS SANTOS
ARMANDO AGUILLON JAIMES
LUIS FRANCISCO AGUILLON RINCON
JOSE RAFAEL CADENA
JOSE ALEXANDER SANTAFE PARADA
EYBAR ARLEY AGUILLON
GENRY RAMON VALENCIA
ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES

7.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB

CONTRATO N°: 3838 DE 2024

OBJETO: SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

NIT: 807.008.392-6

VALOR: MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.118.745.682) IVA incluido

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: José Ananías Santos Contreras

Nombre
JOSE ANANIAS SANTOS CONTRERAS
CARLOS JULIO ANGARITA CHIVATA
OSCAR PEREZ VALENCIA
LUIS AMANDO GONZALEZ COBARIA
JORMAN ELADIO SANTOS CONTRERAS
PEDRO RAFAEL LOPEZ VILLAMIZAR
RUBEN DARIO GONZALEZ ALBARRACIN
EDWIN ALBEIRO MENDEZ ANGARITA
FERNANDO CADENA MONTAÑEZ
CARLOS FABIAN ESTUPIÑAN ALBARRACIN
SILVINO BECERRA MONCADA

7.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB

CONTRATO N°: 3851 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). LOTE 7

NIT: 826.003.402-8

VALOR: MIL NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.091.808.300) IVA INCLUIDO

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL: Elgar Gamboa Jaimes

Nombre
ELGAR GAMBOA JAIMES
ALFREDO BECERRA MONTERREY
ELKIN MICHEL SANTAMARIA CHIVATA
JESUS MARIA CASTRO BOTIA
ALVARO BARROSO DUARTE
JESUS ANTONIO CRUZ VARGAS
MISAEL REINA GODOY
REINALDO ANGARITA
RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ
GEISSON ALEXANDER LASSO CHAVEZ
CARMEN JANNET RIVERO MALDONADO

8.0 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL

- **Semana: 01 al 03 de agosto de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 28 de julio al 03 de agosto de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se continua con el diligenciamiento de información correspondiente para la evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial para iRAP.
6. Se radica oficio AMV4-VNC2017-177-25, con asunto: INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2025
7. Se realiza recorrido de inspección al PR 84+0874 Puente Las Palmas, por fuerte socavación en la cimentación del estribo y aletas de entrada.
8. Se realiza visita a la Inspección de policía del Corregimiento de Samoré, Toledo, Norte de Santander.
9. Se realiza recorrido de inspección al PR 108+0058 Puente Cubugón, para revisar estado de las láminas que componen la losa del puente
10. Se realiza seguimiento a las obras ejecutadas por el Consorcio Vías Colombia 063 en la construcción del Puente Bojaba PR 139+0011
11. Se realiza recorrido de inspección al PR 111+0780, para verificar obras realizadas por la empresa CENIT
12. Se realiza recorrido de inspección a obras de drenaje transversal que requieren ser construidas nuevamente PR 85+0100, PR 66+0450, PR 108+0070

- **Semana: 04 al 10 de agosto de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.

2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 04 de agosto al 10 de agosto de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se continua con el diligenciamiento de información correspondiente para la evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial para iRAP.
6. Se radica oficio AMV4-VNC2017-179-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de julio 2025, Corregimiento de San Bernardo de Batá, Toledo, Norte de Santander
7. Se radica oficio AMV4-VNC2017-180-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de julio 2025, Corregimiento de Gibraltar, Toledo, Norte de Santander
8. Se radica oficio AMV4-VNC2017-181-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de julio 2025, Corregimiento de Samoré, Toledo, Norte de Santander
9. Se radica oficio AMV4-VNC2017-182-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de julio 2025, Cubará, Boyacá
10. Se radica oficio AMV4-VNC2017-183-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de julio 2025, Saravena, Arauca
11. Se radica oficio AMV4-VNC2017-184-25, con asunto: Respuesta a solicitud de apoyo para dar respuesta a un derecho de petición en referencia a la vía La Soberanía – Vía Nacional 6604 La Lejía – Saravena, Sector El Amarillón – Saravena PR 31+0000 al PR 150+0000
12. Se radica Acta de Cobro No. 13 correspondiente al mes de julio de 2025 de la Administración Vial Grupo 04
13. Se radica oficio AMV4-VNC2017-186-25, con asunto: Entrega de Informe Mensual de Avance de Trabajo Administración Vial 04 correspondiente al mes de julio de 2025 – Vía 6604 La Lejía - Saravena.
14. Se radica oficio AMV4-VNC2017-187-25, con asunto: Entrega de Informe de Rendimientos de las Actividades de Servicio de Mantenimiento Rutinario del mes de julio de 2025
15. Se realiza solicitud de aprobación de insumos para el PR 84+0874, PR 143+0483 de la Vía 6604 La Lejía - Saravena AMV G04
16. Se atiende emergencia presentada el día 04/08/2025, en el PR 38+0500, por caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía.

17. Se atiende emergencia presentada el día 10/08/2025, en el PR 38+0500, por caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía.

- **Semana: 11 al 17 de agosto de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se realiza envío de información correspondiente para la evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial para iRAP.
6. Se atiende emergencia presentada el día 11/08/2025, en el PR 38+0500, por caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía.
7. Se radica oficio AMV4-VNC2017-189-25, con asunto: ESTADO DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL – VIA NACIONAL 6604 LA LEJÍA – SARAVENA, SECTOR EL AMARILLON – SARAVENA PR 31+0000 AL PR 150+0000
8. Se envía Informe de Invasión Franja de Retiro de la Vía Nacional 6604 LA LEJÍA – SARAVENA, SECTOR EL AMARILLON – SARAVENA PR 31+0000 AL PR 150+0000
9. Se realiza visita al PR 38+0500 con participación de Gestión Social del Consorcio Vías Colombia 063 e Interventoría para evaluar condiciones del propietario del predio y permiso de ingreso para intervenir en el sector.

- **Semana: 18 al 24 de agosto de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:

3. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
4. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025.
5. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
6. Se realiza actualización de Ficha PMO agosto de 2025 AMV 04
7. Se participa de manera virtual en la mesa de trabajo de socialización componente – rendimientos Contrato 4040-2024 revisión, validación, verificación de APUs y sus componentes según normas de construcción vigentes.
8. Se realiza la Capacitación a las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario correspondiente al mes de agosto de 2025

- **Semana: 25 al 31 de agosto de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se radica oficio AMV4-VNC2017-193-25, con asunto: Evidencia Capacitaciones – Cooperativas de Mantenimiento rutinario del mes de agosto de 2025
6. Se radica oficio AMV4-VNC2017-194-25, e Informe de accidentalidad del mes de julio de 2025
7. Se participa en reunión con Interventoría del Contrato 988 de 2021 y comunidad para tratar temas de participación en proyectos sociales.

9.0 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

9.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION – COOTRASERMULPAC

- **Semana: 01 al 03 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 38+0900 al PR 41+0000
2. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 38+0900 al PR 41+0030
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 38+0900 al PR 40+0300
4. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 38+0900 al PR 40+0300
5. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 04 al 10 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 43+0600 al PR 51+0000
2. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 43+0600 al PR 51+0000
3. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 50+0900 al PR 61+0000
4. Se realiza atención de emergencias en el PR 38+0500
5. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 11 al 17 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 42+0000 al PR 43+0400
2. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 36+0700 al PR 43+0400
3. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 52+0900 al PR 60+0000

4. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 42+0000 al PR 43+0400
5. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 38+0350 al PR 41+0500
6. Se realiza atención de emergencias en el PR 38+0500
7. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 18 al 24 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 34+0280 al PR 40+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 31+0000 al PR 40+0000
3. Se realizan actividades de limpieza de barandas entre el PR 34+0700 al PR 36+0200
4. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 25 al 31 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 31+0800 al PR 38+0850
2. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 32+0500 al PR 34+0300
3. Se realiza atención de emergencias en el PR 38+0500
4. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

9.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA

- **Semana: 01 al 03 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 66+0000 al PR 68+0050
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 66+0000 al PR 66+0450
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 65+0980 al PR 68+0880
4. Se realizan actividades de rocería entre el PR 78+0000 al PR 79+0100
5. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 66+0000 al PR 67+0000
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 04 al 10 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 69+0300 al PR 69+0600
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 69+0300 al PR 69+0600
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 68+0000 al PR 69+0600
4. Se realizan actividades de limpieza y ornato en el centro poblado de la Meza PR 82+0200, municipio de Toledo, Norte de Santander
5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 11 al 17 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 69+0000 al PR 80+0500
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 71+0000 al PR 80+0500
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 69+0000 al PR 80+0500

4. Se realizan actividades de limpieza de calzada entre el PR 69+0000 al PR 69+0750
5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 18 al 24 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0080 al PR 82+0700
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 66+0450 al PR 72+0350
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 66+0450 al PR 82+0700
4. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 25 al 31 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 70+0000 al PR 86+0900
2. Se realizan actividades de limpieza de calzada entre el PR 70+000 al PR 70+0200
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 78+0000 al PR 78+0700
4. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 70+0000 al PR 91+0000
5. Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre el PR 68+0000 al PR 73+0000
6. Se realizan actividades de rocería entre el PR 90+0000 al PR 91+0000
7. Se realizan actividades de limpieza de puentes entre el PR 86+0000 al PR 86+0900
8. Se realiza atención de emergencias entre el PR 70+0000 al PR 70+0200
9. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

9.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB

- **Semana: 01 al 03 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 91+0175 al PR 115+0500
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 91+0175 al PR 115+0500
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 114+0850 al PR 115+0500
4. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 91+0175 al PR 115+0785
5. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles en el PR 92+0260
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 04 al 10 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 92+0850 al PR 94+0900
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 92+0850 al PR 94+0900
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 94+0941 al PR 95+0500
4. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 92+0600 al PR 94+0900
5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 11 al 17 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 96+0615 al PR 105+0920
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 92+0850 al PR 94+0900
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 94+0941 al PR 95+0500
4. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 96+0615 al PR 105+0920

5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 18 al 24 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 98+0780 al PR 100+0370
2. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 116+0070 al PR 117+0270
3. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 98+0930 al PR 117+0270
4. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 25 al 31 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 111+0940 al PR 118+0360
2. Se realizan actividades de despeje de derrumbes en el PR 110+0250
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 114+0470 al 114+0715
4. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el 111+0940 al PR 118+0360
5. Actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 112+0000 al PR 115+0000
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

9.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB

- **Semana: 01 al 03 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 127+0600 al PR 130+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 127+0565 al PR 131+0000
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 129+0420 al PR 132+0000
4. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 131+0290 al PR 132+0000

5. Se realizan actividades de rocería entre el PR 127+0090 al PR 132+0000
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 04 al 10 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 132+0815 al PR 136+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 132+0410 al PR 135+0000
3. Se realizan actividades de limpieza de calzada entre el PR 140+0500 al PR 144+0000
4. Se realizan actividades de rocería entre el PR 137+0000 al PR 140+0000
5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 11 al 17 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 140+0000 al PR 142+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 140+0950 al PR 150+0000
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 147+0170 al PR 150+0000
4. Se realizan actividades de limpieza de calzada entre el PR 140+0480 al PR 142+0000
5. Se realizan actividades de rocería entre el PR 149+0500 al PR 150+0000
6. Se realizan actividades de limpieza de puentes y pontones entre el PR 149+0960 al PR 150+0000
7. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 18 al 24 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 122+0000 al PR 125+0100
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 121+0100 al PR 124+0995
3. Se realizan actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 121+0000 al PR 121+0600
4. Se realizan actividades de limpieza de barandas entre el PR 121+0036 al PR 121+0325

5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 25 al 31 de agosto de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 127+0450 al PR 129+0600
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 125+0000 al PR 129+0900
3. Se realizan actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 121+0782 al PR 124+0555
4. Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre el 122+0121 al PR 124+0555
5. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el 134+0800 al PR 134+0850
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

10. APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Contrato No: 981 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATISTA: Consorcio Vías Colombia 063

PLAZO: 09 AÑOS

FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2021

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de agosto de 2030

VALOR DEL CONTRATO: 3.891.745.634,14


18. CAPACITACIONES A COOPERATIVAS

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

ASISTENCIA

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

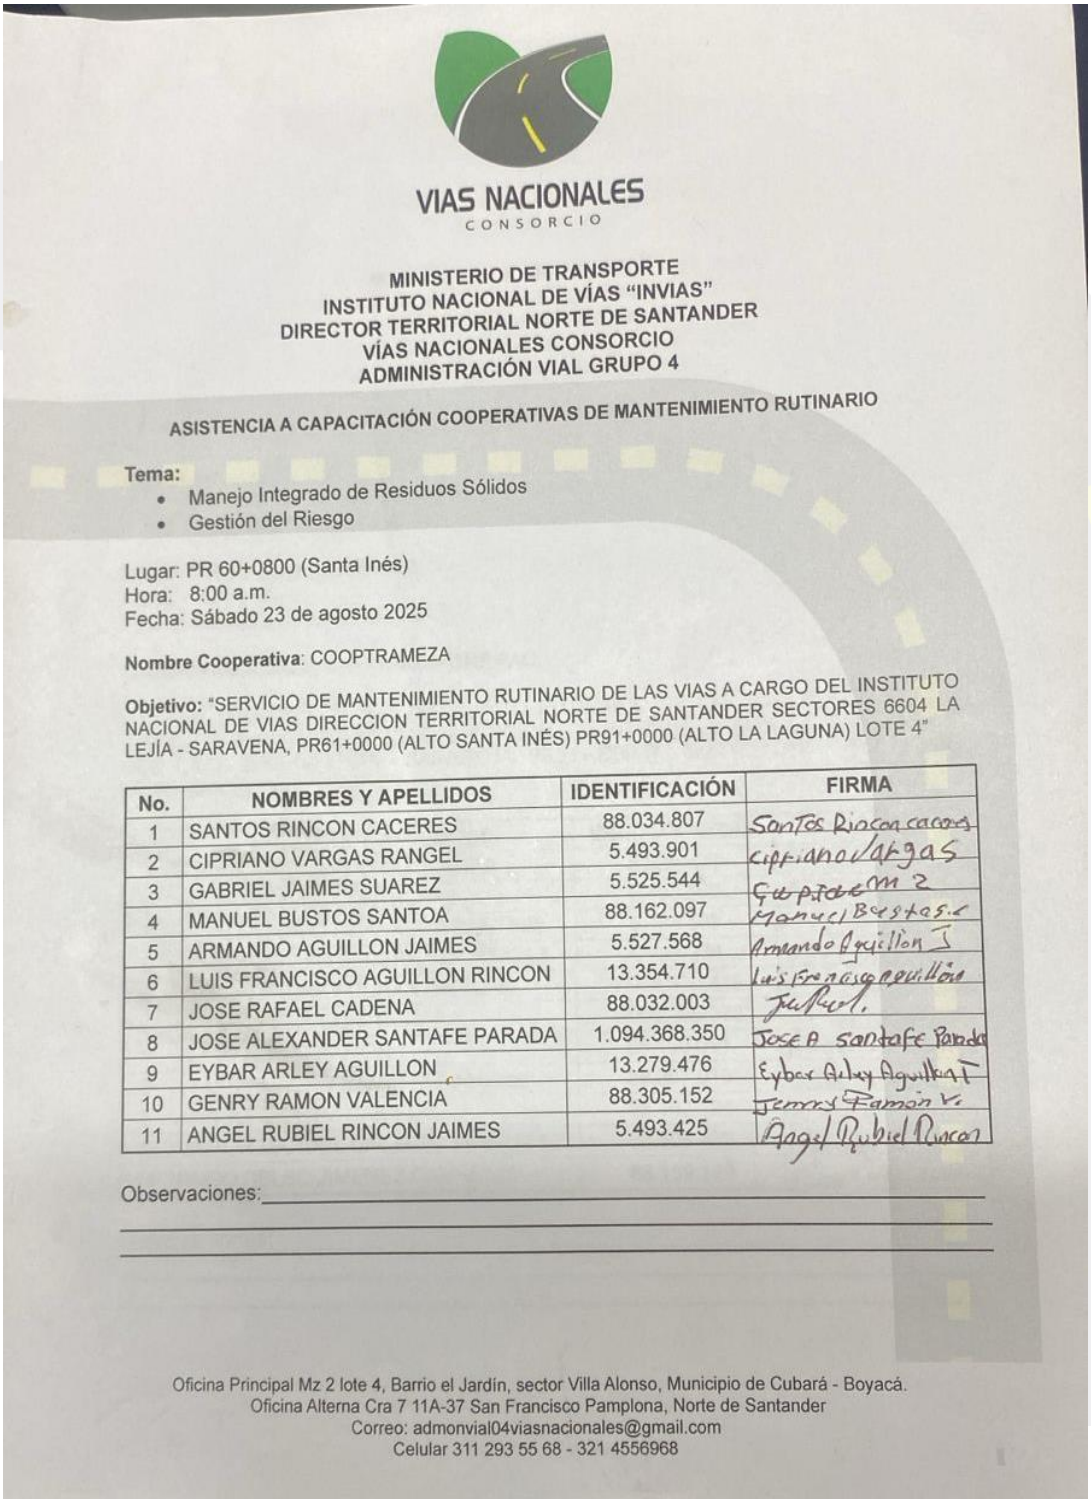

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:

- Manejo Integrado de Residuos Sólidos
- Gestión del Riesgo

Lugar: PR 60+0800 (Santa Inés)
Hora: 8:00 a.m.
Fecha: Sábado 23 de agosto 2025

Nombre Cooperativa: COOPTRAMEZA

Objetivo: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) LOTE 4"


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	SANTOS RINCON CACERES	88.034.807	Santos Rincon caceres
2	CIPRIANO VARGAS RANGEL	5.493.901	cipriano Vargas
3	GABRIEL JAIMES SUAREZ	5.525.544	Gabriel M 2
4	MANUEL BUSTOS SANTOA	88.162.097	Manuel Bustos S.
5	ARMANDO AGUILLON JAIMES	5.527.568	Armando Aguillon J
6	LUIS FRANCISCO AGUILLON RINCON	13.354.710	Luis Francisco Aguillon
7	JOSE RAFAEL CADENA	88.032.003	
8	JOSE ALEXANDER SANTAFE PARADA	1.094.368.350	Jose A Santafe Parada
9	EYBAR ARLEY AGUILLON	13.279.476	Eybar Arley Aguillon T
10	GENRY RAMON VALENCIA	88.305.152	Jenry Ramon V.
11	ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES	5.493.425	Angel Rubiel Rincon

Observaciones: _____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

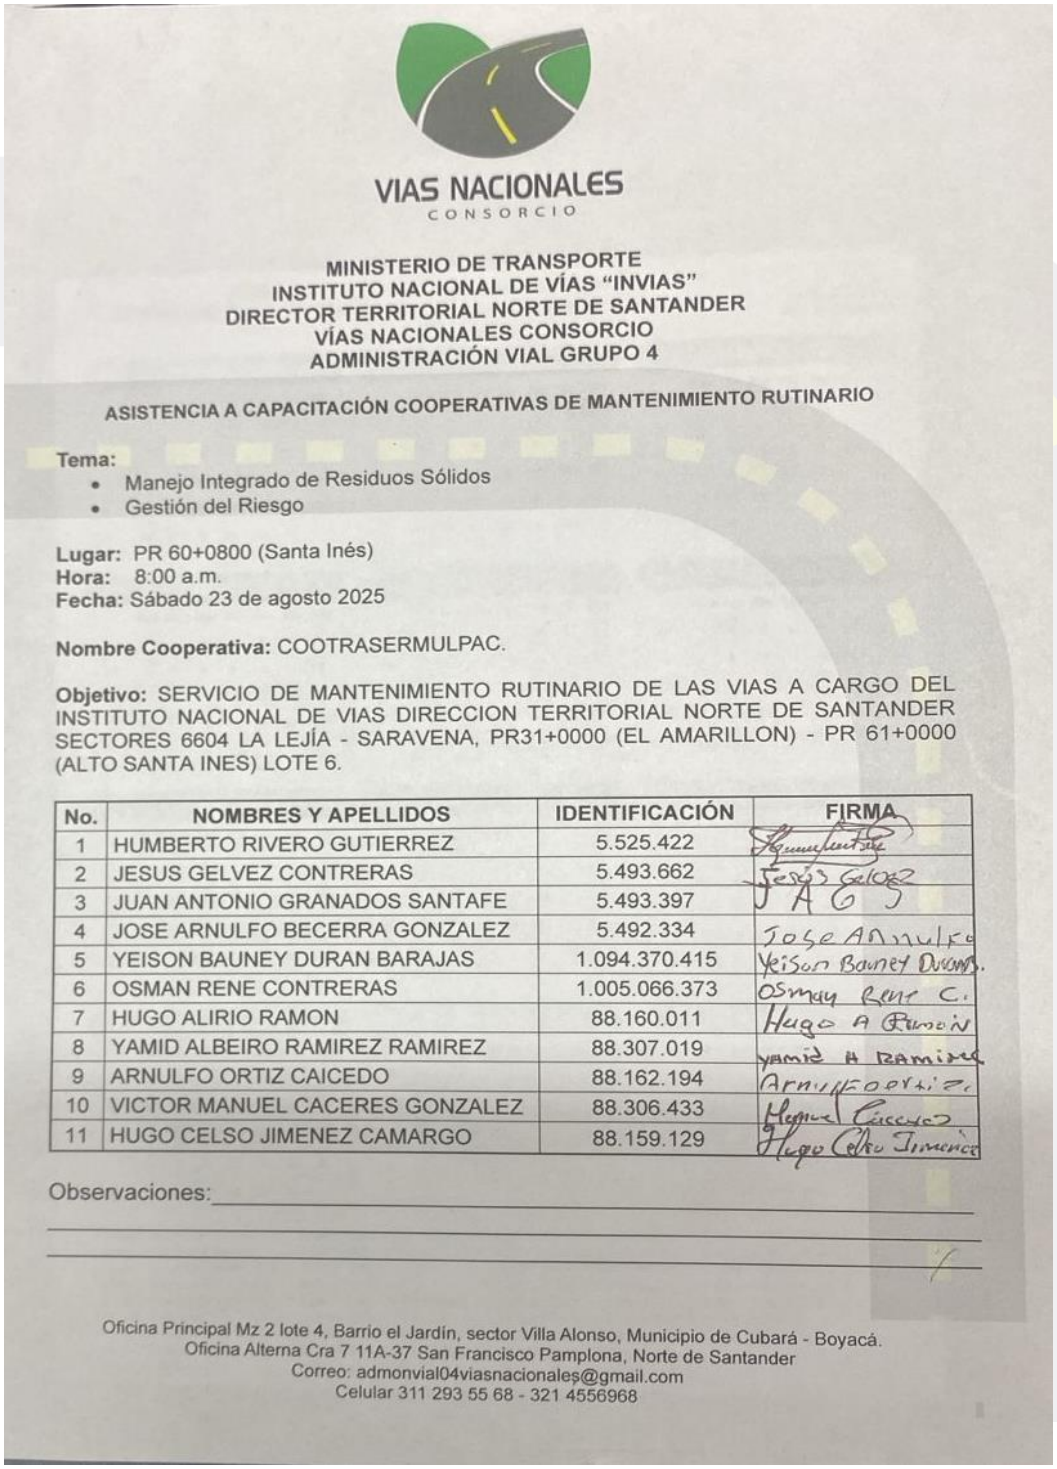

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:
- Manejo Integrado de Residuos Sólidos
- Gestión del Riesgo

Lugar: PR 60+0800 (Santa Inés)
Hora: 8:00 a.m.
Fecha: Sábado 23 de agosto 2025

Nombre Cooperativa: COOTRASERMULPAC.

Objetivo: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INES) LOTE 6.


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ	5.525.422	
2	JESUS GELVEZ CONTRERAS	5.493.662	
3	JUAN ANTONIO GRANADOS SANTAFE	5.493.397	
4	JOSE ARNULFO BECERRA GONZALEZ	5.492.334	
5	YEISON BAUNEY DURAN BARAJAS	1.094.370.415	
6	OSMAN RENE CONTRERAS	1.005.066.373	
7	HUGO ALIRIO RAMON	88.160.011	
8	YAMID ALBEIRO RAMIREZ RAMIREZ	88.307.019	
9	ARNULFO ORTIZ CAICEDO	88.162.194	
10	VICTOR MANUEL CACERES GONZALEZ	88.306.433	
11	HUGO CELSO JIMENEZ CAMARGO	88.159.129	

Observaciones: _____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

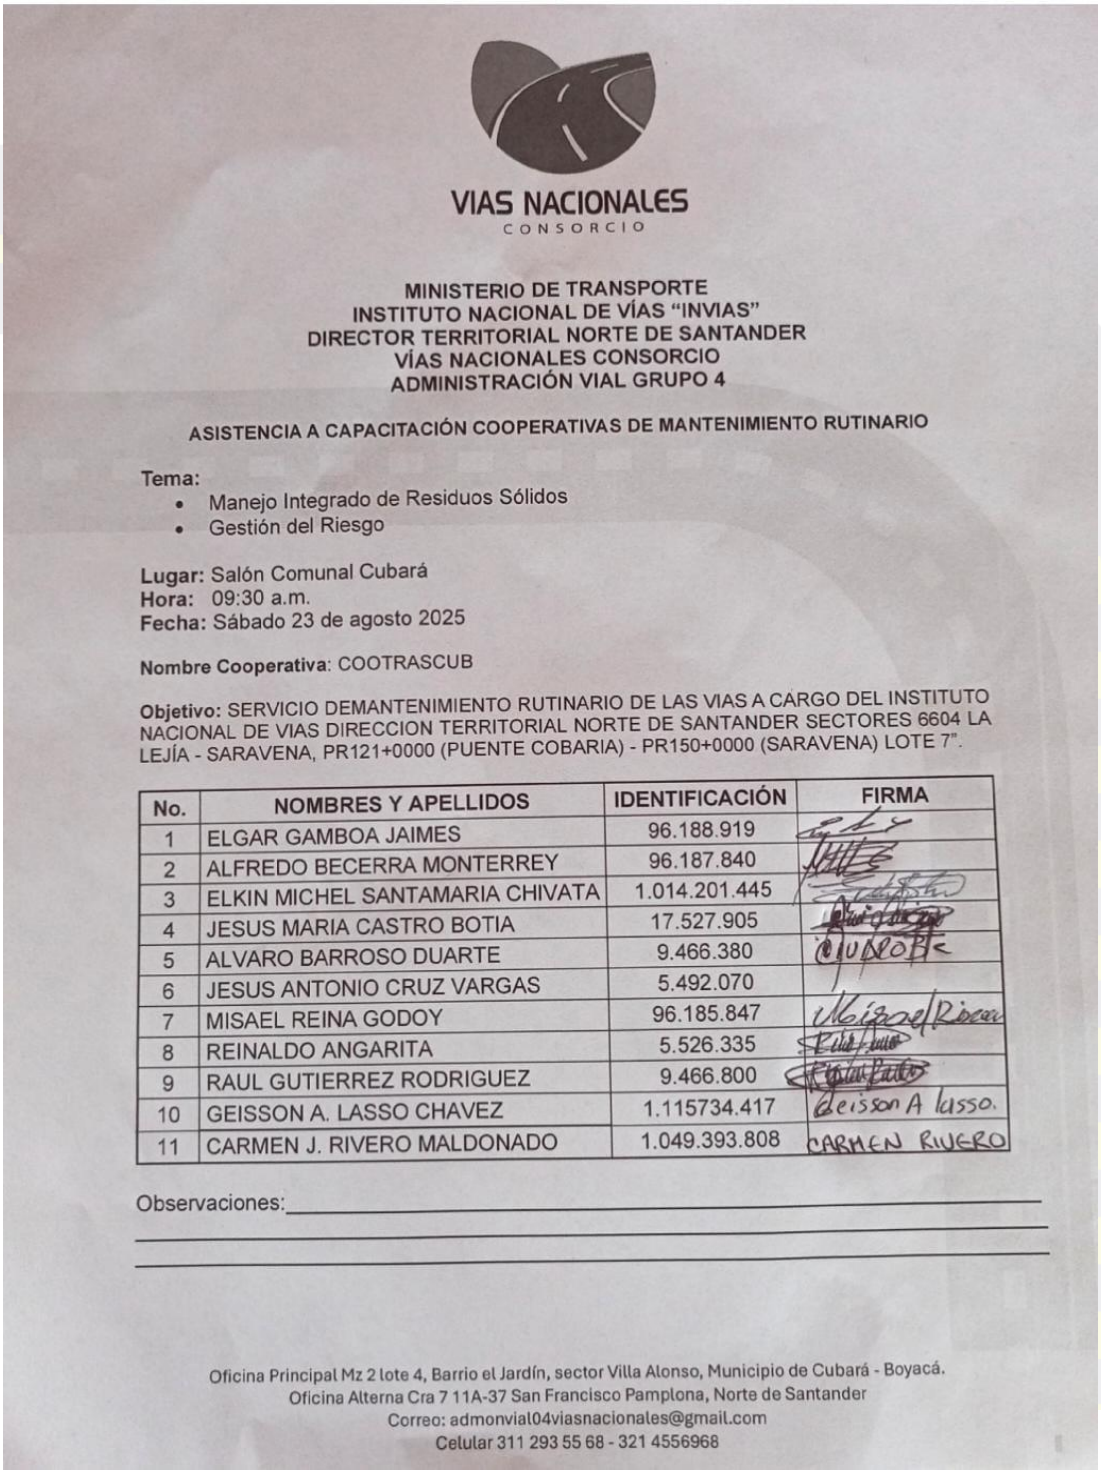

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:
- Manejo Integrado de Residuos Sólidos
- Gestión del Riesgo

Lugar: Salón Comunal Cubará
Hora: 09:30 a.m.
Fecha: Sábado 23 de agosto 2025

Nombre Cooperativa: COOTRASCUB

Objetivo: SERVICIO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA) LOTE 7".

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	ELGAR GAMBOA JAIMES	96.188.919	
2	ALFREDO BECERRA MONTERREY	96.187.840	
3	ELKIN MICHEL SANTAMARIA CHIVATA	1.014.201.445	
4	JESUS MARIA CASTRO BOTIA	17.527.905	
5	ALVARO BARROSO DUARTE	9.466.380	
6	JESUS ANTONIO CRUZ VARGAS	5.492.070	
7	MISAEL REINA GODOY	96.185.847	
8	REINALDO ANGARITA	5.526.335	
9	RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ	9.466.800	
10	GEISSON A. LASSO CHAVEZ	1.115734.417	Geisson A lasso.
11	CARMEN J. RIVERO MALDONADO	1.049.393.808	CARMEN RIVERO

Observaciones:_____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:
- Manejo Integrado de Residuos Sólidos
- Gestión del Riesgo

Lugar: Salón Comunal Cubará
Hora: 09:30 a.m.
Fecha: Sábado 23 de agosto 2025

Nombre Cooperativa: COOTRASERMULGIB

Objetivo: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5"

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	JOSE A. SANTOS CONTRERAS	1.094.368.327	
2	CARLOS JULIO ANGARITA CHIVATA	9.465.592	
3	OSCAR PEREZ VALENCIA	5.478.212	
4	LUIS AMANDO GONZALEZ COBARIA	5.463.189	
5	JORMAN ELADIO SANTOS C.	1.094.369.603	
6	PEDRO RAFAEL LOPEZ VILLAMIZAR	88.164.661	
7	RUBEN DARIO GONZALEZ A.	1.094.274.016	
8	EDWIN ALBEIRO MENDEZ ANGARITA	1.098.150.563	
9	FERNANDO CADENA MONTAÑEZ	1.094.265.379	
10	CARLOS F. ESTUPIÑAN ALBARRACIN	1.157.452.418	
11	SILVINO BECERRA MONCADA	9.466.521	

Observaciones:_____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER REGISTRO FOTOGRAFICO	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 CONTRATO No 2017 DE 2024

23 de agosto 2025

















Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

TEMAS

- Gestión del Riesgo
- Manejo integrado de residuos sólidos

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

MANUEL HERNANDO ORTIZ
INGENIERO AMBIENTAL


GESTIÓN DEL RIESGO



La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.

VIAS NACIONALES
CONSORCIO



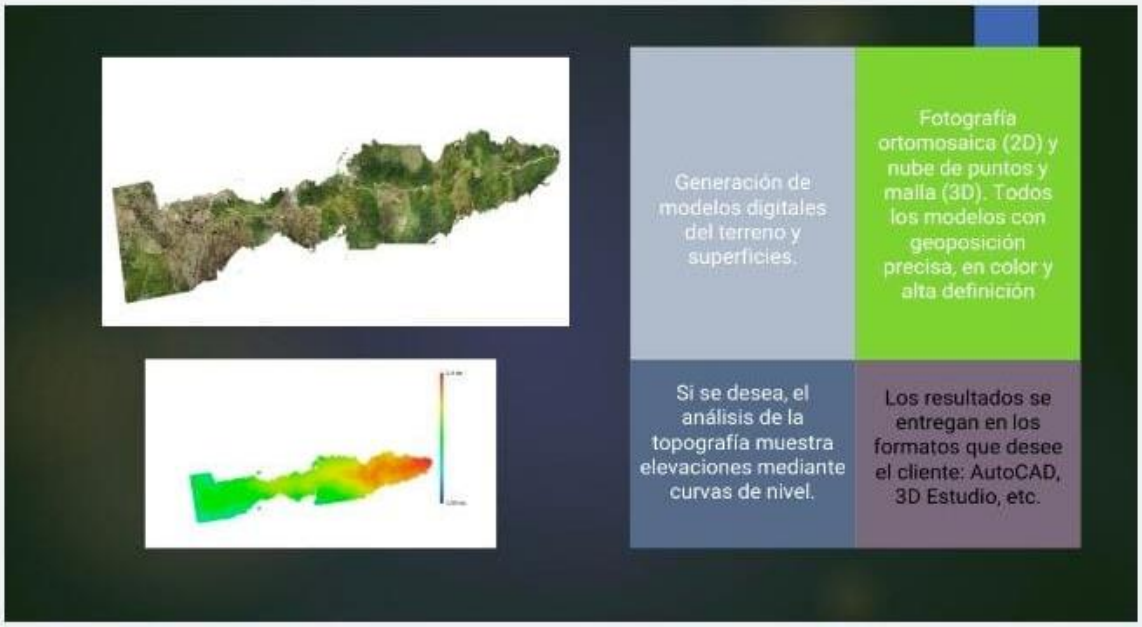

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968


VIAS NACIONALES
CONSORCIO





Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

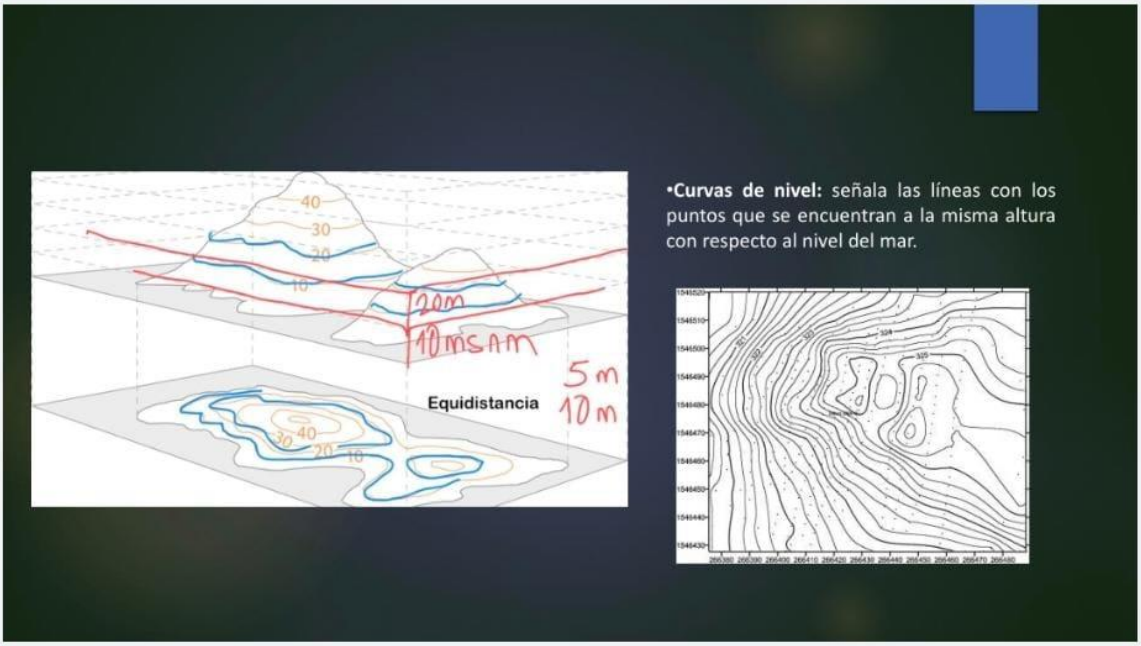

•**Curvas de nivel:** señala las líneas con los puntos que se encuentran a la misma altura con respecto al nivel del mar.



•**Modelo digital de elevaciones (MDE) y modelo digital del terreno (MDT):** aportan información de la superficie terrestre en base a la medición de las elevaciones del terreno.

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO





Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO





Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

¿ PORQUE LAS AMENAZAS NATURALES CAUSAN TANTO IMPACTO ?

Factores tales como:
1- La pobreza,
2- La creciente densidad de la población,
3- La degradación ambiental y
4- El calentamiento global

Están logrando que el impacto
de las amenazas naturales empeore aún más.



Actividades de obra que generan impactos

- Movimiento de tierras
- Manejo inadecuado de RCD
- Desvío de cuerpos de agua
- Tala de arboles






Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO





VIAS NACIONALES
CONSORCIO

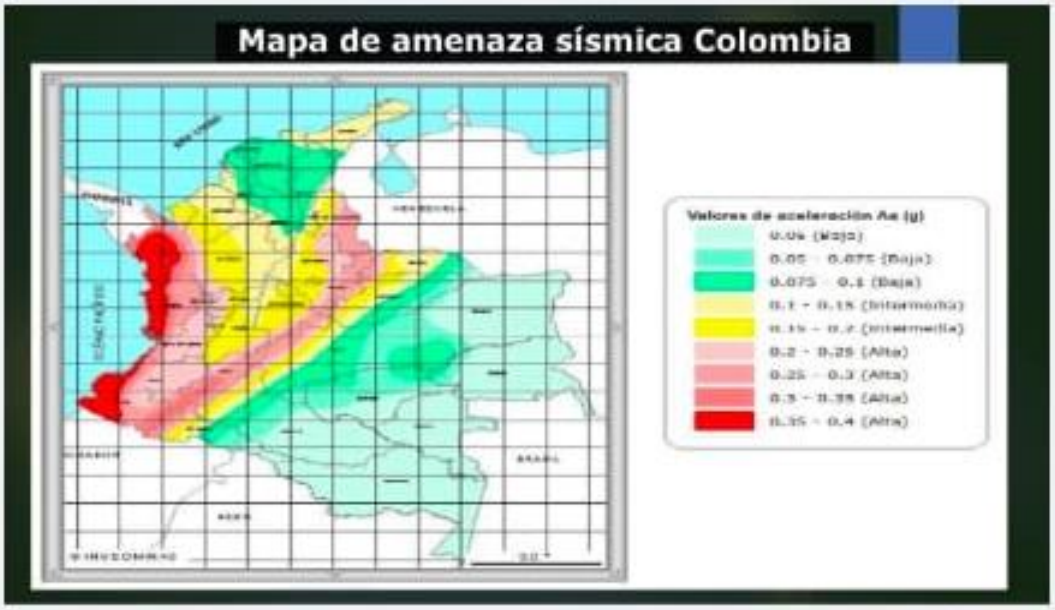




Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO



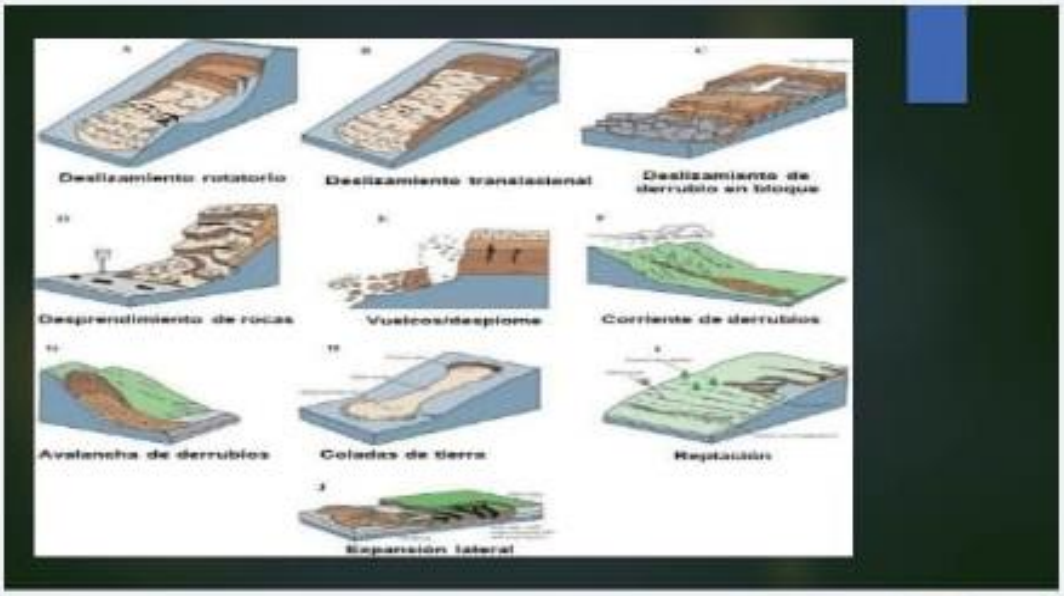

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Medidas de prevención y mitigación

- Plan de Manejo Ambiental
- Manejo adecuado de RCD
- Reforestación y compensación
- Señalización y control de tráfico
- Construcción





Buenas prácticas en obra

- Capacitaciones al personal
- Inspecciones ambientales
- Participación comunitaria





Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO





Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

IMPORTANCIA DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS

Prevención de la contaminación

La gestión adecuada de residuos reduce la contaminación del aire, el agua y el suelo, lo que protege tanto la salud humana como los hábitats naturales de contaminantes nocivos.

Conservación de Recursos

Al gestionar los residuos de manera responsable, se pueden recuperar y reutilizar materiales valiosos, reduciendo la necesidad de extraer nuevas materias primas del medio ambiente.

Reducción de emisiones

Los métodos de eliminación de residuos, como los vertederos, liberan gases de efecto invernadero. Las prácticas sostenibles, como el reciclaje y el compostaje, ayudan a reducir estas emisiones.

Protección de la salud pública

La manipulación y eliminación adecuadas de los residuos ayudan a prevenir la propagación de enfermedades y a mantener un ambiente de trabajo limpio.



NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Decreto 1076 de 2015 →
Compila normas ambientales sectoriales.

Resolución 2184 de 2019
Código de colores para separación de residuos.

Resolución 1362 de 2007
Manejo de residuos peligrosos.

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Son aquellos similares a los residuos domésticos o urbanos, generados en la vida cotidiana de las obras o edificaciones.

- Restos de alimentos.
- Papel, cartón, plásticos, vidrio.
- Bolsas de cemento, empaques y envases comunes.



RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES

Son aquellos que, por sus características físicas o químicas, requieren un manejo especial. No siempre son peligrosos, pero sí necesitan un tratamiento distinto al convencional.

- Envases y restos de pinturas, solventes y pegantes.
- Aceites usados de maquinaria.
- Baterías y luminarias (contienen metales pesados).
- Residuos hospitalarios o biosanitarios (si se generan en obras con campamentos o servicios de salud).



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Separación en la fuente
Puntos ecológicos con código de colores (verde, blanco, negro y rojo).

Almacenamiento temporal
En recipientes limpios, cerrados y señalizados.

Recolección y transporte:
Recolección y transporte por gestores autorizados.

Disposición final
Rellenos sanitarios o entrega a gestores certificados según el tipo de residuo.



CÓDIGO DE COLORES



- **Verde:** Residuos Orgánicos: residuos de comida, restos de barrido, hojarasca.
- **Blanco:** Aprovechables: Papel, cartón, plásticos, vidrios, latas.
- **Rojo:** Residuos Peligrosos y/o Especiales: recipientes, trapos, telas impregnadas de grasas y/o aceites.
- **Negro:** Residuos no Aprovechables: Envolturas, bolsas de plástico, papel sanitario usado.

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

EN CONCLUSIÓN...

TENDENCIAS FUTURAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión eficaz de los residuos es esencial para lograr la sostenibilidad ambiental y mejorar la salud pública. Al adoptar prácticas responsables, podemos reducir significativamente los residuos y sus impactos nocivos en nuestros ecosistemas.

Es necesaria la acción colectiva de individuos, comunidades, empresas y gobiernos para crear un planeta más limpio y saludable. Todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción de prácticas sostenibles de gestión de residuos, garantizando un legado positivo para las generaciones futuras.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CONSTRUIR LIMPIO ES CONSTRUIR RESPONSABLE!





Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

19. EMERGENCIAS

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2025 se presentaron emergencias dentro del corredor vial La Lejía – Saravena PR 31+0000 al PR 150+0000:

1. **Fecha:** lunes 04 de agosto 2025
   PR 38+0500
   Descripción: Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía
   Atendido por la Cooperativa: COOTRASERMULPAC

2. **Fecha:** domingo 10 de agosto 2025
   PR 38+0500
   Descripción: Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía
   Atendido por la Cooperativa: COOTRASERMULPAC

3. **Fecha:** lunes 11 de agosto 2025
   PR 38+0500
   Descripción: Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía
   Atendido por la Cooperativa: COOTRASERMULPAC

4. **Fecha:** sábado 23 de agosto 2025
   PR 45+0600
   Descripción: Vehículo tipo camión sufre volcamiento a causa del peso de la carga ocasionado cierre parcial de la vía.
   Atendido por la Cooperativa: COOTRASERMULPAC

5. **Fecha:** domingo 31 de agosto 2025
   PR 38+0500
   Descripción: Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía
   Atendido por la Cooperativa: COOTRASERMULPAC

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE AGOSTO DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA





PR 38+0500 Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía





PR 45+0600 Vehículo tipo camión sufre volcamiento a causa del peso de la carga ocasionado cierre parcial de la vía

20. REGISTRO FOTOGRÁFICO ADMINISTRACIÓN VIAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Ministerio de Transporte** **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA** **TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER** **INFORME SEMANAL DE AMV G4**	VIAS NACIONALES CONSORCIO **HOJA No. 1 DE 2** **FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025** **INFORME No. 58** **CONTRATO No. 2017 DE 2024**

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 11/08/2025 AL 17/08/2025







Recorrido e Inspección a Cooperativas de Mantenimiento Rutinario Vía 6604 La Lejía - Saravena







Reunión con propietario del predio, profesional social del Contratista Vias Colombia 063 e Interventoría - PR 38+0500 Vía 6604 La Lejía - Saravena








Recorrido de inspección a Sitio Crítico PR 38+0500 Vía 6604 La Lejía - Saravena

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 59 CONTRATO No. 2017 DE 2024

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 18/08/2025 AL 24/08/2025







Mesa de Trabajo Socialización Componente – Rendimientos Contrato 4040-2024 Vía 6604 La Lejía - Saravena







Capacitación Cooperativas de Mantenimiento Rutinario mes de agosto - Vía 6604 La Lejía - Saravena

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 60 CONTRATO No. 2017 DE 2024

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 25/08/2025 AL 31/08/2025







Reunión con Interventoría y comunidad - Vía 6604 La Lejía - Saravena

21. REGISTRO FOTOGRÁFICO COOPERATIVAS

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONTIGO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 57 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 04/08/2025 AL 10/08/2025







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 43+0600 al PR 51+0000







Actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 50+0900 al PR 61+0000







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 43+0600 al PR 51+0000







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 43+0600 al PR 51+0000







Atención de emergencias en el PR 38+0500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 58 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 11/08/2025 AL 17/08/2025





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 36+0700 al PR 43+0400





Actividades de poda, corte y retiro de árboles en el PR 38+0500





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 42+0000 al PR 43+0400





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 42+0000 al PR 43+0400





Atención de emergencias en el PR 38+0500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSTRUCCIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 58 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 11/08/2025 AL 17/08/2025







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 69+0000 al PR 80+0500







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 69+0000 al PR 80+0500







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 71+0000 al PR 80+0500







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 69+0000 al PR 80+0500







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 69+0000 al PR 80+0500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSOLIDA HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 58 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 11/08/2025 AL 17/08/2025







Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 96+0615 al PR 105+0920





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 96+0615 al PR 105+0920







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 92+0850 al PR 94+0900







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 96+0615 al PR 105+0920






Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 96+0615 al PR 105+0920

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 58 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 11/08/2025 AL 17/08/2025





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 147+0170 al PR 150+0000





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 140+0000 al PR 142+0000





Actividades de limpieza de puentes y pontones en el PR 149+0960 al PR 150+0000





Actividades de limpieza de calzada entre el PR 140+0480 al PR 142+0000





Actividades de rocería entre el PR 149+0500 al PR 150+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 04/08/2025 AL 10/08/2025







Actividades de limpieza y ornato en la Capilla de la Meza PR 82+0200, municipio de Toledo, Norte de Santander







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 69+0300 al PR 69+0600







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 69+0300 al PR 69+0600







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 68+0000 al PR 69+0600







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 68+0000 al PR 69+0600

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONCESIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 57 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 04/08/2025 AL 10/08/2025







Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 92+0850 al PR 94+0900







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 92+0600 al PR 94+0900






Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 92+0850 al PR 94+0900







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 92+0600 al PR 94+0900





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 92+0850 al PR 94+0900

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 57 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 04/08/2025 AL 10/08/2025







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 132+0410 al PR 135+0000







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 132+0815 al PR 136+0000







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 132+0410 al PR 135+0000







Actividades de limpieza de calzada entre el PR 140+0500 al PR 144+0000







Actividades de rocería entre el PR 137+0000 al PR 140+0000

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONFIANZA HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 59 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 18/08/2025 AL 24/08/2025







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 34+0280 al PR 40+0000







Actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 31+0000 al PR 40+0000







Actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 31+0000 al PR 40+0000







Actividades de limpieza de barandas entre el PR 34+0700 al PR 36+0200







Actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 31+0000 al PR 40+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 18/08/2025 AL 24/08/2025







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 66+0450 al PR 82+0700







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0080 al PR 82+0700







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0080 al PR 82+0700







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 66+0450 al PR 82+0700







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0080 al PR 82+0700

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONCESIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 59 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 18/08/2025 AL 24/08/2025





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 98+0780 al PR 100+0370





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 98+0930 al PR 117+0270





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 116+0070 al PR 117+0270





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 98+0930 al PR 117+0270





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 116+0070 al PR 117+0270

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2025 INFORME No. 59 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 18/08/2025 AL 24/08/2025







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 121+0100 al PR 124+0995







Actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 121+0000 al PR 121+0600







Actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 121+0000 al PR 121+0600







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 122+0000 al PR 125+0100







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 121+0100 al PR 124+0995

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 60 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 25/08/2025 AL 31/08/2025







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 31+0800 al PR 38+0850





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 31+0800 al PR 38+0850





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 32+0500 al PR 34+0300







Actividades de atención de emergencias entre el PR 38+0500






Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 31+0800 al PR 38+0850

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSTRUCCIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 60 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 25/08/2025 AL 31/08/2025







Actividades de limpieza de defensas metálicas entre el PR 68+0000 al PR 73+0000







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 70+0000 al PR 86+0900







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 78+0000 al PR 78+0700







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 70+0000 al PR 91+0000







Actividades de rocería entre el PR 90+0000 al PR 91+0000

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSOLIDA HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 60 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 25/08/2025 AL 31/08/2025






Actividades de despeje de derrumbes en el PR PR 110+0250





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 111+0940 al PR 118+0360





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 111+0940 al PR 118+0360





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 111+0940 al PR 118+0360





Actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 112+0000 al PR 115+0000

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 60 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 25/08/2025 AL 31/08/2025





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el 134+0800 al PR 134+0850





Actividades de limpieza de señales y mojones entre el 121+0782 al PR 124+0555





Actividades de limpieza de defensas metálicas entre el PR 122+0121 al PR 124+0555





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 127+0450 al PR 129+0600





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 125+0000 al PR 129+0900

INFORME DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

CONTRATO N0. 2017 DE 2024

ADMINISTRACIÓNVIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

PAULA VANESA FLORES RINCON

CUBARA – BOYACA

AGOSTO 2025

Contenido

INTRODUCCION 4
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 5
GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores 5
ASPECTOS CONTRACTUALES 5
Aspectos Generales del Contrato N° 2017 DE 2024. 5
CAPACITACION 6
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL 8
PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA 8
ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP/DOTACION 9
INSPECIONES PREVENTIVAS 9
INSPECCION DE VEHICULOS 11
INSPECCIONES LOCATIVAS 13
INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 15
EMERGENCIAS 15
SEÑALIZACION VIAL 18
HIDRATACION 19
COPASST 20
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) 20
LIDERAZGO 20
AUSENTISMO EG/AT/EL 20
ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES 20
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO No. 2017 21

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA – SARAVENA - PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) LOTE 6.

Relación de personal 21

Gestión SST 22

Reporte de Accidentalidad 24

Reporte de Ausentismo Laboral 24

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) LOTE 4.

Relación de personal 25

Gestión SST 26

Reporte de Accidentalidad 28

Reporte de Ausentismo Laboral 28

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5.

Relación de personal 29

Gestión SST 30

Reporte de Accidentalidad 32

Reporte de Ausentismo Laboral 32

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA C.T.A. - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA) LOTE 7. 33

Relación de personal 33

Gestión SST 34

Reporte de Accidentalidad 36

Reporte de Ausentismo Laboral 36

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37

CONCLUSION 37

RECOMENDACIONES 37

INTRODUCCION

El presente informe registra el cumplimiento e implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato N°2017 de 2024, que tiene por objeto la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2. Cuyo Representante Legal es PAULA VANESA FLORES RINCON.
El presente Informe describe las evidencias de cumplimiento de las actividades operativas encaminadas a implementar medidas de prevención promoción en SST, el mes de abril 2025, dando cumplimiento a el DECRETO 1072 de 2015 y RESOLUCION 0312 de 2019 y demás normatividad vigente.

El área de SST, continuamente trabaja en el seguimiento y aseguramiento de las actividades operacionales, control y verificación de los controles, el bienestar integral de los trabajadores, se hace necesario adoptar medidas de autocuidado, protección y prevención.

El periodo comprendido de este informe es del 01 al 31 de agosto de 2025.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las actividades en caminadas en el desarrollo en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del contrato N.º 2017 DE 2024, cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir con la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajado, en la ejecución de las actividades a desarrollar
- Realizar supervisión y control a los preoperacionales de los equipos y herramientas empleados por las cooperativas para la ejecución de las respectivas actividades.
- Identificar los riesgos y peligros presentes en los corredores viales donde se llevan a cabo las actividades para el personal directo y personal de las cooperativas.

- Implementar controles necesarios a los peligros identificados, para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Identificar los Riesgo locativo por sistemas y medios de almacenamiento,
- condiciones de orden y aseo.
- Realizar inspecciones periódicas internas a las cooperativas, con la finalidad de verificar las condiciones tanto del personal como de equipos, herramientas y vehículos asignados para la labor.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores

El contrato 2017, se desarrolla en el departamento Norte de Santander en las siguientes vías:

Ruta 6604: Vía La Soberanía (La Legía – Saravena) - iniciando en el sector PR31+0000 al PR 150+0000.

ASPECTOS CONTRACTUALES

Aspectos Generales del Contrato N° 2017 DE 2024.

CONTRATO No.	2017 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”.

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING.LEONEL VALERO ESCALANTE
RESIDENTE:	ING. JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO
TIEMPO DE EJECUCION DE CONTRATO:	29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:	31 DE JULIO DE 2026

CAPACITACION

El Consorcio Vías Nacionales, aplica las actividades de capacitación para todos los trabajadores vinculados al contrato 2017 de 2024 directos y de las cooperativas, teniendo como propósito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano educado en los conocimientos adquiridos en SST, fortaleciendo por medio de la prevención y promoción la salud, el auto cuidado, mitigando los accidentes y enfermedades laborales. Al mismo tiempo, la participación en cada una de las capacitaciones, busca mejorar el clima laboral, la salud física, mental, dando cumplimiento al cronograma de capacitación establecido.

Los temas tratados en la capacitación general mensual del mes de agosto fueron:

- Mantenimiento Rutinario.
- Manejo integrado de residuos sólidos.
- Gestión del Riesgo





Mantenimiento Rutinario





Coordinación de trabajo seguro en alturas





Uso adecuado de los elementos de protección persona

Ana Xiomara Fuentes Arteaga Inspectora SISO ADM VIAL G4	Ing. Juan Manuel Rojas Carrillo Ingeniero Residente ADM VIAL G4	31/08/2025

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL

Se realizan charlas de seguridad y salud en el Trabajo y Seguridad Vial, durante el periodo con el objetivo de que el personal del Consorcio Vías Nacionales y el personal de las cooperativas, cuenten con mayor conocimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los controles necesarios a implementar de acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, y generar autocuidado para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA

Durante el periodo, se realizaron ejercicios de estiramiento y calentamiento, antes de iniciar las actividades y durante el desarrollo de estas; para mejorar la salud física y mental de los colaboradores y prevenir lesiones musculares y posibles desordenes musculoesqueléticos y así mismo disminuir la posible presencia de factores psicosociales. De igual manera, los colabores tienen autonomía para tomar su tiempo de pausa activa sin exceder el tiempo estimado de acuerdo a las actividades desarrolladas.









Pausas activas/Calistenia

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP/DOTACION

En cumplimiento a la implementación del SG-SST y según el artículo 230 del código sustantivo del trabajo, se realiza entrega de la primera Dotación durante el periodo agosto 2025, con la finalidad de que teniendo el equipo de protección personal (EPP) se cree un espacio donde el trabajador tenga un ambiente de trabajo positivo y saludable para así tener bienestar laboral, verificando las condiciones de las áreas de trabajo y que garanticen la correcta funcionalidad durante la ejecución de las actividades en el Contrato 2017 de 2024.







Pausas activas/Calistenia

INSPECIONES PREVENTIVAS

El área SST, en cumplimiento a la implementación del SG-SST, realiza inspecciones durante el periodo, con la finalidad de verificar las condiciones de las áreas, equipos, herramientas, entre otros; que garanticen la correcta funcionalidad durante la ejecución de las actividades en el Contrato 2017 de 2024.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y demás Normativa vigente en materia de Seguridad y salud en trabajo en Colombia, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo objetivo principal es Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día 01 al 31 de julio del 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Adm. Vial y las diferentes cooperativas.

- Durante el mes no se presentó ningún incidente ni accidente de trabajo se continúa sensibilizando en el autocuidado.
- Se continúan realizando las inspecciones de seguridad por los operarios inspecciones a los elementos de atención de emergencias camilla, botiquín, extintor, EPP, vehículo, herramienta menor, guadaña, de adjuntan los formatos ya diligenciados en la carpeta del SG-SST se deja registro fotográfico de las inspecciones de seguridad y la señalización temporal instalada en el área de trabajo.
- Se realiza seguimiento a las incapacidades médica y permisos a citas médicas de los colaboradores.
- Se recuerda la importancia continuar con el uso de los elementos de protección personal, señalización de seguridad e informar cualquier eventualidad que se llegue a presentar durante las actividades laborales y en los turnos de emergencia.

INSPECCION DE VEHICULOS

Se realiza inspección de vehículo diariamente por parte de los conductores y se hace acompañamiento por parte de SST, para validar las condiciones de estos; al igual que los elementos de emergencias asignados a cada uno de las camionetas.

Para las actividades a realizar en este contrato, requiere del uso de vehículos automotor con disponibilidad cumpliendo los diferentes traslados en sus rutas comprendidas anteriormente.

Por parte de área SST, se realiza seguimiento a los preoperacionales diariamente y a el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de estos vehículos.

a continuación, se relacionan los vehículos presentes en el contrato del presente informe

TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA	SOAT	RTM
Camioneta	RENAULT DUSTER OROCH	2020	GZL-184	14/02/2026	17/02/2026
Camioneta	NISSAN FRONTIER	2024	NMT-309	21/06/2026	25/06/2029

Como medidas preventivas que se tomaron en el consorcio Vías Nacionales 2025, para los recorridos y transporte del personal tenemos:

- Documentación de vehículos: Estos vehículos cuentan con su correspondiente tarjeta de propiedad, SOAT, tecno mecánica vigente.
- Inspección preoperacional de los vehículos: se continua con el diligenciamiento diario de preoperacionales de estos vehículos, antes de iniciar su jornada laboral.
- Kit de emergencias: estos vehículos cuentan con su botiquín y extintor en requerido para atender alguna emergencia, así como la disponibilidad de 10 conos.





Inspección de Vehículo Adm-Vial




Inspección de Vehículo de Cooperativas

INSPECCIONES LOCATIVAS

Con la finalidad de validar las áreas de la oficina asignada a el Contrato 2017 de 2024, se realiza validación de estas para verificar el estado y las condiciones de trabajo.



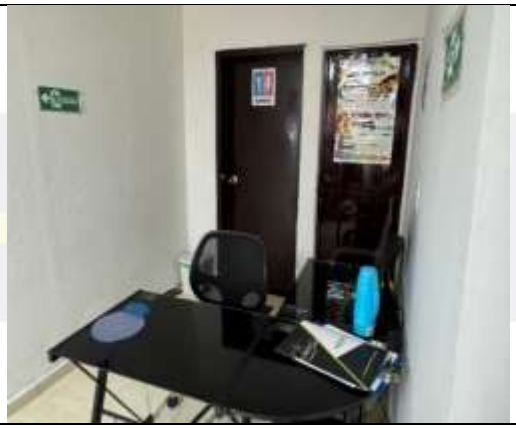



Instalación señalización informativa









Inspección de áreas Locativas

INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El área SST del Consorcio Vías Nacionales, realiza inspección y verificación de las herramientas solicitadas en el Anexo Técnico, y el estado actual de estas; con el objetivo de prevenir condiciones inseguras que puedan afectar la salud de los colaboradores.



Inspección de herramientas y equipos - Cooperativas

EMERGENCIAS

El grupo de trabajo del Consorcio Vías Nacionales, cuenta con los siguientes elementos de emergencias: botiquín, camilla, extintores; los cuales se encuentran en buenas condiciones para ser usados en caso de presentar alguna eventualidad.

Al mismo tiempo, se cuenta con la conformación de la brigada de emergencia, con los integrantes a continuación relacionados:

NOMBRE DE INTEGRANTE	BRIGADITA
Ana Xiomara Fuentes A	Primeros Auxilios
Sandra Carolina Moreno C	Evacuación
Mireya Silva Martínez	Control Incendios

Durante el periodo se realiza la socialización de las responsabilidades

	
Inspección de Extintor y Herramientas – Camioneta GZL-184 – AMV4	Inspección de Extintor y Herramientas – Camioneta NMT-309 – AMV4
	
Inspección de Botiquín – Camioneta GZL-184 – AMV4	

	
Inspección Botiquín – Oficina AMV-3	Inspección Extintor – Oficina AMV-3
	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cootrasermulpac	Inspección de Extintor – Cooperativa Cootrasermulpac
	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cooptrameza	Inspección de Extintor – Cooperativa Cooptrameza

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Ana Xiomara Fuentes Arteaga Inspectora SISO ADM VIAL G4	Ing. Juan Manuel Rojas Carrillo Ingeniero Residente ADM VIAL G4	31/08/2025

	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cootrasermulgib	Inspección de Extintor – Cooperativa Cootrasermulgib
	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cootrascub	Inspección de Extintor – Cooperativa Cootrascub

SEÑALIZACION VIAL

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Invias y los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato en ejecución, se implementa la señalización para la seguridad de los colaboradores durante la ejecución de las tareas en la vía.

	
Instalación de cinta reflectiva a conos y limpieza de señales en la vía	
	
Señalización de áreas de trabajo sobre la RUTA	Señalización de áreas de trabajo de Cooperativas

HIDRATACION

El personal de AMV4, cuenta con agua potable para hidratación, cuando lo deseen y/o necesiten.





COPASST

En cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, se realiza reunión del COPASST del mes de agosto 2025, con la finalidad de tratar temas necesarios para la gestión e implementación de controles de seguridad y salud en el Trabajo para garantizar las actividades tanto administrativas como operativas. Se cuanta con acompañamiento de inspector SST durante la reunión.

Se realiza socialización de las responsabilidades SST de los miembros del COPASST.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

En el periodo, no se presentó ninguna novedad.

LIDERAZGO

Consorcio Vías Nacionales, realiza actividades lúdicas que lleva como título “ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TRABAJO” con la finalidad de generar un vínculo como equipo de trabajo y dar pautas para la mejora en la comunicación asertiva durante la planeación y ejecución de las actividades y a su vez fortalecer el liderazgo.

AUSENTISMO EG/AT/EL

Durante el periodo de agosto 2025, la AMV4 no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de permiso	FECHA
-	-	-	-	-

ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 4, no se presentó accidente laboral y no presento enfermedades laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
AGOSTO	0	0
TOTAL	0	0

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO No. 2017

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA – SARAVENA - PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) LOTE 6.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ	R. legal / Operario	32085408772
2	JESUS GELVEZ CONTRERAS	Operario	3219664065
3	JUAN ANTONIO GRANADOS SANTAFE	Operario	3113261297
4	JOSE ARNULFO BECERRA GONZALEZ	Operario	3104828498
5	YEISON BAUNEY DURAN BARAJAS	Operario	3142396607
6	OSMAN RENE CONTRERAS	Operario	3222845175
7	HUGO ALIRIO RAMON	Operario	3222911459
8	YAMID ALBEIRO RAMIREZ RAMIREZ	Operario	3112575582
9	ARNULFO ORTIZ CAICEDO	Operario	3142149828
10	VICTOR MANUEL CACERES GONZALEZ	Operario	3227095027
11	HUGO CELSO JIMENEZ CAMARGO	Operario	3102114930

Gestión SST

La Cooperativa de COOTRASERMULPAC implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de agosto 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas y equipos





Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOTRASERMULPAC no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
AGOSTO	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOTRASERMULPAC no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA
Yamid Albeiro Ramírez Ramírez	Cita Medica	1dia	22/08/2025
Hugo Celso Jiménez Camargo	Cita Medica	1dia	22/08/2025
Hugo Celso Jiménez Camargo	Cita Medica	1dia	29/08/2025

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) LOTE 4.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	SANTOS RINCON CACERES	R/ Legal Operario	3203857428
2	CIPRIANO VARGAS RANGEL	Operario	3144421062
3	GABRIEL JAIMES SUAREZ	Operario	3227060524
4	MANUEL BUSTOS SANTOA	Operario	3223018367
5	ARMANDO AGUILLON JAIMES	Operario	3203857428
6	LUIS FRANCISCO AGUILLON RINCON	Operario	3212901757
7	JOSE RAFAEL CADENA	Operario	3203724439
8	JOSE ALEXANDER SANTAFE PARADA	Operario	3202749508
9	EYBAR ARLEY AGUILLON	Operario	3224426952
10	GENRY RAMON VALENCIA	Operario	3126224388
11	ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES	Operario	3112436098

Gestión SST

La Cooperativa de COOPTRAMEZA implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de agosto 2025.
Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente




Pausas activas-Calistenia




Inspección de herramientas





Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOPTRAMEZA no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
AGOSTO	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOPTRAMEZA reporta ausentismo por calamidad familiar y permiso de tipo personal.

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA
Ángel Rubiel Rincón Jaimes	Cita Medica	1 día	22/08/2025
Luis Francisco Aguillón Rincón	Oftalmología - Urología	2 días	25/08/2025 27/08/2025

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	JOSE ANANIAS SANTOS CONTRERAS	R/ Legal Operario	3112111163
2	CARLOS JULIO ANGARITA CHIVATA	Operario	3227491713
3	OSCAR PEREZ VALENCIA	Operario	3144247790
4	LUIS AMANDO GONZALEZ COBARIA	Operario	3104166019
5	JORMAN ELADIO SANTOS CONTRERAS	Operario	3222773370
6	PEDRO RAFAEL LOPEZ VILLAMIZAR	Operario	3507282690
7	RUBEN DARIO GONZALEZ ALBARRACIN	Operario	3222226814
8	EDWIN ALBEIRO MENDEZ ANGARITA	Operario	3132636452
9	FERNANDO CADENA MONTAÑEZ	Operario	3213245098
10	CARLOS FABIAN ESTUPIÑAN ALBARRACIN	Operario	3133057227
11	SILVINO BECERRA MONCADA	Operario	3213579827

Gestión SST

La Cooperativa de COOTRASERMULGIB implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de agosto 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas y equipos





Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOTRASERMULGIB no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
AGOSTO	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOTRASERMULGIB no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA
José Ananías Santos Contreras	Acompañamiento padre 3ra edad (Cita Med)	1 día	04/08/2025
José Ananías Santos Contreras	Acompañamiento padre 3ra edad (Cita Med)	1 día	23/08/2025
José Ananías Santos Contreras	Acompañamiento padre 3ra edad (Cita Med)	1 día	28/08/2025
Oscar Pérez Valencia	Cita Odontológica	1 día	06/08/2025
Oscar Pérez Valencia	Rx Odontológico	1 día	15/08/2025
Luis Amando González Cobaria	Cita Medica	1 día	05/08/2025
Silvino Becerra Moncada	Cita Odontológica	1 día	13/08/2025
Silvino Becerra Moncada	Cita Odontológica	1 día	15/08/2025

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA C.T.A. - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA) LOTE 7.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	ELGAR GAMBOA JAIMES	R/ Legal Operario	3205626409
2	ALFREDO BECERRA MONTERREY	Operario	3133266424
3	ELKIN MICHEL SANTAMARIA CHIVATA	Operario	3112873464
4	JESUS MARIA CASTRO BOTIA	Operario	3143938147
5	ALVARO BARROSO DUARTE	Operario	3102093398
6	JESUS ANTONIO CRUCES VARGAS	Operario	3204246876
7	MISAEL REINA GODOY	Operario	3108661538
8	REYNALDO ANGARITA	Operario	3102074867
9	RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ	Operario	3144386134
10	GEISSON ALEXANDER LASSO CHAVEZ	Operario	3206750528
11	CARMEN JANNET RIVERO MALDONADO	Operario	3113778962

Gestión SST

La Cooperativa de COOTRASCUB implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de agosto 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas y equipos





Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencias





Señalización de área de trabajo

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOTRASCUB no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
AGOSTO	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de AGOSTO 2025, la Cooperativa COOTRASCUB reporta ausentismo por enfermedad general y permiso de tipo personal

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA
Jesús Antonio Cruces Vargas	Incapacidad Angioplastia	30 días	22/07/2025 20/08/2025
Jesús Antonio Cruces Vargas	Incapacidad Angioplastia	20 días	20/08/2025 08/09/2025
Reynaldo Angarita	Rx Columna	1 día	22/08/2025
Reynaldo Angarita	Exámenes medico	1 día	26/08/2025
8Jesús María Castro Botia	Cita Otorrino	1 día	27/08/2025

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

Durante el periodo corresponden del día 01 de agosto al 31 de agosto del 2025, se realizaron labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se continúan aplicando las medidas de bioseguridad, Se realizo registro fotográfico de las inspecciones de seguridad y la señalización temporal instalada en el área de trabajo, durante el mes no se presentó ningún incidente, ni accidente de trabajo se continúa sensibilizando en el autocuidado, se continúan realizando las inspecciones de seguridad por los operarios inspecciones a los elementos de atención de emergencias camilla, botiquín, extintor, EPP, vehículo, herramienta menor, guadaña.

Se realiza seguimiento a las incapacidades médica y permisos de tipo personal o médicos de los colaboradores. Se recuerda la importancia continuar con el uso de los elementos de protección personal, señalización de seguridad e informar cualquier eventualidad que se llegue a presentar durante las actividades laborales y en los turnos de emergencia. Se continua con el seguimiento del diseño y la implementación del SG-SST de las cooperativas, para garantizar el bienestar de todos los colaboradores y a su vez prevenir afectaciones a las organizaciones con posibles sanciones.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a las cooperativas dar cumplimiento a el Manual de Señalización decreto 1885 de 2015, y adecuar las señales de acuerdo a lo establecido.
2. Se recomienda a las cooperativas la designación de roles como lo es el personal conductor y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad de PESV de acuerdo a los estándares mencionados en la Resolución 20223040040595 de 2022.
3. Se recomienda a toda la personal directo y de las cooperativas disponibilidad a los cambios para las mejoras planeadas durante el año 2025, en cumplimiento a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Se recomienda a personal SST de las cooperativas implementar los controles necesarios para las actividades con mayor frecuencia.
