Bogotá D.C. septiembre 06 de 2025

CTT-225- 1700-25

Señores:
CONSORCIO SOFAN C-046
Atención: Julio Cesar Bogotá
Director contratista
Carrera 13ª No 89-38
Email: oficinabogota@sofaningenieria.com

REFERENCIA: **CTO-225-2024-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION.**

Asunto: Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-163 Remisión Informe Gerencial No. 3

Respetado Ingeniero

En atención a la entrega del Informe gerencial N.º 3 – Versión 1, esta Interventoría informa que, tras la revisión de la documentación y anexos remitidos, se verifica que la información, están conforme a lo establecido en el contrato y sus lineamientos técnicos.

En consecuencia, la Interventoría aprueba el Informe gerencial N.º 3 – V1

No obstante, lo anterior, se recuerda que, en el caso que el Instituto De Caminos Y Construcciones De Cundinamarca – ICCU y/o la Interventoría requiera información adicional o requiera que el documento sea ajustado, esto debe ser atendido por el Consultor.

Atentamente

CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49

David Tierradentro
Director de interventoría

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

INFORME MENSUAL No. 3
1 AL 31 DE JULIO DEL 2025

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

FOR-ADM-11

Bogotá - Cundinamarca, 5 julio de 2025

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN.

INFORME MENSUAL No. 3
1 AL 31 JULIO DEL 2025

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

ELABORO	REVISO	APROBÓ INTERVENTORÍA
PAULA ANDREA DIAZ DÍAZ Especialista PMP **CRISTIAN CAMILO GRIMALDO YANES** Especialista PMP	**JULIO CESAR BOGOTÁ CARRILLO** Director de Obra	**LUIS EDUARDO PRIETO** Residente Interventoría

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
0	

Contrato de Obra No.	**ICCU-CTO-245 DE 2025**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C-046**
Contrato de Interventoría No.	**ICCU-CTO-225 DE 2025**	**Interventoría:**	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49**
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN			
INFORME MENSUAL No.	**3**	**MES O PERIODO:**	**1 DE JULIO 2025 A 31 DE JULIO 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 6
3.2. CONECTIVIDAD, ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS 7
3.3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TÉCNICA EJECUTADAS Y EN CURSO 8
3.4. PUNTOS PRIORIZADOS 9
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
4.1. OBJETO DEL CONTRATO 11
4.2. DURACIÓN DEL CONTRATO 11
4.3. VALOR DEL CONTRATO 11
5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11
5.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA 11
5.2. SEGUIMIENTO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE REAL 12
5.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES. 15
5.4. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT): 18
5.5. COMPONENTE AMBIENTAL: 22
5.6. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 26
5.7. COMPONENTE SOCIAL 28
5.8. GESTIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS 30
5.9. LIMITACIONES ENCONTRADAS 30
5.10. SEGUIMIENTO POR INDICADORES 31
6. RECURSO HUMANO 31
7. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 33
7.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO: 33
7.2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO 34
7.3. GARANTÍAS Y SEGUROS 34
8. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO 35
8.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PAGA 35
8.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PMT 35
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36
10. ANEXOS 36

Listado de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA....7
ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DE CORREDOR VIAL A INTERVENIR....7
ILUSTRACIÓN 3. FUNDIDA CONCRETO CAISSON ILUSTRACIÓN 4. AMARRE ACERO VIGA CABEZAL....9
ILUSTRACIÓN 5. EXCAVACIÓN PARA MURO ILUSTRACIÓN 6. AMARRE DE ACERO....10
ILUSTRACIÓN 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO JUNIO PR50+625 ILUSTRACIÓN 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO JULIO PR50+625....10
ILUSTRACIÓN 9. SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO....12
ILUSTRACIÓN 10. CURVA "S" VALOR GANADO (EVM)....13
ILUSTRACIÓN 11. CUADRO DE PORCENTAJES POR FRENTES)....14
ILUSTRACIÓN 12. GRAFICAS DE AVANCE POR FRENTES....14

Listado Tablas

TABLA 1. LISTADO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL....18
TABLA 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PUNTOS CRÍTICOS....22
TABLA 3. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE AMBIENTAL....22
TABLA 4. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE AMBIENTAL....25
TABLA 5. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE SST....26
TABLA 6. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SST....28
TABLA 7. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE SOCIAL....29
TABLA 8. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SOCIAL....30
TABLA 9. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO SOFAN C-046....31
TABLA 10. ESTADO FINANCIERO CONTRATO.....34
TABLA 11. GARANTÍAS Y AMPAROS PARA EL CONTRATO....34
TABLA 12. ESTADO FINANCIERO PAGA....35
TABLA 13. ESTADO FINANCIERO PMT....35

Anexos

ANEXO 1 – PROGRAMACIÓN

ANEXO 2 – CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ANEXO 3 – PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU suscribió el contrato ICCU-CTO-245 de 2025, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN", como resultado del proceso de licitación pública ICCU-LP-046 de 2024, adjudicado mediante Resolución No. 115 del 11 de febrero de 2025. El contrato fue suscrito con el CONSORCIO SOFAN C-046, por un valor total de $30.559.916.220 M/CTE y un plazo de ejecución de catorce (14) meses, contados a partir del acta de inicio firmada el 21 de abril de 2025.

Durante el mes de julio de 2025, el contrato continuó en fase operativa, con ejecución simultánea en cuatro frentes de obra distribuidos a lo largo de la Troncal del Tequendama. Se destacan avances en la construcción de muros de contención en los puntos críticos PR 41+500 y PR 48+960, mantenimiento de paraderos, y la limpieza de alcantarillas en sectores priorizados. Asimismo, se mantuvo activa la gestión técnica y administrativa orientada a garantizar la continuidad operativa del contrato, pese a las limitaciones asociadas al no desembolso del anticipo contractual, situación que ha generado afectaciones en actividades de mayor demanda presupuestal, como el mantenimiento con concreto asfáltico.

Este informe gerencial recoge los hechos más relevantes del periodo, incluyendo avances técnicos, seguimientos financieros, estado contractual, limitaciones encontradas, y las acciones adelantadas por el Consorcio en procura del cumplimiento de las metas establecidas. Todo ello en coordinación con la interventoría y en el marco de los lineamientos contractuales y administrativos establecidos por el ICCU.

2. GENERALIDADES

Durante el mes de julio de 2025, el CONSORCIO SOFAN C-046 continuó con la ejecución del contrato ICCU-CTO-245 de 2025, correspondiente al mantenimiento de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras mediante actividades periódicas y de contención. Las intervenciones se enfocaron en frentes priorizados por el ICCU, ejecutando actividades como construcción de muros de contención, mantenimiento de paraderos, limpieza de alcantarillas y labores preliminares en el tramo de pavimento articulado.

Durante este periodo, se destaca la aprobación por parte de la interventoría del Programa Detallado de Trabajo (PDT), mediante oficio CTT-225-1326-25 del 17 de mayo de 2025, el cual fue validado con observaciones puntuales sobre el punto del PR 21+900. Esta aprobación ha permitido avanzar en la planificación y ejecución conforme al cronograma actualizado del proyecto.

Asimismo, se mantuvo una coordinación técnica constante para el traslado de maquinaria y la ejecución de actividades en campo. Todas las acciones desarrolladas contaron con trazabilidad técnica y documental, conforme al sistema de gestión de calidad del proyecto.

A pesar de que algunas actividades, como la instalación de mezcla asfáltica, no se pudieron iniciar debido al no desembolso del anticipo contractual, se garantizó la continuidad operativa del contrato con recursos propios del consorcio y priorización técnica en los frentes de mayor impacto. Las condiciones climáticas también representaron una limitación operativa parcial en algunos sectores, principalmente durante horas de la tarde.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización y descripción

El proyecto se ubica en departamento de Cundinamarca en la zona suroccidental provincia del Tequendama y su objetivo es realizar el mantenimiento de la red vial de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras, realizando actividades periódicas como mantenimiento de la estructura de pavimento por regular estado, reconstrucción parcial de los tramos en mal estado, construcción y reposición de pavimento en adoquín, construcción de estructuras de drenaje y subdrenaje longitudinal, actividades de seguridad vial.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

✓ Mantenimiento vial.
✓ Atención sitios críticos
✓ Construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal.
✓ Obras de seguridad vial.



Ilustración 1. Departamento de Cundinamarca

3.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

La troncal del Tequendama y los demás tramos que conectan a esta, son vías de carácter secundario y terciario que pasa por los municipios de Municipios de Soacha, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima, Viotá, Apulo y Tocaima, están conformadas por una calzada dos carriles (uno por cada sentido).

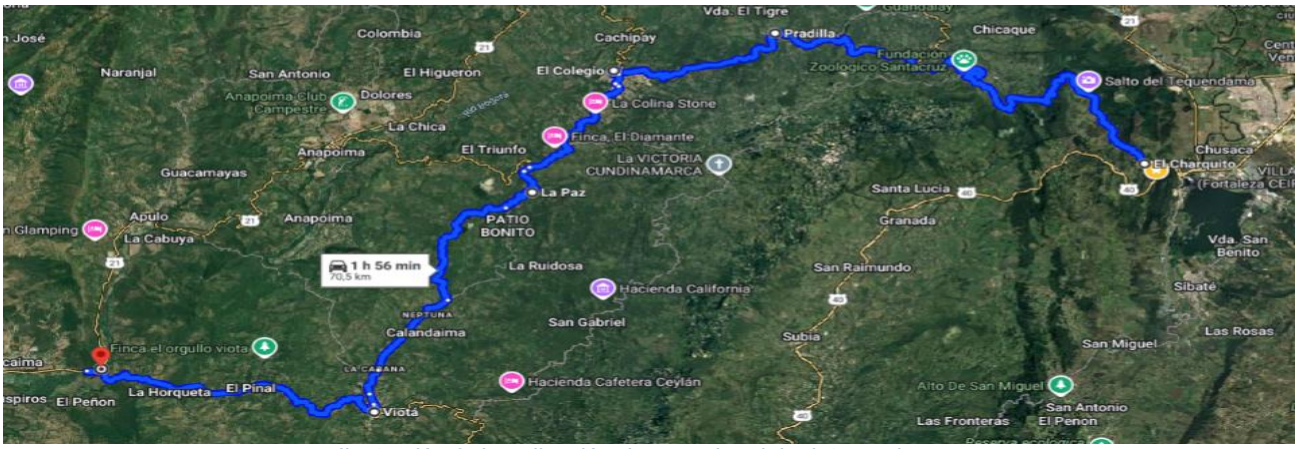


Ilustración 2. Localización de corredor vial a intervenir

3.3. Actividades de intervención técnica ejecutadas y en curso

Durante el mes de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 ejecutó intervenciones técnicas en varios frentes de trabajo priorizados, conforme al Programa Detallado de Trabajo (PDT) validado por la interventoría. Las actividades desarrolladas y en curso corresponden a las siguientes:

- **Frente 1 – PR 48+960:** Finalización de actividades de cimentación profunda mediante caisson, incluyendo excavación manual, armado y fundida de anillos, instalación y vaciado de pilotes, replanteo y fundida de la viga cabezal. Se implementaron medidas de protección de talud con plásticos y lonas.

- **Frente 2 – PR 41+500:** Avance en la construcción de muro tipo “L”, incluyendo excavación mecánica, instalación del solado de limpieza, corte y amarre del acero, fundida de la zarpa y avance en el cuerpo del muro mediante colocación de concreto según especificaciones técnicas.

- **Frente 3 – Mantenimiento de paraderos**: Intervención en siete puntos localizados entre el PR 23+310 y el PR 64+700, ejecutando lijado de estructuras metálicas, demolición y reconstrucción de pedestales de concreto y adecuación preliminar para aplicación de pintura.

- **Frente 4 – Limpieza de alcantarillas:** Ejecución del 100 % de las actividades correspondientes a este frente. Se intervinieron cinco alcantarillas en los puntos PR 50+750, PR 51+107, PR 41+430, PR 50+925 y PR 42+706, eliminando material sedimentado y residuos que comprometían su funcionamiento hidráulico.
  Tal como se indicó en el Comité No. 13 del 23 de julio, y conforme a las directrices del ICCU, no se continuará con la limpieza de más alcantarillas, dado que la atención de puntos adicionales con alta colmatación será asumida por la Dirección de Concesiones. En este sentido, la actividad se considera finalizada dentro del marco contractual actual.

- **Frente 5 – PR 1+800:** Se iniciaron actividades preliminares para mantenimiento del pavimento articulado, incluyendo levantamiento topográfico, instalación del PMT, traslado de maquinaria y demolición de la cuneta lateral, como fase previa a la remoción del adoquín existente.

- **Topografía:** Se ejecutaron labores de abscisado, nivelación de la vía y control técnico en muros del PR 21+950 y PR 2+150. Estas actividades permitieron validar condiciones geométricas, verticalidad y comportamiento de los elementos estructurales existentes.

Es importante señalar que no fue posible iniciar las actividades de aplicación de mezcla asfáltica debido a la falta de desembolso del anticipo contractual. No obstante, el consorcio ha invertido recursos propios para avanzar en las demás actividades críticas, garantizando el cumplimiento técnico del cronograma en los frentes activos.

3.4. Puntos priorizados

Durante el mes de julio de 2025 se mantuvo la atención a los puntos críticos priorizados dentro del contrato ICCU-CTO-245 de 2025, con avances significativos en la ejecución física en los siguientes sectores:

Estado de los puntos priorizados:

- **Punto 1: PR48+960**

Tipo de obra: Construcción de Muro Caisson

Se continuó la construcción del muro de contención con cimentación tipo caisson. Durante el periodo se ejecutaron las actividades de excavación manual de caisson, armado y fundida de anillos, instalación de pilotes, fundida de concreto y ejecución de la viga cabezal, conforme a los planos estructurales aprobados. Las actividades se desarrollaron conforme al cronograma establecido.



Ilustración 3. Fundida Concreto Caisson



Ilustración 4. Amarre Acero Viga cabezal

- **Punto 2: PR 41+500**

Tipo de obra: Construcción muro en “L”

Se avanzó en la construcción del muro tipo “L”, ejecutando la excavación mecánica, instalación del PMT, replanteo, solado de limpieza, armado de acero, fundida de la zarpa y preparación de formaleta para la siguiente fase estructural. Este frente se encuentra activo.



Ilustración 5. Excavación para muro



Ilustración 6. Amarre de Acero

Por otra parte:

PR 50+625: A la fecha, este punto crítico continúa sin intervención, ya que su ejecución depende del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) que aún no ha sido emitido por la autoridad competente. Tal como se ha reiterado en anteriores informes y comités técnicos, el contratista se encuentra a la espera del otorgamiento de dicho permiso para dar inicio a las actividades correspondientes. Se insiste en la necesidad de priorizar su trámite, dado el estado crítico del sector y el alto riesgo para la infraestructura vial.



Ilustración 7. Registro Fotográfico Junio PR50+625



Ilustración 8. Registro Fotográfico Julio PR50+625

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1. Objeto del contrato

Realizar la “MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN”

4.2. Duración del contrato

El plazo máximo de acuerdo con las condiciones del contrato ICCU-245 de 2025 es de catorce (14) meses para la ejecución total de las obras.

4.3. Valor del contrato

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 30.559.916.220), equivalentes a 21.468 SMLMV para el año de suscripción del contrato, correspondiente al 2025.

5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Seguimiento al cronograma de obra

Fecha de inicio del contrato: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación del contrato: 20 de junio de 2026

Para este periodo del mes de julio, se han realizado las actividades de:

- **Inicio de obras en el PR 48+960 Construcción de muro**
- **Inicio obras en PR50+625 (En espera de POC)**
- **Inicio de obras en PR41+512. Construcción de muro**
- **Instalación de señalización temporal**
- **Ejecución de sondeos geotécnicos**
- **Rehabilitación de paraderos**
- **Limpieza de alcantarillas sobre el corredor vial**

Se viene realizando la intervención de 2 puntos críticos a intervenir EL PR 48+960 y el PR 41+512, en ambos puntos se realiza la construcción de muros de contención para la estabilización de la calzada. En el punto crítico identificado como PR50+625 (BOX CULVERT) aunque está programado no ha sido posible entrar a intervenirlo debido a que se necesita un permiso de ocupación de cauce (POC) que permita su intervención, a fecha de este informe nos encontramos a la espera de este permiso.

Se viene adelantando actividades de rehabilitación de paraderos y de limpieza de alcantarillas en el corredor vial.

Para el mes de julio se ha realizado la actualización del programa de obra debido a cambios en la secuencia constructiva y en la identificación de nuevos puntos críticos como se detallo en informe del mes de junio.

Cambio en la intervención programada del mantenimiento vial; Este se había programado de abscisa mayor a la menor, sin embargo, el ICCU solicito que su intervención se realice de los abscisados menores a mayores.

Identificación de nuevos puntos críticos. Se identificaron 2 nuevos puntos críticos que no se encontraban relacionados en la PDT inicial.

Entrega de diseños y Permisos de Ocupación de Cauce Para la intervención de los puntos críticos, el ICCU debe entregar al contratista los diseños de las obras a realizar, y en 3 de los sitios críticos se debe tramitar PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE (POC).

Cambio de fecha inicial de la etapa de construcción. La entrega de diseños retrasó el inicio de las obras por tanto la fecha inicial de la etapa de construcción cambio de 20-05-2025 a 9-96-2025, como lo expresa la interventoría en su comunicado CTT-225-958-25 de junio 4 de 2025 Donde el primer mes del contrato correspondiente a identificación de puntos críticos, revisión de diseños y levantamiento, se extiende por 15 días más.

Por tanto, para el mes de Julio se ha presentado una actualización y redistribución del cronograma presentado inicialmente y que ha sido aprobado por interventoría mediante comunicado No. CTT-225-1326-25del 17 de julio del 2025 sobre este que en adelante se realiza el seguimiento de obra.


5.2. Seguimiento comparativo entre avance programado vs. Avance real

Con el propósito de evaluar el desempeño del proyecto durante el mes de Julio de 2025, se presenta a continuación un análisis comparativo entre el avance físico programado y el avance realmente ejecutado, tomando como base la actualización de la planificación aprobada mediante según mesa de trabajo del 29 de julio del 2025.

Ilustración 9. Seguimiento Avance físico del proyecto

		PROGRAMADO		EJECUCION		INDICADORES		
				TOTALES			VARIACION	SPI
Semana No.	FECHA	CPTP(Millones)	% PROG.	CPTR (Millones)	% EJEC	CRTR	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
Semana 1	25/05/2025	24,99	0,08%	12,50	0,04%	11,875	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	153,38	0,51%	24,41	0,08%	23,18813808	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	267,24	0,90%	63,61	0,21%	60,43291472	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	464,85	1,56%	102,82	0,35%	$ 97,68	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	1.107,58	3,72%	142,02	0,48%	$ 134,92	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	1.622,78	5,45%	181,23	0,61%	$ 172,17	-4,84%	0,11
Semana 7	6/07/2025	115,95	0,39%	196,73	0,66%	$ 186,89	0,27%	1,70
Semana 8	13/07/2025	208,36	0,70%	212,23	0,71%	$ 201,62	0,01%	1,02
Semana 9	20/07/2025	372,36	1,25%	227,74	0,76%	$ 216,35	-0,49%	0,61
Semana 10	27/07/2025	689,99	2,32%	243,24	0,82%	$ 231,08	-1,50%	0,35

Ilustración 10. Curva "S" Valor ganado (EVM)

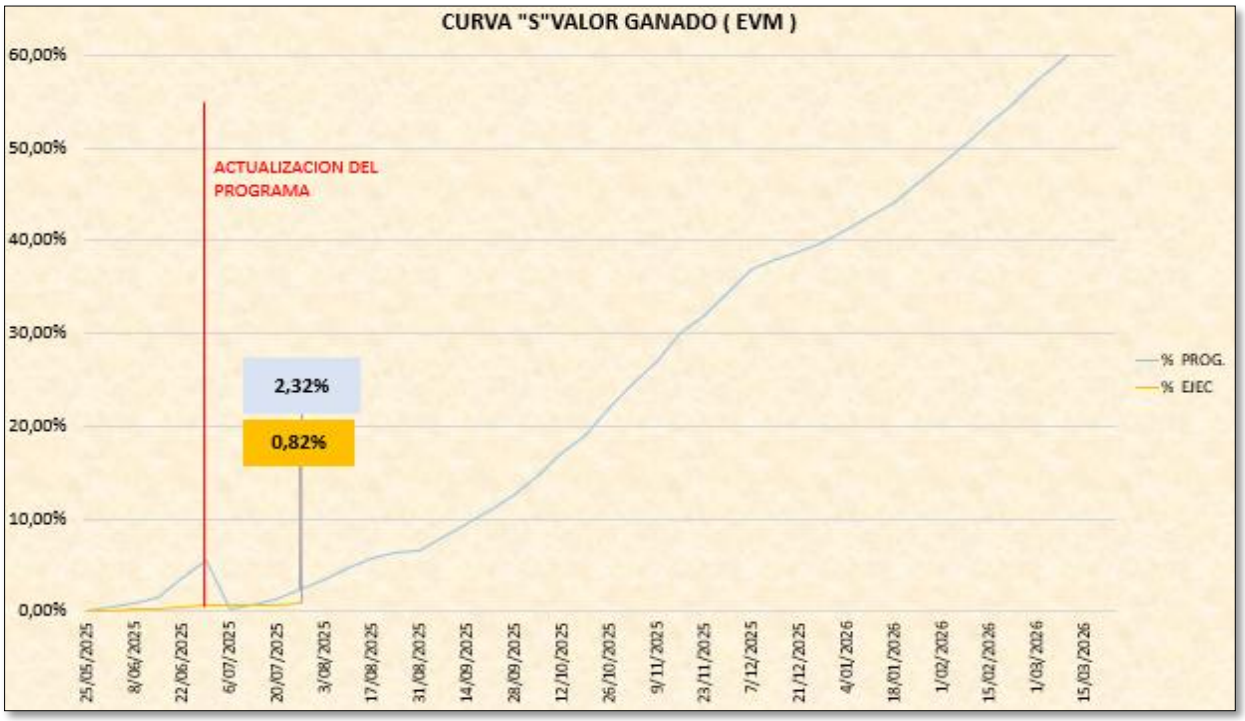

Como se puede evidenciar en el cuadro de seguimiento y en la gráfica se ha realizado la actualización de la programación con el fin de reflejar la realidad de la secuencia constructiva y la nueva redistribución, por ello se ve un cambio en el porcentaje programado entre las semanas 6 y semana 7. Por tanto, los resultados a la fecha del corte de este informe son los siguientes registros a fecha 27 de julio de 2025.

Actividad	% Programado	% Ejecutado	% Desviación
General	2.32%	0.82%	-1.50%

Este análisis se realiza con base en la metodología PMI de valor ganado descrita en el Plan de Gerencia, y será actualizado mensualmente en la "Plantilla de Seguimiento" **(Ver Anexo 3. Plantilla de seguimiento-Panel de Control).**

Del anexo 3. Plantilla de seguimiento – Panel de control extraemos las siguientes graficas que permiten evidenciar los avances en el proyecto.

Ilustración 11. Cuadro de porcentajes por frentes)


CONSTRUCCION	VALOR	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
MANTO VIAL	$ 24.788.783.741,00	1,68%	0,00%	-1,68%	20/06/2026
P. CRITICOS	$ 3.002.649.682,00	7,13%	7,96%	0,83%	20/06/2026
DRENAJES	$ 1.704.511.618,55	2,91%	0,07%	-2,84%	20/06/2026
SEGURIDAD VIAL	$ 235.049.799,00	0,00%	0,00%	0,00%	20/06/2026
MTO PARADEROS	$ 60.180.000,00	17,83%	5,00%	-12,83%	16/03/2026
COMPONENTES	$ 768.741.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	19/06/2026
MNTO VIAL	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**Fin**
PR1+130 al PR4+500	$ 1.220.591.813,45	34,05%	0,00%	-34,05%	26/08/2025
PR4+500 al PR25+500	$ 7.538.949.436,07			0,00%	11/12/2025
PR25+500 al PR46+500	$ 7.538.949.436,07			0,00%	30/03/2026
PR46+500 al PR60+300	$ 4.954.166.772,28			0,00%	19/05/2026
PR60+300 al PR70+150	$ 3.536.126.283,12			0,00%	20/06/2026
PTO CRITICOS	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR50+625 _Box culvert (*)	$ 153.485.512,46	20,11%	0,00%	-20,11%	20/08/2025
PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 128.258.827,95	0,00%	48,61%	48,61%	24/11/2025
PR48+900. Muro	$ 293.929.271,50	62,33%	60,14%	-2,19%	20/08/2025

(*) EL atraso en el Punto critico PR50+625 no es impuable al contratista toda vez que no se ha dado aprobacion al POC para dar inicio a las obras.

En el cuadro anterior, muestra los avances en los diferentes frentes de obra, se viene trabajando en los frentes de Puntos críticos, drenajes, mantenimiento de paraderos, aun no se ha logrado dar inicio al mantenimiento de vías, este último proyectamos se arranque en el mes de agosto de 2025.

En el mismo cuadro se registra el avance en los grandes capítulos que son mantenimiento de vías y puntos críticos. En el primer capítulo de mantenimiento de vías no se ha logrado dar inicio y en el segundo capítulo de puntos críticos se ha avanzado en 2 sectores. El punto crítico del PR50+625_ Box culvert, no se ha logrado iniciar debido a que para su intervención nos encontramos a la espera de la aprobación de un Permiso de ocupación de cauce (POC) el cual está en proceso de aprobación, por tanto y por depender de la aprobación de un tercero este atraso no puede ser imputable al contratista quien en ánimos de avanzar en las obras dio inicio temprano a PR41+512 trasladando por lo pronto los recursos a este nuevo frente.

Ilustración 12. Graficas de avance por frentes

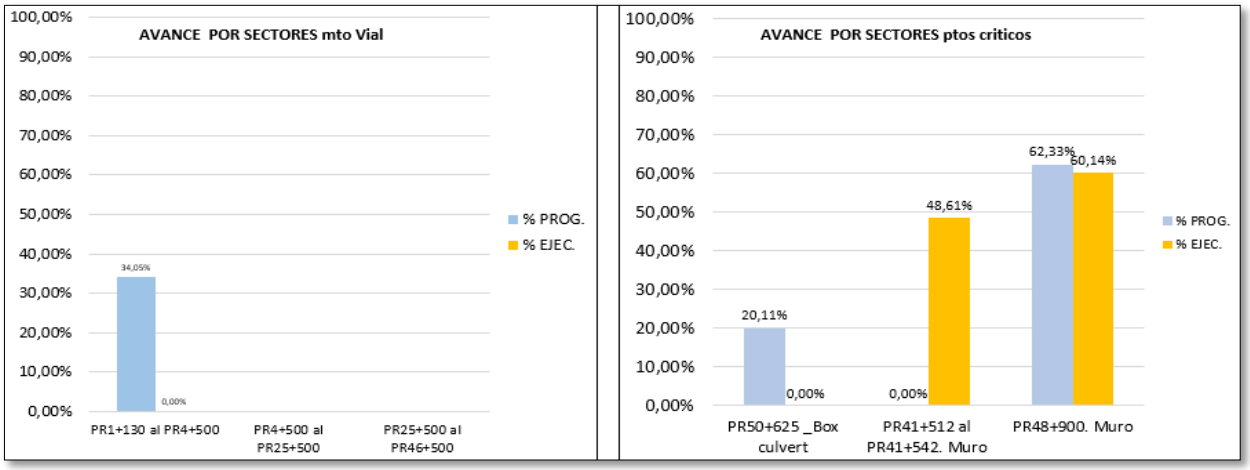

En la ilustración 12, se muestran gráficamente los avances en los grandes frentes de mantenimiento de vías y puntos críticos descritos en el párrafo anterior.

Para el mes próximo (agosto de 2025) El contratista planea dar inicio a las actividades de mantenimiento de vías y así ir recuperando paulatinamente el atraso en este frente.

5.3. Actividades Técnicas, administrativas y gerenciales.

Durante el mes de julio de 2025, el equipo técnico del CONSORCIO SOFAN C-046 continuó con la ejecución progresiva de las actividades constructivas, de seguimiento y gestión técnica del contrato, atendiendo los frentes priorizados y respondiendo a los requerimientos de la interventoría e ICCU. Se destacan las siguientes acciones:

Técnicas:

- **Ejecución física en frentes de obra:** Se avanzó con la construcción de los muros de contención en los PR 48+960 (caisson) y PR 41+500 (muro tipo L), así como con las actividades de mantenimiento de paraderos y limpieza de alcantarillas (actividad ya finalizada). Estas acciones permitieron consolidar la presencia operativa del contrato en campo y dar continuidad a la atención de los puntos críticos definidos.
- **Señalización preventiva y condiciones de seguridad**: Se solicitó al ICCU la implementación de señalización preventiva en puntos críticos con alto riesgo para la movilidad y la seguridad de los usuarios, en especial en sectores con afectaciones estructurales aún no intervenidas.
- **Atención a requerimientos de seguimiento diario:** Se atendió el requerimiento de la interventoría sobre el envío de reportes diarios de avance en los frentes activos, con el fin de fortalecer el monitoreo conjunto del desarrollo del proyecto.
- **Gestiones sobre la limpieza de alcantarillas:** Se respondió al oficio CTT-225-1273-25 reiterando que la limpieza de las cinco alcantarillas contempladas en el contrato ya fue ejecutada, y que, conforme a lo indicado en el Comité No. 13 del 23 de julio, no se continuará con esta actividad, la cual será asumida por la Dirección de Concesiones.

Administrativas:

- Se realizó la radicación del Programa Detallado de Trabajo (PDT) ajustado, atendiendo las observaciones formuladas durante el Comité Técnico del 2 de julio. Este documento incluye la programación actualizada de actividades, frentes de obra, recursos y prioridades técnicas.

- Posteriormente, mediante el oficio CTT-225-1326-25 del 17 de julio de 2025, la interventoría emitió visto bueno condicionado al PDT, solicitando la inclusión del Box Culvert ubicado en el PR 21+900. El contratista recibió dicha observación y se encuentra en proceso de incorporar el ajuste requerido, conforme a las instrucciones impartidas.

- Se mantuvo además la actualización periódica de los soportes administrativos requeridos por la interventoría y el ICCU, incluyendo reportes de personal y control documental.

Gerenciales:

- Coordinación técnica y logística para el despliegue progresivo de equipos y recursos hacia los frentes priorizados.
- Participación en comités de seguimiento, mesas técnicas y espacios de articulación con la interventoría e ICCU.
- De manera prioritaria, se reiteró al ICCU la urgencia del trámite y desembolso del anticipo contractual, mediante comunicación formal radicada el 18 de julio (Oficio FOR-CO-03-ICCU046-142), exponiendo los efectos que ha generado su no entrega en la ejecución técnica y en la sostenibilidad financiera del contrato. A la fecha del presente informe, el anticipo continúa pendiente de desembolso, situación que ha obligado al contratista a mantener la operación con recursos propios, limitando la ampliación de frentes y la ejecución de actividades de mayor impacto presupuestal, como las relacionadas con concreto asfáltico.

Adicional se presenta la relación de correspondencia enviada **(Ver Anexo 2. Cuadro de correspondencia).**

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-119	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1044-25, Solicitud inicio de trabajos de campo – Presentación de plan de contingencia para subsanar el atraso presentado en el oficio CTT-225-958-25
FOR-CO-03-ICCU046-120	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1150-25, Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.

FOR-CO-03-ICCU046-121	7/07/2025	ICCU	TECNICO	Solicitud urgente de implementación de señalización preventiva en puntos críticos de la Troncal del Tequendama
FOR-CO-03-ICCU046-122	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1124-25, INFORME TÉCNICO N°1 V2.
FOR-CO-03-ICCU046-123	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	INFORME TÉCNICO N° 2.
FOR-CO-03-ICCU046-131	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Remisión PDT, atendiendo a observaciones presentadas en Comité Técnico del 2 de julio de 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-136	12/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1282-25, Solicitud de reporte diario de frentes de trabajo
FOR-CO-03-ICCU046-139	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE CTT-225-1273-25, Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación.
FOR-CO-03-ICCU046-140	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1199-25, Revisión Muro PR48+900.
FOR-CO-03-ICCU046-141	15/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1280-25, Solicitud de

				concepto del especialista en geotecnia frente a condiciones de excavación en el PR 41+500.
FOR-CO-03-ICCU046-142	18/7/2025	ICCU	ICCU	Solicitud urgente de pronunciamiento y trámite del anticipo contractual
Correo DIRECTOR DE OBRA	22/7/2025	POLIMIX	TECNICO	Reclamación por incumplimiento logístico en suministro de concreto lunes 21 de julio 2025 – Polimix
FOR-CO-03-ICCU046-144	24/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1245-25, Traslado de oficio ICCU-S-2025-0004426 repuesta al oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños.

Tabla 1. Listado de correspondencia enviada Área Técnica, administrativa y gerencial

5.4. Plan de Manejo de Tránsito (PMT):


Durante el mes de julio de 2025, el CONSORCIO SOFAN C-046 continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los sectores donde se ejecutan actividades de obra, conforme a los diseños aprobados por el ICCU y la interventoría. La instalación del PMT se ha realizado de manera progresiva en los frentes activos, incluyendo elementos de señalización reglamentaria, preventiva e informativa, con el fin de garantizar la seguridad tanto del personal de obra como de los usuarios de la vía.

En el caso del PR 50+625, se reitera que no se ha dado inicio a las actividades de intervención física debido a la falta del Permiso de Ocupación de Cauce (POC), trámite que está a cargo del ICCU. Por tanto, y de acuerdo con lo estipulado contractualmente, no procede aún la instalación del PMT en este sector. Sin embargo, se ha manifestado de forma reiterada que la señalización actualmente presente es insuficiente y representa un riesgo para la seguridad de la comunidad.

Mediante el oficio FOR-CO-03-ICCU046-121 del 7 de julio de 2025, el Consorcio solicitó formalmente al ICCU la implementación urgente de señalización preventiva en diversos puntos críticos de la Troncal del Tequendama que no están bajo intervención directa del contratista. En la comunicación se argumenta que, dada la naturaleza del contrato, el Consorcio no tiene competencia para atender todos los sectores críticos identificados en la vía, muchos de los cuales presentan riesgos evidentes de colapso o pérdida de banca.

Con base en los recorridos técnicos realizados, el contratista ha identificado una serie de sectores con condiciones estructurales altamente peligrosas, cuya inestabilidad, pérdida de banca o socavación representan un riesgo directo para la comunidad y los usuarios de la vía. En este sentido, se adjuntó un listado detallado de los puntos más comprometidos, solicitando al ICCU coordinar con las entidades responsables la implementación de medidas preventivas temporales que mitiguen el riesgo para los usuarios, mientras se avanza en su atención conforme a la programación del contrato. A continuación, se presenta la relación fotográfica de algunos de los sectores que requieren atención y señalización urgente.

No	Registro Fotográfico
1	 
	PR50+625
2	 
	PR 50+690

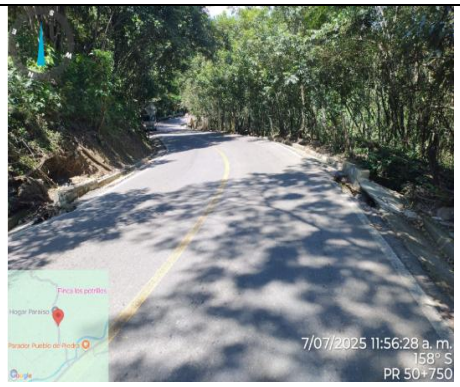3	 
	PR50+750
4	 
	PR50+825
5	
	PR61+430

6	 
	PR67+130
7	 
	PR68+650
8	 
	PR48+999

9	 
	PR46+900
10	 
	PR31+530

Tabla 2. Registro Fotográfico de puntos críticos

5.5. Componente Ambiental:

Durante el mes de julio de 2025, se adelantaron diversas gestiones y comunicaciones relacionadas con el componente ambiental del contrato ICCU 245 de 2025, orientadas al manejo adecuado de los RCD, la atención de observaciones de interventoría y autoridades, la coordinación con entes municipales y ambientales, así como la implementación de medidas de mitigación y seguimiento ambiental en obra. A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas.

Tabla 3. Listado de Actividades, Componente Ambiental.

ACTIVIDADES
Mediante comunicado CAR 13252008178 del 01 de julio de 2025, la CAR remite Respuesta al radicado 13251000753: RCD CONTRATO Numero único generador: 13251000753.

El día 02 de julio de 2025 mediante correo whatsapp La interventoría remite observaciones sobre material granular que se encuentra sobre la vía como contención y que por viento o escorrentia se va a lavar.
El día 02 de julio de 2025 mediante whatsapp el Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 remite a la Ing. Alejandra Tierradentro de Interventoría. respuesta y subsanación de las observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, del día 02 de julio de 2025.
Mediante comunicado CTT-225- 1200-25 del 03 de julio de 2025, la Interventoría envía Remisión de respuesta de la Alcaldía de San Antonio respecto al material resultante del fresado. Se adjunta el oficio SDPT No. 0457. Respuesta a solicitud de asignación de puntos para la disposición del material producto del fresado, de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de la Alcaldía Municipal de San Antonio de Tequendama.
Mediante oficio SIM No. 435-2025 del 04 de julio de 2025, la Secretaria de Infraestructura y Movilidad de la Alcaldía Municipal de El Colegio, envía Respuesta a solicitud de asignación de puntos para la disposición del material producto del fresado
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0126 del 07 de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta Comunicado
Mediante comunicado CTT-225- 1238-25 del 08 de julio de 2025, la Interventoría remite Reiteración gestión de RCD y cumplimiento normativo.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0129 del 08 de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta Comunicado CTT-225-1174-25 Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.
Mediante comunicado CTT-225-1258-25 del 09 de julio de 2025, la Interventoría remite Remisión de respuesta de la Alcaldía de Tocaima respecto al material resultante del fresado. Se adjunta el oficio No. 2025-SIDF-4490. Respuesta a solicitud de asignación de puntos para la disposición del material producto del fresado, de la Alcaldía Municipal de San Antonio de Tocaima.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0133 del 09 de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°2.
Mediante comunicado CTT-225-1259-25 del 09 de julio de 2025, la Interventoría remite Remisión de respuesta de la Alcaldía de El Colegio respecto al material resultante del fresado. Se adjunta el oficio SIM No. 434-2025 Respuesta a solicitud de asignación de puntos para la disposición del material producto del fresado, Secretaria de Infraestructura y Movilidad de la Alcaldía Municipal de El Colegio.
El día 09 de julio de 2025 se realizó y se asistió de manera virtual una mesa de trabajo del componente ambiental sobre el manejo adecuado de RCD y unidades sanitarias del contrato ICCU 245 de 2025, donde asistieron la Supervisora Ambiental del ICCU, la profesional ambiental de Interventoría y del contratista.
Mediante comunicado CTT-225-1263-25 del 10 de julio de 2025, la Interventoría remite Respuesta a solicitud de apoyo para la gestión de asignación de sitios de recepción de material sobrante RCD.
Mediante comunicado CTT-225-1273-25 del 10 de julio de 2025, la Interventoría remite Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación..
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0139 del 14 de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite a la Interventoría: Respuesta CTT-225-1273-25, Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación.

Mediante comunicado CTT-225-1292-25 del 14 de julio de 2025, la Interventoría remite Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.
Mediante comunicado CTT-225-1293-25 del 14 de julio de 2025, la Interventoría remite Observaciones al PAGA V4.
El día 14 de julio de 2025 mediante correo whatsapp La interventoría remite observaciones sobre la importancia de la protección de los RCD y su correcta conformación. En el PR41 también hay material disperso que aún no está conformado. En cuanto a la limpieza de paraderos, solicito por favor realizar la recolección y disposición de los residuos generados durante las actividades de limpieza. Y también tener presente los puntos ecológicos, en cuanto a su correcta disposición.
El día 15 de julio de 2025 mediante whatsapp el Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 remite a la Ing. Alejandra Tierradentro de Interventoría. respuesta y subsanación de las observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, del día 24 de julio de 2025.
Mediante comunicado CTT-225- 1319-25 del 16 de julio de 2025, la Interventoría remite Remisión de respuesta de la Alcaldía de Viotá respecto a la disposición del material resultante del fresado y del material común proveniente de excavaciones mecánicas.
El día 18 de julio de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite a la Supervisora ambiental del ICCU (Ing. Perla Lombo) para informar sobre la visita que tuvimos en la Alcaldía de Anapoima con el Secretario de Planeación Ing. Jeisson Contreras, para que nos colaborarán con la legalización y permisos de los predios que están solicitando y se les está entregando por Donación el material RCD (excavación) a los predios aledaños y para la emisión de los certificados de RCD por aprovechamiento y/o disposición, de acuerdo a la Resolución 1257 de 2021, en la cual manifestó que ellos no están encargados y no pueden generar esos permisos ni los certificados porque la autoridad ambiental no los habilita para eso..
Mediante comunicado CTT-225- 1335-25 del 18 de julio de 2025, la Interventoría remite Remisión de respuesta de la CAR frente al manejo de material RCD.
Mediante comunicado CAR 20252056112 del 18 de julio de 2025, la CAR remite Respuesta al radicado 20251074882: 1230-CAR-Oficio CAR solicitud de disposición de RCD.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0143 del 21 de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta al comunicado CTT-225-1292-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.
Mediante comunicado CTT-225- 1353-25 del 22 de julio de 2025, la Interventoría remite Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.
El día 23 de julio de 2025 mediante correo electrónico La interventoría remite observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, por la realización de labores de lavado de maquinaria (mezcladora de concreto) directamente sobre una zona blanda, sin la implementación de medidas de protección ambiental requeridas.
El día 25 de julio de 2025 mediante whatsaap el Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 remite a la Ing. Alejandra Tierradentro de Interventoría. respuesta y subsanación de las observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, por la realización de labores de lavado de maquinaria (mezcladora de concreto) directamente sobre una zona blanda, sin la implementación de medidas de protección ambiental requeridas.

Mediante comunicado CTT-225- 1406-25 del 30 de julio de 2025, la Interventoría remite Alcance al oficio CTT-225-1353-25.
Se asistió de manera virtual a los comités integrales del contrato ICCU 245 de 2025, los días 02, 09, 16, 23 y 30 de julio de 2025.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

Tabla 4. Listado correspondencia enviada Componente Ambiental

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-129	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1174-25, Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.
FOR-CO-03-ICCU046-130	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Informe Gerencial No.2 1 al 30 junio del 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-133	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°2
-	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	COMUNICADO CAR 13252008178 PMARCDNUG 13251000753
-	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL	AMBIENTAL	ACTUALIZACION DEL PAGA V4

		TEQUENDAMA 49		
FOR-CO-03-ICCU046-143	21/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1292-25, Atención al oficio FOR-CO- 03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.

5.6. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Durante el mes de julio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 desarrolló diversas actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas a garantizar la protección del personal, el cumplimiento de la normatividad vigente y la prevención de riesgos en los diferentes frentes de obra. Estas acciones incluyeron procesos de inducción, dotación y reposición de EPP, inspecciones, instalación de elementos de seguridad, gestión de recursos y acompañamiento en actividades críticas. A continuación, se relacionan las principales actividades ejecutadas.

Tabla 5. Listado de Actividades, Componente SST

ACTIVIDADES SST
Inducciones al personal del Consorcio Sofan C-046
Inducciones al personal de URBANUZ
Entrega de dotación y EPP
Reposición de dotación y EPP deteriorados a contratista URBANUZ
Reposición de dotación y EPP deteriorados a Consorcio Sofan C-046
Notificación de riesgo a el personal
Charlas SST al personal en los diferentes frentes de trabajo
Gestionar la adquisición de los puntos de emergencia para el KM 41+512
Gestionar la adquisición de los puntos ecológicos para el KM 41+512
Inspección a los EPP
Gestionar la adquisición del punto de emergencia de la oficina
Realizar pausas activas a todo el personal
Instalación de puntos de anclaje para trabajo seguro en alturas
Recibir dotación enviada de Bogotá
Inspeccionar puntos de emergencia y ecológico en el KM48+900,
Gestionar hidratación para el personal en los diferentes frentes de obra
Acompañamiento de actividades criticas en los diferentes puntos de obra
Realizar informe de gestión SST mensual
señalización y demarcación en el KM48+900
Entrega y recepción de preoperacionales
Cierre de observaciones
Asistir a los comités

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción

de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-117	1/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.
FOR-CO-03-ICCU046-118	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, CTT-225-1059-25, CTT-225-1159-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST.
FOR-CO-03-ICCU046-124	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	INFORME SST No. 2 1 al 30 junio del 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-125	7/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión Documentos Camión PRY 569
FOR-CO-03-ICCU046-127	7/07/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta al comunicado CTT-225-1214-25, Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.
FOR-CO-03-ICCU046-132	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.
FOR-CO-03-ICCU046-137	13/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal en obra.

FOR-CO-03-ICCU046-145	25/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1299-25, Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0132, FOR-CO-03-ICCU046-0137 Entrega de documentación SST personal operativo
FOR-CO-03-ICCU046-146	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1247-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0124 Informe SST N°2.
FOR-CO-03-ICCU046-147	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1240-25, Observaciones componente SST.
FOR-CO-03-ICCU046-148	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1281-25, Reiteración sobre el uso obligatorio de líneas de vida en excavaciones mayores a 1.50 metros.
FOR-CO-03-ICCU046-149	29/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentación SST personal operativo.
FOR-CO-03-ICCU046-151	31/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1402-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0145 documentación personal.

Tabla 6. Listado correspondencia enviada Componente SST

5.7. Componente Social

En este periodo se priorizaron acciones relacionadas con la divulgación de ofertas laborales para mano de obra no calificada, la atención a la comunidad y el seguimiento a predios cercanos

al área de intervención. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en este componente:

Tabla 7. Listado de Actividades, Componente Social

ACTIVIDAD
Durante el mes de julio, el componente social, en cumplimiento del Plan de Gestión Social y en relación con la protección de la infraestructura, llevó a cabo la elaboración de 10 actas de vecindad en el K 1+800, vereda Trujillo Bajo, así como un acta de espacio público. Con relación al fortalecimiento y participación: El componente técnico y social asiste a reunión convocada por la veeduría ciudadana, en las instalaciones de la interventoría Adicionalmente, se dio cumplimiento a los porcentajes establecidos por la entidad en cuanto a la vinculación de mano de obra no calificada (MONC). Se mantienen activos los canales de comunicación habilitados por el contratista para la comunidad En respuesta a una situación de agresión sufrida por un colaborador del consorcio en el K 41+500, en la Inspección El Triunfo y Patio Bonito, se realizó una campaña de sensibilización. Esta actividad contó con el acompañamiento de la Policía Nacional y permitió generar acercamientos con La comunidad la cual percibe la información de manera clara y accesible, lo que favorece una recepción positiva y una apropiación efectiva del mensaje. Adicionalmente se realiza acercamiento con los entes gubernamentales responsables de la Troncal del Tequendama Finalmente, se llevaron a cabo mesas de trabajo conjuntas con la interventoría del contrato, con el fin de coordinar y hacer seguimiento a las acciones sociales y contractuales del proyecto

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-126	7/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1214-25, Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.
FOR-CO-03-ICCU046-128	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe Social No.2 1 al 30 junio del 2025.

-	9/7/2025	POLICIA NACIONAL	SOCIAL	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL PARA OBRA EN EJECUCIÓN
-	9/7/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	ACOSO POR PARTE DE CIUDADANOS - EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS
FOR-CO-03-ICCU046-134	11/7/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	SOCIAL	INFORME- AGRECIONES PERSONALES Y ACTO DE VANDALISMO K41+500
FOR-CO-03-ICCU046-135	11/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado – Oficio CTT-225-1261-25, Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad.
FOR-CO-03-ICCU046-138	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado – Oficio CTT-225-1272-25, Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad
FOR-CO-03-ICCU046-150	30/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Inventario de predios K 1+800 - Registro fotográfico

Tabla 8. Listado correspondencia enviada Componente Social

5.8. Gestiones logísticas y operativas

Durante el mes de julio de 2025 se realizaron acciones logísticas orientadas a garantizar la continuidad de las actividades en los frentes priorizados, pese a las restricciones financieras derivadas del no desembolso del anticipo contractual. Entre las principales gestiones se destacan: el traslado y distribución de maquinaria pesada y equipo menor a los puntos de intervención; la instalación y mantenimiento del Plan de Manejo de Tránsito en los sectores activos; la coordinación para el suministro de materiales e insumos requeridos para la construcción de muros de contención en los PR 48+960 y PR 41+500; y la ejecución de labores de mantenimiento de paraderos y limpieza de alcantarillas. Estas acciones se complementaron con la actualización del Programa Detallado de Trabajo, la radicación de soportes técnicos y administrativos ante la interventoría, y la participación en comités y mesas de trabajo, asegurando la trazabilidad operativa y documental de cada actividad.

5.9. Limitaciones encontradas

Las principales limitaciones del periodo se relacionan con la persistente ausencia del desembolso del anticipo contractual, situación que continúa afectando el flujo de caja del proyecto y limita la apertura de nuevos frentes de trabajo, especialmente aquellos que requieren inversiones significativas como el mantenimiento con concreto asfáltico. Asimismo, se mantiene la imposibilidad de intervenir el punto crítico PR 50+625 debido a la falta del Permiso de

Ocupación de Cauce, trámite a cargo del ICCU y que es indispensable para iniciar obras en ese sector. A estas circunstancias se sumaron dificultades logísticas en la programación de suministro de materiales, lo que exigió reprogramaciones y ajustes en la secuencia constructiva para optimizar los recursos disponibles.

5.10. Seguimiento por indicadores

En línea con lo establecido en el Plan de Gerencia del Proyecto y con el fin de fortalecer el componente de seguimiento por metas, se ha estructurado una matriz de indicadores técnicos que permite evaluar el desempeño del contrato por fases, incorporando variables como avance físico programado y ejecutado, fechas de cumplimiento y posibles desviaciones. Esta herramienta de control se actualiza mensualmente y permite hacer seguimiento detallado a la ejecución del proyecto. El informe consolidado correspondiente al mes de julio de 2025 se encuentra en el archivo anexo. **(Ver Anexo 3. Plantilla de Seguimiento – Indicadores Mensuales).**

6. RECURSO HUMANO

Durante el periodo, el proyecto contó con el siguiente personal técnico y operativo vinculado al desarrollo de actividades:

Tabla 9. Personal del Contratista – Consorcio SOFAN C-046

No.	Nombre contratante	Datos /l trabajador			
		Nombres y Apellidos	TIPO / DOCUMENTO	Cédula / ciudadanía No.	Cargo
1	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Carlos Daniel Tinoco Sopo	CC	1073428676	Inspector Vial
2	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Elefileth Ricardo Valderrama	CC	1102827156	Residente tecnico
3	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Francisco Alexander Ramirez	CC	79891992	Residente Ambiental
4	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	Eliana Barrios Garcia	CC	1067846724	Inspector Vial
5	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	David Andres Castellanos	CC	1013594757	Inspector Vial
6	CONSORCIO SOFAN C-046	Julio Cesar Bogotá	CC	79584147	Director de obra
7	CONSORCIO SOFAN C-046	Yadmin Gracy Parra	CC	35377240	Inspectora Social

8	CONSORCIO SOFAN C-046	Edison Aguilar Corchuelo	CC	3152286	Conductor
9	CONSORCIO SOFAN C-046	Adriana Manrique Zárate	CC	52295147	Residente SST
10	CONSORCIO SOFAN C-046	Katherine Guayacan Parra	CC	100072645	Residente Social
11	CONSORCIO SOFAN C-046	German Quintero Chavez	CC	93295779	Inspector Vial
12	CONSORCIO SOFAN C-046	Luis López	CC	5570315	Cadenero
13	CONSORCIO SOFAN C-046	Carlos Poveda	CC	79898295	Topografo
14	CONSORCIO SOFAN C-046	Yeison Garavito	CC	1015423004	Residente tecnico
15	CONSORCIO SOFAN C-046	Sergio Arturo Vargas	CC	1000618103	Inspector Vial
16	CONSORCIO SOFAN C-046	Cindy Nataly Aparicio	CC	1052393378	Administradora de obra
17	CONSORCIO SOFAN C-046	Julieth Avendaño Sandoval	CC	1070332265	Auxiliar de trafico
18	CONSORCIO SOFAN C-046	Laura Rodriguez Gomez	CC	1005700126	Auxiliar de trafico
19	CONSORCIO SOFAN C-046	Felix Manuel Gonzalez Ramirez	CC	1070034893	Auxiliar de trafico
20	CONSORCIO SOFAN C-046	Nelson Molina Bejarano	CC	80388530	Auxiliar de trafico
21	CONSORCIO SOFAN C-046	Mario Morales Cano	CC	368894	Conductor
22	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Luis Raul Ramirez Camacho	CC	1007770085	Operador de maquinaria
23	CONSORCIO SOFAN C-046	John Fredy Cifuentes Ramirez	CC	1024498865	Almacenista
24	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Julian Eduardo Sanchez Angel	CC	1069403902	Operador de maquinaria

25	CONSORCIO SOFAN C-046	Jose Leonardo Crespo Sanchez	CC	1069402943	Auxiliar de trafico
26	URBANUZ	Maikol Ivan Cruz Cruz	CC	1024590518	Auxiliar de obra
27	URBANUZ	Rafael Moreno Yepez	CC	7958232	Auxiliar de obra
28	URBANUZ	Simeon Arturo Marin Mendez	CC	93451240	Auxiliar de obra
29	URBANUZ	Angelo Wilmar Hernandez Herrera	CC	1096952544	Ayudante
30	URBANUZ	Luis Fernando Gutierrez Gutierrez	CC	1002499758	Oficial
31	CONSORCIO SOFAN C-046	Yeimy Romero Montilla	CC	1070332522	Auxiliar de trafico
32	URBANUZ	Hugo Sanchez Zamora	CC	79920251	Inspector de obra
33	URBANUZ	Hector Morales Vega	CC	7687846	Ayudante
34	URBANUZ	John Gutierrez Diaz	CC	1052952441	Ayudante
35	URBANUZ	Jefferson Galindo Beltran	CC	1070329806	Ayudante
36	URBANUZ	Fabio Unse Cabrera	CC	8352449	Ayudante
37	URBANUZ	Cristian Maldonado Rincón	CC	1078827339	Ayudante
38	URBANUZ	Jose Piñeros Garzón	CC	80384552	Ayudante
39	CONSORCIO SOFAN C-046	Julian Galán Martínez	CC	80171639	Auxiliar de trafico
40	URBANUZ	Octavio Marín Mendez	CC	5884022	Ayudante
41	URBANUZ	Alfonso Castro Peña	CC	1043977466	Ayudante
42	CONSORCIO SOFAN C-046	María Viviana Pérez Poveda	CC	1070331584	Auxiliar de trafico
43	CONSORCIO SOFAN C-046	Jhonathan Rojas Quitian	CC	1015473673	Auxiliar de trafico
44	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Jennifer Rincón Ortiz	CC	1033683761	Inspectora SST

7. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

7.1. Estado general del contrato:

A la fecha de corte del presente informe, el estado financiero del proyecto es el siguiente:

Contrato No. ICCU-CTO-245 DE 2025
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-046
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

Valor inicial del contrato: $30.559.916.220
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación: 20 de junio de 2026
Plazo de ejecución inicial: 14 meses

Tabla 10. Estado Financiero Contrato.

CONCEPTO/ACTA	OBRA	PAGA	PMT	PROVISIÓN AJUSTES VARIACIÓN COSTOS INSUMOS	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 29.791.174.841,00	$ 266.141.379,00	$ 402.600.000,00	$ 100.000.000,00	$ 30.559.916.220,00
ANTICIPO	20%	N/A	N/A	N/A	
	$ 6.111.983.244,00				$ 6.111.983.244,00
POR EJECUTAR	**$ 29.791.174.841,00**	**$ 266.141.379,00**	**$ 402.600.000,00**	**$ 100.000.000,00**	**$ 30.559.916.220,00**

A la fecha, se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos contractuales exigidos para el trámite del anticipo, incluida la constitución del patrimonio autónomo. Actualmente, se está a la espera del desembolso de los recursos por parte de la entidad.

7.2. Inversión del anticipo

El anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato será amortizado de manera progresiva mediante descuentos aplicables a las actas parciales de ejecución, conforme a las condiciones contractuales. Aunque su entrega no condiciona el inicio del contrato, representa un soporte financiero fundamental para dar continuidad a las actividades técnicas, logísticas y operativas.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista ha adelantado de manera oportuna y completa todos los trámites administrativos y financieros requeridos por la entidad para el desembolso del anticipo. En consecuencia, se encuentra a la espera de estos recursos, mientras ha sostenido el avance inicial con recursos propios.

7.3. Garantías y seguros

Tabla 11. Garantías y amparos para el contrato

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	21/04/25	22/10/26	$6.111.983.244.00
Buen manejo del anticipo	21/04/25	22/10/26	$ 6.111.983.224.00
Prestaciones sociales	21/04/25	21/06/29	$ 6.111.983.244.00
Calidad y Estabilidad de la obra	20/06/26	20/06/31	$ 8.937.352.452,30
RCE	21/04/25	20/06/26	$1.527.995.811.00

Fuente: Póliza No. 87833 Anexo 2 – 25529 Anexo 1

8. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO

8.1. Seguimiento financiero al PAGA

Para el periodo correspondiente al mes de junio de 2025, no se ha generado facturación ante la entidad contratante por actividades específicas del componente ambiental.

Cabe resaltar que el presupuesto asignado en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), aprobado por interventoría y supervisión, corresponde a un valor global de $266.141.379, el cual contempla todos los costos y gastos asociados con el componente ambiental, social y SST.

En este sentido, el seguimiento financiero del componente se mantendrá actualizado conforme se generen avances de facturación y ejecución presupuestal en los próximos periodos.

Tabla 12. Estado Financiero PAGA

CONCEPTO/ACTA	PAGA	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 266.141.379,00	$ 266.141.379,00
ANTICIPO	N/A	
POR EJECUTAR	**$ 266.141.379,00**	**$ 266.141.379,00**

8.2. Seguimiento financiero al PMT

Durante el presente periodo correspondiente al mes de junio de 2025, no se registra ejecución financiera asociada al componente de Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Si bien se ha dado inicio a la implementación del PMT aprobado.

En este sentido, el seguimiento financiero del PMT se mantendrá actualizado conforme se generen avances de facturación y ejecución presupuestal en los próximos periodos.

Tabla 13. Estado Financiero PMT

CONCEPTO/ACTA	PMT	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 402.600.000,00	$ 402.600.000,00
ANTICIPO	N/A	
POR EJECUTAR	**$ 402.600.000,00**	**$ 402.600.000,00**

Actualmente nos encontramos en proceso de ejecución del Corte de Obra No. 1 y 2, el cual incluirá el cobro de los diferentes componentes del contrato, entre ellos el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), conforme a los avances físicos y a las actividades ejecutadas en campo. Una vez se culmine este corte y se radique la correspondiente factura ante la entidad contratante, se actualizará la información financiera de cada componente en los próximos informes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Durante el mes de julio de 2025, el contrato ICCU-CTO-245 de 2025 mantuvo su ejecución en fase operativa, priorizando la atención de puntos críticos y actividades de mantenimiento en los frentes autorizados por la interventoría. Se logró avanzar de manera significativa en la construcción de muros de contención en los PR 48+960 y PR 41+500, así como en el la limpieza de alcantarillas contempladas en el alcance contractual.

Pese a las restricciones derivadas del no desembolso del anticipo contractual y a la falta de permisos para intervenir ciertos sectores como el PR 50+625, el consorcio sostuvo la operatividad mediante la optimización de recursos propios y la reprogramación estratégica de actividades, manteniendo la trazabilidad técnica y administrativa de todas las gestiones. La coordinación con la interventoría y el ICCU permitió ajustar el Programa Detallado de Trabajo y dar continuidad al proyecto, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y normatividad aplicable.

Recomendaciones:

- Gestionar de manera prioritaria ante el ICCU el desembolso del anticipo contractual, considerando su impacto directo en la apertura de frentes y en la ejecución de actividades de alto costo como el mantenimiento con concreto asfáltico.
- Insistir en el trámite y obtención del Permiso de Ocupación de Cauce para el PR 50+625, a fin de iniciar oportunamente las obras de mitigación en este punto crítico.
- Mantener la estrategia de optimización y priorización de recursos mientras persista la limitación financiera, garantizando la atención continua de los frentes activos.
- Continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la comunicación con la interventoría para agilizar la resolución de trámites, observaciones y ajustes técnicos.
- Evaluar y documentar las lecciones aprendidas de la secuencia constructiva ajustada en julio, de manera que sirvan de base para la planeación de los próximos meses y permitan recuperar el desfase registrado frente a lo programado.

10. ANEXOS

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 1

PROGRAMACIÓN

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% plan. 25-07-2025	% ejec. 25-07-2025	% físico completado	CPTP	CPTR	Costo
0	**0**	**ICCU-245-2025-MTO VIA TEQUENDAMA_CLB1**	**287 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 20/06/26**	**2,32%**	**0,82%**	**1%**	**$ 689.987.064,47**	**$ 243.239.485,93**	**$ 29.791.174.841,00**
1	**1**	**MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN**	**287 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 20/06/26**	**2,32%**	**0,82%**	**1%**	**$ 689.987.064,47**	**$ 243.239.485,93**	**$ 29.791.174.841,00**
2	**1.1**	**INICIO**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**100,00%**	**100,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
3	**1.1.1**	**FIRMA DE CONTRATO**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
4	**1.1.2**	**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
5	**1.2**	**PRELIMINARES - PLANIFICACION. Fase 1**	**33 días**	**lun 21/04/25**	**lun 9/06/25**	**100,00%**	**100,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
10	**1.3**	**CONSTRUCCION. Fase 2**	**269 días**	**vie 16/05/25**	**sáb 20/06/26**	**2,32%**	**0,82%**	**1%**	**$ 689.987.064,47**	**$ 243.239.485,93**	**$ 29.791.174.841,00**
11	**1.3.1**	**MANTENIMIENTO VIAL**	**239 días**	**mar 1/07/25**	**sáb 20/06/26**	**1,68%**	**0,00%**	**0%**	**$ 415.567.351,42**	**$ 0,00**	**$ 24.788.783.740,99**
12	**1.3.1.1**	**PR1+130 al PR4+500**	**38 días**	**mar 1/07/25**	**mar 26/08/25**	**34,05%**	**0,00%**	**0%**	**$ 415.567.351,42**	**$ 0,00**	**$ 1.220.591.813,45**
18	**1.3.1.2**	**PR4+500 al PR25+500**	**73 días**	**mar 26/08/25**	**jue 11/12/25**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 7.538.949.436,07**
24	**1.3.1.3**	**PR25+500 al PR46+500**	**73 días**	**jue 11/12/25**	**lun 30/03/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 7.538.949.436,07**
30	**1.3.1.4**	**PR46+500 al PR60+300**	**33 días**	**lun 30/03/26**	**mar 19/05/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.954.166.772,28**
36	**1.3.1.5**	**PR60+300 al PR70+150**	**22 días**	**mar 19/05/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.536.126.283,12**
42	**1.3.2**	**FIN MANTENIMIENTO VIAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
43	**1.3.3**	**PUNTOS CRITICOS**	**269 días**	**vie 16/05/25**	**sáb 20/06/26**	**7,13%**	**7,96%**	**8%**	**$ 214.078.092,97**	**$ 239.106.358,15**	**$ 3.002.649.682,46**
44	**1.3.3.1**	**PR50+625 _Box culvert**	**48 días**	**mar 10/06/25**	**mié 20/08/25**	**20,11%**	**0,00%**	**0%**	**$ 30.862.036,23**	**$ 0,00**	**$ 153.485.512,46**
51	**1.3.3.2**	**PR1+100 al PR1+135 - peaje**	**15 días**	**mié 20/08/25**	**mié 10/09/25**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.591.510,40**
55	**1.3.3.3**	**PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)- Rep. pav. Articulado**	**56 días**	**vie 1/08/25**	**jue 23/10/25**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 826.789.890,70**
61	**1.3.3.4**	**PR2+060 al PR2+080 - Muro**	**60 días**	**mié 10/09/25**	**mar 9/12/25**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 239.380.239,60**
68	**1.3.3.5**	**PR4+600 al PR4+620. manejo de aguas**	**37 días**	**mar 9/12/25**	**mar 3/02/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 43.087.817,60**
73	**1.3.3.6**	**PR13+416 al PR13+436 - Box. Arreglar**	**36 días**	**mar 3/02/26**	**jue 26/03/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 16.338.577,75**
79	**1.3.3.7**	**PR21+700 al PR21+720- Box. Arreglar**	**36 días**	**jue 26/03/26**	**mié 20/05/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 46.072.380,00**
85	**1.3.3.8**	**PR21+760. Baden**	**21 días**	**mié 20/05/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 92.171.465,00**
90	**1.3.3.9**	**PR21+950 al PR22+020. Muro**	**76 días**	**jue 26/02/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.038.323.639,50**
97	**1.3.3.10**	**PR40+060 al PR40+090. Rep. pav. Articulado**	**64 días**	**lun 24/11/25**	**jue 26/02/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 120.220.550,00**
103	**1.3.3.11**	**PR41+512 al PR41+542. Muro**	**65 días**	**mié 20/08/25**	**lun 24/11/25**	**0,00%**	**48,61%**	**49%**	**$ 0,00**	**$ 62.341.795,35**	**$ 128.258.827,95**
109	**1.3.3.12**	**PR48+900. Muro**	**49 días**	**lun 9/06/25**	**mié 20/08/25**	**62,33%**	**60,14%**	**60%**	**$ 183.216.056,74**	**$ 176.764.562,80**	**$ 293.929.271,50**
116	**1.3.3.13**	**DISEÑOS, PERMISOS Y OTROS**	**211 días**	**vie 16/05/25**	**mié 25/03/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
161	**1.3.4**	**FIN OBRAS DE PUNTOS CRITICOS**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
162	**1.3.5**	**DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL**	**254 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 20/06/26**	**2,91%**	**0,07%**	**0%**	**$ 49.612.159,56**	**$ 1.124.127,78**	**$ 1.704.511.618,55**
163	**1.3.5.1**	**PR1+130 al PR4+500**	**43 días**	**lun 9/06/25**	**lun 11/08/25**	**22,11%**	**0,07%**	**0%**	**$ 49.612.159,56**	**$ 147.963,26**	**$ 224.356.253,29**
171	**1.3.5.2**	**PR4+500 al PR25+500**	**58 días**	**mar 26/08/25**	**mié 19/11/25**	**0,00%**	**0,07%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 422.674,76**	**$ 640.900.484,68**
179	**1.3.5.3**	**PR25+500 al PR46+500**	**58 días**	**jue 11/12/25**	**vie 6/03/26**	**0,00%**	**0,07%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 213.370,76**	**$ 323.533.451,24**
187	**1.3.5.4**	**PR46+500 al PR60+300**	**32 días**	**lun 30/03/26**	**lun 18/05/26**	**0,00%**	**0,07%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 235.467,00**	**$ 357.037.912,62**
195	**1.3.5.5**	**PR60+300 al PR70+150**	**22 días**	**mar 19/05/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,07%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 104.652,00**	**$ 158.683.516,72**
203	**1.3.6**	**FIN DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
204	**1.3.7**	**OBRAS DE SEGURIDAD VIAL**	**63 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 235.049.799,00**
230	**1.3.8**	**FIN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL**	**0 días**	**mié 15/04/26**	**mié 15/04/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
231	**1.3.9**	**MANTENIMIENTO DE PARADEROS**	**190 días**	**lun 9/06/25**	**lun 16/03/26**	**17,83%**	**5,00%**	**5%**	**$ 10.729.460,53**	**$ 3.009.000,00**	**$ 60.180.000,00**
233	**1.3.10**	**FIN MANTENIMIENTO DE PARADEROS**	**0 días**	**lun 16/03/26**	**lun 16/03/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
234	**1.4**	**CIERRE DE CONTRATO**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 2

CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FOR-CO-01
Versión 01

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO	TIPO				ANEXOS O FOLIOS	RESPUESTA	OFICIO DE RESPUESTA
125	FOR-CO-03-ICCU046-117	1/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	4 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1198-25
126	FOR-CO-03-ICCU046-118	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, CTT-225-1059-25, CTT-225-1159-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST.	X			X	Informe 21 Folios/ Anexo 12	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
127	FOR-CO-03-ICCU046-119	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1044-25, Solicitud inicio de trabajos de campo – Presentación de plan de contingencia para subsanar el atraso presentado en el oficio CTT-225-958-25	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1460-25
128	FOR-CO-03-ICCU046-120	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1150-25, Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
129	FOR-CO-03-ICCU046-121	7/07/2025	ICCU	TECNICO	Solicitud urgente de implementación de señalización preventiva en puntos críticos de la Troncal del Tequendama	X			X	N/A	ICCU	
130	FOR-CO-03-ICCU046-122	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1124-25, INFORME TÉCNICO N°1 V2.	X			X	Informe Técnico (27 Folios) #Anexo (7)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
131	FOR-CO-03-ICCU046-123	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	INFORME TÉCNICO N° 2.	X			X	Informe Técnico (31 Folios) #Anexo (8)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
132	FOR-CO-03-ICCU046-124	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	INFORME SST No. 2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	Informe SST (20 Folios) Anexo (11)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
133	FOR-CO-03-ICCU046-125	7/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión Documentos Camión PRY 569	X			X	Carpeta 1	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
134	FOR-CO-03-ICCU046-126	7/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1214-25, Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
135	FOR-CO-03-ICCU046-127	7/07/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta al comunicado CTT-225-1214-25, Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	X			X	3 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
136	FOR-CO-03-ICCU046-128	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe Social No.2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	23 folios (11 Anexos)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
137	FOR-CO-03-ICCU046-129	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1174-25, Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.	X			X	9 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
138	FOR-CO-03-ICCU046-130	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Informe Gerencial No.2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
139	FOR-CO-03-ICCU046-131	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Remisión PDT, atendiendo a observaciones presentadas en Comité Técnico del 2 de julio de 2025.	X			X	2 Folios 3 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
140	FOR-CO-03-ICCU046-132	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	5 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1299-25
141	FOR-CO-03-ICCU046-133	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°2	X			X	Informe Técnico (26 Folios) Anexo (9 Carpetas)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
142	-	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	COMUNICADO CAR 13252008178 PMARCD NUG 13251000753	X			X	2 Folios	N/A	
143	-	9/7/2025	POLICIA NACIONAL	SOCIAL	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL PARA OBRA EN EJECUCIÓN	X			X	1 Folio	POLICIA NACIONAL	
144	-	9/7/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	ACOSO POR PARTE DE CIUDADANOS - EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS	X			X	1 Folio	VEEDURIA CIUDADANA	
145	FOR-CO-03-ICCU046-134	11/7/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	SOCIAL	INFORME- AGRECIONES PERSONALES Y ACTO DE VANDALISMO K41+500	X			X	3 Folios	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	
146	FOR-CO-03-ICCU046-135	11/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado – Oficio CTT-225-1261-25, Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
147	FOR-CO-03-ICCU046-136	12/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1282-25, Solicitud de reporte diario de frentes de trabajo	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
148	FOR-CO-03-ICCU046-137	13/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal en obra.	X			X	1 Folio 5 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1299-25
149	FOR-CO-03-ICCU046-138	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado – Oficio CTT-225-1272-25, Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad	X			X	Informe social (23 Folios) #Anexo (10)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
150	FOR-CO-03-ICCU046-139	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE CTT-225-1273-25, Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
151	FOR-CO-03-ICCU046-140	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1199-25, Revisión Muro PR48+900.	X			X	12 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
152	-	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ACTUALIZACION DEL PAGA V4	X			X	Paga V4	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
153	FOR-CO-03-ICCU046-141	15/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1280-25, Solicitud de concepto del especialista en geotecnia frente a condiciones de excavación en el PR 41+500.	X			X	Informe 2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
154	FOR-CO-03-ICCU046-142	18/7/2025	ICCU	ICCU	Solicitud urgente de pronunciamiento y trámite del anticipo contractual	X			X	4 Folios	ICCU	ICCU-E-2025-0009002 con la contraseña POiVVEuk8r // ICCU-S-2025-0004550 y la contraseña 97BX7fuPs5//ctt-225-1460-25
155	FOR-CO-03-ICCU046-143	21/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1292-25, Atención al oficio FOR-CO- 03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.	X			X	Informe Ambiental # 2 V2 (26 Folios) 9 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1353-25
156	Correo DIRECTOR DE OBRA	22/7/2025	POLIMIX	TECNICO	Reclamación por incumplimiento logístico en suministro de concreto lunes 21 de julio 2025 – Polimix				X	N/A	POLIMIX	
157	FOR-CO-03-ICCU046-144	24/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1245-25, Traslado de oficio ICCU-S-2025-0004426 repuesta al oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños.	X			X	Cotas Propuesta Adoquinada Nivelación Adoquinada Pavimento Articulado (Plano) Presupuesto	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1434-25
158	FOR-CO-03-ICCU046-145	25/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1299-25, Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0132, FOR-CO-03-ICCU046-0137 Entrega de documentación SST personal operativo	X			X	2 Carpetas Contrato Urbanuz	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
159	FOR-CO-03-ICCU046-146	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1247-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0124 Informe SST N°2.	X			X	Informe SST No 2 V2 14 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
160	FOR-CO-03-ICCU046-147	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1240-25, Observaciones componente SST.	X			X	Permisos ATS (13 Folios) Programa Procedimiento Alturas (66 Folios)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	

161	FOR-CO-03-ICCU046-148	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1281-25, Reiteración sobre el uso obligatorio de líneas de vida en excavaciones mayores a 1.50 metros.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
162	FOR-CO-03-ICCU046-149	29/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentación SST personal operativo.	X			X	4 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
163	FOR-CO-03-ICCU046-150	30/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Inventario de predios K 1+800 - Registro fotográfico				X	Link	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
164	FOR-CO-03-ICCU046-151	31/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1402-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0145 documentación personal.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR-CO-02
Versión 02

CONSEC.	FECHA RECIBIDO	TIPO			REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ANEXOS O FOLIOS	REQUIERE RESPUESTA			RESPUESTA	
		OFICIO	MEDIO MAG.	E-MAIL					SI	NO	RESPONSABLE	FECHA	CONSECUTIVO
CTT-225-1198-25	3/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0117	1 Folio		X			
CTT-225-1199-25	3/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Revisión Muro PR48+900	17 Folios	X		ELEFILETH RICARDO	14/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-140
CTT-225-1213-25	4/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-0102 Aprobación Informe mensual social 1	1 Folio		X			
CTT-225-1214-25	4/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	7/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-126
SIM No. 435-2025	4/7/2025	X		X	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	AMBIENTAL	RE SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-088 de fecha 9 de junio de 2025	1 Folio		X			
CTT-225-1235-25	7/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0118 Respuesta informe mensual SST #1 V3	1 Folio		X			
CTT-225-1238-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Reiteración gestión de RCD y cumplimiento normativo.	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1240-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Observaciones componente SST	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	28/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-147
CTT-225-1241-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU 046-0012-VALIDACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1 Folio		X			
CCT-225-1245-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Traslado de oficio ICCU-S-2025-0004426 repuesta al oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños.	3 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA/YEISON GARAVITO	24/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-144
CTT-225-1247-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0124 Informe SST N°2	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	28/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-146
CTT-225-1248-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta Al Oficio FOR-CO-03-ICCU046-0125 Remisión de documentos de vehículo para revisión y aprobación	1 Folio		X			
CTT-225-1258-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la Alcaldía de Tocaima respecto al material resultante del fresado.	2 Folios		X			
CTT-225-1259-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la Alcaldía de El Colegio Cundinamarca respecto al material resultante del fresado.	2 Folios		X			
CTT-225-1264-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-104 revisión informe de topografía	1 Folio	X		YEISON GARAVITO		
CTT-225-1261-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad.	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	11/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-135
CTT-225-1263-25	10/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta a solicitud de apoyo para la gestión de asignación de sitios de recepción de material sobrante RCD.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1273-25	10/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación	1 Folio	X		YEISON GARAVITO	14/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-139
CTT-225-1281-25	11/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Reiteración sobre el uso obligatorio de líneas de vida en excavaciones mayores a 1.50 metros	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	28/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-148
CTT-225-1280-25	11/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de concepto del especialista en geotecnia frente a condiciones de excavación en el PR 41+500	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	15/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-141
CTT-225-1282-25	11/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de reporte diario de frentes de trabajo	1 Folio	X		YEISON GARAVITO	12/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-136
CTT-225-1272-25	12/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Repuesta FOR-CO-03-ICCU046-0128 - Observaciones informe mensual social No 2 V1	2 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	14/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-138
CTT-225-1292-25	14/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	21/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-143
CTT-225-1293-25	14/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Observaciones al PAGA V4	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1319-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la Alcaldía de Viotá respecto a la disposición del material resultante del fresado y del material común proveniente de excavaciones mecánicas	2 Folios		X			
CTT-225-1299-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0132, FOR-CO-03-ICCU046-0137 Entrega de documentación SST personal operativo	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	25/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-145
CTT-225-1323-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-0138 Aprobación Informe mensual social 2 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1326-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-131 Validación PDT	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO		
CTT-225-1335-25	18/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la CAR frente al manejo de material RCD.	4 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1346-25	21/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Observaciones técnicas – Fundida de concreto y maniobras de izaje en PR 41+500 y PR 46+987	3 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		
13252008404	17/7/2025	X		X	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	AMBIENTAL	Respuesta al radicado 13251000753: RCD CONTRATO 245 DE 2025	3 Folios		X			
CTT-225-1353-25	22/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficioFOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	1/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-154
CTT-225-1402-25	30/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0145 Documentacion personal	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	31/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-151
CTT-225-1406-25	30/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Alcance al oficio CTT-225-1353-25	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ	1/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-154
CTT-225-1434-25	31/07/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-144 RE CTT-225-245-25 Trasl Of ICCU-S-2025-0004426	8 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		

ANEXO No 3


PLANTILLA DE SEGUIMIENTO


Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com


FECHA DE INFORME 27/07/2025

CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN


		PROGRAMADO				EJECUCION				INDICADORES		
		TOTAL CONTRATO				TOTALES					VARIACION	SPI
Semana No.	FECHA			CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	CRTR	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
		semana	acumulado									
Semana 1	25/05/2025	$ 24.990.824,95	$ 24.990.824,95	24,99	0,08%	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	12,50	0,04%	11,875	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	$ 128.389.189,85	$ 153.380.014,80	153,38	0,51%	$ 11.908.566,40	$ 24.408.566,40	24,41	0,08%	23,18813808	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	$ 113.862.825,47	$ 267.242.840,27	267,24	0,90%	$ 39.205.028,04	$ 63.613.594,44	63,61	0,21%	60,43291472	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	$ 197.605.612,71	$ 464.848.452,98	464,85	1,56%	$ 39.205.028,04	$ 102.818.622,48	102,82	0,35%	$ 97,68	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	$ 642.735.048,38	$ 1.107.583.501,36	1.107,58	3,72%	$ 39.205.028,04	$ 142.023.650,52	142,02	0,48%	$ 134,92	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	$ 515.194.675,47	$ 1.622.778.176,83	1.622,78	5,45%	$ 39.205.030,59	$ 181.228.681,11	181,23	0,61%	$ 172,17	-4,84%	0,11
Semana 7	6/07/2025	$ 61.153.535,14	$ 115.945.471,98	115,95	0,39%	$ 15.502.701,21	$ 196.731.382,32	196,73	0,66%	$ 186,89	0,27%	1,70
Semana 8	13/07/2025	$ 92.414.416,38	$ 208.359.888,36	208,36	0,70%	$ 15.502.701,21	$ 212.234.083,52	212,23	0,71%	$ 201,62	0,01%	1,02
Semana 9	20/07/2025	$ 164.000.015,45	$ 372.359.903,81	372,36	1,25%	$ 15.502.701,21	$ 227.736.784,73	227,74	0,76%	$ 216,35	-0,49%	0,61
Semana 10	27/07/2025	$ 317.627.160,66	$ 689.987.064,47	689,99	2,32%	$ 15.502.701,21	$ 243.239.485,93	243,24	0,82%	$ 231,08	-1,50%	0,35
Semana 11	3/08/2025	$ 355.731.086,90	$ 1.045.718.151,36	1.045,72	3,51%							
Semana 12	10/08/2025	$ 350.175.066,60	$ 1.395.893.217,95	1.395,89	4,69%							
Semana 13	17/08/2025	$ 313.881.270,12	$ 1.709.774.488,08	1.709,77	5,74%							
Semana 14	24/08/2025	$ 183.208.884,63	$ 1.892.983.372,71	1.892,98	6,35%							
Semana 15	31/08/2025	$ 65.611.456,29	$ 1.958.594.829,01	1.958,59	6,57%							
Semana 16	7/09/2025	$ 411.988.026,93	$ 2.370.582.855,95	2.370,58	7,96%							
Semana 17	14/09/2025	$ 438.227.533,37	$ 2.808.810.389,33	2.808,81	9,43%							
Semana 18	21/09/2025	$ 438.294.242,27	$ 3.247.104.631,61	3.247,10	10,90%							
Semana 19	28/09/2025	$ 502.249.147,67	$ 3.749.353.779,30	3.749,35	12,59%							
Semana 20	5/10/2025	$ 638.120.048,48	$ 4.387.473.827,79	4.387,47	14,73%							
Semana 21	12/10/2025	$ 666.886.179,61	$ 5.054.360.007,42	5.054,36	16,97%							
Semana 22	19/10/2025	$ 588.126.936,33	$ 5.642.486.943,75	5.642,49	18,94%							
Semana 23	26/10/2025	$ 854.198.922,61	$ 6.496.685.866,36	6.496,69	21,81%							
Semana 24	2/11/2025	$ 801.860.747,88	$ 7.298.546.614,23	7.298,55	24,50%							
Semana 25	9/11/2025	$ 721.933.552,92	$ 8.020.480.167,15	8.020,48	26,92%							
Semana 26	16/11/2025	$ 903.185.183,53	$ 8.923.665.350,67	8.923,67	29,95%							
Semana 27	23/11/2025	$ 609.590.305,16	$ 9.533.255.655,83	9.533,26	32,00%							
Semana 28	30/11/2025	$ 741.405.740,21	$ 10.274.661.396,05	10.274,66	34,49%							
Semana 29	7/12/2025	$ 752.283.999,78	$ 11.026.945.395,82	11.026,95	37,01%							
Semana 30	14/12/2025	$ 298.930.811,95	$ 11.325.876.207,77	11.325,88	38,02%							
Semana 31	21/12/2025	$ 246.704.025,32	$ 11.572.580.233,09	11.572,58	38,85%							
Semana 32	28/12/2025	$ 331.409.753,90	$ 11.903.989.986,98	11.903,99	39,96%							
Semana 33	4/01/2026	$ 84.046.653,77	$ 12.237.638.894,57	12.237,64	41,08%							
Semana 34	11/01/2026	$ 420.933.673,08	$ 12.658.572.567,67	12.658,57	42,49%							
Semana 35	18/01/2026	$ 450.388.320,25	$ 13.108.960.887,91	13.108,96	44,00%							
Semana 36	25/01/2026	$ 625.771.668,85	$ 13.734.732.556,76	13.734,73	46,10%							
Semana 37	1/02/2026	$ 639.647.319,37	$ 14.374.379.876,15	14.374,38	48,25%							
Semana 38	8/02/2026	$ 637.637.439,54	$ 15.012.017.315,68	15.012,02	50,39%							
Semana 39	15/02/2026	$ 641.857.139,46	$ 15.653.874.455,14	15.653,87	52,55%							
Semana 40	22/02/2026	$ 669.641.832,02	$ 16.323.516.287,17	16.323,52	54,79%							
Semana 41	1/03/2026	$ 704.676.763,97	$ 17.028.193.051,15	17.028,19	57,16%							
Semana 42	8/03/2026	$ 655.904.819,15	$ 17.684.097.870,29	17.684,10	59,36%							
Semana 43	15/03/2026	$ 616.668.142,91	$ 18.300.766.013,21	18.300,77	61,43%							
Semana 44	22/03/2026	$ 631.561.443,91	$ 18.932.327.457,12	18.932,33	63,55%							
Semana 45	29/03/2026	$ 507.381.192,87	$ 19.439.708.649,98	19.439,71	65,25%							
Semana 46	5/04/2026	$ 83.643.313,97	$ 19.523.351.963,92	19.523,35	65,53%							
Semana 47	12/04/2026	$ 749.189.274,81	$ 20.272.541.238,71	20.272,54	68,05%							
Semana 48	19/04/2026	$ 997.137.736,16	$ 21.269.678.974,85	21.269,68	71,40%							
Semana 49	26/04/2026	$ 1.005.930.059,95	$ 22.275.609.034,78	22.275,61	74,77%							
Semana 50	3/05/2026	$ 826.571.025,45	$ 23.102.180.060,25	23.102,18	77,55%							
Semana 51	10/05/2026	$ 1.089.311.769,75	$ 24.191.491.829,98	24.191,49	81,20%							
Semana 52	17/05/2026	$ 1.060.022.565,53	$ 25.251.514.395,51	25.251,51	84,76%							
Semana 53	24/05/2026	$ 386.301.971,84	$ 25.637.816.367,34	25.637,82	86,06%							
Semana 54	31/05/2026	$ 1.090.701.878,42	$ 26.728.518.245,76	26.728,52	89,72%							
Semana 55	7/06/2026	$ 1.144.406.431,66	$ 27.872.924.677,43	27.872,92	93,56%							
Semana 56	14/06/2026	$ 953.081.058,87	$ 28.826.005.736,31	28.826,01	96,76%							
Semana 57	21/06/2026	$ 965.169.104,71	$ 29.791.174.841,00	29.791,17	100,00%							

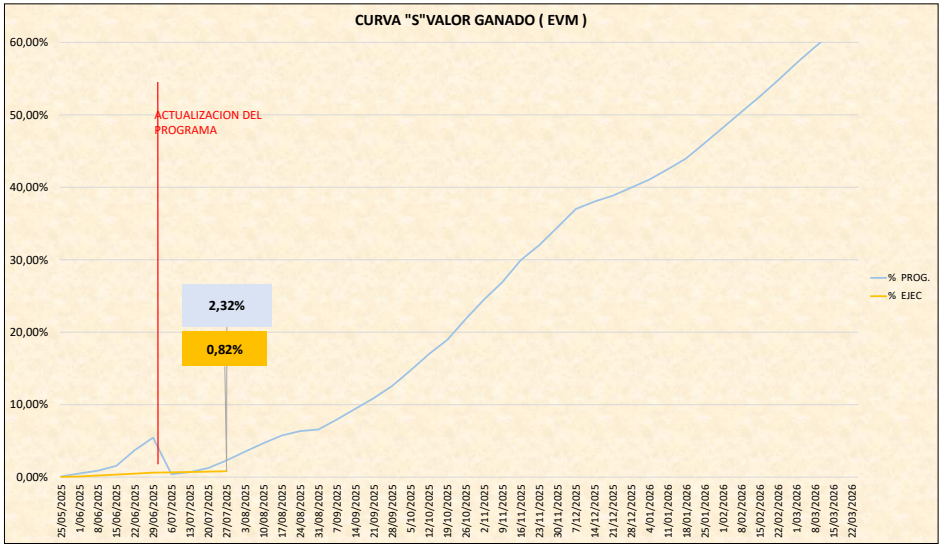

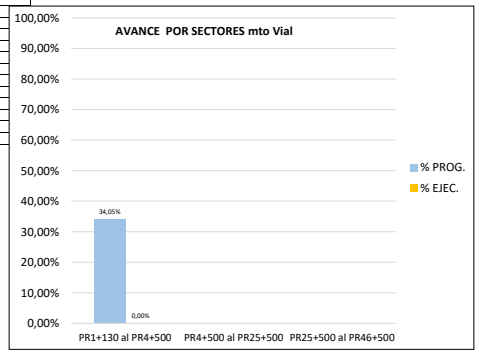

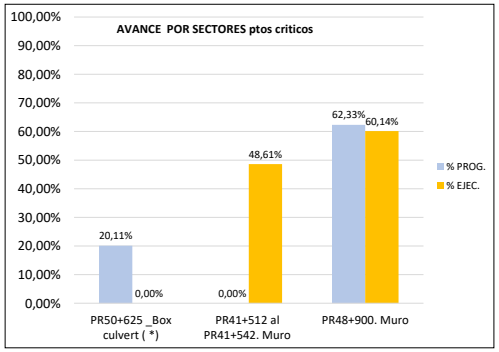

CONSTRUCCION	VALOR	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
MANTO VIAL	$ 24.788.783.741,00	1,68%	0,00%	-1,68%	20/06/2026
P. CRITICOS	$ 3.002.649.682,00	7,13%	7,96%	0,83%	20/06/2026
DRENAJES	$ 1.704.511.618,55	2,91%	0,07%	-2,84%	20/06/2026
SEGURIDAD VIAL	$ 235.049.799,00	0,00%	0,00%	0,00%	20/06/2026
MTO PARADEROS	$ 60.180.000,00	17,83%	5,00%	-12,83%	16/03/2026
COMPONENTES	$ 768.741.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	19/06/2026
MNTO VIAL	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**Fin**
PR1+130 al PR4+500	$ 1.220.591.813,45	34,05%	0,00%	-34,05%	26/08/2025
PR4+500 al PR25+500	$ 7.538.949.436,07			0,00%	11/12/2025
PR25+500 al PR46+500	$ 7.538.949.436,07			0,00%	30/03/2026
PR46+500 al PR60+300	$ 4.954.166.772,28			0,00%	19/05/2026
PR60+300 al PR70+150	$ 3.536.126.283,12			0,00%	20/06/2026
PTO CRITICOS	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR50+625 _Box culvert (*)	$ 153.485.512,46	20,11%	0,00%	-20,11%	20/08/2025
PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 128.258.827,95	0,00%	48,61%	48,61%	24/11/2025
PR48+900. Muro	$ 293.929.271,50	62,33%	60,14%	-2,19%	20/08/2025



(*) EL atraso en el Punto crítico PR50+625 no es impuable al contratista toda vez que no se ha dado aprobacion al POC para dar inicio a las obras.
