Bogotá D.C. septiembre 24 de 2025

CTT-225-1832-25

Señores:
CONSORCIO SOFAN C-046
Atención: Andrés Gabriel Sofan Sánchez
Representante Legal
Carrera 13ª No 89-38
Email: oficinabogota@sofaningenieria.com

REFERENCIA: **CTO-225-2024-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION.**

Asunto: Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-217 Remisión Informe Gerencial No. 4

Respetado Ingeniero Bogotá.

En atención al Informe Mensual Gerencial No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025, presentado por el Censorio Sofan C-046 en el marco del Contrato de Obra No. ICCU-245-2025, remitimos el siguiente concepto:

1. **Aval del informe**

El documento presenta de manera consolidada la información administrativa, técnica, financiera, social, ambiental y de seguridad, con sus respectivos soportes. En consecuencia, la interventoría otorga aval al Informe Mensual Gerencial No. 4, correspondiente al mes de agosto de 2025.

2. **Observaciones de la interventoría.**

No obstante el aval, se dejan las siguientes observaciones que deberán ser atendidas en el siguiente corte:

- Persiste una desviación del -4,27% respecto a la programación aprobada. Se requiere la presentación de un **plan de contingencia** que contemple medidas concretas para redimir el atraso.
- Deberá radicarse oficialmente la versión ajustada del Programa Detallado de Trabajo, incluyendo los nuevos puntos críticos autorizados.
- Se deberá profundizar en la estrategia para el manejo del material fresado (PR 14+000) y el relacionamiento con comunidades y autoridades locales.
- Se solicita el cierre formal de las no conformidades reportadas en el marco del Plan de Calidad, anexando evidencias en el próximo informe.

El contratista deberá presentar en el Informe No. 5:

- Cronograma PDT ajustado y aprobado.
- Evidencia de atención a las no conformidades.
- Plan de contingencia para redimir el atraso.
- Estrategia definida para el manejo ambiental y social del proyecto.

.
.

Atentamente,

CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49

DAVID TIERRADENTRO
Director Interventoría

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

INFORME MENSUAL No. 4
1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

FOR-ADM-11

Bogotá - Cundinamarca, 5 agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN.

INFORME MENSUAL No. 4
1 AL 31 AGOSTO DEL 2025

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

ELABORO	REVISO	APROBÓ INTERVENTORÍA
PAULA ANDREA DÍAZ DÍAZ Especialista PMP	**JULIO CESAR BOGOTÁ CARRILLO** Director de Obra	**LUIS EDUARDO PRIETO** Residente Interventoría

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
0	

Contrato de Obra No.	**ICCU-CTO-245 DE 2025**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C-046**
Contrato de Interventoría No.	**ICCU-CTO-225 DE 2025**	**Interventoría:**	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49**
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN			
INFORME MENSUAL No.	**4**	**MES O PERIODO:**	**1 DE AGOSTO 2025 A 31 DE AGOSTO 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. GENERALIDADES 7
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 8
3.2. CONECTIVIDAD, ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS 8
3.3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TÉCNICA EJECUTADAS Y EN CURSO 9
3.1. PUNTOS PRIORIZADOS 11
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 15
4.1. OBJETO DEL CONTRATO 15
4.2. DURACIÓN DEL CONTRATO 15
4.3. VALOR DEL CONTRATO 15
5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 15
5.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA 15
5.2. SEGUIMIENTO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE REAL 16
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES. 19
7. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT): 22
8. COMPONENTE AMBIENTAL: 24
9. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 28
10. COMPONENTE SOCIAL 30
11. GESTIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS 32
12. LIMITACIONES ENCONTRADAS 33
13. SEGUIMIENTO POR INDICADORES 33
14. RECURSO HUMANO 33
15. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 36
15.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO: 36
15.2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO 36
15.3. GARANTÍAS Y SEGUROS 37
16. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO 37
16.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PAGA 37
16.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PMT 37
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38
18. ANEXOS 39

Listado de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA....8
ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DE CORREDOR VIAL A INTERVENIR....9
ILUSTRACIÓN 3. PARADEROS INSTALACIÓN DE PINTURA....10
ILUSTRACIÓN 4. INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ILUSTRACIÓN 5. INSTALACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA....10
ILUSTRACIÓN 6. INSTALACIÓN DE GEOMALLA ILUSTRACIÓN 7. FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO....11
ILUSTRACIÓN 8. INSTALACIÓN FORMALETA MURO ILUSTRACIÓN 9. VACIADO DE CONCRETO RÍGIDO....12
ILUSTRACIÓN 10. INSTALACIÓN DE FORMALETA FASE 2 ILUSTRACIÓN 11. INSTALACIÓN FORMALETA FASE 2....12
ILUSTRACIÓN 12.INSTALACIÓN DE FORMALETA ILUSTRACIÓN 13. VACIADO DE CONCRETO RÍGIDO....13
ILUSTRACIÓN 14. COMPACTACIÓN RECEBO ILUSTRACIÓN 15. INSTALACIÓN DE GEODREN Y PIEDRA FILTRO....13
ILUSTRACIÓN 16. FUNDIDO MANUAL DE DESCOLE DE ALCANTARILLA ILUSTRACIÓN 17. INSTALACIÓN GRANULARES....14
ILUSTRACIÓN 18. COMPACTACIÓN BASE GRANULAR ILUSTRACIÓN 19. INSTALACIÓN DE ADOQUIN....14
ILUSTRACIÓN 20. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS....14
ILUSTRACIÓN 21. REGISTRO FOTOGRÁFICO MAYO PR50+625 ILUSTRACIÓN 22. REGISTRO FOTOGRÁFICO AGOST-SEP PR50+625....15
ILUSTRACIÓN 23. SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MES DE AGOSTO....16
ILUSTRACIÓN 24. CURVA "S" VALOR GANADO (EVM) AGOSTO 2025....17
ILUSTRACIÓN 25. CUADRO DE PORCENTAJES POR FRENTES. AGOSTO 2025....18
ILUSTRACIÓN 26. GRAFICAS DE AVANCE POR FRENTES AGOSTO 2025....19
ILUSTRACIÓN 27. IMPLEMENTACIÓN PMT PR41+500 ILUSTRACIÓN 28. IMPLEMENTACIÓN PMT PR48+960....23
ILUSTRACIÓN 29. IMPLEMENTACIÓN PMT INSTALACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA....23
ILUSTRACIÓN 30. IMPLEMENTACIÓN PMT (RAMAL RIO BOGOTÁ)....24

Listado Tablas

TABLA 1. LISTADO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL....22
TABLA 2. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE AMBIENTAL....24
TABLA 3. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE AMBIENTAL....27
TABLA 4. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE SST....28
TABLA 5. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SST....30
TABLA 6. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE SOCIAL....30
TABLA 7. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SOCIAL....32

TABLA 8. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO SOFAN C-046 34

TABLA 9. PERSONAL MANO DE OBRA-URBANUZ 35

TABLA 10. ESTADO FINANCIERO CONTRATO. 36

TABLA 11. GARANTÍAS Y AMPAROS PARA EL CONTRATO 37

TABLA 12. ESTADO FINANCIERO PAGA 37

TABLA 13. ESTADO FINANCIERO PMT 38

Anexos

ANEXO 1 – PROGRAMACIÓN

ANEXO 2 – CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ANEXO 3 – PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU suscribió el contrato ICCU-CTO-245 de 2025, cuyo objeto es: “Mantenimiento de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras mediante actividades periódicas y de contención”, adjudicado mediante proceso de licitación pública ICCU-LP-046 de 2024 y formalizado con el CONSORCIO SOFAN C-046, por un valor de $30.559.916.220 M/CTE y un plazo de catorce (14) meses, contados a partir del acta de inicio suscrita el 21 de abril de 2025.

Durante el mes de agosto de 2025, el contrato mantuvo ejecución activa con cinco frentes de obra distribuidos a lo largo de la Troncal del Tequendama. Entre los principales avances se destacan: la culminación de los muros de contención en los PR 41+500 y PR 48+960, el mantenimiento de paraderos en distintos puntos del corredor, la intervención en el ramal El Colegio–La Mesa mediante actividades de pavimento articulado, y el inicio del mantenimiento de la carpeta asfáltica en el PR 3+650, incluyendo fresado, imprimación, instalación de geomalla y mezcla asfáltica.

En paralelo, se gestionó el giro del anticipo contractual, recibido en la primera semana de agosto con los respectivos descuentos de ley, lo que permitió fortalecer la operación financiera del proyecto.

Si bien el análisis de valor ganado evidencia una desviación negativa del -4,27 % frente al avance programado, la entrada en ejecución de actividades de alto peso contractual como la mezcla asfáltica permitirá recuperar progresivamente el rezago en los siguientes cortes. Se mantiene pendiente la intervención del Box Culvert en el PR 50+625, condicionada a la expedición del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) por parte de la CAR.

Este informe gerencial recoge los hechos más relevantes del periodo, incluyendo el estado contractual, avances técnicos y administrativos, seguimiento financiero, limitaciones encontradas y las acciones implementadas por el Consorcio en coordinación con la interventoría y el ICCU, con el propósito de garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución del contrato.

2. GENERALIDADES

Durante el mes de agosto de 2025, el CONSORCIO SOFAN C-046 continuó con la ejecución del contrato ICCU-CTO-245 de 2025, correspondiente al mantenimiento de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras mediante actividades periódicas y de contención.

Las intervenciones se desarrollaron en cinco frentes de trabajo:

- PR 48+960 y PR 41+500: culminación de muros de contención, incluyendo amarre de acero, encofrado y vaciado de concreto.

- Mantenimiento de paraderos: adecuación de estructuras metálicas y de concreto en diferentes puntos de la troncal, con aplicación de lijado, pintura y reposición de elementos deteriorados.

- Ramal El Colegio – La Mesa (PR 1+800): intervención de pavimento articulado mediante retiro de adoquines, reconstrucción de cunetas, instalación de geodren vial y ejecución de bordillos y adoquines de concreto.

- PR 3+650: inicio del mantenimiento de pavimento flexible, con actividades de fresado, imprimación, instalación de geomalla biaxial y mezcla asfáltica MDC-19.

En este periodo se avanzó también en la actualización del Programa Detallado de Trabajo (PDT). Actualmente se están realizando recorridos conjuntos con la interventoría, con el fin de revisar y definir los puntos adicionales que deberán incluirse en la ejecución, garantizando que la programación refleje de manera precisa las condiciones reales del proyecto.

La ejecución del Box Culvert en el PR 50+625 continúa pendiente, en espera de la expedición del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) por parte de la autoridad ambiental competente.

Las condiciones climáticas presentaron lluvias en horas de la tarde, generando retrasos puntuales. Pese a ello, se mantuvo la operación activa en todos los frentes, apoyada con movilización de maquinaria pesada y aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

En conclusión, el mes de agosto se caracterizó por la consolidación de actividades estructurales críticas, la entrada en operación de frentes de pavimento flexible y articulado, lo que permitirá optimizar la planificación de los trabajos en los próximos periodos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización y descripción

El proyecto se ubica en departamento de Cundinamarca en la zona suroccidental provincia del Tequendama y su objetivo es realizar el mantenimiento de la red vial de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras, realizando actividades periódicas como mantenimiento de la estructura de pavimento por regular estado, reconstrucción parcial de los tramos en mal estado, construcción y reposición de pavimento en adoquín, construcción de estructuras de drenaje y subdrenaje longitudinal, actividades de seguridad vial.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

✓ Mantenimiento vial.
✓ Atención sitios críticos
✓ Construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal.
✓ Obras de seguridad vial.



Ilustración 1. Departamento de Cundinamarca

3.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

La troncal del Tequendama y los demás tramos que conectan a esta, son vías de carácter secundario y terciario que pasa por los municipios de Municipios de Soacha, San Antonio del

Tequendama, El Colegio, Anapoima, Viotá, Apulo y Tocaima, están conformadas por una calzada dos carriles (uno por cada sentido).

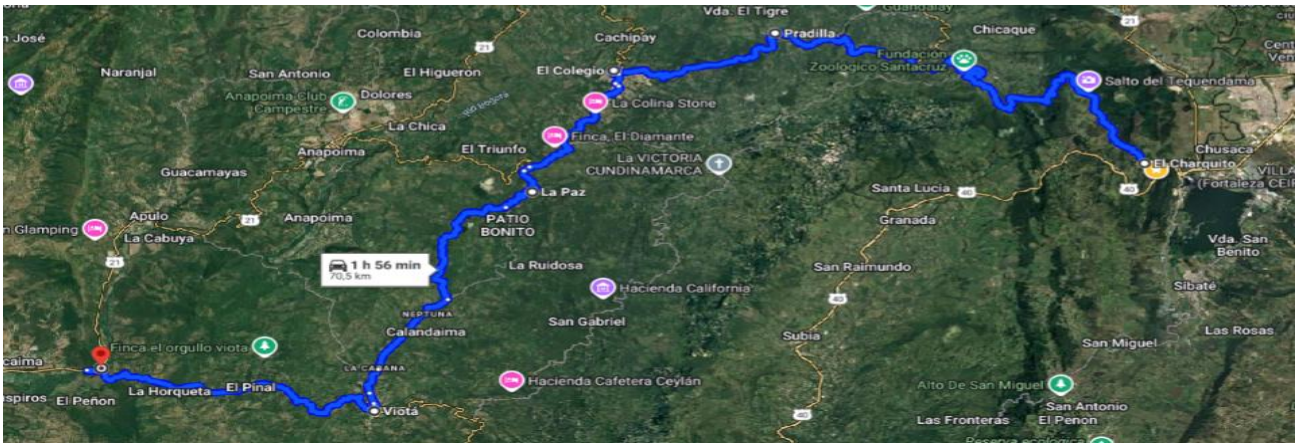


Ilustración 2. Localización de corredor vial a intervenir

3.3. Actividades de intervención técnica ejecutadas y en curso

Durante el mes de agosto de 2025, el CONSORCIO SOFAN C-046 mantuvo la ejecución simultánea de cinco frentes de obra priorizados, conforme a la programación vigente y a las directrices impartidas por el ICCU y la interventoría. A continuación, se resumen las principales actividades desarrolladas y en curso:

- **Frente 1 (PR48+960):** Se culminó la construcción del muro de contención con cimentación profunda, incluyendo amarre de acero, encofrado y vaciado del vástago, así como relleno con material granular compactado. (Ver 4.4 Puntos priorizados)

- **Frente 2 (PR41+500):** Se avanzó en la construcción del muro tipo “L”, con amarre de acero, encofrado, vaciado de concreto, instalación de filtro, relleno con material filtrante y compactación con recebo B-200. (Ver 4.4 Puntos priorizados)

- **Frente 3 (Mantenimiento de paraderos):** Se ejecutaron labores de lijado de estructuras metálicas, limpieza de adhesivos, aplicación de anticorrosivo y pintura, así como la demolición y reconstrucción de pedestales de concreto en los puntos PR 23+310, PR 21+750, PR 29+160, PR 38+230, PR 38+240, PR 42+160, PR 52+360 y PR 64+700.



Ilustración 3. Paraderos Instalación de pintura

- **Frente 4 (Ramal El Colegio-La Mesa (PR1+800)):** Se realizó la intervención del pavimento articulado, con retiro de adoquines, demolición de cunetas, reconstrucción de alcantarilla, instalación de geodren vial y tubería, extendido y compactación de base granular, construcción de cunetas y bordillos, y reinstalación de adoquines en concreto. (Ver 4.4 Puntos priorizados).

- **Frente 5 (PR3+650):** Se dio inicio al mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante actividades de fresado, imprimación, instalación de geomalla biaxial y mezcla MDC-19, conforme al diseño radicado y validado por la interventoría.



Ilustración 4. Instalación de Mezcla asfáltica



Ilustración 5. Instalación de emulsión asfáltica



Ilustración 6. Instalación de Geomalla



Ilustración 7. Fresado de pavimento asfaltico

Las actividades fueron respaldadas con la movilización de maquinaria pesada (retroexcavadora, minicargador, pavimentadora, vibrocompactadores y fresadora), así como con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado, lo que permitió garantizar condiciones de seguridad para el personal y los usuarios de la vía.

En términos de programación, las labores desarrolladas durante agosto consolidan la ejecución de frentes críticos y permiten la entrada progresiva en actividades de mayor peso contractual, como la mezcla asfáltica, lo que generará un impacto positivo en los indicadores de avance físico en los siguientes meses.

3.1. Puntos priorizados

Durante el mes de agosto de 2025, se mantuvo la atención a los puntos críticos priorizados dentro del contrato ICCU-CTO-245 de 2025, con los siguientes avances:
Estado de los puntos priorizados:

- **Punto 1: PR48+960**

Tipo de obra: Construcción de muro de contención con cimentación profunda (caisson)

Se finalizó el amarre del acero de refuerzo, encofrado y vaciado del vástago del muro. Posteriormente, se continuo con la Instalación de formaletas metálicas para vaciado de concreto.



Ilustración 8. Instalación Formaleta Muro



Ilustración 9. Vaciado de concreto rígido



Ilustración 10. instalación de formaleta fase 2



Ilustración 11. Instalación formaleta fase 2

- **Punto 2: PR 41+500**

Tipo de obra: Construcción muro en “L”.

Se ejecutaron actividades de encofrado y vaciado de concreto del muro tipo “L”, instalación de filtro, relleno con material filtrante y compactación con recebo B-200.



Ilustración 12.Instalación de formaleta



Ilustración 13. Vaciado de Concreto Rígido



Ilustración 14. Compactación recebo



Ilustración 15. Instalación de Geodren y piedra filtro

- **Punto 3: PR 1+800, Ramal El Colegio-La Mesa (pavimento articulado):** Se desarrollaron actividades de retiro de adoquines, demolición de cunetas existentes, instalación de geodren vial y tubería, construcción de cunetas y bordillos, y reinstalación de adoquines en concreto, avanzando significativamente en la recuperación funcional del tramo.



Ilustración 16. Fundido manual de descole de alcantarilla



Ilustración 17. Instalación granulares



Ilustración 18. Compactación base granular



Ilustración 19. Instalación de Adoquin



Ilustración 20. Construcción de cunetas

Por otra parte:

PR 50+625: La ejecución de este punto crítico continúa pendiente en razón a la no expedición del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) por parte de la autoridad ambiental competente. El contratista ha reiterado su disposición de iniciar actividades tan pronto se obtenga la autorización respectiva, dado el riesgo de pérdida de banca que presenta este sector.



Ilustración 21. Registro Fotográfico mayo PR50+625



Ilustración 22. Registro Fotográfico agost-sep PR50+625

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1. Objeto del contrato

Realizar la “MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN”

4.2. Duración del contrato

El plazo máximo de acuerdo con las condiciones del contrato ICCU-245 de 2025 es de catorce (14) meses para la ejecución total de las obras.

4.3. Valor del contrato

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 30.559.916.220), equivalentes a 21.468 SMLMV para el año de suscripción del contrato, correspondiente al 2025.

5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Seguimiento al cronograma de obra

Fecha de inicio del contrato: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación del contrato: 20 de junio de 2026

Para este periodo del mes de agosto se han realizado las actividades de:

- **Frente 1 (PR48+960)**
- **Frente 2 (PR41+500)**
- **Frente 3 (Mantenimiento de paraderos)**
- **Frente 4 (Ramal El Colegio-La Mesa (PR1+800))**
- **Frente 5 (PR3+650)**

5.2. Seguimiento comparativo entre avance programado vs. Avance real

Con el propósito de evaluar el desempeño del proyecto durante el mes de agosto de 2025, se presenta a continuación un análisis comparativo entre el avance físico programado y el avance realmente ejecutado, tomando como base la actualización de la planificación aprobada.

Ilustración 23. Seguimiento Avance físico del proyecto MES DE AGOSTO

		PROGRAMADO		EJECUCION		INDICADORES	
				TOTALES		VARIACION	SPI
	FECHA	CPTP(Millones)	% PROG.	CPTR (Millones)	% EJEC	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
Semana 1	25/05/2025	24,99	0,08%	12,50	0,04%	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	153,38	0,51%	24,41	0,08%	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	267,24	0,90%	63,614	0,21%	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	464,85	1,56%	102,82	0,35%	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	1.107,58	3,72%	142,02	0,48%	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	1.622,78	5,45%	181,23	0,61%	-4,84%	0,11
Semana 7	6/07/2025	115,95	0,39%	196,73	0,66%	0,27%	1,70
Semana 8	13/07/2025	208,36	0,70%	212,23	0,71%	0,01%	1,02
Semana 9	20/07/2025	372,36	1,25%	227,74	0,76%	-0,49%	0,61
Semana 10	27/07/2025	689,99	2,32%	243,24	0,82%	-1,50%	0,35
Semana 11	3/08/2025	1.045,72	3,51%	288,88	0,97%	-2,54%	0,28
Semana 12	10/08/2025	1.395,89	4,69%	308,70	1,04%	-3,65%	0,22
Semana 13	17/08/2025	1.709,77	5,74%	344,10	1,16%	-4,58%	0,20
Semana 14	24/08/2025	1.892,98	6,35%	369,73	1,24%	-5,11%	0,20
Semana 15	31/08/2025	1.958,59	6,57%	683,96	2,30%	-4,279%	0,35

A continuación, presentamos la gráfica de Curva “S” de valor ganado (EVM) de acuerdo a la metodología de seguimiento que se viene aplicando.

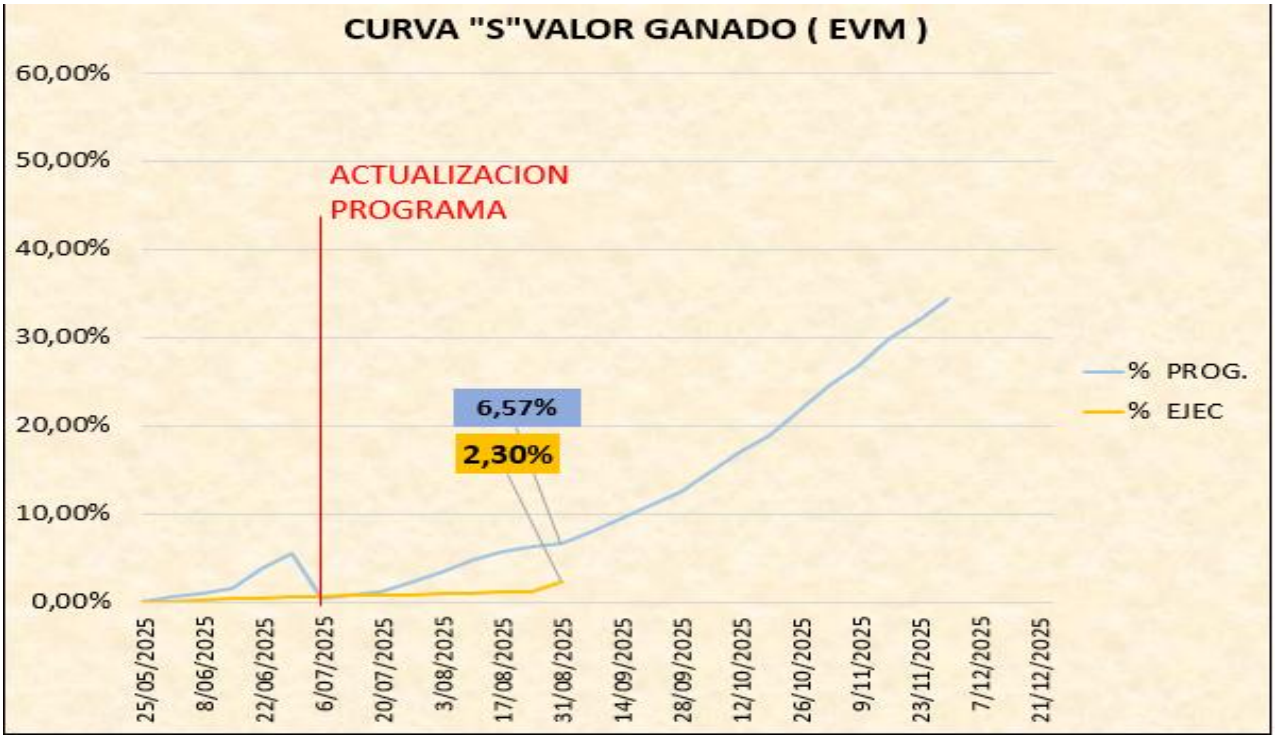


Ilustración 24. Curva "S" Valor ganado (EVM) AGOSTO 2025

Como se puede evidenciar en el cuadro de seguimiento y en la gráfica se ha realizado la actualización de la programación con el fin de reflejar la realidad de la secuencia constructiva y la nueva redistribución, se ve un cambio en el porcentaje programado entre las semanas 6 y semana 7. Por tanto, los resultados a la fecha del corte de este informe 31 de Agosto de 2025 son los siguientes:

Actividad	% Programado	% Ejecutado	% Desviación
General	6.57%	2.30%	-4.27%

Este análisis se realiza con base en la metodología PMI de valor ganado descrita en el Plan de Gerencia, y será actualizado mensualmente en la "Plantilla de Seguimiento" **(Ver Anexo 3. Plantilla de seguimiento-Panel de Control).**

Del anexo 3. Plantilla de seguimiento – Panel de control extraemos las siguientes graficas que permiten evidenciar los avances en el proyecto.

CONSTRUCCION	VALOR	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
MANTO VIAL	$ 24.788.783.741,00	4,99%	1,22%	-3,77%	19/06/2026
P. CRITICOS	$ 3.002.649.682,00	15,94%	11,95%	-3,99%	0/01/1900
DRENAJES	$ 1.704.511.618,55	13,24%	0,07%	-13,17%	19/06/2026
SEGURIDAD VIAL	$ 235.049.799,00	0,00%	0,00%	0,00%	20/06/2026
MTO PARADEROS	$ 60.180.000,00	29,93%	35,00%	5,07%	12/05/2026
COMPONENTES	$ 768.741.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	19/06/2026
MNTO VIAL	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR1+130 al PR4+500	$ 1.220.591.813,45	100,00%	24,82%	-75,18%	26/08/2025
PR4+500 al PR25+500	$ 7.538.949.436,07	0,21%		-0,21%	11/12/2025
PR25+500 al PR46+500	$ 7.538.949.436,07			0,00%	30/03/2026
PR46+500 al PR60+300	$ 4.954.166.772,28			0,00%	19/05/2026
PR60+300 al PR70+150	$ 3.536.126.283,12			0,00%	20/06/2026
PTO CRITICOS	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR50+625 _Box culvert	$ 153.485.512,46	100,00%	2,35%	-97,65%	20/08/2025
PR1+100 al PR1+135 - peaje	$ 4.591.510,40	18,98%	0,00%	-18,98%	10/09/2025
PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)- P	$ 826.789.890,70	3,15%	6,20%	3,05%	23/10/2025
PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 128.258.827,95	3,38%	69,71%	66,33%	24/11/2025
PR48+900. Muro	$ 293.929.271,50	100,00%	73,00%	-27,00%	20/08/2025

NOTAS: **EL Atraso en el Punto critico PR50+625 no es impuable al contratista toda vez que no se ha dado aprobacion al POC para dar inicio a las obras.**

Ilustración 25. Cuadro de porcentajes por frentes. AGOSTO 2025

En el cuadro anterior, muestra los avances en los diferentes frentes de obra, se viene trabajando en los frentes de Puntos críticos, drenajes, mantenimiento de paraderos y se da inicio al mantenimiento de la vía.

El análisis comparativo entre el avance programado y el avance real al mes de agosto de 2025 muestra una desviación acumulada del -4,27 % frente a lo previsto en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). La causa principal de esta brecha corresponde a la demora en la entrega del anticipo contractual, situación que limitó la capacidad operativa y financiera del proyecto durante los primeros meses de ejecución.

Con la reciente consignación del anticipo en la cuenta fiduciaria, se cuenta ahora con los recursos necesarios para intensificar la producción en los frentes de mayor impacto contractual, en particular los de pavimento flexible. En este sentido, se proyecta que la brecha identificada tenderá a cerrarse en los próximos cortes de seguimiento, en la medida en que se consolide la ejecución de actividades de alto volumen presupuestal.

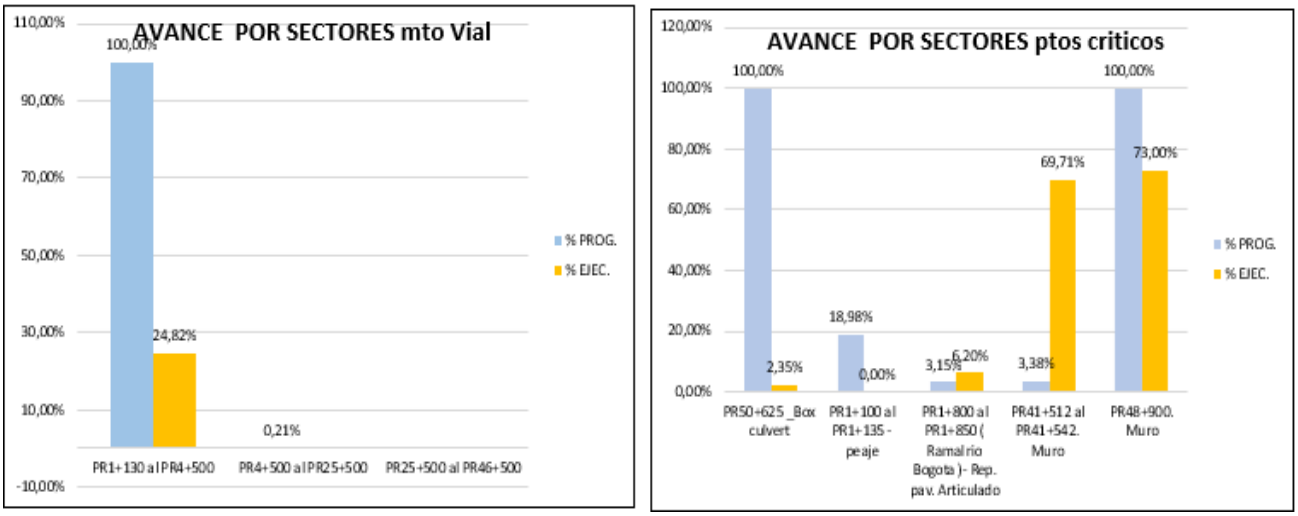


Ilustración 26. Graficas de avance por frentes AGOSTO 2025

En la ilustración 26, se muestran gráficamente los avances en los grandes frentes de mantenimiento de vías y puntos críticos descritos en el párrafo anterior.

El contratista ha dado inicio al frente de mantenimiento de la vía, con el inicio de este frente el contrista pretende ir recuperando el avance en estas actividades.

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES.

Durante el mes de agosto se adelantaron diferentes gestiones administrativas orientadas a garantizar la operación contractual y el flujo financiero del proyecto. Entre ellas se destacan:

- Radicación y trámite de documentos ante la Fiduciaria Bogotá S.A. para el desembolso directo del anticipo contractual al Banco de Bogotá.
- Envío de documentos de proveedores ante la interventoría para revisión y aprobación, y dar tramite de desembolso ante la fiducia.
- Remisión de contratos de subcontratistas para aprobación, en particular el relacionado con mano de obra de URBANUZ Construcciones HS SAS.
- Notificación de prórrogas a contratos de personal a término fijo, garantizando la continuidad del recurso humano vinculado al proyecto.
- Envío de comunicaciones oficiales y de soporte al ICCU y a la interventoría, incluyendo actas parciales de obra y solicitudes de modificación contractual.
- Consolidación de soportes documentales exigidos en la supervisión del contrato, asegurando el cumplimiento de los requerimientos contractuales y de control.

Actividades gerenciales

A nivel gerencial, durante el periodo se adelantaron acciones orientadas a la dirección estratégica del contrato y la coordinación de recursos, entre las cuales se resaltan:

- Presentación del Informe Gerencial No. 3 a la interventoría y al ICCU, consolidando los avances técnicos, financieros y administrativos.
- Coordinación de reuniones de seguimiento con la Interventora para revisión semanal de avance de obra.
- Revisión con la Interventoría y el ICCU, para priorizar la ejecución de puntos críticos adicionales que se han observado en la vía.
- Seguimiento al trámite del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) ante la CAR, requisito indispensable para la intervención del Box Culvert en el PR 50+625, considerado un punto crítico del contrato.
- Evaluación de riesgos contractuales, financieros y ambientales, definiendo acciones de mitigación para evitar retrasos adicionales en la ejecución.

Adicional se presenta la relación de correspondencia enviada **(Ver Anexo 2. Cuadro de correspondencia).**

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-157	5/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	REMISION INFORME TECNICO No 3
FOR-CO-03-ICCU046-158	6/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE DESEMBOLSO POR FIDUCIA
FOR-CO-03-ICCU046-160	6/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Remisión de contrato de subcontratista para aprobación – Mano de obra URBANUZ CONSTRUCCIONES HS SAS
FOR-CO-03-ICCU046-163	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	REMISIÓN INFORME GERENCIAL No. 3.
FOR-CO-03-ICCU046-168	12/08/2025	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ADMINISTRATIVO	Solicitud de desembolso

				directo al Banco de Bogotá
FOR-CO-03-ICCU046-169	12/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1512-25, Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos.
FOR-CO-03-ICCU046-171	13/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1471-25, Solicitud Información y aplicación de la norma.
FOR-CO-03-ICCU046-172	13/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1264-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-104 revisión informe de topografía.
FOR-CO-03-ICCU046-178	15/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1511-25, Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.
FOR-CO-03-ICCU046-179	15/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión de diseño de mezcla MDC-19 para revisión y aprobación
FOR-CO-03-ICCU046-180	19/8/2025	YADMIN PARRA REYES	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo

FOR-CO-03-ICCU046-181	19/8/2025	JULIO CESAR BOGOTA CARRILLO	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo
FOR-CO-03-ICCU046-182	19/8/2025	EDISON AGUILAR CORCHUELO	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo
FOR-CO-03-ICCU046-183	19/8/2025	ADRIANA MANRIQUE	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo
FOR-CO-03-ICCU046-184	20/8/2025	ICCU	TECNICO	Pago de Acta parcial de obra No.1, correspondiente al periodo del 21 de abril al 30 de junio del 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-193	27/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de Acta de Modificación # 1
FOR-CO-03-ICCU046-195	27/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1609-25, OBSERVACIONES SOBRE EL MATERIAL FILTRANTE
FOR-CO-03-ICCU046-199	30/8/2025	ICCU	TECNICO	Pago de Acta parcial de obra No.1, correspondiente al periodo del 21 de abril al 30 de junio del 2025.

Tabla 1. Listado de correspondencia enviada Área Técnica, administrativa y gerencial

7. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT):

Durante el mes de agosto de 2025 se continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por el ICCU, aplicando señalización preventiva y apoyo de auxiliares de tránsito en los frentes en ejecución. Estas medidas permitieron mantener la movilidad de la

troncal y sus ramales en condiciones seguras, garantizando tanto la protección de los usuarios de la vía como del personal de obra.

El PMT fue ajustado de acuerdo con el avance de las actividades y las condiciones de tráfico, lo que permitió realizar intervenciones en muros, paraderos, pavimento articulado y flexible con afectaciones mínimas en la circulación vehicular.

Es importante precisar que en el punto crítico PR 50+625, así como en otros sectores priorizados que aún no han sido intervenidos, no se ha implementado señalización por parte del contratista, en tanto el PMT aplica únicamente al momento de iniciarse los trabajos en dichos sitios.

Adicionalmente, tal y como se indicó en el informe del mes de julio se remitió comunicación formal al ICCU y a la interventoría con relación a otros puntos críticos identificados durante los recorridos conjuntos, los cuales se encuentran en proceso de revisión y no hacen parte de los puntos críticos priorizados en el contrato. Una vez se emita la respectiva aprobación, se procederá a la programación de actividades y a la implementación del PMT correspondiente.



Ilustración 27. Implementación PMT PR41+500



Ilustración 28. Implementación PMT PR48+960



Ilustración 29. Implementación PMT Instalación Mezcla Asfáltica



Ilustración 30. Implementación PMT (Ramal Rio Bogotá)

8. COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante el mes de agosto de 2025, se adelantó la gestión ambiental, atendiendo observaciones de la Interventoría y la Supervisión del ICCU, dando respuesta a comunicados, correos y recomendaciones en campo, así como presentando informes mensuales, fichas ambientales y solicitudes de certificación de materiales. Se realizaron reportes fotográficos de subsanación, trámites de aprobación ante la CAR y seguimiento a la gestión de RCD y puntos de acopio. Adicionalmente, se participó en los comités integrales semanales del contrato.

Tabla 2. Listado de Actividades, Componente Ambiental.

ACTIVIDADES
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0154 del 01 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta al comunicado CTT-225-1353-25 y CTT-225-1406-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.
El día 01 de agosto de 2025 mediante whatsapp la Supervisora ambiental del ICCU (Ing. Perla Lombo) le informó al profesional ambiental del Consorcio Sofan C-046 que, según reunión desde la Dirección General del ICCU y la CAR, nos autorizan la donación de material a los propietarios de los predios. Nos dan la autorización de no reportar estos materiales en el Plan RCD, solo dejar el seguimiento social. Esta información se transmitió a la profesional ambiental de Interventoría, la cual reitero, que cuando hagamos los reportes de los informes a la CAR, que tengamos todos los soportes que nos dice la Resolución. Y preguntó si se dejó alguna copia del acta de esa reunión, para que se pueda tener como soporte. La Supervisora ambiental del ICCU respondió que no.
El día 01 de agosto de 2025 mediante whatsapp La interventoría hace la recomendación que se evite desorden en obra con foto del PR48+900. Lo ideal es que en algunos puntos se realicen acopios organizados de la madera, que se señalicen, se ordenen y se agrupen en un solo lugar. Además, es importante separar la madera que se pueda reutilizar de la que ya no sirve, para que esta última se gestione adecuadamente como disposición final.

El día 04 de agosto de 2025 mediante whatsapp La interventoría hace la observación durante la visita de campo, ¿dónde se tiene previsto disponer un material RCD en el PR1+800? El cual debe estar adecuadamente acopiado, protegido y señalizado. ¿qué se va a hacer con el adoquín que se está levantando, ya se colocará adoquín nuevo? El Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046, da respuesta a las observaciones los días 04 y 05 de agosto.
El día 06 de agosto de 2025 mediante whatsapp el Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 remite a la Ing. Alejandra Tierradentro de Interventoría, registro fotográfico de respuesta y subsanación de las observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, del día 01 de agosto de 2025.
Mediante comunicado CTT-225-1459-25 del 06 de agosto de 2025, la Interventoría envía Aprobación del informe mensual Ambiental No.2 versión 3 del contratista
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0162 del 8 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°3.
Mediante comunicado CTT-225- 1509-25 del 11 de agosto de 2025, la Interventoría remite Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0171 del 13 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta comunicado CTT-225-1471-25, Solicitud Información y aplicación de la norma.
El día 13 de agosto de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite DESCRIPCION DEL PROYECTO Y FICHAS AMBIENTALES POC INTERVENCION DEL PR21+710.
El día 13 de agosto de 2025 mediante whatsapp La interventoría hace la observación durante la visita de campo, sobre el RCD del PR 1+800. Vi que esta acopiado, pero no está protegido y al haber revuelto partículas grandes con partículas finas pues se requiere la protección. Por otro lado, el volumen ya es bastante por lo que se puede estar ocupando parte de la vía y parte de la zona de trabajo. ¿Cuánto tiempo más se tendrá ese material ahí? ¿Cuándo se disponga, en donde se hará? Además, manifiesta mantener el orden, ya que la situación actual nos está dejando en una mala impresión. Lo ideal es que todo el material esté acopiado de forma organizada, y no disperso en la zona destinada para su almacenamiento. Conservar el aseo en los puntos ecológicos. En el PR1+800 no contamos con bolsa blanca, por lo que les solicito estar atentos a este detalle. El Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046, responde parcialmente a las observaciones solicitadas por la Interventoría.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0173 del 14 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta al comunicado CTT-225-1293-25, Observaciones al PAGA V4.
Mediante comunicado CTT-225-1562-25 del 19 de agosto de 2025, la Interventoría remite Observaciones al PAGA V5.
El día 19 de agosto de 2025 mediante whatsapp el Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 remite a la Ing. Alejandra Tierradentro de Interventoría, registro fotográfico de respuesta y subsanación de las observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, del día 13 de agosto de 2025.
Mediante comunicado CTT-225-1572-25 del 21 de agosto de 2025, la Interventoría remite Observaciones fichas para trámite del POC – PR21+720.

El día 21 de agosto de 2025 mediante correo electrónico, La interventoría remite Observaciones sobre manejo de acopio y punto ecológico – Solicitud de subsanación.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0190 del 22 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta al comunicado CTT-225-1509-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0162, observaciones al informe mensual N° 3.
El día 22 de agosto de 2025 mediante whatsapp La interventoría hace la observación durante la visita de campo, En el km 1+800 hay unos escombros que lanzaron como pendiente abajo, si se está haciendo el acopio en un predio, no deberían estar ahí. Según las fotos mostradas, este material acopiado debe estar protegido y señalizado, de paso se recomienda separar los RCD por tipo finos separados de los más grandes.
El día 25 de agosto de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite a Cementos Tequendama SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MATERIAL- CEMENTO TIPO UG PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
El día 25 de agosto de 2025 mediante correo electrónico Cementos Tequendama envía remisión 80325234 como CERTIFICADO DE MATERIAL- CEMENTO TIPO UG PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
El día 25 de agosto de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite a la Planta de Asfalto Sofan SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MATERIAL- MIXTO (ARENA RIO/GRAVA 3/4) PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2025
El día 25 de agosto de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite a la Planta de Asfalto Sofan SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MATERIAL- MIXTO (ARENA RIO/GRAVA 3/4) PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2025
El día 26 de agosto de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite a la Interventoría PLANTILLAS COMUNICADOS GESTION MATERIAL RCD CON ALCALDIAS SEGUN REUNION CON EL ICCU DEL JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0192 del 26 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta al comunicado CTT-225-1572-25, Observaciones fichas para trámite del POC – PR21+720..
El día 27 de agosto de 2025 mediante correo electrónico la Planta de Asfalto Sofan envía CERTIFICADO DE MATERIAL- MIXTO (ARENA RIO/GRAVA 3/4) PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2025
El día 27 de agosto de 2025 mediante correo electrónico la Planta de Asfalto Sofan envía CERTIFICADO DE MATERIAL- MIXTO (ARENA RIO/GRAVA 3/4) PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2025
Los días 27 y 29 de agosto de 2025 mediante whatsapp el Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 remite a la Ing. Alejandra Tierradentro de Interventoría, registro fotográfico de respuesta y subsanación de las observaciones de las actividades de seguimiento ambiental, del día 22 de agosto de 2025.
Mediante comunicado CTT-225-1624-25 del 27 de agosto de 2025, la Interventoría remite Aprobación de fichas de manejo ambiental – Trámite POC PR 21+720.
Mediante comunicado CTT-225-1626-25 del 27 de agosto de 2025, la Interventoría remite Observaciones al informe mensual N°3 V2.
El día 28 de agosto de 2025 mediante correo electrónico el Consorcio Sofan C-046 remite SOLICITUD DE APROBACION DE LOS SITIOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RCD EN LOS PR48+900 - PR2+000 - PR2+300.

Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0198 del 29 de agosto de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Respuesta al comunicado CTT-225-1626-25, Observaciones al informe mensual N° 3 V2.
Se asistió de manera virtual a los comités integrales del contrato ICCU 245 de 2025, los días 06, 13, 20 y 27 de agosto de 2025.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

Tabla 3. Listado correspondencia enviada Componente Ambiental

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-154	1/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1353-25 y CTT-225-1406-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.
FOR-CO-03-ICCU046-162	9/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°3
FOR-CO-03-ICCU046-173	14/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1293-25, Observaciones al PAGA V4.
FOR-CO-03-ICCU046-190	21/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1509-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0162, observaciones al informe mensual N° 3.
FOR-CO-03-ICCU046-192	26/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1572-25, Observaciones fichas para trámite del POC – PR21+720.
-	28/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOLICITUD DE APROBACION DE LOS SITIOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RCD EN LOS PR48+900 - PR2+000 - PR2+300

FOR-CO-03-ICCU046-198	29/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1626-25, Observaciones al informe mensual N° 3 V2.

9. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

En agosto de 2025, se desarrolló actividades de SST enfocadas en inducciones, charlas de seguridad, entrega y reposición de EPP, creación y socialización de ATS, señalización en obra, gestión de permisos y acompañamiento a actividades críticas. Asimismo, se elaboró el informe mensual de gestión y se participó en los comités del contrato.

Tabla 4. Listado de Actividades, Componente SST

ACTIVIDADES SST
Inducciones al personal del Consorcio Sofan C-046
Inducciones al personal de URBANUZ
Entrega de dotación y EPP
Reposición de dotación y EPP deteriorados a contratista URBANUZ
Reposición de dotación y EPP deteriorados a Consorcio Sofan C-046
Notificación de riesgo a el personal
Charlas SST al personal en los diferentes frentes de trabajo
Inspección a los EPP
Liberar permisos de trabajo
Crear y divulgar ATS a todos los colaboradores
Instalación de puntos de anclaje para trabajo seguro en alturas
Gestionar hidratación para el personal en los diferentes frentes de obra
Acompañamiento de actividades criticas en los diferentes puntos de obra
Realizar informe de gestión SST mensual
señalización y demarcación en el KM48+900
Entrega y recepción de preoperacionales
Cierre de observaciones
Asistir a los comités

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO

FOR-CO-03-ICCU046-152	1/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Remisión de documentos de equipo para revisión y aprobación.Vibrocompactador CC1200
FOR-CO-03-ICCU046-161	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	REMISION INFORME SST No 3
FOR-CO-03-ICCU046-164	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta Comunicado CTT-225-1405-25, Informe SST N°2, Planilla Especialista.
FOR-CO-03-ICCU046-165	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta Comunicado CTT-225-1465-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0152 documentación Maquinaria I.
FOR-CO-03-ICCU046-170	12/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Entrega de documentación SST personal operativo y administrativo
FOR-CO-03-ICCU046-177	15/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Entrega de documentación SST personal operativo y administrativo
FOR-CO-03-ICCU046-185	22/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta comunicado CTT-225-1522-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0161 Informe SST No. 3.
FOR-CO-03-ICCU046-191	25/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Remisión FURAT – Notificación Accidente de Trabajo
FOR-CO-03-ICCU046-194	27/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	REMISION DOCUMENTOS FRESADORA
FOR-CO-03-ICCU046-197	28/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta comunicado CTT-225-1623-25, RE FOR-CO-03-ICCU046-0185 Informe SST # 3 V2.
FOR-CO-03-ICCU046-200	31/8/2025	CONSORCIO TRONCAL	Entrega de documentos SST personal operativo y administrativo

		TEQUENDAMA 49	

Tabla 5. Listado correspondencia enviada Componente SST

10. COMPONENTE SOCIAL

Durante el mes de agosto de 2025, se desarrolló actividades de gestión social en el marco del contrato, fortaleciendo la comunicación con la comunidad, la veeduría ciudadana y las entidades gubernamentales. Se realizaron divulgaciones informativas, mesas de trabajo con la interventoría, invitaciones a recorridos del PGS y atención a los actores sociales en el PAC. Asimismo, se participó en los comités integrales del contrato y se recibió la aprobación del Informe de Obra N.° 3.

Tabla 6. Listado de Actividades, Componente Social

ACTIVIDAD
1. Canales de Comunicación Durante el presente mes se han mantenido activos los canales de comunicación habilitados por el contratista, permitiendo una interacción constante y fluida con la comunidad y demás actores interesados.
2. Divulgación de Información Se realizó la divulgación correspondiente mediante volante informativo relacionado con el inicio de actividades de asfaltado, asegurando que la comunidad esté al tanto de los avances y procesos del proyecto. Dicho volante fue instalado en los puntos satélites de la troncal (alcaldías).
3. Invitación a Entidades Gubernamentales Se elaboró y entregó un oficio informativo mediante el cual se invitó a las entidades gubernamentales del municipio de La Troncal a participar en el primer recorrido plasmado en el Plan de Gestión Social (PGS), junto a la veeduría ciudadana.
4. Mesas de Trabajo con la Interventoría Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la interventoría del proyecto, en las que se corroboró la vacante ofertada por el contratista a través de la Agencia Nacional de Empleo, garantizando el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos.
5. Participación en Comités Integrales Se participó activamente en los Comités Integrales junto a la supervisión del contrato, interventoría y el contratista.

6. Atención a la Veeduría Ciudadana

El día 08 de agosto, se atendió la visita de la veeduría ciudadana en las instalaciones del Punto de Atención al Ciudadano (PAC), resolviendo inquietudes y socializando los avances del proyecto.

7. Aprobación de Informe de Obra

El día 15 de agosto, se recibió la aprobación del Informe N.º 3 de Obra, por parte de la interventoría.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-155	5/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	REMISION INFORME SOCIAL No 3
FOR-CO-03-ICCU046-156	5/8/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	REMISION DE ACTA DE VECIDNDAD POSIBLE RIESGO DE COLAPSO DE INMUEBLE
FOR-CO-03-ICCU046-159	6/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Acercamiento preliminar – Intervención técnica proyectada peaje Nuevo Salto
FOR-CO-03-ICCU046-166	9/08/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1487-25 - Solicitud de aclaración sobre compromiso de disponibilidad de carrotanques.
FOR-CO-03-ICCU046-167	11/08/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1488-25 Observaciones informe mensual social No 3 V2
FOR-CO-03-ICCU046-174	14/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA
FOR-CO-03-ICCU046-175	14/8/2025	VEEDURIA CIUDADANA	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA

FOR-CO-03-ICCU046-176	14/8/2025	ICCU	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA
-	19/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Volante informativo - Inicio de actividades de mantenimiento vial
FOR-CO-03-ICCU046-186	21/8/2025	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON (ALCALDE ANAPOIMA)	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA
FOR-CO-03-ICCU046-187	21/8/2025	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO (ALCALDE DE TEQUENDAMA)	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA
FOR-CO-03-ICCU046-188	21/8/2025	OSCAR HERNAN QUIROJA	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA
FOR-CO-03-ICCU046-189	21/8/2025	DIEGO ANDRES LOPEZ SUAREZ	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA
FOR-CO-03-ICCU046-196	26/8/2025	ICCU	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA

Tabla 7. Listado correspondencia enviada Componente Social

11. GESTIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS

Durante el mes de agosto de 2025, el Consorcio SOFAN C-046 adelantó diferentes gestiones logísticas y operativas que permitieron la continuidad de los frentes de obra en la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras. Entre las principales se destacan:

- **Movilización y disponibilidad de maquinaria y equipos**, incluyendo retroexcavadora, vibrocompactadores, minicargador, fresadora y pavimentadora, requeridos para los frentes de pavimento flexible y articulado.

- **Gestión de suministros de materiales**, tales como mezcla asfáltica MDC-19, formaleta metálica, piedra filtro, base granular y adoquines de concreto, asegurando inventarios suficientes para los procesos en curso.

- **Apoyo logístico en transporte y disposición de materiales**, particularmente en el acopio de fresado, transporte de mezcla asfaltica y en el traslado de insumos a los diferentes puntos de intervención.

- **Coordinación de personal operativo**, con programación semanal de cuadrillas en muros, pavimento y paraderos, ajustada según el avance real en cada frente.

- **Implementación de medidas de seguridad y señalización temporal**, en articulación con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

En general, las actividades logísticas y operativas garantizaron el abastecimiento oportuno de materiales, la permanencia de equipos en sitio y la coordinación adecuada de recursos humanos, lo que permitió sostener el ritmo de ejecución de los frentes activos.

12. LIMITACIONES ENCONTRADAS

Durante el mes de agosto de 2025 se identificaron las siguientes limitaciones que incidieron en el desarrollo del contrato:

- **Demora en la entrega del anticipo contractual**, situación que restringió la capacidad operativa en los primeros meses y generó la desviación acumulada frente al cronograma.

- **Trámite pendiente del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) ante la CAR**, lo cual impide dar inicio a la intervención del Box Culvert en el PR 50+625, considerado un punto crítico del corredor.

- **Proceso de revisión de nuevos puntos críticos por parte del ICCU y la interventoría**, los cuales no hacen parte de los priorizados inicialmente en el contrato, y por tanto aún no pueden ser objeto de intervención ni de implementación de PMT.

- **Condiciones climáticas variables**, con lluvias recurrentes en horas de la tarde que ocasionaron ajustes en las jornadas de actividades de muros.

Estas limitaciones han incidido en la ejecución del proyecto, pero con la disponibilidad del anticipo y la priorización de actividades de mayor peso contractual se proyecta mitigar el rezago en los próximos cortes.

13. SEGUIMIENTO POR INDICADORES

En línea con lo establecido en el Plan de Gerencia del Proyecto y con el fin de fortalecer el componente de seguimiento por metas, se ha estructurado una matriz de indicadores técnicos que permite evaluar el desempeño del contrato por fases, incorporando variables como avance físico programado y ejecutado, fechas de cumplimiento y posibles desviaciones. Esta herramienta de control se actualiza mensualmente y permite hacer seguimiento detallado a la ejecución del proyecto. El informe consolidado correspondiente al mes de agosto de 2025 se encuentra en el archivo anexo. **(Ver Anexo 3. Plantilla de Seguimiento – Indicadores Mensuales).**

14. RECURSO HUMANO

Durante el periodo, el proyecto contó con el siguiente personal técnico y operativo vinculado al desarrollo de actividades:

Tabla 8. Personal del Contratista – Consorcio SOFAN C-046

#	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	KATHERINE GUAYACAN PARRA	1000726045	RESIDENTE SOCIAL
2	ELEFILETH RICARDO VALDERRAMA	1102827156	RESIDENTE TECNICO
3	FRANCISCO RAMIREZ	79891992	RESIDENTE AMBIENTAL
4	DAVID CASTELLANOS VILLALOBOS	1013594757	INSPECTOR VIAL
5	ELIANA BARRIOS GARCIA	1067846724	INSPECTOR VIAL
6	CARLOS TINOCO SOPO	1073428676	INSPECTOR VIAL
7	JULIO CESAR BOGOTA CARRILLO	79684147	DIRECTOR DE OBRA
8	YADMIN PARRA REYES	35377240	AUXILIAR SOCIAL
9	EDISON AGUILAR CORCHUELO	3152286	CONDUCTOR
10	ADRIANA MANRIQUE ZARATE	52295147	RESIDENTE SST
11	CARLOS ARMANDO POVEDA RAMIREZ	79898294	TOPOGRAFO
12	LUIS MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	5570315	CADENERO 1
13	GERMAN QUINTERO CHÁVEZ	93295779	INSPECTOR VIAL
14	YEISON FERNEY GARAVITO LÓPEZ	1015423004	RESIDENTE DE OBRA
15	SERGIO ARTURO VARGAS DIAZ	1000618103	INSPECTOR VIAL
16	CINDY NATHALY APARICIO ZABALA	1052393378	ADMINISTRADORA DE OBRA
17	LAURA RODRIGUEZ GOMEZ	1005700126	AUXILIAR DE TRAFICO
18	JULIETH AVENDAÑO SANDOVAL	1070332265	AUXILIAR DE TRAFICO
19	FELIX MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	1070634893	AUXILIAR DE TRAFICO
20	NELSON MOLINA BEJARANO	80388530	AUXILIAR DE TRAFICO
21	MARIO MORALES CANO	368894	CONDUCTOR CAMION
22	LUIS RAUL RAMIREZ CAMACHO	1007770085	OPERADOR EXCAVADORA
23	JOHN FREDY CIFUENTES RAMIREZ	1024498865	ALMACENISTA
24	JOSE LEONARDO CRESPO SANCHEZ	1069402943	AUXILIAR DE TRAFICO
25	YEIMY DANIELA ROMERO MONTILLA	1070332522	AUXILIAR DE TRAFICO
26	JULIAN EDUARDO SANCHEZ ANGEL	1069403902	OPERADOR MINICARGADOR
27	JULIAN ANDRES GALAN MARTINEZ	80171639	AUXILIAR DE TRAFICO
28	JHONATHAN ALFONSO ROJAS QUITIAN	1015473673	AUXILIAR DE TRAFICO
29	MARIA VIVIANA PEREZ POVEDA	1070331584	AUXILIAR DE TRAFICO
30	LUIS FERNANDO LEON GALINDO	1072962990	AUXILIAR DE TRAFICO
31	JENNIFER RINCON ORTIZ	1033683761	INSPECTORA SST
32	DIANA CAROLINA RUSSI	1013613705	INSPECTORA SST
33	FABIAN HERNAN VELA CUERVO	1070325300	AUXILIAR DE TRAFICO
34	JOSE HUMBERTO PRIETO PEÑA	80377066	OPERADOR PAVIMENTADORA

35	JORGE MARTIN MARTINEZ	1073519768	TORNILLERO- MALACHERO
36	JOSE NILSON PEÑA PINTO	80323009	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
37	ORLANDO CASTILLO	80442669	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
38	VICTOR ALFONSO CARRASQUILLA BELTRAN	1023861282	OPERADOR DE FRESADORA
39	ADI ROA CASTILLO	79214256	CONDUCTOR VOLQUETA
40	JAYDEN HARLEY BUSTOS ARDILA	1070325681	AUXILIAR DE TRAFICO
41	MANUEL ESTEBAN ROA MUÑOZ	1070332247	AUXILIAR DE TRAFICO
42	CRISTIAN FELIPE BASTIDAS MUÑOZ	1070324693	AUXILIAR DE TRAFICO
43	JOSÉ ALFREDO MORA MORENO	1069403187	OPERADOR DE MINICARGADOR
44	HILLARY HERNÁNDEZ DAZA	1003530298	BOAL
45	JIESSON ARLEY ROSAS GRAJALES	1016716523	CONDUCTOR CAMIÓN

Tabla 9. Personal Mano de obra-Urbanuz

No.	Nombre contratante	Datos / trabajador	
		Nombres y Apellidos	Cargo
1	URBANUZ	Maicol Sanchez Zamora	Maestro de Obra
2	URBANUZ	Epifanio Acosta Cardenas	Ayudante
3	URBANUZ	Julian Amado Tavera	Ayudante
4	URBANUZ	Rigoberto Rayo Alape	Ayudante
5	URBANUZ	Kevin Mauricio Benavides Betin	Ayudante
6	URBANUZ	Maikol Ivan Cruz Cruz	Auxiliar de obra
7	URBANUZ	Rafael Moreno Yepez	Auxiliar de obra
8	URBANUZ	Simeon Arturo Marin Mendez	Auxiliar de obra
9	URBANUZ	Angelo Wilmar Hernandez Herrera	Ayudante
10	URBANUZ	Luis Fernando Gutierrez Gutierrez	Oficial
11	URBANUZ	Hugo Sanchez Zamora	Inspector de obra
12	URBANUZ	Hector Morales Vega	Ayudante
13	URBANUZ	John Gutierrez Diaz	Ayudante
14	URBANUZ	Jefferson Galindo Beltran	Ayudante
15	URBANUZ	Fabio Unse Cabrera	Ayudante
16	URBANUZ	Jose Piñeros Garzón	Ayudante
17	URBANUZ	Octavio Marín Mendez	Ayudante

15. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

15.1. Estado general del contrato:

A la fecha de corte del presente informe, el estado financiero del proyecto es el siguiente:

Contrato No. ICCU-CTO-245 DE 2025
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-046
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

Valor inicial del contrato: $30.559.916.220
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación: 20 de junio de 2026
Plazo de ejecución inicial: 14 meses

Tabla 10. Estado Financiero Contrato.

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
OBRA	$ 29.791.174.841,00
PAGA	$ 266.141.379,00
PMT	$ 402.600.000,00
PROVISIÓN AJUSTES VARIACIÓN COSTOS INSUMOS	$ 100.000.000,00
POR EJECUTAR	**$ 30.559.916.220,00**

A la fecha, se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos contractuales exigidos para el trámite del anticipo, incluida la constitución del patrimonio autónomo. Actualmente, se está a la espera del desembolso de los recursos por parte de la entidad.

15.2. Inversión del anticipo

Durante el mes de agosto de 2025 se formalizó la entrega del anticipo contractual, el cual fue consignado en la cuenta fiduciaria del proyecto con la aplicación de los descuentos de ley correspondientes.

La disponibilidad de estos recursos permitió fortalecer la capacidad financiera del contrato, garantizar el flujo de caja y dar inicio a la ejecución de actividades de mayor peso presupuestal, particularmente las asociadas a la mezcla asfáltica.

Con la entrada en operación del anticipo se proyecta una recuperación progresiva de la desviación acumulada frente al cronograma, en la medida en que se logre intensificar la producción en los frentes priorizados.

15.3. Garantías y seguros

Tabla 11. Garantías y amparos para el contrato

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	21/04/25	22/10/26	$6.111.983.244.00
Buen manejo del anticipo	21/04/25	22/10/26	$ 6.111.983.224.00
Prestaciones sociales	21/04/25	21/06/29	$ 6.111.983.244.00
Calidad y Estabilidad de la obra	20/06/26	20/06/31	$ 8.937.352.452,30
RCE	21/04/25	20/06/26	$1.527.995.811.00

Fuente: Póliza No. 87833 Anexo 2 – 25529 Anexo 1

16. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO

16.1. Seguimiento financiero al PAGA

Para el periodo correspondiente al mes de agosto de 2025, no se ha generado facturación ante la entidad contratante por actividades específicas del componente ambiental.

Cabe resaltar que el presupuesto asignado en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), aprobado por interventoría y supervisión, corresponde a un valor global de $266.141.379, el cual contempla todos los costos y gastos asociados con el componente ambiental, social y SST.

En este sentido, el seguimiento financiero del componente se mantendrá actualizado conforme se generen avances de facturación y ejecución presupuestal en los próximos periodos.

Tabla 12. Estado Financiero PAGA

CONCEPTO/ACTA	PAGA	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 266.141.379,00	$ 266.141.379,00
ANTICIPO	N/A	
POR EJECUTAR	**$ 266.141.379,00**	**$ 266.141.379,00**

16.2. Seguimiento financiero al PMT

Durante el presente periodo correspondiente al mes de agosto de 2025, no se registra ejecución financiera asociada al componente de Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Si bien se ha dado inicio a la implementación del PMT aprobado.

En este sentido, el seguimiento financiero del PMT se mantendrá actualizado conforme se generen avances de facturación y ejecución presupuestal en los próximos periodos.

Tabla 13. Estado Financiero PMT

CONCEPTO/ACTA	PMT	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 402.600.000,00	$ 402.600.000,00
ANTICIPO	N/A	
POR EJECUTAR	**$ 402.600.000,00**	**$ 402.600.000,00**

Actualmente nos encontramos en proceso de tramite para facturación del Corte de Obra No. 1 en el cual está incluido el cobro de los diferentes componentes del contrato, entre ellos el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

El pago del Plan de Manejo de Tránsito y PAGA no se liquida en función de un avance físico específico en obra, sino mediante un cálculo proporcional al avance económico global del contrato. La fórmula aplicada distribuye el valor presupuestado de casa uno en relación con el porcentaje de ejecución financiera, garantizando así que su reconocimiento corresponda al desarrollo general del proyecto y no a una actividad puntual.

Una vez se culmine este corte y se radique la correspondiente factura ante la entidad contratante, se actualizará la información financiera de cada componente en los próximos informes.

Adicional estamos en el trámite de revisión y aprobación del Corte de Obra No. 2 por parte de la interventoría.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Durante agosto de 2025, el contrato ICCU-245 consolidó la ejecución de cinco frentes de obra, destacándose el avance en muros de contención (PR 41+500 y PR 48+960), el mantenimiento de paraderos, la intervención en pavimento articulado (PR 1+800) y el inicio de actividades de pavimento flexible (PR 3+650).
- La disponibilidad del anticipo contractual permitió fortalecer el flujo financiero y habilitar la ejecución de actividades de mayor peso presupuestal, en especial la mezcla asfáltica.
- El análisis de valor ganado refleja una desviación negativa de -4,27 % frente al avance programado; sin embargo, se proyecta una recuperación progresiva en los siguientes meses.
- Persisten limitaciones asociadas a factores externos como la no expedición del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) para el PR 50+625 y las lluvias recurrentes en la zona, que generan ajustes en las jornadas de trabajo.

- Se mantuvo una gestión constante en los componentes ambiental, social y de SST, atendiendo observaciones de la interventoría y garantizando la participación de la comunidad y actores institucionales.

Recomendaciones:

- Continuar con la ejecución prioritaria de frentes de alto impacto contractual, particularmente los asociados al pavimento flexible, con el fin de recuperar el rezago frente al cronograma.
- Gestionar de parte del ICCU de manera permanente con la CAR la expedición del POC para el PR 50+625, dado el riesgo de pérdida de banca en el sector.
- Reforzar las medidas de orden, señalización y disposición de RCD en los puntos de acopio, asegurando cumplimiento normativo y buena percepción comunitaria.
- Mantener la implementación rigurosa de actividades de SST en obra, uso de EPP y acompañamiento a labores críticas.
- Seguir fortaleciendo la gestión social mediante divulgación oportuna de la información, atención a la comunidad y coordinación con la veeduría ciudadana.

18. ANEXOS

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 1

PROGRAMACIÓN

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	% plan. 31-08-2025	% ejec. 31-08-2025	CPTP	CPTR
0	0	ICCU-245-2025-MTO VIA TEQUENDAMA_CLB1	$ 29.791.174.841,00	287 días	lun 21/04/2	sáb 20/06/26	6,57%	2,30%	$ 1.958.594.829,01	$ 683.961.040,93
1	1	MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN	$ 29.791.174.841,00	287 días	lun 21/04/25	sáb 20/06/26	6,57%	2,30%	$ 1.958.594.829,01	$ 683.961.040,93
2	1.1	INICIO	$ 0,00	0 días	lun 21/04/2	lun 21/04/25	100,00%	100,00%	$ 0,00	$ 0,00
5	1.2	PRELIMINARES - PLANIFICACION. Fase 1	$ 0,00	33 días	lun 21/04/2	lun 9/06/25	100,00%	100,00%	$ 0,00	$ 0,00
10	1.3	CONSTRUCCION. Fase 2	$ 29.791.174.841,00	269 días	vie 16/05/2	sáb 20/06/26	6,57%	2,30%	$ 1.958.594.829,01	$ 683.961.040,93
11	1.3.1	MANTENIMIENTO VIAL	$ 24.788.783.740,99	239 días	mar 1/07/2	sáb 20/06/26	4,99%	1,22%	$ 1.236.262.662,82	$ 302.964.259,64
12	1.3.1.1	PR1+130 al PR4+500	$ 1.220.591.813,45	38 días	mar 1/07/2	mar 26/08/2	100,00%	24,82%	$ 1.220.591.813,45	$ 302.964.259,64
18	1.3.1.2	PR4+500 al PR25+500	$ 7.538.949.436,07	73 días	mar 26/08/	jue 11/12/25	0,21%	0,00%	$ 15.670.849,37	$ 0,00
24	1.3.1.3	PR25+500 al PR46+500	$ 7.538.949.436,07	73 días	jue 11/12/2	lun 30/03/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
30	1.3.1.4	PR46+500 al PR60+300	$ 4.954.166.772,28	33 días	lun 30/03/2	mar 19/05/2	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
36	1.3.1.5	PR60+300 al PR70+150	$ 3.536.126.283,12	22 días	mar 19/05/	sáb 20/06/2	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
42	1.3.2	FIN MANTENIMIENTO VIAL	$ 0,00	0 días	sáb 20/06/2	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
43	1.3.3	PUNTOS CRITICOS	$ 3.002.649.682,46	269 días	vie 16/05/2	sáb 20/06/26	15,94%	11,95%	$ 478.624.665,54	$ 358.809.653,51
44	1.3.3.1	PR50+625 _Box culvert	$ 153.485.512,46	48 días	mar 10/06/2	mié 20/08/25	100,00%	2,35%	$ 153.485.512,46	$ 3.613.219,20
51	1.3.3.2	PR1+100 al PR1+135 - peaje	$ 4.591.510,40	15 días	mié 20/08/2	mié 10/09/25	18,98%	0,00%	$ 871.414,95	$ 0,00
55	1.3.3.3	PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)- Rep. pav. Articulado	$ 826.789.890,70	56 días	vie 1/08/25	jue 23/10/25	3,15%	6,20%	$ 26.005.991,99	$ 51.222.920,23
61	1.3.3.4	PR2+060 al PR2+080 - Muro	$ 239.380.239,60	60 días	mié 10/09/2	mar 9/12/25	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
68	1.3.3.5	PR4+600 al PR4+620. manejo de aguas	$ 43.087.817,60	37 días	mar 9/12/25	mar 3/02/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
73	1.3.3.6	PR13+416 al PR13+436 - Box. Arreglar	$ 16.338.577,75	36 días	mar 3/02/26	jue 26/03/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
79	1.3.3.7	PR21+700 al PR21+720- Box. Arreglar	$ 46.072.380,00	36 días	jue 26/03/2	mié 20/05/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
85	1.3.3.8	PR21+760. Baden	$ 92.171.465,00	21 días	mié 20/05/2	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
90	1.3.3.9	PR21+950 al PR22+020. Muro	$ 1.038.323.639,50	76 días	jue 26/02/2	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
97	1.3.3.10	PR40+060 al PR40+090. Rep. pav. Articulado	$ 120.220.550,00	64 días	lun 24/11/2	jue 26/02/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
103	1.3.3.11	PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 128.258.827,95	65 días	mié 20/08/2	lun 24/11/25	3,38%	69,71%	$ 4.332.474,64	$ 89.414.401,03
109	1.3.3.12	PR48+900. Muro	$ 293.929.271,50	49 días	lun 9/06/25	mié 20/08/25	100,00%	73,00%	$ 293.929.271,50	$ 214.559.113,05
116	1.3.3.13	DISEÑOS, PERMISOS Y OTROS	$ 0,00	211 días	vie 16/05/2	mié 25/03/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
161	1.3.4	FIN OBRAS DE PUNTOS CRITICOS	$ 0,00	0 días	sáb 20/06/2	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
162	1.3.5	DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	$ 1.704.511.618,55	254 días	lun 9/06/25	sáb 20/06/26	13,24%	0,07%	$ 225.693.092,75	$ 1.124.127,78
203	1.3.6	FIN DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	$ 0,00	0 días	sáb 20/06/2	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
204	1.3.7	OBRAS DE SEGURIDAD VIAL	$ 235.049.799,00	63 días	mar 17/03/	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
230	1.3.8	FIN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL	$ 0,00	0 días	mié 15/04/2	mié 15/04/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
231	1.3.9	MANTENIMIENTO DE PARADEROS	$ 60.180.000,00	190 días	lun 9/06/25	lun 16/03/26	29,93%	35,00%	$ 18.014.407,89	$ 21.063.000,00
233	1.3.10	FIN MANTENIMIENTO DE PARADEROS	$ 0,00	0 días	lun 16/03/2	lun 16/03/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
234	1.4	CIERRE DE CONTRATO	$ 0,00	0 días	sáb 20/06/2	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0,00

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 2

CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR-CO-02
Versión 02

CONSEC.	FECHA RECIBIDO	TIPO			REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ANEXOS O FOLIOS	REQUIERE RESPUESTA			RESPUESTA	
		OFICIO	MEDIO MAG.	E-MAIL					SI	NO	RESPONSABLE	FECHA	CONSECUTIVO
OFI25-007138	10/4/2025	X		X	AGENCIA PARA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION	SOCIAL	PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION P REINTEGRACION	1		X			
CTT-225-0593-25	3/4/2025	X			CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0005, REMISION TARJETA FIRMADA CONTRATO FIDUCIA	2		X			
-	8/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	ADMINISTRATIVO	APROBACION POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO	1		X			
-	11/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	SOCIAL	DOCUMENTOS PARA SOCIALIZACION, MODELO VOLANTE, PIEZA PUBLICITARIA Y PRESENTACION	1	X		KATHERINE GUAYACAN	15/04/2025	RESPUESTA CORREO social245@sofaningenieria.com
CTT-225-0650-25	14/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0006, REMISION PLAN	2	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	21/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-017
CTT-225-0671-25	15/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	TRASLADO INDICACIONES VALLA INFORMATIVA ICCU Y MANUAL DE USO DE LOGOS	2	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	25/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-035
CTT-225-0686-25	16/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0017, REMISION PLAN	2	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	24/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-021
-	21/4/2025			X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION ACTA DE INICIO	1	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	21/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-020
CTT-225-0700-25	22/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0021, APROBACION PL	1		X			
CTT-225-0704-25	22/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0011, APROBACION HI	1		X			
-	22/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	ADMINISTRATIVO	APLICACIÓN DECRETO 0175 DE 2025, IMPUESTO DE TIMBRE	2		X			
-	22/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	ADMINISTRATIVO	APROBACION POLIZAS CON ACTA DE INICIO	1		X			
CTT-225-0714-25	24/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	OBSERVACIONES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL	2	X		KATHERINE GUAYACAN	12/05/2025	RESPUESTA CORREO social245@sofaningenieria.com
CTT-225-0720-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0008 OBSERVACIONES AL PG-SST	1		X			
CTT-225-0723-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	OBSERVACIONES OFICIO Y VOLANTE DE CONVOCATORIA REUNION DE I	1	X		KATHERINE GUAYACAN	25/04/2025 V1 Y 27/04/2025 V2	Correo electronido V1 / FOR-CO-03-ICCU046-018 V2
-	28/4/2025			X	VRC INGENIERIA	TECNICA	REMISION PMT ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Informe - Planos (4)	X		TECNICA	28/04/2025	RESPUESTA CORREO elericardo@sofaningenieria.com
-	29/4/2025			X	VRC INGENIERIA	TECNICA	REMISION PMT ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO V2	Informe - Planos (4)	X		ELEFILETH RICARDO	22/05/2025	RESPUESTA CORREO elericardo@sofaningenieria.com
-	30/4/2025			X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	REMISION DE TRAFICO NUEVO SALTO 2024	1		X			
CTT-225-0725-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0008 OBSERVACIONES AMBIENTAL ENTREGA PAGA	4	X		FRANCISCO RAMIREZ	6/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-040
CTT-225-0733-25	28/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	REMISION PIEZAS DE CONVOCATORIA REUNION DE INICIO	1	X		KATHERINE GUAYACAN	24/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-024 a 033
-	29/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	SOCIAL	APROBACION VOLANTE SOCIALIZACION INICIO DE OBRA	1		X			
-	29/4/2025			X	ICCU-MARIA RODRIGUEZ ROZO	SOCIAL	SOLICITUD REGISTRO FOTOGRAFICO PARA VALLA	1	X		ELEFILETH RICARDO	2/05/2025	RESPUESTA CORREO elericardo@sofaningenieria.com
CTT-225-0748-25	30/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CALIDAD	OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD	2	X		ADMINISTRATIVO	6/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-046
CTT-225-0749-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	CONCEPTO RECORRIDO INICIAL TRONCAL TEQUENDAMA	17		X			
CTT-225-0763-25	30/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTOS	1	X		ADMINISTRATIVO	6/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-042
-	5/5/2025			X	ALCALDIA MUNICIPAL EL COLEGIO	SOCIAL	SOLICITUD DE SOCIALIZACION EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO	1	X		KATHERINE GUAYACAN	6/05/2025	RESPUESTA CORREO social245@sofaningenieria.com
CTT-225-0745-25	6/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-018 Y 038 REVISION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	11	X		ELEFILETH RICARDO	13/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-044
CTT-225-0806-25	7/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0039 OBSERVACIONES AL PG-SST V2	1	X		MARCELA PINTO	7/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-043
-	12/5/2025			X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	REMISION DISEÑOS INTERVENCION K50+500	2	X		JULIO CESAR BOGOTA	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-058
CTT-225-0838-25	13/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0043 OBSERVACIONES AL PG-SST V2	1		X			
CTT-225-0845-25	13/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0042REVISION CRONOGRAMA DE OBRA	1		X			
CTT-225-0841-25	13/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-046 OBSERVACIONES AMBIENTAL ENTREGA PAGA V2	1	X		FRANCISCO RAMIREZ	21/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0063
CTT-225-0843-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	SOLICITUD ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2		X			
CTT-225-0848-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	APROBACION PLAN DE GESTION SOCIAL	1		X			
CTT-225-0849-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-015 METODOLOGIA DE EJECUCION DEL CONTRATO	1	X		JULIO CESAR BOGOTA	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-057
CTT-225-0851-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-036 REMISION PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS	1	X		CRISTIAN GRIMALDOS	20/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0062
CTT-225-0671-25	14/5/2025	X		X	ICCU-MARIA RODRIGUEZ ROZO	SOCIAL	VALLA CON MEDIDA CORRESPONDIENTE SEGÚN DECRETO 00234 DE 20	1	X		KATHERINE GUAYACAN	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0093
CTT-225-0853-25	14/5/2025	X		X	ICCU-MARIA RODRIGUEZ ROZO	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-042 CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTOS	1	X		ELEFILETH RICARDO	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0059
CTT-225-0871-25	16/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	GESTION VACANTES SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CUNDINAMARC	1	X		KATHERINE GUAYACAN	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-056
CTT-225-0892-25	19/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ICCU	5 Planos	X		JULIO CESAR BOGOTA	20/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-061
CTT-225-0893-25	19/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ENTREGA DE CONCEPTO DE INTERVENTORIA ALCANTARILLA PR50+622	Informe - Documentos		X			
CTT-225-0894-25	19/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Traslado oficio FOR-CO-03-ICCU046-058 Solicitud de Diseño Definitivo para At	1		X			
CTT-225-0896-25	20/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	INCLUSION APARTADO DE PRESUPUESTO EN PLAN DE GESTION SOCIAL	1	X		KATHERINE GUAYACAN	21/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0064
CTT-225-0905-25	21/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de desglose y discriminación de AIU.	1	X		ELEFILETH RICARDO		
CTT-225-0914-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0041-Ajuste plan de calidad	1	X		ELEFILETH RICARDO	4/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0041

CTT-225-0918-25	23/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Valla punto de atención a la comunidad Contrato 245- 2025	1	X		ICCU	4/06/2025	comunicacionesiccu@gmail.com
CTT-225-0938-25	27/5/2025	X		X	ICCU	ICCU	Entrega Plan de Gestión Social	Plan Gsocial		X			
CTT-225-0941-25	27/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0070_ Entrega documentacion S	1	X		ADRIANA ZARATE	28/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0072
CTT-225-0942-25	27/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Traslado REDISEÑO BOX CULVERT TRONCAL DEL TEQUENDAMA PR50+6	Diseños		X			
CTT-225-0945-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Atención al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0044 y 0060 Revisión Hojas d	16 Folios		X			
CTT-225-0946-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0059 , CUMPLIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS	1 Folio		X			
CTT-225-0947-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Radicacion SG-SST emitido por le contratista y aprobado por interventoría	Plan GSST		X			
CTT-225-0952-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de señalización puntos criticos	3 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	29/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0075
13252005810	29/5/2025	X		X	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	AMBIENTAL	Respuesta al radicado 13251000715: Solicitud de informacion de fuente hídrica	10 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	28/05/2025	Correo electronido ambiental@sofaningenieria.com
CTT-225-0958-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-073 Afectaciones en la ejecución por fa	5 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	13/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0098
CTT-225-0983-25	5/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-057 RE CTT-225-0849-25 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO_V2	1 Folio		X			
CTT-225-0984-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-060 RE CTT-225-0851-25 Remisión pla	1 Folio		X			
CTT-225-0971-26	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA V3	1 Folio		X			
CTT-225-0972-26	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Entrega del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA V3	1 Folio		X			
CTT-225-0991-26	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-065 Aprobación PMT ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	1 Folio		X			
CTT-225-992-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-067 Remisión Maquinaria y equipos	1 Folio		X			
CTT-225-993-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-068 Remisión cambio HV Profesional F	2 Folios		X			
CTT-225-994-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-074 Radicación documentos Equipo de	1 Folio		X			
CTT-225-995-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Entrega de informe Técnico PR50+625	1 Folios 1 Anexo		X			
CTT-225-1005-25	5/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Implementación urgente del PMT con reguladores de tráfico – PR 50+625	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	12/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0096
CTT-225-1009-25	5/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Cumplimiento instalacion Valla informativa	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0093
CTT-225-1014-25	6/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0076 - Observaciones Informe Social No 1	3 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	7/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0082
CTT-225-1016-25	7/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0072 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	8/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0083
CTT-225-1017-25	7/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0077 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST	1 Folio+ Informe	X		ADRIANA ZARATE	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0091
CTT-225-1028-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-075 RE CTT-225-0952-25 Solicitud de señalización puntos críticos	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	27/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-114
CTT-225-1031-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Entrega Plan de Calidad	1 Folio		X			
CTT-225-1033-25	11/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0081 Observaciones al informe mensual ambiental	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0094
CTT-225-1038-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-085 Solicitud de mesa de trabajo	1 Folio		X			
CTT-225-1042-25	10/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0083 ALCANCE DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	1 Folio		X			
CTT-225-1044-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud inicio de trabajos de campo – Presentación de plan de contingencia para subsanar el atraso presentado en el oficio CTT-225-958-25	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-119
CTT-225-1046-25	10/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0082 - Observaciones Informe Social No 1	2 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	19/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-102
CTT-225-1049-25	11/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	ENTREGA PMT	1 Folio 2 Anexos		X			
CTT-225-1057-25	12/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0089 Entrega de documentación SST personal operativo	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	12/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0095
CTT-225-1059-25	12/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0091 Respuesta informe mensual 1 SST	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	24/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-107
CTT-225-1066-25	16/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación del informe mensual Ambiental No.1 del contratista	1 Folio		X			
CTT-225-1087-25	17/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0095 Entrega de documentación SST personal operativo	1 Folio		X			
CTT-225-1088-25	17/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-096 RE CTT-225-1005-25 Implementación urgente del PMT – PR 50+625.	2 Folios		X			
CTT-225-1116-25	19/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0099 – Solicitud de reprogramac	3 Folios	X		CRISTIAN GRIMALDOS	24/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-106
CTT-225-1120-25	19/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Reiteración solicitud de información – puntos de intervención con requerimiento	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO	10/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0090
CTT-225-1126-25	24/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Alcance a la comunicación CTT-225-1044-25 y Revisión entrega formal Informe de Medición de deflectometria y condición superficial Troncal	5 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	27/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-113
CTT-225-1146-25	24/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0078 INFORME TÉCNICO N°1	2 Folios	X		YEISON GARAVITO	5/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-122
CTT-225-1147-25	24/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-079 Informe Gerencial	1 Folio	X		CRISTIAN GRIMALDOS	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-115
CTT-225-1148-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Traslado oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños	3 Folios		X			
CTT-225-1150-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-120
CTT-225-1152-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Traslado oficio ICCU-S-2025-0004129 Opción de Mejora al plan de PMT	4 Folios	X		ELEFILETH RICARDO	27/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-111
CTT-225-1149-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-101 Diseño de muro sobre pilotes en l	1 Folio		X			
CTT-225-1159-25	26/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0107 Respuesta informe mensual SST #1 V3	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-118
CTT-225-1160-25	26/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0105 y FOR-CO-03-ICCU046-0108 Documentación personal	1 Folio		X			
CTT-225-1161-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Observaciones recolectadas durante recorrido	3 Folios	X		ADRIANA ZARATE/KATHERIN	7/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-127
CTT-225-1174-25	27/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	8/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-129
CTT-225-1198-25	3/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0117	1 Folio		X			
CTT-225-1199-25	3/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Revisión Muro PR48+900	17 Folios	X		ELEFILETH RICARDO	14/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-140
CTT-225-1213-25	4/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-0102 Aprobación Informe mensual social 1	1 Folio		X			
CTT-225-1214-25	4/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	7/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-126
SIM No. 435-2025	4/7/2025	X		X	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	AMBIENTAL	RE SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-088 de fecha 9 de junio de 2025	1 Folio		X			
CTT-225-1235-25	7/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0118 Respuesta informe mensual SST #1 V3	1 Folio		X			

CTT-225-1238-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Reiteración gestión de RCD y cumplimiento normativo.	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1240-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Observaciones componente SST	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	28/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-147
CTT-225-1241-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU 046-0012-VALIDACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1 Folio		X			
CCT-225-1245-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Traslado de oficio ICCU-S-2025-0004426 repuesta al oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños.	3 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA/YEISON GARAVITO	24/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-144
CTT-225-1247-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0124 Informe SST N°2	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	28/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-146
CTT-225-1248-25	8/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta Al Oficio FOR-CO-03-ICCU046-0125 Remisión de documentos de vehículo para revisión y aprobación.	1 Folio		X			
CTT-225-1258-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la Alcaldía de Tocaima respecto al material resultante del fresado.	2 Folios		X			
CTT-225-1259-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la Alcaldía de El Colegio Cundinamarca respecto al material resultante del fresado.	2 Folios		X			
CTT-225-1264-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-104 revisión informe de topografía	1 Folio	X		YEISON GARAVITO	13/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-172
CTT-225-1261-25	9/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad.	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	11/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-135
CTT-225-1263-25	10/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta a solicitud de apoyo para la gestión de asignación de sitios de recepción de material sobrante RCD.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1273-25	10/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación	1 Folio	X		YEISON GARAVITO	14/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-139
CTT-225-1281-25	11/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Reiteración sobre el uso obligatorio de líneas de vida en excavaciones mayores a 1.50 metros	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	28/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-148
CTT-225-1280-25	11/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de concepto del especialista en geotecnia frente a condiciones de excavación en el PR 41+500	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	15/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-141
CTT-225-1282-25	11/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de reporte diario de frentes de trabajo	1 Folio	X		YEISON GARAVITO	12/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-136
CTT-225-1272-25	12/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Repuesta FOR-CO-03-ICCU046-0128 - Observaciones informe mensual social No 2 V1	2 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	14/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-138
CTT-225-1292-25	14/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	21/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-143
CTT-225-1293-25	14/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Observaciones al PAGA V4	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ	14/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-173
CTT-225-1319-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la Alcaldía de Viotá respecto a la disposición del material resultante del fresado y del material común proveniente de excavaciones mecánicas	2 Folios		X			
CTT-225-1299-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0132, FOR-CO-03-ICCU046-0137 Entrega de documentación SST personal operativo	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	25/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-145
CTT-225-1323-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-0138 Aprobación Informe mensual social 2 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1326-25	17/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-131 Validación PDT	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO		
CTT-225-1335-25	18/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Remisión de respuesta de la CAR frente al manejo de material RCD.	4 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1346-25	21/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Observaciones técnicas – Fundida de concreto y maniobras de izaje en PR 41+500 y PR 48+887	3 Folios		X	JULIO CESAR BOGOTA		NO SE RESPONDE
13252008404	17/7/2025	X		X	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	AMBIENTAL	Respuesta al radicado 13251000753: RCD CONTRATO 245 DE 2025	3 Folios		X			
CTT-225-1353-25	22/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficioFOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	1/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-154
CTT-225-1402-25	30/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0145 Documentacion personal	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	31/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-151
CTT-225-1406-25	30/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Alcance al oficio CTT-225-1353-25	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ	1/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-154
CTT-225-1434-25	31/07/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-144 RE CTT-225-245-25 Trasl Of ICCU-S-2025-0004426	8 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		
CTT-225-1460-25	6/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta a comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0119 y FOR-CO-03-ICCU046-0142 – no inicio de trabajos de mantenimiento de pavimento – pronunciamiento y trámite de anticipo.	2 Folios		X			
CTT-225-1471-25	06/08/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud información y aplicación de la norma.	1 Folio	X		YEISON GARAVITO	13/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-171
CTT-225-1459-25	06/08/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación del informe mensual Ambiental No.2 versión 3 del contratista	1 Folio		X			
CTT-225-1405-25	06/08/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0124 Informe SST N°2	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO	8/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-164
CTT-225-1464-25	6/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0151 Documentación personal	1 Folio		X			
CTT-225-1465-25	6/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0152 documentación Maquinaria I	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO	8/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-165
CTT-225-1483-25	6/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Aprobación del contrato de subcontratista URBANUZ CONSTRUCCIONES HS SAS	1 Folio		X			
CTT-225-1487-25	8/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud de aclaración sobre compromiso de disponibilidad de carrotanques.	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	9/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-166
CTT-225-1488-25	8/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Repuesta FOR-CO-03-ICCU046-0155 - Observaciones informe mensual social No 3 V1	2 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	11/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-167
CTT-225-1510-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	solicitud de inicio intervención de asfalto.	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	12/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-169
CTT-225-1511-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.	2 Folios	X		YEISON GARAVITO	15/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-178
CTT-225-1512-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos.	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	12/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-169
CTT-225-1504-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0165 documentación Maquinaria I	1 Folio		X			
CTT-225-1506-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0164 Aprobación informe #2 SST	1 Folio		X			
CTT-225-1522-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0161 Informe SST N°3	2 Folios	X		ELEFILETH RICARDO	22/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-185
CTT-225-1509-25	11/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	21/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-190
CTT-225-1531-25	13/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud de apoyo para la notificación de actividades de obra en el peaje Nuevo Salto.	1 Folio		X			
CTT-225-1538-25	13/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Aprobación - Informe Gerencia 1 V2	1 Folio		X			

CTT-225-1548-25	15/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Aprobación – Respuesta comunicado CTT-225-1124-25, Informe Técnico N.° 1 V2.	1 Folio		X			
CTT-225-1549-25	15/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Aprobación – Informe técnico 2 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1550-25	15/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Aprobación – Informe gerencial 2 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1546-25	15/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Alcance al oficio CTT-225- 1434-25, balance de obras a ejecutar.	11 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		
CTT-225-1551-25	15/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-0167 Aprobación Informe mensual social No. 3 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1552-25	15/8/2025	X		X	VEEDURIA CIUDADANA CONTRATO 245	SOCIAL	Atención a su solicitud mesa de trabajo de fecha agosto 8 de 2025 – contratista de obra	2 Folios		X			
CTT-225-1555-25	19/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0174 - Aprobación invitación recorrido.	1 Folio		X			
CTT-225-1562-25	19/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Observaciones al PAGA V5	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1565-25	19/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	APREMIO No. 1 POR EL NO INICIO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.	1 Folio		X	JULIO CESAR BOGOTA		NO SE RESPONDE
CTT-225-1572-25	21/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Observaciones fichas para tramite del POC PR21+720	1 folio	X		FRANCISCO RAMIREZ	26/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-192
CTT-225-1579-25	21/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0170 personal operativo	1 Folio		X			
CTT-225-1609-25	26/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	OBSERVACIONES SOBRE EL MATERIAL FILTRANTE.	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	27/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-195
CTT-225-1617-25	26/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PARADEROS	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	3/09/2025	FOR-CO-03-ICCU046-205
CTT-225-1619-25	26/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de entrega de ensayo de densidades PR 41+500 Y PR 48+900.	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	5/09/2025	FOR-CO-03-ICCU046-207
CTT-225-1623-25	27/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0185 Informe SST N°3 V2	1 Folio	X		ADRIANA MANRRIQUE	28/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-197
CTT-225-1625-25	27/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Requerimiento documentación maquinaria y personal (actividades de asfalto)	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO		
CTT-225-1624-25	27/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación de fichas de manejo ambiental - Tramite POC PR21+720	30 Folios		X			
CTT-225-1626-25	27/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Observaciones al informe mensual #3 V2	2Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	29/08/2025	FOR-CO-03-ICCU046-198
CTT-225-1632-25	28/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Concepto sobre solicitud de modificación pbra y aprobación de items no previstos	14 Folios		X			
2025-SI-0485	28/8/2025	X		X	ALCALDIA MUNICIPAL VIOTA	SOCIAL	Respuesta Radicado # 2025-E-1521, Oficio FOR-CO-03-ICCU046-0188	1 Folio		X			
CTT-225-1632-25	29/8/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Inicio de actividades sin la entrega de ensayos y respectiva validación por parte de la interventoría.	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		
CTT-225-1653-25	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0194 documentos fresadora W130F	1 Folio		X			
CTT-225-1656-25	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0170 personal operativo	1 Folio	X		ADRIANA MANRRIQUE	1/09/2025	FOR-CO-03-ICCU046-202
CTT-225-1658-25	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Observaciones evidencias en recorrido 29/08/2025	1 Folio	X		ADRIANA MANRRIQUE		
CTT-225-1661-25	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta al comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0195.	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	5/09/2025	FOR-CO-03-ICCU046-206
CTT-225-1657-25	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST-AMBIENTAL	Observaciones en frentes de obra.	3 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ/ADRIANA MANRIQUE		
-	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL-TECNICO	DESCRIPCION DEL PROYECTO Y FICHAS AMBIENTALES POC INTERVENCION DEL PR21+710	3 Folios	X		ELEFILETH RICARDO		
CTT-225-1662-25	1/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-157 Remisión Informe Técnico No. 3	1 Folio		X			
CTT-225-1666-25	2/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Instalación de vallas de información y gestión de permiso de publicidad exterior visual.	1 Folio	X		JULIO BOGOTA/ KATHERINE		
-	2/9/2025	X		X	ICCU	TECNICA	Aprobación de formatos implementar tema RCD	1 Folio		X			
-	2/9/2025	X		X	VEEDURIA CIUDADANA CONTRATO 245	ICCU	Derecho de Petición Control Social	5Folios		X			
CTT-225-1668-25	3/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Requerimiento maquinaria mínima del proyecto (Carrotanques)	1 Folio	X		JULIO BOGOTA		
CTT-225-1672-25	3/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación del informe mensual Ambiental No.3 versión 3 del contratista	1 Folio		X			
CTT-225-1693-25	5/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0185 INFORME SST N°3 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1700-25	8/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-163 Remisión Informe Gerencial No. 3 (Aprobación informe Gerencial)	1Folio		X			
-	8/9/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	SOLICITUD DE APROBACION SITIOS DE ACOPIO MATERIAL	5 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FOR-CO-01
Versión 01

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO	TIPO				ANEXOS O FOLIOS	RESPUESTA	OFICIO DE RESPUESTA
						Ofic.	Fisico	Med. Mag	Correo		RESPONSABLE	
1	FOR-CO-03-ICCU046-001	26/3/2025	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA	SOCIAL	SOLICITID DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION	X			X	1	ARN	OFI25-007138
2	FOR-CO-03-ICCU046-002	12/3/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	CONSULTA SOBRE APLICACIÓN DE IMPUESTO TIMBRE	X			X	2	ICCU	22-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
3	FOR-CO-03-ICCU046-003	18/3/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	RADICACION DE POLIZAS PARA REVISIÓN Y APROBACION	X			X	Poliza de cumplimiento (16 Folios) Poliza RCE (41 folios)	ICCU	08-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
4	FOR-CO-03-ICCU046-004	31/3/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION DEL CONTRATO DE FIDUCIA PARA REVISIÓN Y APROBACION	X			X	21 Folios	INTERVENTORIA	01-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
5	FOR-CO-03-ICCU046-005	3/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION DE TARJETA DE FIRMA DEL CONTRATO FIDUCIA PARA SU SUSCRIPCION	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0593-25
6	FOR-CO-03-ICCU046-006	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Remisión Plan de Inversión del Anticipo V1 y Justificación Técnica, Jurídica y Financiera para la Asignación del 40% del Anticipo en la Adquisición de Maquinaria.	X			X	22 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0650-25
7	FOR-CO-03-ICCU046-007	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de entrega de estudios y diseños – Contrato ICCU-CTO-245 DE 2025	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	
8	FOR-CO-03-ICCU046-008	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST-SOCIAL-AMBIENTAL	Remisión de Programas para el plan de adaptación PAGA (SST-MANEJO AMBIENTAL-SOCIAL)	X			X	Programas + Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0720-25
9	FOR-CO-03-ICCU046-009	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Remisón de solicitud de radicacion ante la ARN	X			X	3 Folios	N/A	N/A
10	FOR-CO-03-ICCU046-010	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CALIDAD	Radicación de documentos – Cumplimiento de compromisos adquiridos según Formato 7 del Pliego de Condiciones. (PLAN DE ASEGURAMEINTO DE CALIDAD)	X			X	36 Folios +Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0748-25
11	FOR-CO-03-ICCU046-011	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Radicación Hoja de Vida del Profesional PMP y Contrato de Prestación de Servicios para el Programa de Gerencia de Proyectos.	X			X	Folios + Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0704-25
12	FOR-CO-03-ICCU046-012	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Radicación Análisis de precios unitarios.	X			X	Excel y PDF	INTERVENTORIA	CTT-225-1241-25
13	FOR-CO-03-ICCU046-013	7/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Radicación de Pólizas para Revisión y Aprobación V2.	X			X	Poliza de cumplimiento (3 Folios) Poliza RCE (41 folios) Anexos	ICCU	22-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
14	FOR-CO-03-ICCU046-014	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	RADICACION Y NOTIFICACION DE POLIZAS	X			X	Poliza de Cumplimiento (3 Folios) Anexo (13 Folios) Poliza RCE (41 Folios)	N/A	N/A
15	FOR-CO-03-ICCU046-015	11/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	X			X	10 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0983-25
16	FOR-CO-03-ICCU046-016	14/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Cumplimiento del numeral 27 – Cláusula 9 del Contrato ICCU-CTO-245 de 2025. Respuesta ARN	X			X	1 Folio	N/A	N/A
17	FOR-CO-03-ICCU046-017	15/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Respuesta comunicado CTT-225-0650-25, Atención al oficio FOR-CO-03-006 Remisión Plan de Inversión del Anticipo y justificación Técnica.	X			X	8 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0686-25
18	FOR-CO-03-ICCU046-018	16/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES PARTE 1	X			X	7 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0745-25
19	FOR-CO-03-ICCU046-019	16/4/2025	PEDRO CASTILLO REINA	SOCIAL	SOLICITUD DE PRÉSTAMO AUDITORIO: REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	N/A	SECRETARIA	SOCIAL OK
20	FOR-CO-03-ICCU046-020	21/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Radicación de Acta de Inicio firmada por el contratista	X			X	1 Folio	INTERVENTORIA	N/A
21	FOR-CO-03-ICCU046-021	15/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Respuesta comunicado CTT-225-0686-25, Atención al oficio FOR-CO-03-017 Remisión Plan de Inversión del Anticipo.	X			X	1 Folio	INTERVENTORIA	CTT-225-0700-25
22	FOR-CO-03-ICCU046-022	28/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Solicitud de pago del Anticipo	X			X	25 Folios	N/A	N/A
23	FOR-CO-03-ICCU046-023	24/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Radicación Acta de Inicio – Entrega de original firmado	X			X	1 Folio	N/A	N/A
24	FOR-CO-03-ICCU046-024	24/4/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
25	FOR-CO-03-ICCU046-025	24/4/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
26	FOR-CO-03-ICCU046-026	24/4/2025	ALCALDE ANAPOIMA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
27	FOR-CO-03-ICCU046-027	24/4/2025	ALCALDE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
28	FOR-CO-03-ICCU046-028	24/4/2025	ALCALDE DE VIOTA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
29	FOR-CO-03-ICCU046-029	24/4/2025	TRANSPORTE TEQUENDAMA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
30	FOR-CO-03-ICCU046-030	24/4/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
31	FOR-CO-03-ICCU046-031	24/4/2025	ALCALDE DEL COLEGIO	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
32	FOR-CO-03-ICCU046-032	24/4/2025	ICCU	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
33	FOR-CO-03-ICCU046-033	24/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
34	FOR-CO-03-ICCU046-034	25/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Remisión de garantías actualizadas conforme al Acta de Inicio	X			X	6 Folios	ICCU	CORREO elericardo@sofaningenieria.com
35	FOR-CO-03-ICCU046-035	25/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta oficio CTT-225-0671-25, traslado indicaciones valla informativa ICCU y manual de uso de logos	X			X	Logos	ICCU	14-05-25 CORREO admoncto245@sofanigenieria.com
36	FOR-CO-03-ICCU046-036	28/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	REMISION PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS	X			X	22 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0851-25
37	FOR-CO-03-ICCU046-037	28/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-714-25 - Observaciones del Plan de Gestión Social	X			X	31 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0848-25
38	FOR-CO-03-ICCU046-038	28/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión Hoja de vida Profesionales. (Parte 2)	X			X	4 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0745-25
39	FOR-CO-03-ICCU046-039	1/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-720-25 - Observaciones al PG-SST	X			X	60 Folios + 16 Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0806-25
40	FOR-CO-03-ICCU046-040	6/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta Comunicado CTT-225-725-25 del 25 de abril de 2025, Observaciones al Programa Ambiental (PAGA).	X			X	178 Folios + 18 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0841-25
41	FOR-CO-03-ICCU046-041	5/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CALIDAD	Respuesta Comunicado CTT-225-748-25 del 30 de abril de 2025, Observaciones al Plan de Calidad	X			X	46 Folios + 8 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0914-25
42	FOR-CO-03-ICCU046-042	6/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0763-25 Solicitud cumplimiento entrega documentos.	X			X	106 Folios + 4 Planos	INTERVENTORIA	CTT-225-0845-25
43	FOR-CO-03-ICCU046-043	7/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0806-25, SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0039 Observaciones al PG-SST V2.	X			X	60 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0838-25

44	FOR-CO-03-ICCU046-044	8/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0745-25, Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-018 y 038 Revisión Hojas de Vida Profesionales	X			X	Diploma Especialización P. Social (1 Folio) Carta de Intención Profesional	INTERVENTORIA	CTT-225-945-25
45	FOR-CO-03-ICCU046-045	9/5/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
46	FOR-CO-03-ICCU046-046	9/5/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
47	FOR-CO-03-ICCU046-047	9/5/2025	ALCALDE ANAPOIMA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
48	FOR-CO-03-ICCU046-048	9/5/2025	ALCALDE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
49	FOR-CO-03-ICCU046-049	9/5/2025	ALCALDE DE VIOTA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
50	FOR-CO-03-ICCU046-050	9/5/2025	TRANSPORTE TEQUENDAMA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
51	FOR-CO-03-ICCU046-051	9/5/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
52	FOR-CO-03-ICCU046-052	9/5/2025	ALCALDE DEL COLEGIO	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
53	FOR-CO-03-ICCU046-053	9/5/2025	ICCU	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
54	FOR-CO-03-ICCU046-054	9/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
55	FOR-CO-03-ICCU046-055	16/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	VALLA INFORMATIVA COMPONENTE SOCIAL	X			X	1 Folio	N/A	N/A
56	FOR-CO-03-ICCU046-056	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-871-25	X			X	2 Folios		N/A
57	FOR-CO-03-ICCU046-057	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-849-25	X			X	1 Folio Metodologia (9 Folios)	INTERVENTORIA	CTT-225-983-25
58	FOR-CO-03-ICCU046-058	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE Solicitud de Diseño Def para Aten de Emerg– PR50+822	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0894-25
59	FOR-CO-03-ICCU046-059	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0853-25 CUMPLIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS	X			X	07. PRO-GH-05 ESTRUCTURA ADM DEL PROYECTO V2 (4 Folios) SOAT UQE 280 (1 Folio) SOAT UQE 281 (1 Folio) Carpeta OEB 473 Carpeta Pavimentadora	INTERVENTORIA	CTT-225-946-25
60	FOR-CO-03-ICCU046-060	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES PARTE 3	X			X	3 CARPETAS	INTERVENTORIA	CTT-225-945-25
61	FOR-CO-03-ICCU046-061	20/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-892-25, Entrega Estudios y Diseños del ICCU.	X			X	1 Folio		N/A
62	FOR-CO-03-ICCU046-0062	20/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-851-25, Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-036 Remisión plan de Gerencia de Proyectos.	X			X	1 Folio 2 anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0984-25
63	FOR-CO-03-ICCU046-0063	21/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-841-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-OBSERVACIONES AMBIENTAL ENTREGA PAGA V2.	X			X	Paga V3	INTERVENTORIA	CTT-225-0971-26
64	FOR-CO-03-ICCU046-0064	21/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a solicitud inclusión de apartado presupuesto Plan de Gestión social – Oficio CTT-225-896-25.	X			X	Plan Gestión social (39 folios)	INTERVENTORIA	CTT-225-0848-25
65	FOR-CO-03-ICCU046-0065	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Remisión PMT actividades de Mantenimiento.	X			X	Informe (20 folios) Planos (4)	INTERVENTORIA	CTT-225-0991-26
66	FOR-CO-03-ICCU046-0066	22/5/2025	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR	TECNICO	Solicitud de información de recurso o cuerpo hídrico en el punto de referencia PR50+625 para iniciar el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce POC	X				N/A	CAR	13252005810
67	FOR-CO-03-ICCU046-0067	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión de documentos de vehículos, maquinaria pesada y maquinaria menor para revisión y aprobación.	X			X	Carpetas (6 und)	INTERVENTORIA	CTT-225-992-25
68	-	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN - SOCIALIZACION INICIO D OBRA 05-05-2025				X	56 Folios	INTERVENTORIA	N/A
69	FOR-CO-03-ICCU046-0068	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Remisión hoja de vida profesional PMP – Solicitud de cambio de profesional asignado	X			X	1 Carpeta	INTERVENTORIA	CTT-225-993-25
70	FOR-CO-03-ICCU046-0069	23/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de evaluación para ajuste dimensional del Box culvert – PR50+600.	X			X	N/A	INTERVENTORIA	REUNIÓN CON DISEÑADOR ICCU
71	FOR-CO-03-ICCU046-0070	25/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentación SST personal operativo y administrativo.	X			X	7 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0941-25
72	FOR-CO-03-ICCU046-0071	27/5/2025	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR	AMBIENTAL	Entrega y radicación del programa de Manejo ambiental de Residuos de construcción y Demolición -PMARCD	X	X			1 Carpeta	CAR	13252005810
73	FOR-CO-03-ICCU046-0072	28/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta CTT-225-941-25, y entrega de Entrega documentación SST personal operativo y administrativo	X			X	5 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-1016-25
74	FOR-CO-03-ICCU046-0073	28/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Afectaciones en la ejecución por falta de insumos técnicos.	X			X	N/A	INTERVENTORIA	CTT-225-958-25
75	FOR-CO-03-ICCU046-0074	28/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Radicación de documentos de equipos de topografía	X			X	2 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-994-25
76	CORREO AMBIENTAL	30/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	RESPUESTA A OBSERVACIONES DESCRIPCION DEL PROYECTO Y FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL POC - BOX PR50+625				X	5 Documentos	INTERVENTORIA	N/A
77	CORREO AMBIENTAL	30/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	RADICACION DEL PMA-RCD DEL CTO ICCU 245 DE 2025				X	1 Documento	INTERVENTORIA	N/A
78	FOR-CO-03-ICCU046-0075	29/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-0952-25, Solicitud de señalización puntos críticos.	X			X	N/A	INTERVENTORIA	CTT-225-1028-25
79	FOR-CO-03-ICCU046-0076	3/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe social No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe Social (24 Folios) Anexo (17)	INTERVENTORIA	CTT-225-1014-25
80	FOR-CO-03-ICCU046-0077	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Informe SST No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe SST (22 Folios) Anexo (5)	INTERVENTORIA	CTT-225-1017-25
81	FOR-CO-03-ICCU046-0078	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Informe Tecnico No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe Tecnico(23 Folios) Anexo (6)	INTERVENTORIA	
82	FOR-CO-03-ICCU046-0079	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Informe Gerencial No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe Gerencial (25 Folios) Anexo (2)	INTERVENTORIA	
83	FOR-CO-03-ICCU046-0080	6/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Justificación para la realización de ensayos para obras de estabilización en la Troncal del Tequendama	X			X	2 Folios 2 Anexos	INTERVENTORIA	Respuesta Correo Ing David Tierradentro
84	FOR-CO-03-ICCU046-0081	6/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Entrega informe Mensual Ambiental No 1	X			X	Informe Técnico (25 Folios) Anexo (2)	INTERVENTORIA	CTT-225-1033-25
85	FOR-CO-03-ICCU046-0082	7/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención al comunicado Oficio CTT-225-1014-25 Informe mensual social N°1	X			X	Informe Social (25 Folios) Anexo (18)	INTERVENTORIA	CTT-225-1046-25
86	FOR-CO-03-ICCU046-0083	8/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0072 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-1042-25
87	FOR-CO-03-ICCU046-0084	9/6/2025	YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ	

88	FOR-CO-03-ICCU046-0085	9/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de mesa de trabajo para planificación de actividades de mantenimiento periódico vía troncal del Tequendama	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-1038-25
89	FOR-CO-03-ICCU046-0086	9/6/2025	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO	
90	FOR-CO-03-ICCU046-0087	9/6/2025	JUAN ALEJANDRO CASTAÑO GAMEZ	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	JUAN ALEJANDRO CASTAÑO GAMEZ	
91	FOR-CO-03-ICCU046-0088	9/6/2025	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	SIM No. 435-2025
92	FOR-CO-03-ICCU046-0089	10/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentos SST personal operativo	X			X	1 Folio 3 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1057-25
93	FOR-CO-03-ICCU046-0090	10/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Se informa sobre los sitios o tramos para los tramites de Permiso de Ocupación de Cauce POC con el ICCU y la AAC.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
94	FOR-CO-03-ICCU046-0091	11/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST	X			X	18 Folios Informe(10 Anexos)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1059-25
95	FOR-CO-03-ICCU046-0092	11/6/2025	SOFAN INGENIERIA SA.S.	ADMINISTRATIVO	ESTADO CAMION PRY 569	X			X	2 Folios	N/A	N/A
96	FOR-CO-03-ICCU046-0093	11/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA COMUNICADO CTT-225-1009-25	X			X	2 Folios	N/A	N/A
97	FOR-CO-03-ICCU046-0094	11/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta Comunicado CTT-225-1033-25 del 11 de junio de 2025, observaciones al informe mensual ambiental	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
98	-	12/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	COMUNICADO-COMPONENTE SOCIAL	X			X	2 Folios 1 Anexo Informe	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Se coordina Mesa de Trabajo
99	FOR-CO-03-ICCU046-0095	12/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1057-25 OBSERVACIONES en el radicado FOR-CO-03-ICCU046-0089	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1087-25
100	-	12/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTAS DE VECINDAD K49+000	X			X	Registro Fotografico	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Observaciones Correo
101	FOR-CO-03-ICCU046-0096	12/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1005-25, Implementación urgente del PMT con reguladores de tráfico – PR 50+625.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1088-25
102	FOR-CO-03-ICCU046-0097	13/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Justificación técnica para ensayos de diagnostico y estabilización	X			X	7 Folios (1 Anexo)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
103	FOR-CO-03-ICCU046-0098	13/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE CTT-225-958-25 Afectación en la ejecución por la falta de insumos tecnicos	X			X	1 Folio 4 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
104	-	16/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTAS DE VECINDAD K49+000	X			X	1 Anexo	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
105	FOR-CO-03-ICCU046-099	18/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Radicación de la programación PDT	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1116-25
106	FOR-CO-03-ICCU046-100	18/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de entrega de diseños faltantes – Contrato ICCU-245-2025	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
107	FOR-CO-03-ICCU046-101	19/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de aclaración sobre diseño de muro sobre pilotes en PR 49+000	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
108	-	19/6/2025	CAR Corporacion Autónoma Regional CAR Corporacion Autónoma Regional	AMBIENTAL	CONCEPTO PAGO POC				X	N/A	CONSORCIO SOFAN C-046	
109	FOR-CO-03-ICCU046-102	19/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1046-25 Informe Social N°1	X			X	25 Folios 16 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
110	FOR-CO-03-ICCU046-103	20/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión de Informes de Vía y Caracterización del Terreno	X			X	Informe Sondeos (40 Folios) Informe Auscultación (51 Folios)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
111	FOR-CO-03-ICCU046-104	20/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Alcance comunicado FOR-CO-03-ICCU046-098 del 13 de junio del 2025.	X			X	Informes + Registro fotografico	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
112	FOR-CO-03-ICCU046-105	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	6 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
113	FOR-CO-03-ICCU046-106	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1116-25, Radicación de la Programación PDT.	X			X	6 Archivos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
114	-	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud de acompañamiento técnico - levantamiento de actas de vecindad K41+500				X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
115	FOR-CO-03-ICCU046-107	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1059-25, Respuesta informe mensual SST.	X			X	2 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
116	FOR-CO-03-ICCU046-108	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
117	FOR-CO-03-ICCU046-109	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado CTT-225-1116-25, Justificación programación (PDT).	X			X	4 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
118	FOR-CO-03-ICCU046-110	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Solicitud de ingreso del profesional Carlos Tinoco como inspector de obra y retiro de Pedro José Jaller.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
119	FOR-CO-03-ICCU046-111	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Respuesta comunicado CTT-225-1152-25, Traslado oficio ICCU-S-2025-0004129 Opción de Mejora al Plan de PMT.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
120	FOR-CO-03-ICCU046-112	8/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	SOLICITUD DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE LOS SITIOS DE RECEPCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE RCD POR PARTE DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA	X			X	7 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
121	FOR-CO-03-ICCU046-113	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1126-25, Alcance a la comunicación CTT-225-1044-25 y Revisión entrega formal Informe de Medición de deflectometria y condición superficial Troncal Tequendama.	X			X	3 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
122	FOR-CO-03-ICCU046-114	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1028-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-075 RE CTT-225-0952-25 Solicitud de señalización puntos críticos.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
123	FOR-CO-03-ICCU046-115	30/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado CTT-225-1147-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-079 Informe Gerencial.	X			X	Informe de gerebcia 26 folios (3 Anexos)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
124	FOR-CO-03-ICCU046-116	30/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Alcance a oficio FOR-CO-03-ICCU046-0109 del 25 de junio del 2025, Remisión de PDT.	X			X	Plan de Trabajo (Project) Flujo de caja y Curvas S	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
125	FOR-CO-03-ICCU046-117	1/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	4 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1198-25
126	FOR-CO-03-ICCU046-118	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, CTT-225-1059-25, CTT-225-1159-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST.	X			X	Informe 21 Folios/ Anexo 12	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
127	FOR-CO-03-ICCU046-119	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1044-25, Solicitud inicio de trabajos de campo – Presentación de plan de contingencia para subsanar el atraso presentado en el oficio CTT-225-958-25	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1460-25
128	FOR-CO-03-ICCU046-120	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1150-25, Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	

129	FOR-CO-03-ICCU046-121	7/07/2025	ICCU	TECNICO	Solicitud urgente de implementación de señalización preventiva en puntos críticos de la Troncal del Tequendama	X			X	N/A	ICCU	
130	FOR-CO-03-ICCU046-122	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1124-25, INFORME TÉCNICO N°1 V2.	X			X	Informe Técnico (27 Folios) Anexo (7)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
131	FOR-CO-03-ICCU046-123	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	INFORME TÉCNICO N° 2.	X			X	Informe Técnico (31 Folios) Anexo (8)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
132	FOR-CO-03-ICCU046-124	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	INFORME SST No. 2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	Informe SST (20 Folios) Anexo (11)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1405-25
133	FOR-CO-03-ICCU046-125	7/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión Documentos Camión PRY 569	X			X	Carpeta 1	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
134	FOR-CO-03-ICCU046-126	7/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1214-25, Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
135	FOR-CO-03-ICCU046-127	7/07/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta al comunicado CTT-225-1214-25, Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	X			X	3 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
136	FOR-CO-03-ICCU046-128	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe Social No.2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	23 folios (11 Anexos)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
137	FOR-CO-03-ICCU046-129	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1174-25, Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.	X			X	9 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
138	FOR-CO-03-ICCU046-130	8/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Informe Gerencial No.2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
139	FOR-CO-03-ICCU046-131	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Remisión PDT, atendiendo a observaciones presentadas en Comité Técnico del 2 de julio de 2025.	X			X	2 Folios 3 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
140	FOR-CO-03-ICCU046-132	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	5 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1299-25
141	FOR-CO-03-ICCU046-133	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°2	X			X	Informe Técnico (26 Folios) Anexo (9 Carpetas)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
142	-	9/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	COMUNICADO CAR 13252008178 PMARCD NUG 13251000753	X			X	2 Folios	N/A	
143	-	9/7/2025	POLICIA NACIONAL	SOCIAL	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL PARA OBRA EN EJECUCIÓN	X			X	1 Folio	POLICIA NACIONAL	
144	-	9/7/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	ACOSO POR PARTE DE CIUDADANOS - EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS	X			X	1 Folio	VEEDURIA CIUDADANA	
145	FOR-CO-03-ICCU046-134	11/7/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	SOCIAL	INFORME- AGRECIONES PERSONALES Y ACTO DE VANDALISMO K41+500	X			X	3 Folios	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	
146	FOR-CO-03-ICCU046-135	11/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado – Oficio CTT-225-1261-25, Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
147	FOR-CO-03-ICCU046-136	12/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1282-25, Solicitud de reporte diario de frentes de trabajo	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
148	FOR-CO-03-ICCU046-137	13/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal en obra.	X			X	1 Folio 5 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1299-25
149	FOR-CO-03-ICCU046-138	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado – Oficio CTT-225-1272-25, Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0126 - Acciones frente a incidente con comunidad	X			X	Informe social (23 Folios) Anexo (10)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
150	FOR-CO-03-ICCU046-139	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE CTT-225-1273-25, Solicitud de actividades de limpieza de alcantarillas como medida de mitigación.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
151	FOR-CO-03-ICCU046-140	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1199-25, Revisión Muro PR48+900.	X			X	12 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
152	-	14/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ACTUALIZACION DEL PAGA V4	X			X	Paga V4	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
153	FOR-CO-03-ICCU046-141	15/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1280-25, Solicitud de concepto del especialista en geotecnia frente a condiciones de excavación en el PR 41+500.	X			X	Informe 2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
154	FOR-CO-03-ICCU046-142	18/7/2025	ICCU	ICCU	Solicitud urgente de pronunciamiento y trámite del anticipo contractual	X			X	4 Folios	ICCU	ICCU-E-2025-0009002 con la contraseña POiVVEuk8r // ICCU-S-2025-0004550 y la contraseña 97BX7fuPs5//ctt-225-1460-25
155	FOR-CO-03-ICCU046-143	21/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1292-25, Atención al oficio FOR-CO- 03-ICCU046-0133, observaciones al informe mensual N° 2.	X			X	Informe Ambiental # 2 V2 (26 Folios) 9 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1353-25
156	Correo DIRECTOR DE OBRA	22/7/2025	POLIMIX	TECNICO	Reclamación por incumplimiento logístico en suministro de concreto lunes 21 de julio 2025 – Polimix				X	N/A	POLIMIX	
157	FOR-CO-03-ICCU046-144	24/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1245-25, Traslado de oficio ICCU-S-2025-0004426 repuesta al oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños.	X			X	Cotas Propuesta Adoquinada Nivelación Adoquinada Pavimento Articulado (Plano) Presupuesto	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1434-25
158	FOR-CO-03-ICCU046-145	25/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1299-25, Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0132, FOR-CO-03-ICCU046-0137 Entrega de documentación SST personal operativo	X			X	2 Carpetas Contrato Urbanuz	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
159	FOR-CO-03-ICCU046-146	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1247-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0124 Informe SST N°2.	X			X	Informe SST No 2 V2 14 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
160	FOR-CO-03-ICCU046-147	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1240-25, Observaciones componente SST.	X			X	Permisos ATS (13 Folios) Programa Procedimiento Alturas (66 Folios)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
161	FOR-CO-03-ICCU046-148	28/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta oficio CTT-225-1281-25, Reiteración sobre el uso obligatorio de líneas de vida en excavaciones mayores a 1.50 metros.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
162	FOR-CO-03-ICCU046-149	29/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentación SST personal operativo.	X			X	4 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
163	FOR-CO-03-ICCU046-150	30/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Inventario de predios K 1+800 - Registro fotográfico				X	Link	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
164	FOR-CO-03-ICCU046-151	31/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1402-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0145 documentación personal.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1464-25
165	FOR-CO-03-ICCU046-152	1/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión de documentos de equipo para revisión y aprobación.Vibrocompactador CC1200	X			X	1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1465-25
166	FOR-CO-03-ICCU046-153	1/9/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE TEQUENDAMA	TECNICO	Solicitud de apoyo con maquinaria para adecuación de acopio de fresado.	X			X	1 Folio	ALCALDIA MUNICIPAL DE TEQUENDAMA	
167	FOR-CO-03-ICCU046-154	1/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1353-25 y CTT-225-1406-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0143, observaciones al informe mensual N° 2 V2.	X			X	Informe Mensual Ambiental No. 2 V3 (32 folios) 9 carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
168	FOR-CO-03-ICCU046-155	5/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	REMISION INFORME SOCIAL No 3	X			X	Informe social 23 Folios Anexos 12	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
169	FOR-CO-03-ICCU046-156	5/8/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	SOCIAL	REMISION DE ACTA DE VECIDNDAD POSIBLE RIESGO DE COLAPSO DE INMUEBLE	X			X	Acta de vecindad	ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	

170	FOR-CO-03-ICCU046-157	5/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	REMISION INFORME TECNICO No 3	X			X	Informe social 38 Folios 10 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
171	FOR-CO-03-ICCU046-158	6/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE DESEMBOLSO POR FIDUCIA	X			X	Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
172	FOR-CO-03-ICCU046-159	6/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Acercamiento preliminar – Intervención técnica proyectada peaje Nuevo Salto	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
173	FOR-CO-03-ICCU046-160	6/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Remisión de contrato de subcontratista para aprobación – Mano de obra URBANUZ CONSTRUCCIONES HS SAS	X			X	10 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1483-25
174	FOR-CO-03-ICCU046-161	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISION INFORME SST No 3	X			X	Informe SST (18 Folios) Anexo (25)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
175	FOR-CO-03-ICCU046-162	9/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°3	X			X	Informe Técnico (26 Folios) Anexo (9 Carpetas)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
176	FOR-CO-03-ICCU046-163	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	REMISIÓN INFORME GERENCIAL No. 3.	X			X	Informe social (37) folios Anexos 3	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
177	FOR-CO-03-ICCU046-164	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta Comunicado CTT-225-1405-25, Informe SST N°2, Planilla Especialista.	X			X	1 FOLIO	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1506-25
178	FOR-CO-03-ICCU046-165	8/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta Comunicado CTT-225-1465-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0152 documentación Maquinaria I.	X			X	1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1504-25
179	FOR-CO-03-ICCU046-166	9/08/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1487-25 - Solicitud de aclaración sobre compromiso de disponibilidad de carrotanques.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
180	FOR-CO-03-ICCU046-167	11/08/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1488-25 Observaciones informe mensual social No 3 V2	X			X	Informe social (26) folios Anexos 13	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
181	FOR-CO-03-ICCU046-168	12/08/2025	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ADMINISTRATIVO	Solicitud de desembolso directo al Banco de Bogotá				X	1 Folio	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	
182	FOR-CO-03-ICCU046-169	12/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1512-25, Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos.	X			X	1 fOLIO	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
183	FOR-CO-03-ICCU046-170	12/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentación SST personal operativo y administrativo	X			X	1 Folio 2 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
184	FOR-CO-03-ICCU046-171	13/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1471-25, Solicitud Información y aplicación de la norma.	X			X	Ref. 290-25 (105 Folios), Licencia Ambiental (1 Folio), Resolución Ambiental (12 folios), Unidades Certificadas (1 folio), Concreto convencional (2 folios), Rucom (1 Folio), Certificado IDU (1 Folio),CErtificado ISO (1 Folio)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
185	FOR-CO-03-ICCU046-172	13/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1264-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-104 revisión informe de topografía.	X			X	Levantamiento Quebrada DWG, Levantamiento Quebrada PDF	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
186	FOR-CO-03-ICCU046-173	14/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1293-25, Observaciones al PAGA V4.	X			X	Plan Ambiental PAGA V3 (185 folios) ⁋8 carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
187	FOR-CO-03-ICCU046-174	14/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1555-25
188	FOR-CO-03-ICCU046-175	14/8/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	VEEDURIA CIUDADANA	
189	FOR-CO-03-ICCU046-176	14/8/2025	ICCU	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	ICCU	
190	FOR-CO-03-ICCU046-177	15/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentación SST personal operativo y administrativo	X			X	Carpeta 47 a la 53	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
191	FOR-CO-03-ICCU046-178	15/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1511-25, Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
192	FOR-CO-03-ICCU046-179	15/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión de diseño de mezcla MDC-19 para revisión y aprobación	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
193	-	19/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Volante informativo - Inicio de actividades de mantenimiento vial	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
194	FOR-CO-03-ICCU046-180	19/8/2025	YADMIN PARRA REYES	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X	X			1 Folio	N/A	
195	FOR-CO-03-ICCU046-181	19/8/2025	JULIO CESAR BOGOTA CARRILLO	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X	X			1 Folio	N/A	
196	FOR-CO-03-ICCU046-182	19/8/2025	EDISON AGUILAR CORCHUELO	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X	X			1 Folio	N/A	
197	FOR-CO-03-ICCU046-183	19/8/2025	ADRIANA MANRIQUE	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X	X			1 Folio	N/A	
198	FOR-CO-03-ICCU046-184	20/8/2025	ICCU	TECNICO	Pago de Acta parcial de obra No.1, correspondiente al periodo del 21 de abril al 30 de junio del 2025.	X			X	2 Folios	ICCU	
199	FOR-CO-03-ICCU046-185	22/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1522-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0161 Informe SST No. 3.	X			X	Informe SST (27 Folios) 18 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
200	FOR-CO-03-ICCU046-186	21/8/2025	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON (ALCALDE ANAPOIMA)	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	N/A	
201	FOR-CO-03-ICCU046-187	21/8/2025	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO (ALCALDE DE TEQUENDAMA)	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	N/A	
202	FOR-CO-03-ICCU046-188	21/8/2025	OSCAR HERNAN QUIROJA	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	N/A	
203	FOR-CO-03-ICCU046-189	21/8/2025	DIEGO ANDRES LOPEZ SUAREZ	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	N/A	
204	FOR-CO-03-ICCU046-190	21/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1509-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0162, observaciones al informe mensual N° 3.	X			X	7 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
205	FOR-CO-03-ICCU046-191	25/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión FURAT – Notificación Accidente de Trabajo	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
206	FOR-CO-03-ICCU046-192	26/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1572-25, Observaciones fichas para trámite del POC – PR21+720.	X			X	34 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
207	FOR-CO-03-ICCU046-193	27/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de Acta de Modificación # 1	X			X	16 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
208	FOR-CO-03-ICCU046-194	27/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISION DOCUMENTOS FRESADORA	X			X	1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1653-25
209	FOR-CO-03-ICCU046-195	27/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1609-25, OBSERVACIONES SOBRE EL MATERIAL FILTRANTE	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1661-25
210	FOR-CO-03-ICCU046-196	26/8/2025	ICCU	SOCIAL	INVITACIÓN A RECORRIDO DE OBRA – VEEDURÍA CIUDADANA	X			X	1 Folio	ICCU	
211	FOR-CO-03-ICCU046-197	28/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1623-25, RE FOR-CO-03-ICCU046-0185 Informe SST # 3 V2.	X			X	1 Folio Informe y Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	

212	-	28/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	SOLICITUD DE APROBACION DE LOS SITIOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RCD EN LOS PR48+900 - PR2+000 - PR2+300				X	4 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
213	FOR-CO-03-ICCU046-198	29/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1626-25, Observaciones al informe mensual N° 3 V2.	X			X	4 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
214	FOR-CO-03-ICCU046-199	30/8/2025	ICCU	TECNICO	Pago de Acta parcial de obra No.1, correspondiente al periodo del 21 de abril al 30 de junio del 2025.	X			X	2 Folios 29 Archivos	ICCU	
215	FOR-CO-03-ICCU046-200	31/8/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentos SST personal operativo y administrativo	X			X	9 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
216	FOR-CO-03-ICCU046-201	1/9/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión de volquetas para transporte de mezcla asfáltica	X			X	2 Folios 5 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
217	FOR-CO-03-ICCU046-202	1/9/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1656-25, documentos personal operativo.	X			X	2 Folios 1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
218	FOR-CO-03-ICCU046-203	3/9/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE VERIFICACION PARA RECEPCION DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
219	FOR-CO-03-ICCU046-204	3/09/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE VERIFICACION PARA RECEPCION DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA	X			X	1Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
220	FOR-CO-03-ICCU046-205	3/09/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1617-25 – Plan de trabajo de mantenimiento de paraderos	X			X	1 folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
221	FOR-CO-03-ICCU046-206	5/09/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta al comunicado CTT-225-1661-25 – Material filtrante PR 41+500	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
222	FOR-CO-03-ICCU046-207	5/09/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta al oficio CTT-225-1619-25 – Solicitud de entrega de ensayos de densidades PR 41+500 y PR 48+900	X			X	1 Folio	N/A	
223	FOR-CO-03-ICCU046-208	5/09/2025	CARLOS POVEDA RAMIREZ	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	N/A	
224	FOR-CO-03-ICCU046-209	5/09/2025	LUIS LOPEZ	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	N/A	
225	FOR-CO-03-ICCU046-210	5/09/2025	GERMAN QUINTERO	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	N/A	
226	FOR-CO-03-ICCU046-211	5/09/2025	YEISON GARAVITO LOPEZ	ADMINISTRATIVO	Notificación de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	N/A	
227	FOR-CO-03-ICCU046-212	5/09/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE VERIFICACION PARA RECEPCION DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA- LA FORTUNA	X			X	1Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
228	FOR-CO-03-ICCU046-213	5/09/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE VERIFICACION PARA RECEPCION DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA- LA FORTUNA	X			X	1Folio	N/A	
229	FOR-CO-03-ICCU046-214	5/09/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe mensual social No 4 V1	X			X	24 Folios 8 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
230	-	6/09/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	SOLICIT+F228- PRUD DE APROBACION DE LOS SITIOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RCD EN LOS PR+- PR00 - PR2+000 - PR2+300+F231				X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	

ANEXO No 3

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO


Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046


FECHA DE INFORME 31/08/2025


CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN


		PROGRAMADO				EJECUCION				INDICADORES			
		TOTAL CONTRATO				TOTALES					VARIACION	SPI	CPI
	FECHA			CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	CRTR	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP	CPTR/CRTR
		semana	acumulado										
Semana 1	25/05/2025	$ 24.990.824,95	$ 24.990.824,95	24,99	0,08%	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	12,50	0,04%	11,875	-0,04%	0,50	1,05
Semana 2	1/06/2025	$ 128.389.189,85	$ 153.380.014,80	153,38	0,51%	$ 11.908.566,40	$ 24.408.566,40	24,41	0,08%	23,18813808	-0,43%	0,16	1,05
Semana 3	8/06/2025	$ 113.862.825,47	$ 267.242.840,27	267,24	0,90%	39205028,04	63613594,44	63,614	0,21%	60,43291472	-0,68%	0,24	1,05
Semana 4	15/06/2025	$ 197.605.612,71	$ 464.848.452,98	464,85	1,56%	$ 39.205.028,04	$ 102.818.622,48	102,82	0,35%	$ 97,68	-1,22%	0,22	1,05
Semana 5	22/06/2025	$ 642.735.048,38	$ 1.107.583.501,36	1.107,58	3,72%	$ 39.205.028,04	$ 142.023.650,52	142,02	0,48%	$ 134,92	-3,24%	0,13	1,05
Semana 6	29/06/2025	$ 515.194.675,47	$ 1.622.778.176,83	1.622,78	5,45%	$ 39.205.030,59	$ 181.228.681,11	181,23	0,61%	$ 172,17	-4,84%	0,11	1,05
Semana 7	6/07/2025	$ 61.153.535,14	$ 115.945.471,98	115,95	0,39%	$ 15.502.701,21	$ 196.731.382,32	196,73	0,66%	$ 186,89	0,27%	1,70	1,05
Semana 8	13/07/2025	$ 92.414.416,38	$ 208.359.888,36	208,36	0,70%	$ 15.502.701,21	$ 212.234.083,52	212,23	0,71%	$ 201,62	0,01%	1,02	1,05
Semana 9	20/07/2025	$ 164.000.015,45	$ 372.359.903,81	372,36	1,25%	$ 15.502.701,21	$ 227.736.784,73	227,74	0,76%	$ 216,35	-0,49%	0,61	1,05
Semana 10	27/07/2025	$ 317.627.160,66	$ 689.987.064,47	689,99	2,32%	$ 15.502.701,21	$ 243.239.485,93	243,24	0,82%	$ 231,08	-1,50%	0,35	1,05
Semana 11	3/08/2025	$ 355.731.086,90	$ 1.045.718.151,36	1.045,72	3,51%	$ 45.640.253,12	$ 288.879.739,05	288,88	0,97%	$ 274,44	-2,54%	0,28	1,05
Semana 12	10/08/2025	$ 350.175.066,60	$ 1.395.893.217,95	1.395,89	4,69%	$ 19.820.480,86	$ 308.700.219,91	308,70	1,04%	$ 293,27	-3,65%	0,22	1,05
Semana 13	17/08/2025	$ 313.881.270,12	$ 1.709.774.488,08	1.709,77	5,74%	$ 35.395.892,88	$ 344.096.112,79	344,10	1,16%	$ 326,89	-4,58%	0,20	1,05
Semana 14	24/08/2025	$ 183.208.884,63	$ 1.892.983.372,71	1.892,98	6,35%	$ 25.637.043,17	$ 369.733.155,96	369,73	1,24%	$ 351,25	-5,11%	0,20	1,05
Semana 15	31/08/2025	$ 65.611.456,29	$ 1.958.594.829,01	1.958,59	6,57%	$ 314.227.884,97	$ 683.961.040,93	683,96	2,30%	$ 649,76	-4,279%	0,35	1,05
Semana 16	7/09/2025	$ 411.988.026,93	$ 2.370.582.855,95	2.370,58	7,96%								
Semana 17	14/09/2025	$ 438.227.533,37	$ 2.808.810.389,33	2.808,81	9,43%								
Semana 18	21/09/2025	$ 438.294.242,27	$ 3.247.104.631,61	3.247,10	10,90%								
Semana 19	28/09/2025	$ 502.249.147,67	$ 3.749.353.779,30	3.749,35	12,59%								
Semana 20	5/10/2025	$ 638.120.048,48	$ 4.387.473.827,79	4.387,47	14,73%								
Semana 21	12/10/2025	$ 666.886.179,61	$ 5.054.360.007,42	5.054,36	16,97%								
Semana 22	19/10/2025	$ 588.126.936,33	$ 5.642.486.943,75	5.642,49	18,94%								
Semana 23	26/10/2025	$ 854.198.922,61	$ 6.496.685.866,36	6.496,69	21,81%								
Semana 24	2/11/2025	$ 801.860.747,88	$ 7.298.546.614,23	7.298,55	24,50%								
Semana 25	9/11/2025	$ 721.933.552,92	$ 8.020.480.167,15	8.020,48	26,92%								
Semana 26	16/11/2025	$ 903.185.183,53	$ 8.923.665.350,67	8.923,67	29,95%								
Semana 27	23/11/2025	$ 609.590.305,16	$ 9.533.255.655,83	9.533,26	32,00%								
Semana 28	30/11/2025	$ 741.405.740,21	$ 10.274.661.396,05	10.274,66	34,49%								

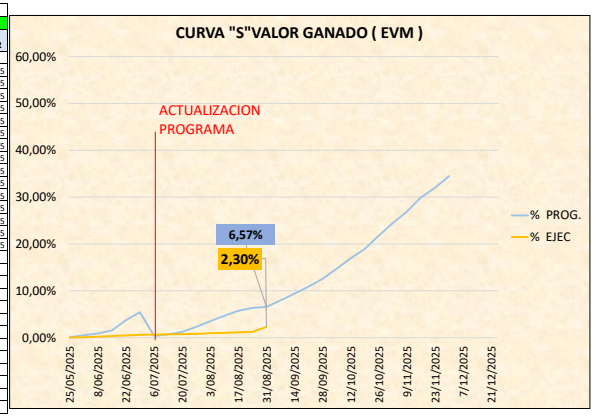

CONSTRUCCION	VALOR	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
MANTO VIAL	$ 24.788.783.741,00	4,99%	1,22%	-3,77%	19/06/2026
P. CRITICOS	$ 3.002.649.682,00	15,94%	11,95%	-3,99%	0/01/1900
DRENAJES	$ 1.704.511.618,55	13,24%	0,07%	-13,17%	19/06/2026
SEGURIDAD VIAL	$ 235.049.799,00	0,00%	0,00%	0,00%	20/06/2026
MTO PARADEROS	$ 60.180.000,00	29,93%	35,00%	5,07%	12/05/2026
COMPONENTES	$ 768.741.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	19/06/2026
MNTO VIAL	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR1+130 al PR4+500	$ 1.220.591.813,45	100,00%	24,82%	-75,18%	26/08/2025
PR4+500 al PR25+500	$ 7.538.949.436,07	0,21%		-0,21%	11/12/2025
PR25+500 al PR46+500	$ 7.538.949.436,07			0,00%	30/03/2026
PR46+500 al PR60+300	$ 4.954.166.772,28			0,00%	19/05/2026
PR60+300 al PR70+150	$ 3.536.126.283,12			0,00%	20/06/2026
PTO CRITICOS	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR50+625 _Box culvert	$ 153.485.512,46	100,00%	2,35%	-97,65%	20/08/2025
PR1+100 al PR1+135 - peaje	$ 4.591.510,40	18,98%	0,00%	-18,98%	10/09/2025
PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota) - Rep.	$ 826.789.890,70	3,15%	6,20%	3,05%	23/10/2025
PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 128.258.827,95	3,38%	69,71%	66,33%	24/11/2025
PR48+900. Muro	$ 293.929.271,50	100,00%	73,00%	-27,00%	20/08/2025

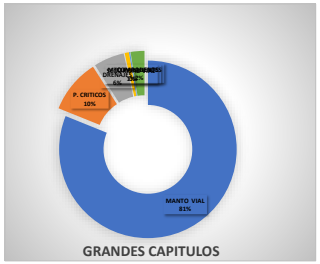





NOTAS: **EL Atraso en el Punto crítico PR50+625 no es impuable al contratista toda vez que no se ha dado aprobacion al POC para dar inicio a las obras.**

Consorcio SOFAN C-046

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PROYECTO
FOR-ADM-18
Versión 1

CONTRATO: ICCU-CTO-245 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

MES 4 **PERIODO:** 1 AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD	Indicador 1	Indicador 2	Resultado	ESTADO	OBSERVACIONES
Técnico	% rendimiento = % ejecutado / % planeado	%	2,30%	6,57%	34,9%		
Técnico	% rendimiento mes = % Ejecutado mes / % planeado mes	%	2,30%	6,57%	34,9%		
Técnico	Indice de ejecucion del programa (IEP = CPTR / CPTP)	%	683,96	1958,59	0,35		
Técnico	% Variacion= % ejecutado - % Programado	%	2,30%	6,57%	-4,28%		
Financiero mes	presupuesto ejec. mes / presupuesto prog. Mes	$	$ 683.961.040,93	$ 1.958.594.829,01	0,35		
financiero acumulado	presupuesto ejec. acum / presupuesto prog. Acum.	$	$ 683.961.040,93	$ 1.958.594.829,01	0,35		
facturacion	presupuesto facturado / presupuesto ejecutado.	$	$ -	$ 683.961.040,93	0,00		
amortizacion anticipo	anticipo amortizado / anticipo entregado	$	$ -	$ -	0,0%		
Administrativo	Disponibilidad de personal clave	%	100%	95%		Parcial	Algunos perfiles en proceso de vinculación.
Administrativo	Cumplimiento del cronograma de entregables	%	100%	100%		Cumplido	Entregables cumplidos conforme a cronograma.

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD	PROGRAMADO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO	ESTADO	OBSERVACIONES
AMBIENTAL			**6,75**	**6,75**	**38,10**		
COMPONENTE SOCIAL		%	**10,95**	**10,95**	**47,55**		
COMPONENTE SST		%	**6,70**	**6,70**	**33,04**		
PMT		%	**3,57**	**3,57**	**64,29**		
Legal	**Radicación de informes y obligaciones legales**	**%**	**7,14**	**7,14**	**28,57**	**Cumplido**	**Informes entregados en forma y tiempo.**
