INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1914-2022** MUNICIPIO DE **COROZAL - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **SEPTIEMBRE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 40 No. 34 – 700		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$11.888.118.793,00
	ADICION APORTES MIN-FONSECON		$2.064.437.318,07
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$2.097.914.327,00
	ADICION APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$350.000.000,00
	ADICIÓN APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$580.000.000,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$16.980.470.438,07
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO	30/11/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Viterbo Gómez Carvajal		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel Antonio Linares Donato	20/12/2022	28/01/2024
	Julián Felipe Valencia	29/01/2024	17/07/2024
	Edgar González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	12/08/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	13/08/2024	25/08/2024
	Manuel Linares Donato	26/08/2024	31/12/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	01/01/2025	23/01/2025
	Viterbo Gómez Carvajal	24/01/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Gonzalo Flórez Peña	20/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	31/12/2023
	Gonzalo Flórez Peña	11/01/2024	31/12/2024
	Gonzalo Flórez Peña	14/02/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	22524	16/01/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	14624 (Reserva)	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado 2-2022-030809 de fecha 19 de julio de 2022	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	24723	20/01/2023	31/12/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000022350	16/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA ADICION Y PRIMERA MODIFICACIÓN	FECHA: 29/12/2023	
	PRIMERA PRÓRROGA Y SEGUNDA ADICIÓN	FECHA: 26/12/2024 (Da plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2025)	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 29/08/2025 (Da plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025)	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	ADICIÓN 01: Hasta el 01/07/2025		
	PRÓRROGA 01 – ADICIÓN 2: Hasta el 28/02/2026		
	PRÓRROGA 02: En trámite por parte del Municipio.		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 12.575.307.132.00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.410.385.620,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 3.174.777.686,07		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del DEPARTAMENTO.	NO APLICA	21/02/2024	$ 5.944.059.397
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición, B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra, C. Cronograma del convenio actualizado.	NO APLICA	11/03/2024	$2.064.437.318,07
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance,	30%	DD/MM/AAAA	$ 4.755.247.517

	C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.			
ULTIMO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el avance del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta final de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 1.188.811.879
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$8.008.496.715,07
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$7.498.514.045,64

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: _____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 540-47-994000022350	Cumplimiento	$1.398.603.312	28/09/2022	28/02/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato L-AM-CS-001-01-23	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 12.575.307.132.00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	29/12/2023		$ 350.000.000,00
	22/03/2024		$ 2.064.777.688,07
Nombre contratista	CONSORCIO EP-C		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	18/08/2023	
	OTRO SI MODIFICATORIO No. 1	29/12/2023	Valor actualizado del contrato DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ l 2.925.307.132,00) M/CTE.
	REINICIO 01	29/01/2024	
	OTRO SI MODIFICATORIO No. 2	22/03/2024	Valor actualizado del contrato CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($14,990,422,205.07} M/CTE.
	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 3	05/11/2024	

	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 4	26/12/2024	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/04/ 2025
	SUSPENSIÓN 02	10/04/2025	
	REINICIO 02	12/05/2025	
	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 5	12/05/2025	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/06/ 2025
	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 6	12/06/2025	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/07/2025
	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 7	24/07/2025	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/08/2025
	SUSPENSIÓN No. 03	25/08/2025	
	REINICIO No. 03	29/08/2025	
	PRÓRROGA	PRÓRROGA	
Fecha de terminación del contrato	29/10/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 14.990.422.205,07
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
PÓLIZA No.	15 - 44 -101277891		
FECHA DE LA PÓLIZA	31/03/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato CM-AM-CS-001-01-23	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE		$ 1.410.385.620,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	26/12/2024		$ 400.000.00,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO I – POLICE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 01	18/08/2023	
	REINICIO 01	29/01/2024	
	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 01	05/11/2024	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/12/ 2024
	PRÓRROGA – OTRO SI MODIFICATORIO No. 01	26/12/2024	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/04/ 2025
	SUSPENSIÓN 02	10/04/2025	
	REINICIO 02	12/05/2025	
	PRÓRROGA -OTRO SI MODIFICATORIO No. 3	12/05/2025	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/06/ 2025
	PRÓRROGA -OTRO SI MODIFICATORIO No. 4	12/06/2025	Amplía el plazo de ejecución hasta el 27/07/2025
	OTROSI MODIFICATORIO N° 05	24/07/2025	Amplia el plazo de ejecución hasta el 27/08/2025

	SUSPENSIÓN No. 03	25/08/2025	
	REINICIO No. 03	29/08/2025	
	PRÓRROGA	29/08/2025	
Fecha de terminación del contrato	29/10/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.810.385.620,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	15-44-101277693		
FECHA DE LA PÓLIZA	27/03/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JULIO DE 2025	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X** Avance acumulado de obra del 70.58%, de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°101 a corte del 28 de septiembre de 2025.	
INFORME FINANCIERO		**X** Informe del mes de SEPTIEMBRE de 2025
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Cuenta bancaria recursos Ministerio $1.308.758,96 corte agosto de 2025.	
	Cuenta bancaria recursos municipio $324.254.781 corte a agosto de 2025.	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X** De acuerdo con el informe N°101 de Interventoría, durante el período se adelantaron principalmente actividades relacionadas a elementos de mampostería, pañetes, redes hidrosanitarias y eléctricas	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**88.26%**
% EJECUTADO DE OBRA	**70.58%**

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO: 29/01/2024
AVANCE DE OBRA: 70.58% (El avance reportado se basa en el informe No. 101 con corte al 28 de septiembre de 2025).
VIGENCIA: 27/11/2025 (De los contratos derivados).

COMPONENTE TÉCNICO.

Durante el presente periodo se realizaron los siguientes comités:

- Comité de seguimiento virtual del 02 de septiembre de 2025, al cual asistió el Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de estudios, diseños, obra e Interventoría a los estudios, diseños, obra, en el cual se definieron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio de Corozal	Actas de suspensión de los contratos derivados.	02/09/2025
Municipio de Corozal	Actas de reinicio de los contratos derivados	02/09/2025
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 94	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 95	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 96	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 97	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio además de la supervisión se trasladará a la obra para realizar seguimiento al cronograma de actividades para le terminación de la obra, se realizarán planes de trabajo semanales.	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento	
Municipio de Corozal	El Municipio de Corozal, remitirá solicitud de mayores recursos.	02/09/2025
Municipio de Corozal	Organizar documentos para el proceso de recibo del proyecto	
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual en el Ministerio del Interior	09/09/2025

- Comité de seguimiento virtual del 15 de septiembre de 2025, al cual asistió el Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de estudios, diseños, obra e Interventoría a los estudios, diseños, obra, en el cual se definieron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio de Corozal	Remitir póliza de la segunda prórroga	15/09/2025
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 98	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 99	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio continuará con el seguimiento semanal en obra	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Inmediato
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual	19/09/2025

- Comité de seguimiento virtual del 19 de septiembre de 2025, al cual asistió el Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de estudios, diseños, obra e Interventoría a los estudios, diseños, obra, en el cual se definieron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio continuará con el seguimiento semanal en obra	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual al 29 de octubre de 2025.	Inmediato
Municipio de Corozal	Cronograma de actividades, plan de trabajo, plan de compras.	22/09/2025
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual en el Ministerio del Interior	25/09/2025

- Comité de seguimiento virtual del 25 de septiembre de 2025, al cual asistió el Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de estudios, diseños, obra e Interventoría a los estudios, diseños, obra, en el cual se definieron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Corozal	Registro fotográfico actualizado	26/09/2025
Municipio de Corozal	Contratación de personal	Inmediato.
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio continuará con el seguimiento semanal en obra	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual al 29 de octubre de 2025.	Inmediato
Municipio de Corozal	Cronograma de actividades, plan de trabajo, plan de compras.	Inmediato
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual en el Ministerio del Interior	29/09/2025

- Comité de seguimiento virtual del 29 de septiembre de 2025, al cual asistió el Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de estudios, diseños, obra e Interventoría a los estudios, diseños, obra, en el cual se definieron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Corozal	Registro fotográfico actualizado	26/09/2025
Municipio de Corozal	Contratación de personal	Inmediato.
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio continuará con el seguimiento semanal en obra	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual al 29 de octubre de 2025.	Inmediato
Municipio de Corozal	Cronograma de actividades, plan de trabajo, plan de compras.	Inmediato
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual en el Ministerio del Interior	29/09/2025

El Municipio de Corozal – Sucre, remitió los siguientes informes semanales de interventoría, así:

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No.98 con corte del 1 al 7 de septiembre de 2025, se ejecutó 69.17%, sobre un programado del 70.75%. Se continuo con las actividades de armado de acero para columnas de garita, nivelación de terreno para adecuación de plaza de formación faltante y parqueadero interno, instalaciones hidrosanitarias, instalación de ventanas piso 2, instalación de estructura de cieloraso, estuco plástico, fundida de columnetas, vigas aéreas y también se adelanta pañete exterior de muro de cerramiento, instalaciones eléctricas.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No.99 con corte del 8 al 14 de septiembre de 2025, se ejecutó 70.07%, sobre un programado del 70.22%. Se continuo con las actividades de armado de acero para columnas de garita, nivelación de terreno para adecuación de plaza de formación faltante y parqueadero interno, instalaciones hidrosanitarias, instalación de ventanas piso 2, instalación de estructura de cieloraso, estuco plástico, fundida de columnetas, vigas aéreas y también se adelanta pañete exterior de muro de cerramiento, instalaciones eléctricas.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No.100 con corte del 15 al 21 de septiembre de 2025, se ejecutó 70.20%, sobre un programado del 82.51%. Se continuo con las actividades de armado de acero para columnas de garita, nivelación de terreno para adecuación de plaza de formación faltante y parqueadero interno, instalaciones hidrosanitarias, instalación de ventanas piso 2, instalación de estructura de cieloraso, estuco plástico, fundida de columnetas, vigas aéreas y también se adelanta pañete exterior de muro de cerramiento, instalaciones eléctricas.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No.101 con corte del 22 al 28 de septiembre de 2025, se ejecutó 70.58%, sobre un programado del 88.26%. Se continuo con las actividades de armado de acero para columnas de garita, nivelación de terreno para adecuación de plaza de formación faltante y parqueadero interno, instalaciones hidrosanitarias, instalación de ventanas piso 2, instalación de estructura de cieloraso, estuco plástico, fundida de columnetas, vigas aéreas y también se adelanta pañete exterior de muro de cerramiento, instalaciones eléctricas.
- El contrato de obra presenta un atraso del 17.68%. El Ministerio de Interior, ha solicitado al Municipio de Corozal, adoptar las medidas necesarias que permitan superar el atraso, sin embargo, la obra presenta un incremento semanal del atraso, sin demostrar acciones efectivas que minimicen el atraso. El Ministerio del Interior radicará ante la subdirección de gestión contractual el inicio del presunto incumplimiento del cronograma del convenio.
- El Municipio de Corozal no ha remitido, el informe de obra e interventoría de obra del mes de agosto de 2025

COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

- Con fecha del 1 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "MODIFICACIÓN PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó remitir la actualización de la póliza.
- Con fecha del 1 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ENTREGA INFORME SEMANAL - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó la entrega del informe semanal.
- Con fecha del 4 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ACTA COMITÉ 02082025 CONVENIO 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE" (…),* mediante el cual se remitió el acta de comité del 02 de septiembre de 2025.
- Con fecha del 4 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó remitir la actualización de la póliza.
- Con fecha del 9 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó el cumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 9 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION ACTA PARCIAL 60% firmada" (…),* mediante el cual se remitió acta parcial.
- Con fecha del 15 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ACTA 7 - 65.28%" (…),* mediante el cual se remitieron observaciones al balance de obra.
- Con fecha del 15 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "COMITE CONVENIO No 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 15 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "REITERACIÓN ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 16 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se remitió el balance de obra.
- Con fecha del 16 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se remitió observaciones al balance de obra.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205 y asunto "REITERACION presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio No. 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre" (…),* mediante el cual se remitió oficio por el incumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211 y asunto "CITACION Comité presencial Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre" (…),* mediante el cual se remitió oficio citando a comité de seguimiento presencial.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION CONTRACTUAL" (…),* mediante el cual se remitió información referente al desembolso.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION MES DE AGOSTO" (…),* mediante el cual se remitió información del PIGA.
- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Accepted: COMITE CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL @ Fri Sep 19, 2025 9am - 10am (GMT-5) (gonzalo.florez@mininterior.gov.co)" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se dio respuesta al oficio de incumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se dio respuesta al oficio de incumplimiento de obligaciones.

- Con fecha del 19 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "OBSERVACIONES INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitieron observaciones a los informes remitidos por el Municipio.
- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la Subdirección de Proyectos a la Coordinación Financiera y Contable con radicado 2025-3-003122-027563 Id: 616571 el asunto *(…) "Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre" (…).*
- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la Subdirección de Proyectos a la Subdirección de Gestión Contractual con radicado 2025-3-003122-027532 Id: 616498 el asunto *(…) "Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre" (…).*
- Con fecha del 23 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "SOLICITUD DE RADICADO DE PRORROGA" (…),* mediante el cual se solicitó copia del radicado del desembolso.
- Con fecha del 23 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "SOLICITUD DE RADICADO DE PRORROGA" (…),* mediante el cual se dio copia del radicado del desembolso.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "OBSERVACIONES INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se reiteraron las observaciones a los informes remitidos por el Municipio.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Radicado 2025-2-003122-041420 Id: 617628 con asunto (...) "CITACIÓN Comité presencial convenio No. 1914-2022, Municipio de Corozal - Sucre" (...),* mediante el cual se citó a comité de seguimiento presencial.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Incumplimiento obligaciones - Entrega de Informe Semanal - Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal - Sucre" (...),* mediante el cual se solicitó a cumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "planeacion@corozal-sucre.gov.co ha aceptado el "COMITÉ CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Citación Comité de seguimiento virtual - Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal – Sucre" (…),* mediante el cual se citó a comité de seguimiento.
- Con fecha del 26 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Compromisos Comité del 25/09/2025 - Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal - Sucre" (…),* mediante el cual se solicitó el cumplimiento de compromisos-
- Con fecha del 26 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "COMITÉ CONVENIO No. 1914-2020 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 26 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION PENDIENTE" (…),* mediante el cual se remitió información del mes de agosto de 2025.
- Con fecha del 29 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION PENDIENTE SUBANADA" (…),* mediante el cual se remitió información del mes de agosto de 2025.
- El Municipio de Corozal, no ha remitido el informe de supervisión del mes de septiembre de 2025.

COMPONENTE FINANCIERO.

- A la fecha el Ministerio del interior ha desembolsado $8.008.496.715,07.
- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la Subdirección de Proyectos a la Coordinación Financiera y Contable con radicado 2025-3-003122-027563 Id: 616571 el asunto *(…) "Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre" (…).*
- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la Subdirección de Proyectos a la Subdirección de Gestión Contractual con radicado 2025-3-003122-027532 Id: 616498 el asunto *(…) "Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre" (…).*

- De igual manera se presenta el estado financiero del Convenio y sus contratos derivados, documento solicitado por la Contraloría General de la República en el marco de la mesa de seguimiento a la función de advertencia el 29 de julio de 2024:

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1914 DE 2022 - MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE

CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE Y MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTA: 11100001376 / BANCOLOMBIA (RECURSOS MINISTERIO)

RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	$ 16.450.470.438,07	APORTES MINISTERIO	$	11.888.118.793,00
		APORTES ADICIÓN MINISTERIO	$	2.064.437.318,07
		APORTES MUNICIPIO	$	2.097.914.327,00
		APORTES ADICIÓN MUNICIPIO	$	350.000.000,00
		APORTES ADICIÓN MUNICIPIO	$	400.000.000,00

DESEMBOLSOS	REQUISITOS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A. Suscripción del acta de inicio, B. designación del supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO, C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO, D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del Interventor del contrato y del supervisor del DEPARTAMENTO.	35804924	21/02/2024	Ministerio del Interior	$ 5.944.059.397,00	
Segundo desembolso	A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición, B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el Interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. C. Cronograma del convenio actualizado.	61469724	11/03/2024	Ministerio del Interior	$ 2.064.437.318,07	
					$ 23.194.301,83	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					$ 8.031.691.016,90	57,56%
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					$ -	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						$ 8.031.691.016,90

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS
VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 2.414.777.688,07	$ 14.990.084.820,07
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.386.903,00	$ -	$ 1.410.386.903,00

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Pago Acta parcial de obra No. 1	2024000185	20240000285	21/03/2024	Ministerio del Interior	$ 563.568.320,00	
Segundo pago	Pago Acta Parcial de obra No. 2	2024000447	2024000611	17/05/2024	Ministerio del Interior	$ 1.444.641.832,95	
Tercer pago	Pago 15% anticipo correspondiente adicional	2024000840	2024001101	1/08/2024	Ministerio del Interior	$ 309.716.205,78	
Cuarto Pago	Pago Acta Parcial de obra No. 3	2024001063	20254001063	27/08/2024	Ministerio del Interior	$ 817.828.244,70	
Quinto pago	Pago Acta parcial de obra No. 4	2024001737	2024002163	27/12/2024	Ministerio del Interior	$ 3.411.810.384,15	
Sexto	Pago Acta parcial de obra No. 4	2024001737	2024002163	27/12/2024	Ministerio del Interior	$ 398.466.672,95	
Séptimo	Pago Acta parcial de obra No. 5	2025000451	25000762	9/04/2025	Ministerio del Interior	$ 41.110.409,73	
Octavo	Pago Acta parcial de obra No. 5	2025000736	25001118/25001119	16/05/2025	Ministerio del Interior	$ 532.325.056,97	
						$ 7.519.267.127,21	50,16%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Pago Acta No. 1	2024000277	2024000392	9/04/2024	Municipio	$ 397.813.961,00	
Segundo pago	Pago Acta parcial de obra No. 4	2024001697	2024002419	26/12/2024	Ministerio del Interior	$ 113.757.823,47	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						$ 511.571.774,47	36,27%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS							$ 8.030.838.901,68
TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A AGOSTO DE 2025							$ 882.116,22
SALDO EN LA CUENTA A AGOSTO DE 2025							$ 1.308.758,96

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por comprometer y el saldo en cuenta corresponde a rendimientos financieros.
- Ultimo extracto agosto de 2025. Si bien en el informe financiero se relacionan pagos realizados el Municipio de Corozal no ha remitido los soportes que permitan validar los mismos. Dentro de los valores para el cierre financiero y realizar los pagos al contratista el Municipio de Corozal tomó los rendimientos financieros, los cuales de ser devueltos a la cuenta y consignados al tesoro.

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1914 DE 2022 - MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE Y MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTA: 11100001656 / BANCOLOMBIA (RECURSOS MUNICIPIO)

RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	$ 16.450.470.438,07	APORTES MINISTERIO	$	11.888.118.793,00
		APORTES ADICIÓN MINISTERIO	$	2.064.437.318,07
		APORTES MUNICIPIO	$	2.097.914.327,00
		APORTES ADICIÓN MUNICIPIO	$	350.000.000,00
		APORTES ADICIÓN MUNICIPIO	$	400.000.000,00

DESEMBOLSOS	REQUISITOS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					$ -	
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
PRIMERO	COFINANCIACIÓN		20/04/2023	Municipio	$ 897.914.327	
SEGUNDO	COFINANCIACIÓN		24/07/2023	Municipio	$ 850.000.000	
TERCERO	COFINANCIACIÓN		27/09/2023	Municipio	$ 350.000.000	
CUARTO	ADICIÓN		2/02/2024	Municipio	$ 350.000.000	
QUINTO	ADICION		7/03/2025	Municipio	$ 400.000.000	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					$ 2.847.914.327,00	100%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						$ 2.847.914.327,00

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS
VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 2.414.777.688,07	$ 14.990.084.820,07
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.386.903,00	$ -	$ 1.410.386.903,00

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Pago anticipo 15%	2024000018	2024000013	2/02/2024	Municipio	$ 1.747.904.327,00	
Segundo pago	Pago anticipo 15%	2024000019	2024000014	2/02/2024	Municipio	$ 138.391.743,00	
Tercer pago	Acta Parcial de obra No. 5	2025000735	25001120/25001121	16/05/2025	Municipio	$ 211.608.257,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						$ 2.097.904.327,00	14,0%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Pago Acta Parcial No. 2	20240000503	2024000679	31/05/2024	Municipio	$ 120.090.999,00	
Segundo pago	Pago Acta Parcial No. 3	2024001567	2024001940	7/11/2024	Municipio	$ 67.943.559,00	
Tercer pago	Pago Acta Parcial No. 3	2024001987	2024002420	26/12/2024	Municipio	$ 161.965.442,00	
Cuarto pago	Pago Acta Parcial No. 5	20255001143	25001399	18/07/2025	Municipio	$ 102.128.931,68	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						$ 452.128.931,68	32,1%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS							$ 2.550.033.258,68
TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A AGOSTO DE 2025							$ 297.881.068,32
SALDO EN LA CUENTA A AGOSTO DE 2025							$ 324.254.781,90

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por comprometer y el saldo en cuenta corresponde a rendimientos financieros. Además se debe realizar conciliación bancaria teniendo en cuenta que los saldos en el banco no coinciden con los saldos de los pagos realizados.

El Municipio de Corozal, no ha remitido el informe financiero del mes de septiembre de 2025.

Componente Jurídico.

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución 30 de noviembre de 2025.

Anexos

- Con fecha del 1 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "MODIFICACIÓN PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó remitir la actualización de la póliza.
- Con fecha del 1 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ENTREGA INFORME SEMANAL - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó la entrega del informe semanal.
- Con fecha del 4 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ACTA COMITÉ 02082025 CONVENIO 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE" (…),* mediante el cual se remitió el acta de comité del 02 de septiembre de 2025.

- Con fecha del 4 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó remitir la actualización de la póliza.
- Con fecha del 9 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se solicitó el cumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 9 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION ACTA PARCIAL 60% firmada" (…),* mediante el cual se remitió acta parcial.
- Con fecha del 15 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "ACTA 7 - 65.28%" (…),* mediante el cual se remitieron observaciones al balance de obra.
- Con fecha del 15 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "COMITE CONVENIO No 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 15 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "REITERACIÓN ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 16 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se remitió el balance de obra.
- Con fecha del 16 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se remitió observaciones al balance de obra.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205 y asunto "REITERACION presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio No. 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre" (…),* mediante el cual se remitió oficio por el incumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211 y asunto "CITACION Comité presencial Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre" (…),* mediante el cual se remitió oficio citando a comité de seguimiento presencial.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION CONTRACTUAL" (…),* mediante el cual se remitió información referente al desembolso.
- Con fecha del 17 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION MES DE AGOSTO" (…),* mediante el cual se remitió información del PIGA.
- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Accepted: COMITE CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL @ Fri Sep 19, 2025 9am - 10am (GMT-5) (gonzalo.florez@mininterior.gov.co)" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se dio respuesta al oficio de incumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES" (…),* mediante el cual se dio respuesta al oficio de incumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 19 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "OBSERVACIONES INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitieron observaciones a los informes remitidos por el Municipio.
- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la Subdirección de Proyectos a la Coordinación Financiera y Contable con radicado 2025-3-003122-027563 Id: 616571 el asunto *(…) "Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre" (…).*
- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la Subdirección de Proyectos a la Subdirección de Gestión Contractual con radicado 2025-3-003122-027532 Id: 616498 el asunto *(…) "Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre" (…).*

- Con fecha del 23 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "SOLICITUD DE RADICADO DE PRORROGA" (…),* mediante el cual se solicitó copia del radicado del desembolso.
- Con fecha del 23 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "SOLICITUD DE RADICADO DE PRORROGA" (…),* mediante el cual se dio copia del radicado del desembolso.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "OBSERVACIONES INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se reiteraron las observaciones a los informes remitidos por el Municipio.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Radicado 2025-2-003122-041420 Id: 617628 con asunto (...) "CITACIÓN Comité presencial convenio No. 1914-2022, Municipio de Corozal - Sucre" (...),* mediante el cual se citó a comité de seguimiento presencial.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Incumplimiento obligaciones - Entrega de Informe Semanal - Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal - Sucre" (...),* mediante el cual se solicitó a cumplimiento de obligaciones.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "planeacion@corozal-sucre.gov.co ha aceptado el "COMITÉ CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 24 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Citación Comité de seguimiento virtual - Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal – Sucre" (…),* mediante el cual se citó a comité de seguimiento.
- Con fecha del 26 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "Compromisos Comité del 25/09/2025 - Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal - Sucre" (…),* mediante el cual se solicitó el cumplimiento de compromisos-
- Con fecha del 26 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal con el asunto *(…) "COMITÉ CONVENIO No. 1914-2020 MUNICIPIO DE COROZAL" (…),* mediante el cual se remitió el link para el comité.
- Con fecha del 26 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION PENDIENTE" (…),* mediante el cual se remitió información del mes de agosto de 2025.
- Con fecha del 29 de septiembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Corozal al Ministerio del Interior con el asunto *(…) "REMISION DE INFORMACION PENDIENTE SUBANADA" (…),* mediante el cual se remitió información del mes de agosto de 2025.
- Acta de comité virtual del 2 de septiembre de 2025.
- Acta de comité virtual del 15 de septiembre de 2025.
- Acta de comité virtual del 19 de septiembre de 2025.
- Acta de comité virtual del 25 de septiembre de 2025
- Acta de comité virtual del 29 de septiembre de 2025
- Informe supervisión del mes de agosto de 2025.
- Informes financieros del mes de agosto de 2025.
- Extractos bancarios del mes de agosto de 2025.
- Informe semanal de interventoría No. 98.
- Informe semanal de interventoría No. 99.
- Informe semanal de interventoría No. 100.
- Informe semanal de interventoría No. 101.
- Informe de obra No. 19 del mes agosto de 2025.
- Informe de interventoría de obra No. 19 del mes de agosto de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- El contrato de obra presenta un atraso del 17.68%. El Ministerio de Interior, ha solicitado al Municipio de Corozal, adoptar las medidas necesarias que permitan superar el atraso, sin embargo, la obra presenta un incremento semanal del atraso, sin demostrar acciones

efectivas que minimicen el atraso. El Ministerio del Interior radicará ante la subdirección de gestión contractual el inicio del presunto incumplimiento del cronograma del convenio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/02/2023	18/01/2024	22/02/2024	06/03/2024	22/03/2024	30/04/2024
30/05/2024	12/06/2024	11/07/2024	26/09/2024	10/10/2024	19/062025
11/07/2025					

8. SUPERVISOR

VITERBO GOMEZ CARVAJAL Supervisión Convenio No. 1914-2022	**GONZALO FLÓREZ PEÑA** Apoyo a Supervisión Convenio No. 1914-2022

Outlook

MODIFICACIÓN PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 1/09/2025 7:30 AM
Para planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; Sec Planeacioncorozal <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (672 KB)
0.3. MINUTA SEGUNDA PRORROGA CONVENIO 1914 DE 2022 COROZAL SUCRE .pdf;

Bogota, D.C, 2 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: MODIFICACIÓN PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y teniendo en cuenta la segunda prórroga del convenio, se solicita realizar la actualización de acuerdo con lo indicado en la minuta del convenio, así:

Minuta inicial

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

GARANTÍAS EXIGIBLES A LA MUNICIPIO

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor del convenio	Vigencia igual al término de ejecución del convenio y seis (06) meses más contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.

Segunda Prórroga

CLÁUSULA CUARTA - GARANTÍA ÚNICA: EL MUNICIPIO deberá presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías de conformidad a los nuevos tiempos del Convenio Interadministrativo definidos en el marco de la presente prórroga y conforme a lo dispuesto en la Cláusula Octava del mismo".

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ENTREGA INFORME SEMANAL - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 1/09/2025 7:30 AM
Para Sec Planeacioncorozal <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogota, D.C, 1 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y de acuerdo con lo indicado en las obligaciones del convenio, se reitera el cumplimiento de la entrega del informe semanal de interventoría, así:

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO"

Por lo anterior, se requiere que de manera inmediata se remitan los siguientes documentos:

1. Informe semanal No. 97 con corte al 31 de agosto de 2025

De igual manera, es importante recordar que, para adelantar cualquier desembolso, es necesario dar cumplimiento a las obligaciones del convenio.

Cordialmente,

ACTA No.	
FECHA	02/09/2025
CIUDAD	PRESENCIAL
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1914-2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	68.50%. De acuerdo con el informe No. 97 al 31 de agosto de 2025.
MOTIVO:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONVENIO No. 1914 DE 2022

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio de Corozal**
Nombre: VITERBO GÓMEZ CARVAJAL C.C.:9.149.257 Cargo: SUPERVISOR	Nombre: BAYRON OSPINA C.C./ NIT: 3.838.696 Cargo: ALCALDE
Nombre: GONZALO FLÓREZ PEÑA C.C.:80.420.013 Cargo: APOYO SUPERVISIÓN	Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ C.C./ NIT: 22.867.874 Cargo: SUPERVISORA
	Nombre: PATRICIA URZOLA BADEL C.C./ NIT: 10.951.643 Cargo: SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Contratista Estudios, Diseños, Obra	**Contratista Interventoría Estudios, Diseños, Obra**
Nombre: JAIRO DURÁN ROMERO C.C.:10.951.643 Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: C.C.: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 2:30 pm se da inicio al comité de seguimiento a la ejecución del convenio No. 1914 de 2022, con la presencia de los funcionarios del Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de Estudios, Diseños, obra e Interventoría a los Estudios, diseños y obra.

Desarrollo del comité:

1. Estado Convenio.
2. Estado Contratos derivados
3. Información pendiente.
4. Varios

ESTADO CONVENIO

- El Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022 se encuentra en ejecución, y su plazo de ejecución vence el 30 de noviembre de 2025.

- El Convenio teniendo en cuenta la segunda prórroga suscrita el 29 de agosto de 2025, debe actualizar la póliza del convenio.

- Teniendo en cuenta el avance de la obra 68.50%, se adelanta por parte del Ministerio del Interior la revisión de los documentos para dar trámite al tercer desembolso.

- El Municipio de Corozal, debe realizar la publicación de la información del convenio en la plataforma SECOP de acuerdo con las obligaciones del convenio, así *"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto".*

ESTADO CONTRATOS DERIVADOS

- El Municipio de Corozal reinicio los contratos derivados el 27 de agosto de 2025, y la prórroga por 2 meses la cual vence el 30 de octubre de 2025, por lo cual se requiere remitir de manera inmediata las minutas de suspensión, reinicio y prórroga de los contratos derivados hasta el mes de octubre de 2025.

- Con respecto al avance en la ejecución de acuerdo con el Informe No. 97 al 31 de agosto de 2025, se cuenta con un avance del 68.50%, y programado del 68.50%, el Contratista de obra, manifiesta que se cuenta con 53 personas en obra, desarrollando las siguientes actividades:

  1. La fachada sobre la troncal de occidente, se encentra 100% pañetada. En la semana del 5 de septiembre de 2025, llegarán los andamios para la instalación en durapanel.
  2. Fachada sobre la vía a sabanas de pedro, los andamios colgantes llegarán en la semana del 5 de septiembre de septiembre de 2025, para iniciar el trabajo de pañete. Se realizó el cerramiento perimetral, sobre la vía el cual ya se encuentra pañetado.
  3. Bloque 1 piso 1: Cocina, despensa, alimentos, comedor. Se cuenta con estuco-pintura, ventanas 100%, cieloraso instalado, mesones en concreto, redes hidrosanitarias (pendiente aparatos), redes eléctricas ducteria y cableado 100%. Sobre zona de comedor está instalada la estructura del cieloraso, sin embargo, la lámina de fibra mineral se encuentra en obra y no se ha instalado dado que en esta zona se requiere realizar la pulida del piso. (Se cuenta con ventanería en aluminio completo).
  4. Bloque 2 piso 1: Auditorio se cuenta estuco y pintura, ventanas 100%, redes eléctricas ducteria y cableado 100%, estructura para cieloraso en drywall, estructura para cieloraso exterior lámina de superboard. Se avanza en estructura de cieloraso para zona de oficinas. (Se cuenta con ventanería en aluminio completo. Las zonas de retenidos y cuartos eléctricos, se encuentran pañetadas a la espera

de pintura epóxica, estas zonas no incluyen cieloraso). Pendiente instalación de redes de aire acondicionado.

5. Bloque 1 piso 2: Se cuenta con estuco y pintura, ventanería al 100%, redes hidrosanitarias, redes eléctricas ducteria y cableado 100%, próxima semana se inicia instalación de perfilería de cieloraso, pendiente instalación de redes de aire acondicionado, próxima semana se inicia cargue de plantilla de piso en las zonas de baños.
6. Bloque 2 piso 2: Se cuenta con estuco y pintura, ventanería al 100%, redes hidrosanitarias, redes eléctricas ducteria y cableado 100%, próxima semana se inicia instalación de perfilería de cieloraso, pendiente instalación de redes de aire acondicionado, próxima semana se inicia cargue de plantilla de piso en las zonas de baños.
7. Bloque 1 piso 3: Estuco y pintura 80%, falta instalación de piso granito la cual se inicia la próxima semana, redes eléctricas ducteria 100%, cableado se termina el 12/09/2025, redes hidrosanitarias se encuentran en avance.
8. Bloque 2 piso 3: Estuco y pintura 80%, falta instalación de piso granito la cual se inicia la próxima semana, redes eléctricas ducteria 100%, cableado se termina el 12/09/2025, redes hidrosanitarias se encuentran en avance.
9. Parqueadero exterior, se encuentra en alistamiento del terreno.
10. Parqueadero interior, se encuentra en avance.
11. Cerramiento se avanza en el último tramo sobre la zona donde estaba ubicado el campamento.

- El Municipio de Corozal, debe remitir los informes de interventoría No. 94, 95, 96 y 97 de acuerdo con la siguiente obligación *"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO"*

- Es importante, recordar al Municipio de Corozal que, para tramitar cualquier desembolso, debe estar al día en el cumplimiento de las obligaciones.

- Teniendo en cuenta la segunda prórroga la cual da plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025, el Ministerio del Interior reitera la solicitud al Municipio de Corozal con respecto a las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al cronograma de actividades: *"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan (...)".*

- El Municipio de Corozal debe presentar el plan de trabajo, para identificar como se implementará personal, jornadas de trabajo, plan de compras, que permita dar cumplimiento al objeto contractual al 30 de noviembre de 2025.

- El Alcalde del Municipio de Corozal, manifiesta que dispondrá de personal en obra del ente territorial con la experticia para realizar el seguimiento diario a la obra, con el fin de poder evidenciar atrasos y tomar las acciones necesarias que permitan adoptar acciones para dar solución inmediata. De igual manera se deben adelantar las acciones para garantizar antes del vencimiento de los contratos derivados 30/10/2025 se cuente con la obra al 100%, incluida la certificación RETIE-RETILAP y conexión definitiva, que permita adelantar el proceso de recibo y entrega por parte del Ministerio del Interior y Policía Nacional.

- El Municipio de Corozal, manifestó que el contratista de obra solicitará una adición de recursos teniendo en cuenta actividades no previsibles. Dicha solicitud será remitida el día de hoy al Municipio de Corozal aprobada para revisión técnica y de manera posterior el Señor Alcalde realizará la solicitud al Ministerio del Interior.

- El Ministerio del Interior, teniendo el proceso de entrega en el mes de octubre de 2025, remite el listado de los documentos para adelantar el proceso de recibo del proyecto:

  1. Acta de recibo a satisfacción (sin observaciones) suscrita por parte de la interventoría de la obra y el contratista de obra.
  2. Acta de recibo a satisfacción (sin observaciones) suscrita por parte de la supervisión del Municipio de Montería.
  3. Video y actas de las capacitaciones a la Policía Nacional de cada uno de los sistemas del proyecto.
  4. Planos record.
  5. Inventario por espacios.
  6. Balance final con memorias de mapeo
  7. Manual de Operación y mantenimiento.
  8. Certificaciones de Voz y Datos.
  9. Certificaciones RETIE y RETILAP.
  10. Certificación de conexión definitiva de servicios públicos.
  11. Registro fotográfico completo del desarrollo de la obra, hasta su terminación.
  12. Garantías de los equipos.
  13. Paz y salvo de servicios públicos.
  14. Llaves del proyecto.
  15. Modificaciones de los contratos derivados, pólizas y aprobación de pólizas.

  El Municipio de Corozal debe realizar el alistamiento de la información que permita al Ministerio del Interior y Policía Nacional, a partir del 1 de noviembre de 2025.

- El Ministerio del Interior recuerda al Municipio de Corozal que los recursos del tercer y cuarto desembolso de la vigencia 2024 al no dar cumplimiento a los requisitos se constituyeron como una reserva presupuestal, lo cual indica que se deben dar cumplimiento a los requisitos para el trámite de los desembolsos pro tarde en el mes de noviembre de 2025. Si no se realizan los desembolsos en la vigencia 2025, los recursos se constituyen en la vigencia 2026 como un recurso expirado, lo cual al ser recursos de inversión fenecen para dicha vigencia siendo necesarios que sean aportados por parte del Municipio de Corozal.

- Con respecto a la documentación pendiente a la fecha, tenemos:

  <u>INFORMACIÓN PENDIENTE</u>

  a. Actas de suspensión de los contratos derivados.
  b. Actas de reinicio de los contratos derivados. X

c. Minuta de prórroga de los contratos derivados con vencimiento hasta el 30 de octubre de 2025
d. Modificación de la póliza de la segunda prórroga del convenio.
e. Informe semanal de interventoría No. 94 con corte al 10 de agosto de 2025.
f. Informe semanal de interventoría No. 95 con corte al 17 de agosto de 2025.
g. Informe semanal de interventoría No. 96 con corte al 24 de agosto de 2025.
h. Informe semanal de interventoría No. 97 con corte al 31 de agosto de 2025.
i. Pantallazo de la Publicación de la totalidad de los documentos en el SECOP II.

Se programa comité para el lunes 8 de septiembre de 2025 a las 2:30 pm virtual.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Corozal	Actas de suspensión de los contratos derivados.	02/09/2025
Municipio de Corozal	Actas de reinicio de los contratos derivados	02/09/2025
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 94	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 95	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 96	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 97	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio además de la supervisión se trasladará a la obra para realizar seguimiento al cronograma de actividades para le terminación de la obra, se realizarán planes de trabajo semanales.	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento	
Municipio de Corozal	El Municipio de Corozal, remitirá solicitud de mayores recursos.	02/09/2025
Municipio de Corozal	Organizar documentos para el proceso de recibo del proyecto	
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual en el Ministerio del Interior	09/09/2025

Se anexa listado de asistencia de los intervinientes;

Ingeniero VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio
Ministerio del Interior

Doctor BAYRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Arquitecto GONZALO FLOREZ PEÑA
Apoyo supervisión
Ministerio del Interior

Ingeniera CARMEN MERCADO PÉREZ
Supervisora
Municipio de Corozal

Doctora PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y contractual
Municipio de Corozal

Ingeniero JAIRO DURAN
Director de obra
CONSORCIO IP-C

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema:	Comité Seguimiento Contrato nº 1914-2022 Municipio de Coronel					
Responsable u organizador:	Ministerio Interior	Dependencia:	Subdirección de Proyectos			
Ciudad:	Bogotá	Lugar y/o enlace:	Sala Juan Pablo II	☑ Presencial ☐ Virtual	Fecha: Día 02 Mes 09 Año 23	Hora inicial / Hora final
Tipo ☑ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____						

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Carmen Ana Mercado	22867874	42	M		NA		X		Alcaldía Coronel	Secretaria Planeación	Planeacion@coronel-sucre.gov.co	3015827561	
2	BAHRON OSPINA T.	3838696	41	H						Alcaldía Coronel	ALCALDE	alcaldia@coronel-sucre.gov.co	3014173685	
3	Jaira Durán Romero	1095164 3	42	H				X		Contratista	Director Secretaría Jurídica	Jairaduran1982@gmail.com	3022277263	
4	Patricia Urzola Badel	64685768	45	M				X		Alc Coronel		juridica@coronel-sucre.gov.co	3008863727	
5	Consejo A. Lopez Tejada	80.112.013	55	H				X		Interior	Dpto. Ejecución	gonzalo.florez@mininterior.gov.co	310.6650614	
6	Vitalbo Gómez Carvajal	91.494.257.	48					X		Mininterior.	Supervisión.	vitalbo.gomez@mininterior.gov.co	3125221054.	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Outlook

ACTA COMITÉ 02082025 CONVENIO 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 4/09/2025 1:55 PM
Para planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; Sec Planeacioncorozal <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 02092025 CONVENIO 1914 2022 COROZAL.pdf;

Bogota, D.C, 4 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: ACTA COMITÉ 02082025 CONVENIO 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* se remite para su conocimiento el Acta de Comité de Seguimiento el 2 de septiembre de 2025, para realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos.

Cordialmente,

Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL.

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 4/09/2025 2:14 PM
Para planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; Sec Planeacioncorozal <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogota, D.C, 4 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL.

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y teniendo en cuenta la suscripción de la segunda prórroga del convenio, se solicita dar cumplimiento a las obligaciones del convenio así:

Minuta inicial:

CLÁUSULA OCTAVA: *GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:*

GARANTÍAS EXIGIBLES AL MUNICIPIO

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor del convenio	Vigencia igual al término de ejecución del convenio y seis (06) meses más contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. *EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del*

Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.

Minuta Segunda Prórroga:

CLÁUSULA CUARTA - GARANTÍA ÚNICA: *EL MUNICIPIO deberá presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías de conformidad a los nuevos tiempos del Convenio Interadministrativo definidos en el marco de la presente prórroga y conforme a lo dispuesto en la Cláusula Octava del mismo.*

Por lo anterior, se requiere por parte del Municipio de Corozal remitir la actualización de la póliza, necesaria para cualquier trámite administrativo y financiero.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 9/09/2025 11:58 AM
Para planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; Sec Planeacioncorozal <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogota, D.C, 9 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL.

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* se solicita dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

" CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

7) Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.

El Municipio de Corozal, debe remitir el Informe del Pan Institucional de Gestión Ambiental del mes de agosto de 2025.

31) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO□FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

El Municipio de Corozal, debe remitir los Informes Financieros del mes de agosto de 2025.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

El Municipio de Corozal, debe remitir el Informe de supervisión del mes de agosto de 2025, así como el informe de obra e interventoría del mes de agosto de 2025.

36) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas.

El Municipio de Corozal, debe remitir el regisro footgráfico con e Informe de supervisión del mes de agosto de 2025.

37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO.

El Municipio de Corozal debe remitir el informe semanal de inteventoría No. 98 con corte al 7 de septiembre de 2025.

51) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.

El Municipio de Corozal, debe remitirlos extractos bancarios del mes de agosto de 2025.

Teniendo en cuenta que las obligaciones se encuentran vencidas, se soliicta remitir la información solicitada de manera inmediata.

Cordialmente,

Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

REMISION ACTA PARCIAL 60% firmada

Desde PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha Mar 9/09/2025 9:35 AM
Para Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>

Corozal - Sucre, septiembre 9 de 2025

Ingeniero
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Cordial saludo:

Por medio del presente remito el acta parcial correspondiente al 60% de la ejecución, firmada.

Atentamente,

ACTA 6 V4.0.rar

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

ACTA No.	
FECHA	15/09/2025
CIUDAD	PRESENCIAL
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1914-2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	70.07%. De acuerdo con el informe No. 99 al 14 de septiembre de 2025. Sin embargo, esta pendiente el informe semanal de interventoría No.98 y No. 99, por parte del Municipio de Corozal – Interventoría.
MOTIVO:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONVENIO No. 1914 DE 2022

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio de Corozal**
Nombre: VITERBO GÓMEZ CARVAJAL C.C.:9.149.257 Cargo: SUPERVISOR	Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ C.C./ NIT: 22.867.874 Cargo: SUPERVISORA
Nombre: GONZALO FLÓREZ PEÑA C.C.:80.420.013 Cargo: APOYO SUPERVISIÓN	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:
Contratista Estudios, Diseños, Obra	**Contratista Interventoría Estudios, Diseños, Obra**
Nombre: JAIRO DURÁN ROMERO C.C.:10.951.643 Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: C.C.: Cargo:
Nombre: ANGELICA BURGOS C.C.: Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: C.C.: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 7:30 am se da inicio al comité de seguimiento a la ejecución del convenio No. 1914 de 2022, con la presencia de los funcionarios del Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de Estudios, Diseños, obra. El Interventor de la obra no se presentó al comité de seguimiento. El apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, manifiesta se adopten las acciones jurídicas teniendo en cuenta la inasistencia a los comités por parte de la interventoría, indicando que la interventoría es el garante técnico del proyecto.

Desarrollo del comité:

1. Estado Convenio.
2. Estado Contratos derivados
3. Información pendiente.
4. Varios

ESTADO CONVENIO

- El Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022 se encuentra en ejecución, y su plazo de ejecución vence el 30 de noviembre de 2025.

- El Convenio teniendo en cuenta la segunda prórroga suscrita el 29 de agosto de 2025, debe actualizar la póliza del convenio, lo cual ya ha sido reiterado al Municipio de Corozal en varias oportunidades. La Supervisora del Municipio de Corozal, informa que la póliza ya se pagó y está pendiente del envío de la misma en la tarde del de hoy.

- A la fecha se avanza en la revisión de los documentos para el trámite del tercer desembolso.

- El Municipio de Corozal, debe realizar la publicación de la información del convenio en la plataforma SECOP de acuerdo con las obligaciones del convenio, así *"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto".*

ESTADO CONTRATOS DERIVADOS

- Los contratos derivados ampliaron su plazo de ejecución hasta el 29 de octubre de 2025.

- Con respecto al avance en la ejecución de acuerdo con el Informe No. 99 al 14 de septiembre de 2025, se cuenta con un avance ejecutado del 70.07%, avance programado 70.22%, lo anterior representa un atraso del 0.15%. El apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, solicita al Municipio de Corozal ante el atraso presentado y el corto plazo de ejecución de los contratos derivados el cual vence el 29 de octubre de 2025, se adopten las medidas de contingencia que permitan garantizar de manera semanal los avances requeridos para que el atraso del cronograma no se incremente de manera exponencial, dado el corto plazo de ejecución.

  "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS. 5) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR".

  Se reitera al Municipio de Corozal adoptar las medidas que permitan dar cumplimiento a la ejecución contractual, lo cual esta desarrollado en la ejecución semanal de actividades, el cual, en la semana al 14 de

septiembre de 2025, correspondió al 0.90%, porcentaje muy bajo para el desarrollo adecuado del proyecto. Por pate del Municipio de Corozal y sus contratistas derivados, se deben adoptar las acciones de contingencia que permitan en la siguiente semana además del avance programado superar el atraso reportado.

- Está pendiente por parte de los contratistas la siguiente información:

a. Informe de obra del mes de agosto de 2025.
b. Informe de interventoría del mes de agosto de 2025.
c. Informe semanal de interventoría No. 98 con corte al 7 de septiembre de 2025.
d. Informe semanal de interventoría No. 99 con corte al 14 de septiembre de 2025.

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO".

- El Apoyo a la supervisión del Municipio de Corozal, manifiesta que se han remitido comunicados al contratista e interventoría solicitando la información requerida.

- Con respecto a las actividades desarrolladas tenemos:

1. Se ha avanzado en el pañete interno de fachadas sobre la plaza de formación, específicamente en la zona del ascensor, punto fijo, vía interna.
2. Con respecto a la fachada sobre la vía a Sabanas de Pedro, se están instalando los andamios colgantes.
3. Con respecto al tema del cielo raso se cuenta con la estructura de las zonas de cocina, comedor, salón múltiple y parte de oficinas.
4. Se avanza en componente eléctrica cableando piso 3.
5. Se informa que la semana anterior llegó una mula de cemento, arena triturada para terminar rampa y patio de formación.
6. La próxima semana se da inicio al proceso de la pulida del piso y a la instalación de piso de gramito en el tercer nivel.
7. Se avanza en estuco piso 3.
8. Se avanza en la construcción del muro de cerramiento sobre la zona de salida vehicular.
9. Se está adelantando el trámite de compra de suministros.

Se indica por parte del Ministerio del Interior, que las actividades desarrolladas son mínimas con respecto a las que se pueden desarrollar actualmente en la obra. Es claro que las actividades deban ser desarrolladas con distintos frentes de trabajo de manera simultánea.

- Con respecto al personal en obra, se cuenta con 32 trabajos sin contar el personal administrativo. El apoyo a la supervisión manifiesta que el personal es insuficiente para poder garantizar la terminación de la obra en el plazo indicado, por lo cual se insta al Municipio de Corozal a adelantar las acciones ante los contratistas derivados mediante los cuales se pueda incrementar el personal en la obra.

- El Municipio de Corozal, debe remitir los informes de interventoría No. 98 y 99 de acuerdo con la siguiente obligación *"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO"*

- Es importante, recordar al Municipio de Corozal que, para tramitar cualquier desembolso, debe estar al día en el cumplimiento de las obligaciones.

- Teniendo en cuenta la segunda prórroga la cual da plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025, el Ministerio del Interior reitera la solicitud al Municipio de Corozal con respecto a las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al cronograma de actividades: *"(…) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan (…)".*

- El Municipio de Corozal debe presentar el plan de trabajo, para identificar como se implementará personal, jornadas de trabajo, plan de compras, que permita dar cumplimiento al objeto contractual al 30 de noviembre de 2025.

- El Ingeniero Viterbo Gómez supervisor por parte del Ministerio del Interior, manifiesta que el rendimiento es muy bajo, sin bien se indica que se están comprando materiales, no se ejecución a pesar de contar con personal en obra. Se solicita que el Municipio de Corozal tome las medidas necesarias frente a los contratistas de obra e interventoría de obra.

- El Ministerio del Interior recuerda al Municipio de Corozal que los recursos del tercer y cuarto desembolso de la vigencia 2024 al no dar cumplimiento a los requisitos se constituyeron como una reserva presupuestal, lo cual indica que se deben dar cumplimiento a los requisitos para el trámite de los desembolsos pro tarde en el mes de noviembre de 2025. Si no se realizan los desembolsos en la vigencia 2025, los recursos se constituyen en la vigencia 2026 como un recurso expirado, lo cual al ser recursos de inversión fenecen para dicha vigencia siendo necesarios que sean aportados por parte del Municipio de Corozal.

- Con respecto a la documentación pendiente a la fecha, tenemos:

INFORMACIÓN PENDIENTE

a. Póliza de la segunda prórroga.
b. Informe de supervisión del mes de agosto de 2025.
c. Informe de obra del mes de agosto de 2025.
d. Informe de interventoría del mes de agosto de 2025.

e. Informe semanal de interventoría No. 98 con corte al 7 de septiembre de 2025.
f. Informe semanal de interventoría No. 99 con corte al 14 de septiembre de 2025.
g. Pantallazo de la Publicación de la totalidad de los documentos en el SECOP II.

El Ministerio del Interior, insta al Municipio de Corozal a dar cumplimiento a los compromisos, que permitan dar cumplimiento al objeto contractual como son el incremento de personal, compra de materiales, al no realizar lo pertinente se solicitará ante la Subdirección de Gestión Contractual el inicio del presunto incumplimiento, con las acciones administrativas y jurídicas que de allí se derivan.

Se insta al Municipio de Corozal, a continuar realizando el seguimiento semanal de actividades en la obra, con lo cual se puedan por parte del ente territorial a detectar y solucionar de manera inmediata las problemáticas presentadas en la obra.

Se programa comité para el 19 de septiembre de 2025 a las 4:30 pm virtual.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio de Corozal	Remitir póliza de la segunda prórroga	15/09/2025
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 98	Inmediato
Municipio de Corozal	Informe semanal de interventoría No. 99	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio continuará con el seguimiento semanal en obra	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Inmediato
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual	19/09/2025

Se anexa listado de asistencia de los intervinientes;

CONVENIO No. 1914 MUNIICPIO DE COROZAL										
ID	Hora de inicio	Hora de finalización	NOMBRE RELACIONADO	CONVENIO RELACIONADO	No. Documento Identificación	Entidad / Interesado	Cargo / Rol en el Convenio / Contrato derivado / Entidad	PROFESIÓN	Correo electrónico2	Teléfono
1007	9/15/25 7:36:44	9/15/25 7:37:52	GONZALO ANTONIO FLÓREZ PEÑA	1914-2022	80420013	MINISTERIO	APOYO SUPERVISIÓN	ARQUITECTO	GONZALO.FLOREZ@MININTERIOR.GOV.CO	3106690614
1008	9/15/25 7:43:11	9/15/25 7:44:52	Viterbo Gómez Carvajal	1914-22	91494257	MINISTERIO	Supervisor	Ingeniero de Transporte Y Vías	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	3125221054
1009	9/15/25 7:44:37	9/15/25 7:51:04	Carmen Ana Mercado Perez	1914-2022	22867874	MUNICIPIO	Secretaria de Planeacion	Ing sanitario y ambiental	Planeacion@corozal-sucre.gov.co	3015827561

Outlook

RE: ACTA 7 - 65.28%

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 15/09/2025 7:19 AM
Para CONSORCIO EP-C <consorcioepc23@gmail.com>; CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: ACTA PARCIAL- PRIMERA REVISIÓN

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y una vez realizada la primera revisión al acta parcial No. 7, se evidenció:

1. El acta no esta firmada por la interventoría.
2. El acta no esta firmada por la Supervisión del Municipio de Corozal.
3. Se debe remitir la Certificación de la Supervisión por parte del Municipio de Corozal, Constructor e interventor, aprobando el avance de la obra a la fecha del acta parcial.
4. Remitir el acta parcial y las memorias en formato PDF

Dichas subsanaciones se requieren sean remitidas de manera inmediata.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: CONSORCIO EP-C <consorcioepc23@gmail.com>
Enviado: domingo, 14 de septiembre de 2025 9:29 p. m.
Para: CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
Cc: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Asunto: ACTA 7 - 65.28%

ACTA 7.xlsx

Outlook

COMITE CONVENIO No 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Organizer	Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Lun 15/09/2025, de 4:00 PM a 5:00 PM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL, Diana Carolina Guerra Urbina, planeación email, Viterbo Gomez Carvajal, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Mensaje enviado	Lun 15/09/2025 4:03 PM

Comité de seguimiento a la ejecución el Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal, se solicita convocar al Señor Alcalde, supervisión del Municipio, Representante legal del contrato de Estudios, diseños, obra, así como al interventor de los mismos.

De igual manera, se requiere realizar una presentación detallada por espacios en el cual se evidencie los avances, según lo acordado en reunión del 2 de septiembre de 2025 presencial en el Ministerio del Interior.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 219 543 526 254 7

Código de acceso: Qy9EQ3aS

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

REITERACIÓN ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL.

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 16/09/2025 3:16 PM
Para PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogota, D.C, 16 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: REITERACIÓN ACTUALIZACIÓN GARANTÍA SEGUNDA PRÓRROGA CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL.

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* teniendo en cuenta la suscripción de la segunda prórroga del convenio, y el correo de fecha 4 de septiembre de 2025 remitido por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal, se reitera el cumplimiento de la obligación en cuanto a la modificación de la póliza del convenio:

Minuta inicial:

CLÁUSULA OCTAVA: *GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:*

GARANTÍAS EXIGIBLES AL MUNICIPIO

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor del convenio	Vigencia igual al término de ejecución del convenio y seis (06) meses más contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. *EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del*

Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.

Minuta Segunda Prórroga:

CLÁUSULA CUARTA - GARANTÍA ÚNICA: *EL MUNICIPIO deberá presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías de conformidad a los nuevos tiempos del Convenio Interadministrativo definidos en el marco de la presente prórroga y conforme a lo dispuesto en la Cláusula Octava del mismo.*

Por lo anterior, se requiere por parte del Municipio de Corozal remitir la actualización de la póliza, necesaria para cualquier trámite administrativo y financiero.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES

Desde PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Fecha Lun 15/09/2025 6:13 PM

Para Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)

4._CERTIFICADO_DE_AVANCE_DE_OBRA_INTERVENTORIA.pdf; CERTIFICADO DE AVANCE EPC 65.25%.pdf; ACTA (6).pdf; CERTIFICADO AVANCE OBRA SUPERVISION.pdf;

MEMORIAS DE CANTIDADES.pdf

Outlook

RE: REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 16/09/2025 6:54 PM
Para PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

Respetuoso saludo:

En el marco del Convenio No. 1914-2022, suscrito por parte del Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE*", y verificada la información remitida, se solicita que la supervisión del Municipio de Corozal, revise el acta No. 6 dado que el porcentaje ejecutado, no es coincidente con los valores presentados.

Se solicita de manera urgente realizar la revisión y remitir el acta nuevamente, para adelantar el trámite del desembolso.

ACTA 6 revisada.xlsx

Cordialmente,

Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de septiembre de 2025 6:12 p. m.

Para: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
Asunto: REMISION INFORMACION COMPROMISOS CONTRACTUALES

MEMORIAS DE CANTIDADES.pdf

Outlook

Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205 y asunto "REITERACION presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio No. 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre"

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 17/09/2025 9:07 AM
Para PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (321 KB)
Oficio incumplimiento Convenio 1914-2022 Municipio de Corozal.pdf;

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal

ASUNTO: Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205 y asunto *"REITERACION presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio No. 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre"*

Respetuoso saludo:

En el marco del Convenio No. 1914-2022, suscrito por parte del Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE*", el Ministerio del Interior remitió al Municipio de Corozal mediante la plataforma ControlDoc el documento con Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205 y asunto *"REITERACION presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio No. 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre"*, para el trámite pertinente.

Cordialmente,



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205
Folios: 5 Fecha: 17-09-2025 08:27:12
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

Bogotá D.C.

Doctor
BAIRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal – Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación – Supervisora Convenio
Municipio de Corozal - Sucre
secplaneacion@corozal-sucre.gov.co

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022. Municipio de Corozal - Sucre.

Asunto: REITERACIÓN presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No.1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre.

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "*(…) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE (…)",* se reitera el cumplimiento a las siguientes obligaciones:

> ***"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. ESPECÍFICAS:***
>
> ***7) Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.***

El Municipio de Corozal está incumpliendo con la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido los documentos mediante los cuales se pueda verificar que se ha adelantado la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, por parte del Municipio de Corozal en el mes de agosto de 2025.

13) Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes.

El Municipio de Corozal está incumpliendo con la obligación, teniendo en cuenta que se no han remitido los documentos mediante los cuales se valide que los contratistas han dado cumplimientos con los aportes de seguridad social.

31) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

El Municipio de Corozal está incumpliendo con la obligación, teniendo en cuenta que se no han remitido los informes financieros del mes de agosto de 2025.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

El Municipio de Corozal, está incumpliendo con la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido los siguientes informes:

a. Informe de supervisión del mes de agosto de 2025.
b. Informe de obra del mes de agosto de 2025.
c. Informe de interventoría del mes de agosto de 2025
d. Certificación que conste el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente al Sistema de Seguridad Social.

36) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas.

El Municipio de Corozal, está incumpliendo con la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido el registro fotográfico con el informe del mes de agosto de 2025.

> ***37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO.***

El Municipio de Corozal, está incumpliendo la obligación teniendo en cuenta que a la fecha no ha remitido:

1. Informe semanal de interventoría No. 98 con corte al 7 de septiembre de 2025.
2. Informe semanal de interventoría No. 99 con corte al 14 de septiembre de 2025.

> ***51) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.***

El Municipio de Corozal, está incumpliendo con la obligación teniendo en cuenta que no ha remitido los extractos bancarios del mes de agosto de 2025.

> ***57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.***

El Municipio de Corozal, debe remitir los documentos mediante los cuales se evidencié que ante los atrasos en la obra se han adelantado acciones administrativas a los contratistas de estudios, diseño, obra e interventoría a los mismos en pro de dar cumplimiento al objeto contractual en el plazo actual.

De igual manera se reitera la actualización de la póliza de la segunda prórroga, de acuerdo con las siguientes obligaciones:

> ***"(...) Minuta inicial:***

CLÁUSULA OCTAVA: *GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:*

GARANTÍAS EXIGIBLES AL MUNICIPIO

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor del convenio	Vigencia igual al término de ejecución del convenio y seis (06) meses más contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. *EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.*

Minuta Segunda Prórroga:

CLÁUSULA CUARTA - GARANTÍA ÚNICA: *EL MUNICIPIO deberá presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías de conformidad a los nuevos tiempos del Convenio Interadministrativo definidos en el marco de la presente prórroga y conforme a lo dispuesto en la Cláusula Octava del mismo (…)".*

Es necesario indicar, que para adelantar los trámites de desembolso las obligaciones del convenio deben estar al día en su totalidad.

Dado que las obligaciones anteriormente descritas, cuentan con su plazo de cumplimiento vencido y el incumplimiento de las mismas es reiterado, se solicita que el Municipio de Corozal remita los documentos de manera inmediata, teniendo en cuenta dará inicio al trámite de presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior.

Cordialmente;

ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 1914 de 2022.

Proyectó: Arquitecto. Gonzalo Flórez Peña / Apoyo técnico a la supervisión SPS

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-040276 Id: 613205
Folios: 5 Fecha: 17-09-2025 08:27:12
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

CC. ASEGURADORA SOLIDARIA. Póliza No. 540-47-994000022350. Municipio de Corozal - Sucre.

Outlook

Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211 y asunto "CITACION Comité presencial Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre"

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 17/09/2025 9:12 AM
Para PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (242 KB)
Oficio Citación Comité convenio 1914-2022 Municipio de Corozal.pdf;

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022 Municipio de Corozal

ASUNTO: Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211 y asunto *"CITACION Comité presencial Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre"*

Respetuoso saludo:

En el marco del Convenio No. 1914-2022, suscrito por parte del Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE*", el Ministerio del Interior remitió al Municipio de Corozal mediante la plataforma ControlDoc el documento con Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211 y asunto *"CITACION Comité presencial Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre"*, para el trámite pertinente.

Cordialmente,



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211
Folios: 2 Fecha: 17-09-2025 08:32:37
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

Bogotá D.C.

Doctor
BAIRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal – Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación – Supervisora Convenio
Municipio de Corozal - Sucre
secplaneacion@corozal-sucre.gov.co

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022. Municipio de Corozal - Sucre.

Asunto: CITACIÓN Comité presencial convenio No.1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre.

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto ***"(...) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE (...)"***, y teniendo en cuenta los bajos rendimientos presentados en la ejecución de la obra, así como el incumplimiento de los compromisos acordados en el comité realizado en la ciudad de Bogotá el 2 de septiembre de 2025, se cita de carácter obligatorio e indelegable al Señor Alcalde, Supervisión del municipio a comité presencial el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Ministerio del Interior Bogotá Cra 8 No. 12 B – 31 Piso 10 , Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para que el Municipio de Corozal presente las acciones efectivas (programa de trabajo, listado de personal, plan de compras) para el desarrollo de la obra que garantice su terminación al 31 de octubre de 2025, fecha de finalización de los contratos derivados.

El Ministerio del Interior solicita al Municipio de Corozal citar al Representante legal del Contrato de Estudios, diseños, obra, así como el Representante legal del Contrato de Interventoría.

De acuerdo con las obligaciones del Convenio No. 1914 de 2022, tenemos:

> *(...) "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 38) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar,*

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-040279 Id: 613211
Folios: 2 Fecha: 17-09-2025 08:32:37
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes" (…).

Cordialmente;



ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 1914 de 2022.

Proyectó: Arquitecto. Gonzalo Flórez Peña / Apoyo técnico a la supervisión SPS

CC. ASEGURADORA SOLIDARIA. Póliza No. 540-47-994000022350. Municipio de Corozal - Sucre.

Outlook

REMISION DE INFORMACION CONTRACTUAL

Desde PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha Mié 17/09/2025 4:50 PM
Para Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)

ACTA 64,85.pdf; CERTIFICADO DE AVANCE SUPERVISION..pdf; CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA INTERVENTORIA.pdf; CERTIFICADO DE AVANCE EPC 64.85%.pdf;

Corozal – Sucre, septiembre 17 de 2025

Ingeniero
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Con copia,

Arquitecto
GONZALO FLÓREZ PEÑA
Apoyo a la Supervision
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión de información contractual.

Cordial saludo:

En el marco del cumplimiento de los compromisos contractuales se remite la siguiente información:

- Acta 6 del 64,85%
- Certificado de avances de interventoría
- Certificado de avances contratista
- Certificado de avances de supervisión

Atentamente,

MEMORIAS DE CANTIDADES..pdf

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal de Corozal

Outlook

REMISION DE INFORMACION MES DE AGOSTO

Desde PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha Mié 17/09/2025 5:16 PM
Para Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

1 archivo adjunto (705 KB)
INFORME IMPLEMENTACION PIGA AGOSTO 2025.pdf;

Corozal – Sucre, septiembre 17 de 2025

Ingeniero
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Con copia,

Arquitecto
GONZALO FLÓREZ PEÑA
Apoyo a la Supervision
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión de información contractual.

Cordial saludo:

En el marco del cumplimiento de los compromisos contractuales se remite la siguiente información:

Informe mensual de implementación del PIGA mes de agosto de 2025.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

Outlook

COMITE CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Organizer	Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 19/09/2025, de 9:00 AM a 10:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL, planeación email, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO, Viterbo Gomez Carvajal
Mensaje enviado	Jue 18/09/2025 4:14 PM

Comité de seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1914-2022 - Seguimiento de compromisos.

El Municipio de Corozal como ejecutor del proyecto debe convocar a los Representantes del Contrato de Estudios, diseños, obra e interventoría a los mismos. De igual manera realizar una presentación detallada de las actividades adelantadas a la fecha...

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 276 761 962 689 2

Código de acceso: zJ6X3pW3

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

COMITE CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Organizer	Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 19/09/2025, de 9:00 AM a 10:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL, planeación email, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO, Viterbo Gomez Carvajal
Mensaje enviado	Jue 18/09/2025 4:14 PM

Comité de seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1914-2022 - Seguimiento de compromisos.

El Municipio de Corozal como ejecutor del proyecto debe convocar a los Representantes del Contrato de Estudios, diseños, obra e interventoría a los mismos. De igual manera realizar una presentación detallada de las actividades adelantadas a la fecha...

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 276 761 962 689 2

Código de acceso: zJ6X3pW3

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Desde PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha Jue 18/09/2025 4:29 PM
Para Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

4 archivos adjuntos (3 MB)

Oficio 0743-SPM-2025.pdf; INFORME FINANCIERO MUNICIPIO BASE DISTRITO AGOSTO.pdf; INFORME FINANCIERO CONVENIO BASE DISTRITO AGOSTO.pdf; 540-47-994000022350-4.PDF;

Oficio 0743/SPM-2025

Corozal – Sucre, 18 de septiembre de 2025

Ingeniero,
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 1914 de 2022
Ministerio del Interior

Arquitecto,
GONZALO FLÓREZ PEÑA
Apoyo técnico a la supervisión
Ministerio del Interior

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022.

ASUNTO: Cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, se remite la siguiente información:

- Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025.
- Informe financiero cuenta del municipio correspondiente al mes de agosto de 2025
- Extracto financiero de la cuenta del municipio correspondiente al mes de agosto de 2025
- Informe financiero cuenta del convenio correspondiente al mes de agosto de 2025
- Extracto financiero de la cuenta del convenio correspondiente al mes de agosto de 2025

- Póliza actualizada de la segunda prórroga otro sí No. 3 del convenio.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

INFORME SUPERVISION AGOSTO 2025.pdf

Oficio 0743/SPM-2025

Corozal – Sucre, 18 de septiembre de 2025

Ingeniero,
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 1914 de 2022
Ministerio del Interior

Arquitecto,
GONZALO FLÓREZ PEÑA
Apoyo técnico a la supervisión
Ministerio del Interior

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022.

ASUNTO: Cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, se remite la siguiente información:

- Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025.
- Informe financiero cuenta del municipio correspondiente al mes de agosto de 2025
- Extracto financiero de la cuenta del municipio correspondiente al mes de agosto de 2025
- Informe financiero cuenta del convenio correspondiente al mes de agosto de 2025

- Extracto financiero de la cuenta del convenio correspondiente al mes de agosto de 2025
- Póliza actualizada de la segunda prórroga otro sí No. 3 del convenio.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	José Peña Contreras	Contratista	
REVISÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
APROBÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401463830

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000022350 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	09	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	09	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE COROZAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.280.032-2**

DIRECCIÓN: CALLE 28 Nº 26-04 CIUDAD: COROZAL, SUCRE TELÉFONO: 6052841333

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	28/09/2022	30/05/2026	1,702,047,043.80

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:
|

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO SEGUNDA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COROZAL (SUCRE) - OTROSÍ No. 3.

NUEVA FECHA FINAL: 30/11/2025

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

TEXTO 3

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON - Y EL MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE. OTROSÍ No. 02.

NUEVA FECHA FINAL: 31-08-2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,702,047,043.80	$ ********5,134,586	$*****5,000.00	$ ******976,521	$ ********6,116,108

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MENDOZA ROMERO COMPA?IA LTDA ASESORE	10333	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540146383

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC207A0F0EFB7F58

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000022350** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **MUNICIPIO DE COROZAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.280.032-2**

ASEGURADO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

TEXTO ITEM 1

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

TEXTO 2

SEGUNDA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON
- Y EL MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE. OTROSÍ No. 02.

ADICION $580.000.000

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

TEXTO 1

SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS ARRIBA CITADOS SEGUN PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE 2022, ADICIONAR LA SUMA DE $2.414.437.318,07 AL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1914 DE 2022, QUEDANDO EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO EN $16.400.470.438,07

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 0

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

RE: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 18/09/2025 5:05 PM
Para PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor Convenio No. 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

ASUNTO: Observaciones Modificación Póliza

Respetuoso Saludo:

En el marco del Convenio de la referencia suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el asunto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, se remiten las siguientes observaciones a la póliza:

1. La Fecha de la expedición de póliza debe corresponder con la fecha del inicio de la vigencia, para el caso 28/09/2022.
2. No se encuentra firmada por el alcalde.

Es necesario remitir los ajustes a la póliza de manera inmediata, teniendo en cuenta que la aprobación de la misma es necesaria para el trámite de desembolso.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	
FECHA	19/09/2025
CIUDAD	PRESENCIAL
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1914-2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	70.07%. De acuerdo con el informe No. 99 al 14 de septiembre de 2025.
MOTIVO:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONVENIO No. 1914 DE 2022

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio de Corozal**
Nombre: VITERBO GÓMEZ CARVAJAL C.C.:9.149.257 Cargo: SUPERVISOR	Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ C.C./ NIT: 22.867.874 Cargo: SUPERVISORA
Nombre: GONZALO FLÓREZ PEÑA C.C.:80.420.013 Cargo: APOYO SUPERVISIÓN	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:
Contratista Estudios, Diseños, Obra	**Contratista Interventoría Estudios, Diseños, Obra**
Nombre: JAIRO DURÁN ROMERO C.C.:10.951.643 Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: MARGARITA FADUL TURIZO C.C.: 1.066.183.096 Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Nombre: ANGELICA BURGOS C.C.:1.066.186.193 Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: C.C.: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 9:00 am se da inicio al comité de seguimiento a la ejecución del convenio No. 1914 de 2022, con la presencia de los funcionarios del Ministerio del Interior, Municipio de Corozal, Policía Nacional, Contratista de Estudios, Diseños, obra e Interventoría a los Estudios, diseños y obra.

Desarrollo del comité:

1. Estado Convenio.
2. Estado Contratos derivados
3. Información pendiente.
4. Varios

ESTADO CONVENIO

- El Convenio Interadministrativo No. 1914 de 2022 se encuentra en ejecución, y su plazo de ejecución vence el 30 de noviembre de 2025.

- El Municipio de Corozal, remitió al Ministerio del Interior con fecha del 19 de septiembre de 2025 la póliza de la segunda suspensión.

- A la fecha se avanza en la revisión de los documentos para el trámite del tercer desembolso.

ESTADO CONTRATOS DERIVADOS

- Los contratos derivados cuentan con plazo de ejecución hasta el 29 de octubre de 2025.

- Con respecto al avance en la ejecución de acuerdo con el Informe No. 99 al 14 de septiembre de 2025, se cuenta con un ejecutado del 70.07%, programado 70.22% y atraso del 0.15%. Es importante indicar que el informe No. 99 fue remitido el 19 de septiembre de 2025 al Ministerio del Interior, sin embargo, los informes se están remitiendo de manera extemporánea, incumpliendo obligaciones del convenio.

  "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO".

- Está pendiente por parte de los contratistas la siguiente información:

  a. Informe de obra del mes de agosto de 2025.
  b. Informe de interventoría del mes de agosto de 2025.

- La interventoría de la obra, informa sobre las actividades adelantadas del último comité del 15 de septiembre de 2025, a la fecha:

  1. Se avanza en la instalación de la estructura de cieloraso.
  2. Construcción de las vigas de remate del cieloraso en superboard.
  3. Pañete bloque No. 2, se alcanza el 90% de ejecución, presente semana.
  4. Cableado eléctrico bloque 1 piso 3, se alcanza el 40% de ejecución, presente semana.
  5. Ejecución de estuco en segundo piso.
  6. Instalación de ventanas en aluminio.

- Se cuenta en obra con 31 trabajadores en obra, personal insuficiente para el desarrollo de la totalidad de actividades que, a la fecha se podrían estar ejecutando, como son:

  1. Placa en concreto del parqueadero interno.
  2. Placa de concreto del parqueadero externo.
  3. Terminación muro de cerramiento.
  4. Terminación de garita de seguridad.
  5. Alistados de pisos cocinas y zonas de baños.
  6. Elementos de mampostería.
  7. Pañetes externos e internos fachadas.
  8. Instalación de tablón en granito tercer piso.
  9. Pulida de piso en tablón de granito primer y segundo piso.
  10. Instalación de acabado de piso plaza de formación.
  11. Enchapes de piso y pared zonas de cocina y baños.

12. Instalación de estructura de cieloraso zona de oficinas primer piso, segundo piso y tercer piso.
13. Alistados de piso cubiertas.
14. Impermeabilización placa de cubierta.
15. Mampostería cubierta.
16. Terminación de cableado redes eléctricas, redes de voz-datos, detección redes contraincendios.

Con las actividades indicadas anteriormente, y la disposición de personal en la obra, se incrementaría de manera importante el porcentaje de ejecución de la obra. De igual manera una vez se avance en dichas actividades precedentes, se podrán adelantar las siguientes actividades:

1. Instalación de lámparas.
2. Instalación de accesorios eléctricos.
3. Instalación de aparatos sanitarios.
4. Instalación de aparatos y muebles de cocina.
5. Instalación de carpintería de madera.
6. Instalación de barandas.
7. Instalación de fachada en Durapanel.

Con respecto al componente eléctrico, se deben adelantar las actividades de manera inmediata que permitan adelantar el proceso de certificación RETIE – RETILAP y la conexión eléctrica definitiva.

- El Municipio de Corozal debe presentar el plan de trabajo el 22 de septiembre de 2025, para identificar como se implementará personal, jornadas de trabajo, plan de compras, que permita dar cumplimiento al objeto contractual al 29 de octubre de 2025 incluidas las certificaciones RETIE y RETILAP, así como la conexión definitiva y poder adelantar el proceso de recibo a más tardar el 30 de noviembre de 2025.

- El Ministerio del Interior recuerda al Municipio de Corozal que los recursos del tercer y cuarto desembolso de la vigencia 2024 al no dar cumplimiento a los requisitos se constituyeron como una reserva presupuestal, lo cual indica que se deben dar cumplimiento a los requisitos para el trámite de los desembolsos pro tarde en el mes de noviembre de 2025. Si no se realizan los desembolsos en la vigencia 2025, los recursos se constituyen en la vigencia 2026 como un recurso expirado, lo cual al ser recursos de inversión fenecen para dicha vigencia siendo necesarios que sean aportados por parte del Municipio de Corozal.

- El plan de trabajo, se ha venido solicitando desde comités anteriores, que permita suplir los atrasos en la obra, sin embargo, a la fecha no ha sido remitido, por lo cual el Ministerio del Interior tramitará el presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior.

- Con respecto a la documentación pendiente a la fecha, tenemos:

<u>INFORMACIÓN PENDIENTE</u>


c. Informe de supervisión del mes de agosto de 2025.
d. Informe de obra del mes de agosto de 2025.
e. Informe de interventoría del mes de agosto de 2025.
f. Pantallazo de la Publicación de la totalidad de los documentos en el SECOP II.


Se programa comité para el 25 de septiembre de 2025 a las 4:30 pm virtual.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio de Corozal	Mejoramiento de la vía a Sabanas de San Pedro	Inmediato
Municipio de Corozal	El Municipio continuará con el seguimiento semanal en obra	
Municipio de Corozal	El Municipio adelantará las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual al 29 de octubre de 2025.	Inmediato
Municipio de Corozal	Cronograma de actividades, plan de trabajo, plan de compras.	22/09/2025
Municipio de Corozal – Ministerio del Interior	Comité de seguimiento virtual en el Ministerio del Interior	25/09/2025

Se anexa listado de asistencia de los intervinientes;

CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL										
ID	Hora de inicio	Hora de finalización	NOMBRE RELACIONADO	CONVENIO RELACIONADO	No. Documento Identificació	Entidad / Interesado	Cargo / Rol en el Convenio / Contrato derivado / Entida	PROFESIÓN	Correo electrónico2	Teléfono
1027	9/19/25 9:11:33	9/19/25 9:13:40	GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA	1914-2022	80420013	MINISTERIO	APOYO SUPERVISIÓN	ARQUITECTO	GONZALO.FLOREZ@MININTERIOR.GOV.CO	3106690614
1028	9/19/25 9:21:55	9/19/25 9:23:16	Viterbo Gómez Carvajal	1914-22	91494257	MINISTERIO	Supervisor	Ingeniero de Transporte y Vías	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	3125221054
1029	9/19/25 9:34:55	9/19/25 9:37:38	CARMEN ANA MERCADO PEREZ	1914 DE 2022	22867874	MUNICIPIO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	INGENIERA SANITARIA Y	planeacion@corozal-sucre.gov.co	3015827561
1030	9/19/25 9:39:02	9/19/25 9:40:25	Angélica María Burgos Martinez	1914 de 2022	1066186399	CONTRATISTA ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA	Residente de obra / Contratista / 1914-2022 /Consorcio EP-C	Ingeniero Civil	consorcioepc23@gmail.com	3016796846
1031	9/19/25 9:40:33	9/19/25 9:41:14	Jairo Alberto Durán Romero	1914 de 2022	10951643	CONTRATISTA ESTUDIOS DISEÑOS Y	Director de Obra	Ingeniero Civil	consorcioepc23@gmail.com	3022277233
1032	9/19/25 9:41:44	9/19/25 9:43:08	Margarita fadul Turizo	1914	1066183096	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	Director	Ingeniero civil	Fadulturizo24@gmail.com	3216243217

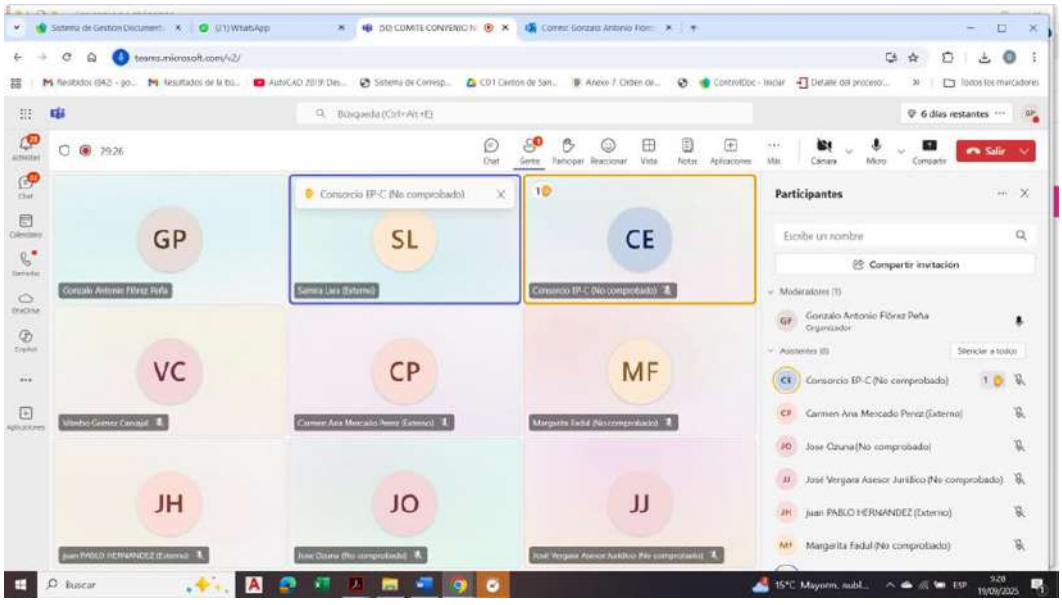

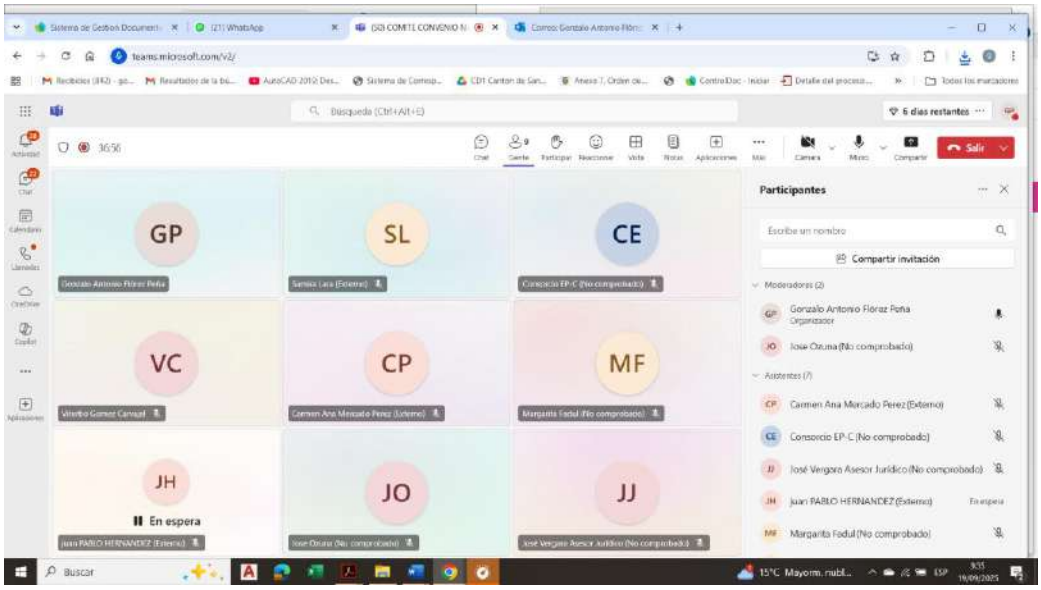
GP
SL
CE
VC
CP
MF
JH
En espera
JO
JJ
Participantes
Compartir invitación

Outlook

OBSERVACIONES INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Desde Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 19/09/2025 2:56 PM
Para PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>; 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>

Bogota, D.C, 19 de septiembre de 2025

Doctor
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación - Supervisora Convenio 1914-2022
Municipio de Corozal

REF: Convenio No. 1914-2022

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA

Respetuoso saludo

En el marco del Convenio de la referencia, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y de acuerdo con la revisión de las fechas de los informes de obra e interventoría, remito las siguientes observaciones:

1. Informe de obra No. 16 (junio 2025) - Informe interventoría No. 16 (12 de mayo al 11 de junio de 2025).
2. Informe de obra No. 17 (Julio 2025) - Informe interventoría No. 17 (12 de junio al 30 de junio de 2025).
3. Informe de obra No. 18 (Agosto 2025) - Informe interventoría No. 18 (1 de julio al 31 de julio de 2025).

De acuerdo con lo evidenciado, se deben revisar los informes dado que no coinciden los periodos de tiempo, los informes deben ser mensuales del 1 de mes al último día del mismo mes. En ese orden de ideas, los informes deberían ser organizados así:

1. Informe No. 16 del 12 al 31 de mayo de 2025.
2. Informe No. 17 del 1 al 30 de junio de 2025.
3. Informe No. 18 del 1 al 31 de julio de 2025.
4. Informe No. 19 del 1 al 30 de agosto de 2025.

Así mismo, se deben revisar los soportes de los informes para que correspondan con el periodo de tiempo indicado. Esta subsanación de observaciones debe realizarse de manera inmediata.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-027563 Id: 616571
Folios: 2 Fecha: 22-09-2025 20:08:47
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario:

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Helmut Hernández Gómez, Coordinador Financiero y Contable.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Solicitud de Tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre.

Apreciado Doctor Hernández,

De manera atenta, me permito remitir la documentación correspondiente a la solicitud del tercer desembolso del convenio de referencia, de acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA - MODIFICACIONES de la primera adición del Convenio No. 1914 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal (Sucre), con registro presupuestal No. 14624, con rubro de afectación presupuestal C-3702-1000-13-0-3702027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDAD. El valor para cobrar es de $4.755.247.517,00 M/L:

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE."*
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE
REGISTRO PRESUPUESTAL	14624
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	C-3702-1000-13-0-3702027-02.
SUB-UNIDAD EJECUTORA	37-01-01-001 MIJ FONSECON
VALOR PAGO/DESEMBOLSO	$4.755.247.517,00 M/L
PERIODO	TERCER DESEMBOLSO
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA.
CUENTA CORRIENTE ( )O DE AHORROS (X) No.:	11100001378

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-027563 Id: 616571
Folios: 2 Fecha: 22-09-2025 20:08:47
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario:

Anexos:

Se relacionan los documentos según los requisitos establecidos en el Procedimiento "Recepción y Trámite de cuentas para pago", por concepto de prestación de servicios/adquisición de bienes/convenios/contratos.

DOCUMENTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES DEL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
Anexo 6 (Informe para pago).	SI
Anexo 8 (Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco de un convenio interadministrativo).	SI
Cuenta de Cobro No.3.	SI
Acta Parcial de obra – Memorias de cálculo	SI
Certificación de paz y salvo de parafiscales del municipio.	SI
Certificación emitida por parte de la Supervisión	SI
Certificación emitida por parte del Contratista de Estudios, diseños, obra	SI
Certificación emitida por parte del Contratista de Interventoría a los estudios, diseños, obra.	SI

Atentamente.

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Supervisor convenio

Elaboró: Arq. Gonzalo Flórez Peña / Apoyo Supervisión SPS.

Revisó: Nicolas González /Apoyo Financiera SPS

Aprobó: Ing. Viterbo Gómez Carvajal / Supervisor de contrato SPS

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-027532 Id: 616498
Folios: 2 Fecha: 22-09-2025 17:51:40
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL.**

DE: **VITERBO GÓMEZ CARVAJAL**
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: Solicitud del tercer desembolso al Convenio No. 1914 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal - Sucre

Cordial saludo;

De manera atenta, me permito remitir la documentación correspondiente a la solicitud del tercer desembolso del convenio de referencia, de acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICACIONES de la primera adición del Convenio No. 1914 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON con el Municipio de Corozal (Sucre), con registro presupuestal No. 14624, con rubro de afectación presupuestal C-3702-1000-13-0-3702027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. El valor para cobrar es de $ 4.755.247.517,00 M/L:

En atención a lo anterior anexo los siguientes documentos

1. Anexo 6 (Informe para pago).
2. Anexo 8 (Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco de un convenio interadministrativo).
3. Cuenta de Cobro No.3.
4. Acta Parcial de obra – Memorias de cálculo.
5. Certificación de paz y salvo de parafiscales del Municipio.
6. Certificación emitida por parte de la supervisión.
7. Certificación emitida por parte del Contratista de Estudios, diseños, obra.
8. Certificación emitida por parte del Contratista de Interventoría de Estudios, diseños, obra.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-027532 Id: 616498
Folios: 2 Fecha: 22-09-2025 17:51:40
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Atentamente,



VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Supervisor convenio

Elaboró: Arq. Gonzalo Flórez Peña / Apoyo Supervisión SPS.
Revisó: Nicolas González /Apoyo Financiera SPS.
Aprobó: Viterbo Gómez Carvajal / Supervisor de contrato SPS.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO 1914 de 2022 FECHA. Día 06 Mes 08 Año 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

DIRECCIÓN: Carrera 28 No. 31ª – 08 Barrio San Juan, Plaza de Junín Palacio Municipal Segundo Piso	TELÉFONO: +57 (605) 2858659
CÉDULA Y/O NIT: 892.280.032-2	CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia@corozal-sucre.gov.co.
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 2 8 0 0
FECHA DE INICIO DÍA: **16** MES: **12** AÑO: 2022	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL** DÍA: 31 MES: 12 AÑO: 2024
Valor total del contrato $13.986.033.120 M/L	Valor desembolso del convenio $4.755.247.517 M/L

VALOR IVA (Cuando aplique)	**VALOR FACTURAS** (Cuando aplique)	**VALOR DESPLAZAMIENTOS** (Cuando aplique)	**VALOR ADICIÓN** (Cuando aplique)	**PRÓRROGA** (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	**SUSPENSIÓN**	**CESIÓN**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA**
			Primera adición por valor de $2.414.437.318,07	Segunda prórroga (Da plazo hasta el 30/11/2025)			

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
03	TERCER DESEMBOLSO	$4.755.247.517 M/L	Sí___ No_X

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 14624	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
BANCOLOMBIA	**11100001378**	Ahorros_X_ Corriente__

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS					El Municipio de Corozal aporta certificado de pago de seguridad social y parafiscales.
FONDO PENSIÓN					
ARL					

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en matrería de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3

Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

El suscrito Supervisor del Convenio, certifica el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio, para proceder a realizar, 3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.755.247.517), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.

La póliza expedida por el MUNICIPIO DE COROZAL corresponde al convenio, la cual tiene valores asegurados correspondientes al 10% del valor del convenio para el amparo de cumplimiento del convenio, con vigencia desde el 28/09/2022 hasta el 28/02/2026

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del_____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de $_____conforme a la cláusula_____del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $

FIRMA RESPONSABLE:



VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
No. 91.494.257
Supervisor

Elaboró: Gonzalo Flórez. /Apoyo Supervisión
Revisó: Nicolas González /Apoyo Financiera
Aprobó: Viterbo Gómez Carvajal/ Supervisor de convenio.

CONVENIO No.	1914-2022	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE COROZAL	
REPRESENTANTE LEGAL	BAYRON JOAQUÍN OSPINA	
C.C.	3.838.696	
PERIODO DE EJECUCIÓN	TERCER DESEMBOLSO	
VALOR TOTAL DE APORTES	$16.980.470.438,07 M/L,	
VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE PERIODO	$4.755.247.517 M/L	
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	SI	NO
	X	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	64.85%	

OBSERVACIONES: El suscrito Supervisor del Convenio, certifica el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio, para proceder a realizar, 3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.755.247.517), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.

Bogotá, septiembre 16 de 2025

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio

Elaboró: Gonzalo Flórez. /Apoyo Supervisión
Revisó: Nicolas González /Apoyo Financiera
Aprobó: Viterbo Gómez Carvajal / Supervisor de convenio.

CUENTA DE COBRO No. 3
EL MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON
NIT: 830.114.475 – 6

DEBE A: **MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE**
NIT: 892.280.032 – 2

LA SUMA DE:
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.755.247.517)

POR CONCEPTO DE:
Tercer Desembolso Convenio interadministrativo No. 1914 del 2022 cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Este valor debe ser consignado a la **CUENTA DE AHORROS** No. **11100001378**
BANCOLOMBIA – SUCURSAL COROZAL

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal

Elaboró: Carmen Mercado Pérez / Secretaria de Planeación

LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE COROZAL

CERTIFICA:

Que el municipio de Corozal-Sucre durante el mes de abril 2025, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma esta certificación a los diecinueve (19) días de mayo de 2025

JULIETH DUQUE LINERO
Tesorera Municipal de Corozal

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el Contrato de Obra No. L-AM-CS-001-01-23, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE", derivado del Convenio interadministrativo No. 1914 del 2022 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE, presenta un avance de 64.85% al 14 de julio de 2025, según certificación expedida por la interventoría CONSORCIO I-POLICE, el día 24 de julio de 2025.

La presente certificación se expide a los veinticuatro un (24) días del mes de julio de 2025.

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de planeacion Municiapal

CIP-V1-2025-100

Corozal, Sucre, 24 de julio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Certificación de Avance de Obra

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la suscrita interventoría del proyecto **ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE**, bajo el contrato de obra No. **L-AM-CS-001-01-23**, contratista Consorcio EP-C 2024, el Consorcio I-Police se permite certificar el avance físico del mismo.

Atendiendo a las observaciones realizadas por la secretaría de planeación,
Hacemos constar que, a la fecha de corte del 14 de julio de 2025, y tras la verificación en campo, revisión de documentos, actas de obra y demás soportes pertinentes, el proyecto presenta un avance físico acumulado del **SESENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (64.85%).**

Este porcentaje de avance corresponde a la ejecución de las siguientes actividades descritas en acta N° 6, memorias y registro fotográfico anexo a este certificado, realizadas conforme a los planos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

Se deja constancia que la interventoría ha ejercido la supervisión técnica, administrativa y financiera sobre las obras ejecutadas, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y las condiciones contractuales.

Expedimos la presente certificación a solicitud del interesado, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), en la ciudad de Montería.

Atentamente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
R.L. CONSORCIO I-POLICE
Interventoría

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

Corozal, Sucre, 24 de julio de 2025

Ingeniero
OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ
R.L. CONSORCIO I - POLICE
INTERVENTORÍA
Email: consorcioipolice@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación, el **CONSORCIO EP-C**, contratista de obra del proyecto en referencia, bajo el **CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, se permite certificar el avance físico del mismo.

Mediante este comunicado, hacemos constar que, a la fecha de corte del 14 de julio de 2025, y tras verificación física y documental, el proyecto presenta un avance físico acumulado del **SESENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO PORCIENTO (64.85%).**

Expedimos la presente certificación a solicitud del interesado, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

ROGER ESTEBAN GUTIÉRREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
CONTRATISTA.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2025	2. No. INFORME	69	3. SEMANA No.	90				
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL:	7/07/2025	AL:	13/07/2025			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	12.575.307.132	
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	11. PLAZO:	22	Meses	
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	14. ADICIONES:	$	2.414.774.705	
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 06 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	12	6	2025	16. SUSPENSIONES 2:	10	4	2025	17. REINICIO 2:	12	5	2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 07 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	24	7	2025	19, TERMINACION	27	8	2025				
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE										
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C										
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO:	$	1.410.385.620	
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	27. PLAZO:	22	Meses	
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	12	6	2025	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	24	7	2025
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN:	27	7	2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSION 2:	10	4	2025
34. REINICIO 2:	12	5	2025	35, TERMINACION	27	8	2025				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE	33. EVALUACIÓN AVANCE ACUMULADO POR CAPÍTULO
PRELIMINARES	2,54%	2,54%	Actividad ejecutado en su totalidad		**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,54%	Actividad ejecutado en su totalidad		**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	36,35%	36,09%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**99,29%**	**99,29%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	3,52%	2,15%	Instalaciones hidraulicas piso 2 bloque 2	**61,10%**	**61,10%**
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	10,88%	10,88%	Levante en mampostería bloque 2 piso 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2 y 3	**98,10%**	**98,10%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	3,31%	1,62%			**48,85%**
PUERTAS Y VENTANAS	4,74%	1,35%			**28,52%**
DIVISIONES	0,83%	0,00%			**5,00%**
CIELO FALSO	4,64%	2,10%			**45,20%**
PINTURA Y ESTUCO	2,73%	0,20%	Estuco plástico para muros bloque1 y 2 piso 1 y 2	**7,20%**	**7,20%**
BARANDA METALICA	0,60%	0,00%			**0,00%**
ASCENSOR	2,44%	0,00%			**0,00%**
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,42%	0,00%			**30,00%**
MURO DE CERRAMIENTO	0,88%	0,77%			**87,20%**
RED CONTRA INCENDIOS	2,61%	0,00%			**0,00%**
GAS NATURAL	0,07%	0,00%			**0,00%**
SISTEMA ELECTRICO	11,60%	6,00%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**51,70%**	**51,70%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	1,89%	0,62%			**32,98%**
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	4,39%	0,00%			**0,00%**
CARPINTERIA DE MADERA	2,43%	0,00%			**0,00%**
CARPINTERIA DE METALICA	2,54%	0,00%			**0,00%**
TOTAL	100,00%	64,85%			

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	64,60%	77,52%	-12,92%
Durante el periodo	0,25%	6,61%	-6,36%
Acumulado Actual	64,85%	84,13%	-19,28%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,61%	84,13%
Valor de la Obra Programada	$ 946.872.096,61	$ 12.053.714.569,68

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,25%	64,85%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 37.475.204,59	$ 9.721.068.071,34

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

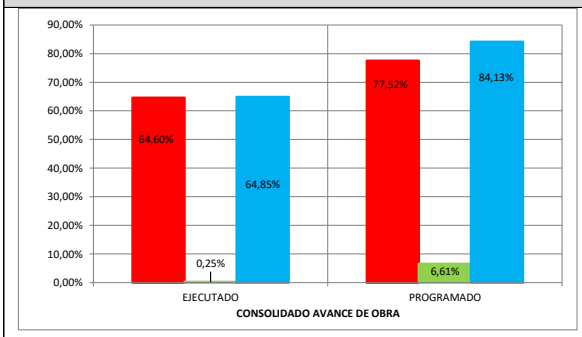

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	DOMINGO	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	SABADO	S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Vibrador de concreto	2	LUNES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	Mezcladoras	1	MARTES	S
ENCHAPADORES	0	Estación topográfica	0	MIERCOLES	S
ELECTRICISTAS	2	Plumilla	1	JUEVES	S
MAESTRO	1	Pica	7	VIERNES	S
OFICIAL	14	Paladraga	8		
AYUDANTE	30	Martillo, pala, buggy	20		
ALMACENISTA	1	Mini cargador	0	LLUVIOSO (L) NUBLADO (N) SOLEADO (S)	
VIGILANTE	2	Venetin para compactacion	0		
MAQUINISTA	0	Volqueta	1		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 1 y 2 piso 3
Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac
Figuración, armado y fundición de parqueadero frontal
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 3
Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado
Instalacion de aires acondicionados
Gabinetes y Bombas de red contra incendios
Instalacion de puertas y ventanas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 19,28% según reprogramacion actualizada, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 64,85%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 1 tercer piso
Se adelantaron actividades en la construccion de mesones de baños, estuco de primer y segundo piso, instalaciones hidro sanitarias tercer piso.
Se expone que, la Interventoría en virtud de sus funciones y mediante el análisis y teniendo encuenta el avance de esta semana, la obra actualmente cuenta con un porcentaje de avance programado del 84.13% frente a un acumulado ejecutado del 64,85%, teniendo un atraso del -19,28%. Al presente, el Contratista cuenta con la cantidad de personal operativo en obra para adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, el tiempo restante no es suficiente para culminar con las actividades faltantes en obra por lo que el contratista solicitara la adicion de dos meses mas a esta unterventoria y al municipio. Esto esta sujeto a la solicitud del municipio de ampliacion del convenio ante el ministerio del interior.
Se bienen presentando mayores cantidades de obra , por lo cual se le solicito al contratista presentar acta de mayores y menores cantidades para su respectiva revicion y/o aprobacion por parte de interventoria y remitir al municipio las condiciones actuales del contrato de obra, ya que se vienen presentando avances de obras que no se pueden reflejar en el avance porcentual de la obra por ser una mayor cantidad por encima de lo contractual.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCI´PON: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE COLUMNETAS PARA MUROS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE COLUMNETAS PARA MUROS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE CABLES PARA REDES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE COLUMNETAS PARA MUROS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCI´PON: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCI´PON: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE COLUMNETAS PARA MUROS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO Y ENCOFRE DE VIGAS COLGANTES PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO Y ENCOFRE DE VIGAS COLGANTES PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE COLUMNETAS PARA MUROS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA

Alcaldía Municipal de COROZAL	**FORMATO** INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA **PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRA	CONSORCIO I - POLICE COROZAL - SUCRE



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: VISITA TÉCNICA DE OBRA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



DESCRIPCIÓN: VISITA TÉCNICA DE OBRA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



DESCRIPCIÓN: VISITA TÉCNICA DE OBRA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



DESCRIPCIÓN: VISITA TÉCNICA DE OBRA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA FACHADA FRONTAL BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE CABLES PARA REDES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE CABLES PARA REDES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE CABLES PARA REDES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE CABLES PARA REDES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO Y ENCONFRE DE VIGAS COLGANTES PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: VIGAS COLGANTES FUNDIDAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: VIGAS COLGANTES FUNDIDAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE CABLES PARA REDES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS PARA MUROS EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA EN LOSA DE CUBIERTA



DESCRIPCI´PON: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO N°: LM-AM-CS-001-01-2023
OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".
CONTRATISTA: CONSORCIO EP-C
INTERVENTORÍA: CONSORCIO I - POLICE
SUPERVISOR: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11.86%		ACTA PARCIAL 3: 6.71%		ACTA PARCIAL 4: 31.29%		ACTA PARCIAL 5: 7.23%		EJECUCIÓN: 64,85%						SALDOS	
														CANTIDADES			VALORES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
1,00	**PRELIMINARES**						**280.063.037,00**		-		-		-				**280.063.037,00**	-	**280.063.037,00**		
1,01	Localizacion, Trazado yreplanteo	m²	2.361,00	4.588,00	10.832.268,00	2.361,00	10.832.268,00		-		-		-	2.361,00		2.361,00	10.832.268,00	-	10.832.268,00	-	-
1,02	Relleno de material seleccionado compactado	m³	2.880,41	93.469,75	269.230.769,00	2.880,41	269.230.769,00		-		-		-	2.880,41		2.880,41	269.230.769,00	-	269.230.769,00	-	-
2,00	**MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION**						**64.740.428,00**		-		-		-				**64.740.428,00**	**5.202.755,00**	**59.537.673,00**		
2,01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion	m³	847,88	26.429,00	22.408.621,00	847,86	22.408.140,00		-		-		-	847,86		847,86	22.408.140,00	-	22.408.140,00	0,02	481,00
2,02	Mejoramiento en Suelo Cemento Compactado	m³	156,26	237.610,00	37.129.533,00	156,26	37.129.533,00		-		-		-	156,26		156,26	37.129.533,00	-	37.129.533,00	-	-
2,03	Cargue y Retiro de Sobrantes	m³	226,55	22.965,00	5.202.721,00	226,55	5.202.755,00		-		-		-	226,55	226,55	-	5.202.755,00	5.202.755,00	-	226,55	5.202.721,00
3,00	**CIMENTACION Y CONCRETOS**						**928.357.607,00**		**654.648.399,00**		**2.063.085.695,00**		**343.491.229,00**				**3.989.582.930,00**	**191.950.448,00**	**4.181.533.378,00**		
3,01	Concreto para solado f'c=2000 PSI e= 5cm	m²	518,44	41.072,00	21.293.368,00	518,43	21.293.101,00		-		-		-	518,43		518,43	21.293.101,00	-	21.293.101,00	0,01	267,00
3,02	Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI	m³	125,04	757.913,00	94.769.442,00	125,04	94.766.410,00		-	-	-		-	125,04	0,00	125,04	94.766.410,00	3.032,00	94.769.442,00	-	-
3,03	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI	m³	92,87	782.913,00	72.709.130,00	92,85	72.697.230,00		-		-		-	92,85		92,85	72.697.230,00	-	72.697.230,00	0,02	11.900,00
3,04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI	Kg	144.079,37	8.521,00	1.227.700.312,00	32.212,30	274.481.035,00	24.921,44	212.355.605,00	57.917,78	493.517.438,00	28.998,32	247.094.664,00	144.049,85		144.049,85	1.227.448.742,00	-	1.227.448.742,00	29,52	251.570,00
3,05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI	m³	176,80	1.043.316,00	184.458.269,00	91,83	95.812.664,00	-	-	84,96	88.642.475,00		-	176,80		176,80	184.455.139,00	-	184.455.139,00	0,00	3.130,00
3,06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI	m³	492,30	1.064.316,00	523.962.767,00	-	-	130,80	139.213.704,00	292,79	311.618.229,00	35,58	37.863.765,00	459,16	33,13	492,29	488.695.698,00	35.256.340,00	523.952.038,00	0,01	10.729,00
3,07	Losa en Concreto Aligerada De f'c=3000 Psi 5cm	m²	3.377,00	264.909,00	894.597.693,00	-	-	1.109,00	293.784.081,00	2.268,00	600.813.612,00		-	3.377,00		3.377,00	894.597.693,00	-	894.597.693,00	-	-
3,08	Losa en Concreto Aligerada De f'c=3000 Psi 10 cm Incluye Lamina Steeldeck	m²	224,00	401.954,00	90.037.696,00		-		-	224,00	90.037.696,00		-	224,00		224,00	90.037.696,00	-	90.037.696,00	-	-
3,09	Estructura Metálica Principal De Cubierta, Incluye Cerchas en perfiles	Kg	6.720,00	20.817,00	139.890.240,00		-		-	6.720,00	139.890.240,00		-	6.720,00		6.720,00	139.890.240,00	-	139.890.240,00	-	-
3,10	Concreto para Foso del Ascensor f´c= 3000 PSI	m³	20,44	1.064.316,00	21.754.619,00	20,44	21.754.619,00	-	-		-		-	20,44		20,44	21.754.619,00	-	21.754.619,00	-	-
3,11	Albaja En Concreto 3000 Psi De Incluye Todo Los Elementos Para Su Elaboración	m	180,32	63.059,00	11.370.799,00		-	-	-		-	-	-		180,32	180,32	-	11.370.799,00	11.370.799,00	-	-
3,12	Concreto F´C=3000 Psi Para Piso Espesor 0,08 Mts	m²	2.361,00	110.760,00	261.504.360,00	1.085,18	120.194.537,00	-	-	1.275,82	141.309.823,00		-	2.361,00		2.361,00	261.504.360,00	-	261.504.360,00	-	-
3,13	Concreto F´C=3000 Psi Para Escaleras	m³	72,67	1.170.656,00	85.071.572,00	-	-	7,94	9.295.009,00	5,78	6.764.050,00	50,00	58.532.800,00	63,72	8,85	72,57	74.591.859,00	10.357.028,00	84.948.887,00	0,10	122.685,00
3,14	Concreto F´C=3000 Psi Para Tanque de Almacenamiento	m³	65,21	1.598.540,00	98.371.893,00	65,20	98.355.299,00	-	-	-	-		-	65,20		65,20	98.355.299,00	-	98.355.299,00	0,01	16.594,00
3,15	Concreto F´C=3000 Psi Para Rampas	m³	183,72	824.622,00	151.499.554,00		-	-	-	183,72	151.499.554,00		-	183,72		183,72	151.499.554,00	-	151.499.554,00	-	-
3,16	Meson en Concreto Acabado Granito Pulido	m³	41,42	921.949,00	38.187.128,00		-	-	-	41,42	38.187.128,00		-	41,42		41,42	38.187.128,00	-	38.187.128,00	-	-
3,17	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x15 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	124,00	59.953,00	7.434.172,00	124,00	7.434.172,00	-	-		-		-	124,00		124,00	7.434.172,00	-	7.434.172,00	-	-
3,18	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x 20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	248,00	72.865,00	18.070.520,00	248,00	18.070.520,00	-	-		-		-	248,00		248,00	18.070.520,00	-	18.070.520,00	-	-
3,19	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	288,00	62.322,00	17.948.736,00	288,00	17.948.736,00	-	-		-		-	288,00		288,00	17.948.736,00	-	17.948.736,00	-	-
3,20	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	324,00	111.581,00	36.152.244,00	324,00	36.152.244,00	-	-		-		-	324,00		324,00	36.152.244,00	-	36.152.244,00	-	-
3,21	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 30x30 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	264,00	187.110,00	49.397.040,00	264,00	49.397.040,00	-	-		-		-	264,00		264,00	49.397.040,00	-	49.397.040,00	-	-
3,22	Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	646,65	62.322,00	40.300.521,00		-	-	-	4,07	253.526,00		-	4,07	642,58	646,65	253.526,00	40.046.871,00	40.300.397,00	0,00	124,00
3,23	Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	855,60	111.581,00	95.468.704,00		-	-	-	4,95	551.924,00		-	4,95	850,65	855,60	551.924,00	94.916.378,00	95.468.302,00	0,00	402,00
3,24	Viga Cinta en Concreto F´C=3000 Psi Para Abertura S =10x15 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	314,00	37.497,00	11.774.058,00		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	314,00	11.774.058,00
3,25	Carcamos S 40x35 cms en Concreto de 3000 PSI para Recoleccion de Aguas lluvias en Zona de Parqueo Incluye Rejilla	m	58,40	300.956,00	17.575.830,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	58,40	17.575.830,00
4,00	**SISTEMA HIDROSANITARIO**						-		**48.764.288,00**		**3.417.579,00**		-				**52.181.867,00**	**85.947.672,00**	**138.129.541,00**		
4,01	Excavación manual en material común.	m³	98,95	26.429,00	2.615.150,00	-	-	98,95	2.615.202,00		-		-	98,95	0,00	98,95	2.615.202,00	53,00	2.615.150,00	-	-
4,02	Relleno manual en recebo comun.	m³	83,70	93.469,75	7.823.418,00	-	-	83,70	7.823.698,00		-		-	83,70	0,00	83,70	7.823.698,00	280,00	7.823.418,00	-	-
4,03	Acometida del servicio público domiciliario de acueducto	Und	1,00	755.839,00	755.839,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	755.839,00
4,04	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 6"	m	75,60	120.749,00	9.128.624,00	-	-	19,80	2.390.830,00		-		-	19,80	55,80	75,60	2.390.830,00	6.737.794,00	9.128.624,00	-	-
4,05	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 4"	m	25,20	65.650,00	1.654.380,00	-	-	9,90	649.935,00		-		-	9,90	15,30	25,20	649.935,00	1.004.445,00	1.654.380,00	-	-
4,06	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3"	m	38,60	81.203,00	3.134.436,00	-	-	15,00	1.218.045,00		-		-	15,00	23,60	38,60	1.218.045,00	1.916.391,00	3.134.436,00	-	-
4,07	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2 1/2"	m	11,00	66.243,00	728.673,00	-	-	2,00	132.486,00		-		-	2,00	9,00	11,00	132.486,00	596.187,00	728.673,00	-	-
4,08	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2"	m	44,50	55.388,00	2.464.766,00	-	-	19,10	1.057.911,00		-		-	19,10	25,40	44,50	1.057.911,00	1.406.855,00	2.464.766,00	-	-
4,09	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3/4"	m	159,20	12.304,00	1.958.797,00	-	-	26,50	326.056,00		-		-	26,50	132,70	159,20	326.056,00	1.632.741,00	1.958.797,00	-	-
4,10	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1"	m	159,20	12.438,00	1.980.130,00	-	-	26,50	329.607,00		-		-	26,50	132,70	159,20	329.607,00	1.650.523,00	1.980.130,00	-	-
4,11	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 9 ø 1/2 "	m	44,50	10.398,00	462.711,00	-	-	19,10	198.602,00		-		-	19,10	25,40	44,50	198.602,00	264.109,00	462.711,00	-	-
4,12	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 1/2 "	m	76,40	45.814,00	3.500.190,00	-	-	18,60	852.140,00		-		-	18,60	57,80	76,40	852.140,00	2.648.049,00	3.500.190,00	-	-
4,13	Punto hidráulico de ø 1/2 "	Und	52,00	27.845,00	1.447.940,00	-	-	-	-	26,00	723.970,00		-	26,00	26,00	52,00	723.970,00	723.970,00	1.447.940,00	-	-

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%								
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		CANTIDADES				VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
4,14	Punto hidráulico de ø 3/4 "	Und	135,00	30.345,00	4.096.575,00	-	-	-	-	-	-		-		135,00	135,00	-	4.096.575,00	4.096.575,00	-	-
4,15	Llave de control 3/4"	Und	82,00	55.268,00	4.531.976,00	-	-	-	-	6,00	331.608,00		-	6,00	76,00	82,00	331.608,00	4.200.368,00	4.531.976,00	-	-
4,16	Caja de inspeccion; 0,8x0,8m libre	Und	8,00	630.674,00	5.045.392,00	-	-	8,00	5.045.392,00		-		-	8,00		8,00	5.045.392,00	-	5.045.392,00	-	-
4,17	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 8"	m	63,40	125.406,00	7.950.740,00	-	-	24,00	3.009.744,00		-		-	24,00	39,40	63,40	3.009.744,00	4.940.996,00	7.950.740,00	-	-
4,18	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 6"	m	164,10	104.772,00	17.193.085,00	-	-	48,00	5.029.056,00		-		-	48,00	116,10	164,10	5.029.056,00	12.164.029,00	17.193.085,00	-	-
4,19	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 4"	m	71,40	53.478,00	3.818.329,00	-	-	24,00	1.283.472,00		-		-	24,00	47,40	71,40	1.283.472,00	2.534.857,00	3.818.329,00	-	-
4,20	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 3"	m	21,40	33.504,00	716.986,00	-	-	12,00	402.048,00		-		-	12,00	9,40	21,40	402.048,00	314.938,00	716.986,00	-	-
4,21	Caja de inspeccion 0,6x0,6m libre	Und	4,00	533.958,00	2.135.832,00	-	-	2,00	1.067.916,00		-		-	2,00	2,00	4,00	1.067.916,00	1.067.916,00	2.135.832,00	-	-
4,22	Suministro e instalación de tubería Ventilación PVC de ø 2"	m	128,40	33.504,00	4.301.914,00	-	-	-	-	7,00	234.528,00		-	7,00	121,40	128,40	234.528,00	4.067.386,00	4.301.914,00	-	-
4,23	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 6"	m	63,74	104.772,00	6.678.167,00	-	-	60,00	6.286.320,00		-		-	60,00	3,74	63,74	6.286.320,00	391.847,00	6.678.167,00	-	-
4,24	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 4"	m	295,52	53.478,00	15.803.819,00	-	-	120,00	6.417.360,00		-		-	120,00	175,52	295,52	6.417.360,00	9.386.459,00	15.803.819,00	-	-
4,25	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 2"	m	157,00	33.504,00	5.260.128,00	-	-	66,00	2.211.264,00		-		-	66,00	91,00	157,00	2.211.264,00	3.048.864,00	5.260.128,00	-	-
4,26	Punto sanitario de 4"	Und	161,00	102.961,00	16.576.721,00	-	-	-	-	8,00	823.688,00		-	8,00	153,00	161,00	823.688,00	15.753.033,00	16.576.721,00	-	-
4,27	Punto sanitario de 2"	Und	46,00	62.085,00	2.855.910,00	-	-	-	-	21,00	1.303.785,00		-	21,00	25,00	46,00	1.303.785,00	1.552.125,00	2.855.910,00	-	-
4,28	Suministro e Instalacion de Sifon Sanitario 2-4"	Und	92,00	46.356,00	4.264.752,00	-	-	9,00	417.204,00		-		-	9,00	83,00	92,00	417.204,00	3.847.548,00	4.264.752,00	-	-
4,29	Suministro e instalacion de sanitario con Fluxometro	Und	51,00	822.476,00	41.946.276,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	51,00	41.946.276,00
4,30	Sanitario para personas con movilidad reducida	Und	10,00	1.928.476,00	19.284.760,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	10,00	19.284.760,00
4,31	Suministro e instalacion de orinal Tipo Antivandalico	Und	39,00	722.476,00	28.176.564,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	39,00	28.176.564,00
4,32	Suministro e Instalacion de Lavamanos Con Fluxometro	Und	52,00	629.280,00	32.722.560,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	52,00	32.722.560,00
4,33	Suministro e Instalacion de Lavaplatos	Und	6,00	424.476,00	2.546.856,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	6,00	2.546.856,00
4,34	Suministro e Instalacion de Duchas Incluye Grifería	Und	46,00	776.949,00	35.739.654,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	46,00	35.739.654,00
4,35	Suministro e instalacion de sanitario con Fluxometro Tipo Antivandalico (Retenidos)	Und	1,00	2.908.476,00	2.908.476,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	2.908.476,00
4,36	Suministro e instalacion de orinal Tipo Antivandalico (Retenidos)	Und	1,00	3.818.476,00	3.818.476,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	3.818.476,00
4,37	Suministro e Instalacion de Lavamanos Antivandalico (Retenidos)	Und	1,00	3.554.780,00	3.554.780,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	3.554.780,00
4,38	Suministro e Instalacion de equipo de bombeo de 2.5 HP y un HIDROFLO de 300 litros	Und	1,00	10.869.499,00	10.869.499,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	10.869.499,00
5,00	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**								-		851.058.406,00		33.243.864,00					**884.302.270,00**	**118.760.823,00**	**1.003.063.093,00**	
5,01	Mamposteria en bloque estructural 20x20x40	m²	3.422,39	116.030,00	397.099.912,00	-	-	-	-	2.909,03	337.534.925,00	168,03	19.496.347,00	3.077,06	345,33	3.422,39	357.031.272,00	40.068.640,00	397.099.912,00	-	-
5,02	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40	m²	1.939,94	85.501,00	165.866.810,00	-	-	-	-	1.648,95	140.986.788,00	160,79	13.747.517,00	1.809,74	130,20	1.939,94	154.734.305,00	11.132.230,00	165.866.535,00	0,00	275,00
5,03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.	m²	3.422,39	50.817,00	173.915.593,00	-	-	-	-	2.909,03	147.828.254,00		-	2.909,03	513,36	3.422,39	147.828.254,00	26.087.339,00	173.915.593,00	-	-
5,04	Pañete allanado 1:4	m²	10.798,42	24.650,00	266.181.053,00	-	-	-	-	9.115,96	224.708.439,00	-	-	9.115,96	1.682,46	10.798,42	224.708.439,00	41.472.614,00	266.181.053,00	-	-
6,00	**ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS**								-		-		62.911.327,00					**62.911.327,00**	**42.030.955,00**	**104.942.282,00**	
6,01	PISO EN BALDOSA DE GRANITO PERLATO PULIDO AL PLOMO 0.33X0.33MT	m²	1.639,51	89.645,00	146.973.874,00	-	-	-	-		-	701,78	62.911.327,00	701,78	468,86	1.170,64	62.911.327,00	42.030.955,00	104.942.282,00	468,87	42.031.592,00
6,02	ENCHAPE PARED CERAMICO 25X35 (Instalacion en Sentido Horizontal)	m²	1.565,00	77.037,00	120.562.905,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1.565,00	120.562.905,00
6,03	PISO EN PORCELANATO PARA PISO MARMOL ST REGIS B 6.5Mm 60x120 PERLA	m²	74,90	100.460,00	7.524.454,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	74,90	7.524.454,00
6,04	ENCHAPE NUEVA YOR NEGRO ANTIDESLIZANTE PARA PISO	m²	482,42	101.922,00	49.169.211,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	482,42	49.169.211,00
6,05	ENCHAPE CERAMICO FORTALEZA NEGRO DE 33.8X33.8 CMS	m²	27,03	107.495,00	2.905.590,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	27,03	2.905.590,00
6,06	PINTURA EPOXICA ANTICHISPA GRIS	m²	55,86	41.803,00	2.335.116,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	55,86	2.335.116,00
6,07	ENCHAPE GRES COLONIAL LISO BETANIA ROJO 30X30 CM	m²	301,94	95.042,00	28.696.981,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	301,94	28.696.981,00
6,08	PISO ESCALERA FUNDIDA ACABADO EN GRANITO	m²	25,50	74.574,00	1.901.637,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	25,50	1.901.637,00
6,09	Guardaescoba Ceramico	m	1.608,51	25.355,00	40.783.771,00	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-	1.608,51	40.783.771,00

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO N°: LM-AM-CS-001-01-2021
OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".
CONTRATISTA: CONSORCIO EP-C
INTERVENTORÍA: CONSORCIO I - POLICE
SUPERVISOR: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

															EJECUCIÓN: 64,85%							
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA						ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
6,10	Construcción de GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO	m	186,00	27.459,00	5.107.374,00	-	-		-		-		-	-		-	-	-	-	186,00	5.107.374,00
7,00	**PUERTAS Y VENTANAS**								-		-		12.054.979,00				**10.833.535,00**	**393.683.417,00**	**404.516.952,00**		
7,01	Suministro e Instalacion Puerta Hoja en Lámina Galvanizada Anticorrosivo Acabado En Pintura Tipo Esmalte Cerradura Tipo Palanca	m^2	87,76	316.297,00	27.758.225,00	-	-		-		-		-	-	87,76	87,76	-	27.758.225,00	27.758.225,00	-	-
7,02	Suministro e Instalacion Portón doble exterior metálica para vehiculos 4,00 x 4,30 mts	Und	1,00	9.003.187,00	9.003.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	9.003.187,00	9.003.187,00	-	-
7,03	Suministro e Instalacion Portón doble exterior metálica para vehiculos 4,00 x 4,00 mts	Und	1,00	8.205.187,00	8.205.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	8.205.187,00	8.205.187,00	-	-
7,04	Suministro e Instalacion puerta doble para planta eléctrica 2,95 x 2,10 mts	Und	5,00	2.276.593,00	11.382.965,00	-	-		-		-		-	-	5,00	5,00	-	11.382.965,00	11.382.965,00	-	-
7,05	Suministro e Instalacion Puerta Doble de acceso primer piso 2,05 × 2,40 mts	Und	1,00	1.926.593,00	1.926.593,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	1.926.593,00	1.926.593,00	-	-
7,06	Suministro e Instalacion Puerta Doble de sala de espera de primer piso de 2,00 x 2,40 mts	Und	1,00	2.976.593,00	2.976.593,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	2.976.593,00	2.976.593,00	-	-
7,07	Suministro e Instalacion Puerta Entrada Doble Tamaño 1,50×2,40 mts	Und	2,00	2.696.593,00	5.393.186,00	-	-		-		-		-	-	2,00	2,00	-	5.393.186,00	5.393.186,00	-	-
7,08	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 1,00 × 2,40 mts	Und	3,00	957.729,00	2.873.187,00	-	-		-		-		-	-	3,00	3,00	-	2.873.187,00	2.873.187,00	-	-
7,09	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 0,90 × 2,40 mts	Und	68,00	902.729,00	61.385.572,00	-	-		-		-		-	-	68,00	68,00	-	61.385.572,00	61.385.572,00	-	-
7,10	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 0,80 × 2,40 mts	Und	6,00	799.729,00	4.798.374,00	-	-		-		-		-	-	6,00	6,00	-	4.798.374,00	4.798.374,00	-	-
7,11	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 0,70 × 2,40 mts	Und	5,00	767.729,00	3.838.645,00	-	-		-		-		-	-	5,00	5,00	-	3.838.645,00	3.838.645,00	-	-
7,12	Suministro e Instalacion de Puerta en barrotes de hierro para zona de retenidos 0,90 x 2,70 mts	Und	3,00	1.517.729,00	4.553.187,00	-	-		-		-		-	-	3,00	3,00	-	4.553.187,00	4.553.187,00	-	-
7,13	Suministro e Instalacion de puerta de vidrio con Riel sobre marco en metal galvanizado, tamaño 1,50 x 2,40 mts	Und	1,00	2.922.303,00	2.922.303,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	2.922.303,00	2.922.303,00	-	-
7,14	Suministro e Instalacion de puerta de vidrio batiente para oficinas, tamaño 0,90 x 2,40 mts	Und	4,00	1.913.187,00	7.652.748,00	-	-		-		-		-	-	4,00	4,00	-	7.652.748,00	7.652.748,00	-	-
7,15	Suministro e Instalacion de puerta deslizante empotrada doble en lámina galvanizada, tamaño 1,27 x 2,10 mts	Und	2,00	2.803.187,00	5.606.374,00	-	-		-		-		-	-	2,00	2,00	-	5.606.374,00	5.606.374,00	-	-
7,16	Suministro e Instalacion de puerta doble galvanizada deslizante, tamaño 2,00 x 2,10 mts	Und	1,00	3.993.187,00	3.993.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	3.993.187,00	3.993.187,00	-	-
7,17	Suministro e Instalacion de puerta doble en lámina galvanizada con calibre 18", tamaño 1,20 x 2,40 mts	Und	1,00	1.361.187,00	1.361.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	1.361.187,00	1.361.187,00	-	-
7,18	Suministro e Instalacion de puerta metálica enrollable para exterior para transformador, tamaño 2,00 x 2,10 mts	Und	1,00	4.563.187,00	4.563.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	4.563.187,00	4.563.187,00	-	-
7,19	Suministro e Instalacion de puerta en lámina galvanizada deslizante para oratorio, tamaño 0,80 x 2,40 mts	Und	1,00	2.503.187,00	2.503.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	2.503.187,00	2.503.187,00	-	-
7,20	Suministro e Instalacion de Puerta deslizante en lámina galvanizada para baños, Tamaño 0,90 × 2,40 mts	Und	19,00	2.803.187,00	53.260.553,00	-	-		-		-		-	-	19,00	19,00	-	53.260.553,00	53.260.553,00	-	-
7,21	Suministro e Instalacion de puerta en lámina de metal galvanizado calibre 18" para cuarto de bombas, tamaño 0,90 x 2,10 mts	Und	1,00	2.068.593,00	2.068.593,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	2.068.593,00	2.068.593,00	-	-
7,22	Suministro e Instalacion de puerta doble en metal galvanizado para sala múltiple, tamaño 1,81 x 2,40 mts	Und	1,00	4.973.187,00	4.973.187,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	4.973.187,00	4.973.187,00	-	-
7,23	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 6,00 x0,50 m	m^2	3,00	407.148,00	1.221.444,00	-	-		-		-	3,00	1.221.444,00		3,00	3,00	-	1.221.444,00	1.221.444,00	-	-
7,24	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 2,00 x0,50 m	m^2	1,00	539.593,00	539.593,00	-	-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	539.593,00	539.593,00	-	-
7,25	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,60 x0,50 m	m^2	0,80	451.297,00	361.038,00	-	-		-		-	2,96	1.333.583,00	2,96	2,16	0,80	1.333.583,00	972.545,00	361.038,00	-	-
7,26	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 4.08 x 1,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	4,08	809.093,00	3.301.099,00	-	-		-		-	4,08	3.301.099,00	4,08		4,08	3.301.099,00	-	3.301.099,00	-	-
7,27	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 3.97 x 0.60 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	2,38	809.093,00	1.925.641,00	-	-		-		-		-	-	2,38	2,38	-	1.925.641,00	1.925.641,00	-	-
7,28	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 2.90 x 0.50 meidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	1,45	750.229,00	1.087.832,00	-	-		-		-	1,45	1.087.832,00	1,45		1,45	1.087.832,00	-	1.087.832,00	-	-
7,29	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de guillotina con tarja para armerillo, tamaño 2,12 x 1,20 m	m^2	2,54	700.729,00	1.779.852,00	-	-		-		-	2,54	1.782.655,00	2,54	0,00	2,54	1.782.655,00	2.803,00	1.779.852,00	-	-
7,30	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,31 x0,60 m	m	1,57	451.297,00	708.536,00	-	-		-		-	1,30	584.430,00	1,30	0,27	1,57	584.430,00	124.106,00	708.536,00	0,00	-
7,31	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de guillotina con tarja para oficinas de atención, tamaño 0,80 x 1,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	4,00	671.297,00	2.685.188,00	-	-		-		-		-	-	4,00	4,00	-	2.685.188,00	2.685.188,00	-	-
7,32	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio proyectante, tamaño 0,80 x0,50 m	m^2	0,40	678.729,00	271.492,00	-	-		-		-	0,58	393.663,00	0,58	- 0,18	0,40	393.663,00	122.171,00	271.492,00	-	-
7,33	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de guillotina con tarja para comedor, tamaño 2,50 x 1,20 m	m^2	3,00	700.729,00	2.102.187,00	-	-		-		-	2,71	1.898.976,00	2,71	0,29	3,00	1.898.976,00	203.211,00	2.102.187,00	-	-
7,34	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,00 x0,50 m	m^2	1,00	451.297,00	451.297,00	-	-		-		-	1,00	451.297,00	1,00		1,00	451.297,00	-	451.297,00	-	-

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%							
	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
7,35	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,40 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	18,00	613.609,00	11.044.962,00	-	-							-	18,00	18,00	-	11.044.962,00	11.044.962,00	-	-
7,36	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,93 x 0,50 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	27,84	613.609,00	17.082.875,00	-	-							-	27,84	27,84	-	17.082.875,00	17.082.875,00	-	-
7,37	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio proyectante, tamaño 0,50 x 2,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	20,00	678.729,00	13.574.580,00	-	-							-	20,00	20,00	-	13.574.580,00	13.574.580,00	-	-
7,38	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,06 x 1,40 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	2,88	613.609,00	1.767.194,00	-	-							-	2,88	2,88	-	1.767.194,00	1.767.194,00	-	-
7,39	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 4,16 x 1,40 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	11,65	613.609,00	7.148.545,00	-	-							-	11,65	11,65	-	7.148.545,00	7.148.545,00	-	-
7,40	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 0,60 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	0,30	716.187,00	214.856,00	-	-							-	0,30	0,30	-	214.856,00	214.856,00	-	-
7,41	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 1,80 x 2,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	4,32	613.609,00	2.650.791,00	-	-							-	4,32	4,32	-	2.650.791,00	2.650.791,00	-	-
7,42	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de guillotina con tarja para oficina de radicación, tamaño 1,50 x 1,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	2,10	700.729,00	1.471.531,00	-	-							-	2,10	2,10	-	1.471.531,00	1.471.531,00	-	-
7,43	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio proyectante, tamaño 0,50 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	0,75	678.729,00	509.047,00	-	-							-	0,75	0,75	-	509.047,00	509.047,00	-	-
7,44	apertura en muro para mirillas de garita de vigilancia vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	0,50	678.729,00	339.365,00	-	-							-	0,50	0,50	-	339.365,00	339.365,00	-	-
7,45	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 2,50 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	1,25	750.229,00	937.786,00	-	-							-	1,25	1,25	-	937.786,00	937.786,00	-	-
7,46	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 6,36 x 2,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	15,26	613.609,00	9.363.673,00	-	-							-	15,26	15,26	-	9.363.673,00	9.363.673,00	-	-
7,47	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 6,36 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	3,18	985.687,00	3.134.485,00	-	-							-	3,18	3,18	-	3.134.485,00	3.134.485,00	-	-
7,48	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 5,60 x 2,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	13,44	750.229,00	10.083.078,00	-	-							-	13,44	13,44	-	10.083.078,00	10.083.078,00	-	-
7,49	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 3,40 x 0,60 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	2,04	613.609,00	1.251.762,00	-	-							-	2,04	2,04	-	1.251.762,00	1.251.762,00	-	-
7,50	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio proyectante, tamaño 0,50 x 2,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	3,60	678.729,00	2.443.424,00	-	-							-	3,60	3,60	-	2.443.424,00	2.443.424,00	-	-
7,51	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,00 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	1,00	613.609,00	613.609,00	-	-							-	1,00	1,00	-	613.609,00	613.609,00	-	-
7,52	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 1,12 x 0,50 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	0,56	613.609,00	343.621,00	-	-							-	0,56	0,56	-	343.621,00	343.621,00	-	-
7,53	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 1,92 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	0,96	613.609,00	589.065,00	-	-							-	0,96	0,96	-	589.065,00	589.065,00	-	-
7,54	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 1,98 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	0,99	613.609,00	607.473,00	-	-							-	0,99	0,99	-	607.473,00	607.473,00	-	-
7,55	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,98 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	1,40	613.609,00	859.053,00	-	-							-	1,40	1,40	-	859.053,00	859.053,00	-	-
7,56	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 1,38 x 2,00 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m^2	2,76	613.609,00	1.693.561,00	-	-							-	2,76	2,76	-	1.693.561,00	1.693.561,00	-	-

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

			PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA			ACTA PARCIAL 2: 11.86%		ACTA PARCIAL 3: 6.71%		ACTA PARCIAL 4: 31.29%		ACTA PARCIAL 5: 7.23%		EJECUCIÓN: 64,85%						SALDOS	
														CANTIDADES			VALORES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
7,57	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corredizas, tamaño 2,13 x 0,50 m/dirio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m²	1,07	750.229,00	802.745,00	-	-		-		-		-	-	1,07	1,07	-	802.745,00	802.745,00	-	-
7,58	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corredizas, tamaño 1,45 x 0,50 m/dirio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m²	0,73	613.609,00	447.935,00	-	-		-		-		-	-	0,73	0,73	-	447.935,00	447.935,00	-	-
7,59	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corredizas, tamaño 1,59 x 0,50 m/dirio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m²	0,80	613.609,00	490.887,00	-	-		-		-		-	-	0,80	0,80	-	490.887,00	490.887,00	-	-
7,60	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corredizas, tamaño 1,23 x 0,50 m/dirio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m²	0,62	613.609,00	380.438,00	-	-		-		-		-	-	0,62	0,62	-	380.438,00	380.438,00	-	-
7,61	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 2 hojas corredizas, tamaño 0,98 x 0,50 m/dirio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m²	0,49	613.609,00	300.668,00	-	-		-		-		-	-	0,49	0,49	-	300.668,00	300.668,00	-	-
7,62	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 3 hojas corredizas, tamaño 4,01 x 2,40 m/dirio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia	m²	9,62	750.229,00	7.217.203,00	-	-		-		-		-	-	9,62	9,62	-	7.217.203,00	7.217.203,00	-	-
7,63	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 12,00 x 7,00 m	m²	84,00	451.297,00	37.908.948,00	-	-		-		-		-	-	84,00	84,00	-	37.908.948,00	37.908.948,00	-	-
7,64	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 10,80 x 1,00 m	m²	21,60	451.297,00	9.748.015,00	-	-		-		-		-	-	21,60	21,60	-	9.748.015,00	9.748.015,00	-	-
7,65	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 4,50 x 1,00 m	m²	9,00	451.297,00	4.061.673,00	-	-		-		-		-	-	9,00	9,00	-	4.061.673,00	4.061.673,00	-	-
7,66	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 3,12 x 1,00 m	m²	12,48	480.729,00	5.999.498,00	-	-		-		-		-	-	12,48	12,48	-	5.999.498,00	5.999.498,00	-	-
8,00	**DIVISIONES**								-		-		-					-	-	-	
8,01	Divisiones en Vidrio Templado Para Oficinas	m²	152,24	601.949,00	91.640.716,00	-	-		-		-		-				-	-	-	152,24	91.640.716,00
9,00	**CIELO FALSO**								-		172.398.419,00		-				**172.398.419,00**	**102.551.833,00**	**274.950.252,00**		
9,01	Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac	m²	2.780,90	177.125,00	492.566.913,00	-	-		-	973,32	172.398.419,00	-	-	973,32	578,98	1.552,30	172.398.419,00	102.551.833,00	274.950.252,00	1.228,61	217.616.661,00
9,02	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall	m²	211,40	80.303,00	16.976.054,00	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	211,40	16.976.054,00
10,00	**PINTURA Y ESTUCO**								-		-		-				-	**89.278.820,00**	**89.278.820,00**		
10,01	Estuco Plastico Interiores	m²	5.362,33	13.571,00	72.772.180,00	-	-		-		-		-		5.362,33	5.362,33	-	72.772.180,00	72.772.180,00	-	-
10,02	Pintura Interior 3 Manos	m²	5.362,33	17.147,00	91.947.873,00	-	-		-		-		-				-	-	-	5.362,33	91.947.873,00
10,03	Estuco Plastico Exteriores	m²	3.590,00	16.814,00	60.362.260,00	-	-		-		-		-	-	981,72	981,72	-	16.506.640,00	16.506.640,00	2.608,28	43.855.620,00
10,04	Pintura Exterior 3 Manos	m²	3.590,00	20.700,00	74.313.000,00	-	-		-		-		-				-	-	-	3.590,00	74.313.000,00
11,00	**BARANDA METALICA**								-		-		-				-	-	-		
11,01	Baranda Metalica con Tuberia en Acero inoxidable 2" (1 Tubo Pasamanos) 1" (3 Tubos), 1/2" (Remates) Platinas 3/16", Tuberia en Acero Inoxidable 2" (Parales Verticales) = 0.95 MT Tuberia E= 2.6mm	m	210,79	312.122,00	65.792.196,00	-	-		-		-		-				-	-	-	210,79	65.792.196,00
12,00	**ASCENSOR**								-		-		-				-	-	-		
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CIRCULACION VERTICAL UN (01) ASCENSOR DE PASAJEROS IMODELO TKJ 450-36W (VVVF) o SIMILAR / CAPACIDAD SEIS (6) PASAJEROS, TRES (03) PARADAS, velocidad de 1.0 mts/seg. Paneles de la Cabina Acero Inox. / Posterior y laterales, Puertas de Cabina EN HAIRLINE Acero Inoxidable, Ancho de Cabina 1.300 mm Fondo de Cabina 1.500 mm, Altura de Cabina 2.300 mm, Botoneras Con señalización en posición lateral, botoneros de planta en¡S1, botones de luego en piso principal. sensor electrónico que permite el registro y la confirmación visual de la llamada a través de LED y luz de emergencia y sistema de comunicacion. Arquitectura modular, alarma de urgencia, abrepuerta y cierrapuerta. En cada piso una botonera de facil reconocimiento para ordenar los desplazamientos, ademas con sistema braille para personas invidentes, indicador de posición y ubicación digital en cabina y en todos los pisos integrados, controlador integrado , control de movimiento simplex colectivo selectivo, control de puertas vwf (Variador de Frecuencia) Operación Funcionamiento en maniobra selectiva colectiva en ascenso y descenso por elementos de programación. Banco Simplex Recorrido 9 m Aprox, Incluye toda	Und	1,00	267.506.150,00	267.506.150,00	-	-		-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	267.506.150,00
13,00	**PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO**								-		45.877.189,00		-				**45.877.189,00**	**45.877.189,00**	-		
13,01	Bordillo Prefabricado de Concreto	m	66,90	87.277,00	5.838.831,00	-	-		-	66,90	5.838.831,00		-	66,90	-	66,90	-	5.838.831,00	-	66,90	5.838.831,00
13,02	Pintura de Piso con Pisolbond	m²	240,00	135.998,00	32.639.520,00	-	-		-	240,00	32.639.520,00		-	240,00	-	240,00	-	32.639.520,00	-	240,00	32.639.520,00
13,03	Placa en Concreto e=10cm, 3000 PSI, Incluye malla electrosoldada Acabado Escobillado	m²	67,22	110.069,00	7.398.838,00	-	-		-	67,22	7.398.838,00		-	67,22	-	67,22	-	7.398.838,00	-	67,22	7.398.838,00
14,00	**MURO DE CERRAMIENTO**						**34.207.102,00**		**36.522.376,00**		**13.488.353,00**		**-**				**84.217.832,00**	**2.263,00**	**84.215.569,00**		
14,01	Excavación en material comun	m³	37,35	26.429,00	987.123,00	37,35	987.123,00	-	-	-	-	-	-	37,35		37,35	987.123,00	-	987.123,00	-	-

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%								
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
14,02	Relleno de material seleccionado compactado	m³	20,70	95.879,50	1.984.706,00	20,70	1.984.706,00	-	-	-	-	-	-	20,70		20,70	1.984.706,00	-	1.984.706,00	-	-
14,03	Concreto para solado f'c=2000 PSI e= 5cm	m²	41,40	36.507,00	1.511.390,00	41,40	1.511.390,00	-	-	-	-	-	-	41,40		41,40	1.511.390,00	-	1.511.390,00	-	-
14,04	Concreto para Pilotes f'c= 3000 PSI	m³	3,32	1.009.316,00	3.350.929,00	3,32	3.353.192,00	-	-	-	-	-	-	3,32	0,00	3,32	3.353.192,00	2.263,00	3.350.929,00	-	-
14,05	Concreto para viga de cimentacion f'c= 3000 PSI	m³	12,42	782.913,00	9.723.779,00	12,42	9.723.779,00	-	-	-	-	-	-	12,42		12,42	9.723.779,00	-	9.723.779,00	-	-
14,06	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI	Kg	1.839,69	9.008,00	16.571.928,00	977,04	8.801.176,00	862,65	7.770.751,00	-	-	-	-	1.839,69		1.839,69	16.571.928,00	-	16.571.928,00	-	-
14,07	Concreto para Columnas f'c= 3000 PSI	m³	7,52	1.043.316,00	7.845.736,00	7,52	7.845.736,00		-		-		-	7,52		7,52	7.845.736,00	-	7.845.736,00	-	-
14,08	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40	m²	385,80	76.671,00	29.579.672,00	-	-	375,00	28.751.625,00	10,80	828.047,00		-	385,80		385,80	29.579.672,00	-	29.579.672,00	-	-
14,09	Concreto para viga de Aereas f'c= 3000 PSI	m³	3,31	951.763,00	3.150.336,00	-	-		-	3,31	3.150.336,00		-	3,31		3,31	3.150.336,00	-	3.150.336,00	-	-
14,10	Pañete allanado 1:4	m²	385,80	24.650,00	9.509.970,00	-	-		-	385,80	9.509.970,00		-	385,80		385,80	9.509.970,00	-	9.509.970,00	-	-
14,11	Pintura Estuco Plastico Exteriores	m²	385,80	13.571,00	5.235.692,00	-	-		-		-		-	-		-	-	-	-	385,80	5.235.692,00
14,12	Pintura Exterior Fachadas	m²	385,80	18.416,00	7.104.893,00	-	-		-		-		-	-		-	-	-	-	385,80	7.104.893,00
15,00	**RED CONTRA INCENDIOS**										-		-					-	-	-		
	TUBERÍAS																	-	-	-		
15,01	Acero Carbono SCH 40, ASTM A-53 extremo ranurado sin costura 4"	ML	290,00	360.308,00	104.489.320,00		-		-		-		-					-	-	-	290,00	104.489.320,00
15,02	Acero Carbono SCH 40, ASTM A-53 extremo ranurado sin costura 2½"	ML	86,00	247.348,00	21.271.928,00		-		-		-		-					-	-	-	86,00	21.271.928,00
	ACCESORIOS				-													-	-	-		
15,03	Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"	UND	11,00	305.433,00	3.359.763,00		-		-		-		-					-	-	-	11,00	3.359.763,00
15,04	Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2½"	UND	13,00	223.033,00	2.899.429,00		-		-		-		-					-	-	-	13,00	2.899.429,00
15,05	Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2"	UND	4,00	185.753,00	743.012,00		-		-		-		-					-	-	-	4,00	743.012,00
15,06	Tee ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"	UND	10,00	161.433,00	1.614.330,00		-		-		-		-					-	-	-	10,00	1.614.330,00
15,07	Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4" x 2½"	UND	7,00	201.433,00	1.410.031,00		-		-		-		-					-	-	-	7,00	1.410.031,00
15,08	Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4" x 2"	UND	4,00	185.433,00	741.732,00		-		-		-		-					-	-	-	4,00	741.732,00
15,09	Reducción ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4" x 2½"	UND	7,00	209.433,00	1.466.031,00		-		-		-		-					-	-	-	7,00	1.466.031,00
15,10	Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"	UND	5,00	177.433,00	887.165,00		-		-		-		-					-	-	-	5,00	887.165,00
15,11	**UNIONES**				-													-	-	-		
15,12	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"	UND	63,00	185.433,00	11.682.279,00		-		-		-		-					-	-	-	63,00	11.682.279,00
15,13	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2½"	UND	42,00	209.433,00	8.796.186,00		-		-		-		-					-	-	-	42,00	8.796.186,00
15,14	Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2"	UND	4,00	177.433,00	709.732,00		-		-		-		-					-	-	-	4,00	709.732,00
	SOPORTES																	-	-	-		
15,15	Soporte tipo colgante empotrado en concreto 4"	UND	33,00	296.148,00	9.772.884,00		-		-		-		-					-	-	-	33,00	9.772.884,00
15,16	Soporte sísmico longitudinal empotrado en concreto 4"	UND	9,00	336.148,00	3.025.332,00		-		-		-		-					-	-	-	9,00	3.025.332,00
15,17	Soporte sísmico lateral empotrado en concreto 4"	UND	11,00	336.148,00	3.697.628,00		-		-		-		-					-	-	-	11,00	3.697.628,00
15,18	Soporte sísmico cuatro vias 4"	UND	5,00	422.865,00	2.114.325,00		-		-		-		-					-	-	-	5,00	2.114.325,00
	VÁLVULAS																	-	-	-		
15,19	Valvula cheque, Sw , 300 WWP, A536 Body, Trim, Bronze, UL/FM 4"	UND	1,00	1.197.729,00	1.197.729,00		-		-		-		-					-	-	-	1,00	1.197.729,00
15,20	Valvula de corte, Clase 150, A126B Body, OS&Y, Trim bronze, Resilient Wedge, ranurada, UL/FM 4"	UND	1,00	1.120.929,00	1.120.929,00		-		-		-		-					-	-	-	1,00	1.120.929,00
15,21	Válvula siamesa (conexión de bomberos) 4" x 2½"	UND	1,00	1.141.729,00	1.141.729,00		-		-		-		-					-	-	-	1,00	1.141.729,00
	GABINETES																	-	-	-		
15,22	Gabinete contra incendios Clase III -	UND	6,00	3.208.593,00	19.251.558,00		-		-		-		-					-	-	-	6,00	19.251.558,00
	BOMBAS												-					-	-	-		

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO N°: LM-AM-CS-001-01-2021
OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".
CONTRATISTA: CONSORCIO EP-C
INTERVENTORÍA: CONSORCIO I - POLICE
SUPERVISOR: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%							
	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
15,23	Bomba centrifuga de eje horizontal, carcasa partida, ULIFM, capacidad de 100 Gpm @ 115 Psi, de una etapa, carcasa en hierro fundido, impulsor en bronce Tablero de control ULIFM, alarmas visuales, con display LCD para visualizar voltaje y amperaje de las baterías, así como la presión del sistema, encerramiento NEMA 2 Manómetros de succión y descarga Válvula desairеadora	Und	1,00	50.000.576,00	50.000.576,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	50.000.576,00
15,24	Válvula de alivio principal de 4", 150# Inlet / 150# Outlet	Und	1,00	2.716.593,00	2.716.593,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	2.716.593,00
15,25	Cono visor de flujo de 4"x6", 150# Flange	Und	1,00	2.041.593,00	2.041.593,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	2.041.593,00
15,26	Muffler 4"	Und	1,00	802.729,00	802.729,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	802.729,00
15,27	Bomba Jockey multi etapas vertical, accionada por motor eléctrico de 5HP, 3600 RPM, 60 Hz, 220 - 440 Voltios, capacidad de 10 Gpm @ 125 Psi Tablero de control ULIFM, 60 Hz, 220 - 440 Voltios, encerramiento NEMA 2	Und	1,00	29.635.432,00	29.635.432,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	29.635.432,00
16,00	**GAS NATURAL**										-		-				-	-	-		
	Tuberia.																-	-	-		
16,01	Suministro e Instalación de tuberia Pe Al Pe 3/4"	m	120,00	26.195,00	3.143.400,00		-		-		-		-				-	-	-	120,00	3.143.400,00
16,02	Suministro e Instalación de tuberia Pe Al Pe 1/2"	m	12,00	25.045,00	300.540,00		-		-		-		-				-	-	-	12,00	300.540,00
	Accesorios.																-	-	-		
16,03	Suministro e Instalación de Union Pe-Al-Pe X 3/4 NPT	Und	20,00	49.295,00	985.900,00		-		-		-		-				-	-	-	20,00	985.900,00
16,04	Suministro e Instalación de Union Pe-Al-Pe X 1/2 NPT	Und	2,00	42.095,00	84.190,00		-		-		-		-				-	-	-	2,00	84.190,00
16,05	Suministro e Instalación de Tee Pe-Al-Pe X 3/4	Und	2,00	42.095,00	84.190,00		-		-		-		-				-	-	-	2,00	84.190,00
16,06	Suministro e Instalación de CODO hg 3/4	Und	5,00	39.095,00	195.475,00		-		-		-		-				-	-	-	5,00	195.475,00
16,07	Suministro e Instalación de CODO CALLE hg 1/2	Und	2,00	33.195,00	66.390,00		-		-		-		-				-	-	-	2,00	66.390,00
16,08	Suministro e Instalación de reduccion hg de 3/4 a 1/2 bush	Und	2,00	35.195,00	70.390,00		-		-		-		-				-	-	-	2,00	70.390,00
16,09	Suministro e Instalación de CODO Pe-Al-Pe X 3/4	Und	12,00	32.095,00	385.140,00		-		-		-		-				-	-	-	12,00	385.140,00
16,10	Suministro e Instalación de valvula Lat D 1/2" Pe-Al-Pe X 1/2" Pe-Al-Pe	UND	2,00	452.476,00	904.952,00		-		-		-		-				-	-	-	2,00	904.952,00
16,11	REGISTRO 3/4 - 1/2 Para Gas	UND	2,00	413.976,00	827.952,00		-		-		-		-				-	-	-	2,00	827.952,00
16,12	Regulador de 2da etapa 3/4"	UND	1,00	533.476,00	533.476,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	533.476,00
17,00	**SISTEMA ELECTRICO**										**150.293.261,00**		**291.141.422,00**				**441.434.683,00**	**15.315.899,00**	**456.750.582,00**		
	SALIDAS ELECTRICAS										**150.293.261,00**		**-**				**150.293.261,00**	**64.661.730,00**	**214.954.991,00**		
17,01	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red normal	UN	278,00	205.351,00	57.087.578,00		-		-	195,00	40.043.445,00		-	195,00	83,00	278,00	40.043.445,00	17.044.133,00	57.087.578,00	-	-
17,02	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red regulada	UN	54,00	223.736,00	12.081.744,00		-		-	38,00	8.501.968,00		-	38,00	16,00	54,00	8.501.968,00	3.579.776,00	12.081.744,00	-	-
17,03	Suministro e instalación salida con tomacorriente GFCI	UN	38,00	240.278,00	9.130.564,00		-		-	27,00	6.487.506,00		-	27,00	11,00	38,00	6.487.506,00	2.643.058,00	9.130.564,00	-	-
17,04	Suministro e instalación salida ventilador de techo	UN	5,00	294.584,00	1.472.920,00		-		-	4,00	1.178.336,00		-	4,00	1,00	5,00	1.178.336,00	294.584,00	1.472.920,00	-	-
17,05	Suministro e instalación salida de iluminación	UN	173,00	298.978,00	51.723.194,00		-		-	121,00	36.176.338,00		-	121,00	52,00	173,00	36.176.338,00	15.546.856,00	51.723.194,00	-	-
17,06	Suministro e instalación salida TV, solo tubería	UN	36,00	185.172,00	6.666.192,00		-		-	25,00	4.629.300,00		-	25,00	11,00	36,00	4.629.300,00	2.036.892,00	6.666.192,00	-	-
17,07	Suministro e instalación salida con interruptor sencillo	UN	118,00	168.848,00	19.924.064,00		-		-	83,00	14.014.384,00		-	83,00	35,00	118,00	14.014.384,00	5.909.680,00	19.924.064,00	-	-
17,08	Suministro e instalación salida con interruptor doble	UN	24,00	187.371,00	4.496.904,00		-		-	17,00	3.185.307,00		-	17,00	7,00	24,00	3.185.307,00	1.311.597,00	4.496.904,00	-	-
17,09	Suministro e instalación salida con interruptor triple	UN	24,00	206.118,00	4.946.832,00		-		-	17,00	3.504.006,00		-	17,00	7,00	24,00	3.504.006,00	1.442.826,00	4.946.832,00	-	-
17,10	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable doble	UN	1,00	205.458,00	205.458,00		-		-	1,00	205.458,00		-	1,00	-	1,00	205.458,00	-	205.458,00	-	-
17,11	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable triple	UN	1,00	240.243,00	240.243,00		-		-	1,00	240.243,00		-	1,00	-	1,00	240.243,00	-	240.243,00	-	-
17,12	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 12.000 BTU	UN	13,00	630.510,00	8.196.630,00		-		-	9,00	5.674.590,00		-	9,00	4,00	13,00	5.674.590,00	2.522.040,00	8.196.630,00	-	-
17,13	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 24.000 - 36000 BTU	UN	32,00	895.902,00	28.668.864,00		-		-	22,00	19.709.844,00		-	22,00	10,00	32,00	19.709.844,00	8.959.020,00	28.668.864,00	-	-
17,14	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 48.000 - 60.000 BTU	UN	9,00	1.123.756,00	10.113.804,00		-		-	6,00	6.742.536,00		-	6,00	3,00	9,00	6.742.536,00	3.371.268,00	10.113.804,00	-	-
	ACOMETIDA Y ALIMENTADORES										**-**		**118.752.262,00**				**118.752.262,00**	**81.332.311,00**	**200.084.573,00**		

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO N°: LM-AM-CS-001-01-2023
OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".
CONTRATISTA: CONSORCIO EP-C
INTERVENTORÍA: CONSORCIO I - POLICE
SUPERVISOR: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%								
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11.86%		ACTA PARCIAL 3: 6.71%		ACTA PARCIAL 4: 31.29%		ACTA PARCIAL 5: 7.23%			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
17,15	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD1)	ML	30,00	231.563,00	6.946.890,00		-		-		-	30,00	6.946.890,00	30,00		30,00	6.946.890,00	-	6.946.890,00	-	-
17,16	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR1)	ML	8,00	83.319,00	666.552,00		-		-		-	8,00	666.552,00	8,00		8,00	666.552,00	-	666.552,00	-	-
17,17	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TDC)	ML	83,00	228.679,00	18.980.357,00		-		-		-	63,00	14.406.777,00	63,00	20,00	83,00	14.406.777,00	4.573.580,00	18.980.357,00	-	-
17,18	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA1)	ML	32,00	352.292,00	11.273.344,00		-		-		-	32,00	11.273.344,00	32,00		32,00	11.273.344,00	-	11.273.344,00	-	-
17,19	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD2)	ML	44,00	230.126,00	10.125.544,00		-		-		-	44,00	10.125.544,00	44,00		44,00	10.125.544,00	-	10.125.544,00	-	-
17,20	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR2)	ML	8,00	84.156,00	673.248,00		-		-		-	8,00	673.248,00	8,00		8,00	673.248,00	-	673.248,00	-	-
17,21	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TH1)	ML	59,00	154.629,00	9.123.111,00		-		-		-	59,00	9.123.111,00	59,00		59,00	9.123.111,00	-	9.123.111,00	-	-
17,22	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA2)	ML	45,00	350.583,00	15.776.235,00		-		-		-	45,00	15.776.235,00	45,00		45,00	15.776.235,00	-	15.776.235,00	-	-
17,23	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#4N +1#8T tramo(TGA-TA3)	ML	60,00	217.830,00	13.069.800,00		-		-		-	60,00	13.069.800,00	60,00		60,00	13.069.800,00	-	13.069.800,00	-	-
17,24	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#6)F+1#6N +1#10T tramo(TGA-TD3)	ML	50,00	111.047,00	5.552.350,00		-		-		-	50,00	5.552.350,00	50,00		50,00	5.552.350,00	-	5.552.350,00	-	-
17,25	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TH2)	ML	63,00	154.513,00	9.734.319,00		-		-		-	63,00	9.734.319,00	63,00		63,00	9.734.319,00	-	9.734.319,00	-	-
17,26	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#6N +1#10T tramo(TGA-TA4)	ML	51,00	146.580,00	7.475.580,00		-		-		-	51,00	7.475.580,00	51,00		51,00	7.475.580,00	-	7.475.580,00	-	-
17,27	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#4N +1#8T tramo(TGA-TA5)	ML	64,00	217.833,00	13.928.512,00		-		-		-	64,00	13.928.512,00	64,00		64,00	13.928.512,00	-	13.928.512,00	-	-
17,28	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#6)F+1#6N +1#10T tramo(TGA-ACS1)	ML	49,00	111.082,00	5.443.018,00		-		-		-	-	-	-	49,00	49,00	-	5.443.018,00	5.443.018,00	0,00	-
17,29	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TBAP)	ML	35,00	155.879,00	5.455.765,00		-		-		-	-	-	-	35,00	35,00	-	5.455.765,00	5.455.765,00	-	-
17,30	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TBCI)	ML	35,00	230.918,00	8.082.130,00		-		-		-	-	-	-	35,00	35,00	-	8.082.130,00	8.082.130,00	0,00	-
17,31	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#8T tramo(TGA-UPS)	ML	32,00	158.914,00	5.085.248,00		-		-		-	-	-	-	32,00	32,00	-	5.085.248,00	5.085.248,00	-	-
17,32	Suministro e instalación alimentador eléctrico en 4(3#350)F+4#350N +1#2/0T tramo(TRAFO-TGA)	ML	10,00	3.341.545,00	33.415.450,00		-		-		-	-	-	-	10,00	10,00	-	33.415.450,00	33.415.450,00	0,00	-
17,33	Suministro e instalación alimentador eléctrico en 2(3#250)F+2#250N +1#2/0T tramo(PLANTA-TGA)	ML	12,00	1.335.910,00	16.030.920,00		-		-		-	-	-	-	12,00	12,00	-	16.030.920,00	16.030.920,00	-	-
17,34	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (2#1/0)F+1#10T tramo(TGA - ILUMINACION EXTERIOR)	ML	100,00	32.462,00	3.246.200,00		-		-		-	-	-	-	100,00	100,00	-	3.246.200,00	3.246.200,00	-	-
	CAJAS DE REGISTRO Y DUCTOS										-		-					-	-		
17,35	Suministro e instalación de caja de registro SB310, acometida en media tensión	UN	2,00	8.414.358,00	16.828.716,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	2,00	16.828.716,00
17,36	Suministro e instalación de caja de registro de BT, para iluminación exterior	UN	8,00	677.539,00	5.420.312,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	8,00	5.420.312,00
	GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN										-		-					**8.318.276,00**	**8.318.276,00**		
17,37	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos con puerta, 220/127v, 125 amp.	UN	3,00	370.503,00	1.111.509,00		-		-		-		-	-	3,00	3,00	-	1.111.509,00	1.111.509,00	-	-
17,38	Suministro e instalación de tablero trifásico 18 circuitos con puerta, 220/127v, 125 amp.	UN	1,00	434.253,00	434.253,00		-		-		-		-	-	1,00	1,00	-	434.253,00	434.253,00	-	-
17,39	Suministro e instalación de tablero trifásico 24 circuitos con puerta, 220/127v, 225 amp.	UN	7,00	678.096,00	4.746.672,00		-		-		-		-	-	7,00	7,00	-	4.746.672,00	4.746.672,00	-	-
17,40	Suministro e instalación de tablero trifásico 36 circuitos con puerta, 220/127v, 225 amp.	UN	2,00	1.012.921,00	2.025.842,00		-		-		-		-	-	2,00	2,00	-	2.025.842,00	2.025.842,00	-	-
17,41	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20, 10ka	UN	114,00	32.872,00	3.747.408,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	114,00	3.747.408,00
17,42	Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20, 10ka	UN	14,00	60.772,00	850.808,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	14,00	850.808,00
17,43	Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30, 10ka	UN	30,00	60.772,00	1.823.160,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	30,00	1.823.160,00
17,44	Suministro e instalación de breaker enchufable 3x40, 10ka	UN	5,00	109.522,00	547.610,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	5,00	547.610,00
17,45	Suministro e instalación de abtero principal debe estar construido en lámina galvanizada calibre 16, pintado con pintura electroestática, uso interior, con barraje de 1000A, de dimensiones 2000 x1800 x 0,75 cms (Alto x Ancho x Profundo) , incluye protecciones principal de 800A y parciales. DPS tipo 1 de 80KVA.	UN	1,00	71.143.089,74	71.143.090,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	71.143.090,00
17,46	Suministro e instalación de tablero transferencia bomba contraincendios, construido en lámina galvanizada calibre 16, pintado con pintura electroestática, uso interior, con barraje de 150A, de dimensiones 1000 x 1200 x0,30 cms (Alto x Ancho x Profundo) , incluye protecciones principal de contactores de 100A, modulo de transferencia, cableado y accesorios.	UN	1,00	10.982.511,04	10.982.511,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	10.982.511,00
17,47	Caja metalica selector para cambio de RED a tablero TR1 o UPS a tablero TR1 de 100A, 220V	UN	1,00	1.757.754,00	1.757.754,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	1,00	1.757.754,00
	REDES DE DATOS										-		-					**33.392.742,00**	**33.392.742,00**		- **33.392.742,00**
17,48	suministro e instalación de salida datos categoria 6a incluye face plate, jack rj45 marca amp o equivalente.	UN	54,00	212.707,00	11.486.178,00		-		-		-		-	-		-	-	-	-	54,00	11.486.178,00

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%							
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
17,49	suministro e instalación de salida voz categoría 6 incluye face plate, jack rj45 marca amp o equivalente.	UN	54,00	124.404,00	6.717.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	54,00	6.717.816,00
17,50	suministro e instalación de cable utp 4 pares cat 6a, uso interior	ML	3.240,00	9.284,00	30.080.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	3.240,00	30.080.160,00
17,51	suministro e instalación de patch panel 24 puertos cat 6a marca amp o equivalente.	UN	4,00	714.417,00	2.857.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	4,00	2.857.668,00
17,52	suministro e instalación de gabinete rack de piso 1980mm x 60mm x 600 mm cerrado - centro principal de cableado, 40 unidades de rack	UN	1,00	3.039.250,00	3.039.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,00	3.039.250,00
17,53	suministro e instalación de switch 100/1000 24 puertos	UN	2,00	5.178.167,00	10.356.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2,00	10.356.334,00
17,54	suministro e instalación de bandejas soporta equipos metálicas.	UN	4,00	76.499,00	305.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	305.996,00	305.996,00	-	-
17,55	suministro e instalación de organizador de cableado delantero.	UN	4,00	61.499,00	245.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	4,00	245.996,00
17,56	suministro e instalación de organizador de cableado trasero.	UN	4,00	61.499,00	245.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	4,00	245.996,00
17,57	suministro e instalación de organizador de cableado vertical de 0,6 m.	UN	4,00	91.499,00	365.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	4,00	365.996,00
17,58	suministro e instalación de patch cord de 3 m cat 6a	UN	108,00	48.284,00	5.214.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	108,00	5.214.672,00
17,59	suministro e instalación de patch cord 1 mt cat 6a.	UN	112,00	41.534,00	4.651.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	112,00	4.651.808,00
17,60	suministro e instalación de acces point	UN	1,00	1.482.434,00	1.482.434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,00	1.482.434,00
17,61	suministro e instalación de tuberia pvc 3/4", 1"	ML	3.564,00	8.864,00	31.591.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.564,00	3.564,00	-	31.591.296,00	31.591.296,00	-	-
17,62	suministro e instalación de tuberia pvc 2"	ML	50,00	29.909,00	1.495.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	-	1.495.450,00	1.495.450,00	-	-
17,63	suministro e instalación de multitoma de tres tomas dobles de tierra aislada, con picos protectores.	UN	2,00	92.438,00	184.876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2,00	184.876,00
17,64	suministro e instalación de caja 40x40x15 cm metálica fondo de madera, distribución teléfonos.	UN	20,00	100.401,00	2.008.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	20,00	2.008.020,00
17,65	suministro e instalación de caja 20cmx20cmx15cm metálica de paso.	UN	5,00	73.214,00	366.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	5,00	366.070,00
	SUBESTACIÓN Y EQUIPOS										-		**172.389.160,00**				**172.389.160,00**	-	**172.389.160,00**	-	
17,66	suministro e instalación de subestación, incluye trafo de 300KVA tipo F, celda de transformador, celda de remonta y celda de seccionador.	UN	1,00	209.962.450,00	209.962.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1,00	209.962.450,00
17,67	Suministro e instalación de planta electrica cabinada de 150KVA.	UN	1,00	172.389.160,00	172.389.160,00	-	-	-	-	-	-	1,00	172.389.160,00	1,00	- 1,00	-	172.389.160,00	- 172.389.160,00	-	1,00	172.389.160,00
17,68	Suministro e instalación de UPS de 15 KVA, trifásica 220/l.27V	UN	1,00	38.865.100,00	38.865.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1,00	38.865.100,00
	MALLA DE PUESTA A TIERRA										-		-				-	-	-		
17,69	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra	UN	1,00	7.491.172,00	7.491.172,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1,00	7.491.172,00
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO										-		-				-	-	-		
17,70	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento	UN	1,00	29.742.191,00	29.742.191,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1,00	29.742.191,00
	REDES EXTERIORES										-		-				-	-	-		
17,71	Suministro e instalación de conjunto de pararrayos y caja primaria de 15 kv tipo polimérico de 12 kv, 10 ka.	UN	1,00	4.305.416,00	4.305.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1,00	4.305.416,00
17,72	Suministro e instalación de línea primaria en media tensión	UN	1,00	24.134.296,00	24.134.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1,00	24.134.296,00
	ILUMINACION Y OTROS										-		-				-	-	-		
17,73	Suministro e instalación de luminaria panel led 60x60 de 40w, 120v	UN	88,00	202.851,00	17.850.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	88,00	17.850.888,00
17,74	Suministro e instalación de luminaria panel led 12w, 120v	UN	265,00	49.866,00	13.214.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	265,00	13.214.490,00
17,75	Suministro e instalación de luminaria panel led 18w, 120v	UN	256,00	54.066,00	13.840.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	256,00	13.840.896,00
17,76	Suministro e instalación de luminaria panel led 20w, 120v	UN	10,00	130.317,00	1.303.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	10,00	1.303.170,00
17,77	Suministro e instalación de luminaria de emergencia led 3w, 120V	UN	67,00	191.230,00	12.812.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	67,00	12.812.410,00
17,78	Suministro e instalación de luminaria hermetica led 2x18w, 120v	UN	8,00	212.601,00	1.700.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	8,00	1.700.808,00
17,79	Suministro e instalación de luminaria hermetica led 18w, 120v	UN	8,00	302.101,00	2.416.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	8,00	2.416.808,00
17,80	Suministro e instalación de luminaria led, 40w, 5200 lum. 220v	UN	7,00	975.734,00	6.830.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	7,00	6.830.138,00
17,81	Suministro e instalación de proyector led de 200w, 220v	UN	6,00	1.199.490,00	7.196.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	6,00	7.196.940,00
17,82	Suministro e instalación de poste metálico rolado de 6 mts con base pernada con brazo de 0,5 mts.	UN	6,00	2.872.775,00	17.236.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	6,00	17.236.650,00
17,83	Suministro e instalación de ventilador de techo	UN	5,00	879.648,00	4.398.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	5,00	4.398.240,00

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%							
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
	MEDIDA INDIRECTA										-		-				-	-	-		
17,84	Suministro e instalación de sistema de medición activos de conexión transformadores monovisuarios. Incluye transformadores de corriente de uso exterior, transformadores de potencial, crucetas ydemás herrajes de conexión	UN	1,00	29.819.965,00	29.819.965,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	29.819.965,00
17,85	Gabinete de medida en poste a prueba de intemperie. Incluye medidor de energía activa-reactiva para medida indirecta, bloque de pruebas, visor, y protección	UN	1,00	9.488.519,00	9.488.519,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	9.488.519,00
18,00	**SISTEMA DE DETECCION RCI**										-		54.496.566,00				**54.496.566,00**	**14.069.529,00**	**68.566.095,00**		
18,01	Suministro e instalación de Panel Deteccion Sistema de 4 lazos con un lazo de 250 puntos instalado., 1.000 puntos de capacidad máxima, 4 NACs., incluye programación, baterias.(incluye tarjeta de lazo sencilla adicional)	UND	1,00	14.000.000,00	14.000.000,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	14.000.000,00
18,02	Suministro e instalación de Detector de Humo Direccionable, incluye base	UND	153,00	643.940,00	98.522.820,00		-		-		-		-				-	-	-	153,00	98.522.820,00
18,03	Suministro e instalación de Estación Manual	UND	6,00	793.990,00	4.763.940,00		-		-		-		-				-	-	-	6,00	4.763.940,00
18,04	Suministro e instalación de Luz Estroboscopica	UND	6,00	818.140,00	4.908.840,00		-		-		-		-				-	-	-	6,00	4.908.840,00
18,05	Suministro e instalación de Cable FPL 2x16	UND	901,00	12.398,00	11.170.598,00		-		-		-		-				-	-	-	901,00	11.170.598,00
18,06	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye soporteria, uniones, curvas y todos los accesorios para su correcto montaje	ML	774,00	70.409,00	54.496.566,00		-		-		-	774,00	54.496.566,00	774,00		774,00	54.496.566,00	-	54.496.566,00	-	-
18,07	Suministro e instalación de cajas 4x4 EMT	UND	215,00	64.179,00	13.798.485,00		-		-		-		-		215,00	215,00	-	13.798.485,00	13.798.485,00	-	-
18,08	Suministro e instalación de cajas 4x2 EMT	UND	6,00	45.174,00	271.044,00		-		-		-		-		6,00	6,00	-	271.044,00	271.044,00	-	-
18,09	Suministro e instalación Coraza 1/2"	ML	61,40	34.504,00	2.118.546,00		-		-		-		-				-	-	-	61,40	2.118.546,00
18,10	Suministro e instalación Conector para Coraza 1/2"	UND	153,00	24.991,00	3.823.623,00		-		-		-		-				-	-	-	153,00	3.823.623,00
19,00	**EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES**										**148.595.810,00**						**148.595.810,00**	-	**148.595.810,00**	-	
19,01	Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondicionado tipo mini split de pared de 12000 btu o 1 TR, que incluye tuberias de cobre de 1/2 Plg y 1/4 Plg con aislamiento termico tipo Rubatex de las mismas dimensiones, cable encauchetado 3 x 14 certificado, elementos de fijacion y sujecion, accesorios y material consumible necsarios para su correcto funcionamiento. Instalado segun norma vigente. Incluye prueba de presurizacion de las tuberias con Nitrogeno a a 500 PSI	m	244,42	149.236,00	36.476.263,00		-		-	219,98	32.828.637,00		-	219,98	- 219,98	-	32.828.637,00	32.828.637,00	-	244,42	36.476.263,00
19,02	Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondicionado tipo Cassete de 48000 Btu o 4 TR y 60000 Btu o 5 TR, que incluye tuberias de cobre de 3/4 Plg y 3/8 Plg con aislamiento termico tipo Rubatex de las mismas dimensiones, cable encauchetado 3 x 12 certificado, elementos de fijacion y sujecion, accesorios y material consumible necsarios para su correcto funcionamiento. Instalado segun norma vigente. Incluye prueba de presurizacion de las tuberias con Nitrogeno a a 500 PSI	m	158,23	236.681,00	37.450.035,00		-		-	142,41	33.705.031,00		-	142,41	- 142,41	-	33.705.031,00	33.705.031,00	-	158,23	37.450.035,00
19,03	Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondicionado tipo mini split de pared de 24000 Btu o 2 TR y 36000 Btu o 3 TR que incluye tuberias de cobre de 5/8 Plg y 3/8 Plg con aislamiento termico tipo Rubatex de las mismas dimensiones, cable encauchetado 3 x 14 certificado, elementos de fijacion y sujecion, accesorios y material consumible necsarios para su correcto funcionamiento. Instalado segun norma vigente. Incluye prueba de presurizacion de las tuberias con Nitrogeno a a 500 PSI	m	473,55	192.546,00	91.180.158,00		-		-	426,20	82.062.142,00		-	426,20	- 426,20	-	82.062.142,00	82.062.142,00	-	473,55	91.180.158,00
19,04	Suministro e Instalacion de Equipo de aires acondicionado tipo mini split de 12000 Btu, tecnologia convencional ON - OFF, refrigerante ecologico, 220 volt. Seer 13, marca reconocidas y con representacion en el pais	Und	12,00	4.554.056,00	54.648.672,00		-		-		-		-				-	-	-	12,00	54.648.672,00
19,05	Suministro e Instalacion de Equipo de aires acondicionado tipo mini split de 24000 Btu, tecnologia convencional ON - OFF, refrigerante ecologico, 220 volt. Seer 13, marca reconocidas y con representacion en el pais	Und	26,00	5.725.920,00	148.873.920,00		-		-		-		-				-	-	-	26,00	148.873.920,00
19,06	Suministro e Instalacion de Equipo de aires acondicionado tipo mini split de 36000 Btu, tecnologia convencional ON - OFF, refrigerante ecologico, 220 volt. Seer 13, marca reconocidas y con representacion en el pais	Und	6,00	9.454.265,00	56.725.590,00		-		-		-		-				-	-	-	6,00	56.725.590,00
19,07	Equipo de aires acondicionado tipo Cassette de 48000 Btu, tecnologia convencional ON - OFF, refrigerante ecologico, 220 volt. Seer 13, marca reconocidas y con representacion en el pais	Und	1,00	13.781.188,00	13.781.188,00		-		-		-		-				-	-	-	1,00	13.781.188,00
19,08	Equipo de aires acondicionado tipo Cassette de 6000 Btu, tecnologia convencional ON - OFF, refrigerante ecologico, 220 volt. Seer 13, marca reconocidas y con representacion en el pais	Und	7,00	16.720.379,00	117.042.653,00		-		-		-		-				-	-	-	7,00	117.042.653,00
19,09	Protector de voltaje	Und	53,00	234.373,00	12.421.769,00		-		-		-		-				-	-	-	53,00	12.421.769,00
19,10	Bases anti vibratorias para unidades condensadoras de 12k a 36k Btu	Und	180,00	50.623,00	9.112.140,00		-		-		-		-				-	-	-	180,00	9.112.140,00
19,11	Bases anti vibratorias para unidades condensadoras de 48k a 60k Btu	Und	32,00	71.933,00	2.301.856,00		-		-		-		-				-	-	-	32,00	2.301.856,00
19,12	Reajuste de gas refrigerante R410	Und	53,00	227.702,00	12.068.206,00		-		-		-		-				-	-	-	53,00	12.068.206,00
20,00	**CARPINTERIA DE MADERA**										-						-	-	-		
20,01	Suministro e Instalacion de Muebles de Cocina en Madera Formica color Ebano	m^2	124,38	762.148,00	94.795.968,00		-		-		-		-				-	-	-	124,38	94.795.968,00

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C. Contratista: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

														EJECUCIÓN: 64,85%							
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR
20,02	Suministro e Instalacion de Closets de Alojamiento en Triplex de 4 mm con 3 Bisagras por Puerta y Laca Mate catalizada con brillla	m^2	149,60	866.486,00	129.626.306,00		-		-		-		-				-	-	-	149,60	129.626.306,00
20,03	Suministro e Instalacion de Puerta entamborada en Triplex de 4 mm	m^2	33,00	1.292.286,00	42.645.438,00		-		-		-		-				-	-	-	33,00	42.645.438,00
21,00	**CARPINTERIA DE METALICA**										-						-	-	-		
21,01	Suministro e Instalacion de Divisiones en acero inoxidable, Cal. 20 cantiliver	m^2	130,00	817.261,00	106.243.930,00		-		-		-		-				-	-	-	130,00	106.243.930,00
21,02	Suministro e Instalacion Fachadas Inclinadas en Durapanel E = 48cm	m^2	204,90	800.626,00	164.048.267,00		-		-		-		-				-	-	-	204,90	164.048.267,00
21,03	Suministro e Instalacion de Muebles en Armerillo Metalicos Lamina Cal 16. de de 155x60 cm	Und	11,00	753.737,00	8.291.107,00		-		-		-		-				-	-	-	11,00	8.291.107,00
	COSTO DIRECTO				**10.980.344.608,00**		$ 1.307.368.174,00		$ 739.935.063,00		$ 3.448.214.712,00		$ 797.339.387,00				$ 6.291.635.893,00	**$ 853.811.379,00**	$ 7.145.547.274,00		**3.801.404.592,00**
	COSTOS INDIRECTOS				3.347.056.043,07		$ 392.210.453,00		$ 221.980.519,00		$ 1.034.464.414,00		$ 239.201.816,00				$ 1.887.490.768,00	**$ 256.173.414,00**	$ 2.143.664.182,00		$ 1.193.374.039,07
22,00	Tramites de legalización ante el operador de red	UN	1	14.452.661,07	14.452.661,07									-		-	-	-	-	1,00	14.452.661,07
23,00	Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	UN	1	4.500.000,00	4.500.000,00									-		-	-	-	-	1,00	4.500.000,00
24,00	Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	UN	1	15.000.000,00	15.000.000,00									-		-	-	-	-	1,00	15.000.000,00
25,00	Certificación RETILAP	UN	1	19.000.000,00	19.000.000,00									-		-	-	-	-	1,00	19.000.000,00
26,00	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m^3	226,55	22.965,00										226,55		226,55		$ -	$ -	-	
		ADMINISTRACIÓN		24%	2.635.282.706,00		$ 313.768.362,00		$ 177.584.415,00		$ 827.571.531,00		$ 191.361.453,00				$ 1.509.992.614,00	**$ 204.938.731,00**	$ 1.714.931.346,00		$ 912.337.102,00
		UTILIDAD		5%	549.017.230,00		$ 65.368.409,00		$ 36.996.753,00		$ 172.410.736,00		$ 39.866.969,00				$ 314.581.795,00	**$ 42.695.569,00**	$ 357.277.364,00		$ 190.070.230,00
		IMPREVISTOS		1%	109.803.446,00		$ 13.073.682,00		$ 7.399.351,00		$ 34.482.147,00		$ 7.973.394,00				$ 62.916.359,00	**$ 8.539.114,00**	$ 71.455.473,00		$ 38.014.046,00
	TOTAL COSTOS PROYECTO				**14.327.400.651,07**		**1.699.578.627,00**		**$ 961.915.582,00**		**$ 4.482.679.126,00**		**$ 1.036.541.203,00**				**8.179.126.661,00**	**1.110.084.793,00**	**9.289.211.456,00**		**5.038.189.195,07**
	VALOR TOTAL				**14.327.400.651,07**												**8.179.126.661,00**	**1.110.084.793,00**	**9.289.211.456,00**		**5.038.189.195,07**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.307.132,00
VALOR OTRO SÍ N°1:	$ 350.000.000,00
VALOR OTRO SÍ N°2:	$ 2.065.115.073,07
VALOR ACT. CONTRATO:	$ 14.990.422.205,07

VALOR ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 663.021.554,00
VALOR ETAPA 2: EJECUCIÓN	$ 14.327.400.651,07
VALOR ANTICIPO:	$ 1.886.296.070
% ANTICIPO:	15,00%

DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% DE PAGO	AMORTIZACION ANTICIPO		SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGO ACUMULADO
ANTICIPO CONTRATO		$ 1.886.296.070	15,00%	$ -		-	1.886.296.069,80	-	
ANTICIPO OTRO SI No. 2		$ 309.767.261	15,00%	$ -			309.767.260,96		
TOTAL		$ 2.196.063.331							

DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% DE PAGO	AMORTIZACION ANTICIPO		SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGO ACUMULADO
ETAPA 1									
ACTA PARCIAL 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 663.021.554,00	100,00%	$ 99.453.233,10		1.786.842.836,70	563.568.320,90	-	100,00%
TOTAL		$ 663.021.554,00		$ 99.453.233,10		1.786.842.836,70	563.568.320,90		100,00%

TIPO DE CONTRATO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CONTRATO N°:	**LM-AM-CS-001-01-2023**
OBJETO:	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EP-C**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO I - POLICE**
SUPERVISOR:	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**

En Corozal, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2025, se reunieron ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA, Representante Legal del CONSORCIO EP-C, Contratista; OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO I - POLICE, Interventoría; y CARMEN ANA MERCADO PÉREZ, Secretaria de Planeación, Supervisora de Obra; para dejar constancia del acta de avance N°6 del proyecto, que se detalla a continuación:

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA						ACTA PARCIAL 2: 11,86%		ACTA PARCIAL 3: 6,71%		ACTA PARCIAL 4: 31,29%		ACTA PARCIAL 5: 7,23%		EJECUCIÓN: 64,85%								
														CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANTIDADES	VALORES	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANT ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADA	CANTIDAD	VALOR

DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% DE PAGO	AMORTIZACION ANTICIPO		SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGO ACUMULADO
ETAPA 2									
ACTA PARCIAL 2	7/05/2024	$ 1.699.578.627,00	11,86%	$ 254.936.794,05		1.531.906.042,65	1.444.641.832,95	12.627.822.024,07	11,86%
ACTA PARCIAL 3	29/07/2024	$ 961.915.582,00	6,71%	$ 144.287.337,30		1.697.385.966,31	817.628.244,70	11.665.906.442,07	18,58%
ACTA PARCIAL 4	28/11/2024	$ 4.482.679.126,00	31,29%	$ 672.401.868,90		1.024.984.097,41	3.810.277.257,10	7.183.227.316,07	49,86%
ACTA PARCIAL 5	7/01/2025	$ 1.036.541.203,00	7,23%	$ 155.481.180,45		869.502.916,96	881.060.022,55	6.146.686.113,07	57,10%
ACTA PARCIAL 6	14/07/2025	$ 1.110.084.793,00	7,75%	$ 166.512.718,95		702.990.198,01	943.572.074,05	5.036.601.320,07	64,85%
TOTAL		$ 9.290.799.331,00	64,85%	$ 1.393.619.899,65		1.024.984.097,41	3.810.277.257,10	6.146.686.113,07	64,85%

ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
CONTRATISTA

OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
R.L. CONSORCIO I - POLICE
INTERVENTORÍA

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**						
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**					**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	2,361.00		
ITEM	**1.0**	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**	**m²**		
1.01	Localizacion, Trazado y replanteo						

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Longitud					
ÁREA DEL LOTE				**2361.00**		**2361.00**
FRENTE	**60.83**					
LADO IZQUIERDO	**80.17**					
FONDO	**5.92**					
LADO DERECHO	**103.06**					
						2,361.00



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**


OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**1.0**	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**	**m²**
1.01	Localizacion, Trazado y replanteo				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







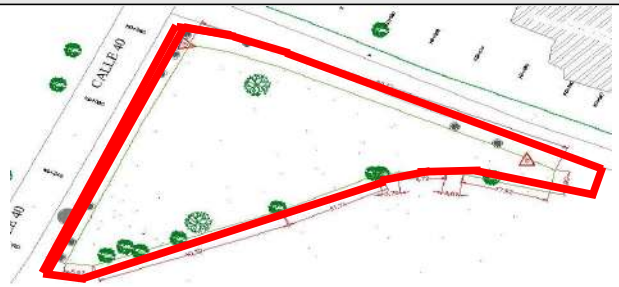





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2,880.41**
ITEM	**1**	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**	**m³**
1.02	Relleno de material seleccionado compactado				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
VER CARTERA ANEXA				**2,880.41**	**m³**	**2880.41**
						2,880.41

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

ORTE DE CALCULOS DE VOLUMENES DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE TIPO A EN COROZAL- SU								
Project: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE CORZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE								
Alignment: alinemiento lleno lote corozal								
Sample Line Group: linea de muestreo								
Start Sta: 0+00.000								
End Sta: 0+80.000								
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0+10.000	0	0	0	71.71	458.57	0	0	458.57
0+20.000	0	0	0	57.32	795.19	0	0	1253.76
0+30.000	0	0.04	0.04	43.42	663.72	0.04	0.04	1917.48
0+40.000	0.04	0.24	0.24	27.18	493.01	0.28	0.28	2410.49
0+50.000	0.41	2.28	2.28	7.9	370.43	2.56	2.56	2780.92
0+60.000	4.83	26.22	26.22	0	99.49	28.77	28.77	2880.41
0+70.000	0	24.15	24.15	0	0	52.93	52.93	2880.41
0+80.000	0	0	0	0	0	52.93	52.93	2880.41

SUMATORIA DE VOLUMENES (M3)		
VOLUMEN DE LLENOS .	2880.41	M3
VOLUMEN DE CORTE.	52.93	M3

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**1**	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**	**m³**	
1.02	Relleno de material seleccionado compactado				

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	**FECHA**	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	847.86		
ITEM	2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION**	**UNIDAD** m³
2.01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	FACTOR EXPANSION	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BLOQUE 1						
ZAPATAS						
ZAP-1	2.20	2.20	2.15	2		20.81
ZAP-2	2.30	2.30	2.15	4		45.49
ZAP-3	2.50	2.50	2.15	10		134.38
ZAP-4	2.60	2.60	2.15	1		14.53
ZAP-5	2.70	2.70	2.15	2		31.35
ZAP-7	1.20	1.20	2.15	1		3.10
ZAP-8	2.80	2.80	2.15	2		33.71
VIGA DE CIMENTACION						
VG 101	18.55	0.4	0.4			2.97
VG 102	24.07	0.4	0.4			3.85
VG 103	33.53	0.4	0.4			5.36
VG 104	33.53	0.4	0.4			5.36
VG 105	19.44	0.4	0.4			3.11
VG 106	19.44	0.4	0.4			3.11
VG 107	19.44	0.4	0.4			3.11
VG 108	19.44	0.4	0.4			3.11
VG 109	13.41	0.4	0.4			2.15
VG 110	6.03	0.4	0.4			0.96
VG 111	6.03	0.3	0.4			0.72

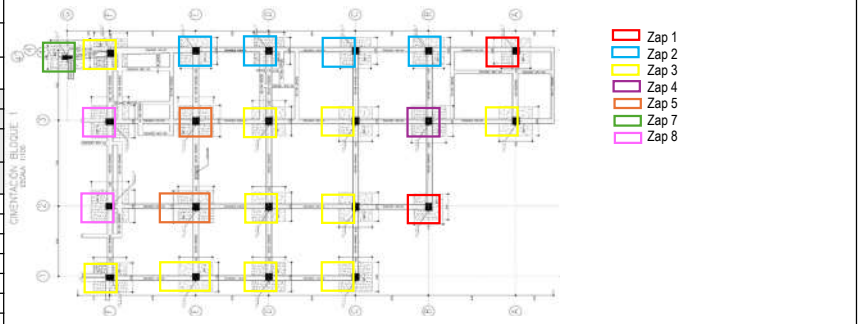

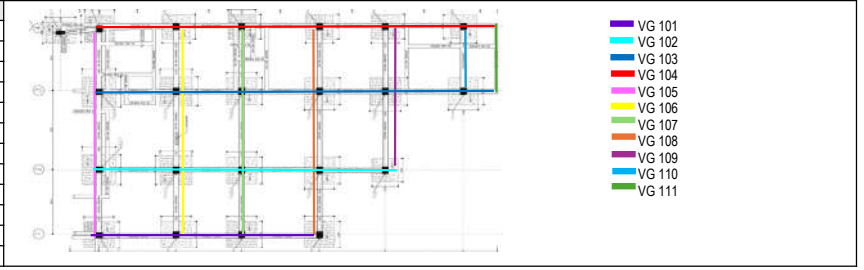

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**847.86**		
ITEM	**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION**	**UNIDAD** **m³**
2.01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion		





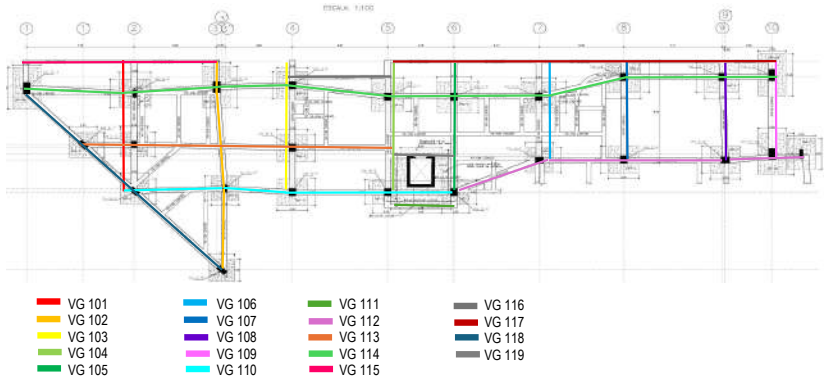

BLOQUE 2						
ZAPATAS						
ZAP-1	1.80	1.80	2.05	1		6.64
ZAP-2	2.00	2.00	2.05	7		57.40
ZAP-3	2.20	2.20	2.15	5		52.03
ZAP-4	2.30	2.30	2.15	2		22.75
ZAP-5	2.50	2.50	2.15	4		53.75
ZAP-6A	3.40	2.00	2.15	2		29.24
ZAP-6B	3.40	2.00	2.15	1		14.62
ZAP-6C	3.40	2.00	2.15	1		14.62
FOSO ASCENSOR	3.50	3.00	2.15	1		22.58
VIGA DE CIMENTACION						
VG 101	10.51	0.40	0.4			1.68
VG 102	16.88	0.40	0.4			2.70
VG 103	10.19	0.40	0.4			1.63
VG 104	11.73	0.40	0.4			1.88
VG 105	11.73	0.40	0.4			1.88
VG 106	7.79	0.40	0.4			1.25
VG 107	7.79	0.40	0.4			1.25
VG 108	7.99	0.40	0.4			1.28
VG 109	7.99	0.40	0.4			1.28
VG 110	22.49	0.40	0.4			3.60
VG 111	4.38	0.20	0.4			0.35
VG 112	23.10	0.40	0.4			3.70
VG 113	21.80	0.40	0.4			3.49
VG 114	53.81	0.40	0.4			8.61
VG 115	18.87	0.20	0.4			1.51
VG 116	6.47	0.20	0.4			0.52
VG 117	27.35	0.20	0.4			2.19
VG 118	23.10	0.40	0.4			3.70
VG 119	4.38	0.40	0.4			0.70
GARITA	2.20	0.30				0.66

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ





CANTIDAD		**847.86**
ITEM	**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION**
UNIDAD		**m³**
2.01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion	

TANQUE DE ALMACENAMIENTO	**7.1**	**9.1**	**3.3**	**1**		**213.21**
						847.86

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025

OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION		UNIDAD	m³	
2.01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion					

REGISTRO FOTOGRÁFICO













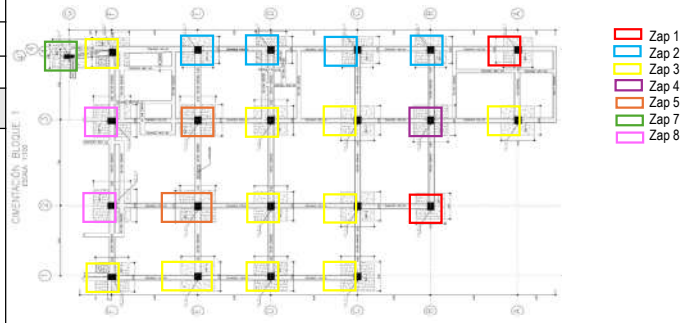

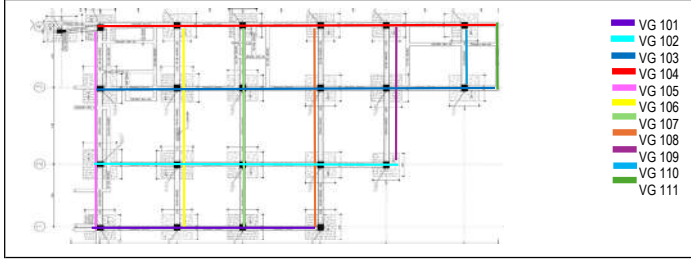



CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION		UNIDAD	m³
2.01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion				











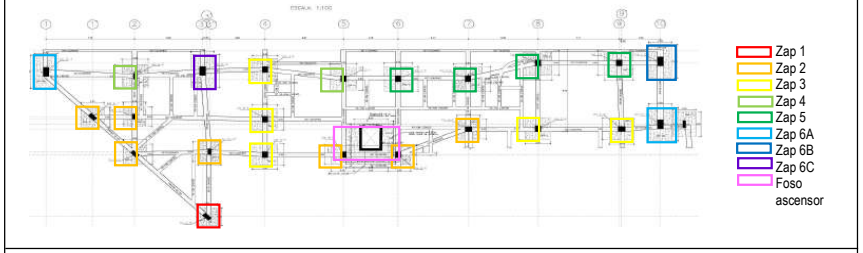

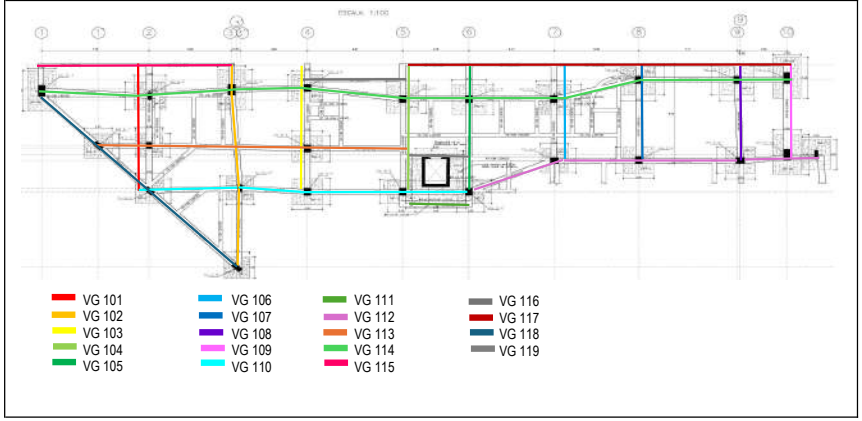


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION		UNIDAD	m³
2.01	Excavación en material comun para zapatas y Cimentacion				

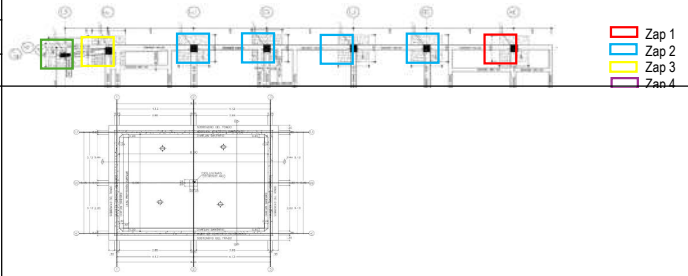

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	156.26
ITEM	2 — **MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION**	**UNIDAD**	m³
2.02	Mejoramiento en Suelo Cemento Compactado		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	FACTOR COMPACTACION	TOTAL ACUMULADO
ZAPATAS						
BLOQUE 1						
ZAP-1	2.20	2.20	0.5	2	1.25	6.05
ZAP-2	2.30	2.30	0.5	4	1.25	13.23
ZAP-3	2.50	2.50	0.5	10	1.25	39.06
ZAP-4	2.60	2.60	0.5	1	1.25	4.23
ZAP-5	2.70	2.70	0.5	2	1.25	9.11
ZAP-7	1.20	1.20	0.5	1	1.25	0.90
ZAP-8	2.80	2.80	0.5	2	1.25	9.80
BLOQUE 2						
ZAP-1	1.80	1.80	0.5	1	1.25	2.03
ZAP-2	2.00	2.00	0.5	7	1.25	17.50
ZAP-3	2.20	2.20	0.5	5	1.25	15.13
ZAP-4	2.30	2.30	0.5	2	1.25	6.61
ZAP-5	2.50	2.50	0.5	4	1.25	15.63
ZAP-6A	3.40	2.00	0.5	2	1.25	8.50
ZAP-6B	3.40	2.00	0.5	1	1.25	4.25
ZAP-6C	3.40	2.00	0.5	1	1.25	4.25
						156.26

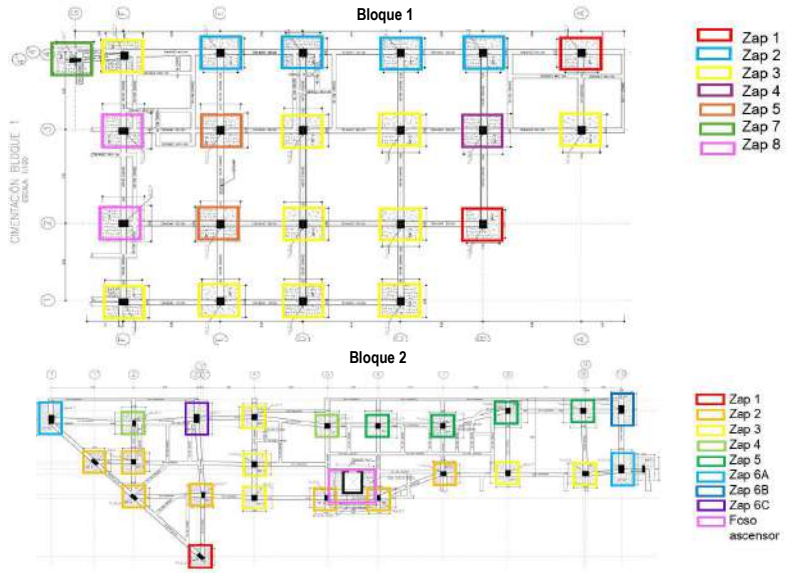

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025

OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION		UNIDAD	m³
2.02	Mejoramiento en Suelo Cemento Compactado				

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**518.43**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 1						
ZAPATAS						
ZAP-1	**2.20**	**2.20**		**2**		**9.68**
ZAP-2	**2.30**	**2.30**		**4**		**21.16**
ZAP-3	**2.50**	**2.50**		**10**		**62.50**
ZAP-4	**2.60**	**2.60**		**1**		**6.76**
ZAP-5	**2.70**	**2.70**		**2**		**14.58**
ZAP-7	**1.20**	**1.20**		**1**		**1.44**
ZAP-8	**2.80**	**2.80**		**2**		**15.68**
VIGAS DE CIMENTACION						
VG 101	**18.55**	**0.40**				**7.42**
VG 102	**24.07**	**0.40**				**9.63**
VG 103	**33.53**	**0.40**				**13.41**
VG 104	**33.53**	**0.40**				**13.41**
VG 105	**19.44**	**0.40**				**7.78**
VG 106	**19.44**	**0.40**				**7.78**
VG 107	**19.44**	**0.40**				**7.78**
VG 108	**19.44**	**0.40**				**7.78**
VG 109	**13.41**	**0.40**				**5.36**
VG 110	**6.03**	**0.40**				**2.41**
VG 111	**6.03**	**0.3**				**1.81**

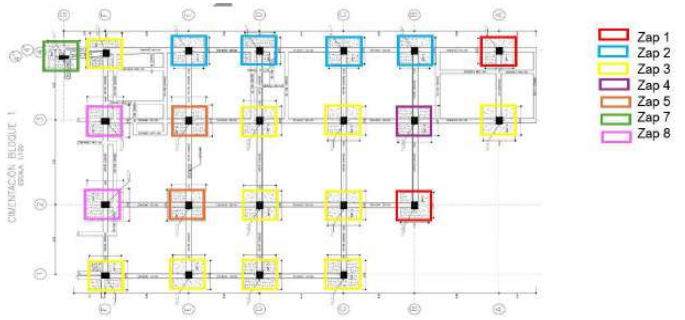

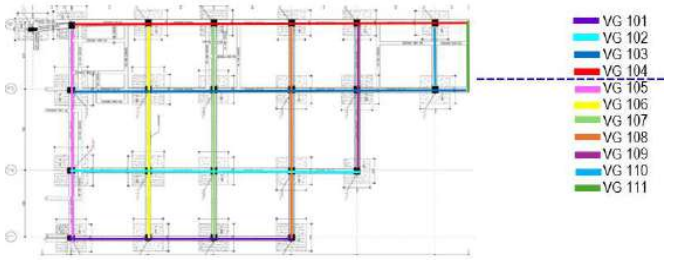

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**518.43**		
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m²**
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
ZAPATAS						
ZAP-1	1.80	1.80		1		3.24
ZAP-2	2.00	2.00		7		28.00
ZAP-3	2.20	2.20		5		24.20
ZAP-4	2.30	2.30		2		10.58
ZAP-5	2.50	2.50		4		25.00
ZAP-6A	3.40	2.00		2		13.60
ZAP-6B	3.40	2.00		1		6.80
ZAP-6C	3.40	2.00		1		6.80
FOSO ASCENSOR	3.50	3.00		1		10.50
VIGAS DE CIMENTACION						
VG 101	10.51	0.40				4.20
VG 102	16.88	0.40				6.75
VG 103	10.19	0.40				4.08
VG 104	11.73	0.40				4.69
VG 105	11.73	0.40				4.69
VG 106	7.79	0.40				3.12
VG 107	7.79	0.40				3.12
VG 108	7.99	0.40				3.20
VG 109	7.99	0.40				3.20
VG 110	22.49	0.40				9.00
VG 111	4.38	0.20				0.88
VG 112	23.10	0.40				9.24





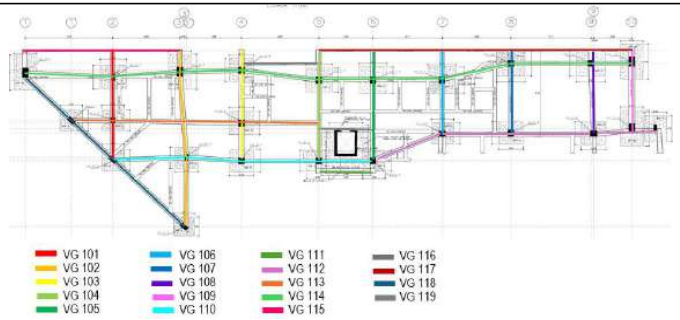

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**518.43**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
VG 113	**21.80**	**0.40**				**8.72**
VG 114	**53.81**	**0.40**				**21.52**
VG 115	**18.87**	**0.20**				**3.77**
VG 116	**6.47**	**0.20**				**1.29**
VG 117	**27.35**	**0.20**				**5.47**
VG 118	**23.10**	**0.40**				**9.24**
VG 119	**4.38**	**0.40**				**1.75**
GARITA						**2.20**
MUROS INTERMEDIOS						
MUROS - BLOQUE 2	**38.88**	**0.3**				**11.66**



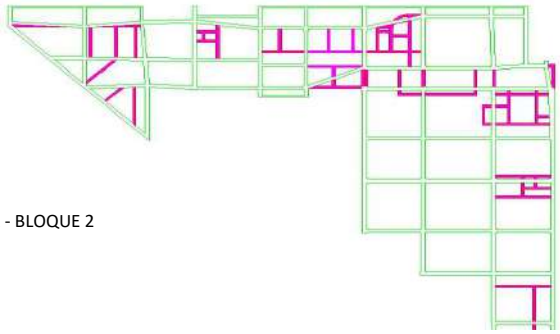

PISO 1 - BLOQUE 2

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**518.43**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO						
BASE DEL TANQUE	**8.25**	**6.25**		**1**		**51.56**

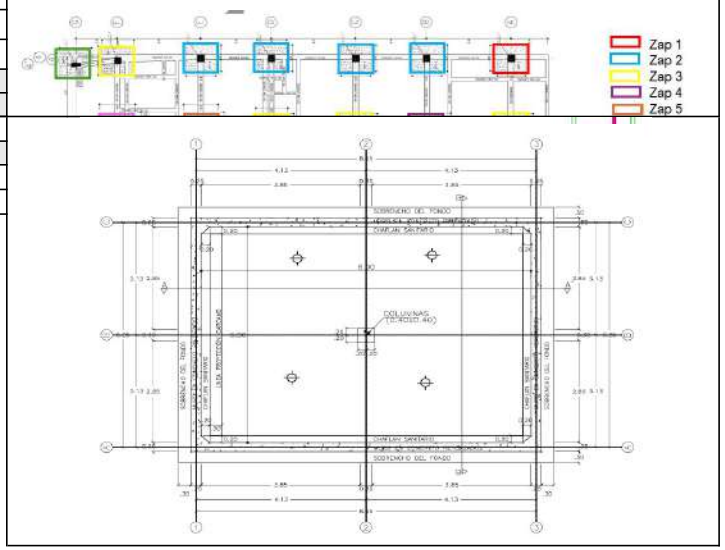

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**518.43**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
						518.43



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	m²	
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				


REGISTRO FOTOGRÁFICO










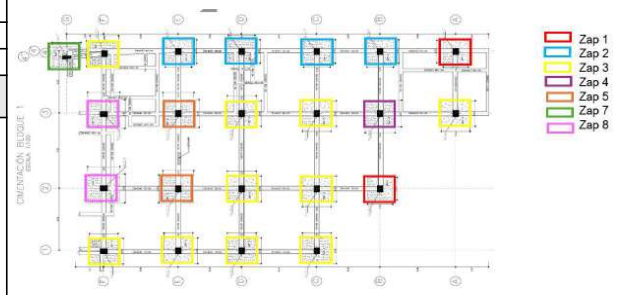



CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	m²	
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				


REGISTRO FOTOGRÁFICO















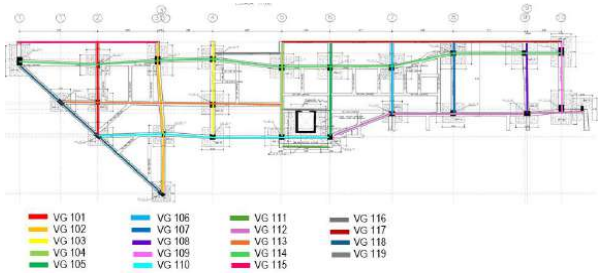


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	m²	
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







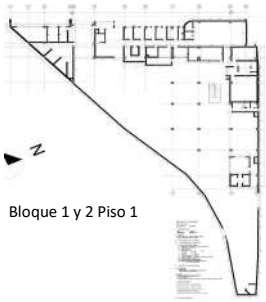

Bloque 1 y 2 Piso 1

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				




REGISTRO FOTOGRÁFICO









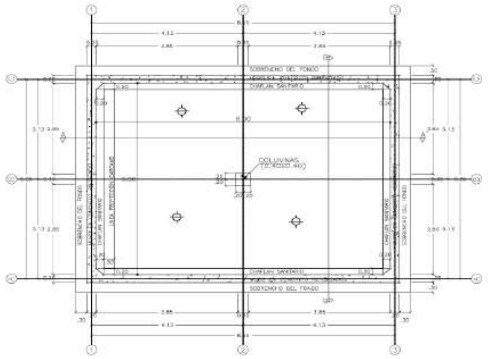

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**125.04**
ITEM	**3**	**Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI**		**UNIDAD**	**m³**
3.02	Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
ZAPATAS						
BLOQUE 1						
ZAP-1	2.20	2.20	0.5	2		4.84
ZAP-2	2.30	2.30	0.5	4		10.58
ZAP-3	2.50	2.50	0.5	10		31.25
ZAP-4	2.60	2.60	0.5	1		3.38
ZAP-5	2.70	2.70	0.5	2		7.29
ZAP-7	1.20	1.20	0.5	1		0.72
ZAP-8	2.80	2.80	0.5	2		7.84
BLOQUE 2						
ZAP-1	1.80	1.80	0.4	1		1.30
ZAP-2	2.00	2.00	0.4	7		11.20
ZAP-3	2.20	2.20	0.5	5		12.10
ZAP-4	2.30	2.30	0.5	2		5.29
ZAP-5	2.50	2.50	0.5	4		12.50
ZAP-6A	3.40	2.00	0.5	2		6.80
ZAP-6B	3.40	2.00	0.5	1		3.40
ZAP-6C	3.40	2.00	0.5	1		3.40
ASCENSOR	3	3.5	0.3	1		3.15
						125.04

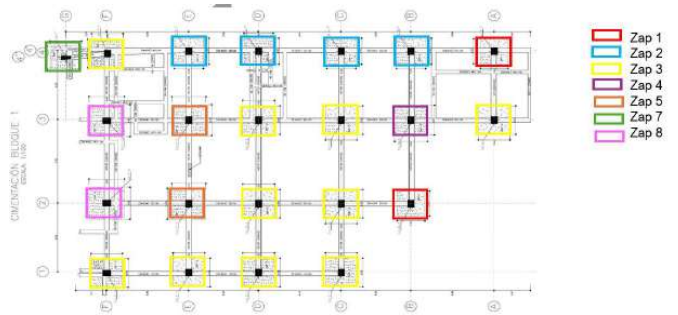



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
ZAPATAS							
BLOQUE N°1							
ZAP-1	2.60	12	1.559	4			194.56
ZAP-2	2.7	12	1.559	8			404.09
ZAP-3	2.9	16	1.559	20			1446.75
ZAP-4	3	18	1.559	2			168.37
ZAP-5	3.1	20	1.559	4			386.63
ZAP-6	3.2	22	1.559	4			439.01
ZAP-7	2.9	10	1.559	1			45.21
ZAP-7	2.4	12	1.559	1			44.90
ZAP-8	1.8	10	0.994	2			35.78
BLOQUE N°2							
ZAP-1	2.2	20	1.559	1			68.60
ZAP-2	2.4	22	1.559	7			576.21
ZAP-3	2.6	24	1.559	5			486.41
ZAP-4	2.7	24	1.559	2			202.05
ZAP-5	2.9	32	1.559	4			578.70
ZAP-6A	2.4	18	1.559	2			134.70
ZAP-6A	3.8	16	1.559	2			189.57
ZAP-6B	2.4	18	1.559	1			67.35
ZAP-6B	3.8	14	1.559	1			82.94
ZAP-6C	2.4	16	1.559	1			59.87
ZAP-6C	3.8	16	1.559	1			94.79
ZAP-7	3.3	20	0.994	1			65.60
ZAP-7	3.7	20	0.994	1			73.56
GARITA							
ZAP-1							
#4 EN B	2.2	10	0.994	3			65.60
#4 EN L	2.2	10	0.994	3			65.60
ZAP-2							
#4 EN B	2.2	10	0.994	1			21.87
#4 EN L	2.2	8	0.994	1			17.49
VIGAS DE CIMENTACIÓN							
BLOQUE N°1							
VG 101							
# 6	6.00	6.00	2.235	1			80.46
# 6	9.50	3.00	2.235	1			63.70
# 6	10.25	6.00	2.235	1			137.45
ESTRIBOS (#3)	1.40	120.00	0.560	1			94.08
VG 102				1			
# 6	5.40	2.00	2.235	1			24.14
# 6	7.00	2.00	2.235	1			31.29
# 6	9.00	8.00	2.235	1			160.92
# 6	6.40	2.00	2.235	1			28.61
ESTRIBOS (#3)	1.40	118.00	0.560	1			92.51
VG 103				1			
# 6	8.00	2.00	2.235	1			35.76
# 6	7.00	14.00	2.235	1			219.03
# 6	9.00	2.00	2.235	1			40.23

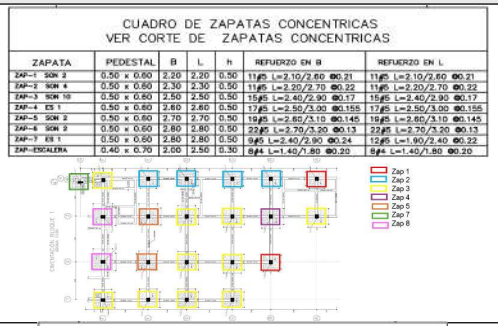

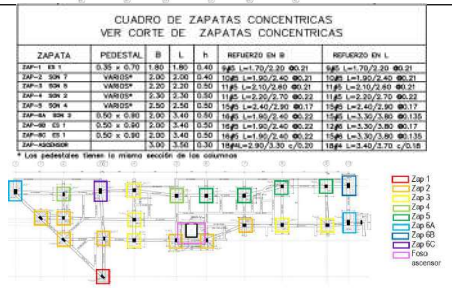



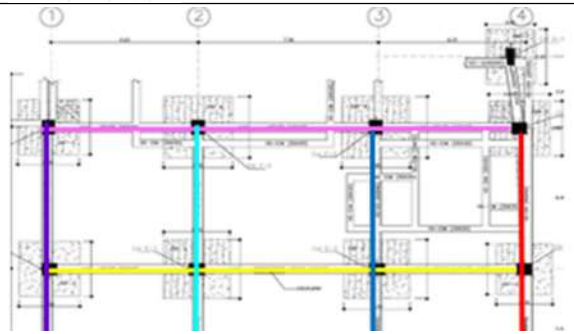

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**10/02/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	10.00	2.00	2.235	1			**44.70**
ESTRIBOS (#3)	1.40	194.00	0.560	1			**152.10**
VG 104							
# 6	8.00	2.00	2.235	1			**35.76**
# 6	7.00	14.00	2.235	1			**219.03**
# 6	9.00	2.00	2.235	1			**40.23**
# 6	10.00	2.00	2.235	1			**44.70**
ESTRIBOS (#3)	1.40	194.00	0.560	1			**152.10**
VG 105							
# 6	6.20	4.00	2.235	1			**55.43**
# 6	10.75	4.00	2.235	1			**96.11**
# 6	10.00	2.00	2.235	1			**44.70**
ESTRIBOS (#3)	1.40	107.00	0.560	1			**83.89**
VG 106							
# 6	6.20	4.00	2.235	1			**55.43**
# 6	10.75	4.00	2.235	1			**96.11**
# 6	10.00	2.00	2.235	1			**44.70**
ESTRIBOS (#3)	1.40	107.00	0.560	1			**83.89**
VG 107							
# 6	6.20	4.00	2.235	1			**55.43**
# 6	10.75	4.00	2.235	1			**96.11**
# 6	10.00	2.00	2.235	1			**44.70**
ESTRIBOS (#3)	1.40	107.00	0.560	1			**83.89**
VG 108							
# 6	6.20	4.00	2.235	1			**55.43**
# 6	10.75	4.00	2.235	1			**96.11**
# 6	10.00	2.00	2.235	1			**44.70**
ESTRIBOS (#3)	1.40	107.00	0.560	1			**83.89**
VG 109							
# 6	6.50	2.00	2.235	1			**29.06**
# 6	9.00	2.00	2.235	1			**40.23**
# 6	8.50	2.00	2.235	1			**38.00**
# 6	7.50	2.00	2.235	1			**33.53**
ESTRIBOS (#3)	1.40	78.00	0.560	1			**61.15**
VG 110							
# 6	7.15	2.00	2.235	1			**31.96**
# 6	6.55	2.00	2.235	1			**29.28**
ESTRIBOS (#3)	1.40	36.00	0.560	1			**28.22**
VG 111							
# 6	7.15	2.00	2.235	1			**31.96**
# 6	7.15	2.00	2.235	1			**31.96**
ESTRIBOS (#3)	1.20	30.00	0.560	1			**20.16**
BLOQUE N°2							
VG 101							
# 6	**4.15**	**2**	**2.235**	**1**			**18.55**
# 6	**5.00**	**2**	**2.235**	**1**			**22.35**
# 6	**4.60**	**2**	**2.235**	**1**			**20.56**
# 6	**7.00**	**2**	**2.235**	**1**			**31.29**
# 6	**5.50**	**2**	**2.235**	**1**			**24.59**
# 5	**4.00**	**2**	**1.552**	**1**			**12.42**

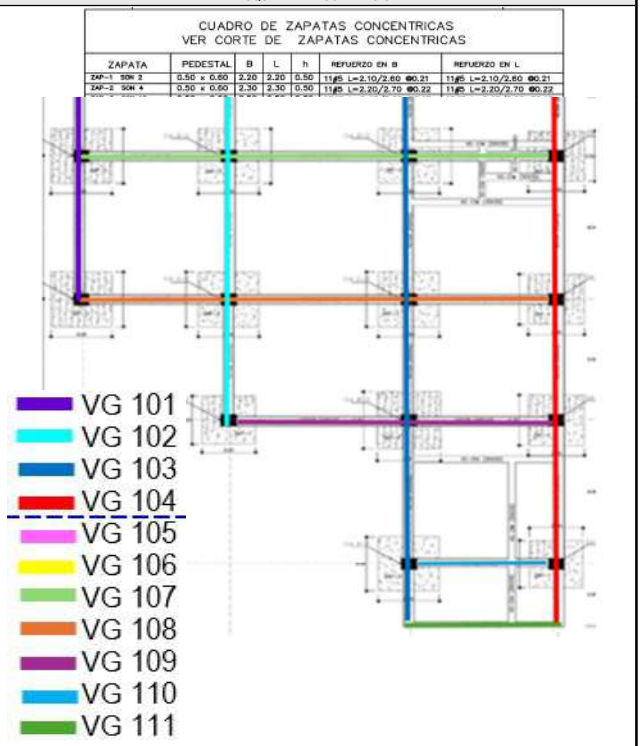

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
ESTRIBOS (#3)	1.40	72	0.560	1			56.45
VG 102							
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
# 6	4.50	2	2.235	1			20.12
# 6	4.30	2	2.235	1			19.22
# 6	6.20	2	2.235	1			27.71
# 6	5.00	2	2.235	1			22.35
# 6	5.60	2	2.235	1			25.03
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
# 4	4.00	1	0.994	1			3.98
ESTRIBOS (#3)	1.40	104	0.560	1			81.54
VG 103							
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	4.50	2	2.235	1			20.12
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
ESTRIBOS (#3)	1.40	72	0.560	1			56.45
VG 104							
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	5.65	2	2.235	1			25.26
# 5	9.00	2	1.552	1			27.94
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	7.65	2	2.235	1			34.20
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
ESTRIBOS (#3)	1.40	72	0.560	1			56.45
VG 105							
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	5.65	2	2.235	1			25.26
# 5	9.00	2	1.552	1			27.94
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	7.65	2	2.235	1			34.20
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
ESTRIBOS (#3)	1.40	72	0.560	1			56.45
VG 106							
# 6	8.85	2	2.235	1			39.56
# 6	8.85	2	2.235	1			39.56
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
ESTRIBOS (#3)	1.40	73	0.560	1			57.23
VG 107							
# 6	8.85	2	2.235	1			39.56
# 6	8.85	2	2.235	1			39.56
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
ESTRIBOS (#3)	1.40	52	0.560	1			40.77
VG 108							
# 6	8.85	2	2.235	1			39.56
# 6	8.85	2	2.235	1			39.56
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
ESTRIBOS (#3)	1.40	52	0.560	1			40.77

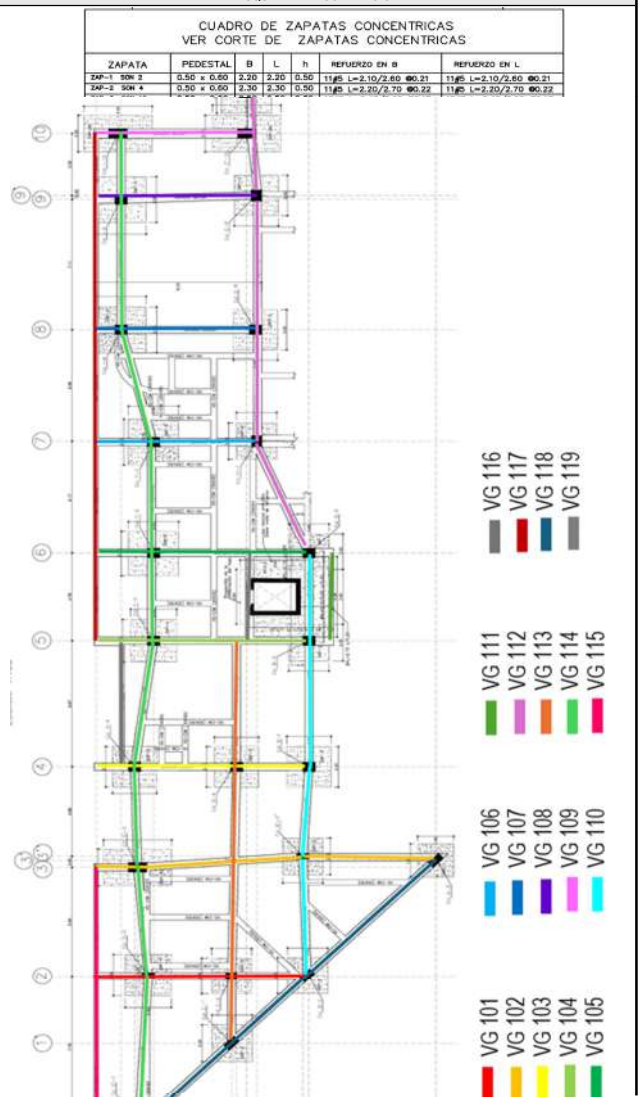

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 109							
# 6	8.50	2	2.235	1			38.00
# 6	8.50	2	2.235	1			38.00
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
ESTRIBOS (#3)	1.40	42	0.560	1			32.93
VG 110							
# 6	5.00	2	2.235	1			22.35
# 6	6.20	2	2.235	1			27.71
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	7.60	2	2.235	1			33.97
# 6	8.80	2	2.235	1			39.34
# 6	7.20	2	2.235	1			32.18
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	4.75	2	2.235	1			21.23
# 5	4.00	1	1.552	1			6.21
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
ESTRIBOS (#3)	1.40	146	0.560	1			114.46
VG 111							
# 6	5.70	2	2.235	1			25.48
# 6	5.70	2	2.235	1			25.48
ESTRIBOS (#3)	1.00	22	0.560	1			12.32
VG 112							
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	8.60	2	2.235	1			38.44
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	5.00	2	2.235	1			22.35
# 6	6.75	2	2.235	1			30.17
# 6	8.30	2	2.235	1			37.10
# 6	10.00	2	2.235	1			44.70
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
ESTRIBOS (#3)	1.40	163	0.560	1			127.79
VG 113							
# 6	6.20	2	2.235	1			27.71
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	7.70	2	2.235	1			34.42
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	4.50	2	2.235	1			20.12
# 5	4.00	1	1.552	1			6.21
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
# 4	4.00	1	0.994	1			3.98
ESTRIBOS (#3)	1.40	142	0.560	1			111.33
VG 114							
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76

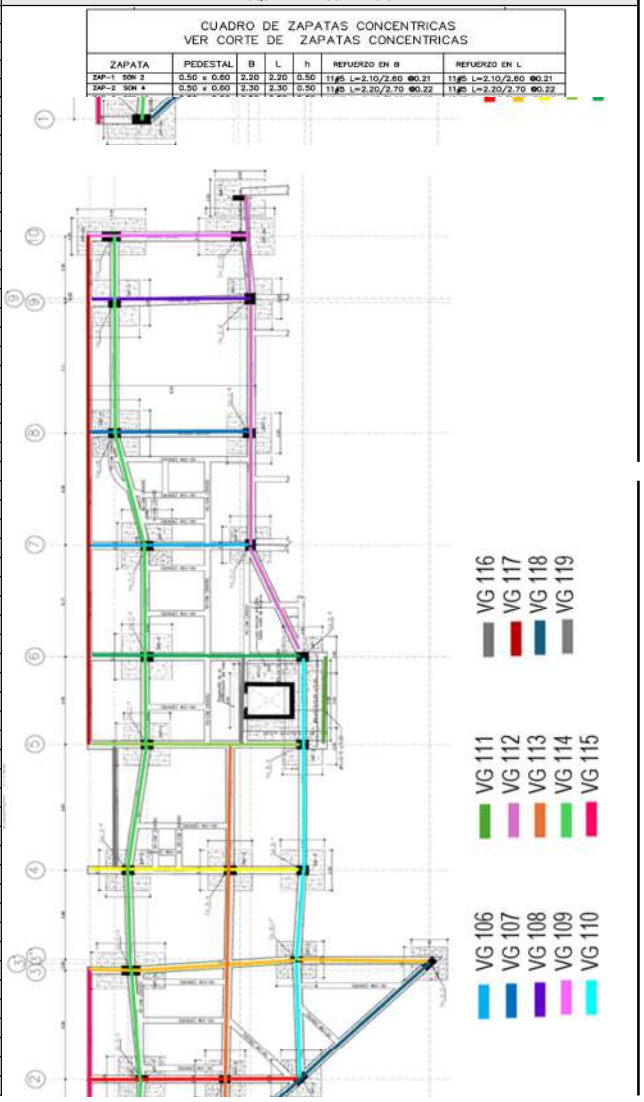

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

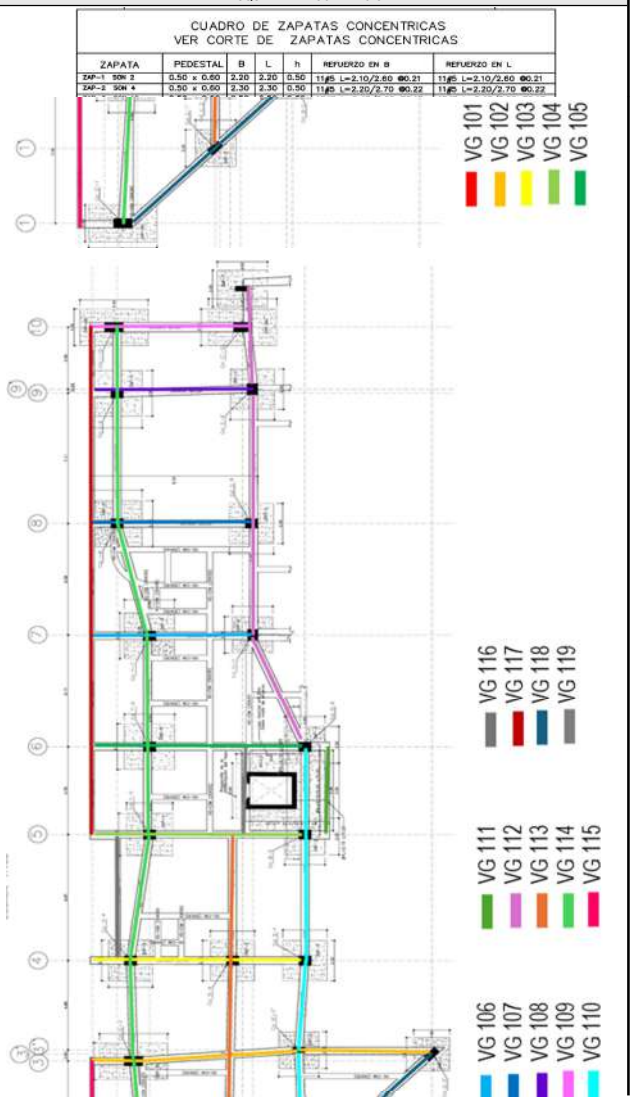

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	5.40	2	2.235	1			24.14
# 6	7.50	2	2.235	1			33.53
# 6	6.60	2	2.235	1			29.50
# 6	7.65	2	2.235	1			34.20
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 6	6.50	2	2.235	1			29.06
# 6	7.25	2	2.235	1			32.41
# 6	7.70	2	2.235	1			34.42
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	3.00	1	2.235	1			6.71
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
ESTRIBOS (#3)	1.40	338	0.560	1			264.99
VG 115							
# 5	7.70	2	1.552	1			23.90
# 5	7.70	2	1.552	1			23.90
# 5	12.00	2	1.552	1			37.25
# 5	3.50	2	1.552	1			10.86
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
ESTRIBOS (#3)	1.00	74	0.560	1			41.44
VG 116							
# 5	7.65	2	1.552	1			23.75
# 5	7.65	2	1.552	1			23.75
ESTRIBOS (#3)	1.00	42	0.560	1			23.52
VG 117							
# 5	6.50	2	1.552	1			20.18
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	6.00	2	1.552	1			18.62
# 5	5.30	2	1.552	1			16.45
# 5	8.50	2	1.552	1			26.38
# 5	7.50	2	1.552	1			23.28
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	8.00	2	1.552	1			24.83
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

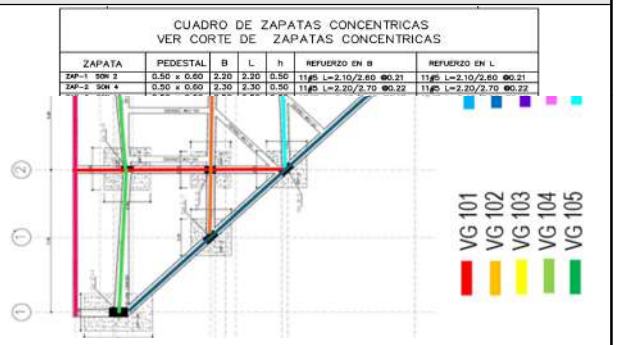

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
ESTRIBOS (#3)	1.00	178	0.560	1			99.68
VG 118							
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
# 6	5.00	2	2.235	1			22.35
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
ESTRIBOS (#3)	1.40	156	0.560	1			122.30
VG 119							
# 5	5.70	3	1.552	1			26.54
# 5	5.70	3	1.552	1			26.54
ESTRIBOS (#3)	1.40	22	0.560	1			17.25
GARITA							
VG 101							
# 5	1.85	2	1.552	2			11.48
# 5	1.85	2	1.552	2			11.48
ESTRIBOS (#3)	1.00	11	0.560	2			12.32
VG 102							
# 5	2.70	2	1.552	2			16.76
# 5	2.70	2	1.552	2			16.76
ESTRIBOS (#3)	0.98	20	0.560	2			21.95
PISO							
PLAZA DE FORMACIÓN							
MALLA ELECTROSOLDADA D63	1	40.38	14.100				569.36
COLUMNAS							
BLOQUE 1							
B-2							
#7	6.60	6	3.042	1			120.46
#7	6.00	6	3.042	1			109.51
#7	5.00	6	3.042	1			91.26
#6	5.20	4	2.235	1			46.49
#6	4.20	4	2.235	1			37.55
#6	8.50	6	2.235	1			113.99
ESTRIBOS (#3)	2.08	109	0.560	1			126.96
FLEJES (#3)	0.72	218	0.560	1			87.90
FLEJES (#3)	0.62	158	0.560	1			54.86
F-2;F-3							
#7	6.6	4	3.042	2			160.62
#7	6	4	3.042	2			146.02
#7	5	4	3.042	2			121.68
#7	5.2	4	3.042	2			126.55

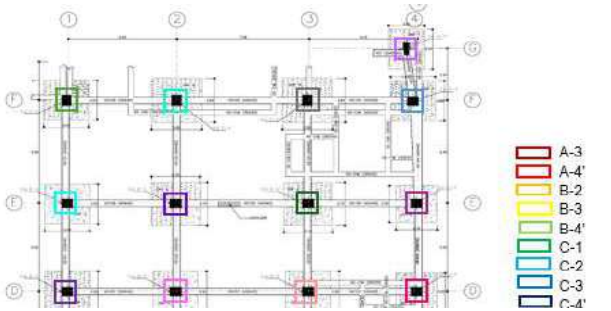

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	10/02/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
#7	4.2	4	3.042	2			102.21
#7	8.5	10	3.042	2			517.14
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	2			186.37
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	2			41.57
FLEJES (#3)	0.72	160	0.560	2			129.02
FLEJES (#3)	0.62	147	0.560	2			102.08
FLEJES (#3)	0.52	58	0.560	2			33.78
B-3							
#7	6.60	4	3.042	1			80.31
#7	6.00	4	3.042	1			73.01
#7	5.00	4	3.042	1			60.84
#7	5.20	4	3.042	1			63.27
#7	4.20	4	3.042	1			51.11
#7	8.50	4	3.042	1			103.43
#7	8.50	6	3.042	1			155.14
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	1			93.18
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	1			20.79
FLEJES (#3)	0.72	160	0.560	1			64.51
FLEJES (#3)	0.62	147	0.560	1			51.04
FLEJES (#3)	0.52	58	0.560	1			16.89
E-2;E-3							
#7	6.6	6	3.042	2			240.93
#7	6	6	3.042	2			219.02
#7	5	6	3.042	2			182.52
#7	8.5	4	3.042	2			206.86
#6	4.2	4	2.235	2			75.10
#6	8.5	6	2.235	2			227.97
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	2			186.37
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	2			41.57
FLEJES (#3)	0.72	240	0.560	2			193.54
FLEJES (#3)	0.62	98	0.560	2			68.05
FLEJES (#3)	0.52	29	0.560	2			16.89
F-1; F-4; E-1; E-4							
#7	6.6	4	3.042	4			321.24
#7	6	4	3.042	4			292.03
#7	5	4	3.042	4			243.36
#7	5.2	4	3.042	4			253.09
#7	4.2	4	3.042	4			204.42
#7	8.5	8	3.042	4			827.42
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	4			372.74
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	4			83.15
FLEJES (#3)	0.72	160	0.560	4			258.05
FLEJES (#3)	0.62	129	0.560	4			179.16
FLEJES (#3)	0.52	58	0.560	4			67.56
A-3; C-2; C-3; D-2; D-3							
#7	6.6	4	3.042	5			401.54
#7	6	4	3.042	5			365.04
#7	5	4	3.042	5			304.20
#7	4.2	4	3.042	5			255.53
#7	8.5	6	3.042	5			775.71
#6	8.5	4	2.235	5			379.95
#4	5.2	4	0.994	5			103.38

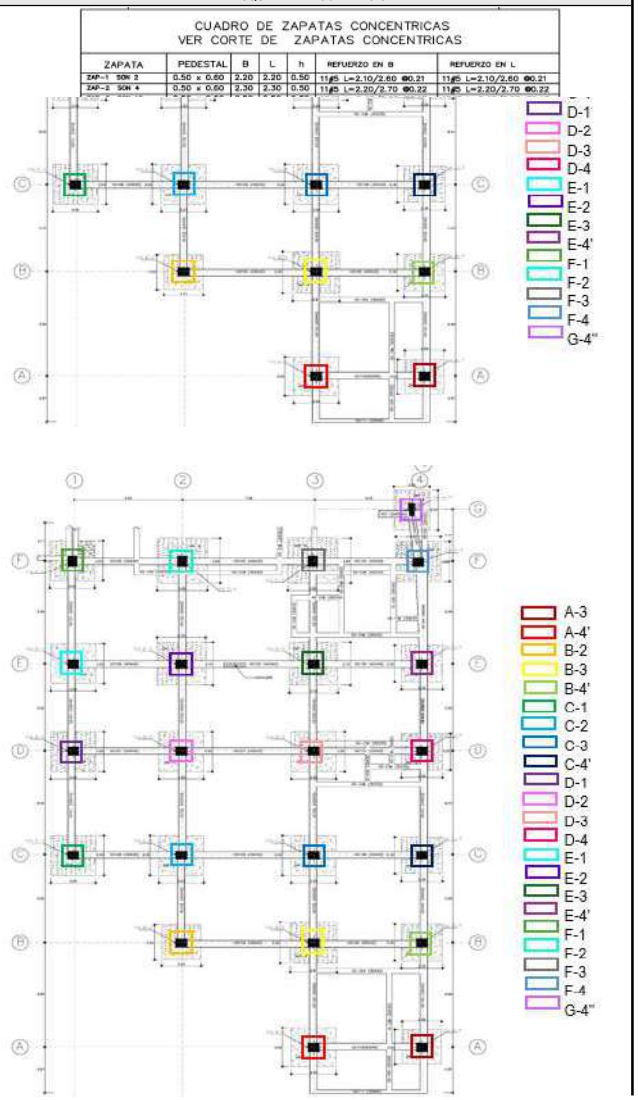

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	5			465.92
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	5			103.94
FLEJES (#3)	0.72	160	0.560	5			322.56
FLEJES (#3)	0.62	129	0.560	5			223.94
FLEJES (#3)	0.52	29	0.560	5			42.22
D-1							
#7	6.6	4	3.042	1			80.31
#7	6	4	3.042	1			73.01
#7	5	4	3.042	1			60.84
#7	5.2	4	3.042	1			63.27
#7	4.2	4	3.042	1			51.11
#7	8.5	6	3.042	1			155.14
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	1			93.18
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	1			20.79
FLEJES (#3)	0.72	160	0.560	1			64.51
FLEJES (#3)	0.62	129	0.560	1			44.79
FLEJES (#3)	0.52	58	0.560	1			16.89
A-4; B-4; C-1; C-4; D-4							
#7	6.6	4	3.042	5			401.54
#7	6	4	3.042	5			365.04
#7	5	4	3.042	5			304.20
#7	5.2	4	3.042	5			316.37
#7	4.2	4	3.042	5			255.53
#7	8.5	4	3.042	5			517.14
#5	8.5	2	1.552	5			131.92
ESTRIBOS (#3)	2.08	80	0.560	5			465.92
ESTRIBOS (#3)	1.28	29	0.560	5			103.94
FLEJES (#3)	0.72	160	0.560	5			322.56
FLEJES (#3)	0.62	129	0.560	5			223.94
FLEJES (#3)	0.52	58	0.560	5			84.45
G-4"							
#6	4.5	4	2.235	1			40.23
#6	9.5	4	2.235	1			84.93
#6	5.5	4	2.235	1			49.17
#5	9	8	1.552	1			111.74
ESTRIBOS (#3)	1.78	109	0.560	1			108.65
FLEJES (#3)	0.37	217	0.560	1			44.96
BLOQUE 2							
B-4; B-5; B-6; C-7; C-8; D-4; F-5; F-6; F-7; H-4							
#7	3.00	4	3.042	10			365.04
#7	9.50	4	3.042	10			1155.96
#7	5.50	4	3.042	10			669.24
#7	7.50	4	3.042	10			912.60
#7	9.00	4	3.042	10			1095.12
ESTRIBOS (#3)	2.08	109	0.560	10			1269.63
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	10			439.49
FLEJES (#3)	0.62	109	0.560	10			378.45
I-8							
#7	3.00	4	3.042	1			36.50
#7	9.50	4	3.042	1			115.60
#7	5.50	4	3.042	1			66.92

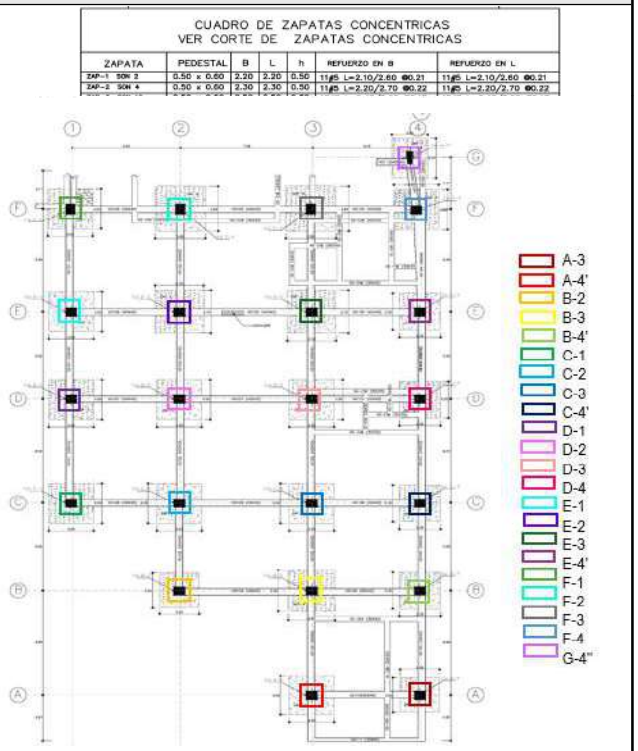



CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

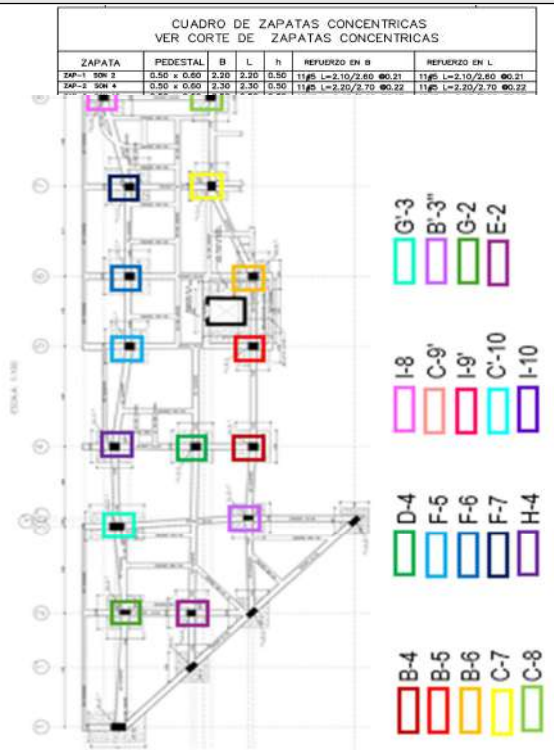



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
#7	7.50	4	3.042	1			91.26
#7	9.00	4	3.042	1			109.51
#7	8.00	4	3.042	1			97.34
ESTRIBOS (#3)	2.08	109	0.560	1			126.96
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	1			43.95
FLEJES (#3)	0.62	109	0.560	1			37.84
C-9							
#7	3.00	6	3.042	1			54.76
#7	9.50	6	3.042	1			173.39
#7	5.50	6	3.042	1			100.39
#7	7.50	6	3.042	1			136.89
#7	9.00	6	3.042	1			164.27
ESTRIBOS (#3)	2.08	109	0.560	1			126.96
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	1			43.95
FLEJES (#3)	0.62	32	0.560	1			11.11
I-9							
#7	3.00	4	3.042	1			36.50
#7	9.50	4	3.042	1			115.60
#7	5.50	4	3.042	1			66.92
#7	8.00	4	3.975	1			127.20
#7	7.50	4	3.042	1			91.26
#7	9.00	4	3.042	1			109.51
#7	12.00	4	3.042	1			146.02
ESTRIBOS (#3)	2.08	109	0.560	1			126.96
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	1			43.95
FLEJES (#3)	0.62	285	0.560	1			98.95
C-10; I-10							
#7	3.00	4	3.042	2			73.01
#7	9.50	4	3.042	2			231.19
#7	5.50	4	3.042	2			133.85
#7	7.50	6	3.042	2			273.78
#7	9.00	6	3.042	2			328.54
#7	8.00	6	3.042	2			292.03
ESTRIBOS (#3)	2.68	109	0.560	2			327.17
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	2			87.90
FLEJES (#3)	0.62	327	0.560	2			227.07
G-3							
#7	3	6	3.042	1			54.76
#7	9.5	6	3.042	1			173.39
#7	5.5	6	3.042	1			100.39
#7	7.5	6	3.042	1			136.89
#7	9	6	3.042	1			164.27
ESTRIBOS (#3)	2.68	109	0.560	1			163.59
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	1			43.95
FLEJES (#3)	0.62	327	0.560	1			113.53
B-3							
#8	12.00	4	3.975	1			190.80
#7	3.00	3	3.042	1			27.38
#7	9.50	3	3.042	1			86.70
#7	5.50	3	3.042	1			50.19
#7	7.50	3	3.042	1			68.45
#7	9.00	3	3.042	1			82.13

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3 — CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

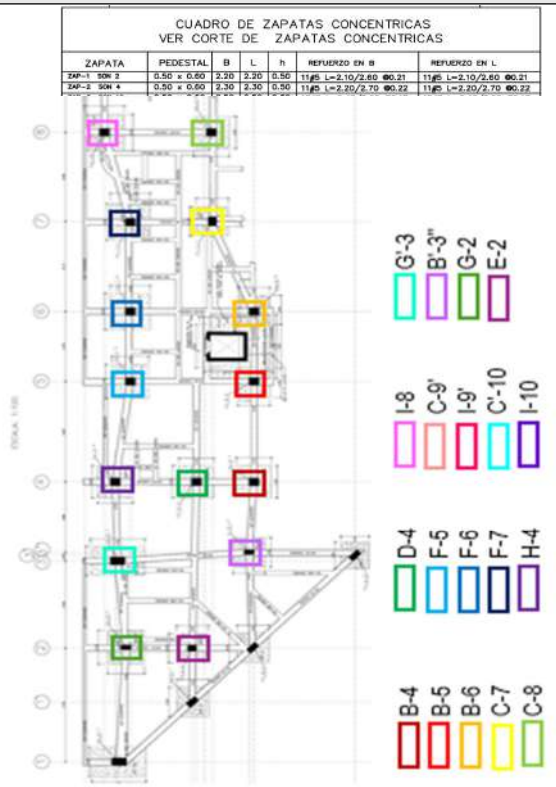

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
#7	12.00	4	3.042	1			146.02
ESTRIBOS (#3)	1.68	109	0.560	1			102.55
FLEJES (#3)	0.72	109	0.560	1			43.95
FLEJES (#3)	0.62	285	0.560	1			98.95
G-2							
#8	5.00	6	3.975	1			119.25
#8	7.50	6	3.975	2			357.75
ESTRIBOS (#3)	1.98	49	0.560	2			108.66
ESTRIBOS (#3)	1.68	34	0.560	1			31.99
FLEJES (#3)	0.72	34	0.560	1			13.71
FLEJES (#3)	0.62	102	0.560	1			35.41
FLEJES (#3)	0.72	49	0.560	2			39.51
FLEJES (#3)	0.62	147	0.560	2			102.08
G-1							
#8	7.55	6	3.975	1			180.07
#8	5.50	6	3.975	1			131.18
#6	3.80	10	2.235	1			84.93
#6	9.00	10	2.235	1			201.15
ESTRIBOS (#3)	2.68	80	0.560	1			120.06
FLEJES (#3)	0.72	80	0.560	1			32.26
FLEJES (#3)	0.62	160	0.560	1			55.55
A-3; E-1							
#7	7.55	4	3.042	2			183.74
#7	5.50	4	3.042	2			133.85
#6	3.80	4	2.235	2			67.94
#6	9.00	4	3.042	2			219.02
ESTRIBOS (#3)	1.98	80	0.560	2			177.41
FLEJES (#3)	0.47	160	0.560	2			84.22
B-2							
#7	7.55	6	3.042	1			137.80
#7	5.50	6	3.042	1			100.39
#7	3.80	8	2.235	1			67.94
#7	9.00	8	3.042	1			219.02
ESTRIBOS (#3)	1.98	80	0.560	1			88.70
FLEJES (#3)	0.47	320	0.560	1			84.22
E-2							
#7	7.55	7	3.042	1			160.77
#7	5.50	7	3.042	1			117.12
#7	3.80	7	2.235	1			59.45
#7	9.00	7	3.042	1			191.65
ESTRIBOS (#3)	1.68	80	0.560	1			75.26
FLEJES (#3)	0.62	80	0.560	1			27.78
FLEJES (#3)	0.52	80	0.560	1			23.30
GARITA							
D2							
#5	5.60	8	1.552	1			69.53
#5	5.60	8	1.552	1			69.53
#3	2.28	41	0.560	1			52.35
ESTRIBOS (#3)	0.32	246	0.560	1			44.08
B1							
#5	6.35	6	1.552	1			59.13

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
#5	2.85	6	1.552	1			26.54
#5	4.35	6	1.552	1			40.51
#5	7.85	6	1.552	1			73.10
#3	2.28	71	0.560	1			90.65
ESTRIBOS (#3)	0.32	284	0.560	1			50.89
B3							
#5	6.35	6	1.552	1			59.13
#5	2.85	6	1.552	1			26.54
#5	4.35	6	1.552	1			40.51
#5	7.85	6	6.350	1			299.09
#3	2.28	71	2.850	1			461.36
ESTRIBOS (#3)	0.32	284	4.350	1			395.33
A2			7.850				
#5	6.35	6	1.552	1			59.13
#5	2.85	6	1.552	1			26.54
#5	4.35	6	1.552	1			40.51
#5	7.85	6	1.552	1			73.10
#3	2.28	67	0.560	1			85.55
ESTRIBOS (#3)	0.32	201	0.560	1			36.02
VIGAS AÉREAS							
BLOQUE 1							
PISO 2 Y 3							
VG 201 y VG 301							
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	5.00	2	3.975	2			79.50
# 7	6.00	2	3.042	2			73.01
# 6	6.00	2	2.235	2			53.64
# 6	8.20	2	2.235	2			73.31
# 7	6.00	2	3.042	2			73.01
# 6	7.00	2	2.235	2			62.58
# 6	7.00	2	2.235	2			62.58
# 6	7.50	2	2.235	2			67.05
# 6	4.80	2	2.235	2			42.91
# 5	8.00	1	1.552	2			24.83
# 5	7.00	1	1.552	2			21.73
# 5	7.00	1	1.552	2			21.73
ESTRIBOS (#3)	1.48	136	0.560	2			225.43
VG 202 y VG 302							
# 8	8.00	2	3.975	2			127.20
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	5.00	2	3.975	2			79.50
# 7	9.40	2	3.042	2			114.38
# 6	7.00	2	2.235	2			62.58
# 6	7.00	2	2.235	2			62.58
# 7	7.30	2	3.042	2			88.83
# 6	8.00	2	2.235	2			71.52
# 6	10.30	2	2.235	2			92.08
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34

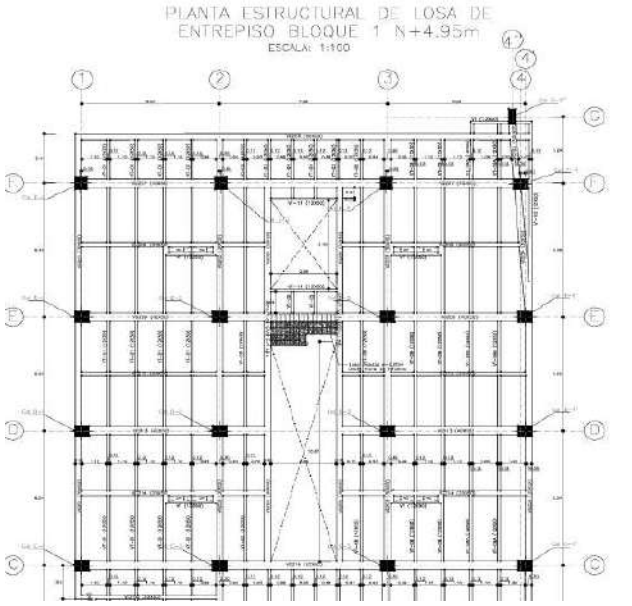

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	144,049.85		
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

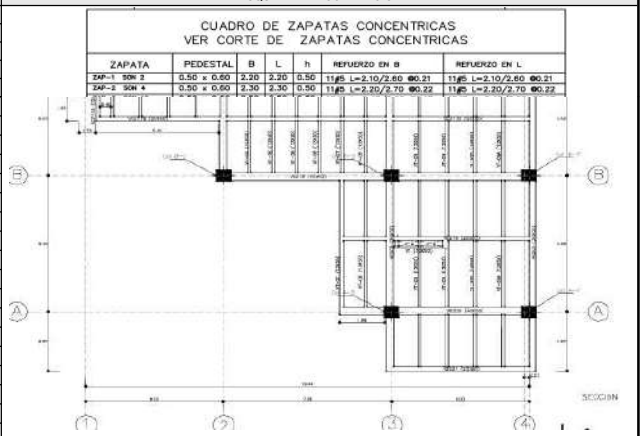

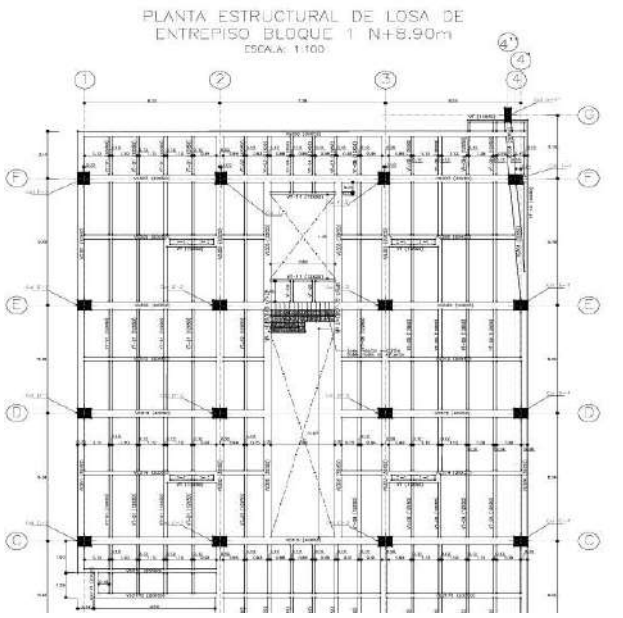

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 5	5.15	1	1.552	2			15.99
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 5	7.00	1	1.552	2			21.73
# 5	8.50	1	1.552	2			26.38
ESTRIBOS (#3)	1.48	169	0.560	2			280.13
VG 203 y VG 303							
# 8	6.00	2	3.975	2			95.40
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	4.00	2	3.975	2			63.60
# 8	5.00	2	3.975	2			79.50
# 7	7.20	2	3.042	2			87.61
# 6	12.00	2	2.235	2			107.28
# 6	7.80	2	2.235	2			69.73
# 6	8.00	2	2.235	2			71.52
# 7	6.00	2	3.042	2			73.01
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 4	9.00	1	0.994	2			17.89
# 4	10.00	1	0.994	2			19.88
# 5	8.00	1	1.552	2			24.83
# 6	9.00	2	2.235	2			80.46
# 6	12.00	2	2.235	2			107.28
# 6	7.60	2	2.235	2			67.94
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34
ESTRIBOS (#3)	1.48	218	0.560	2			361.36
VG 204 y VG 304							
# 8	6.00	2	3.975	2			95.40
# 7	4.00	2	3.042	2			48.67
# 7	4.00	2	3.042	2			48.67
# 7	4.00	2	3.042	2			48.67
# 7	4.00	2	3.042	2			48.67
# 7	6.00	3	3.042	2			109.51
# 7	7.50	2	3.042	2			91.26
# 6	12.00	2	2.235	2			107.28
# 6	12.00	2	2.235	2			107.28
# 7	9.60	2	3.042	2			116.81
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 4	9.00	1	0.994	2			17.89
# 4	10.00	1	0.994	2			19.88
# 5	9.00	2	1.552	2			55.87
# 6	9.00	2	2.235	2			80.46
# 6	12.00	2	2.235	2			107.28
# 6	7.85	2	2.235	2			70.18
# 6	12.00	2	2.235	2			107.28
# 4	6.00	2	0.994	2			23.86
ESTRIBOS (#3)	1.48	234	0.560	2			387.88
VG 205 y VG 305							
# 5	4.50	3	1.552	4			83.81
# 5	12.00	3	1.552	4			223.49
# 5	4.50	3	1.552	4			83.81
# 5	8.50	2	1.552	4			105.54

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	7.00	2	2.235	4			125.16
# 5	6.00	2	1.552	4			74.50
# 4	5.50	1	0.994	4			21.87
# 7	10.50	1	3.042	4			127.76
# 4	6.00	1	0.994	4			23.86
ESTRIBOS (#3)	1.48	118	0.560	4			391.19
VG 206 y VG 306							
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34
# 5	8.00	2	1.552	2			49.66
# 5	6.00	2	1.552	2			37.25
# 5	8.00	2	1.552	2			49.66
# 4	5.50	1	0.994	2			10.93
# 4	11.00	1	0.994	2			21.87
# 4	5.50	1	0.994	2			10.93
ESTRIBOS (#3)	1.48	122	0.560	2			202.23
VG 207 y VG 307							
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 8	4.00	4	3.975	2			127.20
# 8	4.00	4	3.975	2			127.20
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 7	11.00	2	3.042	2			133.85
# 7	11.00	2	3.042	2			133.85
# 7	8.50	2	3.042	2			103.43
# 7	6.00	2	3.042	2			73.01
# 7	8.15	2	3.042	2			99.17
# 6	5.80	2	2.235	2			51.85
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34
# 6	5.80	2	2.235	2			51.85
ESTRIBOS (#3)	1.68	118	0.560	2			222.03
FLEJES (#3)	0.62	85	0.560	2			59.02
VG 208 y VG 308							
# 5	9.08	2	1.552	4			112.74
# 5	4.50	1	1.552	4			27.94
# 5	9.08	2	1.552	4			112.74
# 4	4.00	1	0.994	4			15.90
ESTRIBOS (#3)	1.28	44	0.560	4			126.16
VG 209 y VG 309							
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 8	11.00	2	3.975	2			174.90
# 8	11.00	3	3.975	2			262.35
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 7	11.00	2	3.042	2			133.85
# 7	11.00	2	3.042	2			133.85
# 7	8.50	2	3.042	2			103.43
# 7	6.00	2	3.042	2			73.01
# 7	8.15	2	3.042	2			99.17
# 6	5.80	2	2.235	2			51.85
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34
# 6	5.80	2	2.235	2			51.85
ESTRIBOS (#3)	1.68	121	0.560	2			227.67
FLEJES (#3)	0.62	102	0.560	2			70.83

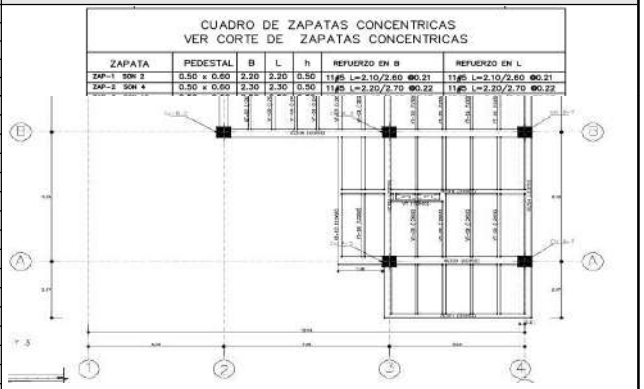

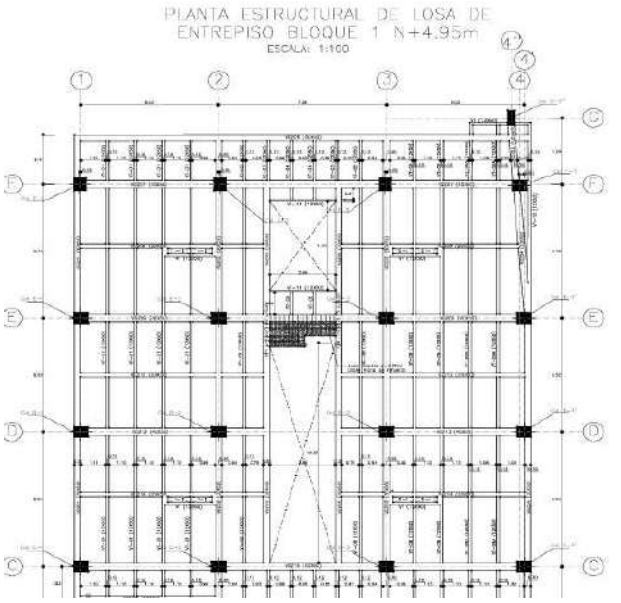

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

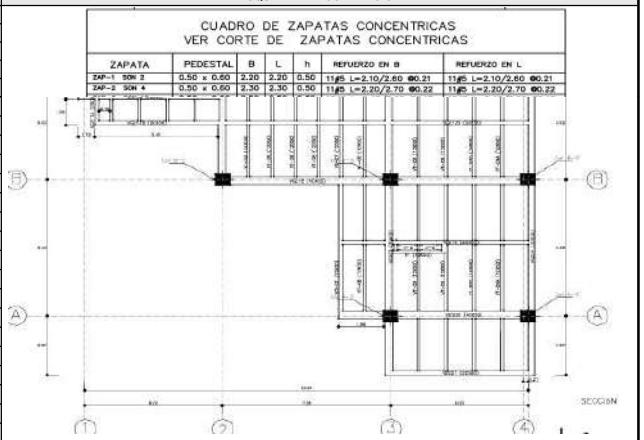

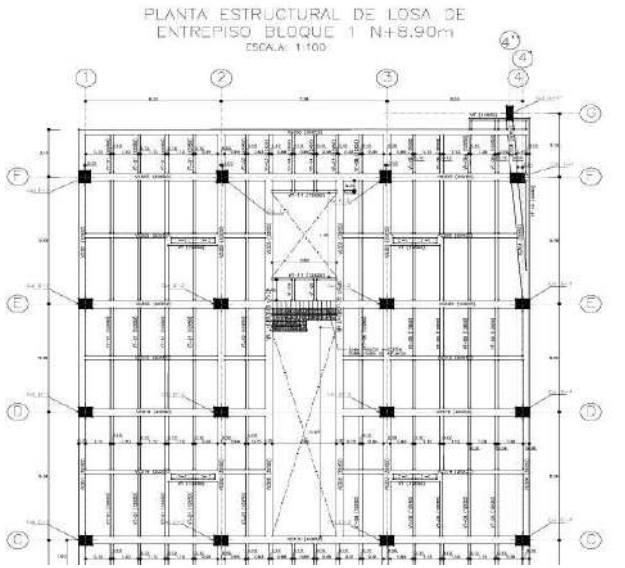

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 210 y VG 310							
# 6	3.70	3	2.235	2			49.62
# 6	3.70	3	2.235	2			49.62
ESTRIBOS (#3)	1.48	20	0.560	2			33.15
VG 211 y VG 311							
# 5	2.55	3	1.552	2			23.75
# 5	2.55	3	1.552	2			23.75
ESTRIBOS (#3)	1.48	10	0.560	2			16.58
VG 212 y VG 312							
# 5	9.10	2	1.552	4			112.99
# 5	4.50	1	1.552	4			27.94
# 5	9.10	2	1.552	4			112.99
# 4	9.10	1	0.994	4			36.18
ESTRIBOS (#3)	1.28	44	0.560	4			126.16
VG 213 y VG 313							
# 8	4.75	4	3.975	4			302.10
# 7	9.35	2	3.042	4			227.54
# 7	9.35	2	3.042	4			227.54
# 6	9.35	2	2.235	4			167.18
ESTRIBOS (#3)	1.68	51	0.560	4			191.92
FLEJES (#3)	0.62	26	0.560	4			36.11
VG 214 y VG 314							
# 5	9.08	2	1.552	4			112.74
# 5	4.50	1	1.552	4			27.94
# 5	9.08	2	1.552	4			112.74
# 4	4.00	1	0.994	4			15.90
ESTRIBOS (#3)	1.28	40	0.560	4			114.69
VG 215 y VG 315							
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 8	11.00	4	3.975	2			349.80
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 7	11.00	2	3.042	2			133.85
# 7	11.00	2	3.042	2			133.85
# 7	8.50	2	3.042	2			103.43
# 7	6.00	2	3.042	2			73.01
# 7	8.15	2	3.042	2			99.17
# 6	5.80	2	2.235	2			51.85
# 6	11.00	2	2.235	2			98.34
# 6	5.80	2	2.235	2			51.85
ESTRIBOS (#3)	1.68	117	0.560	2			220.15
FLEJES (#3)	0.62	98	0.560	2			68.05
VG 216 y VG 316							
# 5	6.90	2	1.552	2			42.84
# 5	6.90	2	1.552	2			42.84
ESTRIBOS (#3)	1.28	39	0.560	2			55.91
VG 217A y VG 317A							
# 5	1.85	2	1.552	2			11.48
# 5	1.85	2	1.552	2			11.48
ESTRIBOS (#3)	1.28	10	0.560	2			14.34
VG 217B y VG 317B							
# 6	4.00	1	2.235	2			17.88
# 4	4.00	1	0.994	2			7.95

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

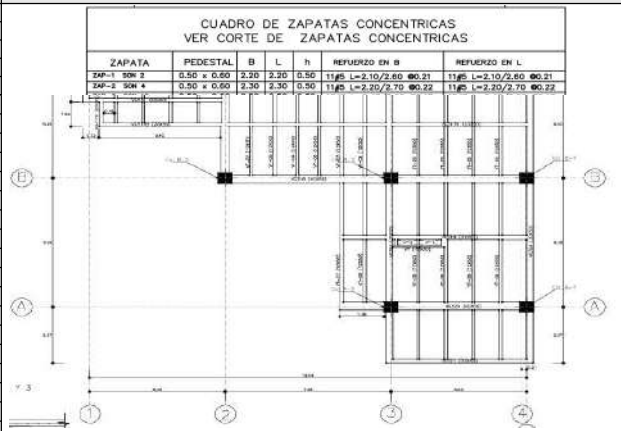

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 5	10.25	2	1.552	2			63.63
# 5	10.25	2	1.552	2			63.63
# 5	7.30	2	1.552	2			45.32
# 5	6.00	2	1.552	2			37.25
# 5	8.00	2	1.552	2			49.66
ESTRIBOS (#3)	1.28	105	0.560	2			150.53
VG 218 y VG 318							
# 8	5.00	3	3.975	2			119.25
# 7	3.00	3	3.042	2			54.76
# 7	9.00	2	3.042	2			109.51
# 7	10.00	2	3.042	2			121.68
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 6	10.00	2	2.235	2			89.40
# 6	5.50	2	2.235	2			49.17
# 5	7.00	2	1.552	2			43.46
# 7	8.80	2	3.042	2			107.08
ESTRIBOS (#3)	1.68	83	0.560	2			156.17
FLEJES (#3)	0.62	64	0.560	2			44.44
VG 219 y VG 319							
# 6	5.00	1	2.235	2			22.35
# 5	9.00	2	1.552	2			55.87
# 5	9.00	2	1.552	2			55.87
# 4	7.00	1	0.994	2			13.92
ESTRIBOS (#3)	1.28	40	0.560	2			57.34
VG 220 y VG 320							
# 8	5.00	3	3.975	2			119.25
# 8	5.00	2	3.975	2			79.50
# 8	3.00	4	3.975	2			95.40
# 7	9.19	2	3.042	2			111.82
# 7	9.20	4	3.042	2			223.89
ESTRIBOS (#3)	1.68	51	0.560	2			95.96
FLEJES (#3)	0.62	45	0.560	2			31.25
VG 221 y VG 321							
VG 221 y VG 321 # 5	6.95	2	1.552	2			43.15
VG 221 y VG 321 # 5	6.95	2	1.552	2			43.15
VG 221 y VG 321 # 3	1.28	40	0.560	2			57.34
CUBIERTA							
VG 401							
# 5	3.50	1	1.552	1			5.43
# 4	10.00	1	0.994	1			9.94
# 4	7.50	1	0.994	1			7.46
# 5	4.50	1	1.552	1			6.98
# 5	5.60	2	1.552	1			17.38
# 5	6.00	2	1.552	1			18.62
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	7.45	2	1.552	1			23.12
# 5	9.70	2	1.552	1			30.11
# 5	8.00	2	1.552	1			24.83
# 4	9.00	1	0.994	1			8.95
# 4	7.00	1	0.994	1			6.96

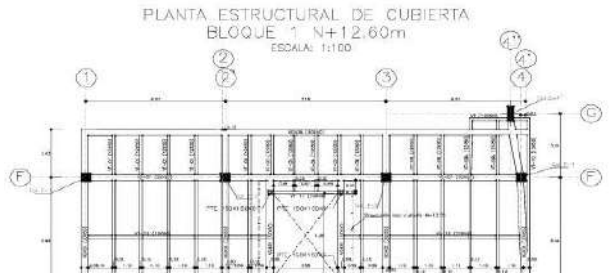

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 4	6.00	1	0.994	1			5.96
ESTRIBOS (#3)	1.48	148	0.560	1			122.66
VG 402							
# 6	4.20	2	2.235	1			18.77
# 4	12.00	1	0.994	1			11.93
# 4	7.00	1	0.994	1			6.96
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	9.00	2	1.552	1			27.94
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76
# 6	10.30	2	2.235	1			46.04
# 6	11.00	2	2.235	1			49.17
ESTRIBOS (#3)	1.48	172	0.560	1			142.55
VG 403							
# 5	6.00	2	1.552	1			18.62
# 5	5.00	2	1.552	1			15.52
# 6	7.00	2	2.235	1			31.29
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
# 6	8.60	2	2.235	1			38.44
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
# 6	7.60	2	2.235	1			33.97
# 6	11.00	2	2.235	1			49.17
ESTRIBOS (#3)	1.48	238	0.560	1			197.25
VG 404							
# 5	6.00	1	1.552	1			9.31
# 5	6.00	3	1.552	1			27.94
# 6	7.20	2	2.235	1			32.18
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
# 6	9.60	2	2.235	1			42.91
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
# 6	7.80	2	2.235	1			34.87
# 6	12.00	2	2.235	1			53.64
ESTRIBOS (#3)	1.48	234	0.560	1			193.94
VG 405							
# 5	4.50	2	1.552	2			27.94
# 5	12.00	2	1.552	2			74.50
# 5	4.50	2	1.552	2			27.94
# 5	6.00	2	1.552	2			37.25
# 5	9.50	2	1.552	2			58.98
# 5	6.00	2	1.552	2			37.25
ESTRIBOS (#3)	1.48	116	0.560	2			192.28
VG 406							
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	5.55	2	2.235	1			24.81
# 6	8.00	2	2.235	1			35.76

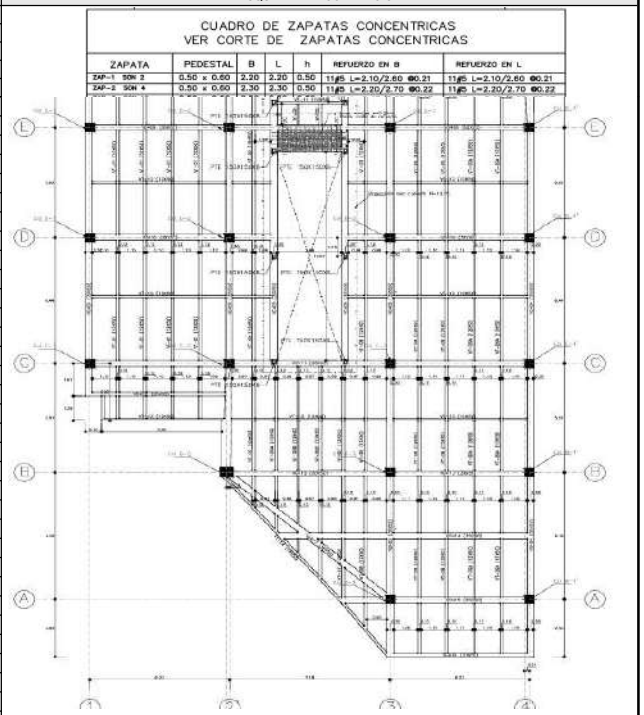



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
ESTRIBOS (#3)	1.48	125	0.560	1			103.60
VG 407							
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
# 6	11.00	2	2.235	1			49.17
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
ESTRIBOS (#3)	1.48	121	0.560	1			100.28
VG 408							
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 5	3.00	1	1.552	1			4.66
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
# 6	11.00	2	2.235	1			49.17
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
ESTRIBOS (#3)	1.48	119	0.560	1			98.63
VG 409							
# 5	3.58	2	1.552	1			11.11
# 5	3.60	2	1.552	1			11.17
ESTRIBOS (#3)	1.48	20	0.560	1			16.58
VG 410							
# 5	5.70	1	1.552	2			17.69
# 6	4.50	2	2.235	2			40.23
# 6	9.10	2	2.235	2			81.35
# 6	9.10	2	2.235	2			81.35
ESTRIBOS (#3)	1.48	52	0.560	2			86.20
VG 411							
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
# 5	4.00	2	1.552	1			12.42
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	10.80	2	2.235	1			48.28
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
# 6	11.00	2	2.235	1			49.17
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
ESTRIBOS (#3)	1.48	120	0.560	1			99.46
VG 412							
# 5	6.90	2	1.552	1			21.42
# 5	6.90	2	1.552	1			21.42
ESTRIBOS (#3)	1.28	38	0.560	1			27.24
VG 413							
# 6	3.00	2	2.235	1			13.41
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23

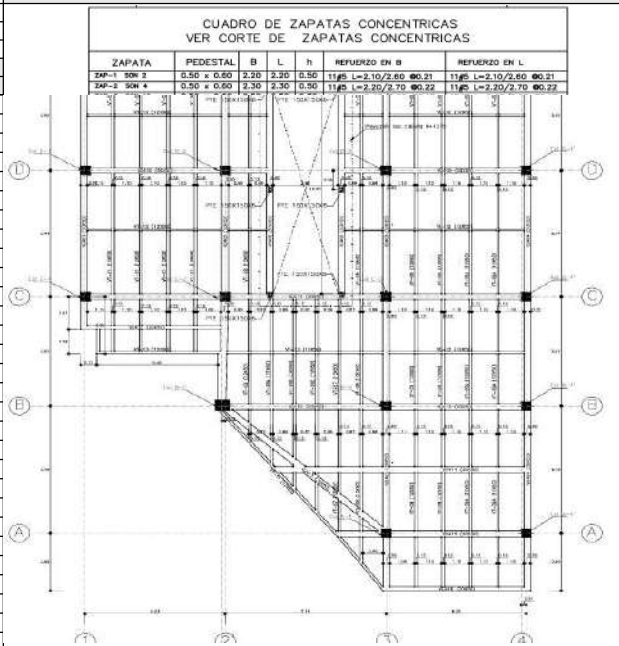



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	144,049.85		
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	
UNIDAD	Kg		
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

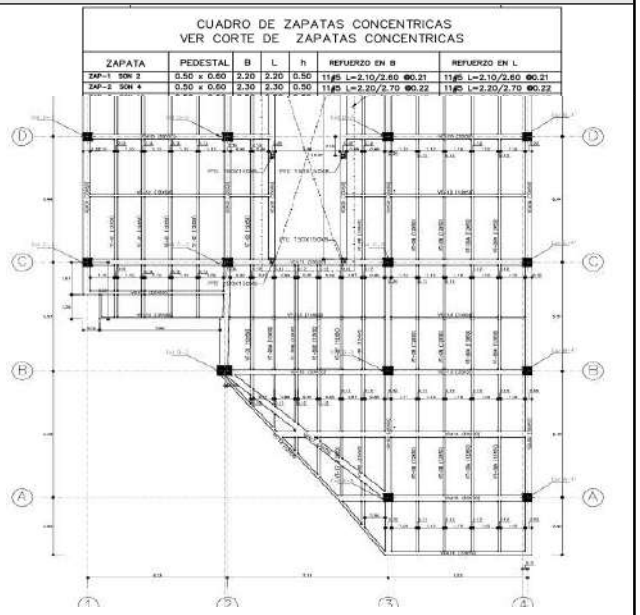

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	10.00	2	2.235	1			44.70
# 5	2.90	1	1.552	1			4.50
# 6	9.60	2	2.235	1			42.91
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
ESTRIBOS (#3)	1.48	82	0.560	1			67.96
VG 414							
# 6	7.30	2	2.235	1			32.63
# 6	7.30	2	2.235	1			32.63
# 6	7.30	2	2.235				
# 6	7.30	2	2.235	1			32.63
ESTRIBOS (#3)	1.48	74	0.560	1			61.33
VG 415							
# 7	5.30	2	3.042	1			32.25
# 5	5.00	1	1.552	1			7.76
# 6	9.15	2	2.235	1			40.90
# 6	9.15	2	2.235	1			40.90
ESTRIBOS (#3)	1.48	52	0.560	1			43.10
VG 416							
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
# 5	7.00	2	1.552	1			21.73
ESTRIBOS (#3)	1.28	40	0.560	1			28.67
VG 417							
# 5	3.00	2	1.552	1			9.31
# 5	3.00	2	1.552	1			9.31
# 6	10.50	2	2.235	1			46.94
# 6	10.50	2	2.235	1			46.94
ESTRIBOS (#3)	1.48	56	0.560	1			46.41
NERVIOS							
PISO 2 Y 3							
VT 01							
# 5	4.00	1	1.552	8			49.66
# 5	4.00	1	1.552	8			49.66
# 6	6.00	2	2.235	8			214.56
# 5	8.30	1	1.552	8			103.05
# 5	8.00	1	1.552	8			99.33
# 6	5.00	1	2.235	8			89.40
# 6	8.50	1	2.235	8			151.98
# 6	9.00	1	2.235	8			160.92
# 6	9.00	1	2.235	8			160.92
ESTRIBOS (#3)	0.62	143	0.560	8			397.20
VT 02							
# 4	4.00	1	0.994	2			7.95
# 5	4.00	1	1.552	2			12.42
# 6	4.00	1	2.235	2			17.88
# 6	9.20	1	2.235				
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	7.80	1	1.552	2			24.21
# 5	8.00	1	1.552	2			24.83
# 5	10.00	1	1.552	2			31.04

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**10/02/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**Kg**
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 5	11.00	1	1.552	2			34.14
# 5	7.00	1	1.552	2			21.73
# 4	4.00	1	0.994	2			7.95
ESTRIBOS (#3)	0.62	159	0.560	2			110.41
VT 03							
# 5	3.10	2	1.552	4			38.49
# 5	3.10	1	1.552	4			19.24
ESTRIBOS (#3)	0.62	14	0.560	4			19.44
VT 04							
# 6	3.85	1	2.235	4			34.42
# 5	3.75	1	1.552	4			23.28
ESTRIBOS (#3)	0.62	18	0.560	4			25.00
VT 05							
# 5	2.00	1	1.552	4			12.42
# 5	2.00	1	1.552	4			12.42
ESTRIBOS (#3)	0.62	8	0.560	4			11.11
VT 06							
# 5	6.40	1	1.552	6			59.60
# 5	6.40	1	1.552	6			59.60
ESTRIBOS (#3)	0.62	32	0.560	6			66.66
VT 07							
# 4	3.00	1	0.994	2			5.96
# 4	4.00	1	0.994	2			7.95
# 5	6.00	1	1.552	2			18.62
# 5	7.70	1	1.552	2			23.90
# 5	7.70	1	1.552	2			23.90
# 5	6.00	1	1.552	2			18.62
ESTRIBOS (#3)	0.62	70	0.560	2			48.61
VT 08							
# 5	3.00	1	1.552	2			9.31
# 5	4.00	1	1.552	2			12.42
# 5	4.00	1	1.552	2			12.42
# 4	4.00	1	0.994	2			7.95
# 6	5.00	1	2.235	2			22.35
# 5	10.00	1	1.552	2			31.04
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	10.00	1	1.552	2			31.04
# 5	7.80	1	1.552	2			24.21
# 6	12.00	1	2.235	2			53.64
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	11.70	1	1.552	2			36.32
# 5	7.00	1	1.552	2			21.73
# 5	4.00	1	1.552	2			12.42
ESTRIBOS (#3)	0.62	199	0.560	2			138.19
VT 09							
# 6	6.00	1	2.235	4			53.64
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 6	5.00	1	2.235	4			44.70
# 6	7.00	1	2.235	4			62.58
# 5	12.00	1	1.552	4			74.50
# 5	12.00	1	1.552	4			74.50
# 6	8.60	1	2.235	4			76.88
# 6	9.00	1	2.235	4			80.46
# 5	12.00	1	1.552	4			74.50
# 5	7.60	1	1.552	4			47.18
# 6	11.00	1	2.235	4			98.34
# 4	9.00	1	0.994	4			35.78
# 4	7.00	1	0.994	4			27.83
# 4	7.00	1	0.994	4			27.83
ESTRIBOS (#3)	0.62	217	0.560	4			301.37
VT 10							
# 6	10.25	1	2.235	2			45.82
# 6	10.25	1	2.235	2			45.82
# 6	5.00	1	2.235	2			22.35
ESTRIBOS (#3)	0.62	56	0.560	2			38.89
VT 11							
# 5	3.90	1	1.552	4			24.21
# 5	3.90	1	1.552	4			24.21
ESTRIBOS (#3)	0.62	20	0.560	4			27.78
VT 09A							
# 6	6.00	1	2.235	4			53.64
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 5	4.00	1	1.552	4			24.83
# 6	5.00	1	2.235	4			44.70
# 6	7.20	1	2.235	4			64.37
# 5	12.00	1	1.552	4			74.50
# 5	12.00	1	1.552	4			74.50
# 6	9.00	1	2.235	4			80.46
# 6	9.00	1	2.235	4			80.46
# 5	12.00	1	1.552	4			74.50
# 5	7.20	1	1.552	4			44.70
# 6	12.00	1	2.235	4			107.28
# 4	9.00	1	0.994	4			35.78
# 4	7.00	1	0.994	4			27.83
# 4	7.00	1	0.994	4			27.83
ESTRIBOS (#3)	0.62	220	0.560	4			305.54
CUBIERTA							
VT 01 CUB							
# 5	6.00	1	1.552	4			37.25
# 5	8.00	1	1.552	4			49.66
# 5	8.00	1	1.552	4			49.66
# 6	5.00	1	2.235	4			44.70

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	8.70	1	2.235	4			77.78
# 6	9.00	1	2.235	4			80.46
# 6	8.80	1	2.235	4			78.67
ESTRIBOS (#3)	0.62	148	0.560	4			205.54
VT 02 CUB							
# 5	12.00	1	1.552	1			18.62
# 5	12.00	1	1.552	1			18.62
# 6	6.50	1	2.235	1			14.53
# 5	9.25	1	1.552	1			14.36
# 5	10.00	1	1.552	1			15.52
# 5	11.00	1	1.552	1			17.07
ESTRIBOS (#3)	0.62	176	0.560	1			61.11
VT 03 CUB							
# 5	3.10	1	1.552	2			9.62
# 5	3.10	1	1.552	2			9.62
ESTRIBOS (#3)	0.62	14	0.560	2			9.72
VT 04 CUB							
# 5	3.75	1	1.552	2			11.64
# 5	3.75	1	1.552	2			11.64
ESTRIBOS (#3)	0.62	18	0.560	2			12.50
VT 05 CUB							
# 5	2.00	1	1.552	2			6.21
# 5	2.00	1	1.552	2			6.21
ESTRIBOS (#3)	0.62	8	0.560	2			5.56
VT 06A CUB							
# 5	4.00	1	1.552	1			6.21
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
# 5	4.00	1	1.552	1			6.21
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
ESTRIBOS (#3)	0.62	51	0.560	1			17.71
VT 06B CUB							
# 5	5.00	1	1.552	1			7.76
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
# 5	5.00	1	1.552	1			7.76
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
ESTRIBOS (#3)	0.62	57	0.560	1			19.79
VT 06C CUB							
# 5	6.30	1	1.552	1			9.78
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
# 5	6.30	1	1.552	1			9.78
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
ESTRIBOS (#3)	0.62	66	0.560	1			22.92
VT 07 CUB							
# 5	7.40	1	1.552	1			11.48
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
# 5	7.40	1	1.552	1			11.48
# 5	6.50	1	1.552	1			10.09
ESTRIBOS (#3)	0.62	75	0.560	1			26.04
VT 08 CUB							
# 5	7.30	1	1.552	1			11.33
# 5	12.00	1	1.552	1			18.62
# 5	12.00	1	1.552	1			18.62

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 6	6.00	1	2.235	1			13.41
# 5	11.00	1	1.552	1			17.07
# 5	12.00	1	1.552	1			18.62
# 5	7.35	1	1.552	1			11.41
# 5	7.00	1	1.552	1			10.86
ESTRIBOS (#3)	0.62	217	0.560	1			75.34
VT 09 CUB							
# 6	5.20	1	2.235	2			23.24
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 6	5.00	1	2.235	2			22.35
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	7.60	1	1.552	2			23.59
# 5	11.00	1	1.552	2			34.14
ESTRIBOS (#3)	0.62	225	0.560	2			156.24
VT 09A CUB							
# 6	5.20	1	2.235	2			23.24
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 6	5.85	1	2.235	2			26.15
# 5	9.00	1	1.552	2			27.94
# 5	12.00	1	1.552	2			37.25
# 5	8.00	1	1.552	2			24.83
# 5	11.00	1	1.552	2			34.14
ESTRIBOS (#3)	0.62	226	0.560	2			156.93
VT 10 CUB							
# 5	10.15	1	1.552	1			15.75
# 5	5.00	1	1.552	1			7.76
# 5	10.15	1	1.552	1			15.75
ESTRIBOS (#3)	0.62	56	0.560	1			19.44
VT 11 CUB							
# 5	3.90	1	1.552	2			12.11
# 5	3.90	1	1.552	2			12.11
ESTRIBOS (#3)	0.62	20	0.560	2			13.89
VT 12 CUB							
# 5	8.00	1	1.552	6			74.50
# 5	4.00	1	1.552	6			37.25
# 5	6.00	1	1.552	6			55.87
# 5	4.00	1	1.552	6			37.25
ESTRIBOS (#3)	0.62	52	0.560	6			108.33
VT 13 CUB							
# 5	7.70	1	1.552	1			11.95
# 5	11.00	1	1.552	1			17.07
# 5	8.50	1	1.552	1			13.19
# 5	7.00	1	1.552	1			10.86
# 5	8.25	1	1.552	1			12.80
# 5	6.00	1	1.552	1			9.31
ESTRIBOS (#3)	0.62	122	0.560	1			42.36
VT 14 CUB							

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 5	7.50	1	1.552	1			11.64
# 5	6.00	1	1.552	1			9.31
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 4	3.00	1	0.994	1			2.98
# 5	6.00	1	1.552	1			9.31
# 5	7.50	1	1.552	1			11.64
ESTRIBOS (#3)	0.62	72	0.560	1			25.00
MURO DE ARMERILLO							
MALLA 8mmx8mm				751			751.00
BLOQUE 2							
PISO 2							
VIGAS AÉREAS							
VG 201 # 6	5.50	2.00	2.235	1			24.59
VG 201 # 7	7.00	2.00	3.042	1			42.59
VG 201 # 7	5.50	2.00	3.042	1			33.46
VG 201 # 7	4.15	2.00	3.042	1			25.25
VG 201 # 7	5.00	2.00	3.042	1			30.42
VG 201 # 7	4.50	2.00	3.042	1			27.38
VG 201 # 5	5.50	1.00	1.552	1			8.54
VG 201 # 3	1.48	75.00	0.560	1			62.16
VG 202 # 7	4.30	2.00	3.042	1			26.16
VG 202 # 7	6.20	2.00	3.042	1			37.72
VG 202 # 7	5.00	2.00	3.042	1			30.42
VG 202 # 7	4.00	2.00	3.042	1			24.34
VG 202 # 7	5.60	2.00	3.042	1			34.07
VG 202 # 7	6.50	2.00	3.042	1			39.55
VG 202 # 7	9.00	2.00	3.042	1			54.76
VG 202 # 7	4.50	2.00	3.042	1			27.38
VG 202 # 5	9.00	1.00	1.552	1			13.97
VG 202 # 3	1.48	104.00	0.560	1			86.20
VG 203 # 8	4.00	2.00	3.975	1			31.80
VG 203 # 6	6.00	1.00	2.235	1			13.41
VG 203 # 6	3.50	1.00	2.235	1			7.82
VG 203 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 203 # 7	4.50	2.00	3.042	1			27.38
VG 203 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50
VG 203 # 7	6.50	2.00	3.042	1			39.55
VG 203 # 7	4.50	2.00	3.042	1			27.38
VG 203 # 8	3.20	1.00	3.975	1			12.72
VG 203 # 4	9.00	1.00	0.994	1			8.95
VG 203 # 3	1.68	72.00	0.560	1			67.74
VG 204 # 7	4.00	3.00	3.042	1			36.50
VG 204 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50
VG 204 # 7	7.65	2.00	3.042	1			46.54
VG 204 # 7	9.00	2.00	3.042	1			54.76
VG 204 # 7	4.65	2.00	3.042	1			28.29
VG 204 # 5	9.00	1.00	1.552	1			13.97
VG 204 # 3	1.68	72.00	0.560	1			67.74
VG 205 # 7	4.00	3.00	3.042	1			36.50
VG 205 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50

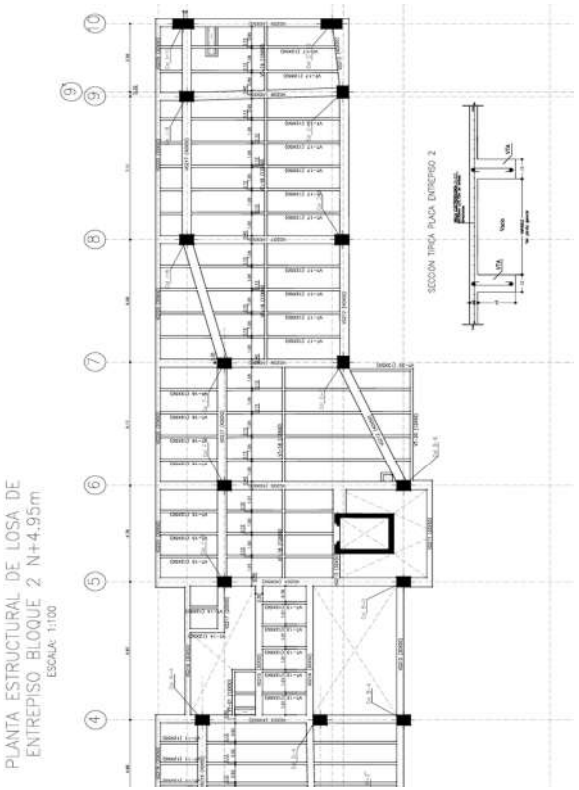

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**10/02/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**Kg**
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD DE TIPOLOGIA**		**UNIDAD**	**TOTAL**
	LONGITUD(m)	**CANT DE PIEZAS**	**PESO (Kg/m)**				**ACUMULADO**
VG 205 # 7	7.65	2.00	3.042	1			**46.54**
VG 205 # 7	9.00	2.00	3.042	1			**54.76**
VG 205 # 7	4.65	2.00	3.042	1			**28.29**
VG 205 # 5	9.00	1.00	1.552	1			**13.97**
VG 205 # 3	1.68	85.00	0.560	1			**79.97**
VG 206 # 8	4.00	2.00	3.975	1			**31.80**
VG 206 # 7	8.90	2.00	3.042	1			**54.15**
VG 206 # 5	2.50	2.00	1.552	1			**7.76**
VG 206 # 7	5.00	2.00	3.042	1			**30.42**
VG 206 # 7	5.00	2.00	3.042	1			**30.42**
VG 206 # 5	6.00	1.00	1.552	1			**9.31**
VG 206 # 3	1.68	56.00	0.560	1			**52.68**
VG 207 # 7	4.00	3.00	3.042	1			**36.50**
VG 207 # 7	2.50	2.00	3.042	1			**15.21**
VG 207 # 7	8.90	2.00	3.042	1			**54.15**
VG 207 # 7	6.00	2.00	3.042	1			**36.50**
VG 207 # 7	4.00	2.00	3.042	1			**24.34**
VG 207 # 5	8.00	1.00	1.552	1			**12.42**
VG 207 # 3	1.68	52.00	0.560	1			**48.92**
VG 208 # 8	4.00	3.00	3.975	1			**47.70**
VG 208 # 7	2.50	2.00	3.042	1			**15.21**
VG 208 # 7	8.90	2.00	3.042	1			**54.15**
VG 208 # 7	6.00	2.00	3.042	1			**36.50**
VG 208 # 7	4.00	2.00	3.042	1			**24.34**
VG 208 # 5	8.00	1.00	1.552	1			**12.42**
VG 208 # 3	1.68	52.00	0.560	1			**48.92**
VG 209 # 8	3.50	3.00	3.975	1			**41.74**
VG 209 # 7	3.50	3.00	3.042	1			**31.94**
VG 209 # 7	8.85	2.00	3.042	1			**53.84**
VG 209 # 7	8.85	2.00	3.042	1			**53.84**
VG 209 # 5	8.75	2.00	1.552	1			**27.16**
VG 209 # 3	1.68	41.00	0.560	1			**38.57**
VG 210 # 6	3.00	3.00	2.235	1			**20.12**
VG 210 # 6	4.00	3.00	2.235	1			**26.82**
VG 210 # 6	5.00	2.00	2.235	1			**22.35**
VG 210 # 6	4.70	2.00	2.235	1			**21.01**
VG 210 # 6	6.00	2.00	2.235	1			**26.82**
VG 210 # 6	6.00	2.00	2.235	1			**26.82**
VG 210 # 5	3.00	1.00	1.552	1			**4.66**
VG 210 # 4	3.00	1.00	0.994	1			**2.98**
VG 210 # 6	6.00	2.00	2.235	1			**26.82**
VG 210 # 6	6.00	2.00	2.235	1			**26.82**
VG 210 # 6	9.00	2.00	2.235	1			**40.23**
VG 210 # 3	1.48	114.00	0.560	1			**94.48**
VG 211 # 6	5.70	2.00	2.235	1			**25.48**
VG 211 # 6	5.70	2.00	2.235	1			**25.48**
VG 211 # 3	1.28	22.00	0.560	1			**15.77**
VG 212 # 8	3.00	3.00	3.975	1			**35.78**
VG 212 # 8	4.00	2.00	3.975	1			**31.80**
VG 212 # 8	6.00	2.00	3.975	1			**47.70**
VG 212 # 7	5.00	2.00	3.042	1			**30.42**
VG 212 # 7	6.75	2.00	3.042	1			**41.07**

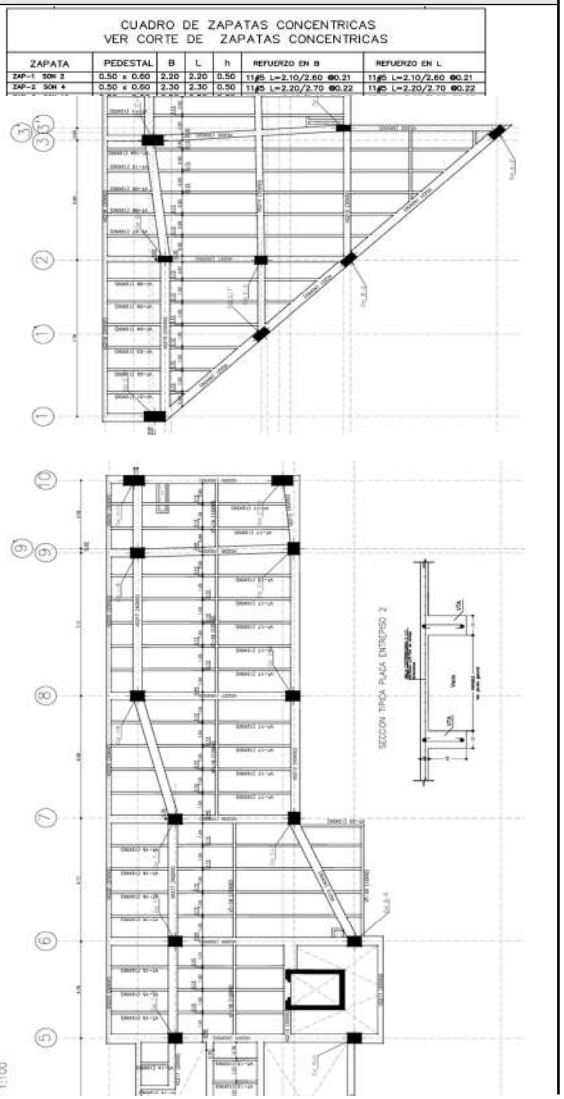

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

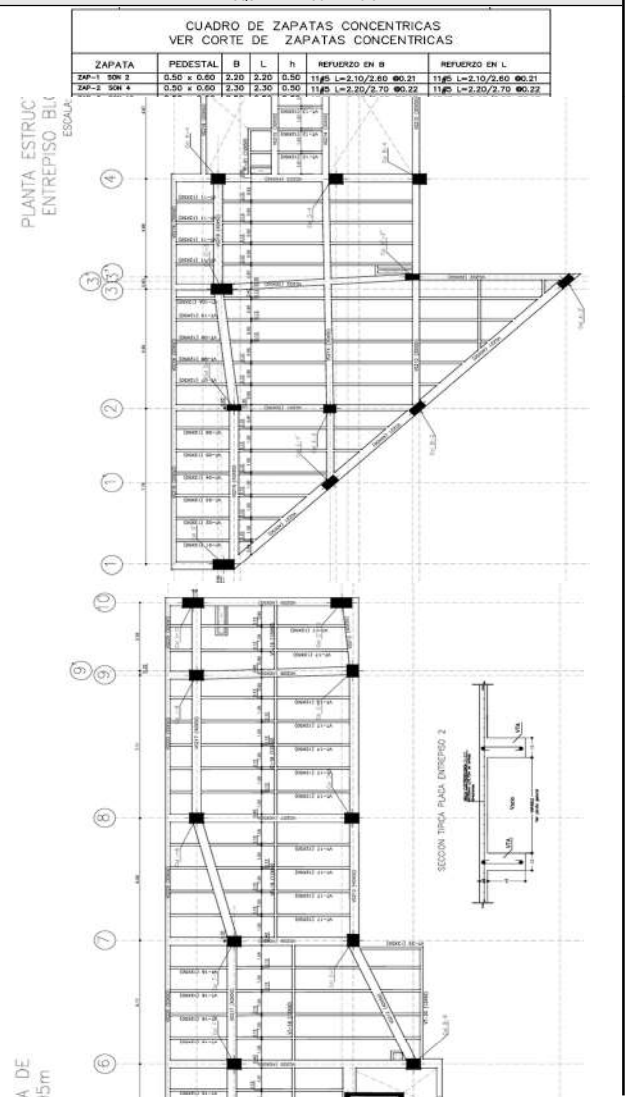

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 212 # 7	7.70	2.00	3.042	1			46.85
VG 212 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 212 # 7	6.50	2.00	3.042	1			39.55
VG 212 # 7	7.00	2.00	3.042	1			42.59
VG 212 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 212 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50
VG 212 # 6	6.00	2.00	2.235	1			26.82
VG 212 # 5	4.00	1.00	1.552	1			6.21
VG 212 # 5	4.00	1.00	1.552	1			6.21
VG 212 # 3	1.68	132.00	0.560	1			124.19
VG 213 # 6	5.70	2.00	2.235	1			25.48
VG 213 # 6	5.70	2.00	2.235	1			25.48
VG 213 # 3	1.48	32.00	0.560	1			26.52
VG 214 # 7	4.00	2.00	3.042	1			24.34
VG 214 # 7	4.00	2.00	3.042	1			24.34
VG 214 # 6	7.50	3.00	2.235	1			50.29
VG 214 # 6	7.00	2.00	2.235	1			31.29
VG 214 # 6	7.00	2.00	2.235	1			31.29
VG 214 # 6	4.30	2.00	2.235	1			19.22
VG 214 # 6	6.00	2.00	2.235	1			26.82
VG 214 # 6	12.00	2.00	2.235	1			53.64
VG 214 # 6	6.80	2.00	2.235	1			30.40
VG 214 # 4	4.00	1.00	1.552	1			6.21
VG 214 # 4	4.00	1.00	1.552	1			6.21
VG 214 # 3	1.48	132.00	0.560	1			109.40
VG 215 # 6	7.75	2.00	2.235	1			34.64
VG 215 # 6	7.75	2.00	2.235	1			34.64
VG 215 # 3	1.48	42.00	0.560	1			34.81
VG 216 # 8	3.00	3.00	3.975	1			35.78
VG 216 # 8	4.00	4.00	3.975	1			63.60
VG 216 # 8	4.00	4.00	3.975	1			63.60
VG 216 # 8	2.50	2.00	3.975	1			19.88
VG 216 # 7	5.20	2.00	3.042	1			31.64
VG 216 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 216 # 7	9.00	2.00	3.042	1			54.76
VG 216 # 7	7.80	3.00	3.042	1			71.18
VG 216 # 7	9.00	2.00	3.042	1			54.76
VG 216 # 7	5.40	2.00	3.042	1			32.85
VG 216 # 5	9.00	1.00	1.552	1			13.97
VG 216 # 5	5.40	1.00	1.552	1			8.38
VG 216 # 6	4.00	1.00	2.235	1			8.94
VG 216 # 4	4.00	1.00	0.994	1			3.98
VG 216 # 3	1.48	116.00	0.560	1			96.14
VG 217 # 8	4.00	3.00	3.975	1			47.70
VG 217 # 8	4.00	3.00	3.975	1			47.70
VG 217 # 8	4.00	3.00	3.975	1			47.70
VG 217 # 8	6.00	2.00	3.975	1			47.70
VG 217 # 7	8.70	2.00	3.042	1			52.93
VG 217 # 7	7.00	2.00	3.042	1			42.59
VG 217 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 217 # 7	8.20	2.00	3.042	1			49.89
VG 217 # 7	4.00	1.00	3.042	1			12.17

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 217 # 5	4.00	2.00	1.552	1			12.42
VG 217 # 5	4.00	1.00	1.552	1			6.21
VG 217 # 5	4.00	2.00	1.552	1			12.42
VG 217 # 7	6.70	2.00	3.042	1			40.76
VG 217 # 7	7.00	2.00	3.042	1			42.59
VG 217 # 7	7.50	2.00	3.042	1			45.63
VG 217 # 7	5.70	2.00	3.042	1			34.68
VG 217 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50
VG 217 # 3	1.68	168.00	0.560	1			158.05
VG 217 # 3	1.28	17.00	0.560	1			12.19
VG 218 # 5	12.00	2.00	1.552	1			37.25
VG 218 # 5	9.00	2.00	1.552	1			27.94
VG 218 # 5	7.70	2.00	1.552	1			23.90
VG 218 # 5	9.00	2.00	1.552	1			27.94
VG 218 # 5	5.00	2.00	1.552	1			15.52
VG 218 # 3	1.28	108.00	0.560	1			77.41
VG 219 # 5	7.65	2.00	1.552	1			23.75
VG 219 # 5	7.65	2.00	1.552	1			23.75
VG 219 # 3	1.28	42.00	0.560	1			30.11
VG 220 # 5	8.50	2.00	1.552	1			26.38
VG 220 # 5	7.50	2.00	1.552	1			23.28
VG 220 # 5	7.00	2.00	1.552	1			21.73
VG 220 # 5	8.00	2.00	1.552	1			24.83
VG 220 # 4	3.00	1.00	0.994	1			2.98
VG 220 # 4	3.00	1.00	0.994	1			2.98
VG 220 # 4	3.00	1.00	0.994	1			2.98
VG 220 # 4	3.00	1.00	0.994	1			2.98
VG 220 # 5	6.50	2.00	1.552	1			20.18
VG 220 # 5	6.00	2.00	1.552	1			18.62
VG 220 # 5	7.00	2.00	1.552	1			21.73
VG 220 # 5	7.00	2.00	1.552	1			21.73
VG 220 # 5	5.30	2.00	1.552	1			16.45
VG 220 # 3	1.28	178.00	0.560	1			127.59
VG 221 # 6	3.50	1.00	2.235	1			7.82
VG 221 # 6	5.00	2.00	2.235	1			22.35
VG 221 # 6	4.00	2.00	2.235	1			17.88
VG 221 # 6	5.00	2.00	2.235	1			22.35
VG 221 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50
VG 221 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 221 # 7	7.00	2.00	3.042	1			42.59
VG 221 # 7	6.00	2.00	3.042	1			36.50
VG 221 # 7	9.00	2.00	3.042	1			54.76
VG 221 # 7	9.00	2.00	3.042	1			54.76
VG 221 # 7	8.00	2.00	3.042	1			48.67
VG 221 # 3	1.68	156.00	0.560	1			146.76
NERVIOS							
VT 01 # 5	4.55	1.00	1.552	1			7.06
VT 01 # 5	4.55	1.00	1.552	1			7.06
VT 01 # 3	0.62	22.00	0.560	1			7.64
VT 02 # 5	5.70	1.00	1.552	1			8.85
VT 02 # 5	5.70	1.00	1.552	1			8.85

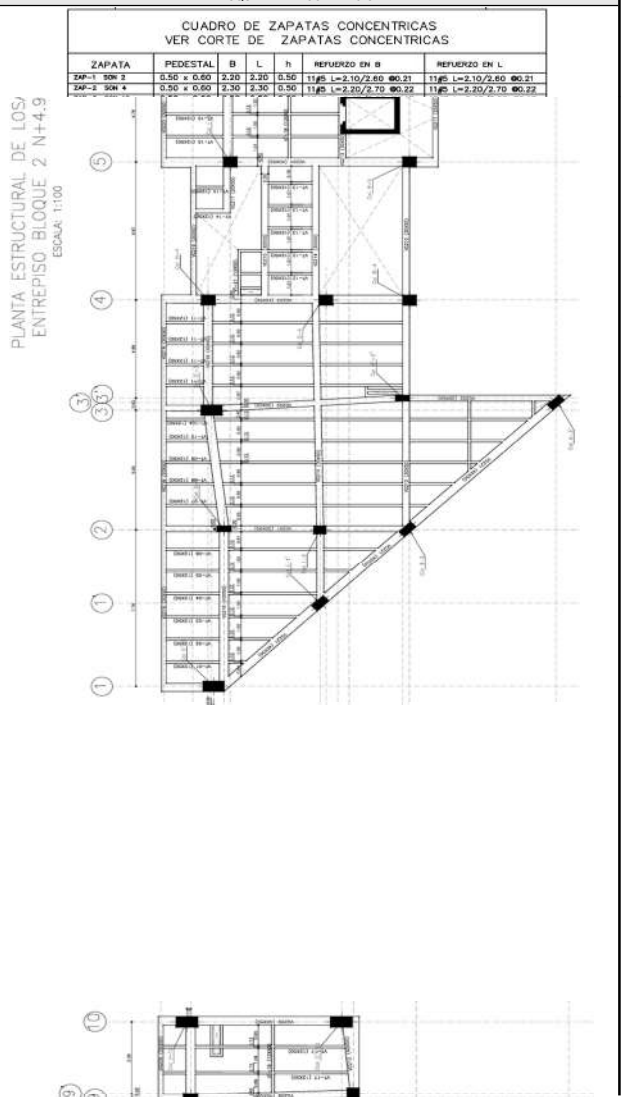

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**10/02/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**Kg**
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD DE TIPOLOGIA**		**UNIDAD**	**TOTAL**
	LONGITUD(m)	**CANT DE PIEZAS**	**PESO (Kg/m)**				**ACUMULADO**
VT 02 # 3	0.62	28.00	0.560	1			**9.72**
VT 03 # 5	6.90	1.00	1.552	1			**10.71**
VT 03 # 5	6.90	1.00	1.552	1			**10.71**
VT 03 # 3	0.62	36.00	0.560	1			**12.50**
VT 04 # 5	6.85	1.00	1.552	1			**10.63**
VT 04 # 5	5.00	1.00	1.552	1			**7.76**
VT 04 # 5	5.50	1.00	1.552	1			**8.54**
VT 04 # 5	3.40	1.00	1.552	1			**5.28**
VT 04 # 3	0.62	42.00	0.560	1			**14.58**
VT 05 # 5	4.60	1.00	1.552	1			**7.14**
VT 05 # 5	5.40	1.00	1.552	1			**8.38**
VT 05 # 5	6.60	1.00	1.552	1			**10.24**
VT 05 # 5	3.40	1.00	1.552	1			**5.28**
VT 05 # 3	0.62	49.00	0.560	1			**17.01**
VT 06 # 5	7.20	1.00	1.552	1			**11.17**
VT 06 # 5	4.00	1.00	1.552	1			**6.21**
VT 06 # 5	3.80	1.00	1.552	1			**5.90**
VT 06 # 5	7.35	1.00	1.552	1			**11.41**
VT 06 # 3	0.62	58.00	0.560	1			**20.14**
VT 07 # 5	4.15	1.00	1.552	1			**6.44**
VT 07 # 5	6.00	1.00	1.552	1			**9.31**
VT 07 # 5	4.00	1.00	1.552	1			**6.21**
VT 07 # 5	6.00	1.00	1.552	1			**9.31**
VT 07 # 5	7.15	1.00	1.552	1			**11.10**
VT 07 # 3	0.62	70.00	0.560	1			**24.30**
VT 08 # 5	5.15	1.00	1.552	1			**7.99**
VT 08 # 5	6.00	1.00	1.552	1			**9.31**
VT 08 # 5	4.00	1.00	1.552	1			**6.21**
VT 08 # 5	6.00	1.00	1.552	1			**9.31**
VT 08 # 5	8.30	1.00	1.552	1			**12.88**
VT 08 # 3	0.62	75.00	0.560	1			**26.04**
VT 09 # 5	5.00	1.00	1.552	1			**7.76**
VT 09 # 5	5.00	1.00	1.552	1			**7.76**
VT 09 # 5	6.70	1.00	1.552	1			**10.40**
VT 09 # 5	3.95	1.00	1.552	1			**6.13**
VT 09 # 5	7.50	1.00	1.552	1			**11.64**
VT 09 # 5	7.40	1.00	1.552	1			**11.48**
VT 09 # 3	0.62	78.00	0.560	1			**27.08**
VT 10 # 5	9.00	1.00	1.552	1			**13.97**
VT 10 # 5	5.00	1.00	1.552	1			**7.76**
VT 10 # 5	7.40	1.00	1.552	1			**11.48**
VT 10 # 5	7.60	1.00	1.552	1			**11.80**
VT 10 # 5	8.50	1.00	1.552	1			**13.19**
VT 10 # 3	0.62	86.00	0.560	1			**29.86**
VT 10A # 5	9.00	1.00	1.552	1			**13.97**
VT 10A # 5	5.50	1.00	1.552	1			**8.54**
VT 10A # 5	8.60	1.00	1.552	1			**13.35**
VT 10A # 5	5.00	1.00	1.552	1			**7.76**
VT 10A # 5	6.70	1.00	1.552	1			**10.40**
VT 10A # 5	6.50	1.00	1.552	1			**10.09**
VT 10A # 3	0.62	96.00	0.560	1			**33.33**
VT 11 # 5	7.15	1.00	1.552	1			**11.10**

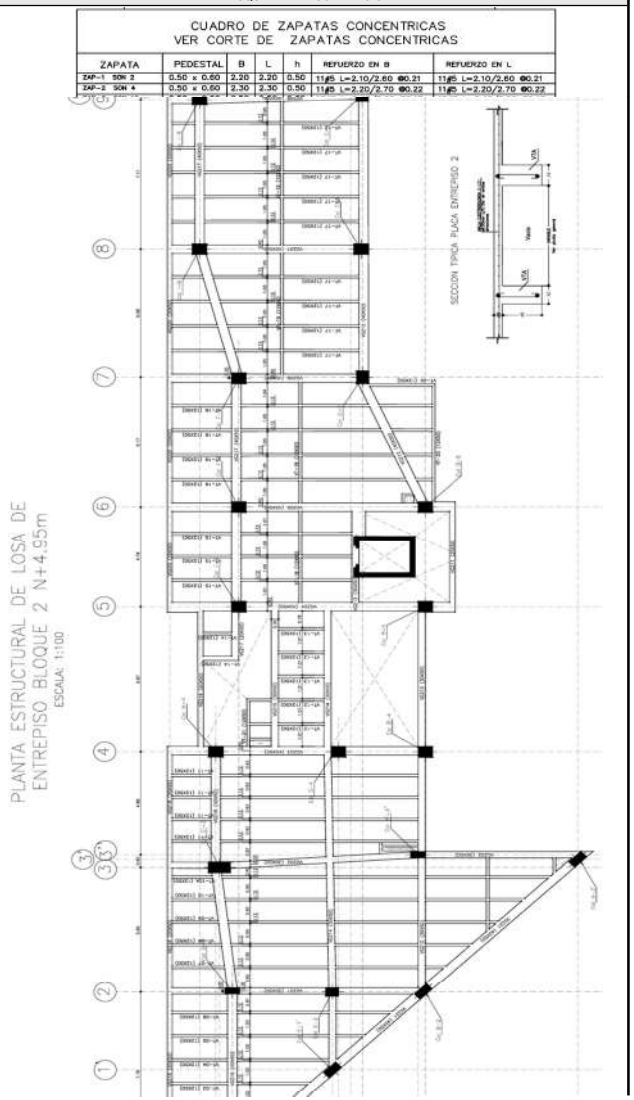

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**10/02/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**Kg**
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VT 11 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 11 # 4	5.50	1.00	0.994	**1**			**5.47**
VT 11 # 5	5.55	1.00	1.552	**1**			**8.61**
VT 11 # 5	6.60	1.00	1.552	**1**			**10.24**
VT 11 # 3	0.62	63.00	0.560	**1**			**21.87**
VT 12 # 5	3.95	1.00	1.552	**2**			**12.26**
VT 12 # 5	3.95	1.00	1.552	**2**			**12.26**
VT 12 # 3	0.62	18.00	0.560	**2**			**12.50**
VT 13 # 5	2.90	1.00	1.552	**3**			**13.50**
VT 13 # 5	2.90	1.00	1.552	**3**			**13.50**
VT 13 # 3	0.62	12.00	0.560	**3**			**12.50**
VT 14 # 5	2.25	1.00	1.552	**2**			**6.98**
VT 14 # 5	2.25	1.00	1.552	**2**			**6.98**
VT 14 # 3	0.62	10.00	0.560	**2**			**6.94**
VT 15 # 6	4.00	1.00	2.235	**3**			**26.82**
VT 15 # 5	8.45	1.00	1.552	**3**			**39.34**
VT 15 # 5	8.45	1.00	1.552	**3**			**39.34**
VT 15 # 3	0.62	45.00	0.560	**3**			**46.87**
VT 16 # 6	4.00	1.00	2.235	**4**			**35.76**
VT 16 # 5	6.50	1.00	1.552	**4**			**40.35**
VT 16 # 5	6.00	1.00	1.552	**4**			**37.25**
VT 16 # 5	9.00	1.00	1.552	**4**			**55.87**
VT 16 # 5	3.70	1.00	1.552	**4**			**22.97**
VT 16 # 3	0.62	67.00	0.560	**4**			**93.05**
VT 21 # 5	3.15	1.00	1.552	**1**			**4.89**
VT 21 # 5	3.15	1.00	1.552	**1**			**4.89**
VT 21 # 3	0.62	14.00	0.560	**1**			**4.86**
VT 17 # 6	8.90	1.00	2.235	**11**			**218.81**
VT 17 # 5	8.80	1.00	1.552	**11**			**150.23**
VT 17 # 4	4.00	1.00	0.994	**11**			**43.74**
VT 17 # 3	0.62	50.00	0.560	**11**			**190.96**
VT 18 # 5	5.70	1.00	1.552	**1**			**8.85**
VT 18 # 5	7.00	1.00	1.552	**1**			**10.86**
VT 18 # 5	6.55	1.00	1.552	**1**			**10.17**
VT 18 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 18 # 3	0.62	68.00	0.560	**1**			**23.61**
VT 19 # 6	4.00	1.00	2.235	**1**			**8.94**
VT 19 # 6	4.00	1.00	2.235	**1**			**8.94**
VT 19 # 6	9.00	1.00	2.235	**1**			**20.12**
VT 19 # 5	9.50	1.00	1.552	**1**			**14.74**
VT 19 # 5	9.00	1.00	1.552	**1**			**13.97**
VT 19 # 5	6.50	1.00	1.552	**1**			**10.09**
VT 19 # 5	4.00	1.00	1.552	**1**			**6.21**
VT 19 # 3	0.62	106.00	0.560	**1**			**36.80**
VT 20 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 20 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 20 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 20 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 20 # 3	0.62	55.00	0.560	**1**			**19.10**
PISO 3							
VIGAS AÉREAS							

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**10/02/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 301 # 7	5.50	2	3.042	1			33.46
VG 301 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 301 # 6	5.50	2	2.235	1			24.59
VG 301 # 7	4.15	2	3.042	1			25.25
VG 301 # 5	5.00	2	1.552	1			15.52
VG 301 # 5	4.50	2	1.552	1			13.97
VG 301 # 3	1.48	72	0.560	1			59.67
VG 302 # 7	4.30	2	3.042	1			26.16
VG 302 # 7	6.20	2	3.042	1			37.72
VG 302 # 7	5.00	2	3.042	1			30.42
VG 302 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 302 # 7	5.60	2	3.042	1			34.07
VG 302 # 6	4.00	2	2.235	1			17.88
VG 302 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 302 # 7	9.00	2	3.042	1			54.76
VG 302 # 7	4.50	2	3.042	1			27.38
VG 302 # 4	7.00	1	0.994	1			6.96
VG 302 # 3	1.48	104	0.560	1			86.20
VG 303 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 303 # 7	4.50	2	3.042	1			27.38
VG 303 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 303 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 303 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 303 # 5	3.50	1	1.552	1			5.43
VG 303 # 5	6.00	1	1.552	1			9.31
VG 303 # 3	1.68	72	0.560	1			67.74
VG 304 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 304 # 7	7.65	2	3.042	1			46.54
VG 304 # 7	9.00	2	3.042	1			54.76
VG 304 # 7	4.65	2	3.042	1			28.29
VG 304 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50
VG 304 # 5	8.00	1	1.552	1			12.42
VG 304 # 3	1.68	72	0.560	1			67.74
VG 305 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 305 # 7	7.65	2	3.042	1			46.54
VG 305 # 7	9.00	2	3.042	1			54.76
VG 305 # 7	4.65	2	3.042	1			28.29
VG 305 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50
VG 305 # 5	8.00	1	1.552	1			12.42
VG 305 # 3	1.68	85	0.560	1			79.97
VG 306 # 8	4.00	2	3.975	1			31.80
VG 306 # 7	8.90	2	3.042	1			54.15
VG 306 # 7	5.00	2	3.042	1			30.42
VG 306 # 7	5.00	2	3.042	1			30.42
VG 306 # 5	2.50	2	1.552	1			7.76
VG 306 # 5	6.00	1	1.552	1			9.31
VG 306 # 3	1.68	56	0.560	1			52.68
VG 307 # 7	2.50	2	3.042	1			15.21
VG 307 # 7	8.90	2	3.042	1			54.15
VG 307 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 307 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 307 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50

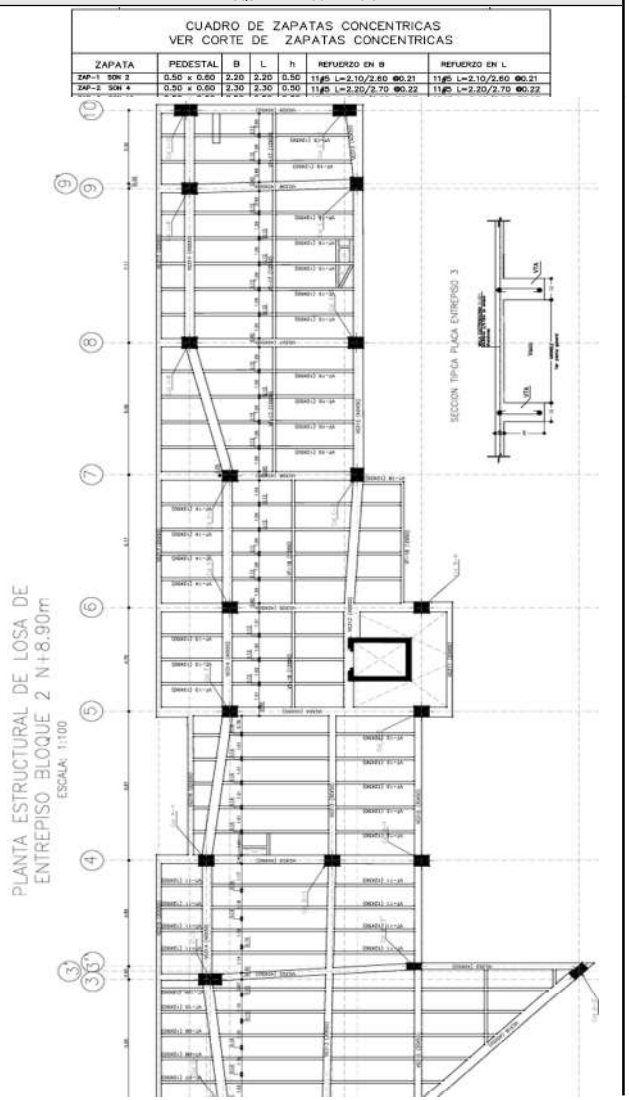

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	144,049.85		
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

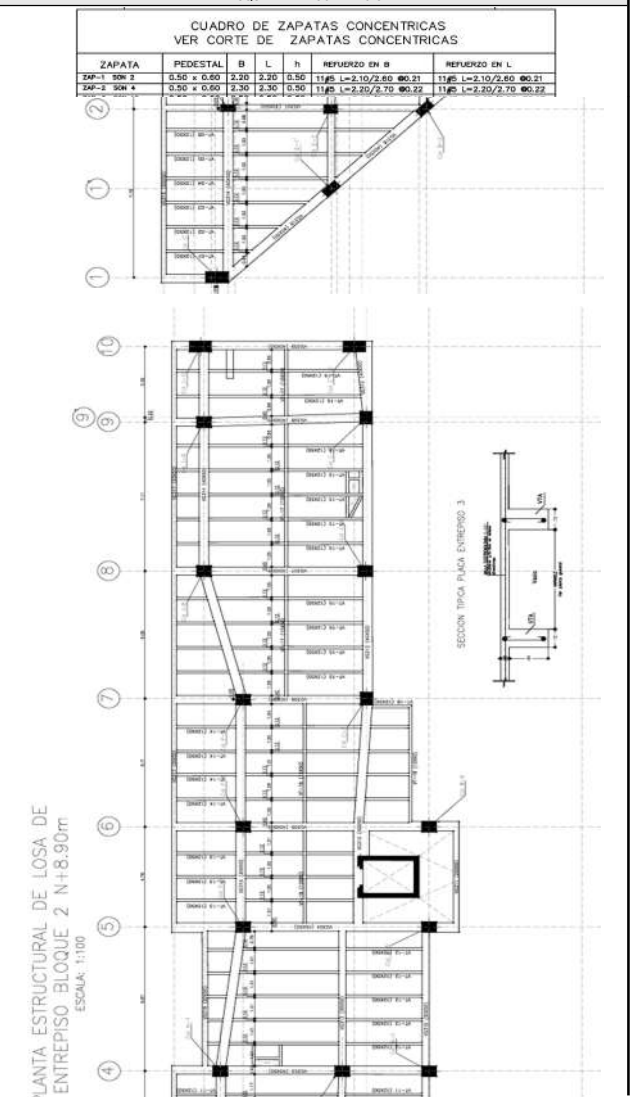

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 307 # 5	8.00	1	1.552	1			12.42
VG 307 # 3	1.68	52	0.560	1			48.92
VG 308 # 7	2.50	2	3.042	1			15.21
VG 308 # 7	8.90	2	3.042	1			54.15
VG 308 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 308 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 308 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50
VG 308 # 5	8.00	1	1.552	1			12.42
VG 308 # 3	1.68	52	0.560	1			48.92
VG 309 # 7	3.50	3	3.042	1			31.94
VG 309 # 7	8.85	2	3.042	1			53.84
VG 309 # 7	8.85	2	3.042	1			53.84
VG 309 # 8	3.50	3	3.975	1			41.74
VG 309 # 5	8.85	2	1.552	1			27.47
VG 309 # 3	1.68	41	0.560	1			38.57
VG 310 # 6	4.70	2	2.235	1			21.01
VG 310 # 6	4.00	2	2.235	1			17.88
VG 310 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 310 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 310 # 6	5.00	2	2.235	1			22.35
VG 310 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 310 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 310 # 6	9.00	2	2.235	1			40.23
VG 310 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 310 # 3	1.48	114	0.560	1			94.48
VG 311 # 6	5.70	2	2.235	1			25.48
VG 311 # 6	5.70	2	2.235	1			25.48
VG 311 # 3	1.28	22	0.560	1			15.77
VG 312 # 8	4.00	2	3.975	1			31.80
VG 312 # 7	8.70	4	3.042	1			105.86
VG 312 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 312 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 312 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 312 # 7	8.20	2	3.042	1			49.89
VG 312 # 7	4.00	1	3.042	1			12.17
VG 312 # 7	6.00	1	3.042	1			18.25
VG 312 # 7	6.70	2	3.042	1			40.76
VG 312 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 312 # 7	7.50	2	3.042	1			45.63
VG 312 # 7	5.70	2	3.042	1			34.68
VG 312 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 312 # 3	1.68	178	0.560	1			167.46
VG 313 # 6	4.00	2	2.235	1			17.88
VG 313 # 6	7.50	2	2.235	1			33.53
VG 313 # 6	7.00	2	2.235	1			31.29
VG 313 # 6	7.00	2	2.235	1			31.29
VG 313 # 6	4.30	2	2.235	1			19.22
VG 313 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 313 # 6	7.00	2	2.235	1			31.29
VG 313 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 313 # 6	6.80	2	2.235	1			30.40
VG 313 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

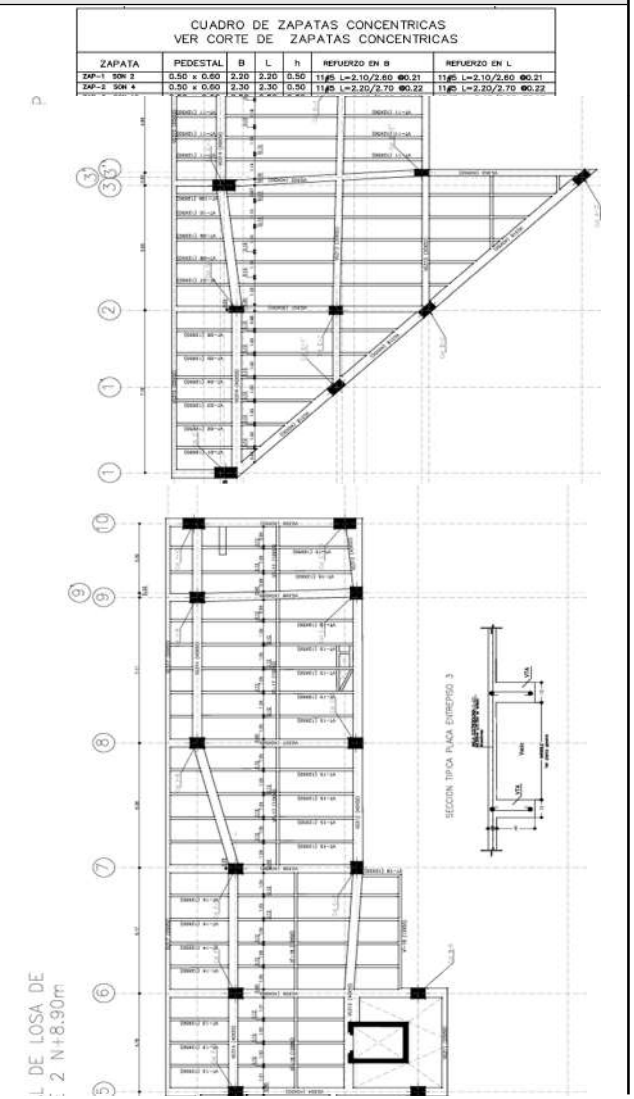

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 313 # 6	7.00	1	2.235	1			15.65
VG 313 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 313 # 7	4.00	2	3.042	1			24.34
VG 313 # 3	1.48	131	0.560	1			108.57
VG 314 # 8	3.00	2	3.975	1			23.85
VG 314 # 8	4.00	3	3.975	1			47.70
VG 314 # 8	4.00	3	3.975	1			47.70
VG 314 # 8	4.00	2	3.975	1			31.80
VG 314 # 8	4.00	3	3.975	1			47.70
VG 314 # 7	5.40	2	3.042	1			32.85
VG 314 # 7	7.50	2	3.042	1			45.63
VG 314 # 7	6.60	2	3.042	1			40.15
VG 314 # 7	7.65	2	3.042	1			46.54
VG 314 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 314 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 314 # 7	7.25	2	3.042	1			44.11
VG 314 # 7	7.70	2	3.042	1			46.85
VG 314 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 314 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50
VG 314 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50
VG 314 # 7	4.00	3	3.042	1			36.50
VG 314 # 7	8.00	3	3.042	1			73.01
VG 314 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 314 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 314 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 314 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 314 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 314 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 314 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 314 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 314 # 6	4.00	2	2.235	1			17.88
VG 314 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 314 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 314 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 314 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 314 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 314 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98
VG 314 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98
VG 314 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98
VG 314 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98
VG 314 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98
VG 314 # 3	1.68	338	0.560	1			317.99
VG 315 # 6	3.00	2	2.235	1			13.41
VG 315 # 5	12.00	2	1.552	1			37.25
VG 315 # 5	9.00	2	1.552	1			27.94
VG 315 # 5	7.70	2	1.552	1			23.90
VG 315 # 5	9.00	2	1.552	1			27.94
VG 315 # 5	5.00	2	1.552	1			15.52
VG 315 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 315 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 315 # 3	1.28	108	0.560	1			77.41
VG 316 # 5	7.65	2	1.552	1			23.75

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

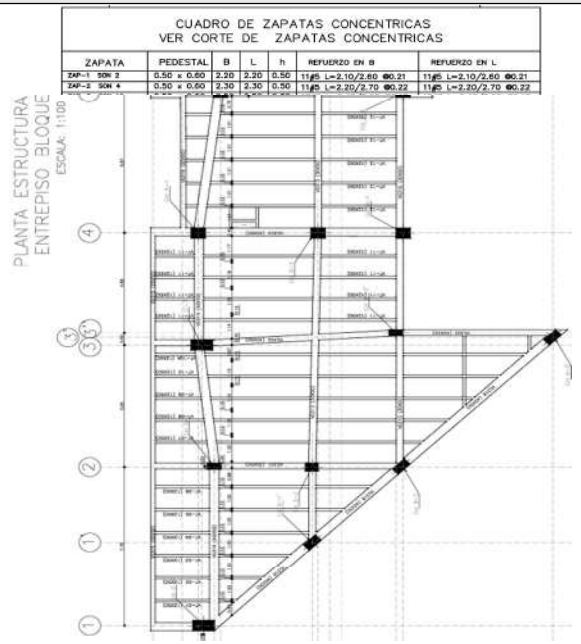

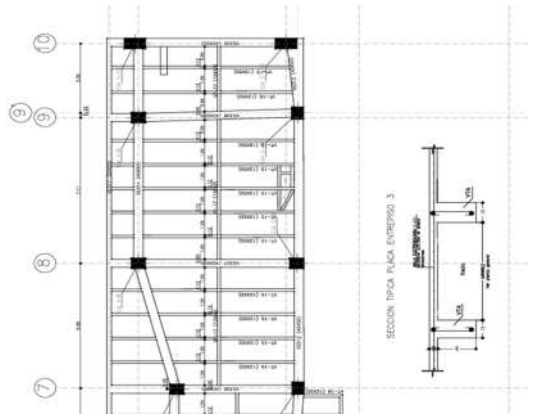

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 316 # 5	7.65	2	1.552	1			23.75
VG 316 # 3	1.28	42	0.560	1			30.11
VG 317 # 5	8.50	2	1.552	1			26.38
VG 317 # 5	7.50	2	1.552	1			23.28
VG 317 # 5	8.00	2	1.552	1			24.83
VG 317 # 5	7.00	2	1.552	1			21.73
VG 317 # 5	5.30	2	1.552	1			16.45
VG 317 # 5	6.00	2	1.552	1			18.62
VG 317 # 5	7.00	2	1.552	1			21.73
VG 317 # 5	7.00	2	1.552	1			21.73
VG 317 # 5	6.50	2	1.552	1			20.18
VG 317 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 317 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 317 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 317 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98
VG 317 # 3	1.28	178	0.560	1			127.59
VG 318 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 318 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 318 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 318 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 318 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 318 # 7	9.00	1	3.042	1			27.38
VG 318 # 7	9.00	1	3.042	1			27.38
VG 318 # 6	3.50	2	2.235	1			15.65
VG 318 # 6	5.00	2	2.235	1			22.35
VG 318 # 6	4.00	2	2.235	1			17.88
VG 318 # 6	5.00	2	2.235	1			22.35
VG 318 # 3	1.68	156	0.560	1			146.76
NERVIOS							
VT 01 # 5	4.55	1.00	1.552	1			7.06
VT 01 # 5	4.55	1.00	1.552	1			7.06
VT 01 # 3	0.62	22.00	0.560	1			7.64
VT 02 # 5	5.70	1.00	1.552	1			8.85
VT 02 # 5	5.70	1.00	1.552	1			8.85
VT 02 # 3	0.62	28.00	0.560	1			9.72
VT 03 # 5	6.90	1.00	1.552	1			10.71
VT 03 # 5	6.90	1.00	1.552	1			10.71
VT 03 # 3	0.62	36.00	0.560	1			12.50
VT 04 # 5	6.85	1.00	1.552	1			10.63
VT 04 # 5	5.00	1.00	1.552	1			7.76
VT 04 # 5	5.50	1.00	1.552	1			8.54
VT 04 # 5	3.40	1.00	1.552	1			5.28
VT 04 # 3	0.62	42.00	0.560	1			14.58
VT 05 # 5	4.60	1.00	1.552	1			7.14
VT 05 # 5	5.40	1.00	1.552	1			8.38
VT 05 # 5	6.60	1.00	1.552	1			10.24
VT 05 # 5	3.40	1.00	1.552	1			5.28
VT 05 # 3	0.62	49.00	0.560	1			17.01
VT 06 # 5	6.00	1.00	1.552	1			9.31
VT 06 # 5	5.40	1.00	1.552	1			8.38
VT 06 # 5	3.80	1.00	1.552	1			5.90

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**10/02/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VT 06 # 5	7.35	1.00	1.552	**1**			**11.41**
VT 06 # 3	0.62	58.00	0.560	**1**			**20.14**
VT 07 # 5	4.15	1.00	1.552	**1**			**6.44**
VT 07 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 07 # 5	4.00	1.00	1.552	**1**			**6.21**
VT 07 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 07 # 5	7.15	1.00	1.552	**1**			**11.10**
VT 07 # 3	0.62	70.00	0.560	**1**			**24.30**
VT 08 # 5	5.15	1.00	1.552	**1**			**7.99**
VT 08 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 08 # 5	4.00	1.00	1.552	**1**			**6.21**
VT 08 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 08 # 5	8.30	1.00	1.552	**1**			**12.88**
VT 08 # 3	0.62	75.00	0.560	**1**			**26.04**
VT 09 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 09 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 09 # 5	6.70	1.00	1.552	**1**			**10.40**
VT 09 # 5	3.95	1.00	1.552	**1**			**6.13**
VT 09 # 5	7.50	1.00	1.552	**1**			**11.64**
VT 09 # 5	7.40	1.00	1.552	**1**			**11.48**
VT 09 # 3	0.62	78.00	0.560	**1**			**27.08**
VT 10 # 5	9.00	1.00	1.552	**1**			**13.97**
VT 10 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 10 # 5	7.40	1.00	1.552	**1**			**11.48**
VT 10 # 5	7.60	1.00	1.552	**1**			**11.80**
VT 10 # 5	8.50	1.00	1.552	**1**			**13.19**
VT 10 # 3	0.62	86.00	0.560	**1**			**29.86**
VT 10A # 5	9.00	1.00	1.552	**1**			**13.97**
VT 10A # 5	5.50	1.00	1.552	**1**			**8.54**
VT 10A # 5	8.60	1.00	1.552	**1**			**13.35**
VT 10A # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 10A # 5	6.70	1.00	1.552	**1**			**10.40**
VT 10A # 5	6.50	1.00	1.552	**1**			**10.09**
VT 10A # 3	0.62	96.00	0.560	**1**			**33.33**
VT 11 # 5	7.15	1.00	1.552	**1**			**11.10**
VT 11 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 11 # 4	5.50	1.00	0.994	**1**			**5.47**
VT 11 # 5	5.55	1.00	1.552	**1**			**8.61**
VT 11 # 5	6.60	1.00	1.552	**1**			**10.24**
VT 11 # 3	0.62	63.00	0.560	**1**			**21.87**
VT 12 # 5	4.70	1.00	1.552	**5**			**36.47**
VT 12 # 5	6.70	1.00	1.552	**5**			**51.99**
VT 12 # 4	5.50	1.00	0.994	**5**			**27.34**
VT 12 # 5	4.50	1.00	1.552	**5**			**34.92**
VT 12 # 5	6.70	1.00	1.552	**5**			**51.99**
VT 12 # 3	0.62	18.00	0.560	**5**			**31.25**
VT 13 # 6	4.00	1.00	2.235	**3**			**26.82**
VT 13 # 5	8.45	1.00	1.552	**3**			**39.34**
VT 13 # 5	8.45	1.00	1.552	**3**			**39.34**
VT 13 # 3	0.62	45.00	0.560	**3**			**46.87**
VT 14 # 4	4.00	1.00	0.994	**4**			**15.90**
VT 14 # 5	6.00	1.00	1.552	**4**			**37.25**

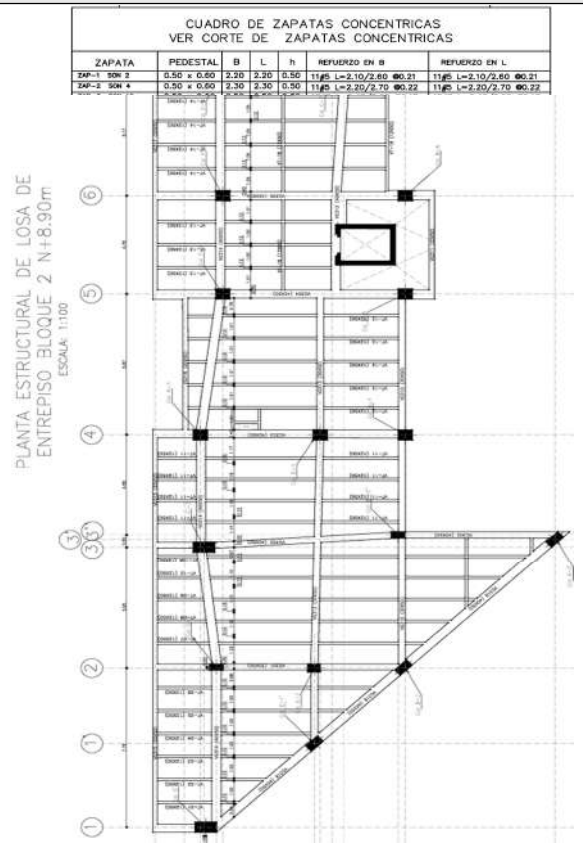

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**10/02/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**144,049.85**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**Kg**
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VT 14 # 5	5.50	1.00	1.552	**4**			**34.14**
VT 14 # 5	3.85	1.00	1.552	**4**			**23.90**
VT 14 # 5	7.50	1.00	1.552	**4**			**46.56**
VT 14 # 3	0.62	59.00	0.560	**4**			**81.94**
VT 15 # 6	8.90	1.00	2.235	**11**			**218.81**
VT 15 # 5	8.80	1.00	1.552	**11**			**150.23**
VT 15 # 4	4.00	1.00	0.994	**11**			**43.74**
VT 15 # 3	0.62	50.00	0.560	**11**			**190.96**
VT 16 # 6	4.00	1.00	2.235	**4**			**35.76**
VT 16 # 5	6.50	1.00	1.552	**4**			**40.35**
VT 16 # 5	6.00	1.00	1.552	**4**			**37.25**
VT 16 # 5	9.00	1.00	1.552	**4**			**55.87**
VT 16 # 5	3.70	1.00	1.552	**4**			**22.97**
VT 16 # 3	0.62	67.00	0.560	**4**			**93.05**
VT 17 # 6	9.00	1.00	2.235	**1**			**20.12**
VT 17 # 5	9.50	1.00	1.552	**1**			**14.74**
VT 17 # 5	9.00	1.00	1.552	**1**			**13.97**
VT 17 # 5	6.50	1.00	1.552	**1**			**10.09**
VT 17 # 5	4.00	1.00	1.552	**1**			**6.21**
VT 17 # 3	0.62	106.00	0.560	**1**			**36.80**
VT 18 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 18 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 18 # 5	6.00	1.00	1.552	**1**			**9.31**
VT 18 # 5	5.00	1.00	1.552	**1**			**7.76**
VT 18 # 3	0.62	55.00	0.560	**1**			**19.10**
CUBIERTA							
VIGAS AÉREAS							
VG 401							
# 7	**5.20**	**2**	**3.042**	**1**			**31.64**
# 7	**7.00**	**2**	**3.042**	**1**			**42.59**
# 6	**8.00**	**2**	**2.235**	**1**			**35.76**
# 7	**4.20**	**2**	**3.042**	**1**			**25.55**
# 7	**4.00**	**2**	**3.042**	**1**			**24.34**
# 5	**9.00**	**1**	**1.552**	**1**			**13.97**
ESTRIBOS (#3)	**1.48**	**62**	**0.560**	**1**			**51.39**
VG 402							
# 4	**3.50**	**1**	**0.994**	**1**			**3.48**
# 6	**4.00**	**2**	**2.235**	**1**			**17.88**
# 7	**8.00**	**2**	**3.042**	**1**			**48.67**
# 7	**4.70**	**2**	**3.042**	**1**			**28.59**
# 7	**6.00**	**2**	**3.042**	**1**			**36.50**
# 7	**6.70**	**2**	**3.042**	**1**			**40.76**
ESTRIBOS (#3)	**1.68**	**72**	**0.560**	**1**			**67.74**
VG 403							
# 4	**3.50**	**2**	**0.994**	**1**			**6.96**
# 6	**4.00**	**2**	**2.235**	**1**			**17.88**
# 7	**3.85**	**2**	**3.042**	**1**			**23.42**
# 7	**10.00**	**2**	**3.042**	**1**			**60.84**
# 7	**8.00**	**2**	**3.042**	**1**			**48.67**
# 7	**6.00**	**2**	**3.042**	**1**			**36.50**
# 5	**9.00**	**1**	**1.552**	**1**			**13.97**

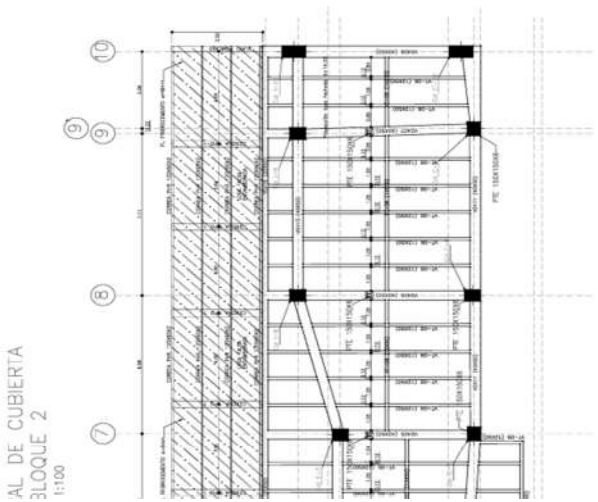

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
ESTRIBOS (#3)	1.68	83	0.560	1			78.09
VG 404							
# 4	3.50	2	0.994	1			6.96
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 7	4.00	2	3.042	1			24.34
# 7	10.00	2	3.042	1			60.84
# 7	8.00	2	3.042	1			48.67
# 7	6.00	2	3.042	1			36.50
# 7	4.65	2	3.042	1			28.29
# 6	9.00	1	2.235	1			20.12
ESTRIBOS (#3)	1.68	65	0.560	1			61.15
VG 405							
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
ESTRIBOS (#3)	1.68	59	0.560	1			55.51
VG 406							
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
ESTRIBOS (#3)	1.68	49	0.560	1			46.10
VG 407							
# 6	4.00	2	2.235	1			17.88
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
# 7	10.00	2	3.042	1			60.84
ESTRIBOS (#3)	1.68	56	0.560	1			52.68
VG 408							
# 5	3.50	1	1.552	1			5.43
# 6	3.50	2	2.235	1			15.65
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
# 7	8.95	2	3.042	1			54.45
# 5	8.75	1	1.552	1			13.58
ESTRIBOS (#3)	1.68	41	0.560	1			38.57
VG 409							
# 4	3.00	2	0.994	1			5.96
# 4	3.00	2	0.994	1			5.96
# 6	4.35	2	2.235	1			19.44
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
# 6	5.00	2	2.235	1			22.35
# 6	5.35	2	2.235	1			23.91
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
ESTRIBOS (#3)	1.68	83	0.560	1			78.09
VG 410							
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
# 6	5.80	2	2.235	1			25.93
ESTRIBOS (#3)	1.28	52	0.560	1			37.27
VG 411							
# 7	9.00	2	3.042	1			54.76
# 7	7.00	2	3.042	1			42.59
# 7	8.00	2	3.042	1			48.67
# 7	8.50	2	3.042	1			51.71
# 4	4.00	1	0.994	1			3.98

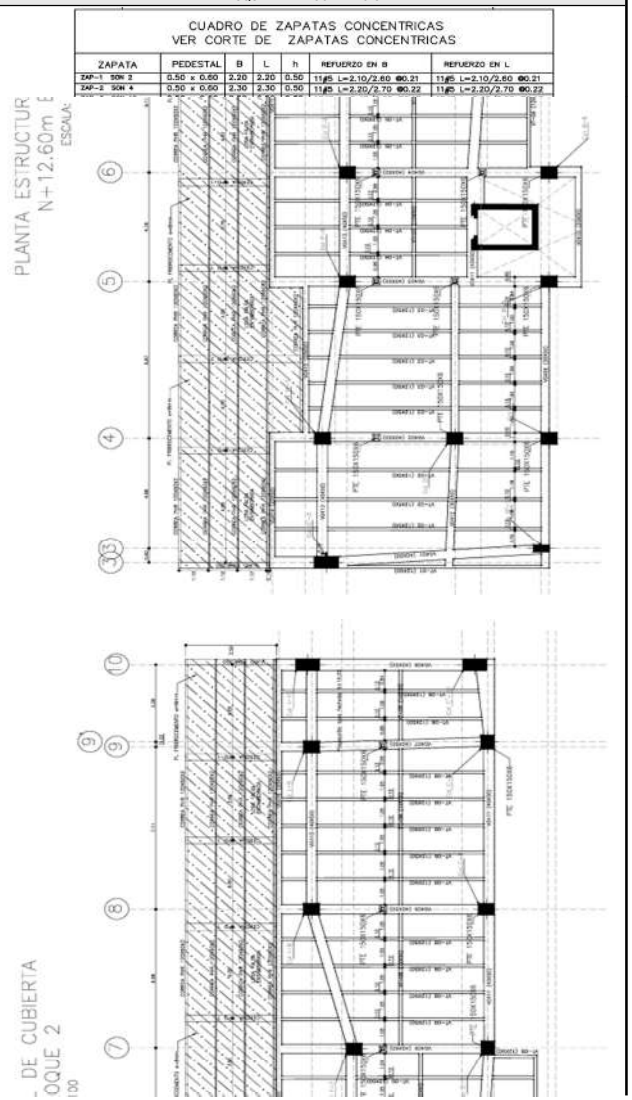

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	10/02/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

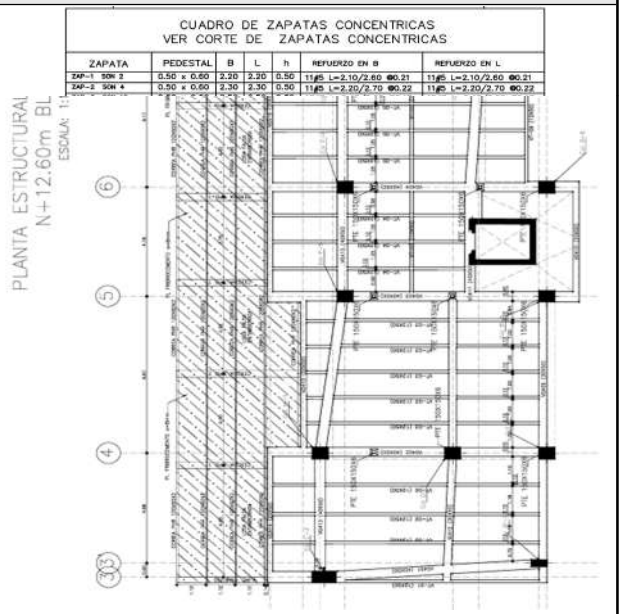

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
# 4	4.00	1	0.994	1			3.98
# 7	8.00	2	3.042	1			48.67
# 7	7.20	2	3.042	1			43.80
# 7	7.60	2	3.042	1			46.24
# 7	9.80	2	3.042	1			59.62
ESTRIBOS (#3)	1.68	179	0.560	1			168.40
VG 412							
# 6	7.50	2	2.235	1			33.53
# 6	9.00	2	2.235	1			40.23
# 6	8.30	2	2.235	1			37.10
# 6	6.00	2	2.235	1			26.82
ESTRIBOS (#3)	1.68	81	0.560	1			76.20
VG 413							
VG 413 # 7	3.65	2	3.042	1			22.21
VG 413 # 7	7.65	2	3.042	1			46.54
VG 413 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 413 # 7	6.50	2	3.042	1			39.55
VG 413 # 7	7.25	2	3.042	1			44.11
VG 413 # 7	7.70	2	3.042	1			46.85
VG 413 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 413 # 7	6.00	1	3.042	1			18.25
VG 413 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 413 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 413 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 413 # 7	7.00	2	3.042	1			42.59
VG 413 # 7	6.00	2	3.042	1			36.50
VG 413 # 7	8.00	2	3.042	1			48.67
VG 413 # 7	5.15	2	3.042	1			31.33
VG 413 # 5	3.65	1	1.552	1			5.66
VG 413 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 413 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 413 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 413 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VG 413 # 4	4.00	1	0.994	1			3.98
VG 413 # 3	1.68	254	0.560	1			238.96
VG 414							
VG 414 # 6	6.50	2	2.235	1			29.06
VG 414 # 6	6.50	2	2.235	1			29.06
VG 414 # 3	1.28	34	0.560	1			24.37
VG 415 # 6	7.75	2	2.235	1			34.64
VG 415 # 6	7.75	2	2.235	1			34.64
VG 415 # 3	1.28	42	0.560	1			30.11
VG 416 # 6	9.00	2	2.235	1			40.23
VG 416 # 6	7.50	2	2.235	1			33.53
VG 416 # 6	7.50	2	2.235	1			33.53
VG 416 # 6	7.75	2	2.235	1			34.64
VG 416 # 6	5.40	2	2.235	1			24.14
VG 416 # 6	6.00	2	2.235	1			26.82
VG 416 # 6	7.50	2	2.235	1			33.53
VG 416 # 6	7.00	2	2.235	1			31.29
VG 416 # 6	6.85	2	2.235	1			30.62
VG 416 # 4	3.00	1	0.994	1			2.98

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VG 416 # 3	1.28	178	0.560	1			127.59
NERVIOS							
VT 01 # 5	7.15	1	1.552	1			11.10
VT 01 # 5	5.00	1	1.552	1			7.76
VT 01 # 5	5.55	1	1.552	1			8.61
VT 01 # 5	6.60	1	1.552	1			10.24
VT 01 # 3	0.62	63	0.560	1			21.87
VT 02 # 5	7.15	1	1.552	3			33.29
VT 02 # 5	5.00	1	1.552	3			23.28
VT 02 # 5	5.55	1	1.552	3			25.84
VT 02 # 5	6.60	1	1.552	3			30.73
VT 02 # 3	0.62	63	0.560	3			65.62
VT 03 # 5	4.70	1	1.552	5			36.47
VT 03 # 5	6.70	1	1.552	5			51.99
VT 03 # 5	4.50	1	1.552	5			34.92
VT 03 # 5	6.50	1	1.552	5			50.44
VT 03 # 3	0.62	55	0.560	5			95.48
VT 04 # 6	8.90	1	2.235	3			59.67
VT 04 # 5	8.80	1	1.552	3			40.97
VT 04 # 4	4.00	1	0.994	3			11.93
VT 04 # 3	0.62	45	0.560	3			46.87
VT 05 # 5	4.00	1	1.552	4			24.83
VT 05 # 5	6.00	1	1.552	4			37.25
VT 05 # 5	5.50	1	1.552	4			34.14
VT 05 # 5	3.85	1	1.552	4			23.90
VT 05 # 5	7.50	1	1.552	4			46.56
VT 05 # 3	0.62	59	0.560	4			81.94
VT 06 # 6	8.85	1	2.235	11			217.58
VT 06 # 5	8.75	1	1.552	11			149.38
VT 06 # 4	4.00	1	0.994	11			43.74
VT 06 # 3	0.62	50	0.560	11			190.96
VT 07 # 5	5.70	1	1.552	1			8.85
VT 07 # 5	7.00	1	1.552	1			10.86
VT 07 # 5	6.55	1	1.552	1			10.17
VT 07 # 5	6.00	1	1.552	1			9.31
VT 07 # 3	0.62	68	0.560	1			23.61
VT 08 # 6	4.00	1	2.235	1			8.94
VT 08 # 6	4.00	1	2.235	1			8.94
VT 08 # 6	9.00	1	2.235	1			20.12
VT 08 # 5	9.50	1	1.552	1			14.74
VT 08 # 5	9.00	1	1.552	1			13.97
VT 08 # 5	6.50	1	1.552	1			10.09
VT 08 # 5	4.00	1	1.552	1			6.21
VT 08 # 3	0.62	108	0.560	1			37.50
VT 09 # 5	6.00	1	1.552	1			9.31
VT 09 # 5	5.00	1	1.552	1			7.76
VT 09 # 5	6.00	1	1.552	1			9.31
VT 09 # 5	5.00	1	1.552	1			7.76
VT 09 # 3	0.62	55	0.560	1			19.10
GARITA							

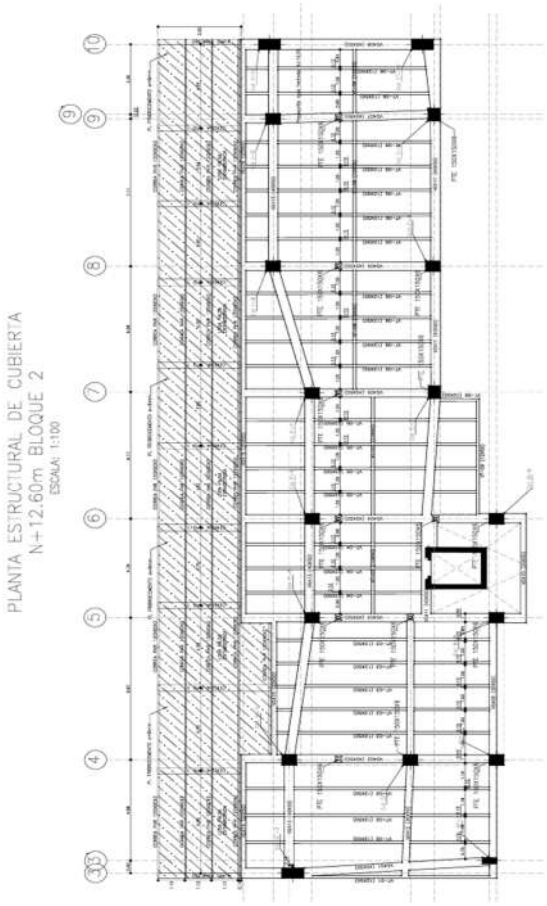

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO		CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				


UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
VIGAS AEREAS							
VG 201 # 4	3.10	3.00	0.994	1			9.24
VG 201 # 4	3.10	3.00	0.994	1			9.24
VG 201 # 3	0.98	34.00	0.560	1			18.66
VG 202 # 4	2.70	3.00	0.994	2			16.10
VG 202 # 4	2.70	3.00	0.994	2			16.10
VG 202 # 3	0.98	20.00	0.560	2			21.95
VG 203 # 4	1.30	2	0.994	1			2.58
VG 203 # 4	1.30	2	0.994	1			2.58
VG 203 # 3	0.98	6	0.560	1			3.29
VG 204 # 4	2.35	2	0.994	2			9.34
VG 204 # 4	2.35	2	0.994	2			9.34
VG 204 # 3	0.98	20	0.560	2			21.95
VG 301 # 4	3.10	3	0.994	1			9.24
VG 301 # 4	3.10	3	0.994	1			9.24
VG 301 # 3	0.98	34	0.560	1			18.66
VG 302 # 4	2.70	3	0.994	2			16.10
VG 302 # 4	2.70	3	0.994	2			16.10
VG 302 # 3	0.98	20	0.560	2			21.95
VG 303 # 5	1.30	2	1.552	1			4.04
VG 303 # 5	1.30	2	1.552	1			4.04
VG 303 # 5	0.98	6	0.560	1			3.29
NERVIOS							
VT 01 # 4	2.50	1	0.994	1			2.49
VT 01 # 4	2.50	1	0.994	1			2.49
VT 01 # 2	0.42	20	0.250	1			2.10
VT 02 # 4	2.35	1	0.994	1			2.34
VT 02 # 4	2.35	1	0.994	1			2.34
VT 02 # 2	0.42	14	0.250	1			1.47
VT 04 # 4	1.70	1	0.994	1			1.69
VT 04 # 4	1.70	1	0.994	1			1.69
VT 04 # 2	0.42	12	0.250	1			1.26
VT 01 # 4	2.50	1	0.994	1			2.49
VT 01 # 4	2.50	1	0.994	1			2.49
VT 01 # 2	0.22	16	0.250	1			0.88
VT 02 # 4	3.50	1	0.994	1			3.48
VT 02 # 4	3.50	1	0.994	1			3.48
VT 02 # 2	0.22	23	0.250	1			1.27
VT 03 # 4	2.30	1	0.994	1			2.29
VT 03 # 5	2.45	1	1.552	1			3.80
VT 04 # 2	0.22	14	0.250	1			0.77
ASCENSOR							
Zap # 4	3.70	18	0.994	1			66.20
Zap # 4	3.30	18	0.994	1			59.04
Placa # 4	4.70	2	0.994	1			9.34
Placa # 4	2.15	2	0.994	1			4.27
Muro # 4	15.12	180	0.994	1			2705.27
Muro # 4	14.00	190	0.994	1			2644.04
MURO DE RETENIDOS							




PLANTA ESTRUCTURAL DE LOSA DE CUBIERTA N+6.90m
ESCALA: 1:50

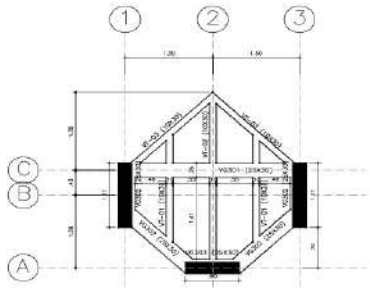

PLANTA ESTRUCTURAL DE LOSA DE CUBIERTA N+6.90m
ESCALA: 1:50

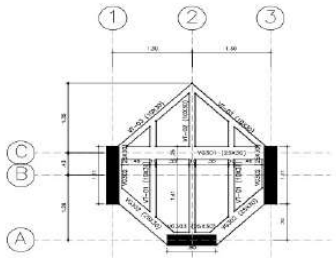



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	10/02/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				


UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
MALLA ELECTROSOLDADA D63	1.00		13.135	14.1			185.20
BLOQUE N°1 ESCALERAS							
TRAMO 1 NIVEL 1							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	63		Kg	38.81
Varilla 1/2"	1.4		0.990	8		Kg	11.09
Varilla 3/4"	1.25		2.230	12		Kg	33.45
DESCANSO							
Varilla 1/2"	2.53		0.990	16		Kg	40.08
Varilla 1/2"	1.9		0.990	18		Kg	33.86
Varilla 1/2"	1.55		0.990	18		Kg	27.621
TRAMO 2 NIVEL 1							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	53		Kg	32.648
Varilla 1/2"	0.15		0.990	8		Kg	1.188
Varilla 3/4"	0.35		2.230	12		Kg	9.37
NIVEL 2							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	44		Kg	27.10
Varilla 1/2"	0.85		0.990	8		Kg	6.73
Varilla 3/4"	0.3		2.230	12		Kg	8.03
DESCANSO							
Varilla 1/2"	2.53		0.990	16		Kg	40.08
Varilla 1/2"	1.9		0.990	18		Kg	33.86
Varilla 1/2"	1.55		0.990	18		Kg	27.62
TRAMO 2 NIVEL 2							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	48		Kg	29.57
Varilla 1/2"	5.55		0.990	8		Kg	43.96
Varilla 3/4"	4.9		2.230	12		Kg	131.12











REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	10/02/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
BLOQUE N°2 ESCALERAS							
NIVEL 1							302.14
Varilla 3/8"	1.1		0.560	40		Kg	24.64
Varilla 1/2"	0.5		0.990	8		Kg	3.96
Varilla 5/8"	0.45		1.550	8		Kg	5.58
DESCANSO							
Varilla 1/2"	0.25		0.990	8		Kg	1.98
Varilla 1/2"	0.25		0.990	8		Kg	1.98
Varilla 5/8"	2.1		1.550	8		Kg	26.04
TRAMO 2 NIVEL 1							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	37		Kg	22.79
Varilla 1/2"	5.15		0.990	8		Kg	40.79
Varilla 5/8"	4.65		1.550	8		Kg	57.66
DESCANSO							
Varilla 1/2"	0.3		0.990	8		Kg	2.38
Varilla 5/8"	1.8		1.550	8		Kg	22.32
Varilla 5/8"	2.1		1.550	8		Kg	26.04
TRAMO 3 NIVEL 1							
NIVEL 1							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	33		Kg	20.33
Varilla 1/2"	0.05		0.990	8		Kg	0.40
Varilla 5/8"	3.65		1.550	8		kg	45.26
NIVEL 2							445.58
Varilla 3/8"	1.1		0.560	34		Kg	20.94
Varilla 1/2"	4.1		0.990	8		Kg	32.47
Varilla 5/8"	4.4		1.550	8		Kg	54.56

CUADRO DE ZAPATAS CONCENTRICAS
VER CORTE DE ZAPATAS CONCENTRICAS

ZAPATA	PEDESTAL	B	L	h	REFUERZO EN B	REFUERZO EN L
ZAP-1 SON 2	0.50 x 0.60	2.20	2.20	0.50	11Ø5 L=2.10/2.60 @0.21	11Ø5 L=2.10/2.60 @0.21
ZAP-2 SON 4	0.50 x 0.60	2.30	2.30	0.50	11Ø5 L=2.20/2.70 @0.22	11Ø5 L=2.20/2.70 @0.22

TRAMO 2 NIVEL 1
ESCALA: 1:50



TRAMO 3 NIVEL 1
ESCALA: 1:50




REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	10/02/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
DESCANSO							
Varilla 1/2"	1.7		0.990	8		Kg	13.46
Varilla 1/2"	1.7		0.990	8		Kg	13.46
Varilla 5/8"	2.1		1.550	8		Kg	26.04
TRAMO 2 NIVEL 2							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	37		Kg	22.79
Varilla 1/2"	5.15		0.990	8		Kg	40.79
Varilla 5/8"	4.65		1.550	8		Kg	57.66
DESCANSO							
Varilla 1/2"	1.7		0.990	8		Kg	13.46
Varilla 5/8"	1.8		1.550	8		Kg	22.32
Varilla 5/8"	2.1		1.550	8		Kg	26.04
TRAMO 3 NIVEL 2							
Varilla 3/8"	1.1		0.560	28		Kg	17.25
Varilla 1/2"	4.15		0.990	8		Kg	32.87
Varilla 5/8"	4.15		1.550	8		Kg	51.46
TANQUE DE ALMACENAMIENTO							
LOSA INFERIOR							
#5	7.4	98	1.556	1			1128.41
#5	8.35	76	1.556	1			987.44
#5	2.4	38	1.556	1			141.91
#5	1.8	38	1.556	1			106.43
MUROS							
#5	3.65	212	1.556	1			1204.03
#5	3.85	84	1.556	1			503.21
#4	7	62	0.994	1			431.40

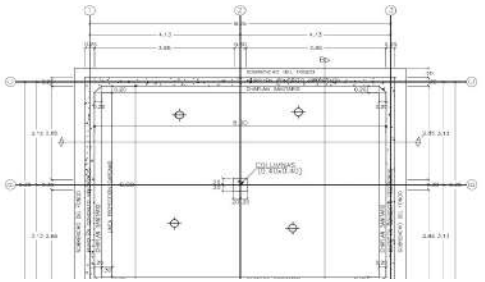

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	10/02/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	144,049.85	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA		UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD(m)	CANT DE PIEZAS	PESO (Kg/m)				ACUMULADO
#4	9	60	0.994	1			536.76
#4	1.5	2	0.994	1			2.98
CHAFLAN							
#4	1.45	140	0.994	1			201.78
#4	1.35	62	0.994	1			83.20
LOSA SUPERIOR							
#4	8.8	56	0.994	1			489.84
#4	6.8	72	0.994	1			486.66
VIGAS							
#6	8.9	6	2.235	1			119.35
#4	3	2	0.994	1			5.96
#3	1	246	0.560	1			137.76
#5	6.9	18	1.552	1			192.76
COLUMNAS							
#6	3.85	8	2.235	1			68.84
#3	1.4	27	0.560	1			21.17
						TOTAL	144,049.85

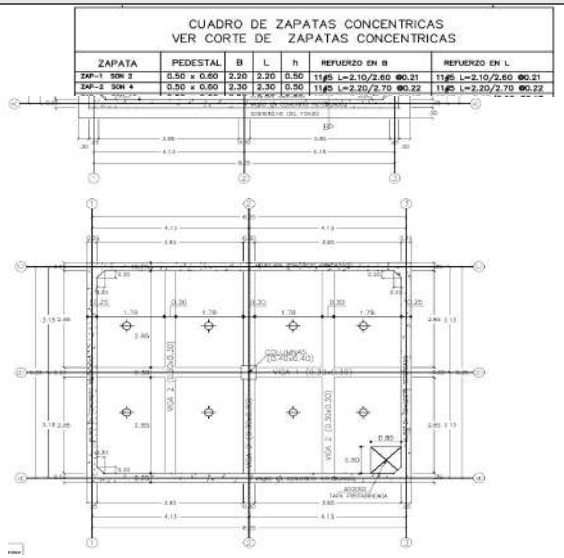

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















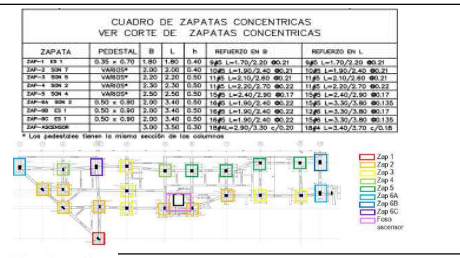



CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA					
	DEPARTAMENTO DE SUCRE					
	MUNICIPIO DE COROZAL					
	MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025		
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						




















CUADRO DE ZAPATAS CONCENTRICAS
VER CORTE DE ZAPATAS CONCENTRICAS

ZAPATA	PEDESTAL	B	L	h	REFUERZO EN B	REFUERZO EN L
ZAP-1 SON 2	0.50 x 0.60	2.30	2.30	0.50	11ø5 L=2.10/2.60 @0.21	11ø5 L=2.10/2.60 @0.21
ZAP-2 SON 4	0.50 x 0.60	2.30	2.30	0.50	11ø5 L=2.20/2.70 @0.22	11ø5 L=2.20/2.70 @0.22

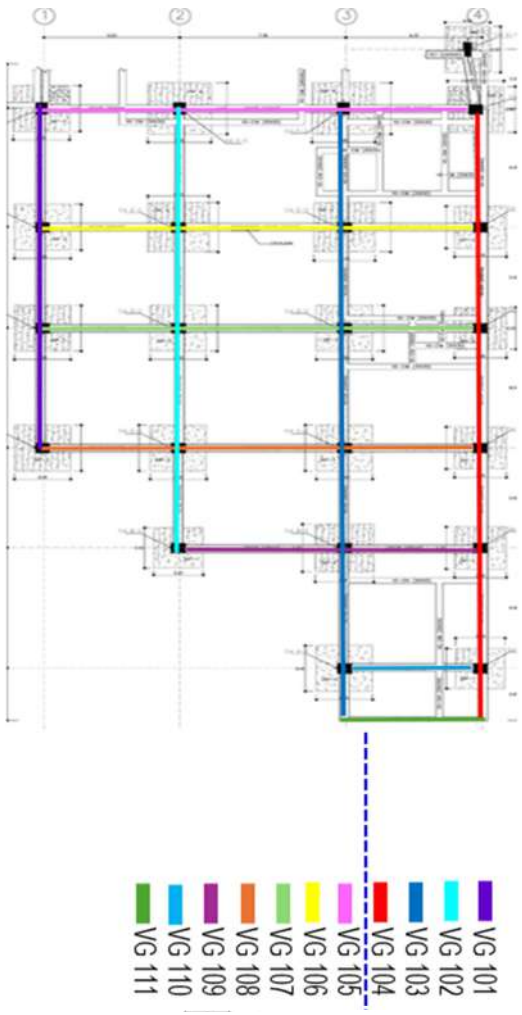

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA					
	DEPARTAMENTO DE SUCRE					
	MUNICIPIO DE COROZAL					
	MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						















CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





















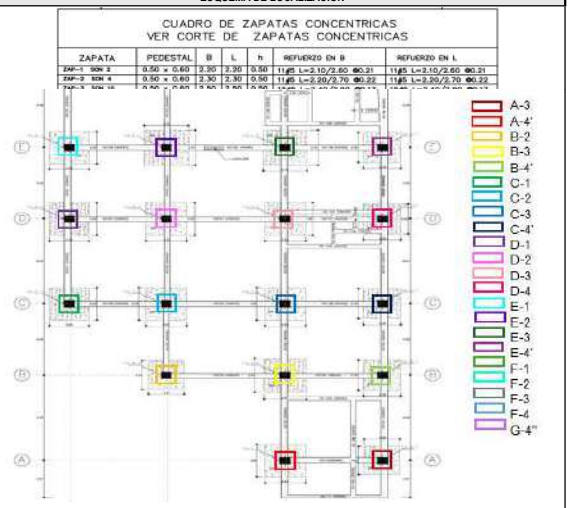

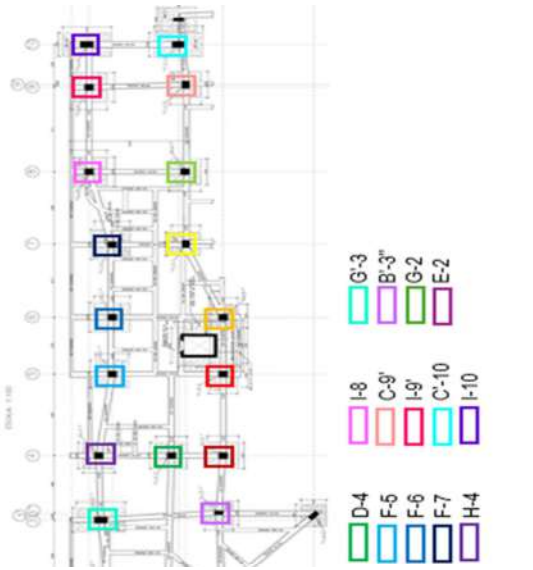

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

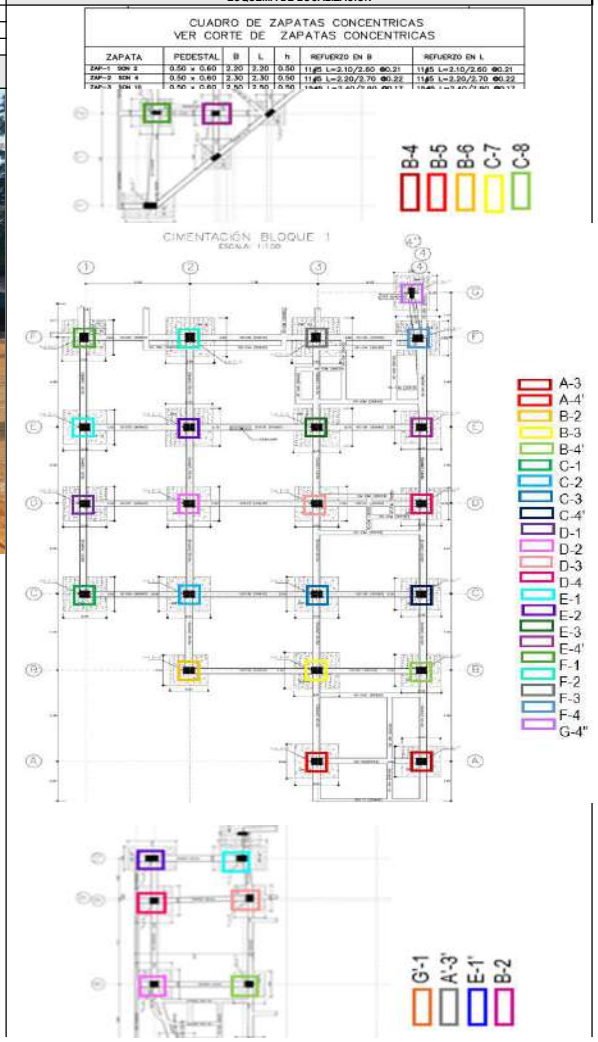

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						















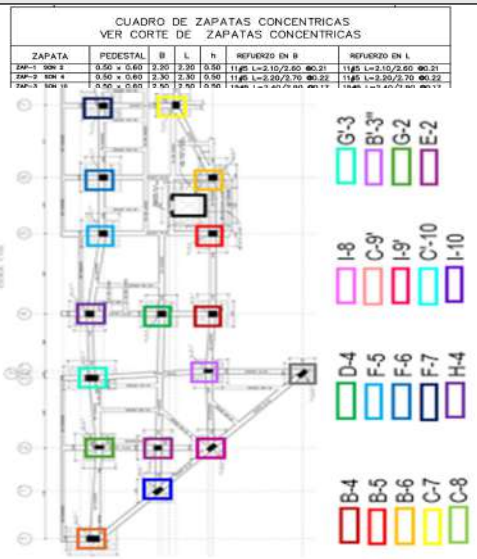

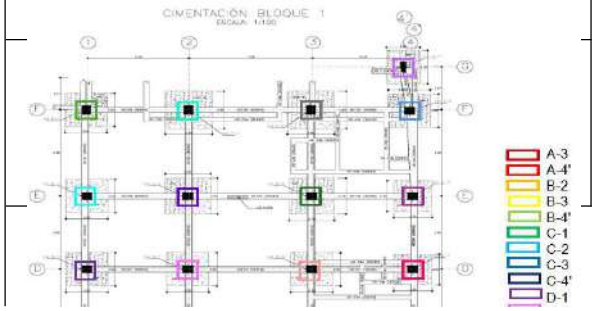

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025		
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".						
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-		
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg		
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI						
REGISTRO FOTOGRÁFICO							















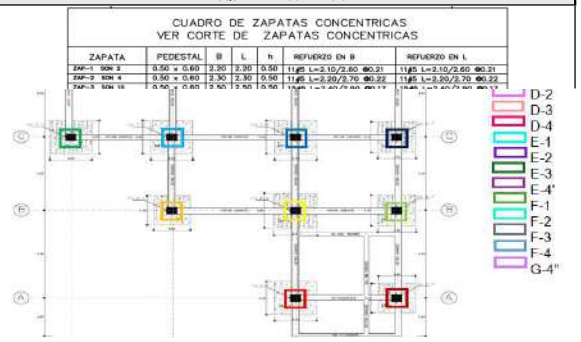

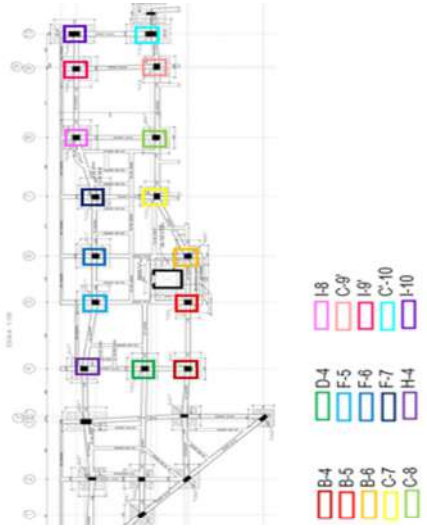


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA					
	DEPARTAMENTO DE SUCRE					
	MUNICIPIO DE COROZAL					
	MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	Kg	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						









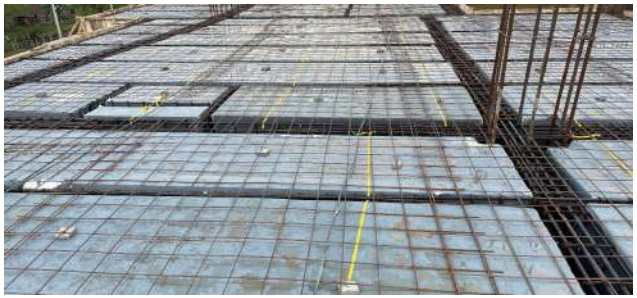










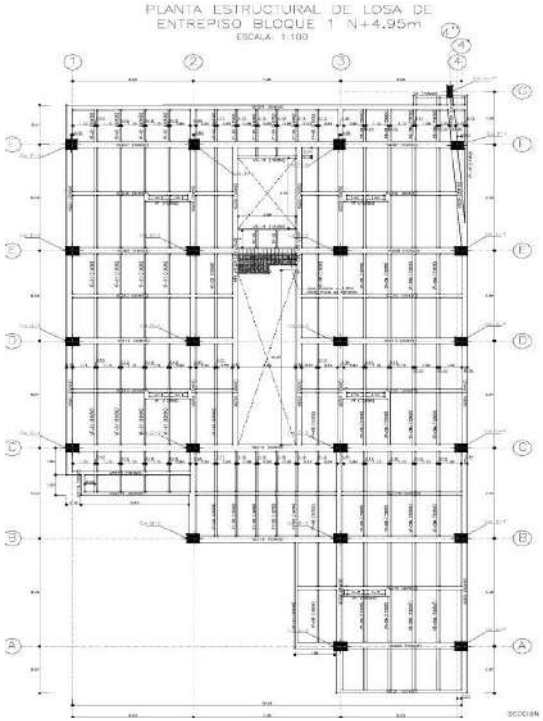

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**Kg**	
3.04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				



REGISTRO FOTOGRÁFICO









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**6**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI**	**UNIDAD**	**m³**	
3.02	Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI				


REGISTRO FOTOGRÁFICO










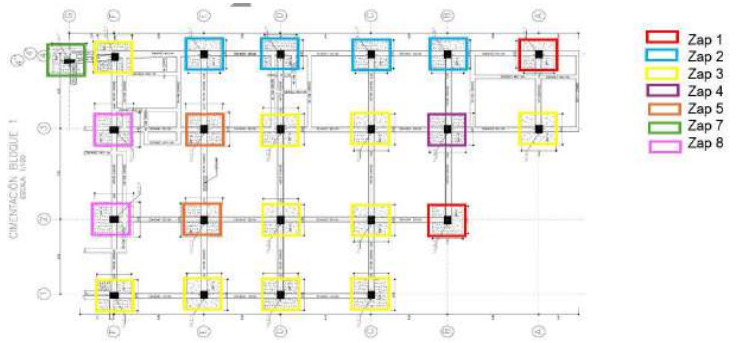











Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 92.85
ITEM	3	Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI	UNIDAD: m³
3.03	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BLOQUE 1						
VG 101	18.55	0.40	0.4			2.97
VG 102	24.07	0.40	0.4			3.85
VG 103	33.53	0.40	0.4			5.36
VG 104	33.53	0.40	0.4			5.36
VG 105	19.44	0.40	0.4			3.11
VG 106	19.44	0.40	0.4			3.11
VG 107	19.44	0.40	0.4			3.11
VG 108	19.44	0.40	0.4			3.11
VG 109	13.41	0.40	0.4			2.15
VG 110	6.03	0.40	0.4			0.96
VG 111	6.03	0.30	0.4			0.72
BLOQUE 2						
VG 101	10.51	0.40	0.4			1.68
VG 102	16.88	0.40	0.4			2.70
VG 103	10.19	0.40	0.4			1.63
VG 104	11.73	0.40	0.4			1.88
VG 105	11.73	0.40	0.4			1.88
VG 106	7.79	0.40	0.4			1.25
VG 107	7.79	0.40	0.4			1.25
VG 108	7.99	0.40	0.4			1.28
VG 109	7.99	0.40	0.4			1.28
VG 110	22.49	0.4	0.4			3.60
VG 111	4.38	0.2	0.4			0.35
VG 112	23.1	0.4	0.4			3.70
VG 113	21.8	0.4	0.4			3.49
VG 114	53.81	0.4	0.4			8.61
VG 115	18.87	0.2	0.4			1.51
VG 116	6.47	0.2	0.4			0.52
VG 117	27.35	0.2	0.4			2.19
VG 118	23.1	0.4	0.4			3.70

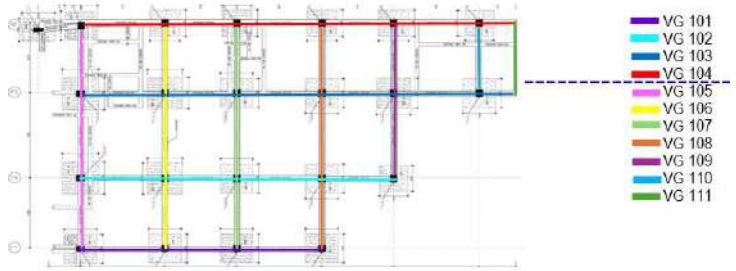

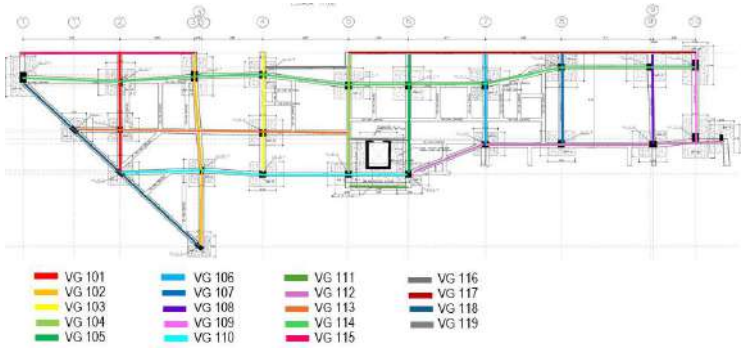

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**92.85**		
ITEM	**3**	**Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI**	**UNIDAD**	**m³**
3.03	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
VG 119	**4.38**	**0.4**	**0.4**			**0.70**
GARITAS						
VG101	**7.33**	**0.30**	**0.3**			**0.66**
ADICIONALES BLOQUES 1 Y 2						**15.20**
						92.85



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3** — **Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI**	**UNIDAD**	**m³**
3.03	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI		


REGISTRO FOTOGRÁFICO







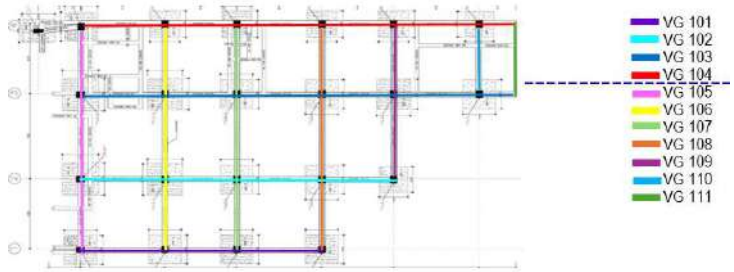

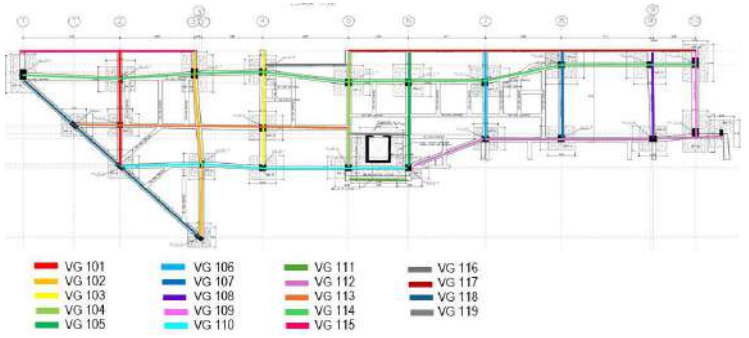CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI**		**UNIDAD**	**m³**	
3.03	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI					

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BLOQUE 1						
PEDESTALES						
A-3	2.45	0.50	0.60			0.74
A-4'	2.45	0.50	0.60			0.74
B-2	2.45	0.50	0.60			0.74
B-3	2.45	0.50	0.60			0.74
B-4'	2.45	0.50	0.60			0.74
C-1	2.45	0.50	0.60			0.74
C-2	2.45	0.50	0.60			0.74
C-3	2.45	0.50	0.60			0.74
C-4'	2.45	0.50	0.60			0.74
D-1	2.45	0.50	0.60			0.74
D-2	2.45	0.50	0.60			0.74
D-3	2.45	0.50	0.60			0.74
D-4'	2.45	0.50	0.60			0.74
E-1	2.45	0.50	0.60			0.74
E-2	2.45	0.50	0.60			0.74
E-3	2.45	0.50	0.60			0.74
E-4'	2.45	0.50	0.60			0.74
F-1	2.45	0.50	0.60			0.74
F-2	2.45	0.50	0.60			0.74
F-3	2.45	0.50	0.60			0.74
F-4	2.45	0.50	0.60			0.74
G-4"	2.45	0.25	0.70			0.43

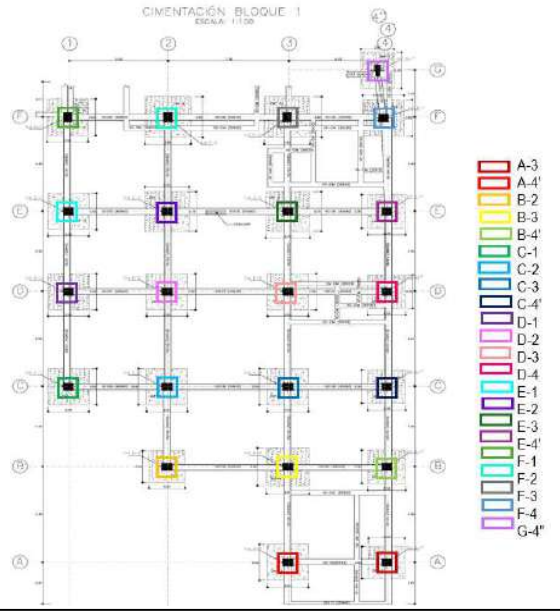

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
COLUMNAS						
A-3	4.50	0.50	0.60			1.35
A-4'	4.50	0.50	0.60			1.35
B-2	4.50	0.50	0.60			1.35
B-3	4.50	0.50	0.60			1.35
B-4'	4.50	0.50	0.60			1.35
C-1	4.50	0.50	0.60			1.35
C-2	4.50	0.50	0.60			1.35
C-3	4.50	0.50	0.60			1.35
C-4'	4.50	0.50	0.60			1.35
D-1	4.50	0.50	0.60			1.35
D-2	4.50	0.50	0.60			1.35
D-3	4.50	0.50	0.60			1.35
D-4'	4.50	0.50	0.60			1.35
E-1	4.50	0.50	0.60			1.35
E-2	4.50	0.50	0.60			1.35
E-3	4.50	0.50	0.60			1.35
E-4'	4.50	0.50	0.60			1.35
F-1	4.50	0.50	0.60			1.35
F-2	4.50	0.50	0.60			1.35
F-3	4.50	0.50	0.60			1.35
F-4	4.50	0.50	0.60			1.35
G-4"	4.50	0.25	0.70			0.79

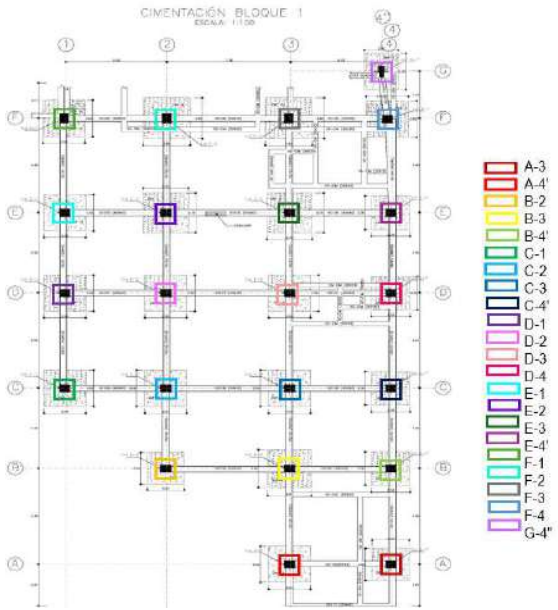

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 2						
A-3	3.95	0.50	0.60			1.19
A-4'	3.95	0.50	0.60			1.19
B-2	3.95	0.50	0.60			1.19
B-3	3.95	0.50	0.60			1.19
B-4'	3.95	0.50	0.60			1.19
C-1	3.95	0.50	0.60			1.19
C-2	3.95	0.50	0.60			1.19
C-3	3.95	0.50	0.60			1.19
C-4'	3.95	0.50	0.60			1.19
D-1	3.95	0.50	0.60			1.19
D-2	3.95	0.50	0.60			1.19
D-3	3.95	0.50	0.60			1.19
D-4'	3.95	0.50	0.60			1.19
E-1	3.95	0.50	0.60			1.19
E-2	3.95	0.50	0.60			1.19
E-3	3.95	0.50	0.60			1.19
E-4'	3.95	0.50	0.60			1.19
F-1	3.95	0.50	0.60			1.19
F-2	3.95	0.50	0.60			1.19
F-3	3.95	0.50	0.60			1.19
F-4	3.95	0.50	0.60			1.19
G-4"	3.95	0.25	0.70			0.69

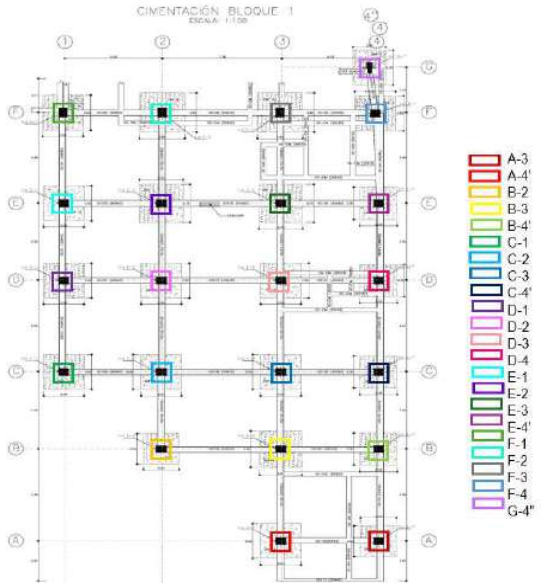

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 3						
A-3	3.70	0.40	0.40			0.59
A-4'	3.70	0.40	0.40			0.59
B-2	3.70	0.40	0.40			0.59
B-3	3.70	0.40	0.40			0.59
B-4'	3.70	0.40	0.40			0.59
C-1	3.70	0.40	0.40			0.59
C-2	3.70	0.40	0.40			0.59
C-3	3.70	0.40	0.40			0.59
C-4'	3.70	0.40	0.40			0.59
D-1	3.70	0.40	0.40			0.59
D-2	3.70	0.40	0.40			0.59
D-3	3.70	0.40	0.40			0.59
D-4'	3.70	0.40	0.40			0.59
E-1	3.70	0.40	0.40			0.59
E-2	3.70	0.40	0.40			0.59
E-3	3.70	0.40	0.40			0.59
E-4'	3.70	0.40	0.40			0.59
F-1	3.70	0.40	0.40			0.59
F-2	3.70	0.40	0.40			0.59
F-3	3.70	0.40	0.40			0.59
F-4	3.70	0.40	0.40			0.59
G-4"	5.10	0.25	0.39			0.50

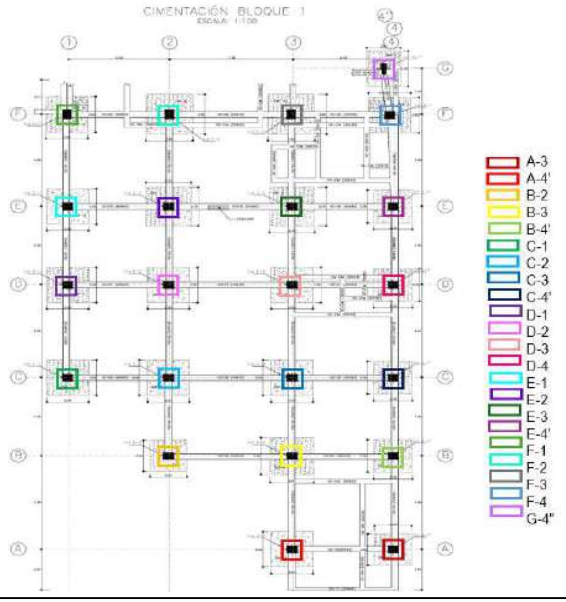

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 176.80
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: m³
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BLOQUE 2						
PEDESTALES						
B-4	2.45	0.50	0.60			0.74
B-5	2.45	0.50	0.60			0.74
B-6	2.45	0.50	0.60			0.74
C-7	2.45	0.50	0.60			0.74
C-8	2.45	0.50	0.60			0.74
D-4	2.45	0.50	0.60			0.74
F-5	2.45	0.50	0.60			0.74
F-6	2.45	0.50	0.60			0.74
F-7	2.45	0.50	0.60			0.74
H-4	2.45	0.50	0.60			0.74
I-8	2.45	0.50	0.60			0.74
C-9'	2.45	0.50	0.60			0.74
I-9	2.45	0.50	0.60			0.74
C'-10	2.45	0.50	0.90			1.10
I-10	2.45	0.50	0.90			1.10
G'-3	2.45	0.50	0.90			1.10
B'-3"	2.45	0.30	0.60			0.44
G-2	2.45	0.50	0.90			1.10
E-2	2.45	0.50	0.50			0.61

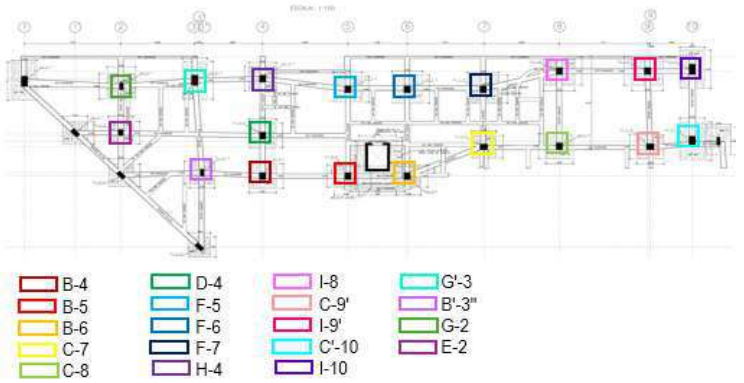

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 1						
B-4	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
B-5	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
B-6	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
C-7	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
C-8	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
D-4	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
F-5	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
F-6	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
F-7	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
H-4	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
I-8	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
C-9'	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
I-9	**4.50**	**0.50**	**0.60**			**1.35**
C'-10	**4.50**	**0.50**	**0.90**			**2.03**
I-10	**4.50**	**0.50**	**0.90**			**2.03**
G'-3	**4.50**	**0.50**	**0.90**			**2.03**
B'-3"	**4.50**	**0.30**	**0.60**			**0.81**
G-2	**4.50**	**0.50**	**0.90**			**2.03**
E-2	**4.50**	**0.50**	**0.50**			**1.13**

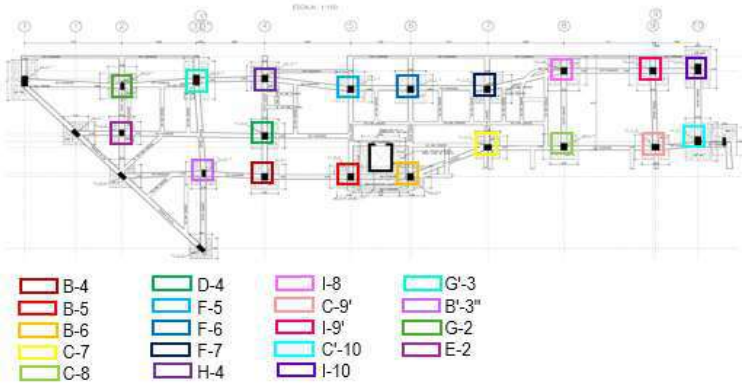

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	176.80
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	m^3
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
PISO 2						
B-4	3.95	0.50	0.60			1.19
B-5	3.95	0.50	0.60			1.19
B-6	3.95	0.50	0.60			1.19
C-7	3.95	0.50	0.60			1.19
C-8	3.95	0.50	0.60			1.19
D-4	3.95	0.50	0.60			1.19
F-5	3.95	0.50	0.60			1.19
F-6	3.95	0.50	0.60			1.19
F-7	3.95	0.50	0.60			1.19
H-4	3.95	0.50	0.60			1.19
I-8	3.95	0.50	0.60			1.19
C-9'	3.95	0.50	0.60			1.19
I-9	3.95	0.50	0.60			1.19
C'-10	3.95	0.50	0.90			1.78
I-10	3.95	0.50	0.90			1.78
G'-3	3.95	0.50	0.90			1.78
B'-3"	3.95	0.30	0.60			0.71
G-2	3.95	0.50	0.90			1.78
G'-1	3.95	0.50	0.90			1.78
A'-3'	3.95	0.35	0.70			0.97
E-1'	3.95	0.35	0.70			0.97
B-2	3.95	0.35	0.70			0.97
E-2	3.95	0.40	0.50			0.79

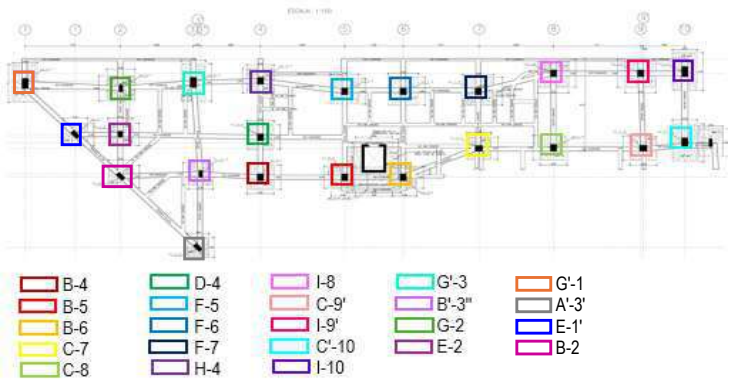

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 3						
B-4	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
B-5	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
B-6	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
C-7	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
C-8	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
D-4	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
F-5	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
F-6	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
F-7	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
H-4	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
I-8	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
C-9'	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
I-9	**3.70**	**0.50**	**0.60**			**1.11**
C'-10	**3.70**	**0.50**	**0.90**			**1.67**
I-10	**3.70**	**0.50**	**0.90**			**1.67**

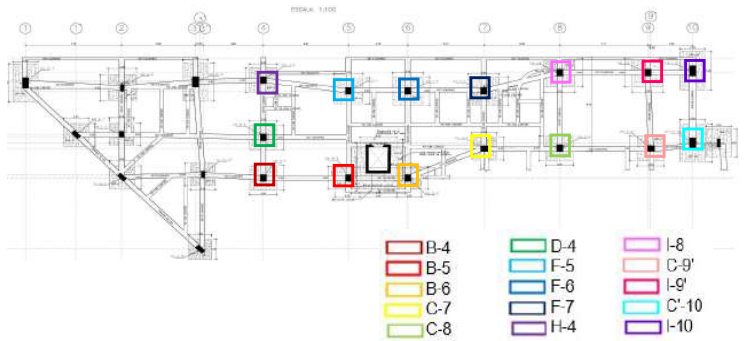

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**176.80**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
GARITA						
D-2	**4.70**	**1.50**	**0.20**			**1.41**
B-1	**4.70**	**1.10**	**0.20**			**1.03**
B-3	**4.70**	**1.10**	**0.20**			**1.03**
A-2	**4.70**	**0.80**	**0.20**			**0.75**
						176.80



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C


Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI					


REGISTRO FOTOGRÁFICO




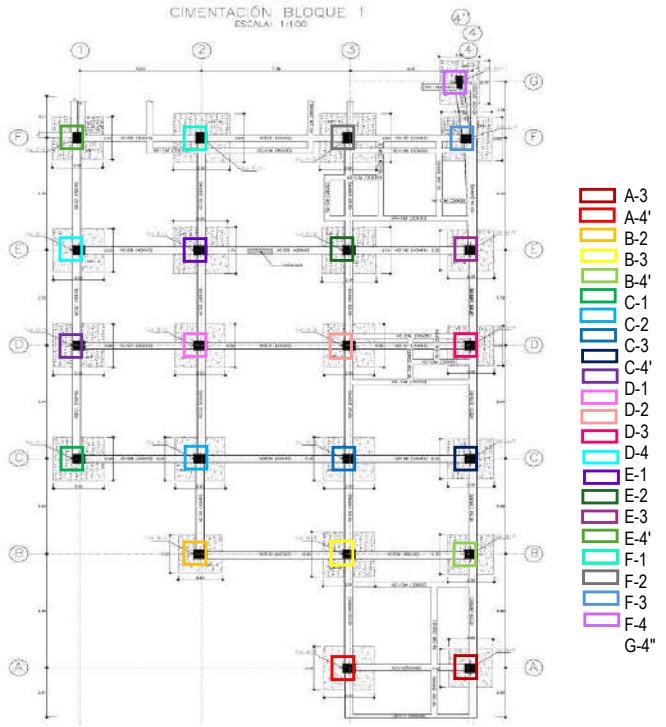

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						







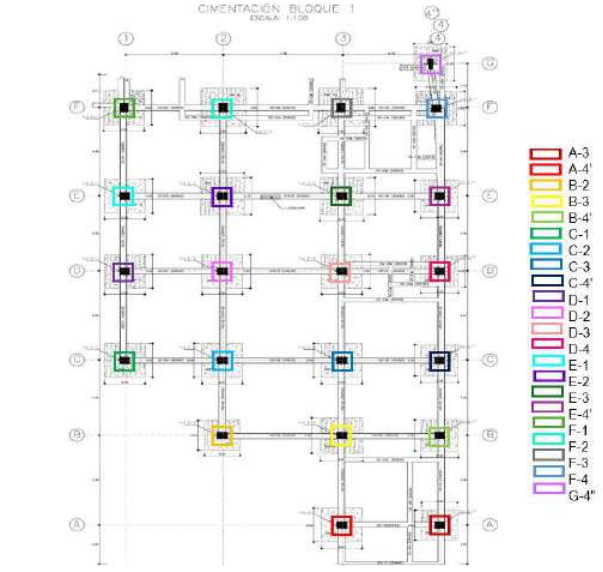

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						





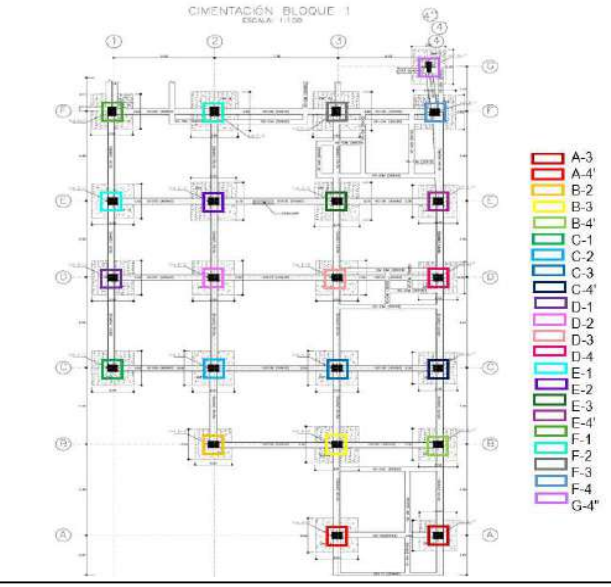


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						












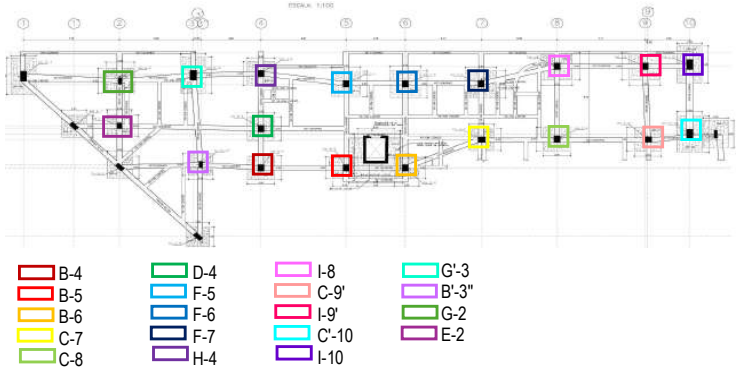


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	m³	
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				



REGISTRO FOTOGRÁFICO



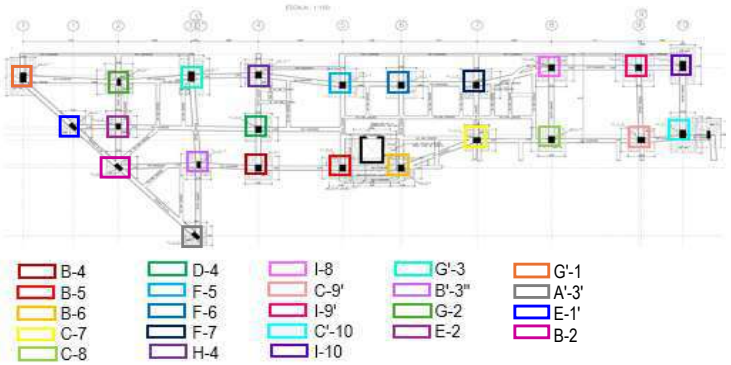



CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						









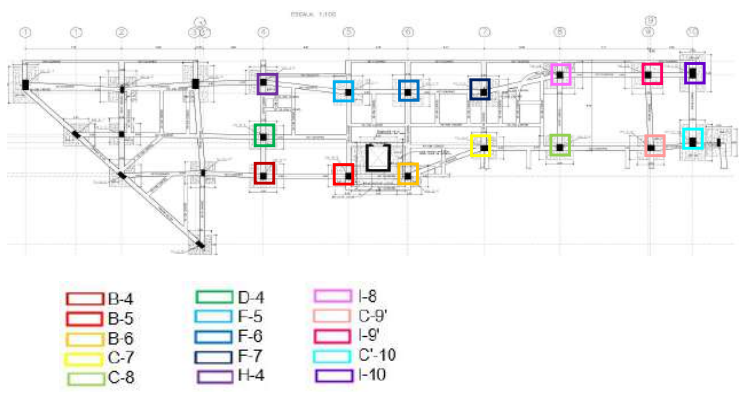

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

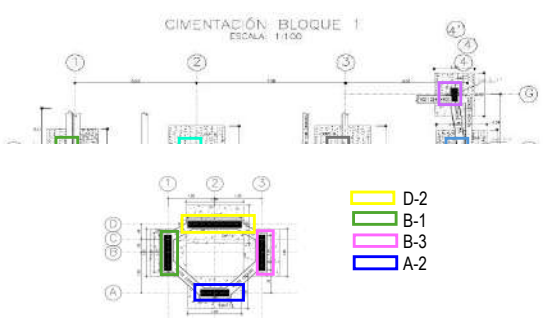

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**492.29**		
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI		

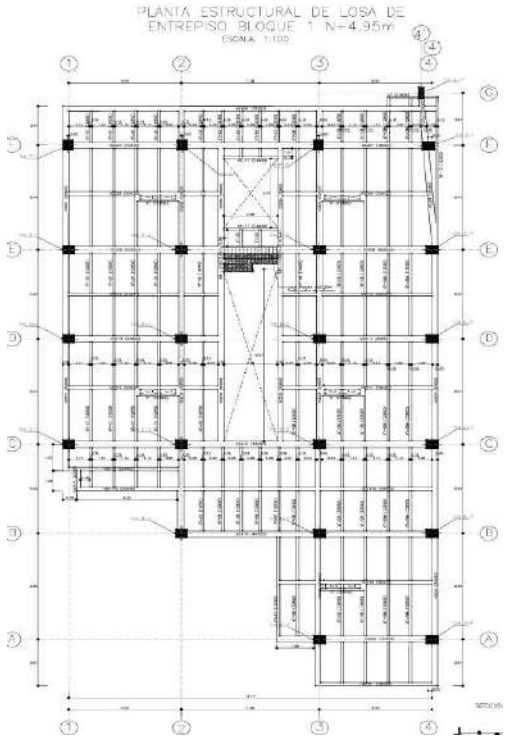

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
VIGAS						
BLOQUE 1						
LOSA DE ENTREPISO 2						
VG 201	24.74	0.3	0.5	1		3.71
VG 202	29.48	0.3	0.5	1		4.42
VG 203	39.54	0.3	0.5	1		5.93
VG 204	39.54	0.3	0.5	1		5.93
VG 205	24.07	0.3	0.5	2		7.22
VG 206	20.05	0.3	0.5	1		3.01
VG 207	20.05	0.4	0.5	1		4.01
VG 208	15.84	0.2	0.5	1		1.58
VG 209	23.44	0.4	0.5	1		4.69
VG 210	2.83	0.3	0.5	1		0.42
VG 211	2.83	0.3	0.5	1		0.42
VG 212	15.98	0.2	0.5	1		1.60
VG 213	20.61	0.4	0.5	1		4.12
VG 214	15.98	0.2	0.5	1		1.60
VG 215	23.44	0.4	0.5	1		4.69
VG 216	6.18	0.2	0.5	1		0.62
VG 217A	1.26	0.2	0.5	1		0.13
VG 217B	19.01	0.2	0.5	1		1.90
VG 218	14.01	0.4	0.5	1		2.80
VG 219	8.14	0.2	0.5	1		0.81
VG 220	8.14	0.4	0.5	1		1.63
VG 221	5.95	0.2	0.5	1		0.60


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
LOSA DE ENTREPISO 3						
VG 301	24.74	0.3	0.5	1		3.71
VG 302	29.48	0.3	0.5	1		4.42
VG 303	39.54	0.3	0.5	1		5.93
VG 304	39.54	0.3	0.5	1		5.93
VG 305	24.07	0.3	0.5	2		7.22
VG 306	20.05	0.3	0.5	1		3.01
VG 307	20.05	0.4	0.5	1		4.01
VG 308	15.84	0.2	0.5	1		1.58
VG 309	23.44	0.4	0.5	1		4.69
VG 310	2.83	0.3	0.5	1		0.42
VG 311	2.83	0.3	0.5	1		0.42
VG 312	15.98	0.2	0.5	1		1.60
VG 313	20.61	0.4	0.5	1		4.12
VG 314	15.98	0.2	0.5	1		1.60
VG 315	23.44	0.4	0.5	1		4.69
VG 316	6.18	0.2	0.5	1		0.62
VG 317A	1.26	0.2	0.5	1		0.13
VG 317B	19.01	0.2	0.5	1		1.90
VG 318	14.01	0.4	0.5	1		2.80
VG 319	8.14	0.2	0.5	1		0.81
VG 320	8.14	0.4	0.5	1		1.63
VG 321	5.95	0.2	0.5	1		0.60

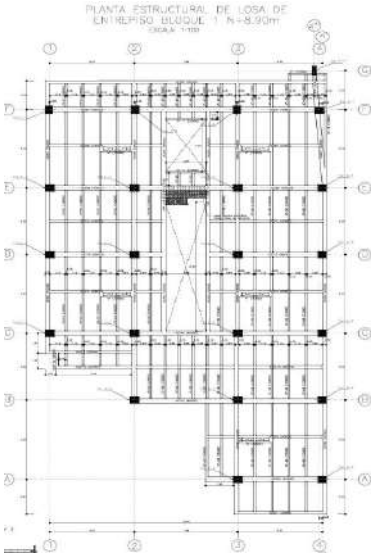

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
CUBIERTA						
VG 401	**24.74**	**0.3**	**0.5**	**1**		**3.71**
VG 402	**29.48**	**0.3**	**0.5**	**1**		**4.42**
VG 403	**39.54**	**0.3**	**0.5**	**1**		**5.93**
VG 404	**39.54**	**0.3**	**0.5**	**1**		**5.93**
VG 405	**24.07**	**0.3**	**0.5**	**2**		**7.22**
VG 406	**20.05**	**0.2**	**0.5**	**1**		**2.01**
VG 407	**20.05**	**0.3**	**0.5**	**1**		**3.01**
VG 408	**20.05**	**0.3**	**0.5**	**1**		**3.01**
VG 409	**2.83**	**0.3**	**0.5**	**1**		**0.42**
VG 410	**17.22**	**0.3**	**0.5**	**2**		**5.17**
VG 411	**20.05**	**0.3**	**0.5**	**1**		**3.01**
VG 412	**5.95**	**0.2**	**0.5**	**1**		**0.60**
VG 413	**14.02**	**0.3**	**0.5**	**1**		**2.10**
VG 414	**10.85**	**0.3**	**0.5**	**1**		**1.63**
VG 415	**8.44**	**0.3**	**0.5**	**1**		**1.27**
VG 416	**6.57**	**0.2**	**0.5**	**1**		**0.66**
VG 417	**9.04**	**0.3**	**0.5**	**1**		**1.36**

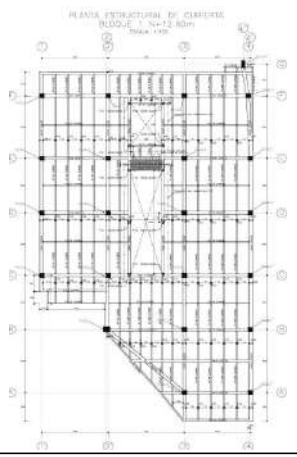

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
NERVIOS						
LOSA DE ENTREPISO 2						
VT 01	25.78	0.12	0.5	4		6.19
VT 02	29.48	0.12	0.5	1		1.77
VT 03	2.41	0.12	0.5	2		0.29
VT 04	2.78	0.12	0.5	2		0.33
VT 05	1.09	0.12	0.5	2		0.13
VT 06	5.17	0.12	0.5	3		0.93
VT 07	12.06	0.12	0.5	1		0.72
VT 08	35.94	0.12	0.5	1		2.16
VT 09	39.54	0.12	0.5	4		9.49
VT 10	9	0.12	0.5	1		0.54
VT 11	2.83	0.12	0.5	2		0.34

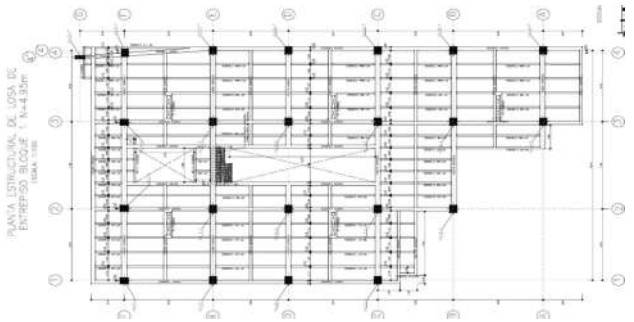

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
LOSA DE ENTREPISO 3						
VT 01	**25.78**	**0.12**	**0.5**	**4**		**6.19**
VT 02	**29.48**	**0.12**	**0.5**	**1**		**1.77**
VT 03	**2.41**	**0.12**	**0.5**	**2**		**0.29**
VT 04	**2.78**	**0.12**	**0.5**	**2**		**0.33**
VT 05	**1.09**	**0.12**	**0.5**	**2**		**0.13**
VT 06	**5.17**	**0.12**	**0.5**	**3**		**0.93**
VT 07	**12.06**	**0.12**	**0.5**	**1**		**0.72**
VT 08	**33.07**	**0.12**	**0.5**	**1**		**1.98**
VT 09	**35.94**	**0.12**	**0.5**	**2**		**4.31**
VT 09A	**36.42**	**0.12**	**0.5**	**2**		**4.37**
VT 10	**9**	**0.12**	**0.5**	**1**		**0.54**
VT 11	**2.83**	**0.12**	**0.5**	**2**		**0.34**

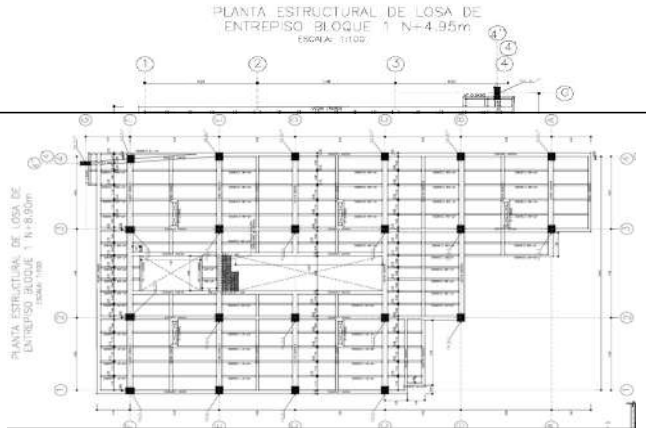

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**492.29**		
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI		



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
CUBIERTA						
VT 01	25.78	0.12	0.5	4		6.19
VT 02	29.48	0.12	0.5	1		1.77
VT 03	2.41	0.12	0.5	2		0.29
VT 04	2.78	0.12	0.5	2		0.33
VT 05	1.09	0.12	0.5	2		0.13
VT 06 A	8.43	0.12	0.5	1		0.51
VT 06 B	9.51	0.12	0.5	1		0.57
VT 06 C	10.86	0.12	0.5	1		0.65
VT 07	12.06	0.12	0.5	1		0.72
VT 08	33.07	0.12	0.5	1		1.98
VT 09	35.94	0.12	0.5	2		4.31
VT 09A	36.42	0.12	0.5	2		4.37
VT 10	9	0.12	0.5	1		0.54
VT 11	2.83	0.12	0.5	2		0.34
VT 12	16.02	0.12	0.5	6		5.77
VT 13	19.03	0.12	0.5	1		1.14
VT 14	16.02	0.12	0.5	1		0.96
BLOQUE 2						
VIGAS						

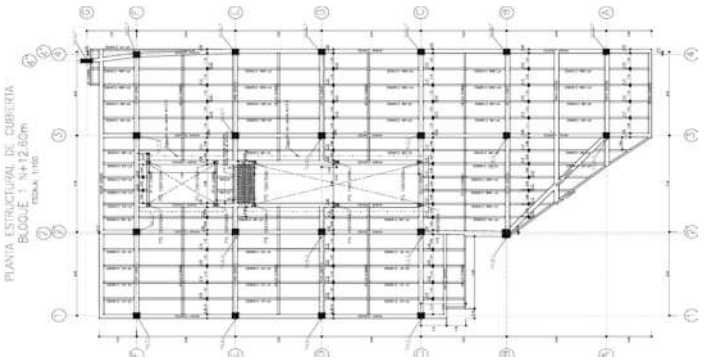

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI		

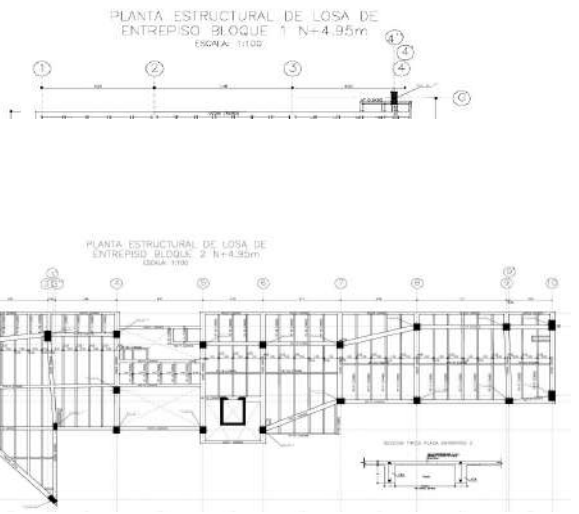

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
LOSA DE ENTREPISO 2						
VG 201	11.01	0.30	0.50	1		1.65
VG 202	17.48	0.30	0.50	1		2.62
VG 203	10.99	0.40	0.50	1		2.20
VG 204	12.13	0.40	0.50	1		2.43
VG 205	12.13	0.40	0.50	1		2.43
VG 206	8.39	0.40	0.50	1		1.68
VG 207	8.39	0.40	0.50	1		1.68
VG 208	8.39	0.40	0.50	1		1.68
VG 209	8.39	0.40	0.50	1		1.68
VG 210	16.51	0.30	0.50	1		2.48
VG 211	5.18	0.20	0.50	1		0.52
VG 212	23.90	0.40	0.50	1		4.78
VG 213	5.18	0.30	0.50	1		0.78
VG 214	22.60	0.30	0.50	1		3.39
VG 215	7.27	0.30	0.50	1		1.09
VG 216	16.99	0.40	0.50	1		3.40
VG 217	30.69	0.40	0.50	1		6.14
VG 218	19.67	0.20	0.50	1		1.97
VG 219	7.27	0.20	0.50	1		0.73
VG 220	26.15	0.20	0.50	1		2.62
VG 221	23.65	0.40	0.50	1		4.73


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**492.29**		
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI		



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
LOSA DE ENTREPISO 3						
VG 301	**11.01**	**0.30**	**0.50**			**1.65**
VG 302	**17.48**	**0.40**	**0.50**			**3.50**
VG 303	**10.99**	**0.30**	**0.50**			**1.65**
VG 304	**12.13**	**0.40**	**0.50**			**2.43**
VG 305	**12.13**	**0.40**	**0.50**			**2.43**
VG 306	**8.39**	**0.40**	**0.50**			**1.68**
VG 307	**8.39**	**0.40**	**0.50**			**1.68**
VG 308	**8.39**	**0.40**	**0.50**			**1.68**
VG 309	**8.39**	**0.40**	**0.50**			**1.68**
VG 310	**18.51**	**0.30**	**0.50**			**2.78**
VG 311	**5.18**	**0.20**	**0.50**			**0.52**
VG 312	**28.36**	**0.40**	**0.50**			**5.67**
VG 313	**22.61**	**0.30**	**0.50**			**3.39**
VG 314	**59.59**	**0.40**	**0.50**			**11.92**
VG 315	**19.67**	**0.20**	**0.50**			**1.97**
VG 316	**7.27**	**0.20**	**0.50**			**0.73**
VG 317	**28.15**	**0.20**	**0.50**			**2.82**
VG 318	**23.65**	**0.40**	**0.50**			**4.73**

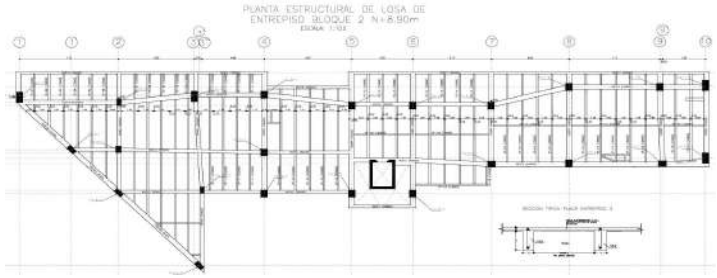

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3** **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI		



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
CUBIERTA						
VG 401	10.68	0.40	0.50			2.14
VG 402	10.99	0.40	0.50			2.20
VG 403	12.13	0.40	0.50			2.43
VG 404	12.13	0.40	0.50			2.43
VG 405	8.39	0.40	0.50			1.68
VG 406	8.39	0.40	0.50			1.68
VG 407	8.39	0.40	0.50			1.68
VG 408	8.34	0.40	0.50			1.67
VG 409	12.85	0.30	0.50			1.93
VG 410	5.18	0.20	0.50			0.52
VG 411	28.36	0.40	0.50			5.67
VG 412	12.65	0.30	0.50			1.90
VG 413	40.77	0.40	0.50			8.15
VG 414	5.87	0.20	0.50			0.59
VG 415	7.27	0.20	0.50			0.73
VG 416	27.75	0.20	0.50			2.78

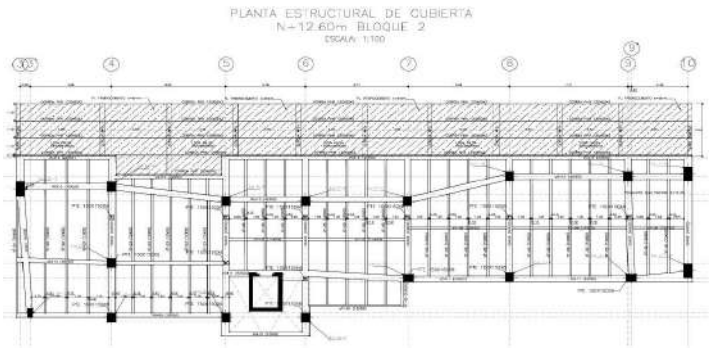


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
NERVIOS						
LOSA DE ENTREPISO 2						
VT 01	4.15	0.12	0.50			0.25
VT 02	5.31	0.12	0.50			0.32
VT 03	6.47	0.12	0.50			0.39
VT 04	7.64	0.12	0.50			0.46
VT 05	8.80	0.12	0.50			0.53
VT 06	10.00	0.12	0.50			0.60
VT 07	11.97	0.12	0.50			0.72
VT 08	12.98	0.12	0.50			0.78
VT 09	13.56	0.12	0.50			0.81
VT 10	14.92	0.12	0.50			0.90
VT 10A	16.19	0.12	0.50			0.97
VT 11	10.94	0.12	0.50			0.66
VT 12	3.56	0.12	0.50			0.21
VT 13	2.49	0.12	0.50			0.15
VT 14	1.82	0.12	0.50			0.11
VT 15	8.04	0.12	0.50			0.48
VT 16	11.25	0.12	0.50			0.68
VT 17	8.39	0.12	0.50			0.50
VT 18	11.35	0.12	0.50			0.68
VT 19	17.20	0.12	0.50			1.03
VT 20	9.57	0.12	0.50			0.57
VT 21	2.73	0.12	0.50			0.16

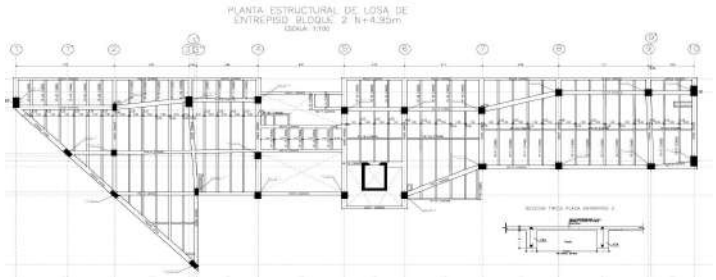

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
LOSA DE ENTREPISO 3						
VT 01	**4.15**	**0.12**	**0.50**			**0.25**
VT 02	**5.31**	**0.12**	**0.50**			**0.32**
VT 03	**6.47**	**0.12**	**0.50**			**0.39**
VT 04	**7.64**	**0.12**	**0.50**			**0.46**
VT 05	**8.80**	**0.12**	**0.50**			**0.53**
VT 06	**10.00**	**0.12**	**0.50**			**0.60**
VT 07	**11.97**	**0.12**	**0.50**			**0.72**
VT 08	**12.98**	**0.12**	**0.50**			**0.78**
VT 09	**13.56**	**0.12**	**0.50**			**0.81**
VT 10	**14.92**	**0.12**	**0.50**			**0.90**
VT 10A	**16.19**	**0.12**	**0.50**			**0.97**
VT 11	**10.94**	**0.12**	**0.50**			**0.66**
VT 12	**9.60**	**0.12**	**0.50**			**0.58**
VT 13	**8.04**	**0.12**	**0.50**			**0.48**
VT 14	**10.13**	**0.12**	**0.50**			**0.61**
VT 15	**8.39**	**0.12**	**0.50**			**0.50**
VT 16	**11.35**	**0.12**	**0.50**			**0.68**
VT 17	**17.20**	**0.12**	**0.50**			**1.03**
VT 18	**9.57**	**0.12**	**0.50**			**0.57**



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**492.29**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



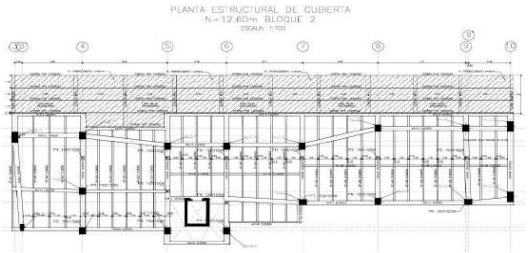



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
CUBIERTA						
VT 01	10.94	0.12	0.50			0.66
VT 02	10.94	0.12	0.50			0.66
VT 03	9.60	0.12	0.50			0.58
VT 04	8.04	0.12	0.50			0.48
VT 05	10.13	0.12	0.50			0.61
VT 06	8.39	0.12	0.50			0.50
VT 07	11.35	0.12	0.50			0.68
VT 08	17.20	0.12	0.50			1.03
VT 09	9.57	0.12	0.50			0.57
VIGAS MUROS INTERMEDIOS						
MURO 20cm PISO 1	351.82	0.20	0.20			14.07
MURO 12cm PISO 1	189.93	0.12	0.20			4.56
MURO 20cm PISO 2	255.26	0.20	0.20			10.21
MURO 12cm PISO 2	139.39	0.12	0.20			3.35
MURO 20cm PISO 3	150.47	0.20	0.20			6.02
MURO 12cm PISO 1	204.13	0.12	0.20			4.90
MURO 12cm PISO 2	146.56	0.12	0.20			3.52
MURO 20cm PISO 2	154.65	0.20	0.20			6.19
MURO 20cm PISO 3	322.93	0.20	0.20			12.92
MURO 12cm PISO 3	201.37	0.12	0.20			4.83
						492.29

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO














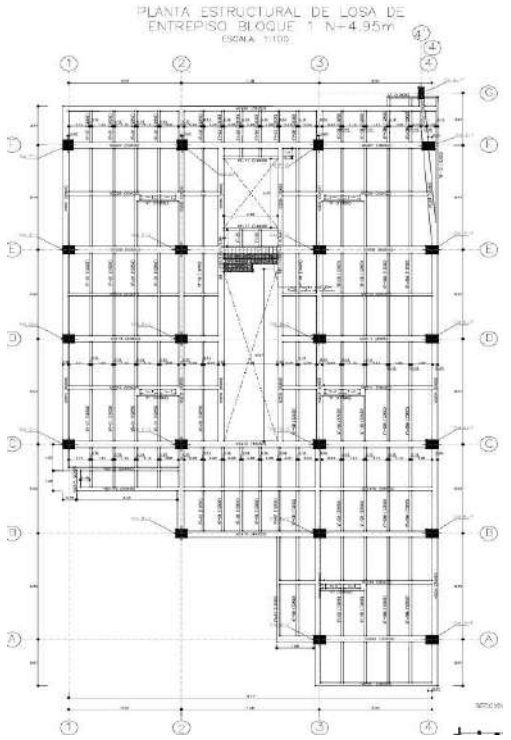

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















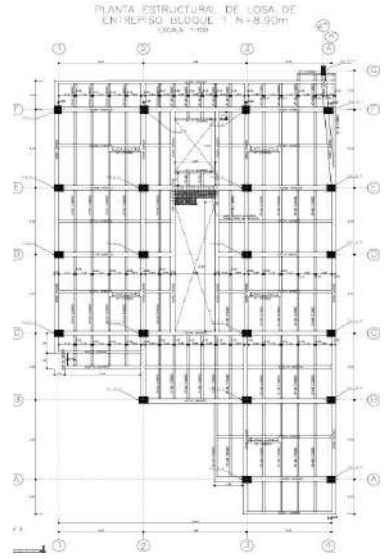

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO












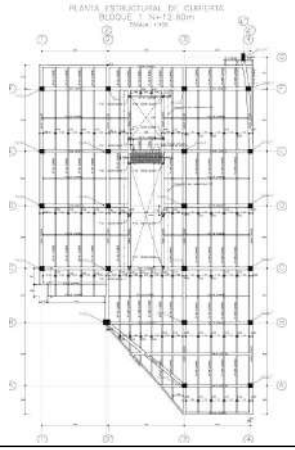

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA**					
	DEPARTAMENTO DE SUCRE					
	MUNICIPIO DE COROZAL					
	MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						












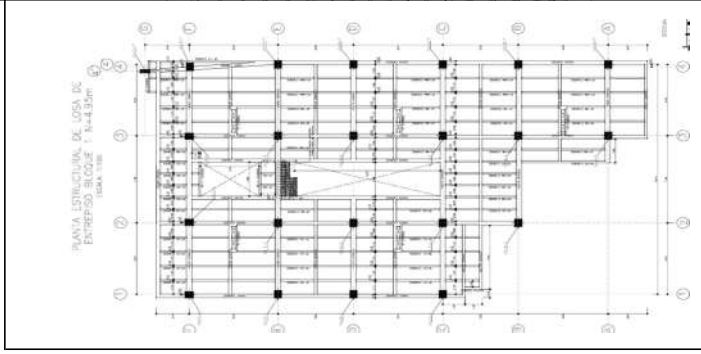


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					









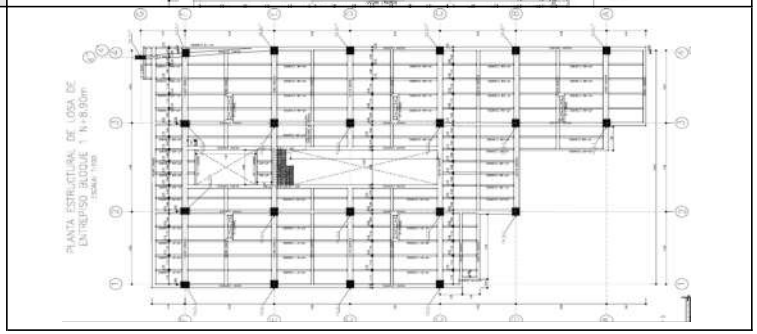

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						












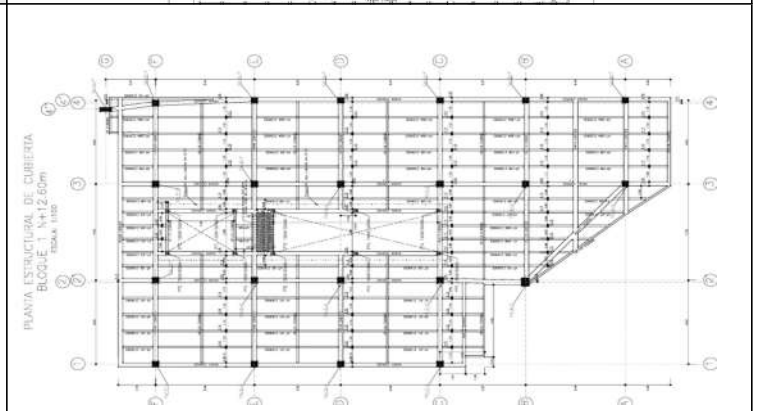

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI					

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















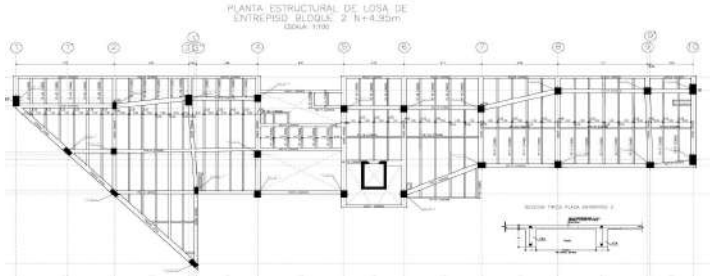

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	m³
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI					




REGISTRO FOTOGRÁFICO









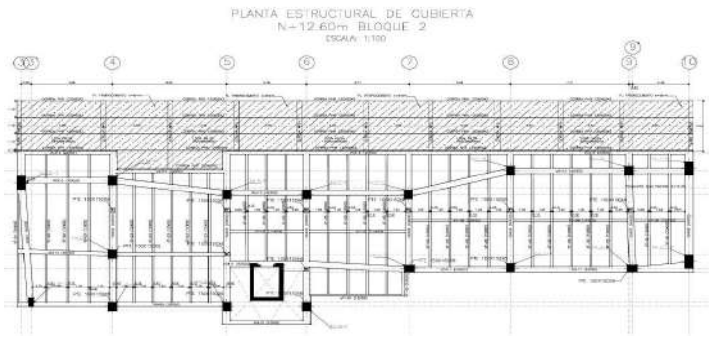

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI				



REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

-

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**3,377.00**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.07	Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 5cm				


UBICACIÓN	DIMENSIONES			Area	CANT	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
LOSA ENTREPISO 2						
BLOQUE N°1			**0.05**	**572.00**		**572.00**
BLOQUE N°2			**0.05**	**537.00**		**537.00**
LOSA ENTREPISO 3						
BLOQUE N°1			0.05	**572.00**		**572.00**
BLOQUE N°2			0.05	**537.00**		**537.00**
CUBIERTA						
BLOQUE N°1			0.05	**572.00**		**572.00**
BLOQUE N°2			0.05	**537.00**		**537.00**


#¡DESCONOCIDO!

#¡DESCONOCIDO!

GARITA						
			0.05	**25**	**2**	**50.00**
						3,377.00

#¡DESCONOCIDO!





Elaboró



ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó



ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**	
3.07	Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 5cm					


REGISTRO FOTOGRÁFICO











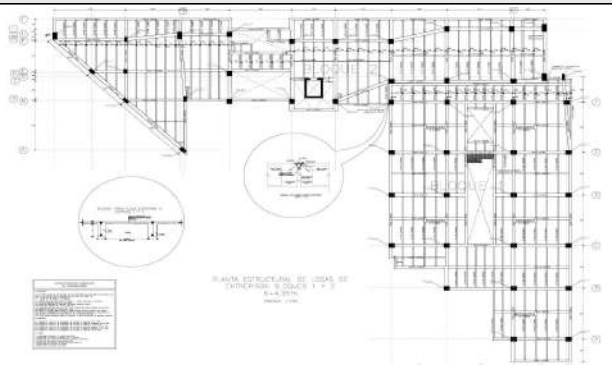













Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**224.00**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m²**
3.08	Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 10 cm Incluye Lamina Steeldeck		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**Area**	**CONVENCION**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 1						
LOSA DE CUBIERTA			0.10	**224.00**		**224.00**
						224.00

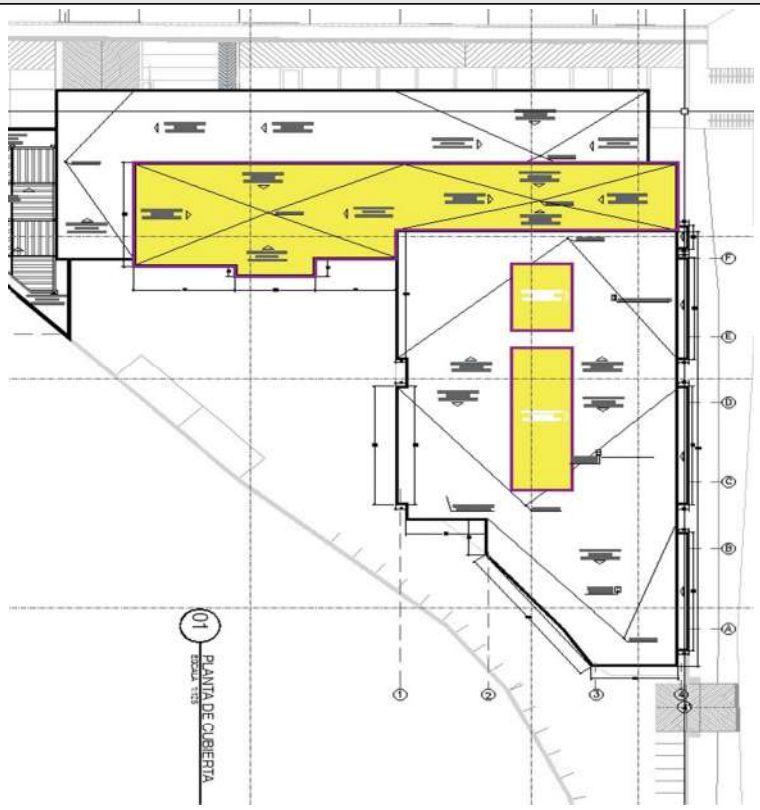

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO EP-C

CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.08	Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 10 cm Incluye Lamina Steeldeck				


REGISTRO FOTOGRÁFICO










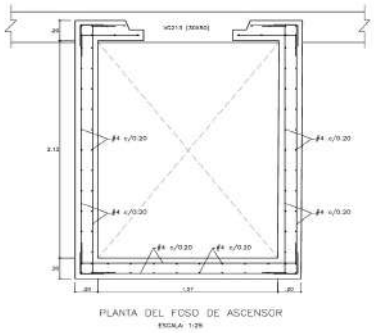


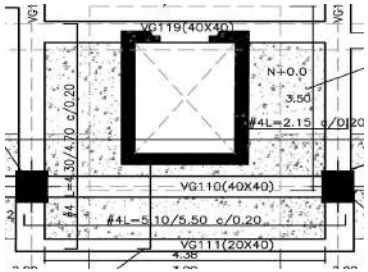







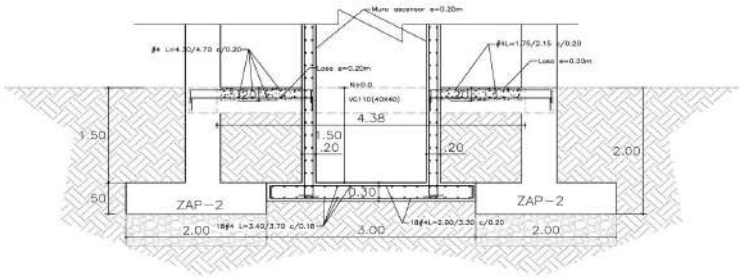

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**6,720.00**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m**
3.09	Estructura Metálica Principal De Cubierta, Incluye Cerchas en perfiles				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Longitud		**Kg/ml**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
COLUMNAS PTE 150x150x8	1		27.41	**15.00**		**411.15**
VIAGS IPE 270	6		36.10	**29.13**		**6308.85**
						6,720.00

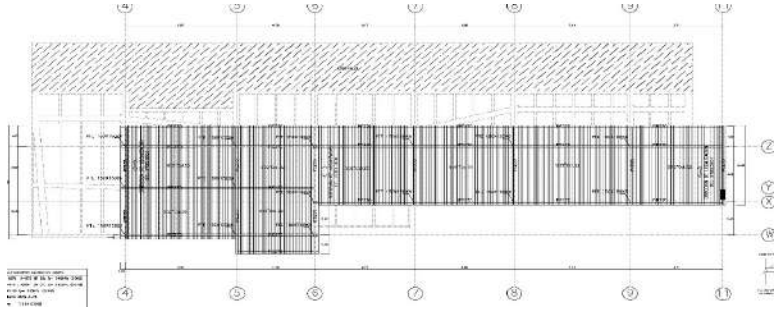

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**20.44**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.10	Concreto para Foso del Ascensor f´c= 3000 PSI		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA NETA	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BLOQUE N°2	14.00		0.20	1.46		20.44
FOSO	1.40		0.20	1.46		
PISO 1	4.95		0.20	1.46		
PISO 2	3.95		0.20	1.46		
PISO 3	3.70		0.20	1.46		
						20.44

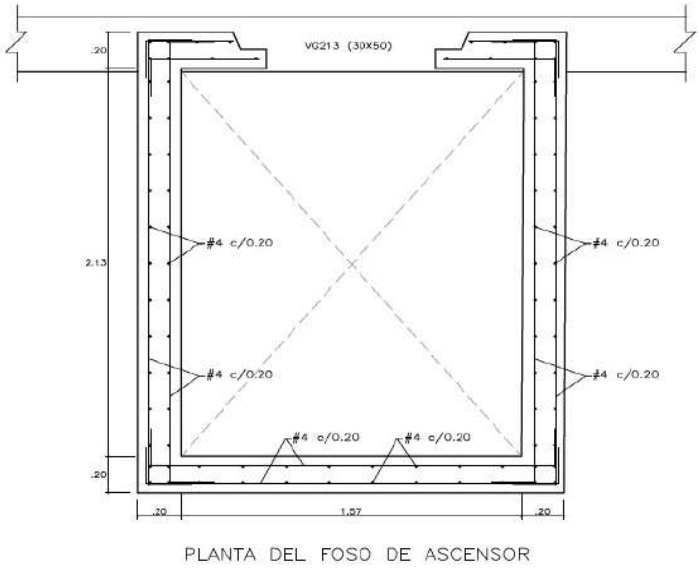

PLANTA DEL FOSO DE ASCENSOR

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.10	Concreto para Foso del Ascensor f´c= 3000 PSI				


REGISTRO FOTOGRÁFICO









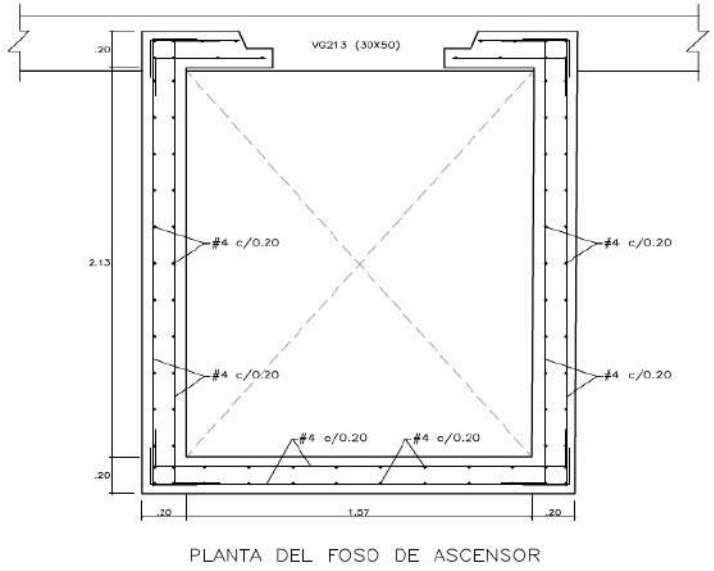

PLANTA DEL FOSO DE ASCENSOR







Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**180.32**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**			**m**
3.11	Alfajia En Concreto 3000 Psi De 0.15 X 0.15, Incluye Todo Los Elementos Para Su Elaboración				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CONVENCION**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**		**ACUMULADO**
PISO 1	**47.94**				**47.94**
					0.00
PISO 2	**73.75**				**73.75**





PISO 3	58.63				58.63
				TOTAL	180.32



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	3.00	CIMENTACIÓN Y CONCRETOS		UNIDAD	m
3.11	Alfajia En Concreto 3000 Psi De Incluye Todo Los Elementos Para Su Elaboración				

REGISTRO FOTOGRÁFICO











REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	3.00	CIMENTACIÓN Y CONCRETOS		UNIDAD	m
3.11	Alfajia En Concreto 3000 Psi De Incluye Todo Los Elementos Para Su Elaboración				

REGISTRO FOTOGRÁFICO











SEGUNDO PISO

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3.00**	**CIMENTACIÓN Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m**
3.11	Alfajia En Concreto 3000 Psi De Incluye Todo Los Elementos Para Su Elaboración				

REGISTRO FOTOGRÁFICO











TERCER PISO

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2,361.00**
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.12	Concreto F´C=3000 Psi Para Piso Espesor 0,08 Mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**					**TOTAL**
	ÁREA					**ACUMULADO**
ÁREA EXTERIOR						
PISO 1	1275.82					**1275.82**
ÁREA CUBIERTA						
PISO 1	1085.18					**1085.18**
						2,361.00



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.12	Concreto F´C=3000 Psi Para Piso Espesor 0,08 Mts				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







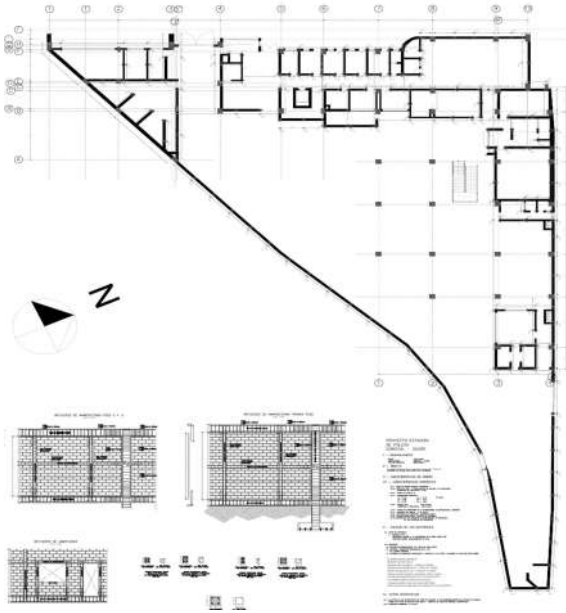



















Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	72.57
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m²**
3.13	Concreto F´C=3000 Psi Para Escaleras		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
ESCALERA						
TRAMO 1 NIVEL 2 BLOQUE 1						
PELDAÑOS	1.20	0.28	0.18	110	3.33	
GARGANTA	3.04	1.20	0.20	30	10.94	
				TOTAL		**14.27**
DESCANSO	2.63	1.20	0.15	1		**0.47**
TRAMO 2 NIVEL 2 BLOQUE 1						
PELDAÑOS	1.20	0.28	0.18	110	3.33	
GARGANTA	3.80	1.20	0.20	30	13.68	
				TOTAL		**17.01**
TRAMO 1 NIVEL 2 BLOQUE 2						
PELDAÑOS	1.20	0.45	0.18	110	5.35	
GARGANTA	2.51	1.20	0.20	30	9.04	
				TOTAL		14.38
DESCANSO	1.20	1.20	0.20	100		0.29
TRAMO 2 NIVEL 2 BLOQUE 2						
PELDAÑOS	1.20	0.25	0.21	110	3.47	
GARGANTA	2.61	1.20	0.20	30	9.40	
						12.86
DESCANSO	1.20	1.20	0.20	1		0.29
TRAMO 3 NIVEL 2 BLOQUE 2						
PELDAÑOS	1.20	0.40	0.18	110	4.75	
GARGANTA	2.29	1.20	0.20	30	8.24	
				TOTAL		13.00
						72.57

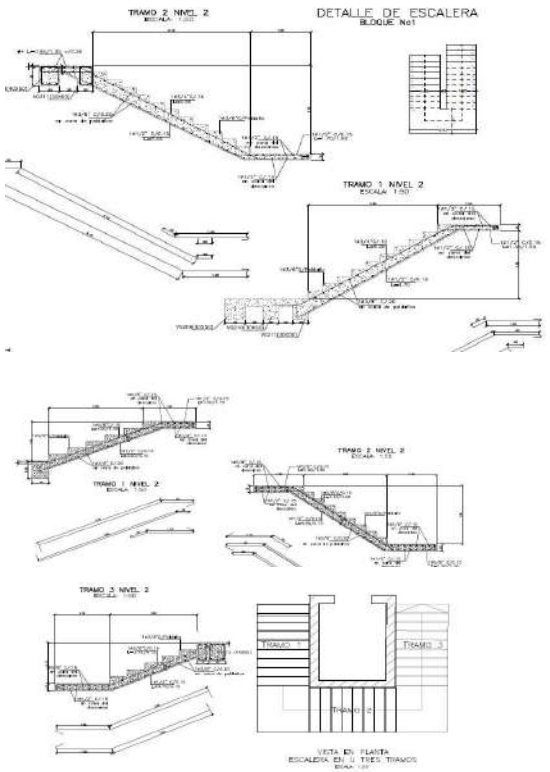

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m²**
3.13	Concreto F´C=3000 Psi Para Escaleras				

REGISTRO FOTOGRÁFICO














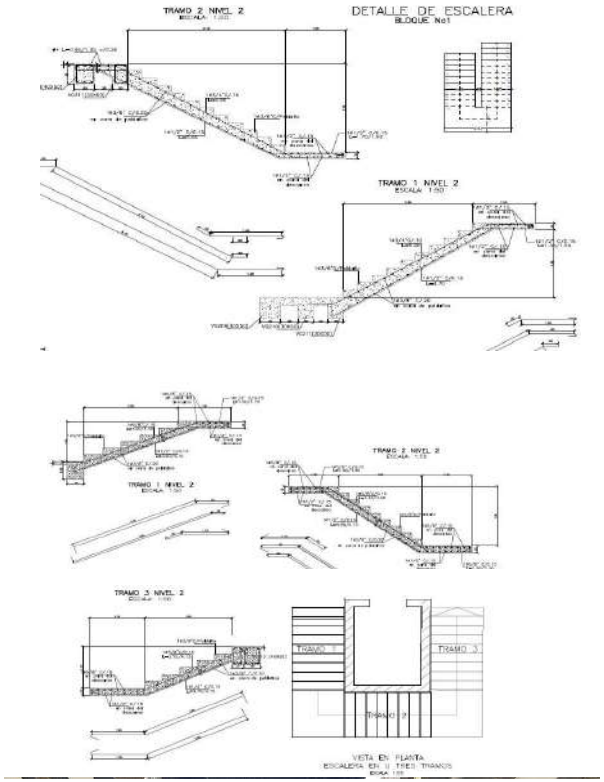








Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**65.20**
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m³**
3.14	Concreto F´C=3000 Psi Para Tanque de Almacenamiento		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
Losa Fondo	7.1	9.10	0.30			**19.38**
Muros	3.3	7.10	0.25	**2**		**11.72**
Muros	3.3	9.10	0.25	**2**		**15.02**
Columna	3.3	0.40	0.40			**0.53**
Viga 2	6.25	0.30	0.30	**3**		**1.69**
Viga 1	8.25	0.30	0.30			**0.74**
Losa Superior	6.4	8.40	0.30			**16.13**
						65.20

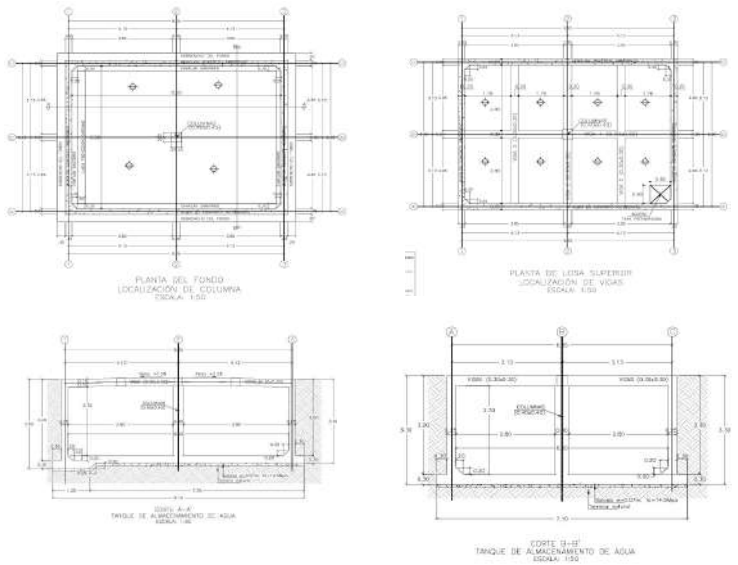

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.14	Concreto F´C=3000 Psi Para Tanque de Almacenamiento				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















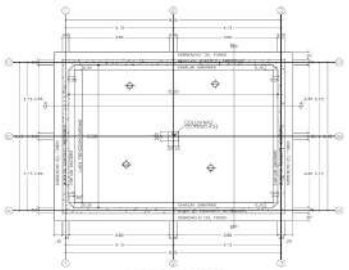

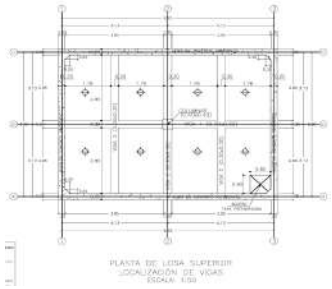













Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 183.72
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: m³
3.15	Concreto F´C=3000 Psi Para Rampas		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CONVENCION		TOTAL ACUMULADO
RAMPAS						
BLOQUE 1						
VEHÍCULOS - SALIDA	5.44	4.00	0.20		21.76	21.76
ANDEN	3.95	1.20	0.10		4.74	26.50
BLOQUE 2						
RAMPA PEATONAL	7.46	1.20	0.10		8.95	35.45
CIRCULACION VEHICULOS - 1	30.56	2.01	0.15		61.43	96.88
RAMPA DE VEHICULOS - EXTERIOR	9.25	5.25	0.20		48.56	145.44
RAMPA DE VEHICULOS - INTERIOR	4.03	1.50	0.20		6.05	151.49
CIRCULACION VEHICULOS - 2	13.32	2.42	0.15		32.23	183.72
						183.72

BLOQUE 1

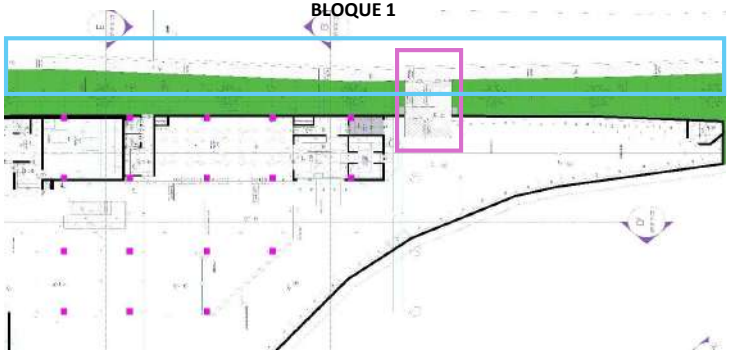

BLOQUE 2



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO EP-C

CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**
3.15	Concreto F´C=3000 Psi Para Rampas				

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 41.42
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: m³
3.16	Meson en Concreto Acabado Granito Pulido		


UBICACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
MESONES						
PISO 1				17.26		17.26
PISO 2				12.90		12.90

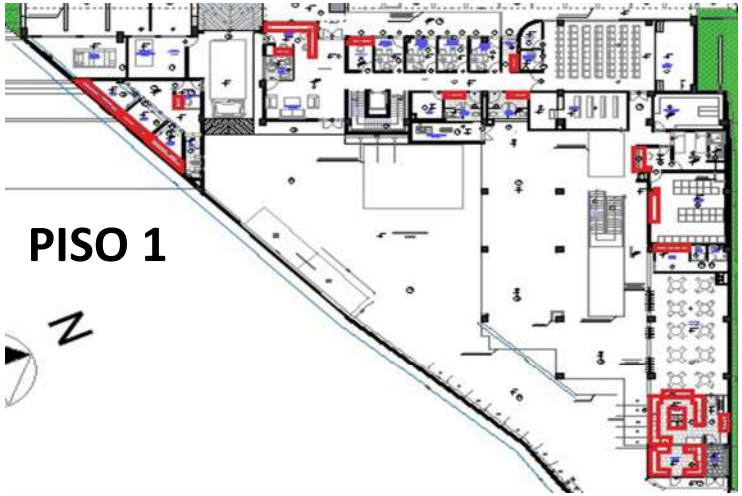

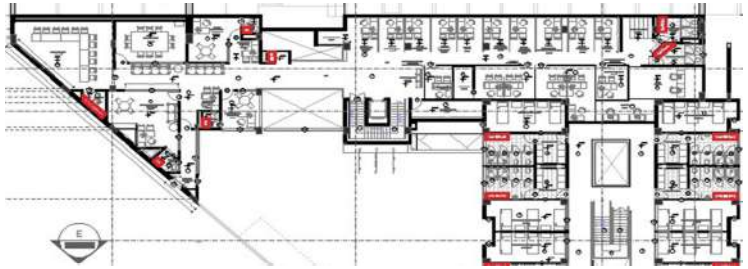

PISO 3				**11.26**		**11.26**
						41.42



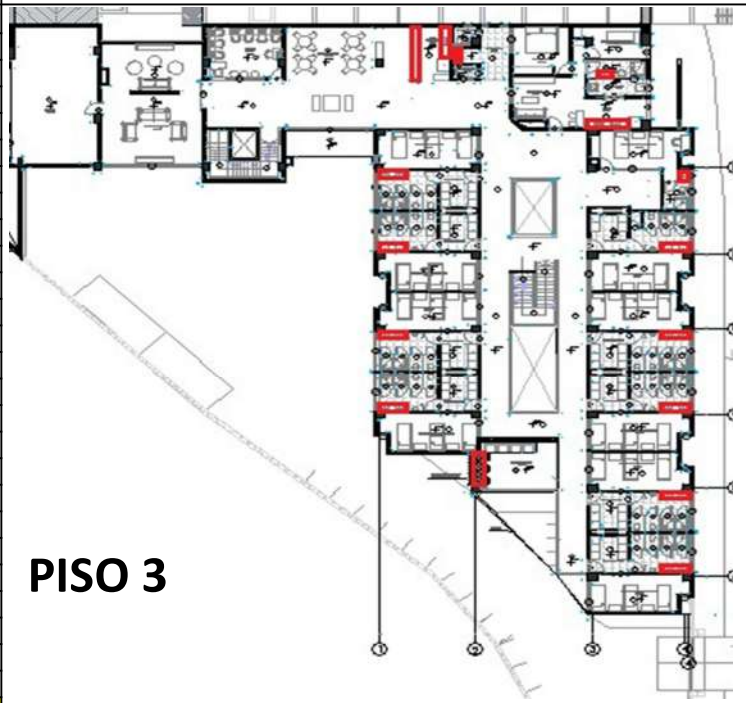

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m³**	
3.16	Meson en Concreto Acabado Granito Pulido					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	124.00
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS		UNIDAD	m
3.17	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x15 cm Incluye Acero de Refuerzo				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
Columnetas de confinamiento						
S=0.15x0.15m						
PISO 3						
BLOQUE 2	3.5	0.15	0.15	35.43		124.00
						124.00

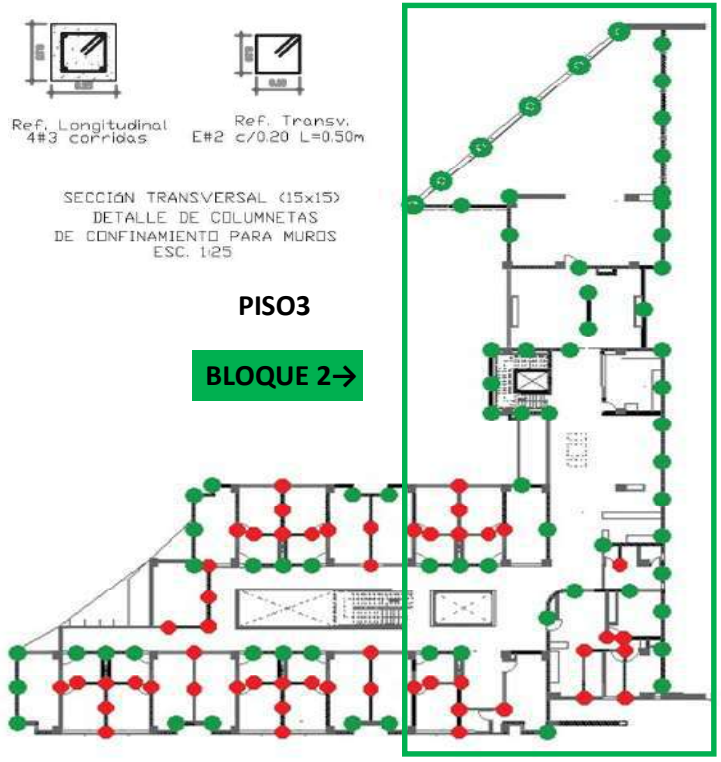

Elaboró

Aprobó

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m**
3.17	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x15 cm Incluye Acero de Refuerzo				



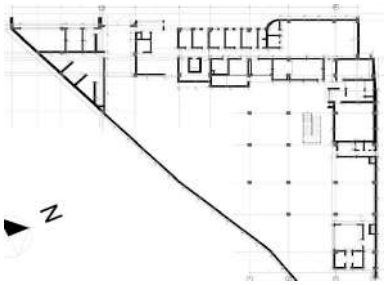

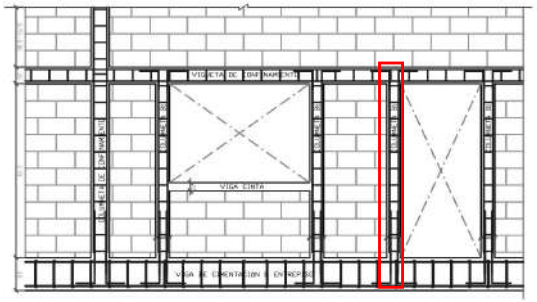

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 248.00
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: m
3.18	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x 20 cm Incluye Acero de Refuerzo		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
Columnetas de confinamiento					248	
S=0.15x0.20m						
MURO						
LADO IZQUIERDO	4.5	0.15	0.20	31.00		139.50
LADO DERECHO	4.5	0.15	0.20	19.00		85.50
FONDO	4.5	0.15	0.20	5.11		23.00
						248.00

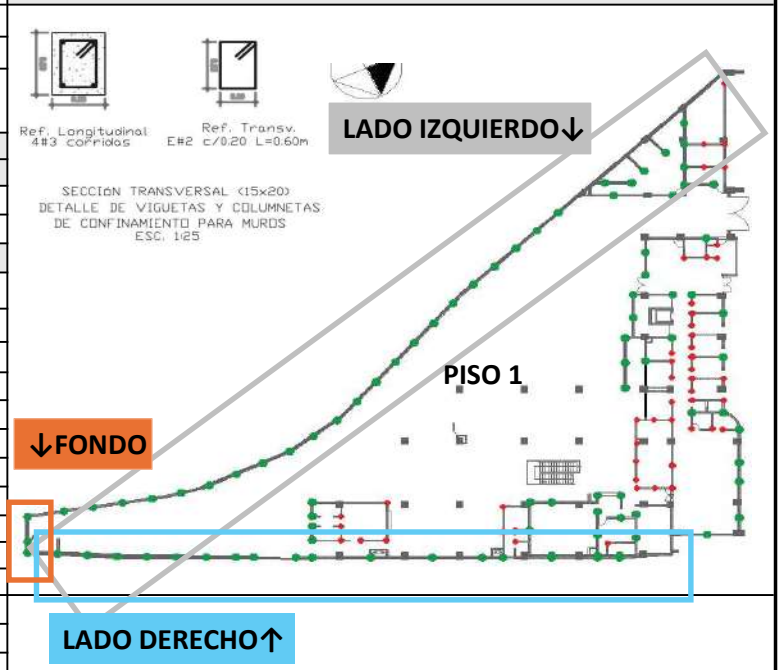

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m**
3.18	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x 20 cm Incluye Acero de Refuerzo				


REGISTRO FOTOGRÁFICO










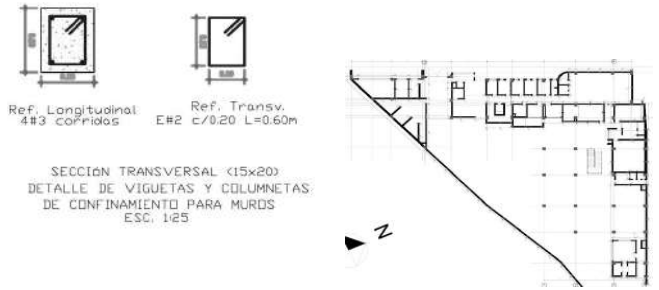

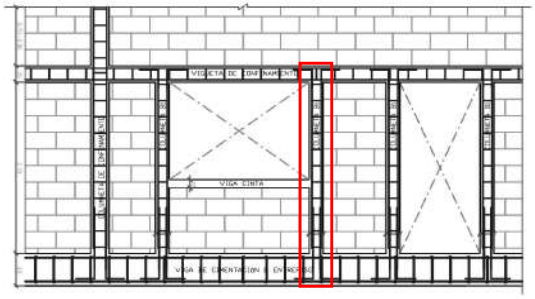

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE




CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 288.00
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: m
3.19	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
Columnetas de confinamiento						
S=0.12x0.20m						
PISO 1						
BLOQUE 1	4.5	0.20	0.12	15.00		67.50
BLOQUE 2	4.5	0.20	0.12	20.00		90.00
PISO 2						
BLOQUE 1	3.5	0.20	0.12	21.29		74.50
BLOQUE 2	3.5	0.20	0.12	16.00		56.00

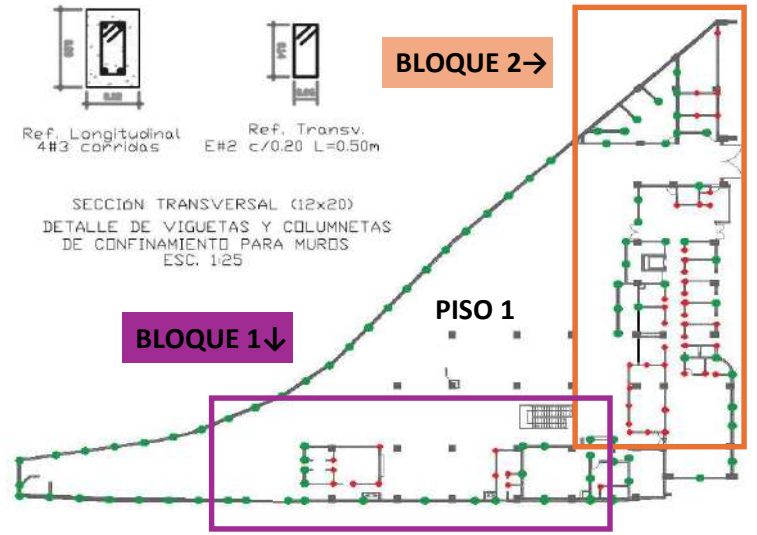

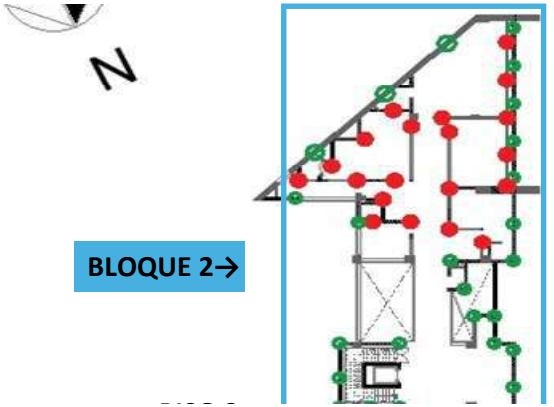

						288.00

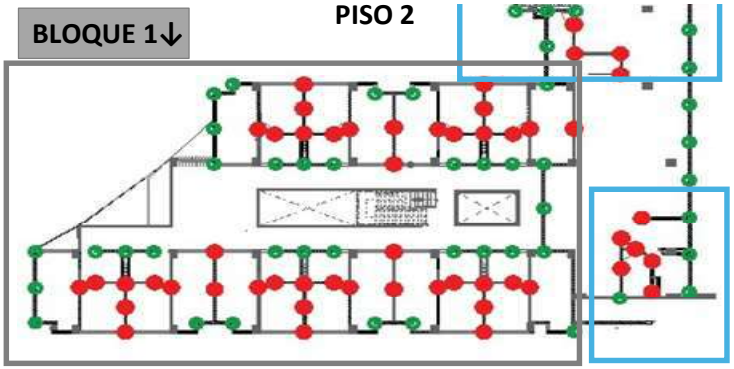

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** / OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3** / **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m**
3.19	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















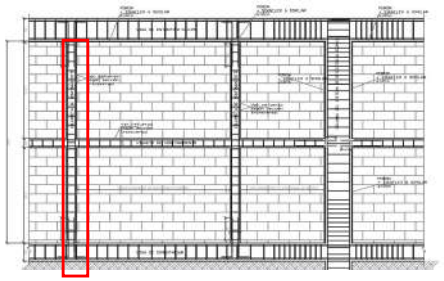





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	324.00
ITEM	3 — CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD	m
3.20	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
Columnetas de confinamiento						
S=0.20x0.20m						
PISO 2						
BLOQUE 1	3.5	0.20	0.20	33.00		115.50
BLOQUE 2	3.5	0.20	0.20	35.00		122.50
PISO 3						
BLOQUE 1	3.5	0.20	0.20	24.57		86.00

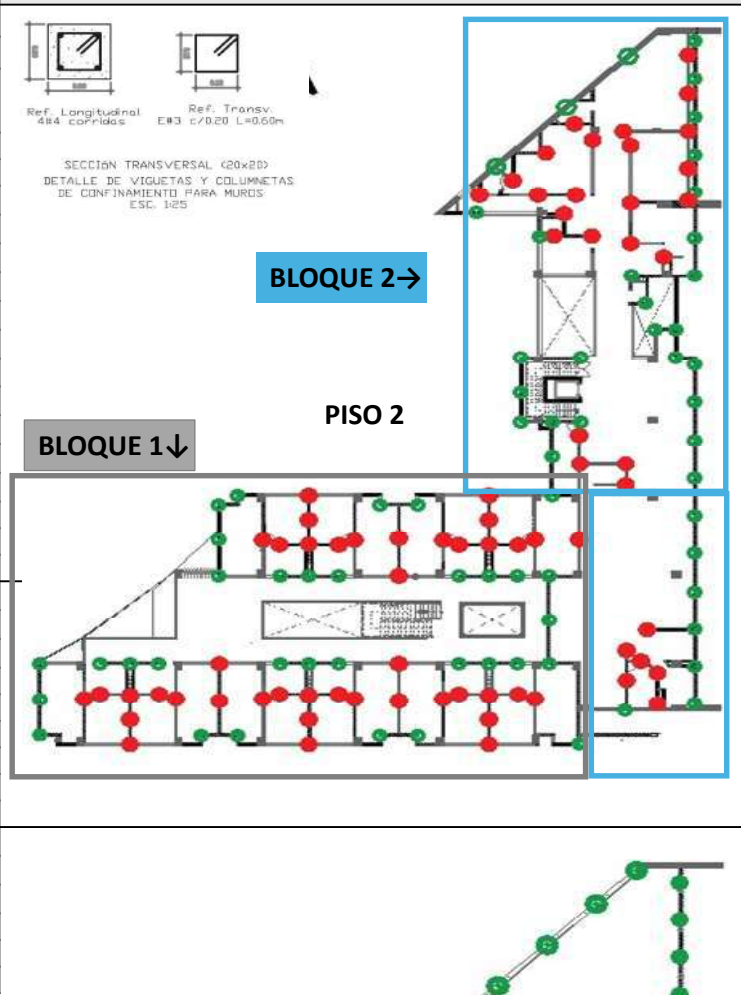

						324.00

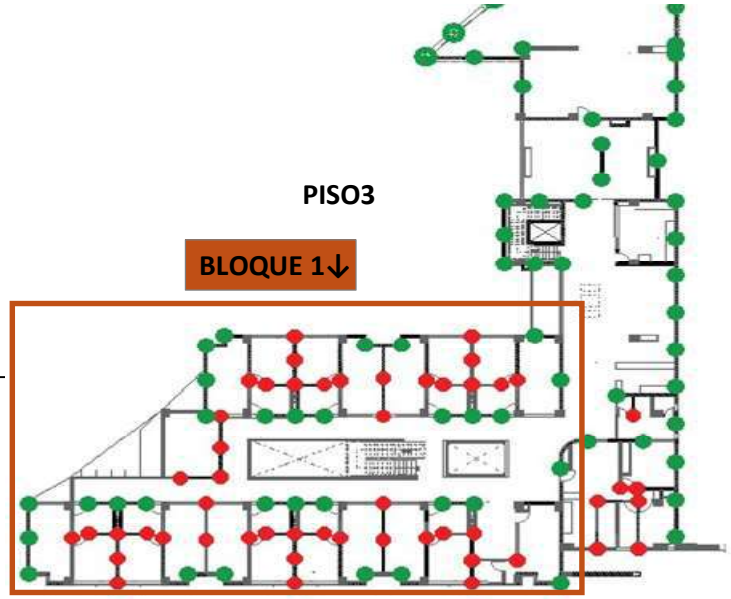

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**UNIDAD**	**m**
3.20	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo				

REGISTRO FOTOGRÁFICO














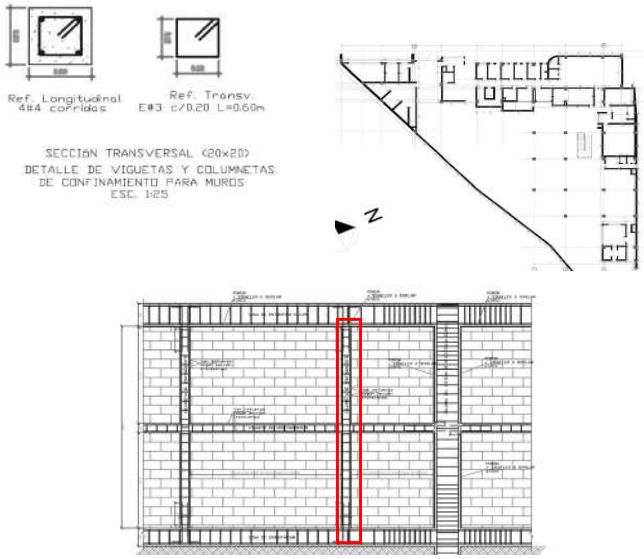





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 264.00
ITEM	3	CIMENTACION Y CONCRETOS	UNIDAD: m
3.21	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 30x30 cm Incluye Acero de Refuerzo		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
Columnetas de confinamiento						
S=0.30x0.30m						
PISO 1						
BLOQUE 1	4.5	0.20	0.20	24.00		108.00
BLOQUE 2	4.5	0.20	0.20	34.67		156.00
						264.00

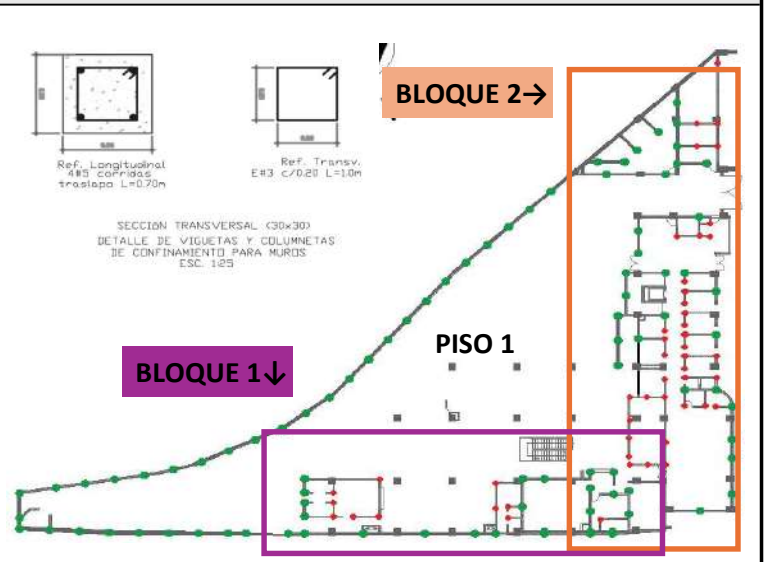

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3** — **CIMENTACION Y CONCRETOS**	**UNIDAD**	**m**
3.21	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 30x30 cm Incluye Acero de Refuerzo		

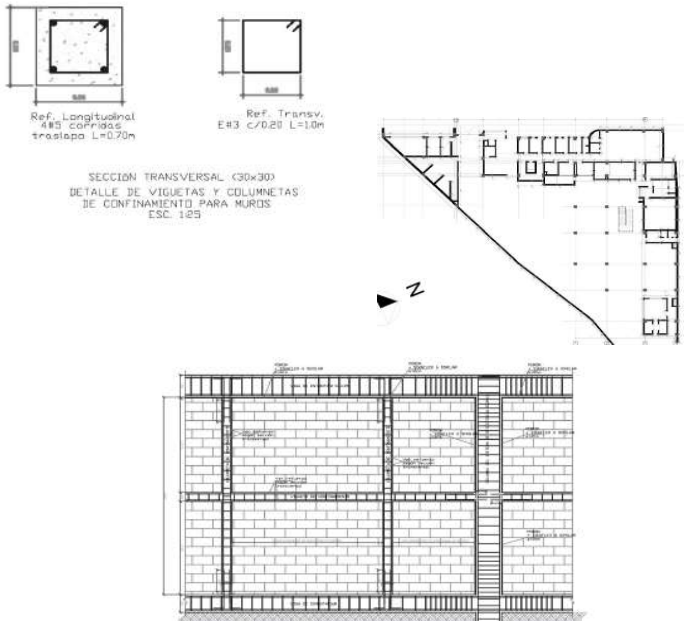

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO EP-C

CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	646.65
ITEM	3 — CIMENTACION Y CONCRETOS		m
3.22	Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo		


UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
PISO 1					
BLOQUE 1	125.00	0.20	0.12		125.00
BLOQUE 2	161.00	0.20	0.12		161.00
PISO 2					
BLOQUE 1	96.00	0.20	0.12		96.00
BLOQUE 2	112.00	0.20	0.12		112.00

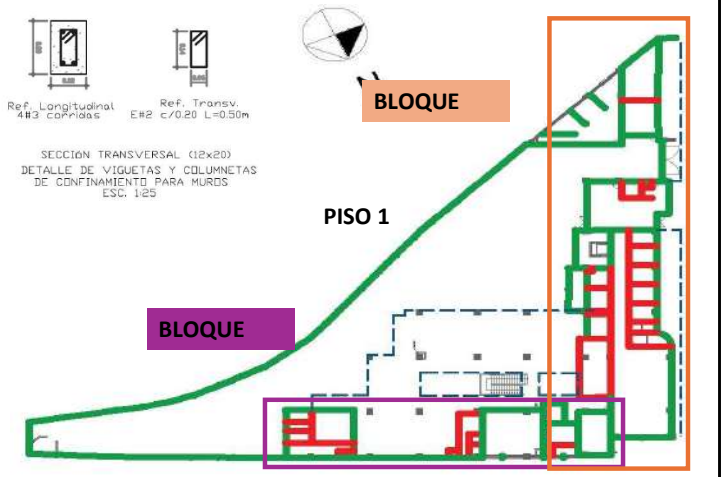

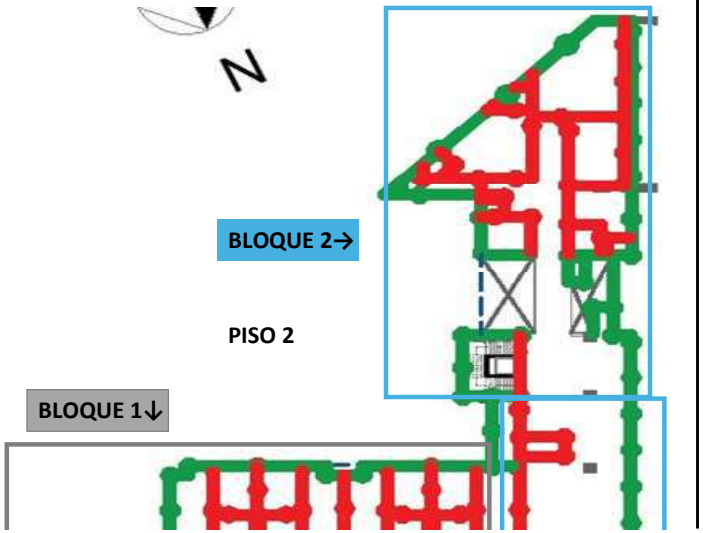

PISO 3					
BLOQUE 1	72.00	0.20	0.12		72.00
BLOQUE 2	80.65	0.20	0.12		80.65
				TOTAL	646.65



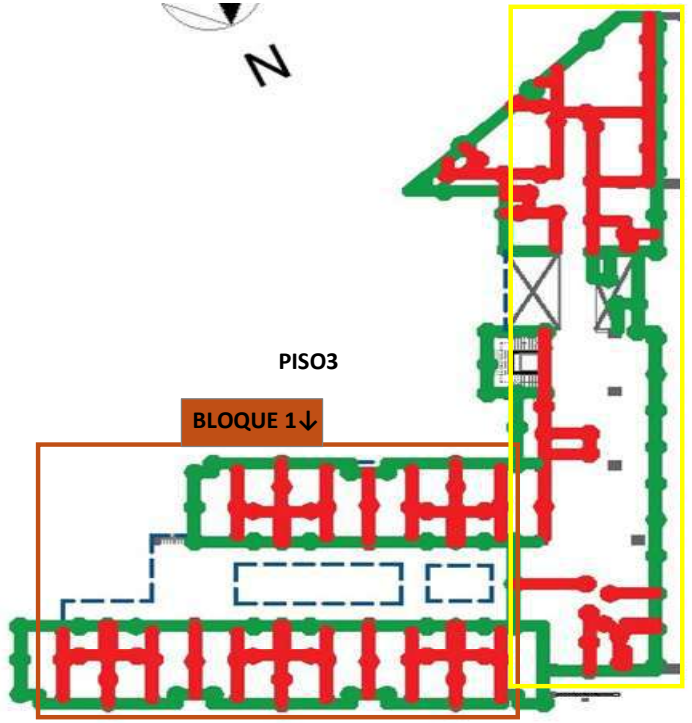

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**		**m²**	
3.22	Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	6	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	855.60
ITEM	3 — CIMENTACION Y CONCRETOS		m
3.23	Vigueta en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo		


UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
VIGUETA S=20x20cm					
PISO 1					
BLOQUE 1	152.00	0.20	0.20		152.00
BLOQUE 2	201.00	0.20	0.20		201.00
PISO 2					
BLOQUE 1	100.00	0.20	0.20		100.00
BLOQUE 2	151.50	0.20	0.20		151.50

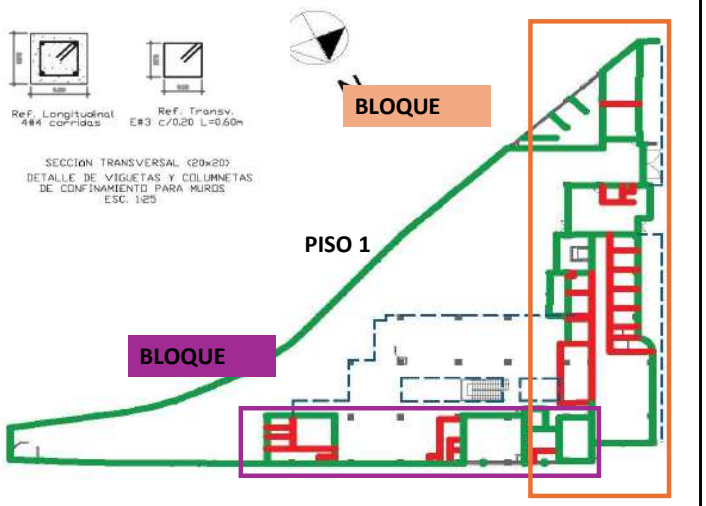

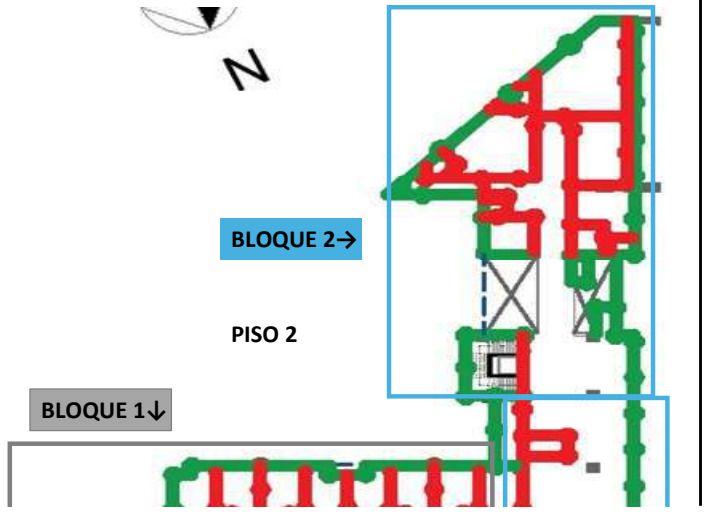

PISO 3					
BLOQUE 1	100.00	0.20	0.20		100.00
BLOQUE 2	151.10	0.20	0.20		151.10
				TOTAL	855.60



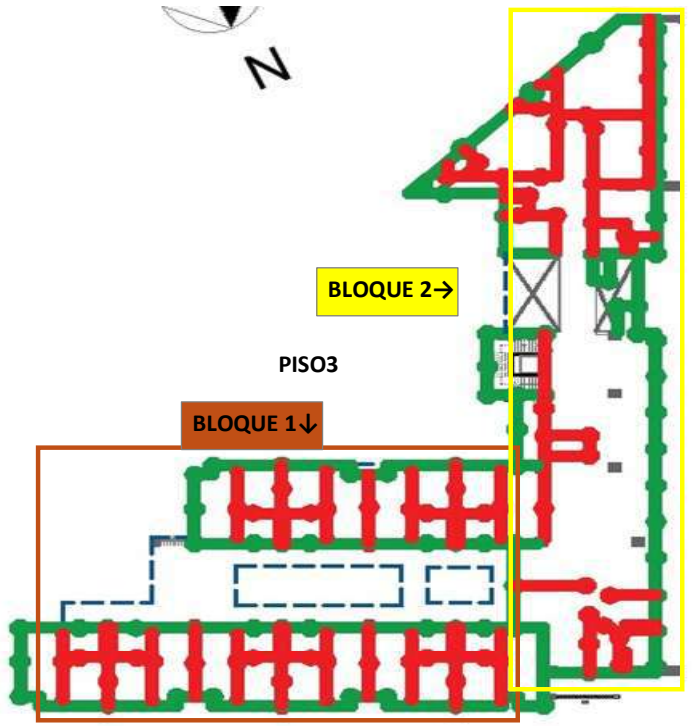

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	**6**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**3**	**CIMENTACION Y CONCRETOS**			**m²**
3.23	Vigueta en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo				

REGISTRO FOTOG´RAFICO










ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

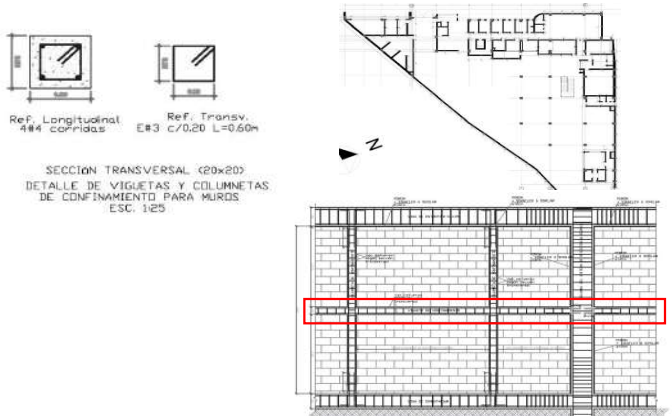

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 98.95
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD: m³
4.01	Excavación manual en material común.		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			Volumen	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
TUBERIA HIDRAULICA						
BLOQUE 1						
PISO 1	16.00	0.50	0.60	4.8		4.80
BLOQUE 2						
PISO 1	22.60	0.50	0.60	6.78		6.78

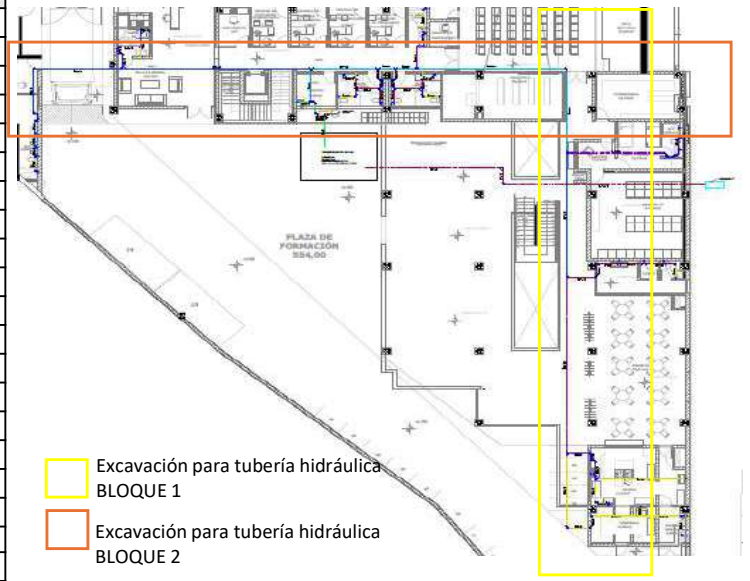

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	98.95
ITEM	4 — SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD	m³
4.01	Excavación manual en material común.		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	Volumen	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
TUBERIA SANITARIA						
BLOQUE 1						
PISO 1	122.36	0.50	0.60	36.708		36.71
BLOQUE 2						
PISO 1	112.12	0.50	0.60	33.636		33.64
MURO PERIMETRAL						
PISO 1	56.74	0.50	0.60	17.022		17.02
						98.95

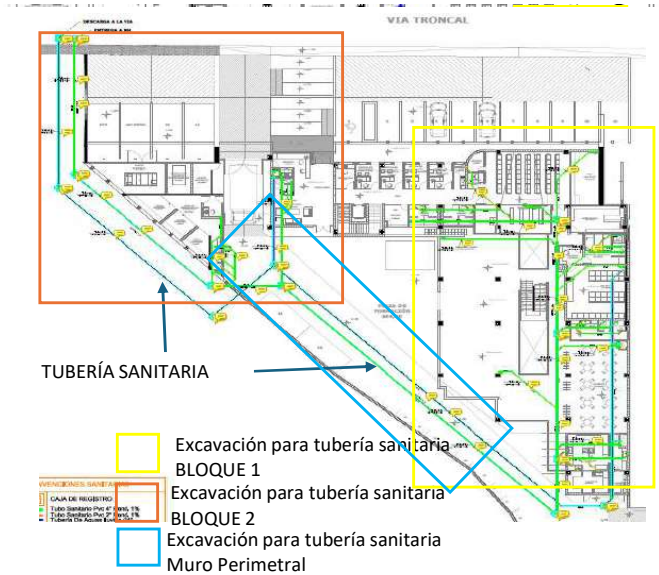

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**98.95**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m³**
4.01	Excavación manual en material común.				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**Volumen**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO		UNIDAD	m³	
4.01	Excavación manual en material común.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						









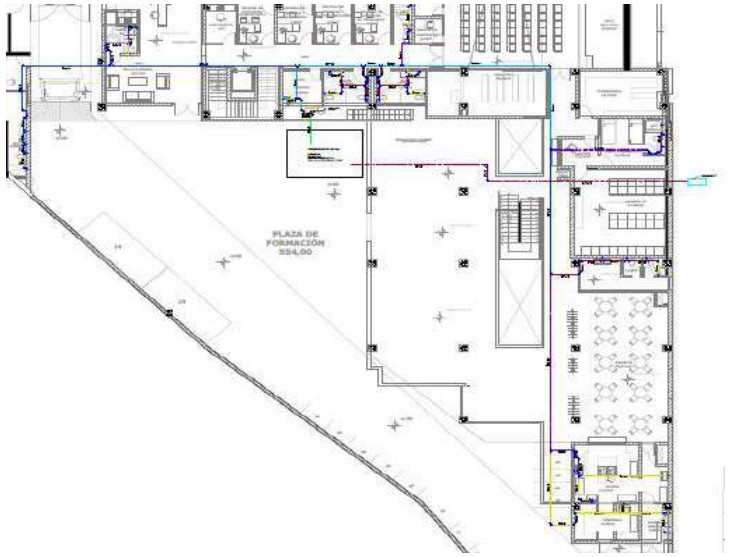


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD	m^3	
4.01	Excavación manual en material común.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



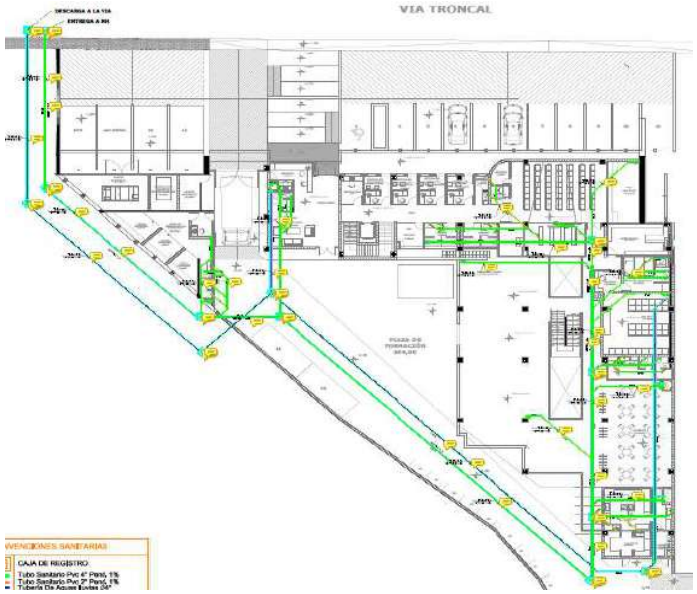

Elaboró

Aprobó

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m³**
4.01	Excavación manual en material común.				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**83.70**
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m³**
4.02	Relleno manual en recebo comun.		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			Volumen	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
TUBERIA SANITARIA						
BLOQUE 1						
PISO 1	51.18	0.50	0.60	**15.35**		**15.35**
BLOQUE 2						
PISO 1	45.86	0.50	0.60	**13.76**		**29.11**
MURO PERIMETRAL						
PISO 1	33.73	0.50	0.60	**10.12**		**39.23**
						83.70

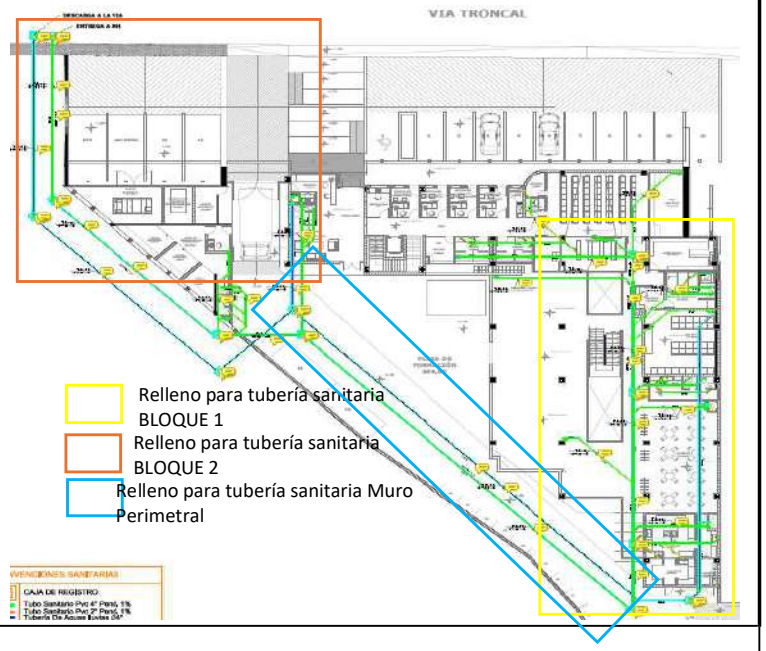

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m³**
4.02	Relleno manual en recebo comun.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





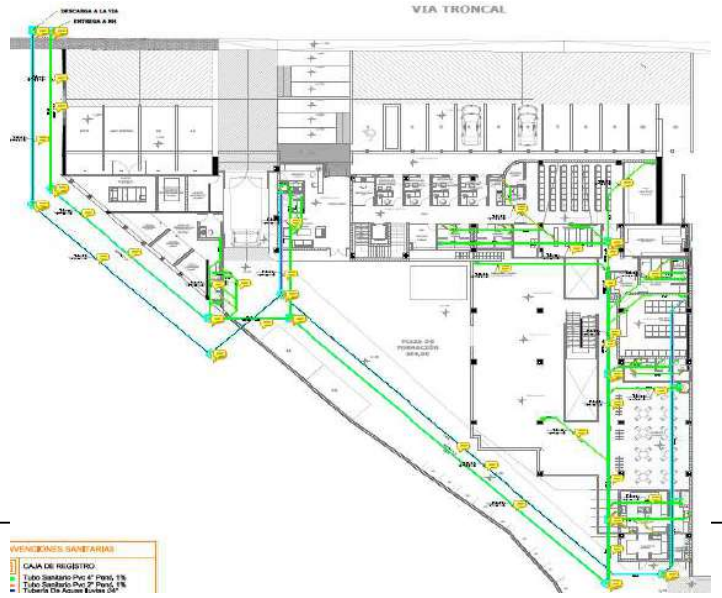


CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m³**
4.02	Relleno manual en recebo comun.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





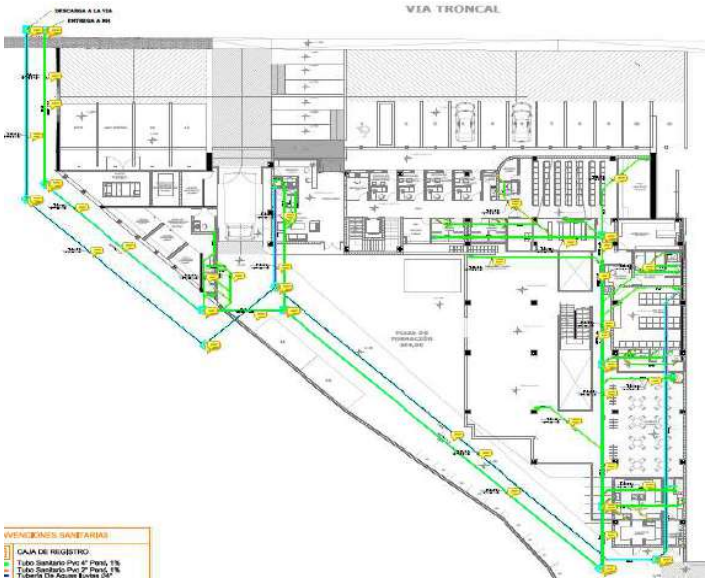

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m³**	
4.02	Relleno manual en recebo comun.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD		75.60
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO			UNIDAD	m
4.04	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 6"					

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD		TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
Bloque 1	12.6			3		37.80
Bloque 2	12.6			3		37.80
						75.60

Bajante aguas lluvias 6"
BLOQUE 2

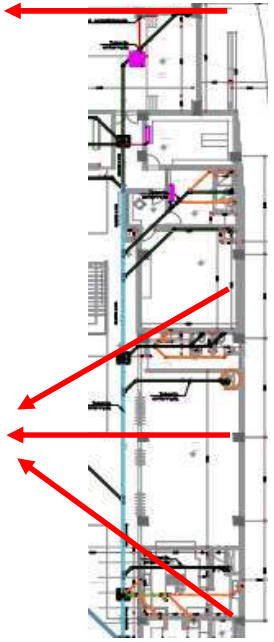

Bajante aguas lluvias 6"
BLOQUE 1

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**	
4.04	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 6"					

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Bajante aguas lluvias 6"
BLOQUE 2

Bajante aguas lluvias 6"
BLOQUE 1

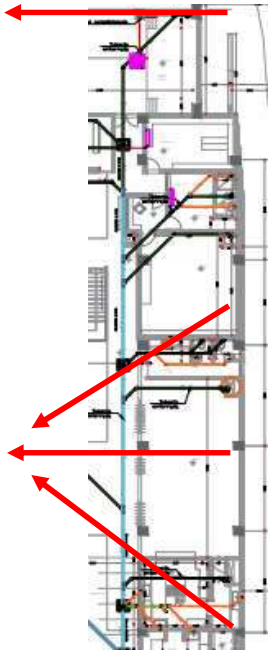

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**25.20**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.05	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 4"				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
Bloque 1	**6**			**2**		**12**
Bloque 2	6.6			**2**		**13.20**
						25.20

Bajante aguas lluvias 4"
BLOQUE 2



Bajante aguas lluvias 4"
BLOQUE 1

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO EP-C	CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.05	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 4"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Bajante aguas lluvias 4"
BLOQUE 2



Bajante aguas lluvias 4"

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 38.60
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD: m
4.06	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3"		


UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
BLOQUE 2						
PISO 1				17		17.00
PISO 2				21.6		21.60

Tub Hid Ø 3"

PISO 1



PISO 2

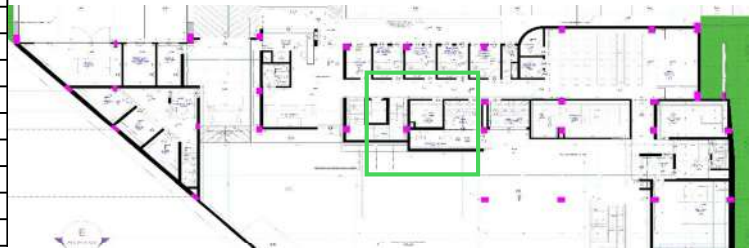

						38.60



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**	
4.06	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3"					

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**11.00**
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.07	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2 1/2"		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
PISO 1	8			1		8.00
	3			1		3.00
						11.00

Tub Hid Ø 2 1/2"

PISO 1

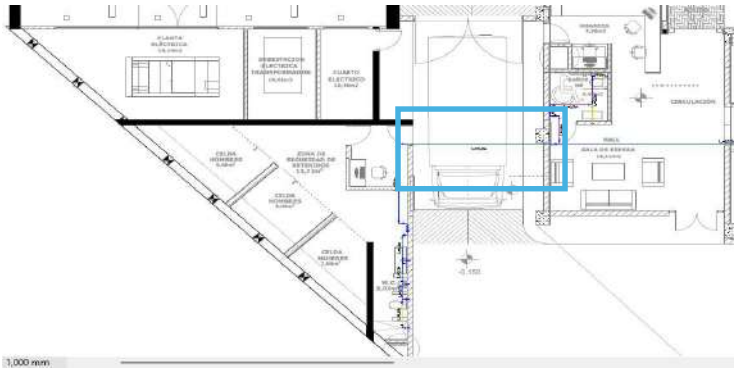

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE



CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**	
4.07	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2 1/2"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Tub Hid Ø 2 1/2"

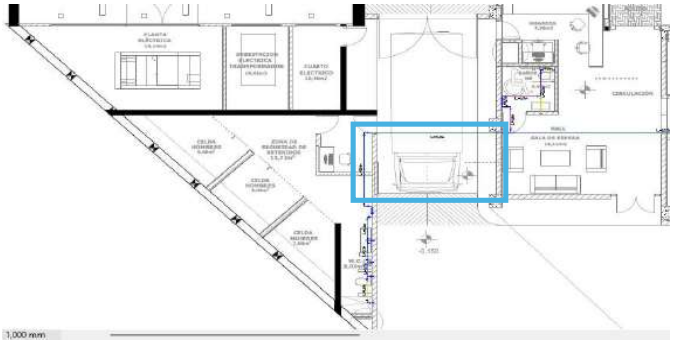

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**44.50**
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.08	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2"		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
PISO 1						
BLOQUE 1	7			1		7.00
BLOQUE 2	10.6			1		10.60
	1.6			1		1.60
	1.3			1		1.30
	4.8			1		4.80
	2.2			1		2.20
PISO 2						
BLOQUE 2	17.00			1		17.00

Tub Hid Ø 2"

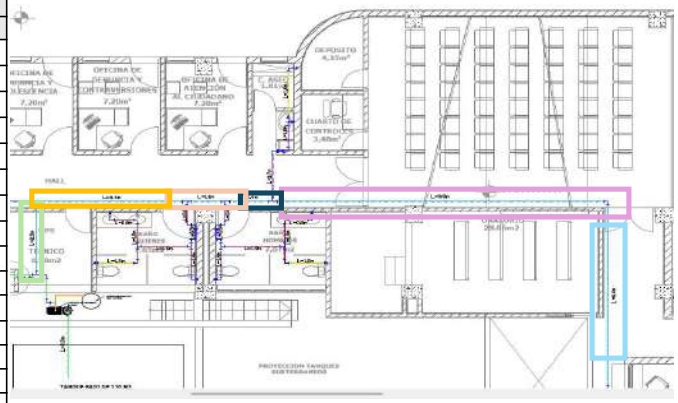

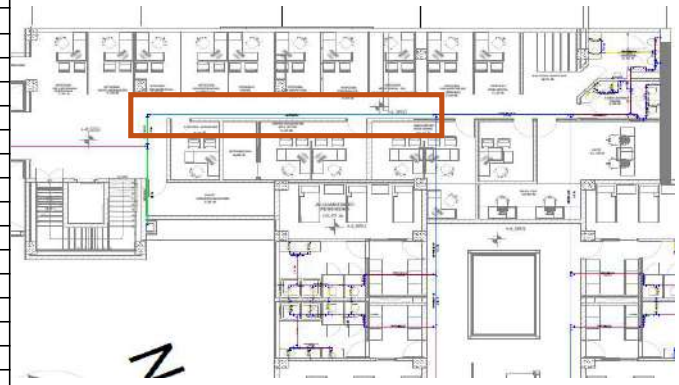

						44.50

Elaboró



ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó



ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD	m	
4.08	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2"				


Tub Hid Ø 2"

REGISTRO FOTOGRÁFICO







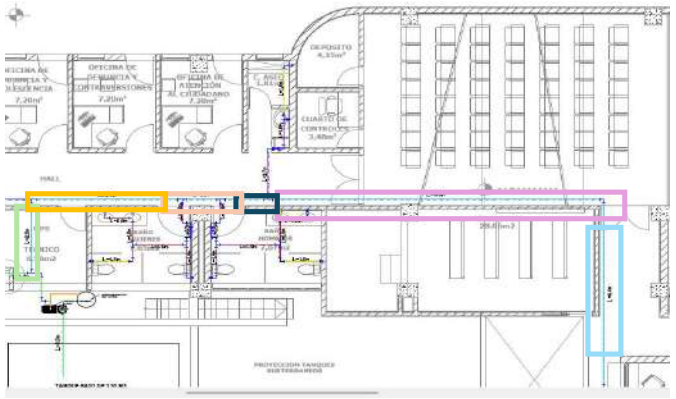

Elaboró

Aprobó

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	159.20
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.09	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3/4"				

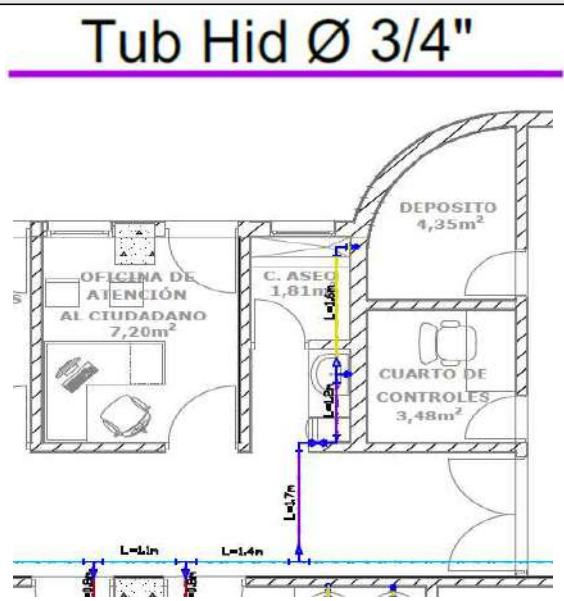

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
PISO 1				51.2		51.20
PISO 2				54		54.00
PISO 2				54		54.00
						159.20

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.09	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3/4"				


REGISTRO FOTOGRÁFICO









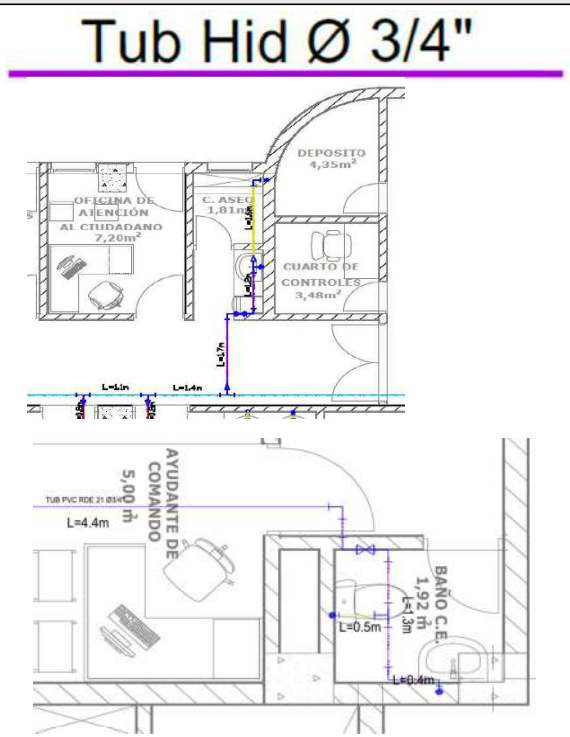

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**159.20**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.10	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1"				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
PISO 1				**51.2**		**51.20**
PISO 2				**54**		**54.00**
PISO 2				**54**		**54.00**
						159.20

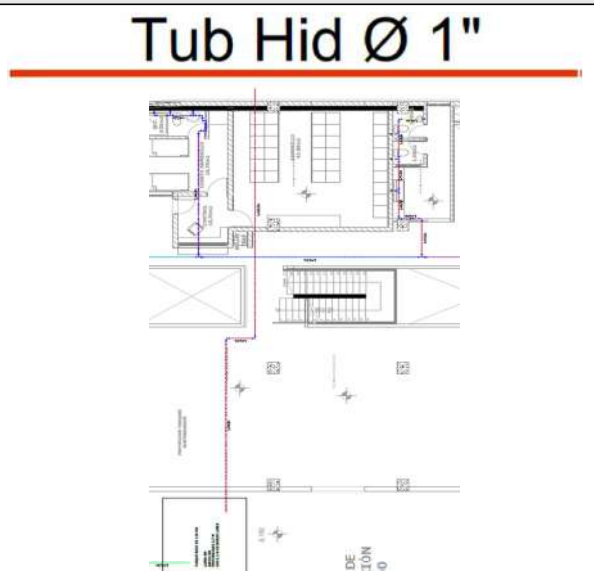

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** / OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** / **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.10	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1"		


REGISTRO FOTOGRÁFICO









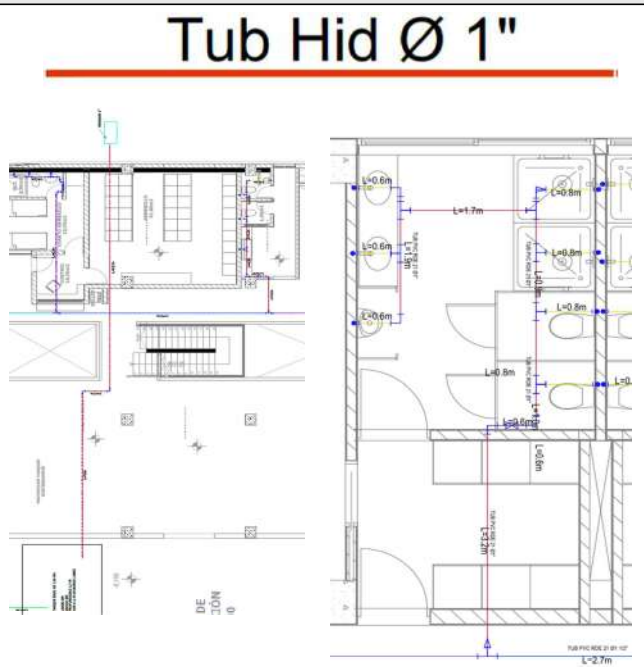

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**44.50**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.11	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 9 ø 1/2 "				

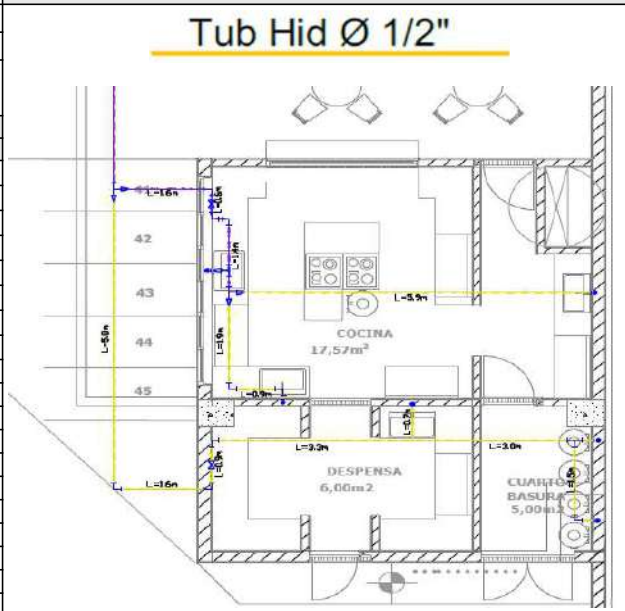

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
PISO 1				**25.1**		**25.10**
PISO 2				**19.4**		**19.40**
						44.50

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.11	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 9 ø 1/2 "		


REGISTRO FOTOGRÁFICO










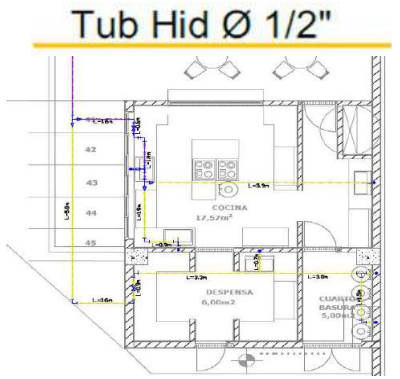

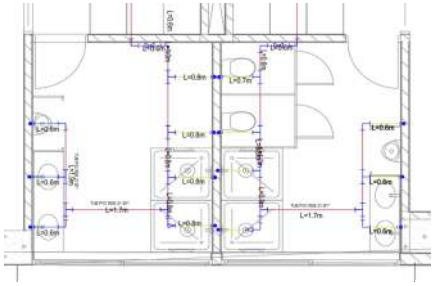

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	76.40
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.12	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 1/2 "				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
PISO 1				**42**		**42.00**
PISO 2				**34.4**		**34.40**
						76.40

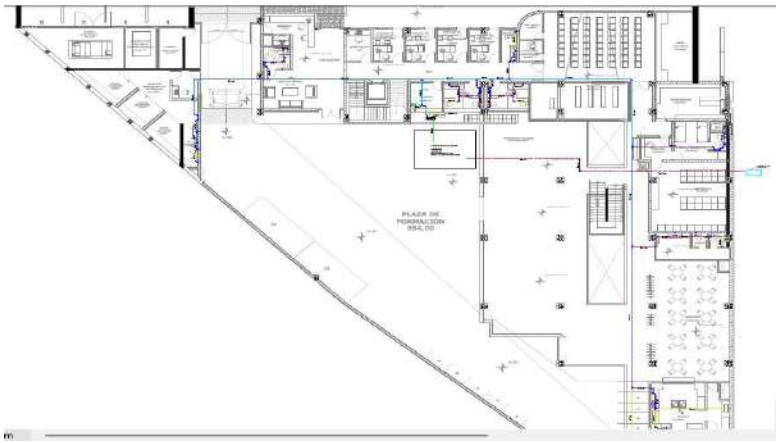

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**	
4.12	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 1/2 "				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



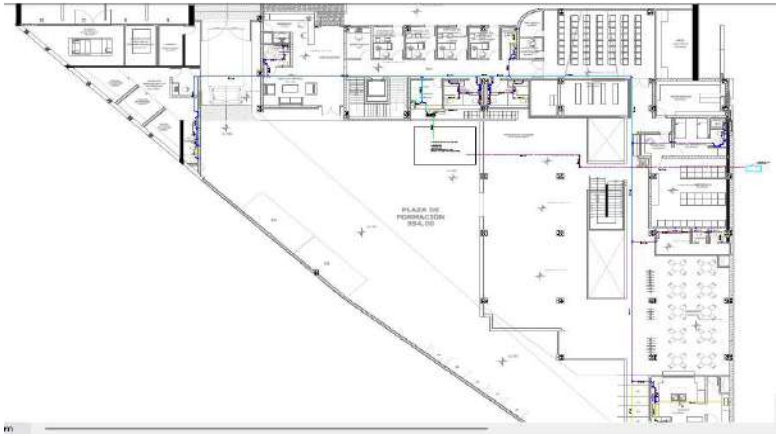

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 52.00
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD: Und
4.13	Punto hidráulico de ø 1/2 "		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
PISO 1						
BLOQUE 1						
DUCHAS				1		1.00
ORINALES				1		1.00
BLOQUE 2						
DUCHAS				1		1.00
ORINALES				1		1.00
PISO 2						
BLOQUE 1						
DUCHAS				20		20.00
ORINALES				9		9.00
BLOQUE 2						
ORINALES				1		1.00
PISO 3						
BLOQUE 1						0.00
DUCHAS				9		9.00
ORINALES				9		9.00
						52.00

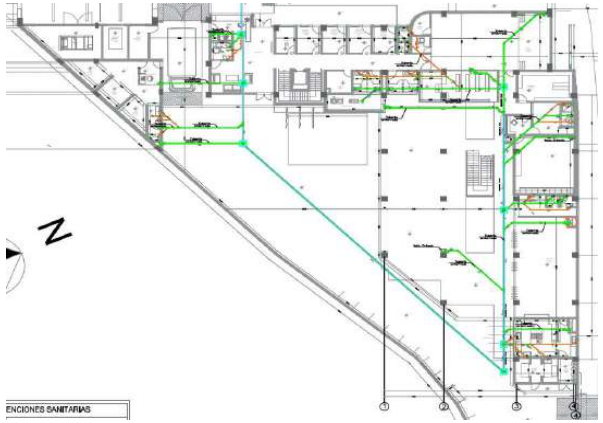

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**Und**
4.13	Punto hidráulico de ø 1/2 "				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





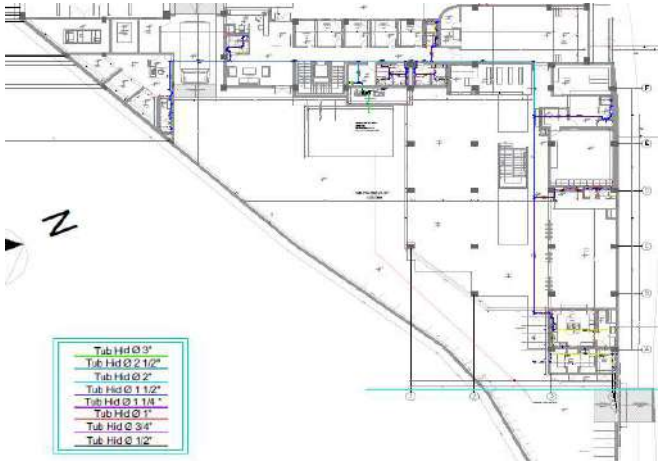

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 135.00
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD: Und
4.14	#¡REF!		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	UNIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
PISO 1						
BLOQUE 1						
LAVAMANOS				7		7.00
SANITARIOS				3		3.00
BLOQUE 2						
LAVAMANOS				6		6.00
SANITARIOS				6		6.00
PISO 2						
BLOQUE 1						
LAVAMANOS				20		20.00
SANITARIOS				20		20.00
BLOQUE 2						
LAVAMANOS				9		9.00
SANITARIOS				9		9.00
PISO 3						
BLOQUE 1						
LAVAMANOS				20		20.00
SANITARIOS				20		20.00
BLOQUE 2						
LAVAMANOS				6		8.00
SANITARIOS				4		7.00
						135.00

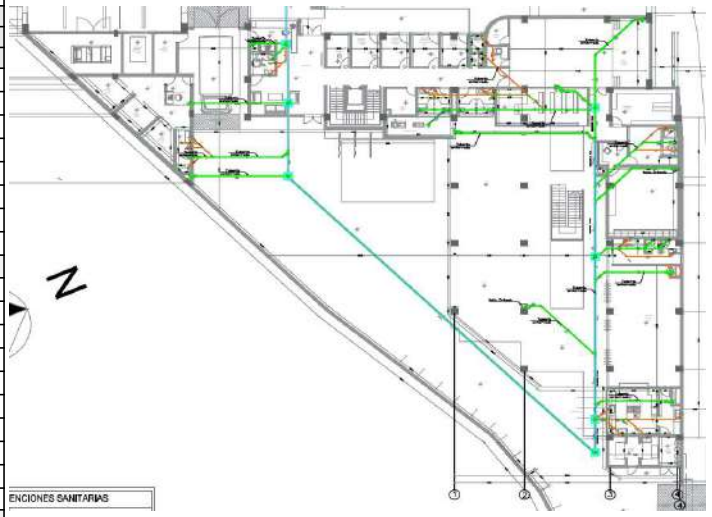

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO		UNIDAD	UND
4.14	Punto hidráulico de ø 3/4 "				

REGISTRO FOTOGRÁFICO














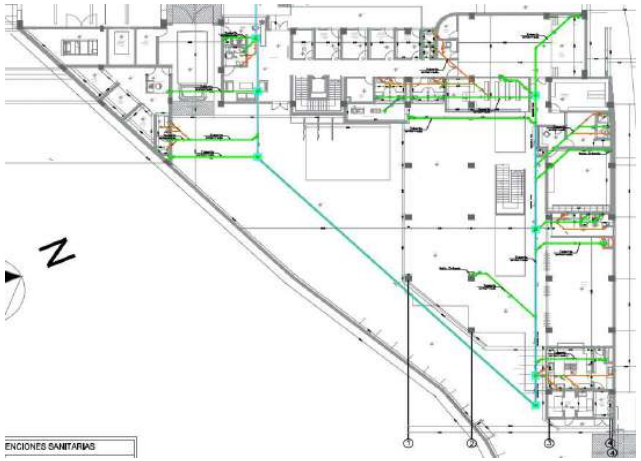

Elaboró

Aprobó

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO		UNIDAD	UND	
4.14	Punto hidráulico de ø 3/4 "					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**82.00**
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**und**
4.15	Llave de control 3/4"		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
PISO 1						
BLOQUE 1						
SANITARIOS				3		3.00
LAVAMANOS				7		7.00
BLOQUE 2						
SANITARIOS				6		6.00
LAVAMANOS				6		6.00
PISO 2						
BLOQUE 1						
SANITARIOS				20		20.00
BLOQUE 2						
SANITARIOS				9		9.00
LAVAMANOS				7		7.00
PISO 3						
BLOQUE 1						
SANITARIOS				20		20.00
BLOQUE 2						
SANITARIOS				4		4
						82.00



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025

OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO		UNIDAD	und
4.15	Llave de control 3/4"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





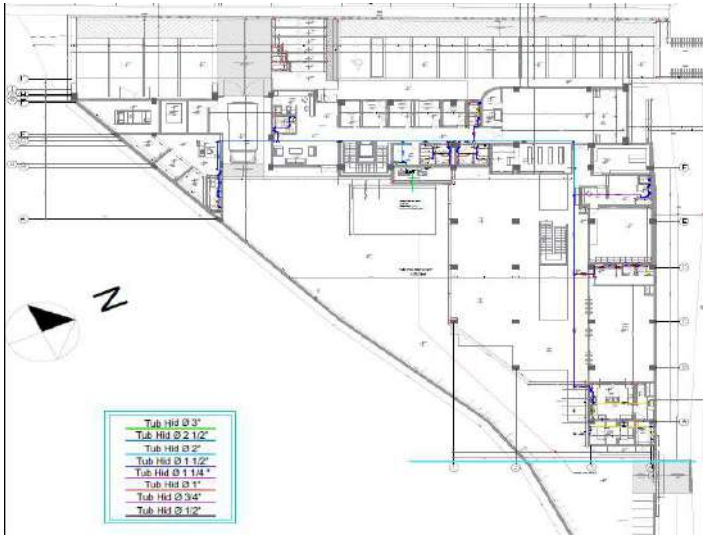

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**8.00**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**Und**
4.16	Caja de inspeccion; 0,8x0,8m libre				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 1				**8**		**8.00**
						8.00

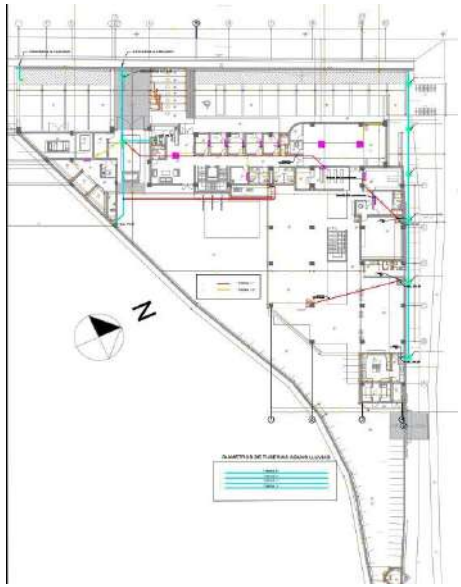

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**Und**	
4.16	Caja de inspeccion; 0,8x0,8m libre				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



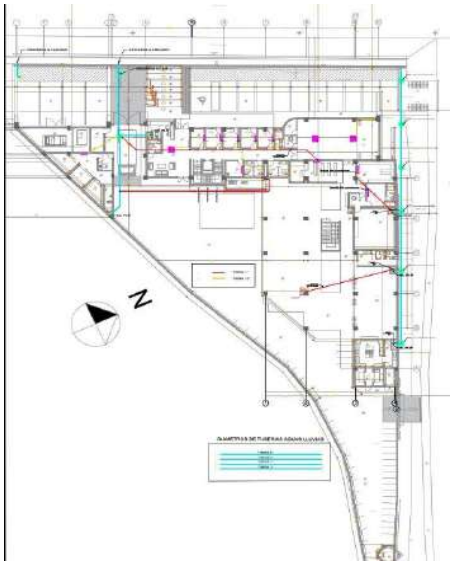

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	63.40
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.17	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 8"				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**		**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
TUBERÍA				**63.4**		**63.40**
						63.40

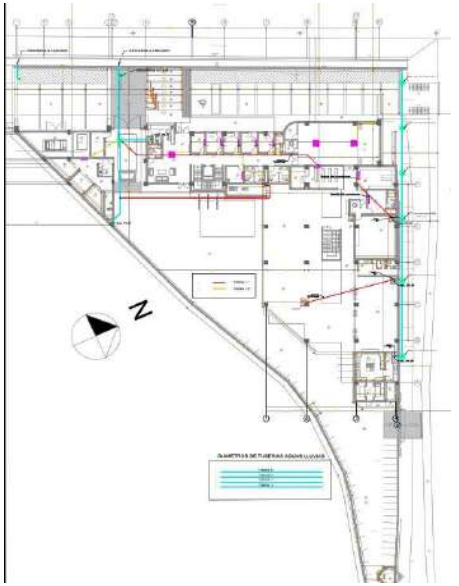

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.17	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 8"		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





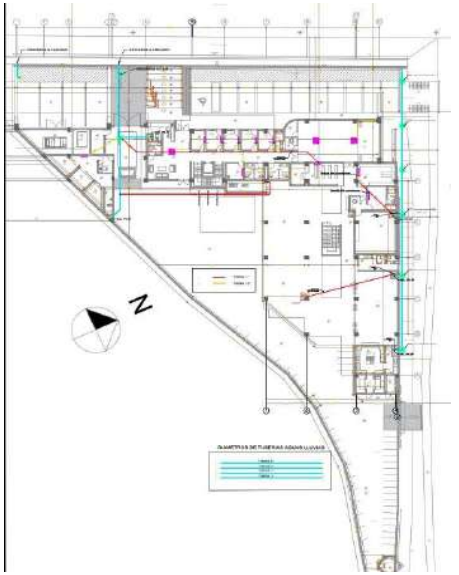

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**164.10**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.18	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 6"				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
PISO 1				**72**		**72.00**
PISO 2				**54**		**54.00**
PISO 3				**38.1**		**38.10**
						164.10

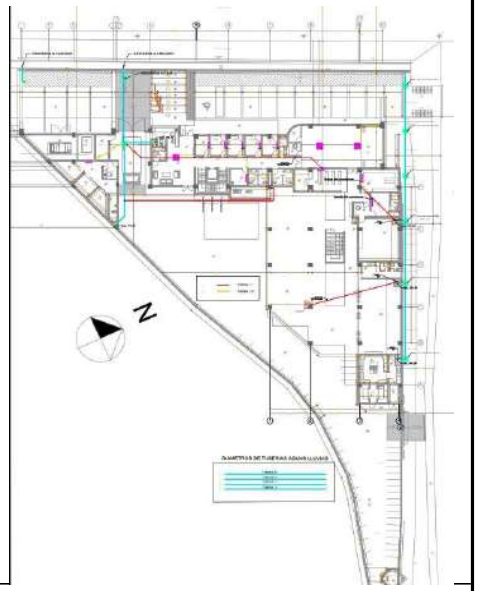

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.18	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 6"		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





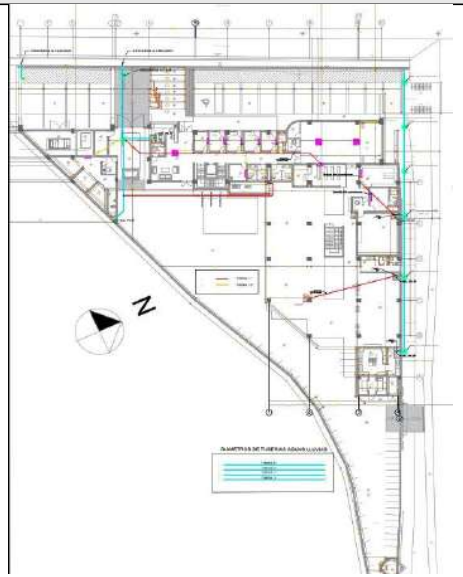

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	71.40
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.19	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 4"		

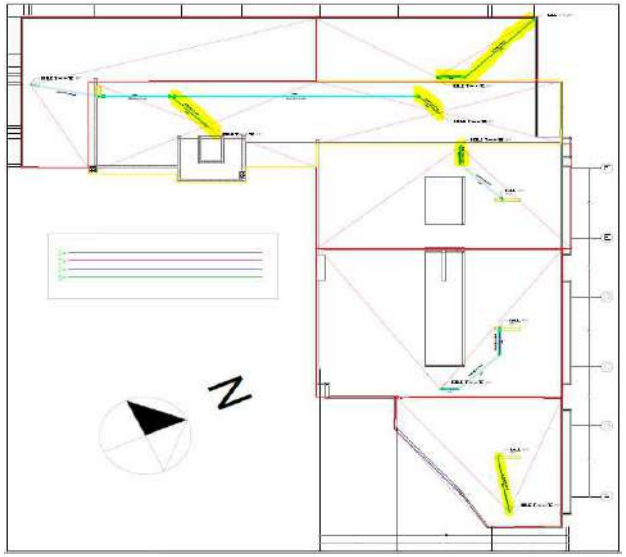

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
Tuberia				71.4		71.40
						71.40

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.19	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 4"		

REGISTRO FOTOGRÁFICO







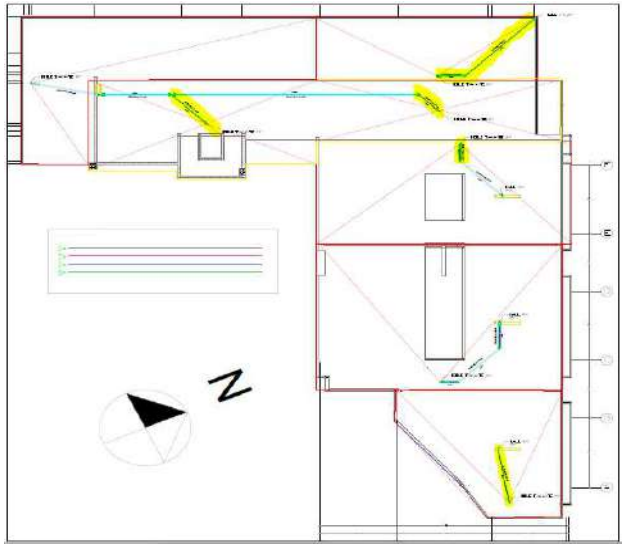

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** — OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**21.40**
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.20	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 3"		

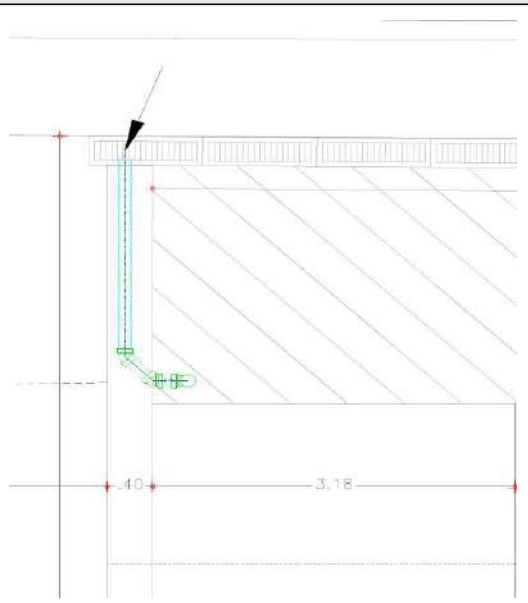

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	Largo	Ancho	Espesor			ACUMULADO
TUBERÍA				**21.4**		**21.40**
						21.40

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**	
4.20	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 3"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







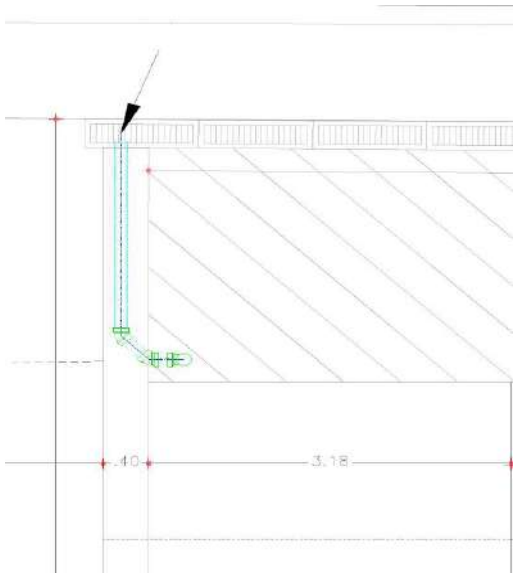

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**4.00**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**Und**
4.21	Caja de inspeccion 0,6x0,6m libre				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
PISO 1				**4**		**4.00**
						4.00

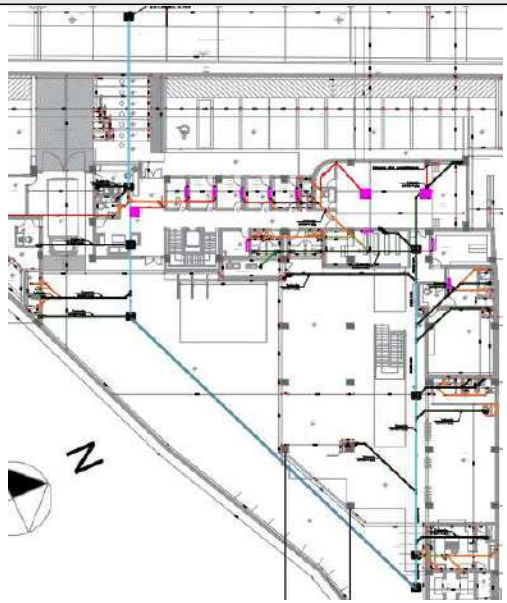

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** / OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** / **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**Und**
4.21	Caja de inspeccion 0,6x0,6m libre		

REGISTRO FOTOGRÁFICO







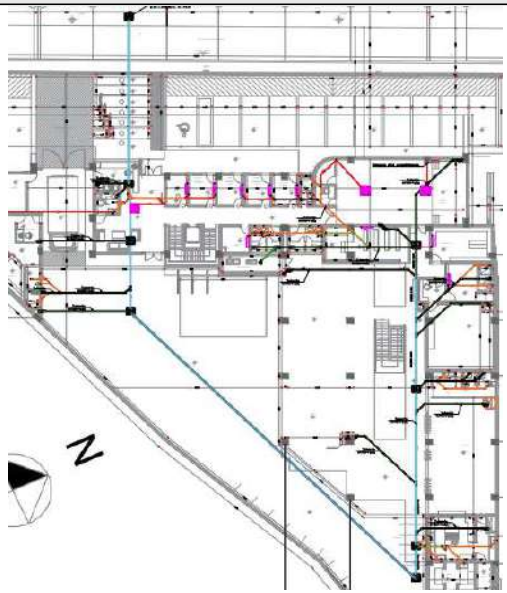

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**128.40**
ITEM	**4** — **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.22	Suministro e instalación de tubería Ventilación PVC de ø 2"		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CONVENCION**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
PISO 1	1				**128.4**	**128.40**
						128.40

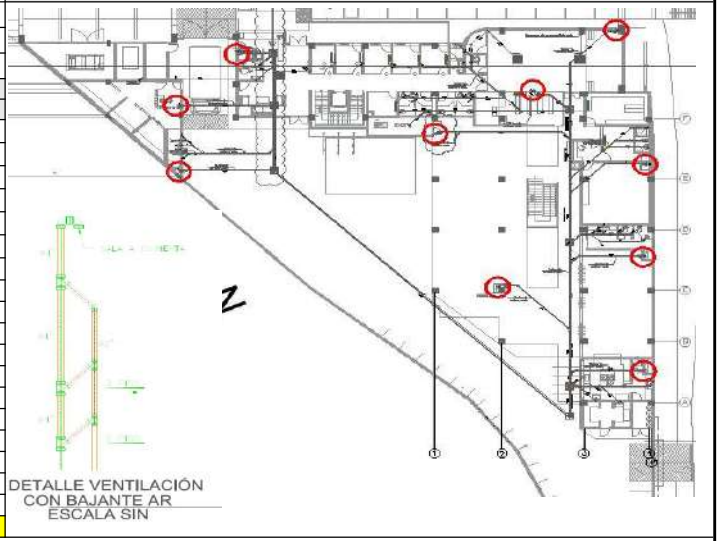

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025


OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO		UNIDAD	m
4.22	Suministro e instalación de tubería Ventilación PVC de ø 2"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







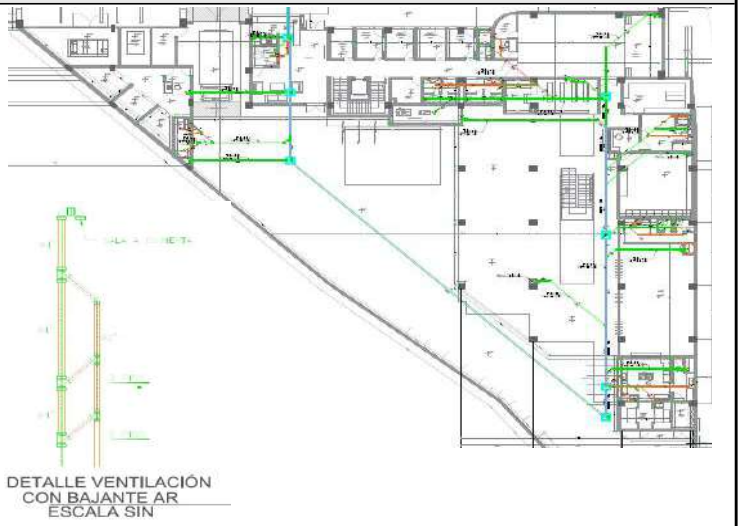

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 63.74
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD: m
4.23	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 6"		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
TUBERÍA SANITARIA 6"						
PISO 1				63.74		63.74
BLOQUE 1						
BLOQUE 2						
						63.74

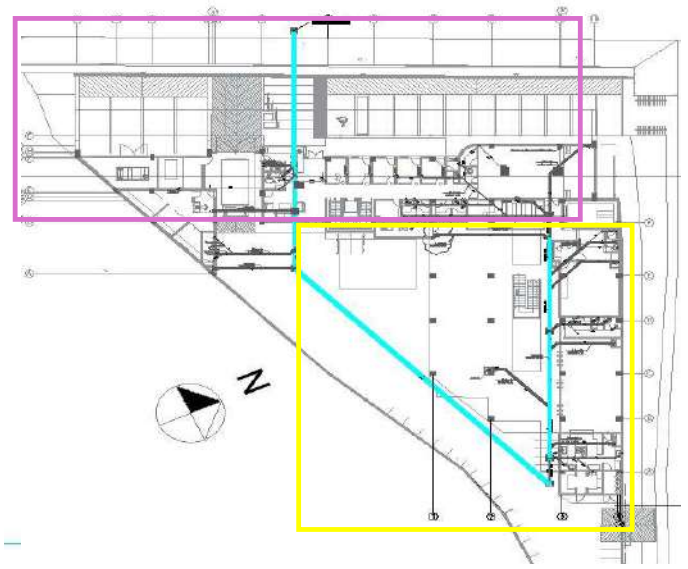

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**


OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**	
4.23	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 6"					

REGISTRO FOTOGRÁFICO







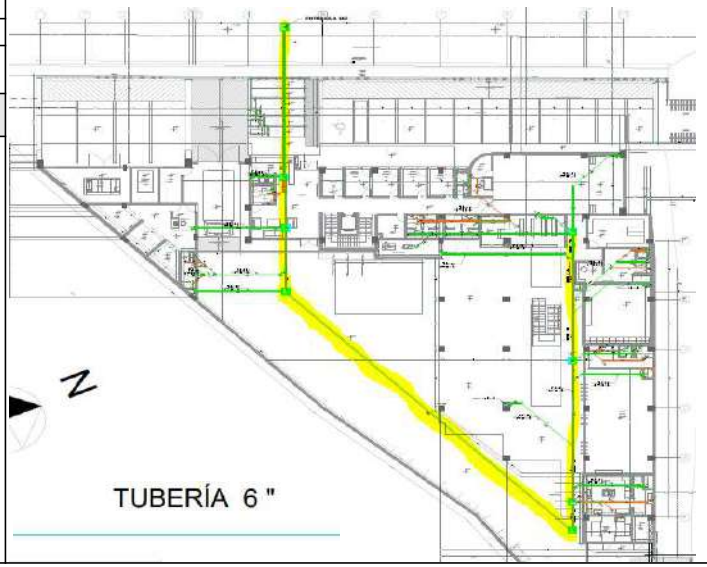

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	295.52
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**m**
4.24	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 4"				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**CONVENCION**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
TUBERÍA SANITARIA 4"						
PISO 1				295.52		295.52
BLOQUE 1						
BLOQUE 2						
						295.52

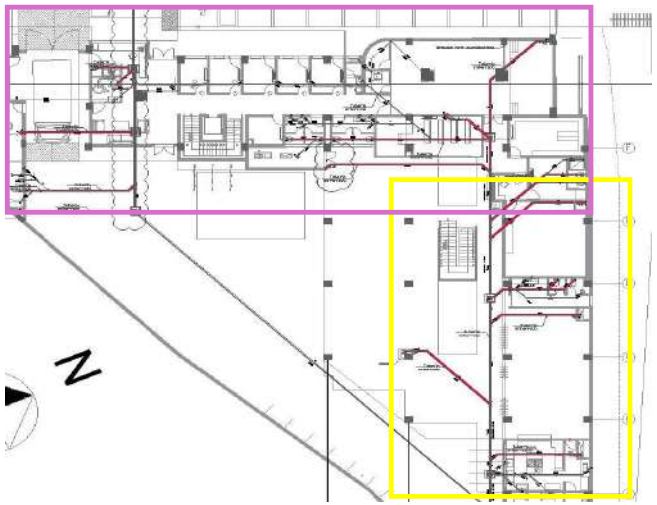

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** / OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** / **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.24	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 4"		

REGISTRO FOTOGRÁFICO







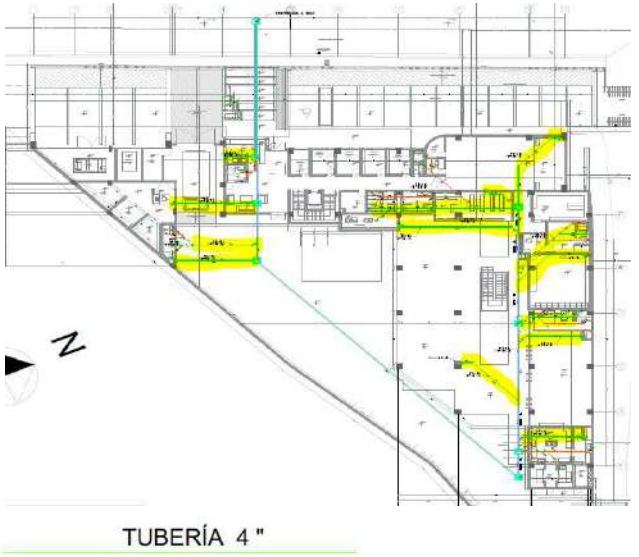

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	157.00
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO		UNIDAD	m
4.25	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 2"				

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

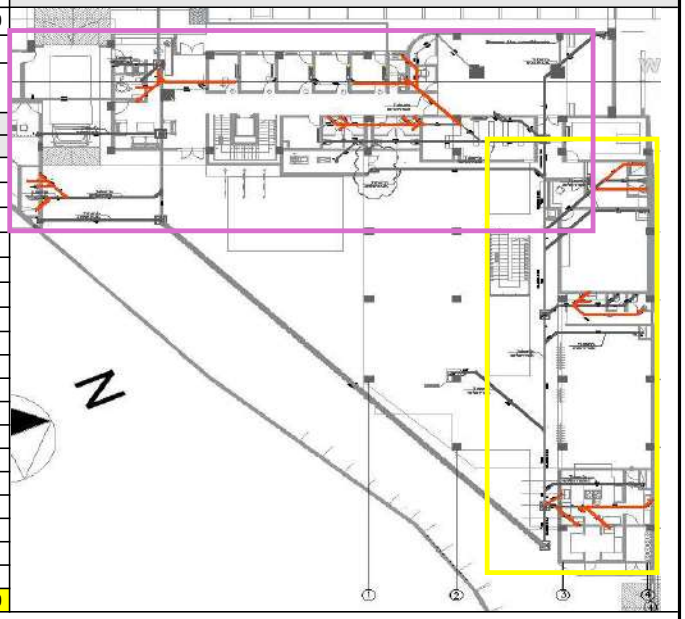

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor			
TUBERÍA SANITARIA 2"						
PISO 1				157		157.00
BLOQUE 1						
BLOQUE 2						
						157.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** / OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4** / **SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**m**
4.25	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 2"		

REGISTRO FOTOGRÁFICO







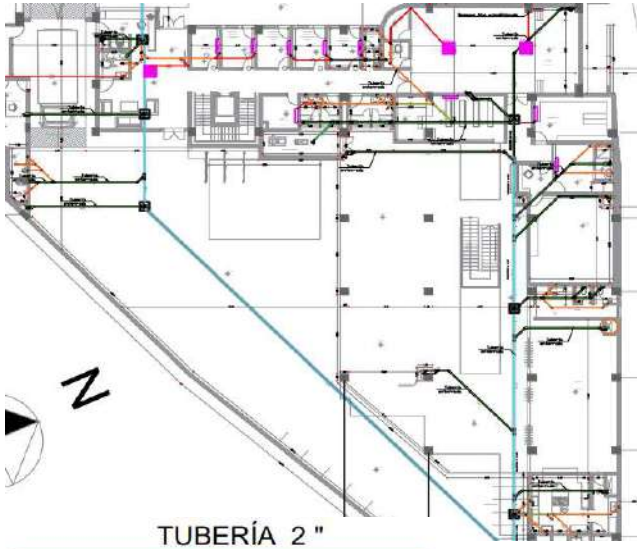

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 161.00
ITEM	4	SISTEMA HIDROSANITARIO	UNIDAD: Und
4.26	Punto sanitario de 4"		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	UNIDAD	DESPERDICIO	TOTAL ACUMULADO
PISO 1						
BLOQUE 1						
DUCHAS				1		1.00
ORINALES				2		2.00
SANITARIOS				4		4.00
BLOQUE 2						
DUCHAS				2		2.00
ORINALES				2		2.00
SANITARIOS				8		8.00
PISO 2						
BLOQUE 1						
DUCHAS				12		12.00
ORINALES				10		10.00
SANITARIOS				22		22.00
BLOQUE 2						
DUCHAS				26		26.00
ORINALES				10		10.00
SANITARIOS				12		12.00
PISO 3						
BLOQUE 1						
DUCHAS				12		12.00
ORINALES				2		2.00
SANITARIOS				22		22.00
BLOQUE 2						
DUCHAS				4		4.00
ORINALES				4		4.00
SANITARIOS				6		6.00
						161.00

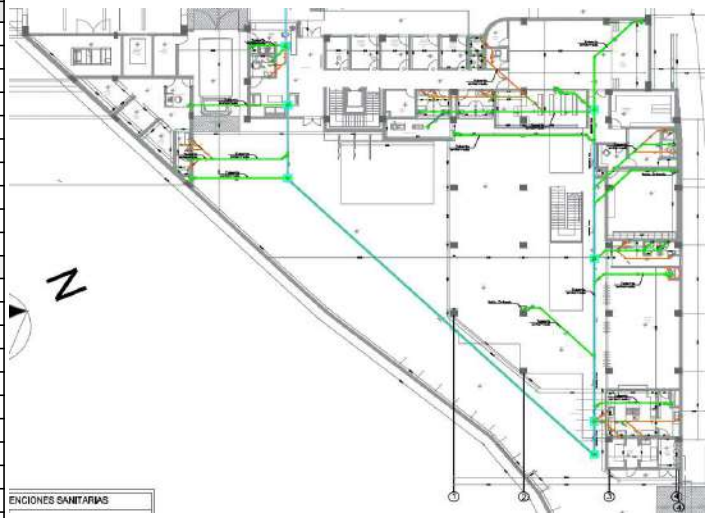

Elaboró

Aprobó

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**Und**
4.26	Punto sanitario de 4"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





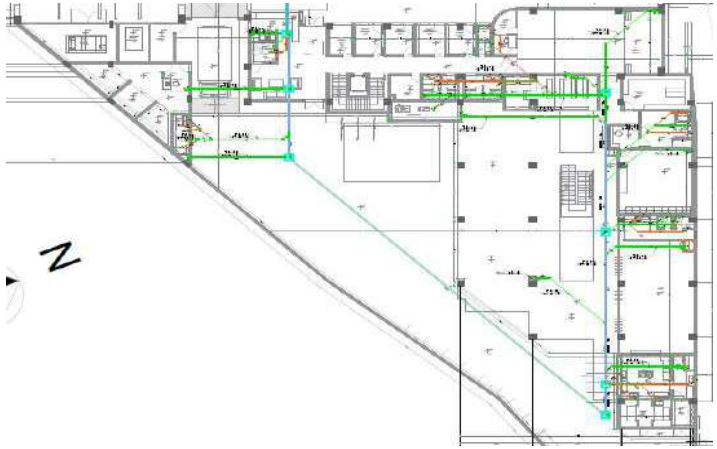

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**46.00**	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**Und**	
4.27	Punto sanitario de 2"					

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			
DUCHAS						**46.00**
						46.00

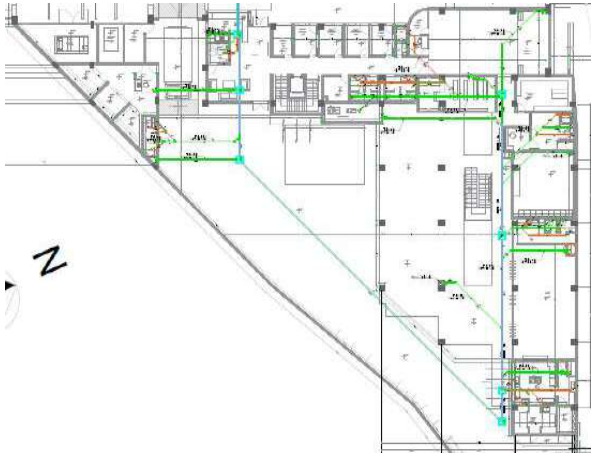

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**Und**	
4.27	Punto sanitario de 2"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







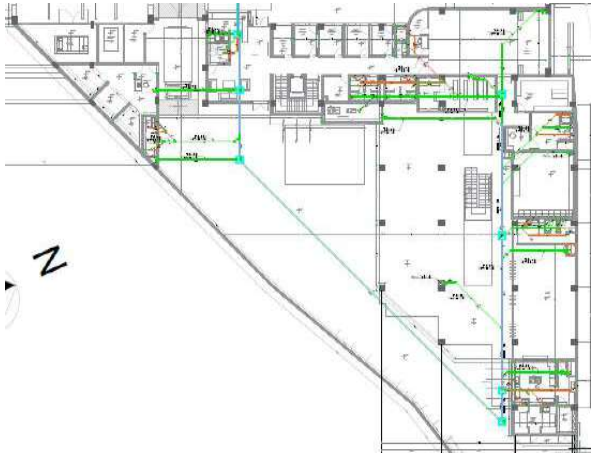

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**92.00**
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**		**UNIDAD**	**Und**
4.28	Suministro e Instalacion de Sifon Sanitario 2-4"				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Espesor**			**ACUMULADO**
DUCHAS Y BAÑOS				**92**		**92.00**
						92.00

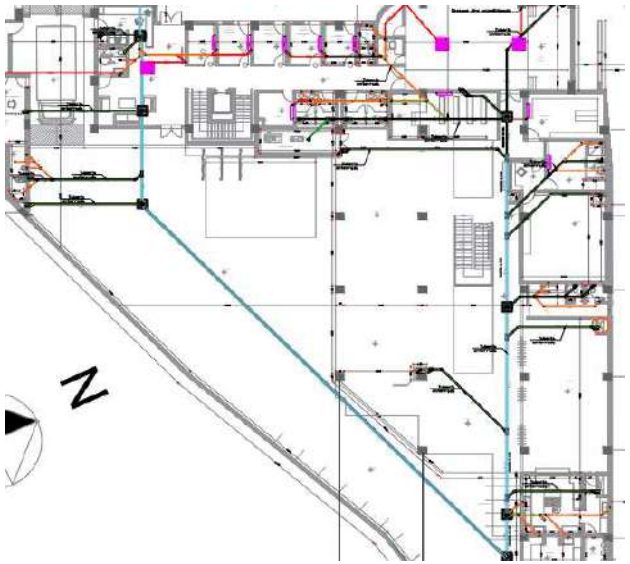

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**4**	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**UNIDAD**	**Und**	
4.28	Suministro e Instalacion de Sifon Sanitario 2-4"				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





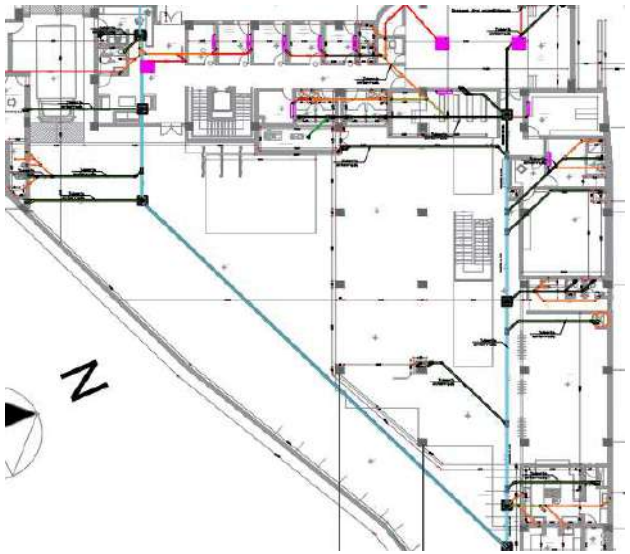

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	3,422.39
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.01	Mamposteria en bloque estructural 20x20x40				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Cantidad		
BLOQUE 1 PRIMER PISO					
COCINA PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	21.65	4.50		97.43	97.43
COMEDOR PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	11.74	4.50		52.83	52.83
LAVADO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	8.48	4.50		38.16	38.16
ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	28.14	4.50		126.63	126.63
CUARTO ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	12.13	4.50		54.59	54.59
BLOQUE 2 PRIMER PISO					
INTENDENCIA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.77	4.50		84.47	84.47
SALA MULTIPLE PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	24.86	4.50		111.87	111.87
CUARTO DE ASEO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	1.22	4.50		5.49	5.49
OFICINAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	15.56	4.50		70.02	70.02
DESCUENTOS					
SERVICIOS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	13.23	4.50		59.54	59.54
PUNTO FIJO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	7.40	4.50		33.30	33.30
SALA DE ESPERA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	24.03	4.50		108.14	108.14
CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	9.28	4.50		41.76	41.76
CELDAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.23	38.89	4.50		175.01	175.01
LEVANTE 0.34	14.95	4.50		67.28	67.28
BLOQUE 1 SEGUNDO PISO					
ALOJAMIENTO SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	144.10	3.50		504.34	504.34
BAÑOS SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	60.30	3.50		211.05	211.05
BLOQUE 2 SEGUNDO PISO					
ESPACIO DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 1					

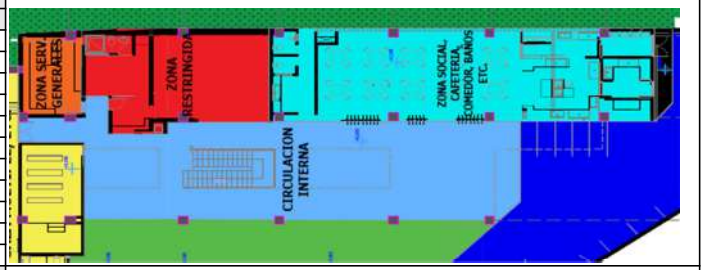



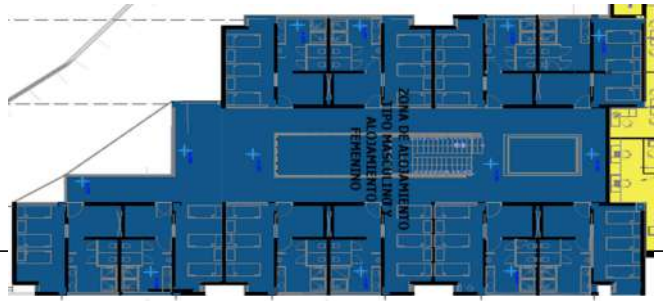

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 3,422.39
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	UNIDAD: m²
5.01	Mamposteria en bloque estructural 20x20x40		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Cantidad		
LEVANTE 0.20	57.91	3.50		202.69	202.69
´PUNTO FIJO SEGUNDO PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	23.40	3.50		81.90	81.90
ESPACIO DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 2					
LEVANTE 0.20	68.18	3.50		238.63	238.63
BLOQUE 1 TERCER PISO					
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	81.58	3.45		281.45	281.45
BAÑOS TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	60.30	3.45		208.04	208.04
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	58.91	3.45		203.24	203.24
BLOQUE 2 TERCER PISO					
APARTAMENTO TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	32.08	3.45		110.68	110.68
LAVADO DE BAÑOS TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	3.64	3.45		12.56	12.56
CAFETERIA TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.34	3.45		63.27	63.27
POLICAFE TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	14.21	3.45		49.02	49.02
SALA TV Y DESCANSO TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	15.80	3.45		54.51	54.51
TERRAZA Y MIRADOR TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.12	3.45		62.51	62.51
CUBIERTA					
LEVANTE 0.20	12.02	1.00		12.02	12.02
					3422.39

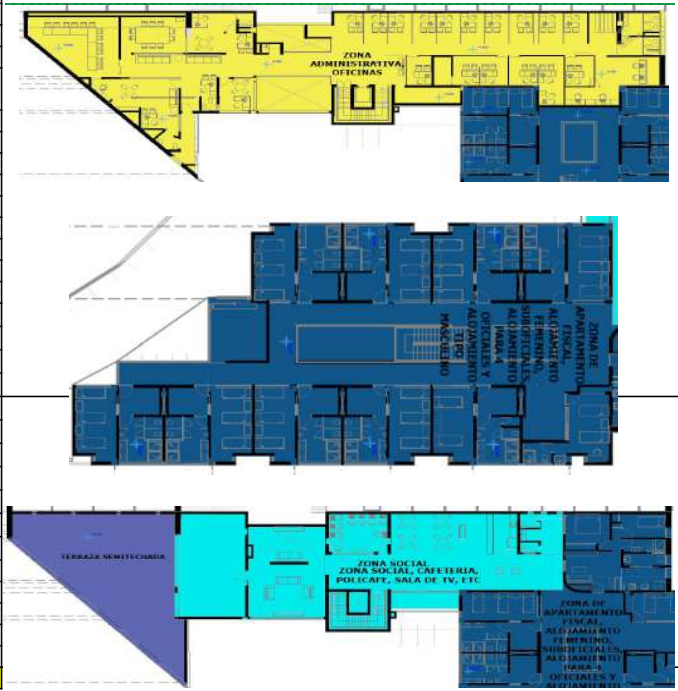

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**

OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**	
5.01	Mamposteria en bloque estructural 20x20x40					

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	6	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 1,939.94
ITEM	5.02	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	UNIDAD: m²
5.02	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Espesor		
BLOQUE 1 PRIMER PISO					
COCINA PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	23.91	4.50		107.60	107.60
COMEDOR PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	7.96	4.50		35.82	35.82
LAVADO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	8.56	4.50	0.12	38.52	38.52
CUARTO ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	4.17	4.50	0.12	18.77	18.77
BLOQUE 2 PRIMER PISO					
SALA MULTIPLE PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	10.48	4.50		47.16	47.16
CUARTO DE ASEO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	1.70	4.50		7.65	7.65
ORATORIO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	25.71	4.50		115.70	115.70
OFICINAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	27.66	4.5		124.47	124.47
SERVICIOS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	23.44	4.50		105.48	105.48
PUNTO FIJO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	9.27	4.50		41.72	41.72
SALA DE ESPERA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	9.76	4.50		43.92	43.92
CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	20.93	4.50		94.19	94.19
CARGA Y DESCARGA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	5.22	4.50		23.49	23.49
BLOQUE 1 SEGUNDO PISO					
ALOJAMIENTO SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	89.37	3.45		308.33	308.33
BAÑOS SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	63.60	3.45		219.42	219.42
BLOQUE 2 SEGUNDO PISO					
ESPACIOS DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 1					
LEVANTE 0.12	33.05	3.45		114.02	114.02
ESPACIOS DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 2					
LEVANTE 0.12	64.98	3.45		224.18	224.18

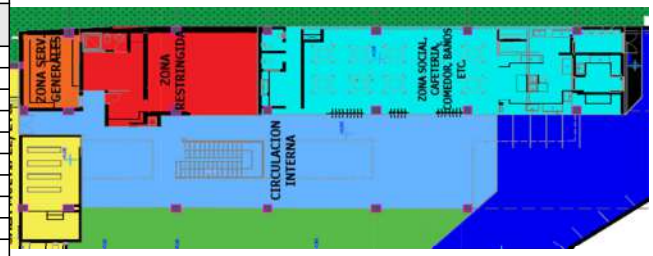



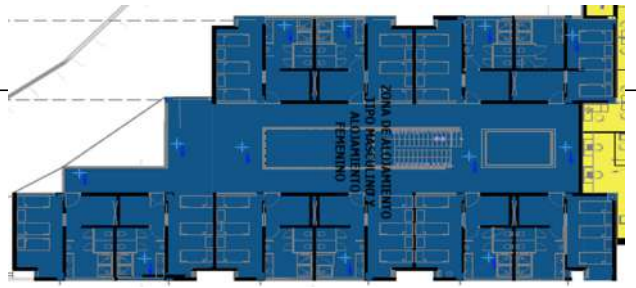



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**6**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1,939.94**
ITEM	**5.02**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		**UNIDAD**	**m²**
5.02	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Alto**	**Espesor**		
BLOQUE 1 TERCER PISO					
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1	**78.12**	**3.45**		**269.52**	**269.52**
					1939.94



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE / **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **M2**
5.02	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40		

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 3,422.39
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	UNIDAD: m²
5.03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Largo	Alto		M2	TOTAL ACUMULADO
BLOQUE 1 PRIMER PISO					
COCINA PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	21.65	4.50		97.43	97.43
COMEDOR PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	11.74	4.50		52.83	52.83
LAVADO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	8.48	4.50		38.16	38.16
ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	28.14	4.50		126.63	126.63
CUARTO ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	12.13	4.50		54.59	54.59
BLOQUE 2 PRIMER PISO					
INTENDENCIA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.77	4.50		84.47	84.47
SALA MULTIPLE PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	24.86	4.50		111.87	111.87
CUARTO DE ASEO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	1.22	4.50		5.49	5.49
OFICINAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	15.56	4.50		70.02	70.02
DESCUENTOS					
SERVICIOS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	13.23	4.50		59.54	59.54
PUNTO FIJO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	7.40	4.50		33.30	33.30
SALA DE ESPERA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	24.03	4.50		108.14	108.14
CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	9.28	4.50		41.76	41.76
CELDAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.23	38.89	4.50		175.01	175.01
LEVANTE 0.34	14.95	4.50		67.28	67.28
BLOQUE 1 SEGUNDO PISO					
ALOJAMIENTO SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	144.10	3.50		504.34	504.34
BAÑOS SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	60.30	3.50		211.05	211.05

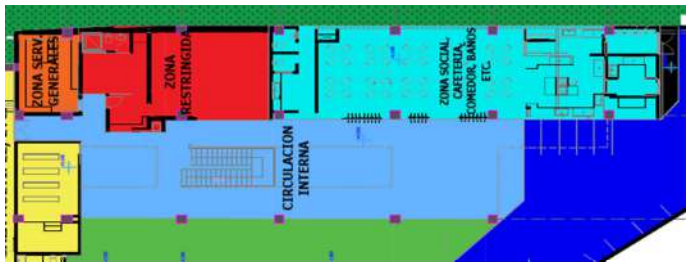



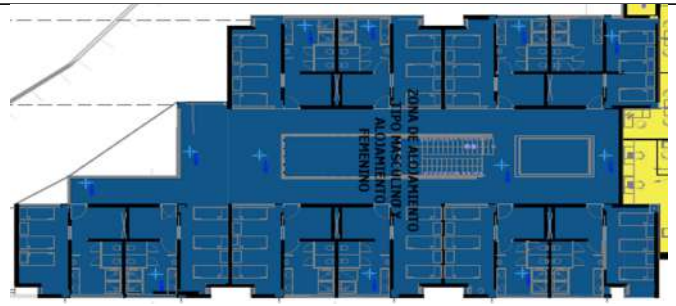

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	3,422.39
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto			
BLOQUE 2 SEGUNDO PISO					
ESPACIO DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 1					
LEVANTE 0.20	57.91	3.50		202.69	202.69
´PUNTO FIJO SEGUNDO PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	23.40	3.50		81.90	81.90
ESPACIO DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 2					
LEVANTE 0.20	68.18	3.50		238.63	238.63
BLOQUE 1 TERCER PISO					
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	81.58	3.45		281.45	281.45
BAÑOS TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	60.30	3.45		208.04	208.04
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	58.91	3.45		203.24	203.24
BLOQUE 2 TERCER PISO					
APARTAMENTO TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	32.08	3.45		110.68	110.68
LAVADO DE BAÑOS TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	3.64	3.45		12.56	12.56
CAFETERIA TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.34	3.45		63.27	63.27
POLICAFE TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	14.21	3.45		49.02	49.02
SALA TV Y DESCANSO TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	15.80	3.45		54.51	54.51
TERRAZA Y MIRADOR TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.12	3.45		62.51	62.51
CUBIERTA					
LEVANTE 0.20	12.02	1.00		12.02	12.02
					3422.39



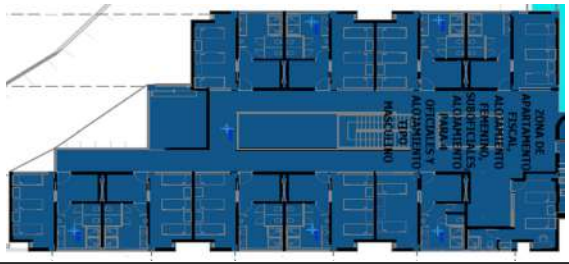



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.		**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**						
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**				**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**					**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ		**CANTIDAD**	**3,422.39**	
ITEM	**5**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**UNIDAD**	**m²**	
5.03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.						
UBICACIÓN		**DIMENSIONES**			**M2**	**TOTAL ACUMULADO**	
		Largo	**Alto**				
CONSORCIO EP-C					**CONSORCIO I - POLICE**		

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.				


REGISTRO FOTOGRÁFICO











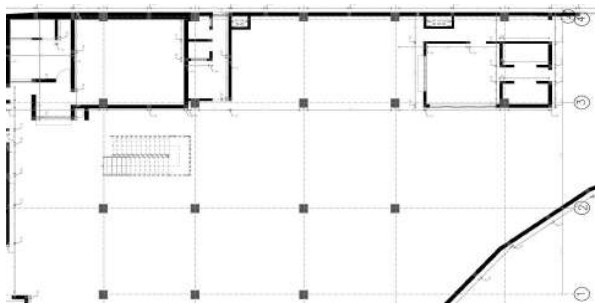



CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.				




REGISTRO FOTOGRÁFICO














REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**5**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		**UNIDAD**	**m²**
5.03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.				



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 10,798.42
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	UNIDAD: m²
5.04	Pañete allanado 1:4		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
MURO 0.20					
BLOQUE 1 PRIMER PISO					
COCINA PRIMER PISO BLOQUE 1 INTERIOR					
LEVANTE 0.20	21.65	4.50	1.00	97.43	97.43
COMEDOR PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	11.74	4.50	1.00	52.83	52.83
LAVADO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	8.48	4.50	1.00	38.16	38.16
ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	28.14	4.50	1.00	126.63	126.63
CUARTO ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	12.13	4.50	1.00	54.59	54.59
PAÑETE EXTERIOR					
LEVANTE 0.20	82.14	4.50	1.00	369.63	369.63
BLOQUE 2 PRIMER PISO					
INTENDENCIA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.77	4.50	1	84.47	84.47
SALA MULTIPLE PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	24.86	4.50	1	111.87	111.87
CUARTO DE ASEO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	1.22	4.50	1	5.49	5.49
OFICINAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	15.56	4.50	1	70.02	70.02
DESCUENTOS			1		
SERVICIOS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	13.23	4.50	1	59.54	59.54
PUNTO FIJO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	7.40	4.50	1	33.30	33.30
SALA DE ESPERA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	24.03	4.50	1	108.14	108.14
CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	9.28	4.50	1	41.76	41.76
CELDAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.23	38.89	4.50	1	175.01	175.01
LEVANTE 0.34	14.95	4.50	1	67.28	67.28
PAÑETE EXTERIOR					
LEVANTE 0.20	168.19	4.50	1	756.86	756.86
BLOQUE 1 SEGUNDO PISO					
ALOJAMIENTO SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	144.10	3.50	1	504.34	504.34
BAÑOS SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	60.30	3.50	1	211.05	211.05

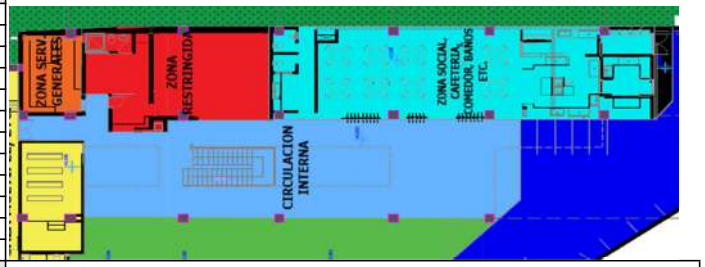





CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 10,798.42
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	UNIDAD: m²
5.04	Pañete allanado 1:4		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PAÑETE EXTERIOR					
LEVANTE 0.20	204.40	3.50	1	715.39	715.39
BLOQUE 2 SEGUNDO PISO					
ESPACIO DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 1					
LEVANTE 0.20	57.91	3.50	1	202.69	202.69
´PUNTO FIJO SEGUNDO PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	23.40	3.50	1	81.90	81.90
ESPACIO DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 2					
LEVANTE 0.20	68.18	3.50	1	238.63	238.63
PAÑETE EXTERIOR					
LEVANTE 0.20	149.49	3.50	1	523.22	523.22
BLOQUE 1 TERCER PISO					
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	81.58	3.45	1	281.45	281.45
BAÑOS TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	60.30	3.45	1	208.04	208.04
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.20	58.91	3.45	1	203.24	203.24
PAÑETE EXTERIOR					
LEVANTE 0.20	200.79	3.45	1	692.73	692.73
BLOQUE 2 TERCER PISO					
APARTAMENTO TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	32.08	3.45	1	110.68	110.68
LAVADO DE BAÑOS TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	3.64	3.45	1	12.56	12.56
CAFETERIA TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.34	3.45	1	63.27	63.27
POLICAFE TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	14.21	3.45	1	49.02	49.02
SALA TV Y DESCANSO TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	15.80	3.45	1	54.51	54.51
TERRAZA Y MIRADOR TERCER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.20	18.12	3.45	1	62.51	62.51
CUBIERTA					
LEVANTE 0.20	44.56	1.00	2	89.12	89.12
PAÑETE EXTERIOR					





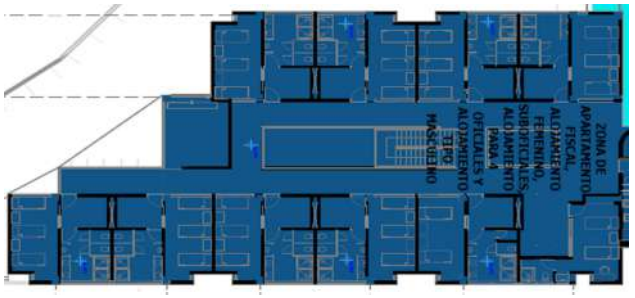



CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 10,798.42
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	UNIDAD: m²
5.04	Pañete allanado 1:4		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
LEVANTE 0.20	102.19	3.45	1	352.56	352.56
MURO 0.12					
BLOQUE 1 PRIMER PISO					
COCINA PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	23.91	4.5	2	215.19	215.19
COMEDOR PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	7.96	4.5	2	71.64	71.64
LAVADO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	8.56	4.5	2	77.04	77.04
CUARTO ARMERILLO PRIMER PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	4.17	4.5	2	37.53	37.53
BLOQUE 2 PRIMER PISO					
SALA MULTIPLE PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	10.48	4.50	2	94.32	94.32
CUARTO DE ASEO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	1.70	4.50	2	15.30	15.30
ORATORIO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	25.71	4.50	2	231.39	231.39
OFICINAS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	27.66	4.5	2	248.94	248.94
SERVICIOS PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	23.44	4.50	2.00	210.96	210.96
PUNTO FIJO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	9.27	4.50	2	83.43	83.43
SALA DE ESPERA PRIMER PISO BLOQUE 2					0.00
LEVANTE 0.12	9.76	4.50	2	87.84	87.84
CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	20.93	4.50	2	188.37	188.37
CARGA Y DESCARGA PRIMER PISO BLOQUE 2					
LEVANTE 0.12	5.22	4.50	2	46.98	46.98
BLOQUE 1 SEGUNDO PISO					
ALOJAMIENTO SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	89.37	3.45	2	616.65	616.65
BAÑOS SEGUNDO PISO BLOQUE 1					
LEVANTE 0.12	63.60	3.45	2	438.84	438.84







CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	10,798.42
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.04	Pañete allanado 1:4				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			M2	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
BLOQUE 2 SEGUNDO PISO					
ESPACIOS DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 1					
LEVANTE 0.12	33.05	3.45	2	228.05	228.05
ESPACIOS DE OFICINAS SEGUNDO PISO BLOQUE 2 PARTE 2					
LEVANTE 0.12	64.98	3.45	2	448.36	448.36
BLOQUE 1 TERCER PISO					
ALOJAMIENTO TERCER PISO BLOQUE 1	79.38	3.45	2	547.73	547.73
					10798.42



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.04	Pañete allanado 1:4				

REGISTRO FOTOGRÁFICO














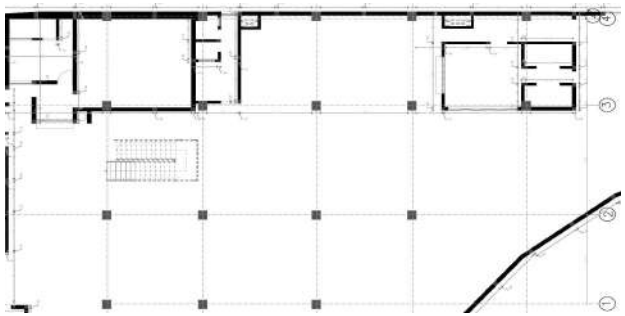





CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²
5.04	Pañete allanado 1:4				



REGISTRO FOTOGRÁFICO











CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		UNIDAD	m²	
5.04	Pañete allanado 1:4					


REGISTRO FOTOGRÁFICO














CONSORCIO EP-C	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SUCRE** **MUNICIPIO DE COROZAL** **MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**5**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**	**UNIDAD**	**m²**	
5.04	Pañete allanado 1:4				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

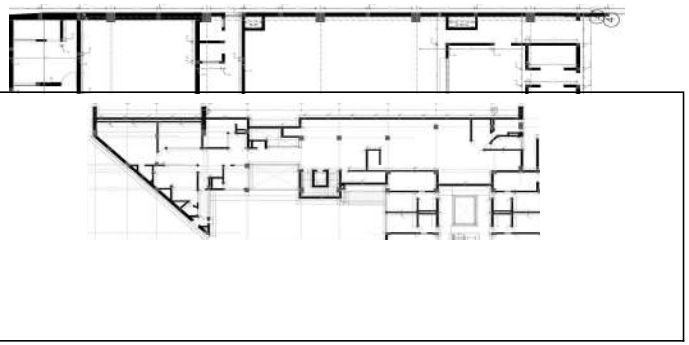

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1,170.64**
ITEM	**6**	**ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS**		**UNIDAD**	**m²**
6.01	PISO EN BALDOSA DE GRANITO PERLATO PULIDO AL PLOMO 0.33X0.33MT				



UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Alto**	**Lados**		
PRIMER PISO					
				512.03	**512.03**
SEGUNDO PISO					
				658.61	**658.61**
					1170.64

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**6**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
6.01	Piso en baldosa de granito perlato pulido al plomo 0,33x0,33mt				



REGISTRO FOTOGRÁFICO











Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 87.76
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** m²
7.01	Suministro e Instalacion Puerta Hoja en Lámina Galvanizada Anticorrosivo Acabado En Pintura Tipo Esmalte Cerradura Tipo Palanca		



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
				87.76		87.76
						87.76

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 1.00
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **UND**
7.02	Suministro e Instalacion Portón doble exterior metálica para vehículos 4,00 x 4,30 mts		



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 1						
PISO 1						
Salida de Vehículos				1.00		1.00
						1.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.03	Suministro e Instalacion Portón doble exterior metálica para vehículos 4,00 x 4,00 mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
PISO 1						
Acceso de vehículos				**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
ITEM	7	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** UND
7.04	#¡REF!		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

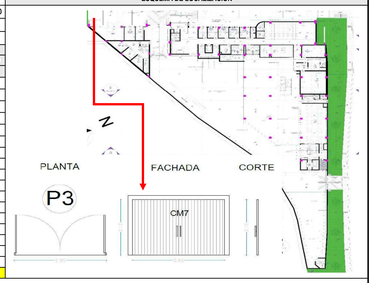

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 2						
PISO 1						
Planta eléctrica				5.00		5.00
						5.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**		1.00
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**			**UNIDAD**	**UND**
7.05	Suministro e Instalacion Puerta Doble de acceso primer piso 2,05 × 2,40 mts					

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
PISO 1						
Acceso al 1er piso				1.00		1.00
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

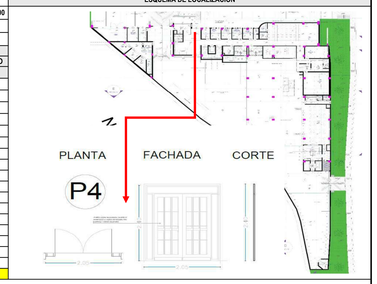

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**		1.00
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**			**UNIDAD**	**UND**
7.06	Suministro e Instalacion Puerta Doble de sala de espera de primer piso de 2,00 x 2,40 mts					

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
PISO 1						
Sala de espera 1er piso				**1.00**		**1.00**
						1.00

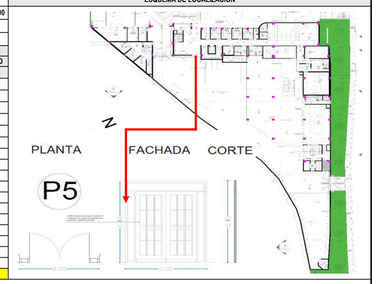

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2.00**
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**UND**
7.07	Suministro e Instalacion Puerta Entrada Doble Tamaño 1,50×2,40 mts		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Alto	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
BLOQUE 2						
PISO 1						
Salida sala múltiple				1.00		1.00
BLOQUE 1						
PISO 1						
Cuarto de basuras				1.00		1.00
						2.00

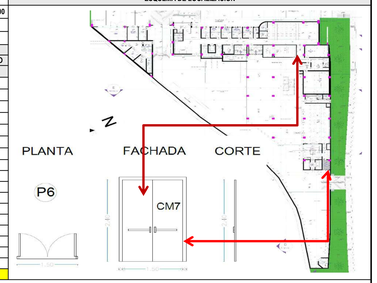

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK EMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**3.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.08	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 1,00 × 2,40 mts				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 2						
PISO 1						
Baño discapacitados				1.00		1.00
Baño hombres				1.00		1.00
Baño mujeres				1.00		1.00
						3.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

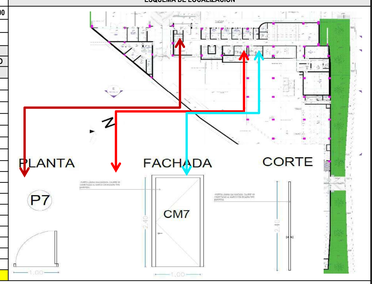

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK EMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 68.00
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **UND**
7.09	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 0,90 × 2,40 mts		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 1						
PISO 1						
Cocina				1.00		1.00
Cuarto basura				1.00		1.00
Armerillo				1.00		1.00
Control armerillo				2.00		2.00
Intendencia				1.00		1.00
Acceso guardia por zona vehicular				1.00		1.00
PISO 2						
Garita Vigilancia				1.00		1.00
Acceso alojamientos				20.00		20.00
PISO 3						
Acceso alojamientos				19.00		19.00
BLOQUE 2						
PISO 1						
Radicación				1.00		1.00
Cuarto eléctrico				1.00		1.00
Zona de seguridad				2.00		2.00
Oficina de vigilancia comunitaria				2.00		2.00
Oficina de infancia y adolescencia				2.00		2.00
Oficina de denuncia y contraversiones				2.00		2.00
Oficina de atención al ciudadano				2.00		2.00
PISO 2						
Oficina Subcomandante				1.00		1.00
Sala de Juntas				1.00		1.00
Oficina comandante				1.00		1.00
Rack comunicaciones				1.00		1.00
PISO 3						
Terraza				1.00		1.00
Apartamento fiscal				1.00		1.00
Alcoba Principal Apartamento Fiscal				1.00		1.00
Alcoba Secundaria Apartamento Fiscal				1.00		1.00
Baño Apartamento fiscal				1.00		1.00
						68.00

BLOQUE 1



BLOQUE 2



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

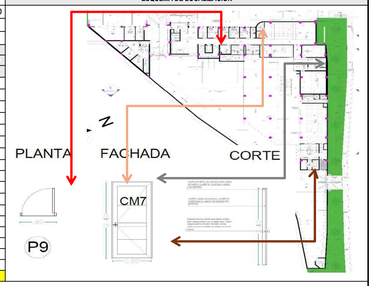

CANTIDAD	**6.00**
ITEM	**7**
UNIDAD	**UND**
7.10	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 0,80 × 2,40 mts

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**CONVENCION**	**TOTAL ACUMULADO**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			
BLOQUE 1						
PISO 1						
Despensa				1.00		1.00
Baño cuarto de armerillo				1.00		1.00
BLOQUE 2						
PISO 1						
UPS Tecnico				1.00		1.00
Depósito				1.00		1.00
BLOQUE 1						
PISO 2						
Baños Admon 2do Piso				2.00		2.00
						6.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD		5.00
ITEM	7	PUERTAS Y VENTANAS			UNIDAD	UND
7.11	Suministro e Instalacion de Puerta batiente Tamaño 0,70 × 2,40 mts					

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 1						
PISO 1						
Baños zona social (comedor)				2.00		2.00
BLOQUE 2						
PISO 1						
Cuarto de controles				1.00		1.00
BLOQUE 1						
PISO 3						
Baños zona social				2.00		2.00
						5.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

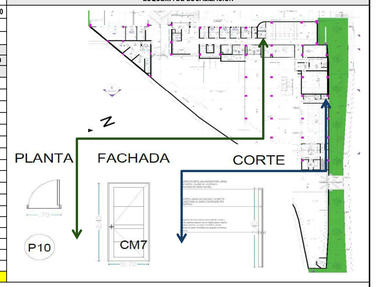

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	**FECHA**	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	3.00
ITEM	7	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.12	Suministro e Instalacion de Puerta en barrotes de hierro para zona de retenidos 0,90 x 2,70 mts				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 2						
PISO 1						
Celdas Retenidos				3.00		3.00
						3.00

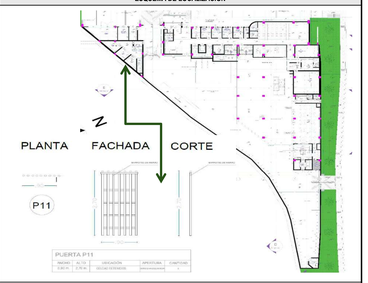

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	**FECHA**	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	1.00
ITEM	7	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.13	Suministro e Instalacion de puerta de vidrio con Riel sobre marco en metal galvanizado, tamaño 1,50 x 2,40 mts				

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

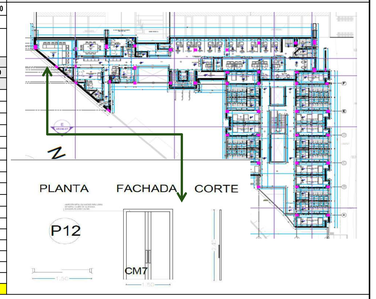

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 2						
PISO 2						
Sala de crisis				1.00		1.00
						1.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**4.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.14	Suministro e Instalacion de puerta de vidrio batiente para oficinas, tamaño 0,90 x 2,40 mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**CONVENCION**	**TOTAL ACUMULADO**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			
Bloque 2						
PISO 2						
Oficina Subsijin				**1.00**		**1.00**
Investigadores subsijin				**1.00**		**1.00**
Analistas subsipol				**1.00**		**1.00**
Oficina disponible				**1.00**		**1.00**
						4.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

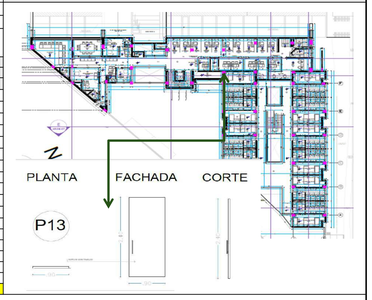

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.15	Suministro e Instalacion de puerta deslizante empotrada doble en lámina galvanizada, tamaño 1,27 x 2,10 mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**CONVENCION**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 2						
PISO 3						
Apto Fiscal				**2.00**		**2.00**
						2.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

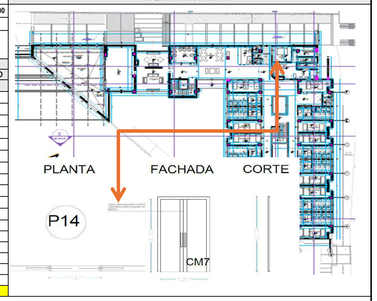

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**1.00**		
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **UND**
7.16	Suministro e Instalacion de puerta doble galvanizada deslizante, tamaño 2,00 x 2,10 mts		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

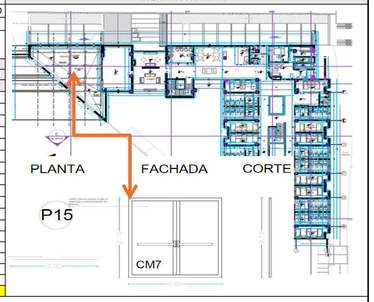

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Alto	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
Bloque 2						
PISO 3						
Terraza				**1.00**		**1.00**
						1.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.17	Suministro e Instalacion de puerta doble en lámina galvanizada con calibre 18", tamaño 1,20 x 2,40 mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**CONVENCION**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 2						
PISO 2						
Salida de emergencia				**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

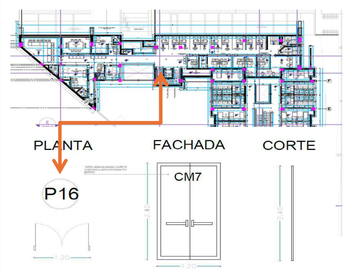

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.18	Suministro e Instalacion de puerta metálica enrollable para exterior para transformador, tamaño 2,00 x 2,10 mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**CONVENCION**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 2						
PISO 1						
Subestación electrica - Transformador				**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

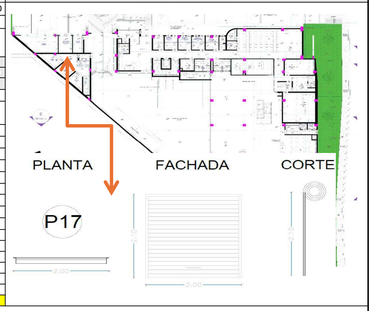

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.19	Suministro e Instalacion de puerta en lámina galvanizada deslizante para oratorio, tamaño 0,80 x 2,40 mts				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	Convención	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 1						
PISO 1						
Oratorio				**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

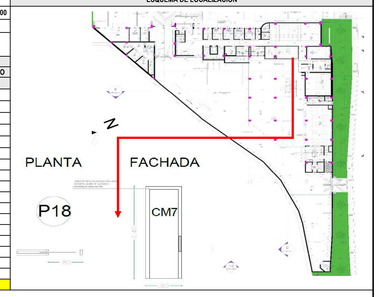

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**19.00**		
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **UND**
7.20	Suministro e Instalacion de Puerta deslizante en lámina galvanizada para baños, Tamaño 0,90 × 2,40 mts		

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

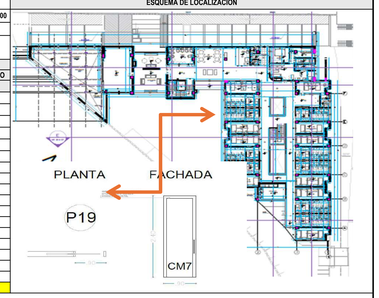

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	Convención	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 1						
PISO 2						
Alojamientos				**19.00**		**19.00**
						19.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.21	Suministro e Instalacion de puerta en lámina de metal galvanizado calibre 18" para cuarto de bombas, tamaño 0,90 x 2.10 mts				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Convención**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
BLOQUE 2						
PISO 1						
Cuarto de bombas				**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

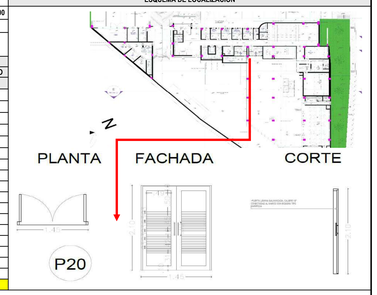

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**UND**
7.22	Suministro e Instalacion de puerta doble en metal galvanizado para sala múltiple, tamaño 1,81 x 2,40 mts				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	Convención	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
BLOQUE 2						
PISO 1						
Acceso a sala múltiple				**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

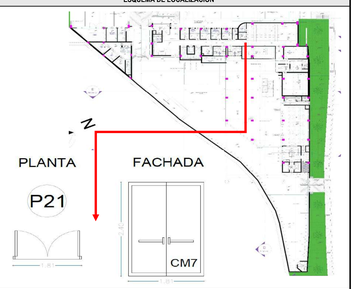

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 3.00
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** M2
7.23	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 6,00 x 0,50 m		



UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 2 piso 1						
Planta eléctrica	3.00	0.50		**1.00**		**1.50**
Planta eléctrica	3.00	0.50		**1.00**		**1.50**
						3.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.23	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 6,00 x 0,50 m				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



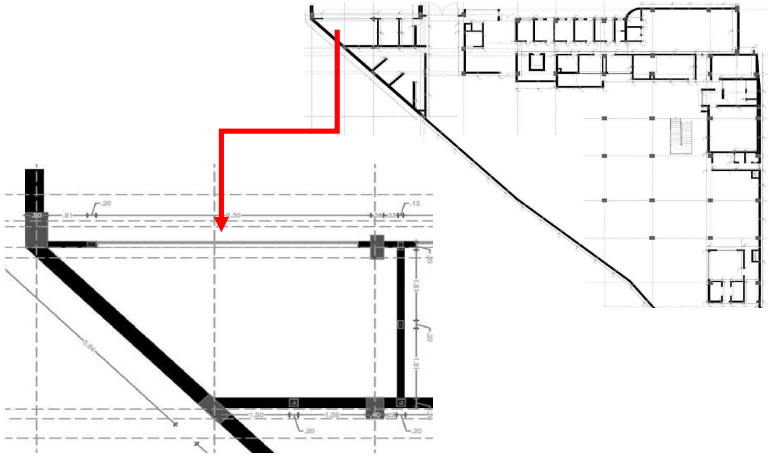

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.24	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 2,00 x 0,50 m				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 2 piso 1						
Transformador	2.00	0.50		**1.00**		**1.00**
						1.00

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

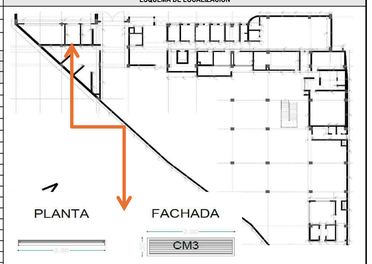

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**		**0.80**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**			**UNIDAD**	**M2**
7.25	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,60 x 0,50 m					

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			
Bloque 2 piso 1						
Cuarto eléctrico	1.60	0.50		**1.00**		**0.80**
						0.80

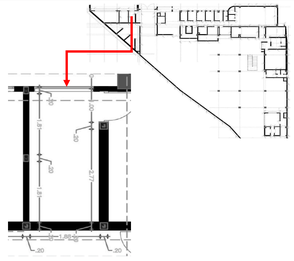

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.25	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,60 x 0,50 m				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



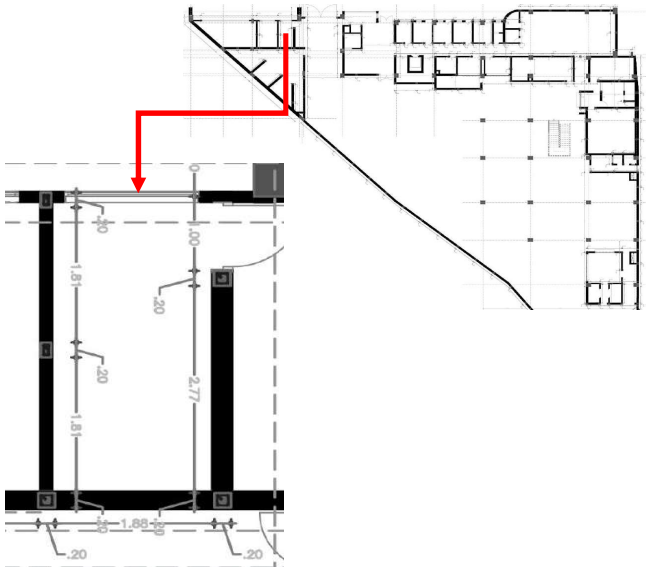

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	**FECHA**	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	4.08
ITEM	7 — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	M2
7.26	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 4.08 x 1,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

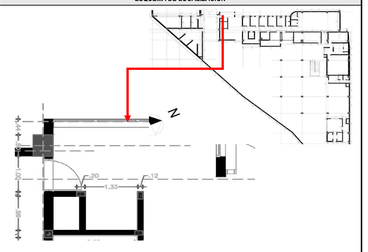
N
2.00
0.30
0.30
0.30

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.26	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 4.08 x 1,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia				


REGISTRO FOTOGRÁFICO









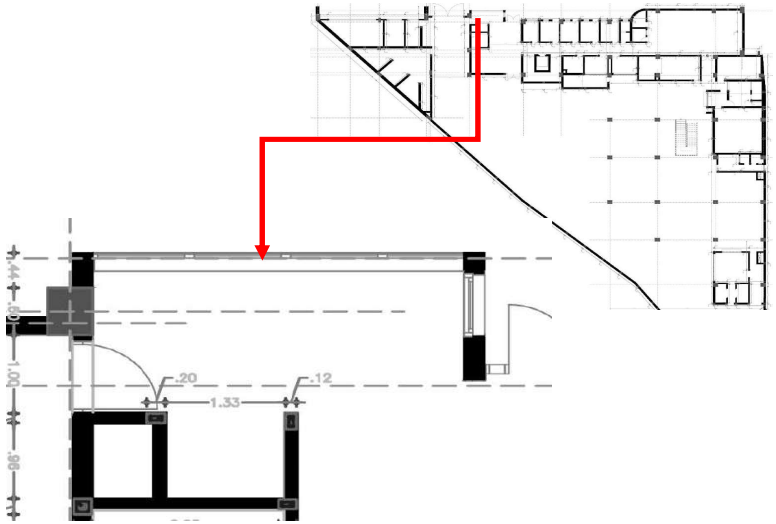

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**4.08**
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**m²**
7.27	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 3.97 x 0.60 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

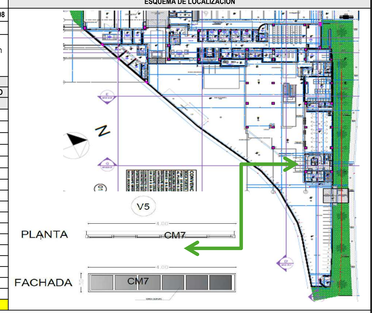

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Alto	Espesor	CANTIDAD	CONVENCION	TOTAL ACUMULADO
Bloque 1 piso 1						
Cocina	4.08	1.00		**1.00**		**4.08**
						4.08

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ

ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**M2**
7.28	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 2.90 x 0.50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 2 piso 1						
Baños mujeres	2.90	0.50		**1.00**		1.45
						1.45



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.28	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 6 hojas corrediza, tamaño 2.90 x 0.50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







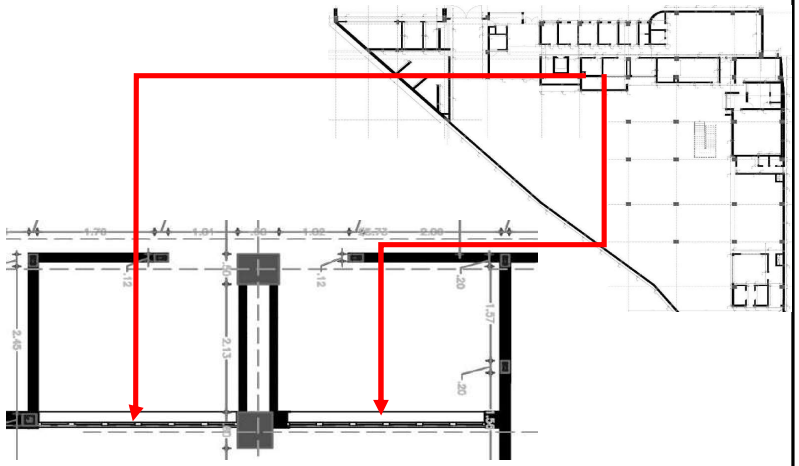

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 2.54
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **M2**
7.29	Suministro e Instalacion ventaneria en aluminio de guillotina con tarja para armerillo, tamaño 2,12 x 1,20 m		

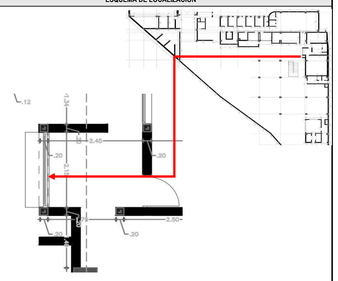

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 1 piso 1						
Control armerillo	2.12	1.20		**1.00**		**2.54**
						2.54

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.29	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de guillotina con tarja para armerillo, tamaño 2,12 x 1,20 m				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



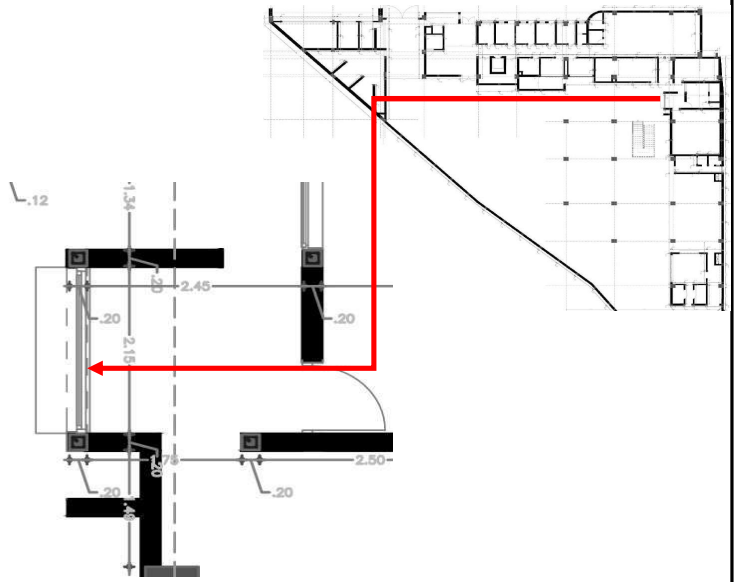

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 1.30
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **M2**
7.30	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,31 x 0,60 m		

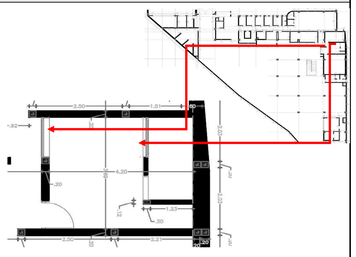

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 1 piso 1						
Cuarto armerillo	1.29	0.50		**1.00**		**0.65**
Baño armerillo	1.30	0.50		**1.00**		**0.65**
						1.30

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.30	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,31 x 0,60 m				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





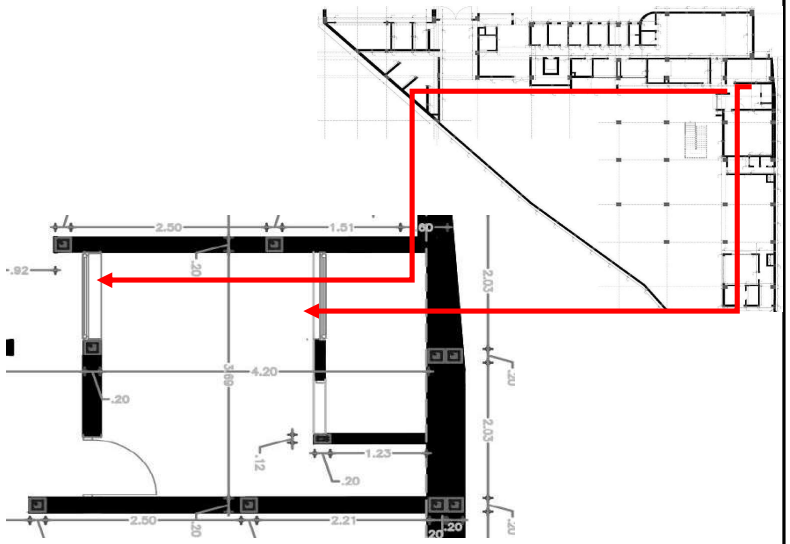

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **M2**
7.31	Suministro e Instalación ventanería en aluminio de guillotina con tarja para oficinas de atención, tamaño 0,80 x 1,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			
Bloque 2 piso 1						
Oficinas de atención	0.80	1.00		**5.00**		**4.00**
						4.00

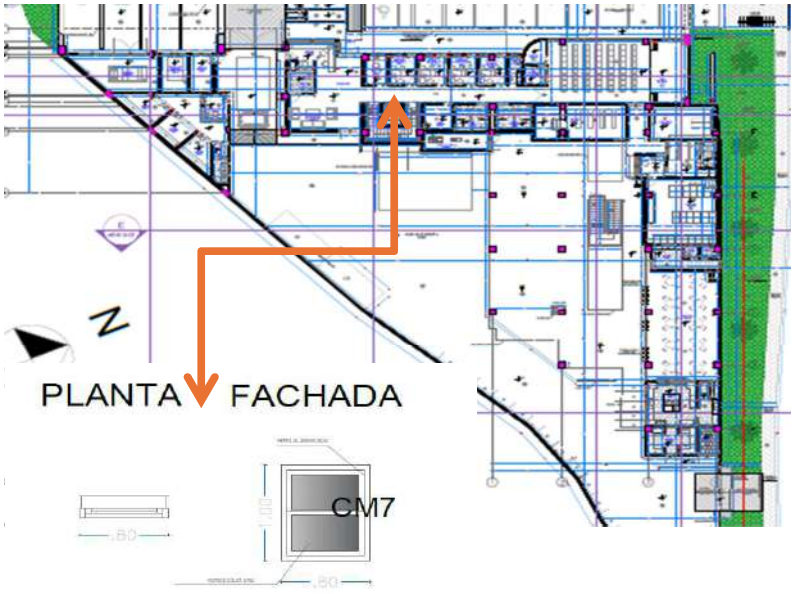

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
CANTIDAD	**0.40**		
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** **M2**
7.32	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio proyectante, tamaño 0,80 x 0,50 m		

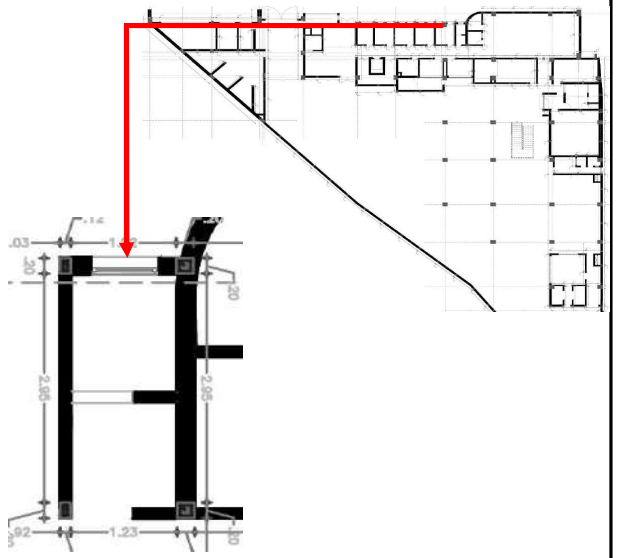

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Ancho	Alto	Espesor			
Bloque 2 piso 1						
Cuarto de aseo	0.80	0.50		**1.00**		**0.40**
						0.40

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.32	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio proyectante, tamaño 0,80 x 0,50 m				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





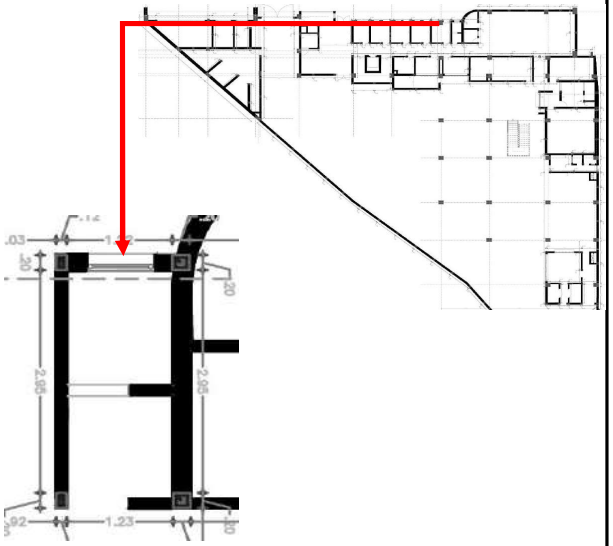

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**

INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2.71**
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.33	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de guillotina con tarja para comedor, tamaño 2,50 x 1,20 m				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 1 piso 1						
Comedor	2.46	1.10		**1.00**		**2.71**
						2.71

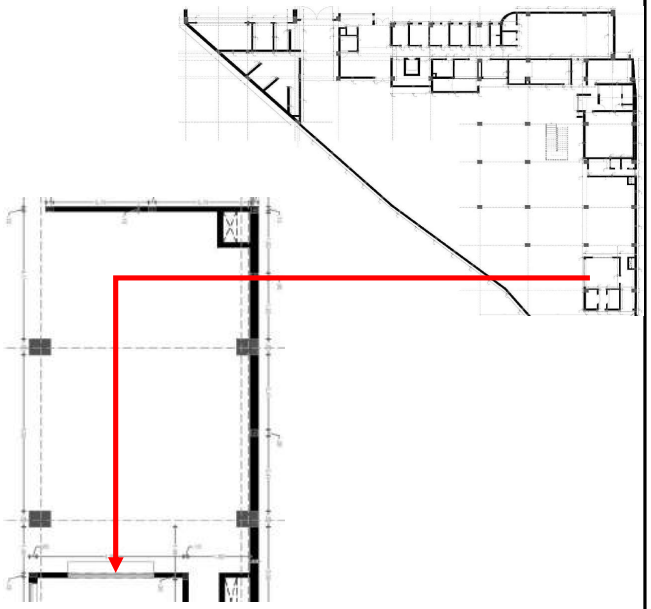

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.33	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de guillotina con tarja para comedor, tamaño 2,50 x 1,20 m				

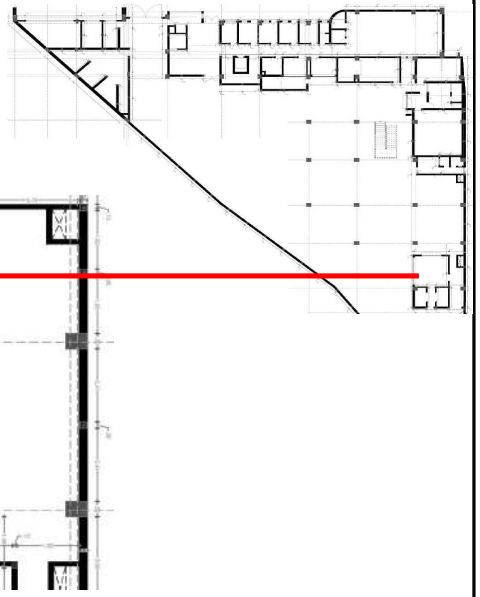

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 1.00
ITEM	7	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD: M2
7.34	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,00 x 0,50 m		

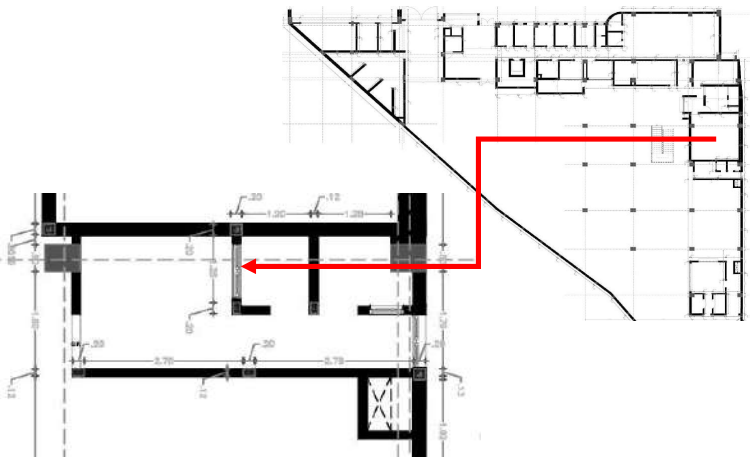

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Ancho	Alto	Espesor			
Bloque 1 piso 1						
Baño social mujeres	1.00	0.50		1.00		0.50
Baño social mujeres	1.00	0.50		1.00		0.50
						1.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**		**UNIDAD**	**M2**
7.34	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 1,00 x 0,50 m				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





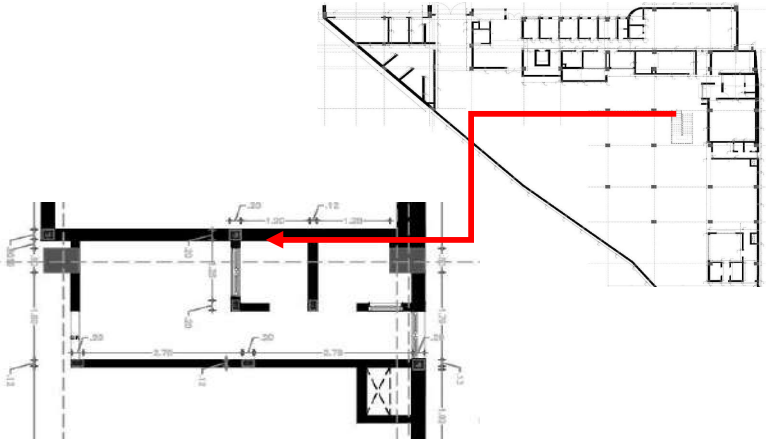

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**18.00**
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**M2**
7.35	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,40 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

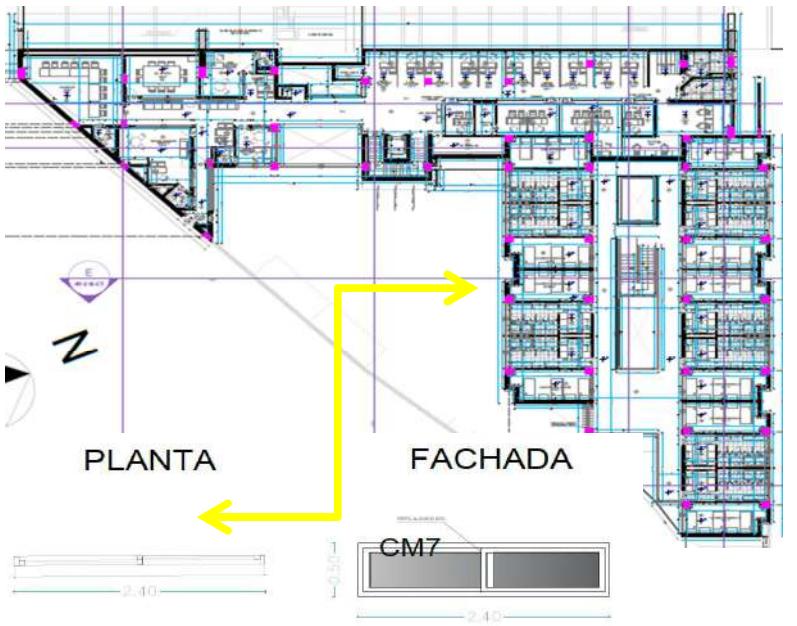

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Alto	Espesor	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Bloque 1 piso 2 y 3						
Alojamientos	2.40	0.50		**15.00**		**18.00**
						18.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**27.84**
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**M2**
7.36	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,93 x 0,50 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 1 piso 2 y 3						
Exterior Baños Alojamientos	2.93	0.50		**19.00**		**27.84**
						27.84

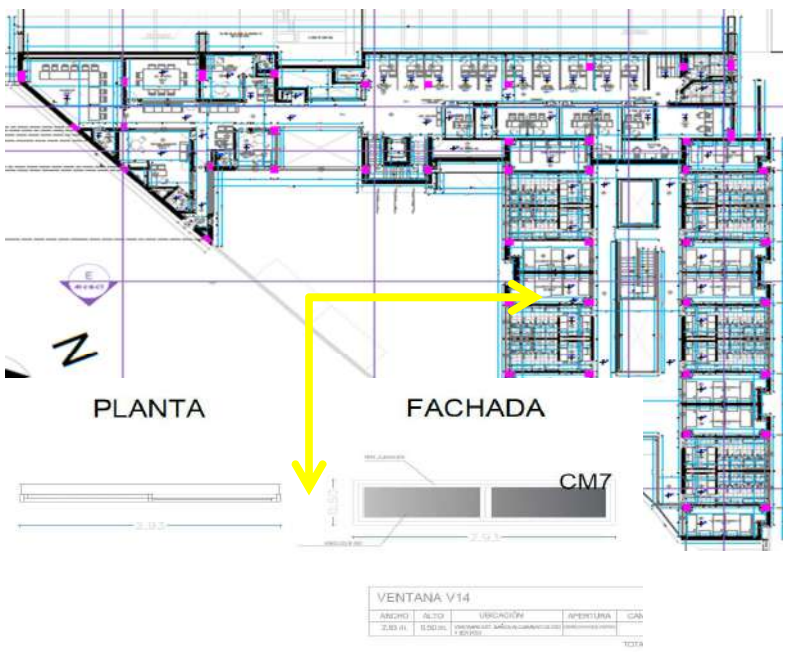

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 20.00
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** M2
7.37	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio proyectante, tamaño 0,50 x 2,00 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

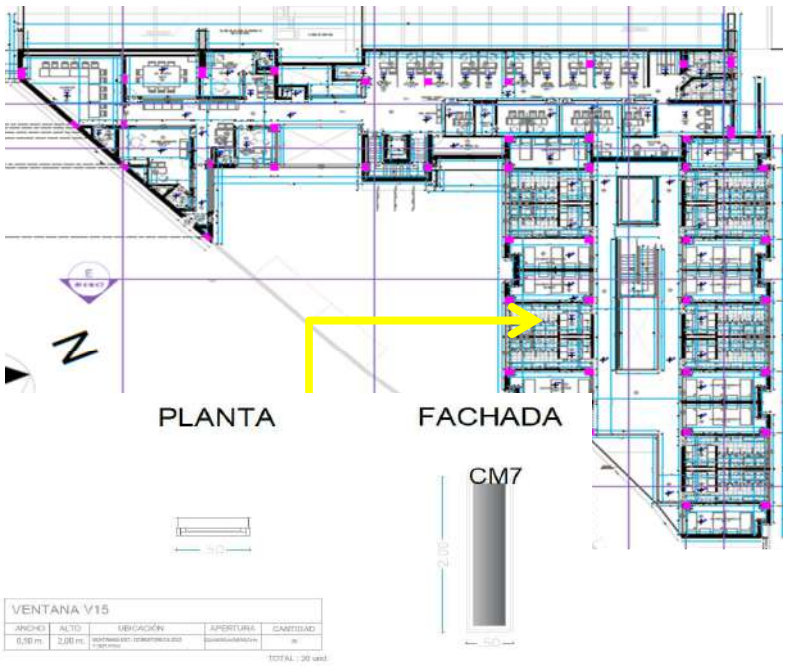

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Ancho	Alto	Espesor			
Bloque 1 piso 2 y 3						
Exterior Dormitorios Alojamientos	0.50	2.00		**20.00**		**20.00**
						20.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2.88**
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**m²**
7.38	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 2,06 x 1,40 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

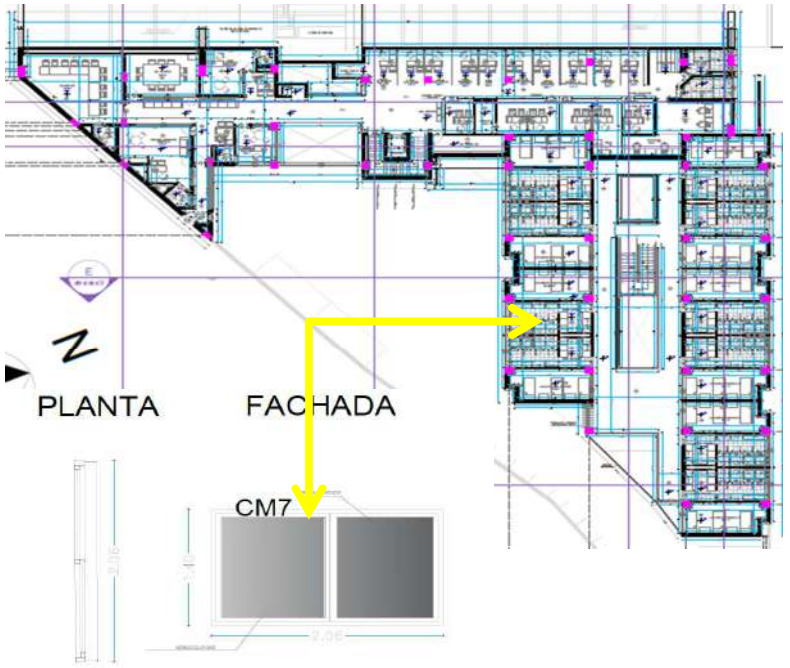

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 2 piso 2						
Oficina comandante de estación	2.06	1.40		**1.00**		**2.88**
						2.88

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	11.65
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**m²**
7.39	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 4 hojas corrediza, tamaño 4.16 x 1,40 m vidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

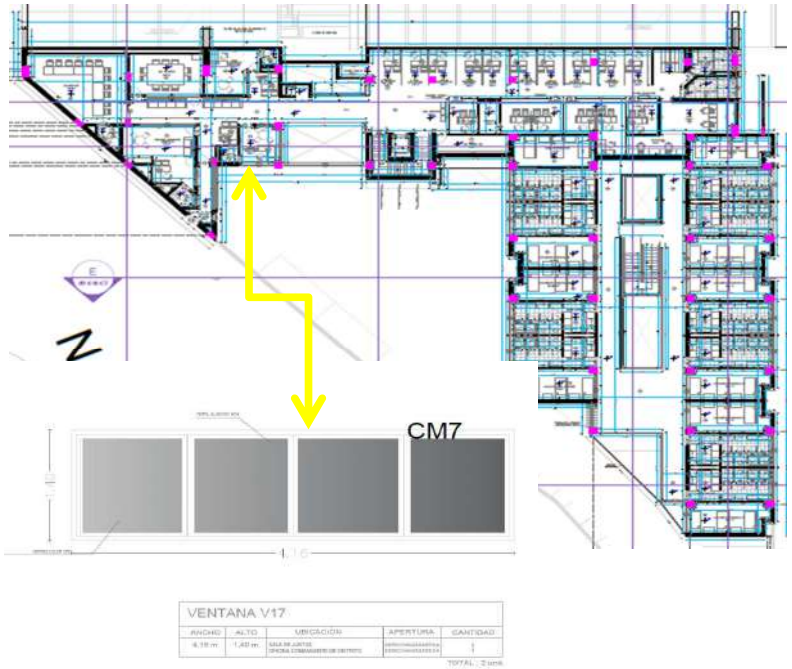

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Alto	Espesor	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Bloque 2 piso 2						
Sala de juntas	4.16	1.40		**1.00**		**5.82**
Oficina comandande de distrito	4.16	1.40		**1.00**		**5.82**
						11.65

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	0.30
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**m²**
7.40	Suministro de persianas en Aluminio Ref. C 40E ALUZINC o similar, tamaño 0,60 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Alto	Espesor	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Bloque 2 piso 1						
Baño hombres	0.60	0.50		**1.00**		**0.30**
						0.30

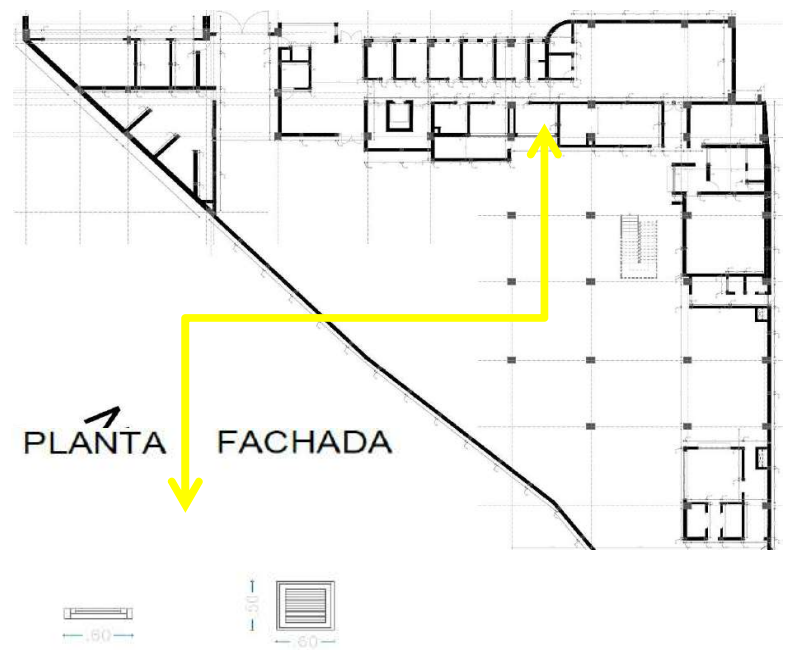

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7	FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23	SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C		ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL: OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD: 4.32
ITEM	7	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD: m²
7.41	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de 2 hojas corrediza, tamaño 1,80 x 2,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

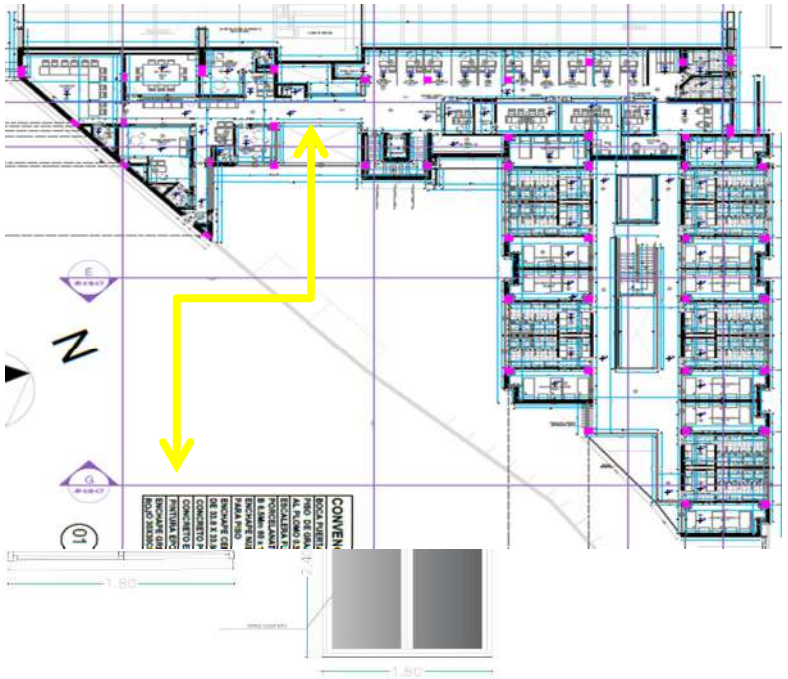

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Ancho	Alto	Espesor			
Bloque 2 piso 2						
Oficina comandande distrito	1.80	2.40		1.00		4.32
						4.32

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE — **REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**2.10**
ITEM	**7** — **PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD**	**m²**
7.42	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio de guillotina con tarja para oficina de radicación, tamaño 1,50 x 1,40 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Espesor**			**ACUMULADO**
Bloque 2 piso 1						
Oficina radicación	1.50	1.40		**1.00**		**2.10**
						2.10

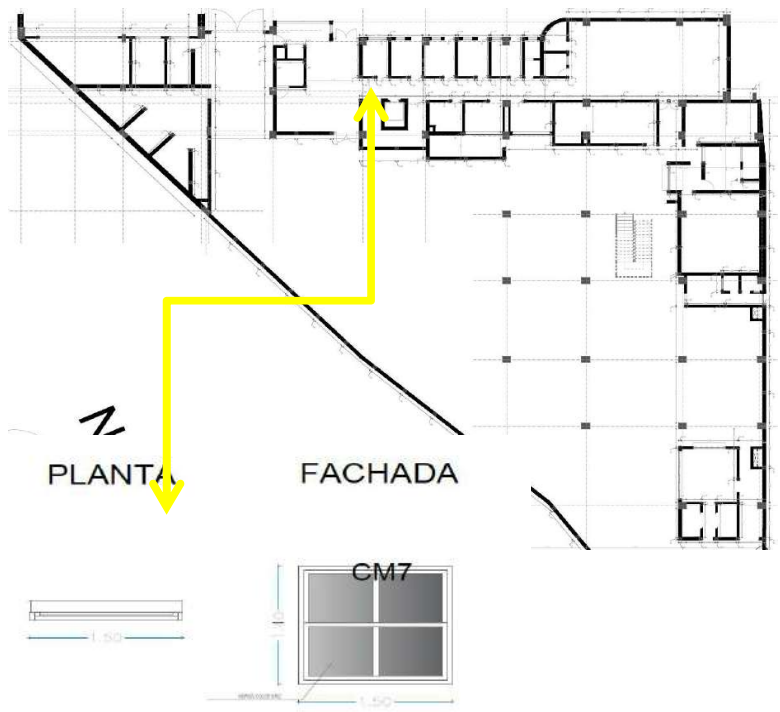

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**	**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**		
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**		**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL** OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD** 0.75
ITEM	**7**	**PUERTAS Y VENTANAS**	**UNIDAD** m^2
7.43	Suministro e Instalacion ventanería en aluminio proyectante, tamaño 0,50 x 0,50 mvidrio liso transparente de espesor 5mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 4MILS y 400 libras de resistencia		

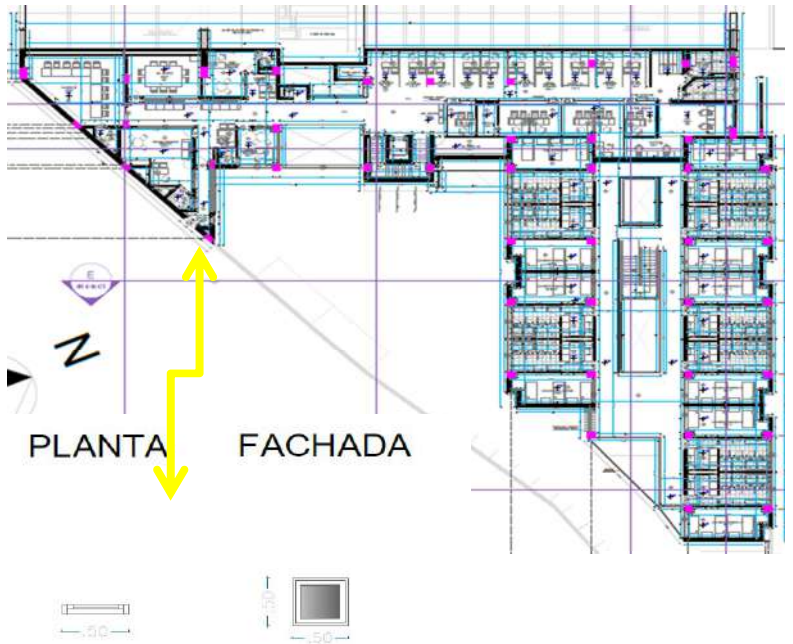

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Ancho	Alto	Espesor			ACUMULADO
Bloque 2 piso 1						
Garita de vigilancia	0.50	0.50		**2.00**		**0.50**
Baño admon	0.50	0.50		**1.00**		**0.25**
						0.75

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1,552.30**
ITEM	**9**	**CIELO FALSO**		**UNIDAD**	**m²**
9.01	Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Alto**	**Lados**		
PISO 1				**645.30**	**645.30**
PISO 2				**907.00**	**1552.30**
					1552.30



Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	7	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD	M2	
9.01	Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac					

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró	Aprobó
ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO EP-C	ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES DIRECTOR DE INTERVENTORÌA CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	5,362.33
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.01	Estuco Plastico Interiores				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			LADOS	TOTAL ACUMULADO
	Longt. Muros	Vanos Puertas	Vanos Ventanas		
PRIMER PISO					
BLOQUE 1					
INTENDENCIA, ARMERILLO, CUARTO DE ARMERILLO, SS.HH., COMEDOR, COCINA	2.53	1.50	0.655		
	3.31	0.80	2.968		
	5.56	2.70	1.12		
	3.66		5.6		
	10.54				
	9.4				
	6.22				
	21.26				
	7.73				
	6.43				
TOTAL ML	76.64				
TOTAL M2 BRUTO	344.88	5.00	10.34	2.00	
TOTAL M2 NETO	329.54				659.07
BLOQUE 2					
ACCESO VEHÍCULAR, GUARDIA, O.A.C., SS.HH., MVR & AUDITORIO	25.67	14.00	6.83		
	2.90	0.90	0.75		
	11.80	2.04	1.12		
	9.12	2.00	5.80		
	8.66	1.00			
	3.21	3.60			
	5.50				
	5.46				
	9.41				
	17.48				
CUARTOS TÉCNICOS Y RETENIDOS	13.22	2.00	2		
	5.71	3.00	1.6		
	3.86	0.90	2.85		
	10.42	0.90	2.85		
	2.5				
	2.5				
	3.82				

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	5,362.33
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.01	Estuco Plastico Interiores				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			LADOS	TOTAL ACUMULADO
	Longt. Muros	Vanos Puertas	Vanos Ventanas		
	0.87				
	10.82				
TOTAL ML	152.93				
TOTAL M2 BRUTO	688.19	30.34	23.80		
TOTAL M2 NETO	634.04			2.00	1268.09
SEGUNDO PISO					
BLOQUE 1					
ALOJAMIENTOS SEGUNDO PISO	36.48	9.00	9		
	36		11.72		
	6.66		2.85		
	6.66		9.6		
	4.38				
	6.75				
	26.26				
	6.66				
	23.90				
TOTAL ML	153.75				
TOTAL M2 BRUTO	530.44	9.00	33.17		
TOTAL M2 NETO	488.27			2.00	976.54
BLOQUE 2					
OFICINAS SEGUNDO PISO	7.80		18.762		
	40.09		1.25		
	26.60		4.2		
	41.98		0.5		
	2.95		0.5		
	11.33				
	20.85				
	10.90				
TOTAL ML	162.50				
TOTAL M2 BRUTO	560.625	0.00	25.21		
TOTAL M2 NETO	535.41			2.00	1070.83
TERCER PISO					
BLOQUE 1					
ALOJAMIENTOS TERCER PISO	36.48	9	9.00		
	33		13.19		
	6.66		1.39		
	10.15		8.40		
	2.38		1.07		
	6.26		1.59		
	7.15		0.63		

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	5,362.33
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.01	Estuco Plastico Interiores				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			LADOS	TOTAL ACUMULADO
	Longt. Muros	Vanos Puertas	Vanos Ventanas		
	48.84		0.49		
	12.19		0.99		
	6.57		0.55		
TOTAL ML	169.68				
TOTAL M2 BRUTO	585.396	9.00	37.28		
TOTAL M2 NETO	539.12			2.00	1078.24
BLOQUE 2					
ÁREA SOCIAL TERCER PISO	39.59	0.8	1.5		
	7.011	1.99	1.7		
TOTAL ML	46.60				
TOTAL M2 BRUTO	160.77345	2.79	3.20		
TOTAL M2 NETO	154.78			2.00	309.57
					5362.33

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.01	Estuco Plastico Interiores				

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	5,362.33
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.03	Estuco Plastico Exteriores				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			LADOS	TOTAL ACUMULADO
	Longt. Muros	Vanos Puertas	Vanos Ventanas		
PRIMER PISO					
BLOQUE 1					
INTENDENCIA, ARMERILLO, CUARTO DE ARMERILLO, SS.HH., COMEDOR, COCINA	2.53	1.50	0.655		
	3.31	0.80	2.968		
	5.56	2.70	1.12		
	3.66		5.6		
	10.54				
	9.4				
	6.22				
	21.26				
	7.73				
	6.43				
TOTAL ML	76.64				
TOTAL M2 BRUTO	344.88	5.00	10.34	2.00	
TOTAL M2 NETO	329.54				659.07
BLOQUE 2					
ACCESO VEHÍCULAR, GUARDIA, O.A.C., SS.HH., MVR & AUDITORIO	25.67	14.00	6.83		
	2.90	0.90	0.75		
	11.80	2.04	1.12		
	9.12	2.00	5.80		
	8.66	1.00			
	3.21	3.60			
	5.50				
	5.46				
	9.41				
	17.48				
CUARTOS TÉCNICOS Y RETENIDOS	13.22	2.00	2		
	5.71	3.00	1.6		
	3.86	0.90	2.85		
	10.42	0.90	2.85		
	2.5				
	2.5				
	3.82				

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	5,362.33
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.03	Estuco Plastico Exteriores				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			LADOS	TOTAL ACUMULADO
	Longt. Muros	Vanos Puertas	Vanos Ventanas		
	0.87				
	10.82				
TOTAL ML	152.93				
TOTAL M2 BRUTO	688.19	30.34	23.80		
TOTAL M2 NETO	634.04			2.00	1268.09
SEGUNDO PISO					
BLOQUE 1					
ALOJAMIENTOS SEGUNDO PISO	36.48	9.00	9		
	36		11.72		
	6.66		2.85		
	6.66		9.6		
	4.38				
	6.75				
	26.26				
	6.66				
	23.90				
TOTAL ML	153.75				
TOTAL M2 BRUTO	530.44	9.00	33.17		
TOTAL M2 NETO	488.27			2.00	976.54
BLOQUE 2					
OFICINAS SEGUNDO PISO	7.80		18.762		
	40.09		1.25		
	26.60		4.2		
	41.98		0.5		
	2.95		0.5		
	11.33				
	20.85				
	10.90				
TOTAL ML	162.50				
TOTAL M2 BRUTO	560.625	0.00	25.21		
TOTAL M2 NETO	535.41			2.00	1070.83
TERCER PISO					
BLOQUE 1					
ALOJAMIENTOS TERCER PISO	36.48	9	9.00		
	33		13.19		
	6.66		1.39		
	10.15		8.40		
	2.38		1.07		
	6.26		1.59		
	7.15		0.63		

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	5,362.33
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.03	Estuco Plastico Exteriores				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			LADOS	TOTAL ACUMULADO
	Longt. Muros	Vanos Puertas	Vanos Ventanas		
	48.84		0.49		
	12.19		0.99		
	6.57		0.55		
TOTAL ML	169.68				
TOTAL M2 BRUTO	585.396	9.00	37.28		
TOTAL M2 NETO	539.12			2.00	1078.24
BLOQUE 2					
ÁREA SOCIAL TERCER PISO	39.59	0.8	1.5		
	7.011	1.99	1.7		
TOTAL ML	46.60				
TOTAL M2 BRUTO	160.77345	2.79	3.20		
TOTAL M2 NETO	154.78			2.00	309.57
					5362.33

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	10	PINTURA Y ESTUCO		UNIDAD	m2
10.01	Estuco Plastico Interiores				

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	37.35
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.01	Excavación en material comun				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Espesor		
MURO DE CERRAMIENTO	**102.94**	**1.16**	**0.25**	**1.25**	**37.35**
					37.35

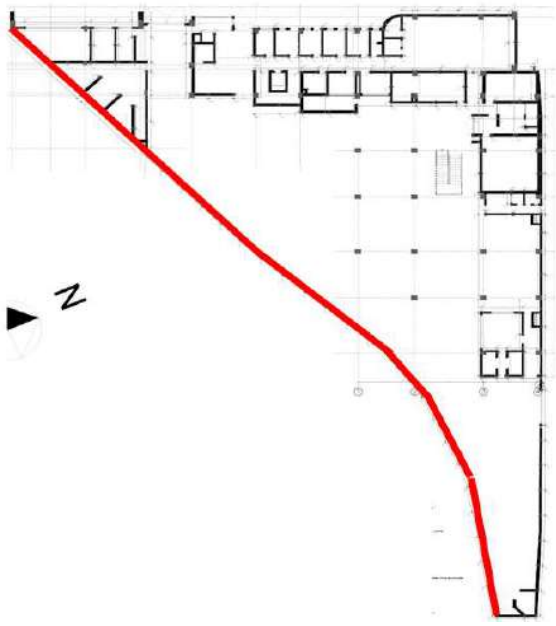

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	m³
14.01	Excavación en material comun				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



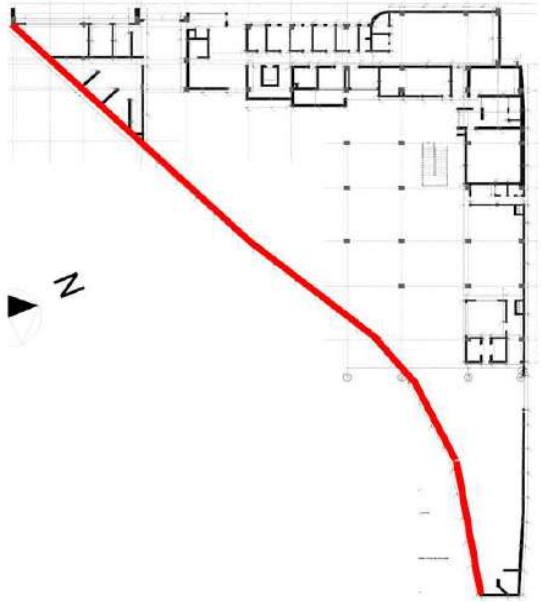

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**20.70**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.02	Relleno de material seleccionado compactado				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
MURO DE CERRAMIENTO				**20.70**	**20.70**
					20.70

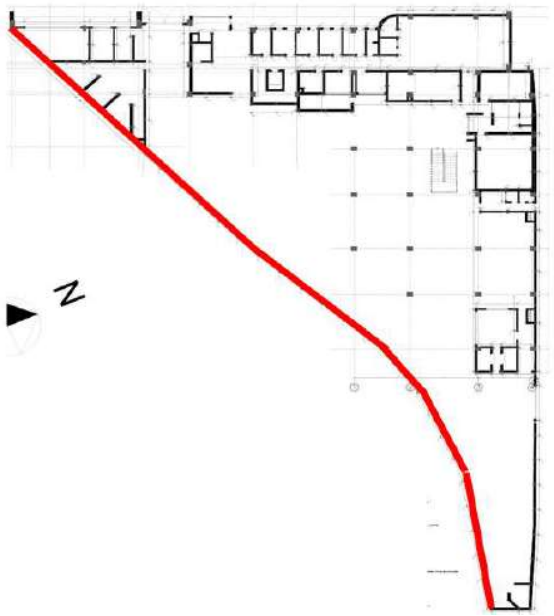

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	m³
14.02	Relleno de material seleccionado compactado				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



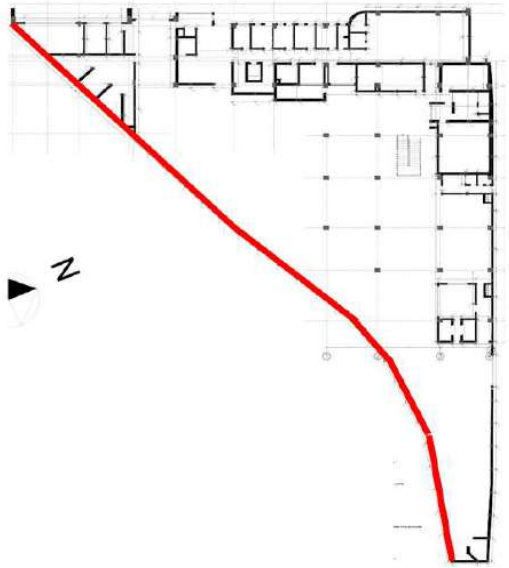

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**41.40**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m²**
14.03	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

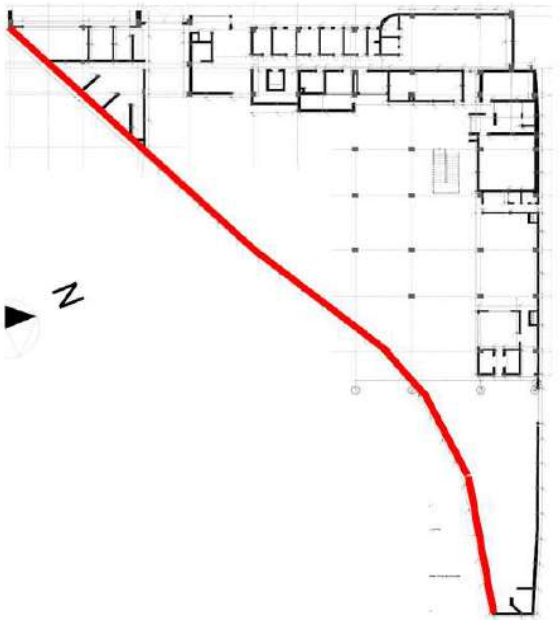

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
MURO DE CERRAMIENTO				**41.40**	**41.40**
					41.40

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m²**
14.03	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



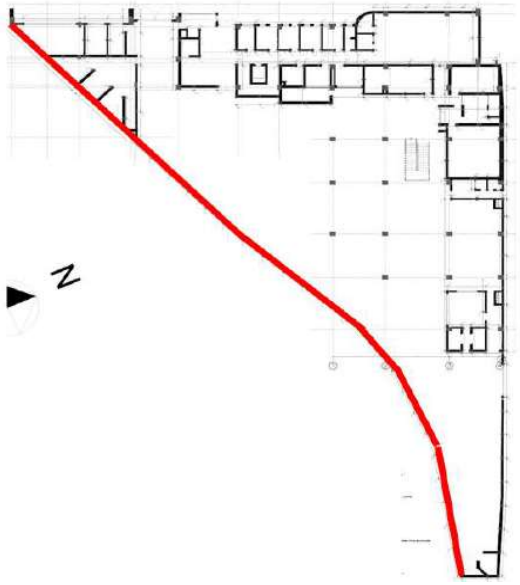

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**3.32**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.04	Concreto para Pilotes f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
MURO DE CERRAMIENTO				**3.32**	**3.32**
					3.32

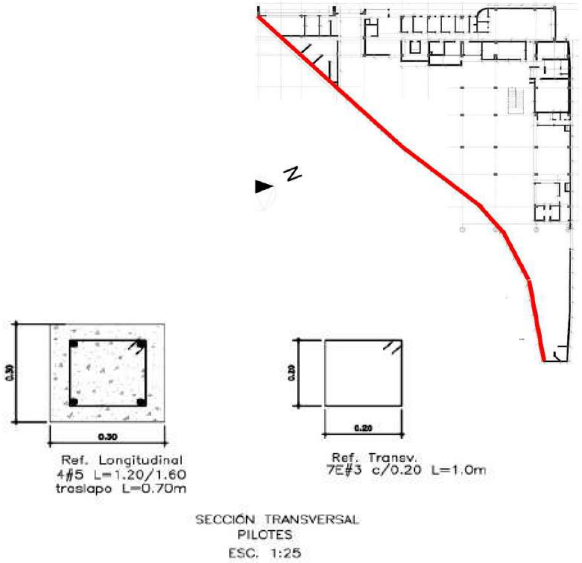

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	m³
14.04	Concreto para Pilotes f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



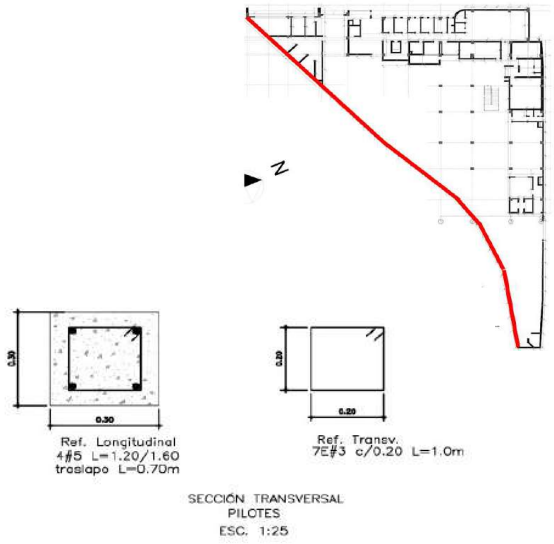

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**12.42**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.05	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
MURO DE CERRAMIENTO				**12.42**	**12.42**
					12.42

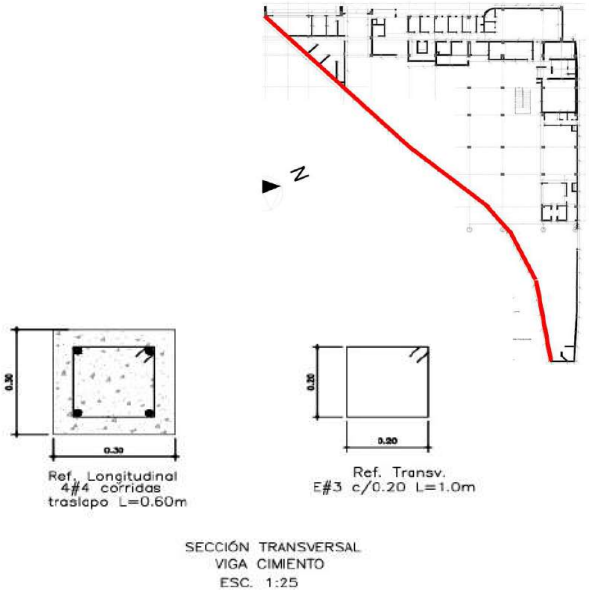

SECCIÓN TRANSVERSAL
VIGA CIMIENTO
ESC. 1:25

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.05	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



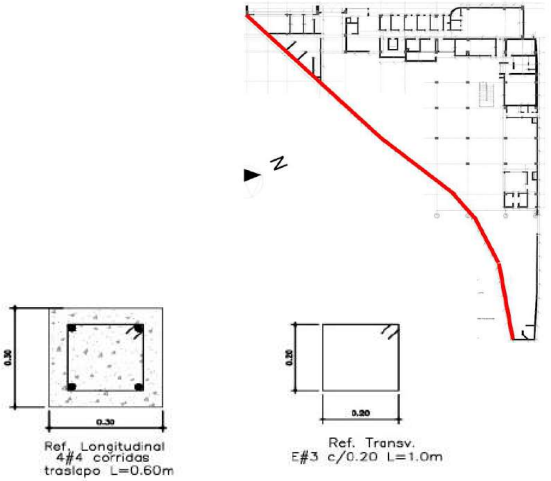

SECCIÓN TRANSVERSAL
VIGA CIMIENTO
ESC. 1:25

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	1,839.69
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	Kg
14.06	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD DE TIPOLOGIA	TOTAL ACUMULADO
	Longitud	Cant de piezas	Peso (Kg/m)		
PILOTES					
MURO DE CERRAMIENTO					
LONGITUDINAL					
#5	1.60	4.00	1.552	34.00	337.72
TRASLAPO					
#5	0.70	4.00	1.552	34.00	147.75
TRANSVERSAL					
#3	1.00	9.00	0.560	34.00	171.36
VIGA DE CIMENTACION					
MURO DE CERRAMIENTO					
LONGITUDINAL					
#4	136.19	4.00	0.994	1	541.49
TRASLAPO					
#4	0.6	4	0.994	21	50.10
TRANSVERSAL					
#3	1.00	614.00	0.560	1.00	343.84
MURO DE CONTENCIÓN					
LONGITUDINAL					
#4	26.67	4.00	0.994	1	106.03
TRASLAPO					
#4	0.6	4	0.994	21	50.10
TRANSVERSAL					
#3	1.00	121.00	0.560	1.00	67.76

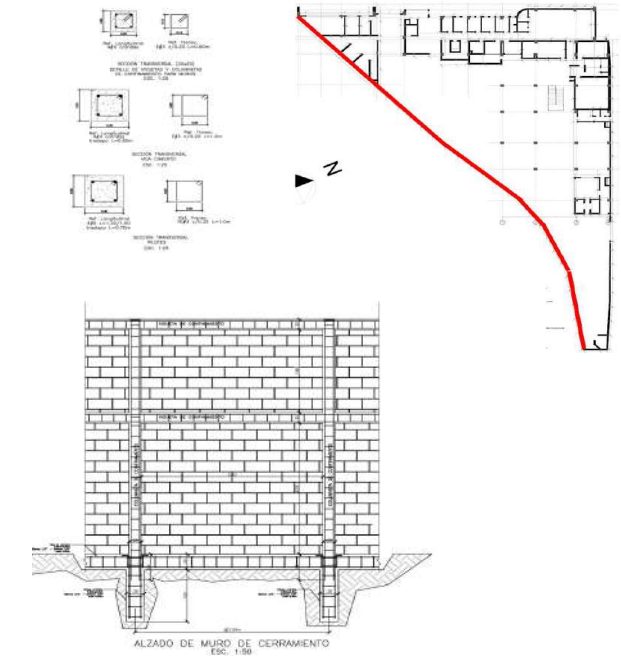

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1,839.69**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**Kg**
14.06	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				





UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD DE TIPOLOGIA**	**TOTAL ACUMULADO**
	Longitud	**Cant de piezas**	**Peso (Kg/m)**		
COLUMNETAS					
MURO DE CERRAMIENTO					
LONGITUDINAL					
#4	**2.96**	**4.00**	**0.994**	**2.00**	**23.55**
					1839.69

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	Kg
14.06	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI				


REGISTRO FOTOGRÁFICO









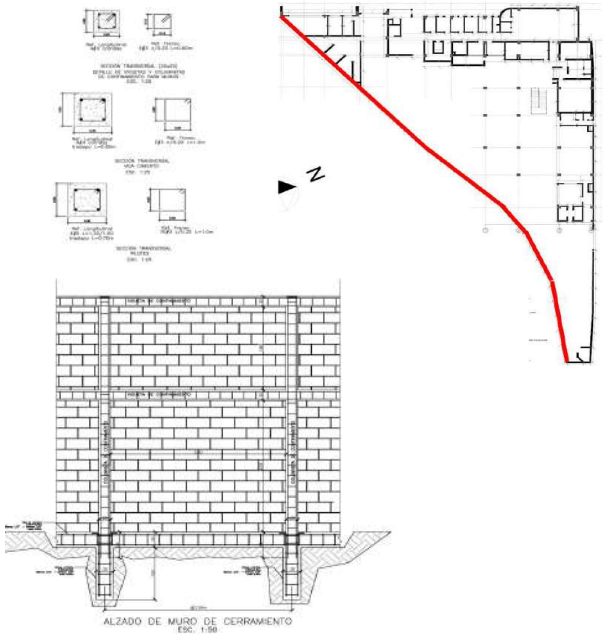

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**7.52**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.07	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Espesor		
MURO DE CERRAMIENTO	**5.53**	**0.20**	**0.20**	**34.00**	**7.52**
					7.52

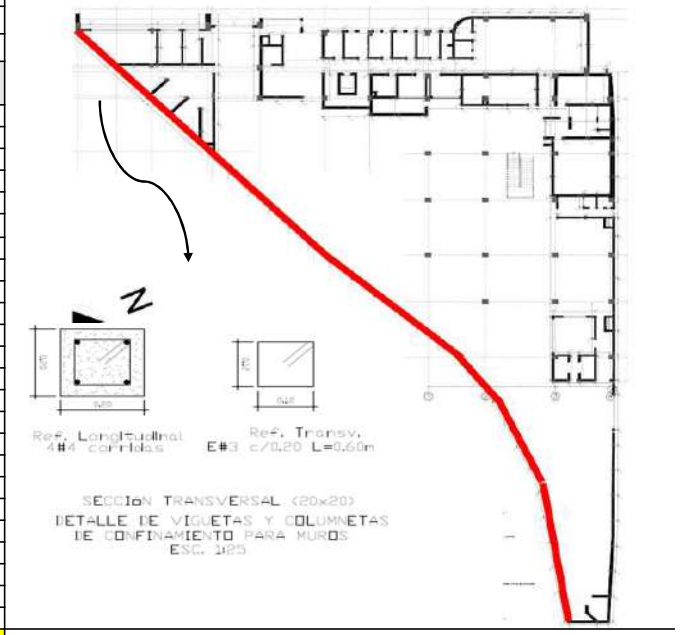

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	m³
14.07	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



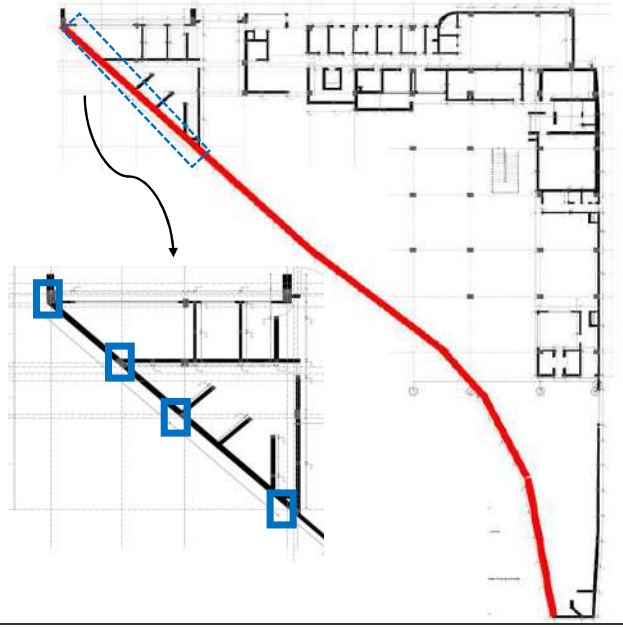

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**385.80**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m²**
14.08	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40				

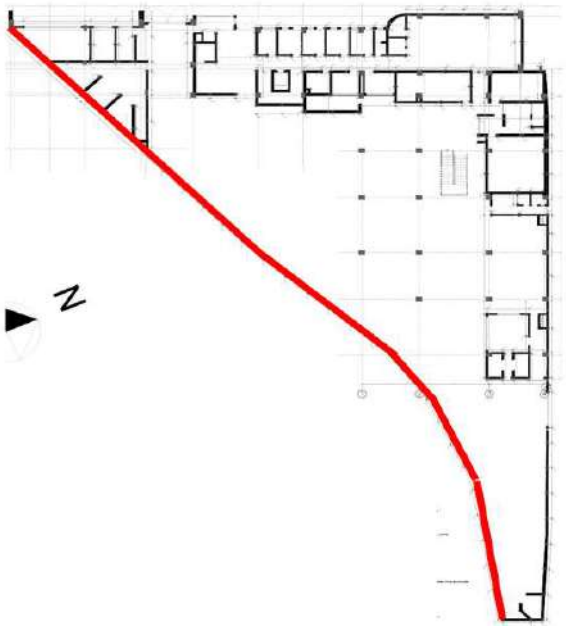

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Área		
MURO DE CERRAMIENTO	**94.10**	**4.10**	**385.80**	**385.80**	**385.80**
					385.80

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**#¡REF!**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m²**
14.08	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40				


REGISTRO FOTOGRÁFICO









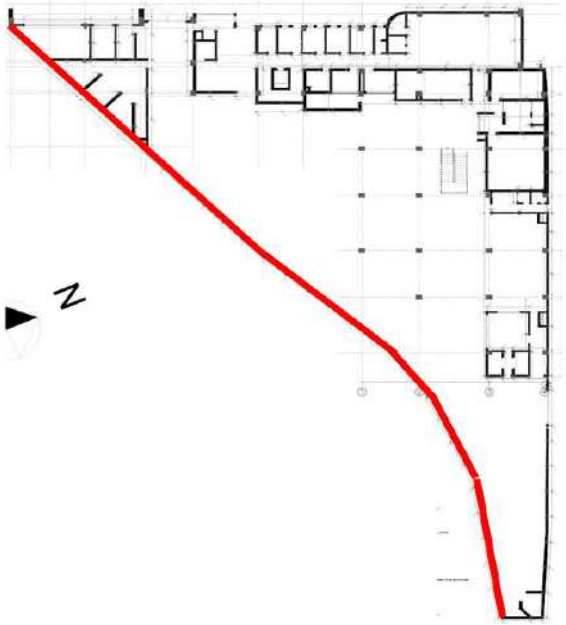

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**3.31**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m³**
14.09	Concreto para viga de Aereas f´c= 3000 PSI				

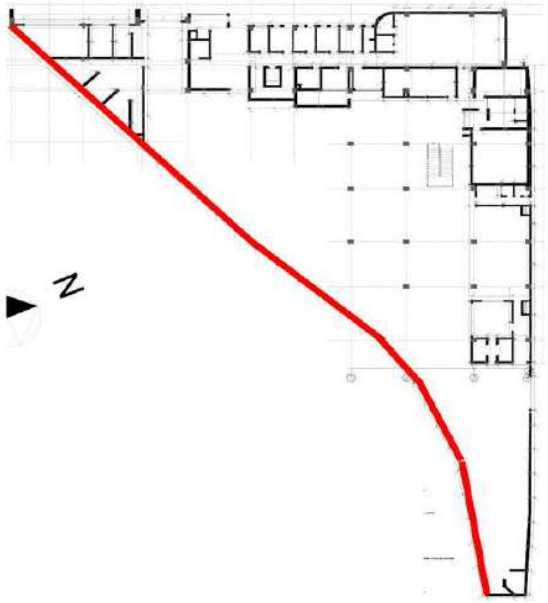

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Espesor		
MURO DE CERRAMIENTO	**82.80**	**0.20**	**0.20**	**3.31**	**3.31**
					3.31

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	14	MURO DE CERRAMIENTO		UNIDAD	m³
14.09	Concreto para viga de Aereas f´c= 3000 PSI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







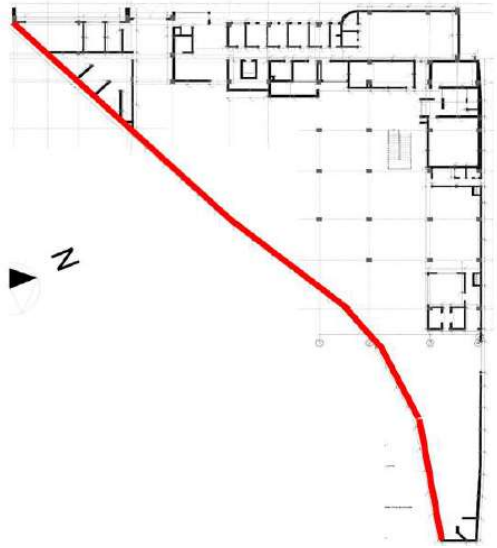

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**385.80**
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m²**
14.10	Pañete allanado 1:4				

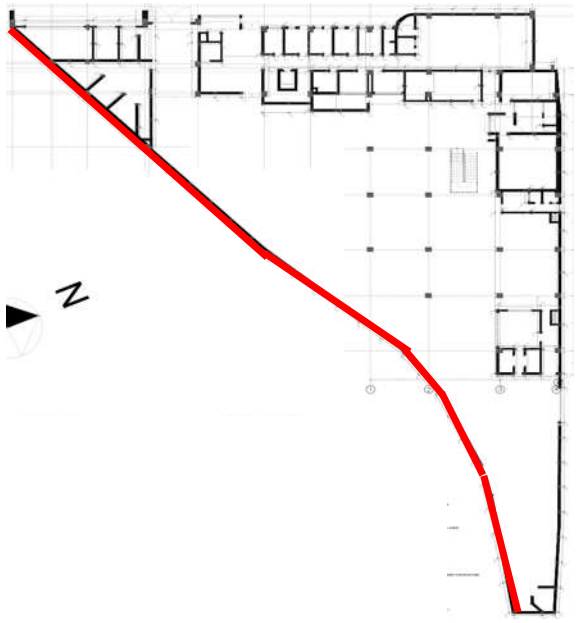

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
MURO DE CERRAMIENTO	**94.10**	**4.10**	**1.00**	**385.80**	**385.80**
					385.80

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**6**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**14**	**MURO DE CERRAMIENTO**		**UNIDAD**	**m²**
14.10	Pañete allanado 1:4				


REGISTRO FOTOGRÁFICO









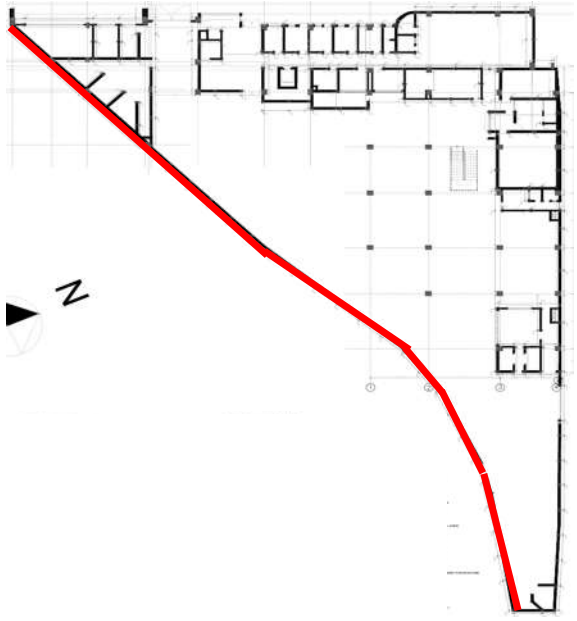

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**278.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.01	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red normal				

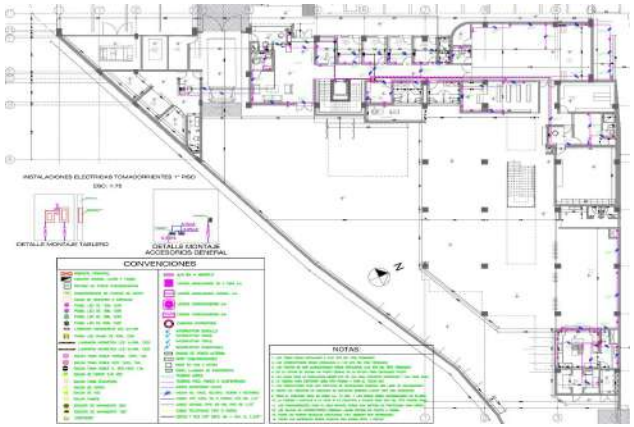

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				**53.00**	**53.00**
Segundo piso				**137.00**	**137.00**
Tercer piso				**88.00**	**88.00**
					278.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.01	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red normal				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





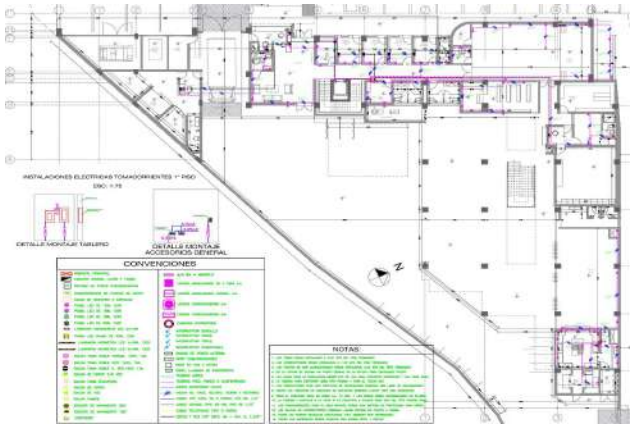

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**54.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.02	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red regulada				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				**11.00**	**11.00**
Segundo piso				**27.00**	**27.00**
Tercer piso				**16.00**	**16.00**
					54.00

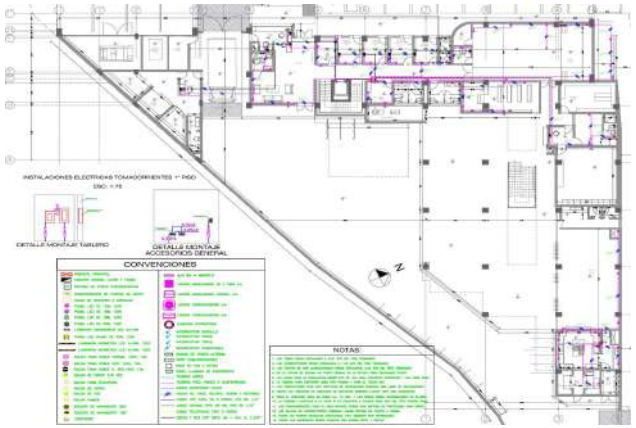

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.02	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red regulada				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







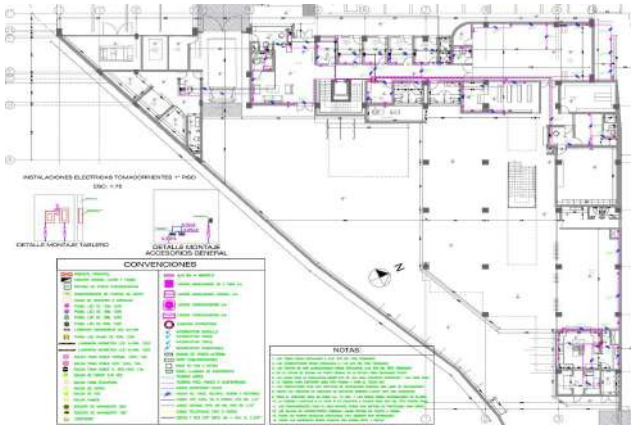

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**38.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.03	Suministro e instalación salida con tomacorriente GFCI				

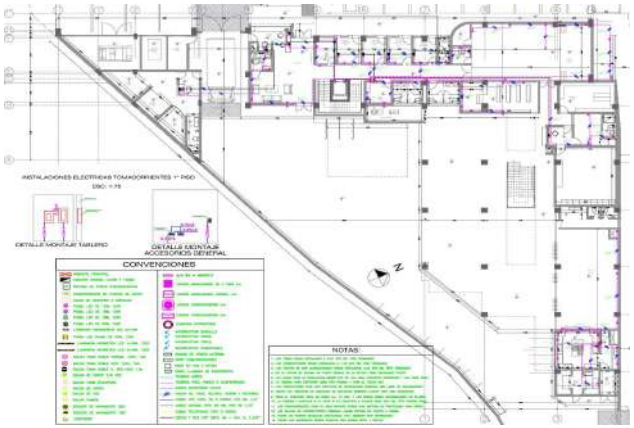

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				**13.00**	**13.00**
Segundo piso				**15.00**	**15.00**
Tercer piso				**10.00**	**10.00**
					38.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C


Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.03	Suministro e instalación salida con tomacorriente GFCI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

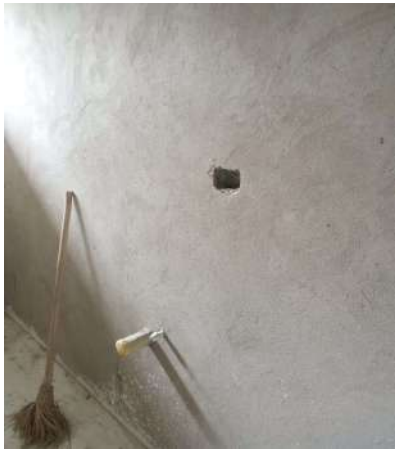



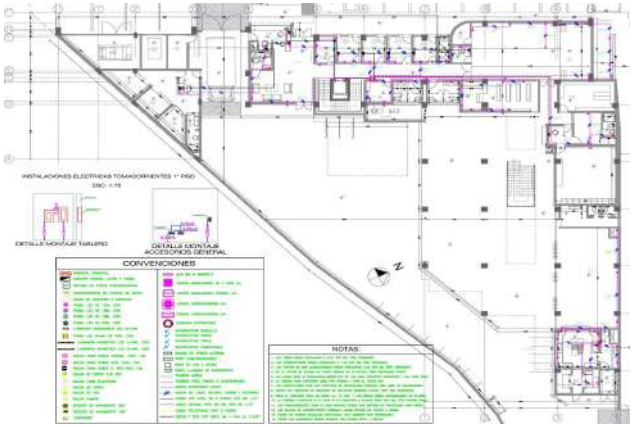

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**5.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.04	Suministro e instalación salida ventilador de techo				

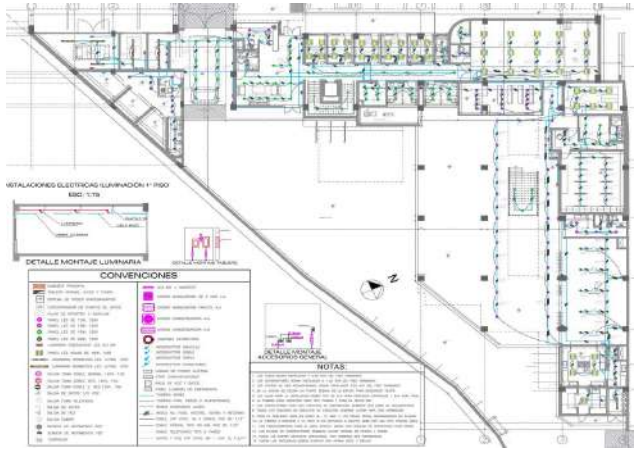

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				**5.00**	**5.00**
					5.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.04	Suministro e instalación salida ventilador de techo				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



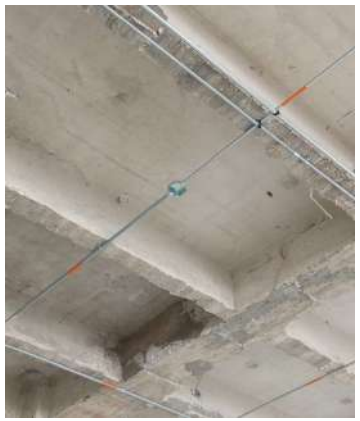



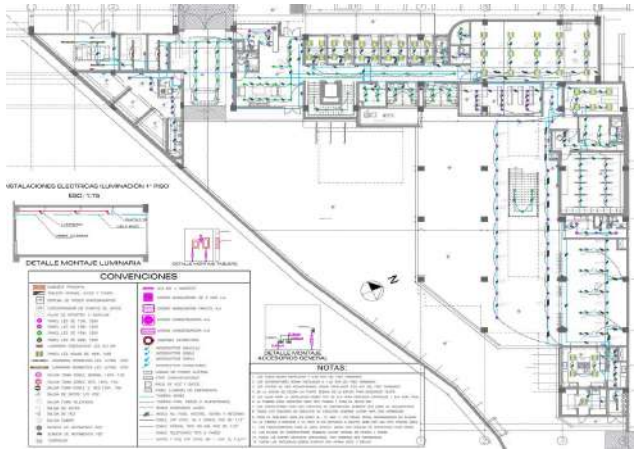

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**173.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.05	Suministro e instalación salida de iluminación				

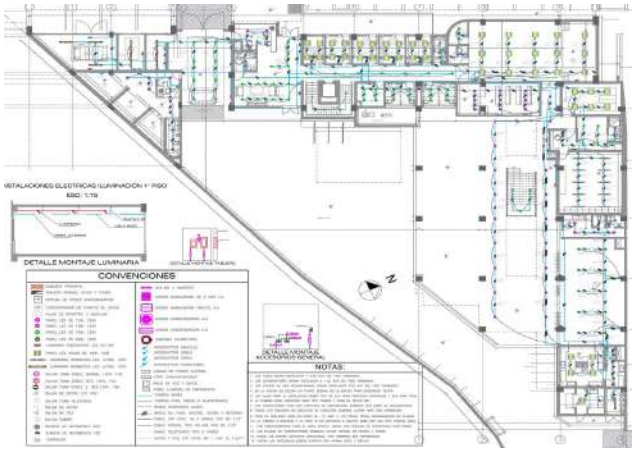

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
BLOQUE 1				**52.00**	**52.00**
BLOQUE 2				**121.00**	**121.00**
					173.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.05	Suministro e instalación salida de iluminación				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







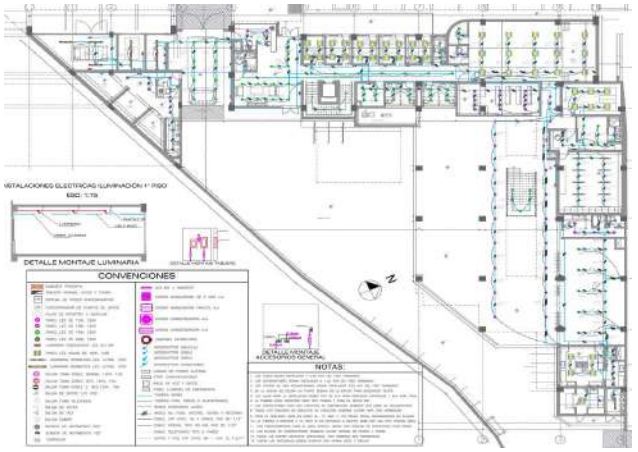

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**36.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.06	Suministro e instalación salida TV, solo tuberia				

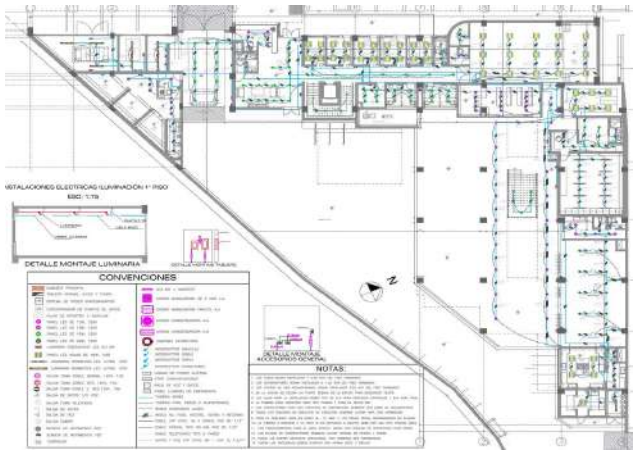

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
BLOQUE 1				**25.00**	**25.00**
BLOQUE 2				**11.00**	**11.00**
					36.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**	
17.06	Suministro e instalación salida TV, solo tuberia					

REGISTRO FOTOGRÁFICO







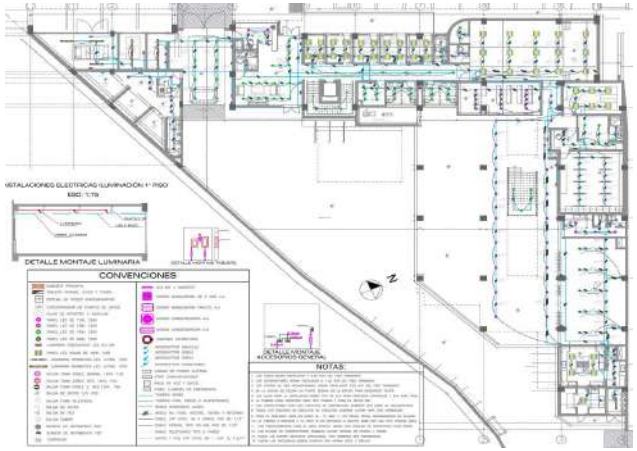

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	118.00
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.07	Suministro e instalación salida con interruptor sencillo				

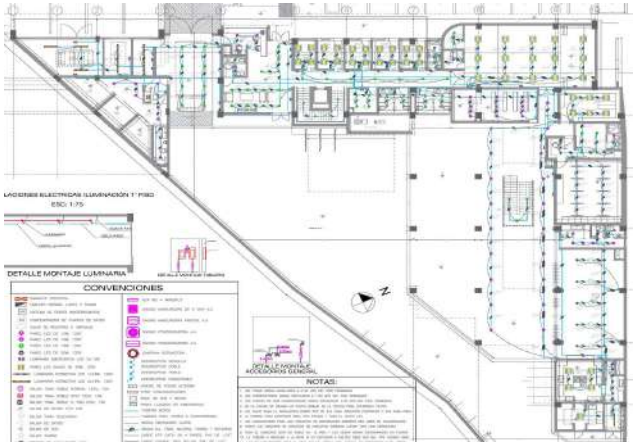

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				32.00	32.00
Segundo psio				46.00	46.00
Tercer piso				40.00	40.00
					118.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	


SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.07	Suministro e instalación salida con interruptor sencillo				

REGISTRO FOTOGRÁFICO







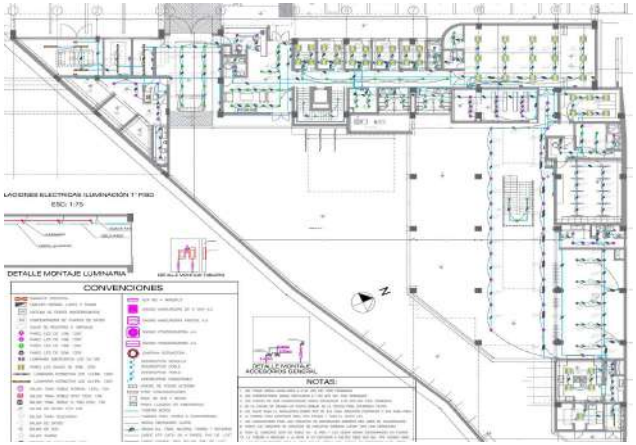

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**24.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.08	Suministro e instalación salida con interruptor doble				

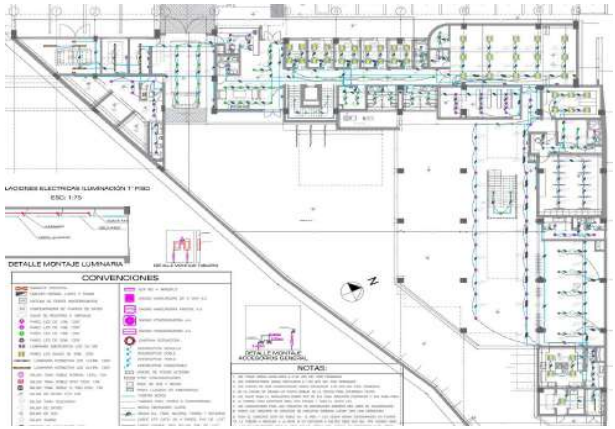

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				**12.00**	**12.00**
Segundo piso				**7.00**	**7.00**
Tercer piso				**5.00**	**5.00**
					24.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**	
17.08	Suministro e instalación salida con interruptor doble					

REGISTRO FOTOGRÁFICO





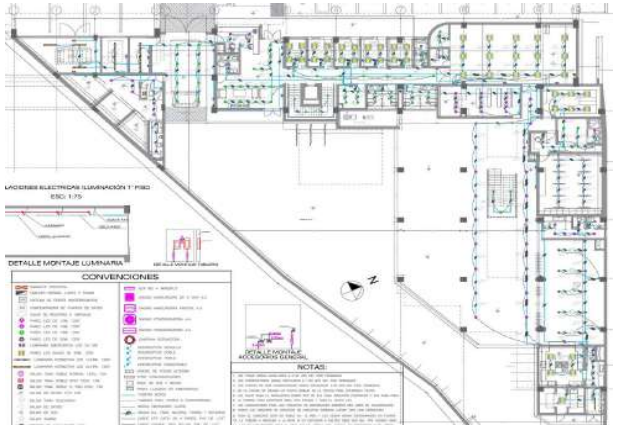

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	24.00
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.09	Suministro e instalación salida con interruptor triple				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				7.00	7.00
Segundo piso				10.00	10.00
Tercer piso				7.00	7.00
					24.00

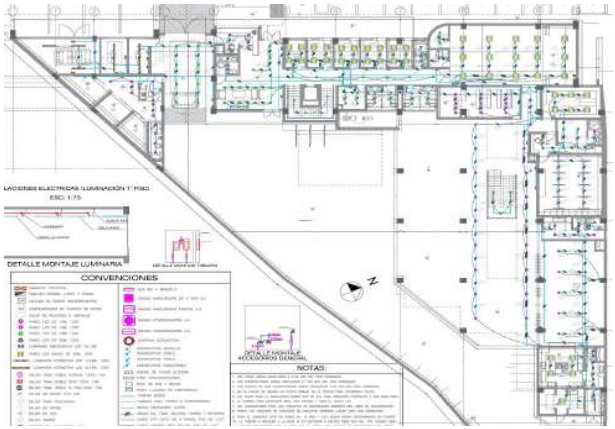

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**	
17.09	Suministro e instalación salida con interruptor triple					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



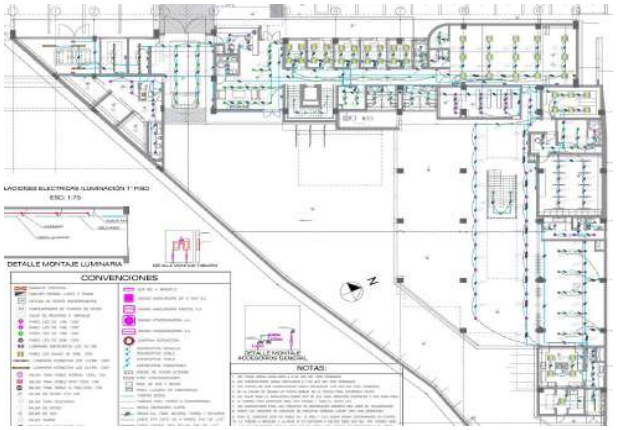

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.10	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable doble				

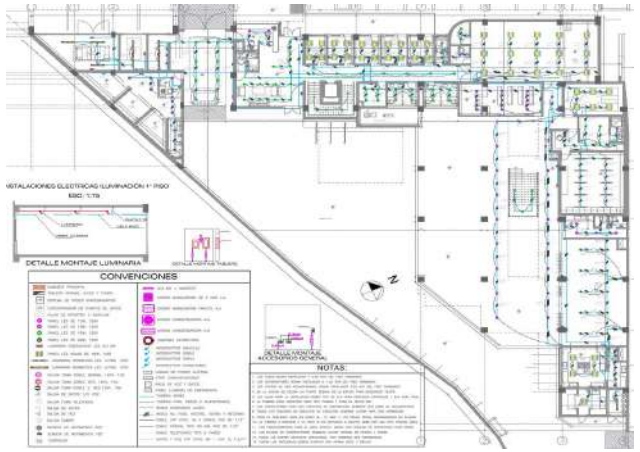

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
Primer piso				**1.00**	**1.00**
					1.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.10	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable doble				

REGISTRO FOTOGRÁFICO





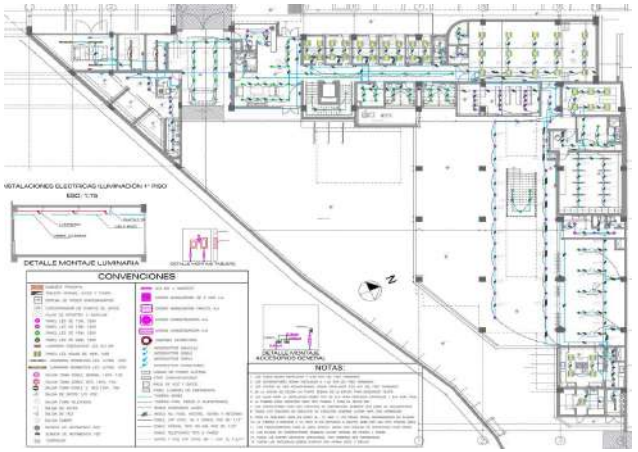

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**1.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.11	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable triple				

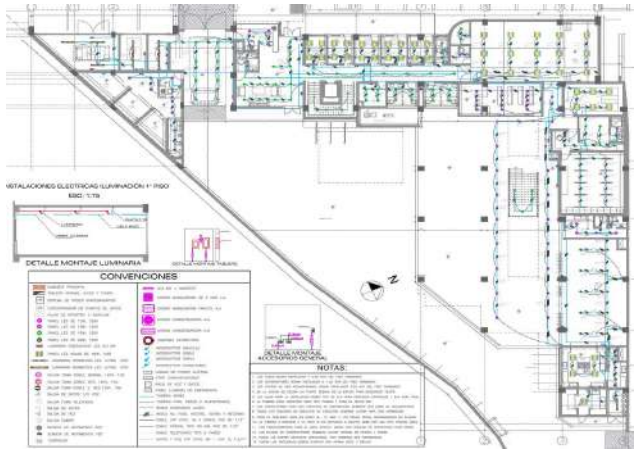

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				**1.00**	**1.00**
					1.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.11	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable triple				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



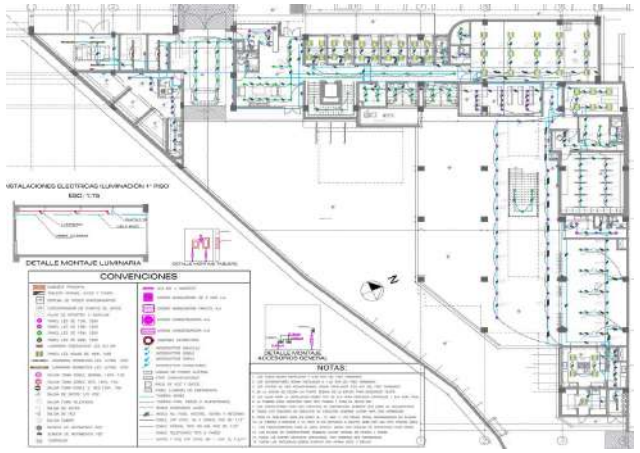

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	13.00
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.12	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 12.000 BTU				

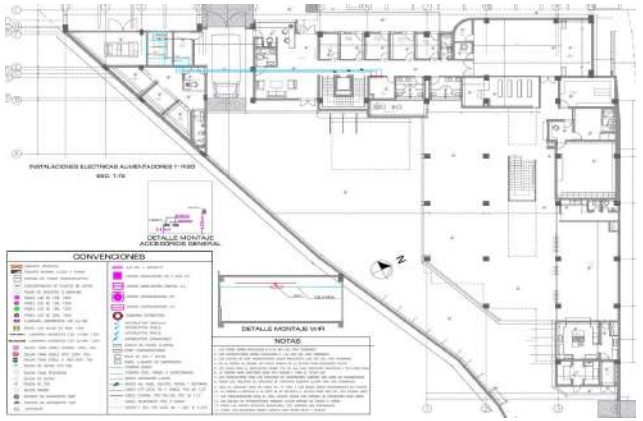

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
				13.00	
BLOQUE 1					
PISO 1				1.00	1.00
PISO 2				0.00	0.00
PISO 3				0.00	0.00
BLOQUE 2					
PISO 1				8.00	8.00
PISO 2				2.00	2.00
PISO 3				2.00	2.00
				13.00	

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE


MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	UN
17.12	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 12.000 BTU				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



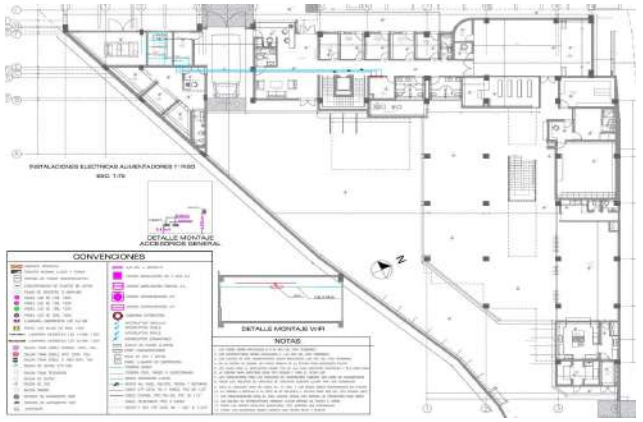

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**32.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.13	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 24.000 - 36000 BTU				

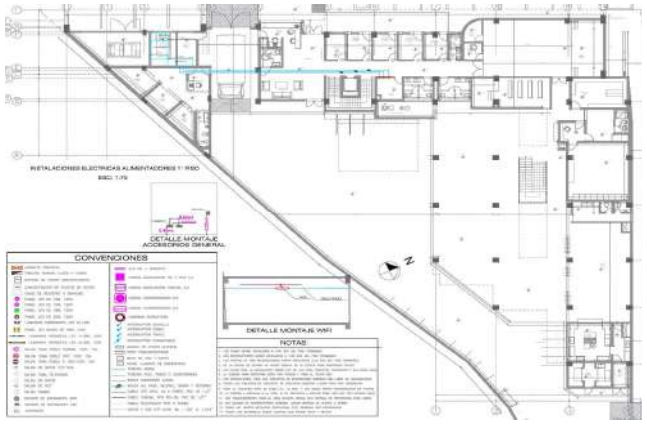

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
				32.00	
BLOQUE 1					
PISO 1				**2.00**	**2.00**
PISO 2				**10.00**	**10.00**
PISO 3				**10.00**	**10.00**
BLOQUE 2					**0.00**
PISO 1				**0.00**	**0.00**
PISO 2				**7.00**	**7.00**
PISO 3				**3.00**	**3.00**
					32.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C


Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**	
17.13	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 24.000 - 36000 BTU					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



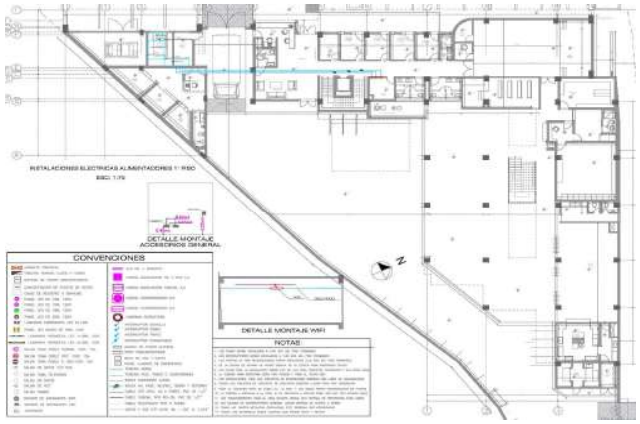

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**9.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**
17.14	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 48.000 - 60.000 BTU				

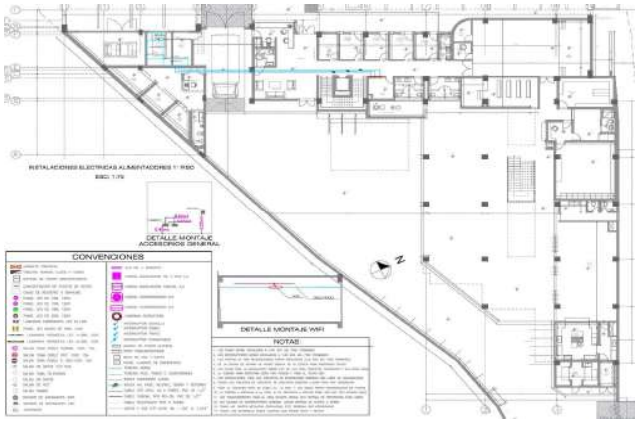

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
BLOQUE 1					
PISO 1				**1.00**	**1.00**
PISO 2				**0.00**	**0.00**
PISO 3				**0.00**	**0.00**
BLOQUE 2					
PISO 1				**3.00**	**3.00**
PISO 2				**4.00**	**4.00**
PISO 3				**1.00**	**1.00**
					9.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C


Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**		**FECHA**	**14/07/2025**		
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**		**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ		
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**			**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**		
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**UN**	
17.14	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 48.000 - 60.000 BTU					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



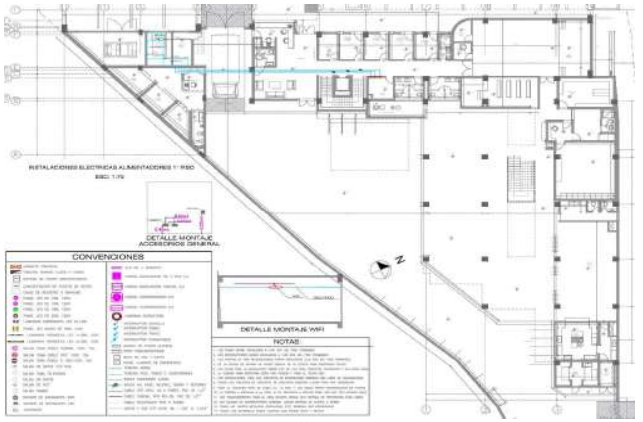

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	30.00
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML
17.15	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD1)				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				30.00	30.00
					30.00

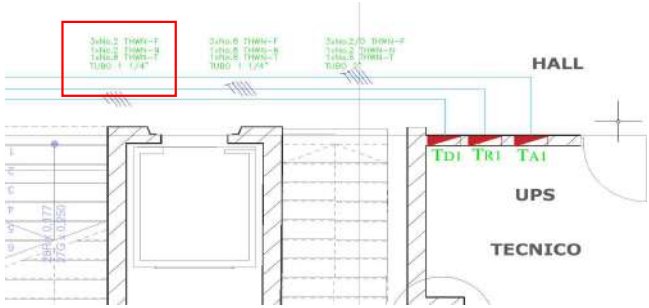

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML
17.15	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD1)				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



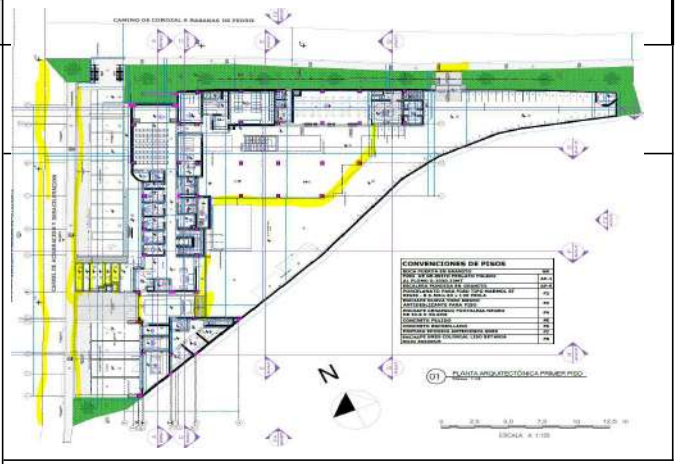

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**8.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**ML**
17.16	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR1)				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				**8.00**	**8.00**
					8.00

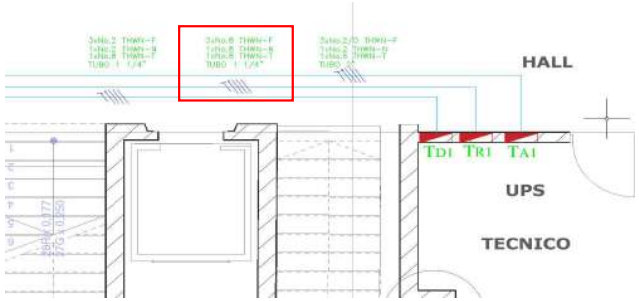

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML
17.16	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR1)				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



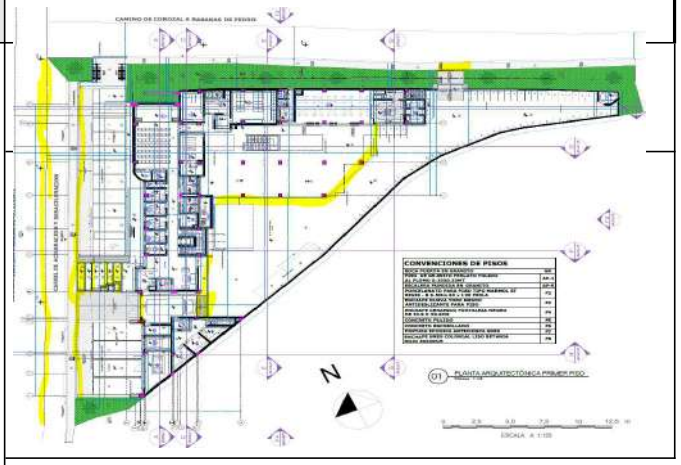

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**83.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**ML**
17.17	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TDC)				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				**83.00**	**83.00**
					83.00

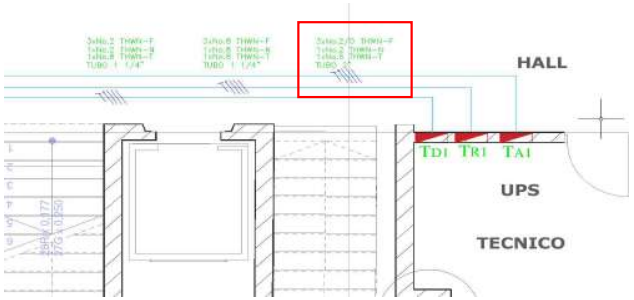

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML	
17.17	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TDC)					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



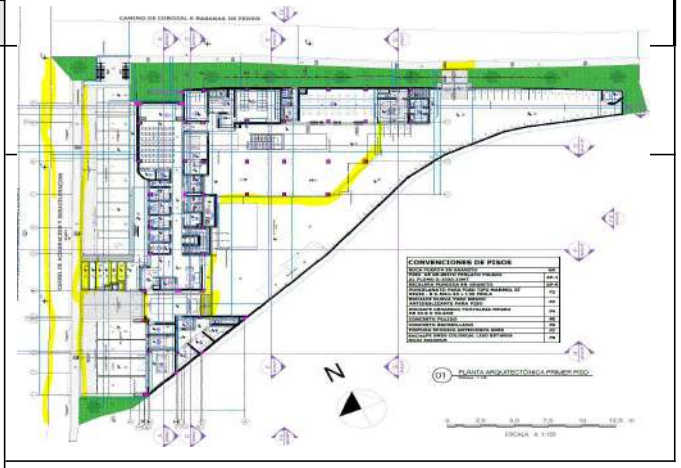

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	32.00
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML
17.18	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA1)				

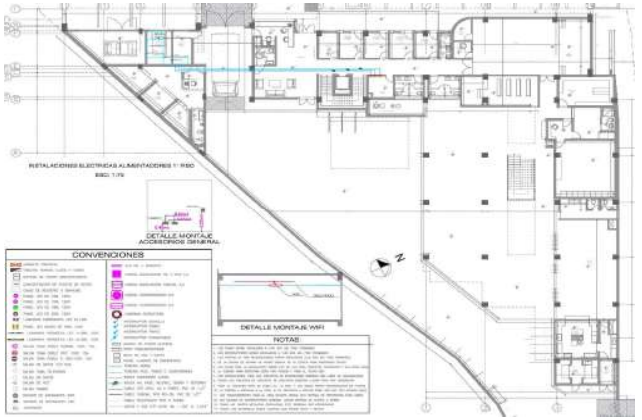

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				32.00	32.00
					32.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML	
17.18	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA1)					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



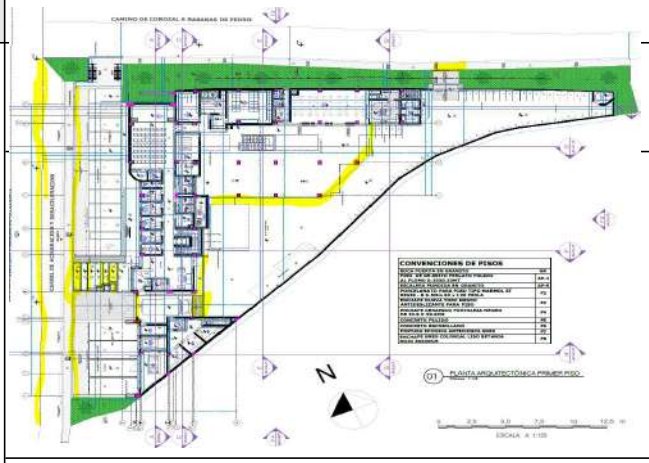

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	44.00
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML
17.19	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD2)				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				44.00	44.00
					44.00

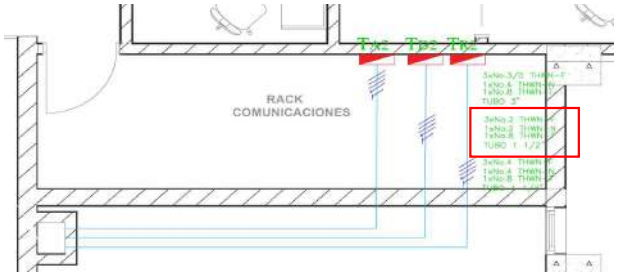

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó


ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7		FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".				
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23		SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C			ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML
17.19	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD2)				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



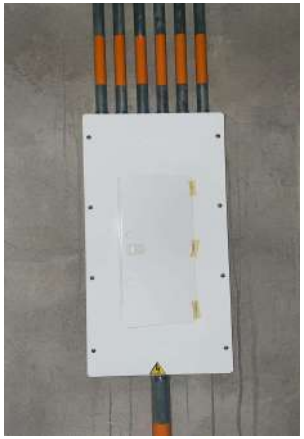

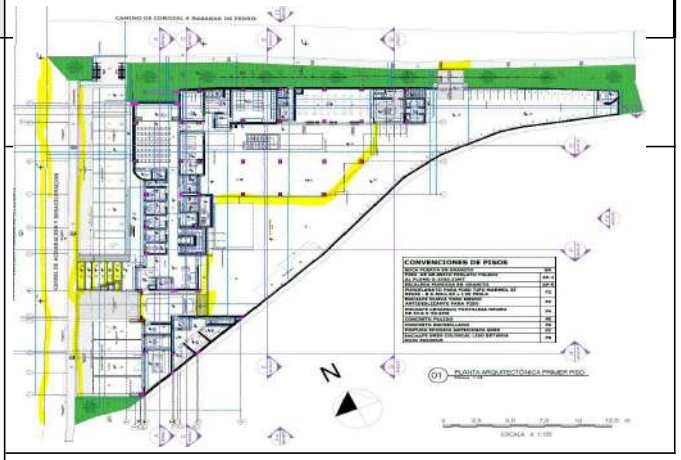

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	**8.00**
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**ML**
17.20	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR2)				

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				**8.00**	**8.00**
					8.00

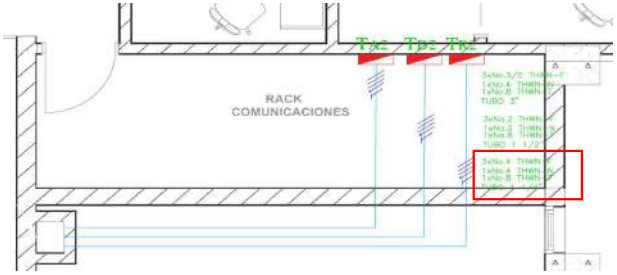

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE


CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".	

SOPORTE DEL ACTA No.	7			FECHA	14/07/2025	
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
CONTRATO No.	L-AM-CS-001-01-23			SUPERVISOR PROYECTO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO EP-C				ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	REP. LEGAL	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	CANTIDAD	-	
ITEM	17	SISTEMA ELECTRICO		UNIDAD	ML	
17.20	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR2)					

REGISTRO FOTOGRÁFICO





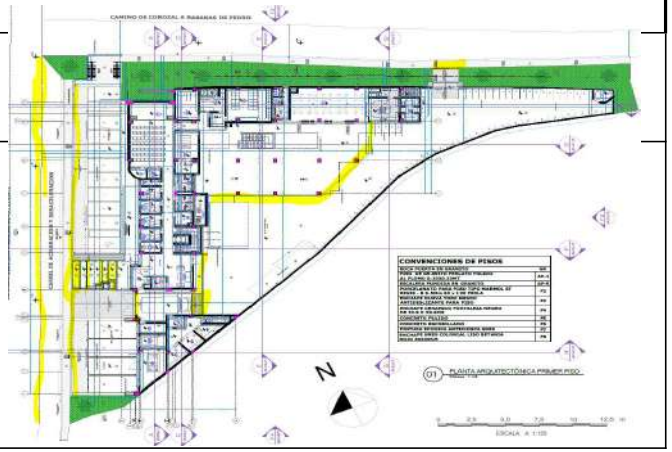

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO I - POLICE


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	59.00
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**ML**
17.21	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TH1)				

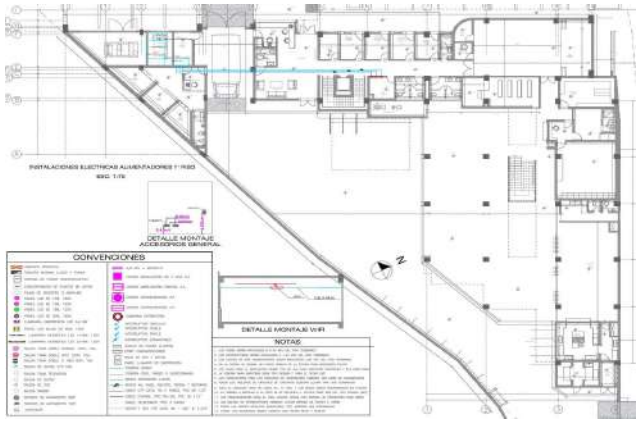

UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Alto	Lados		
PRIMER PISO				**59.00**	**59.00**
					59.00

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C


Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO DE COROZAL MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**	
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ	
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	-	
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**ML**	
17.21	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TH1)					
REGISTRO FOTOGRÁFICO						





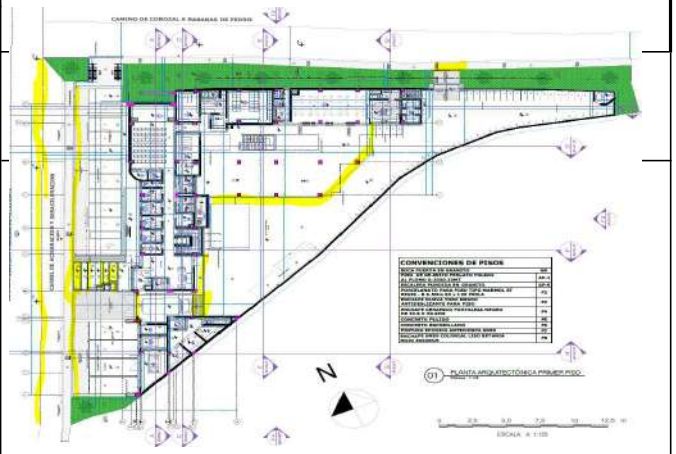

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE

CONSORCIO EP-C

REPUBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE COROZAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE LA OBRA DE "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

SOPORTE DEL ACTA No.	**7**			**FECHA**	**14/07/2025**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".**				
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**			**SUPERVISOR PROYECTO**	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
CONTRATISTA	**CONSORCIO EP-C**				**ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO I - POLICE	**REP. LEGAL**	OSCAR CARRASCAL SANCHEZ	**CANTIDAD**	45.00
ITEM	**17**	**SISTEMA ELECTRICO**		**UNIDAD**	**ML**
17.22	Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA2)				

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	Largo	**Alto**	**Lados**		
PRIMER PISO				**45.00**	**45.00**
					45.00

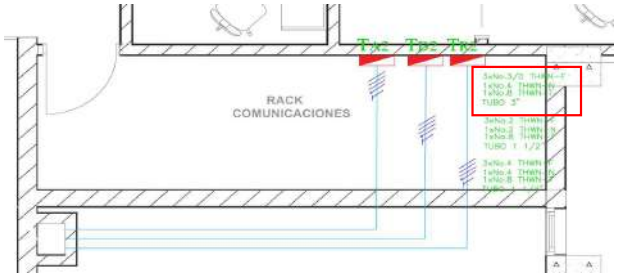

Elaboró

ING. JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EP-C

Aprobó

ING. ERICK AMID CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO I - POLICE
