	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2057 de 2021**, MUNICIPIO DE **LOPEZ DE MICAY, CAUCA**
• INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNI**O- 2025.**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de la alcaldía municipal de López de Micay–Cauca.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Dirección: Cra 2 # 5-07, Calle las Flores – López de Micay (Urbano)	Departamento del Cauca, Municipio de López de Micay. Coordenadas: 2°50′47″N 77°14′50″O  Localización de López de Micay en Cauca 		
BENEFICIARIO:	**Directos:** Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca – 18.932 Habitantes.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$4.813.963.309,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$849.522.937,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.663.486.246,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de Noviembre de 2021.		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 de noviembre del 2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	Hasta el 31 de Agosto de 2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. Iván Darío Castillo	**DESDE:** 9 Enero 2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JAIRO OCORO BONILLA	29 de noviembre del 2021	31 de Diciembre 2023
	Ing.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 43521	19/08/2021	
	No. 14822	16/01/2022	
	No 16023	19/01/2023	
	No 16424	16/01/2024	
	No 16524	16/01/2024	
	No 21294	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO OBRA.	No. 129221	29/11/2021	
	No 6322	16/01/2022	
	No 10423	19/01/2023	
	No 8424	16/01/2024	
	No 8524	16/01/2024	
	No 14024	16/01/2024	

FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	**No. 2-2023-042664**	**Fecha: 14/08/2023**
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL (MINISTERIO DEL INTERIOR)	**N/A**	**N/A**
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/11/2021	No. 435-47-994000047251

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/11/2021	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Diciembre de 2022.	**FECHA: 29/07/2022**
	SEGUNDA PRÓRROGA Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Diciembre de 2023.	**FECHA: 12/09/2022**
	TERCERA PRÓRROGA Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Agosto de 2024. Sustitución presupuestal vigencia 2024.	**FECHA: 4/09/2023**
	CUARTA PRORROGA. Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Agosto de 2025.	**FECHA: 16/12/2024**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**SUSPENSIÓN 01** Suspendido por 2meses. Nueva fecha de terminación:31 Octubre de 2024	**FECHA: 21/08/2024**
	REINICIO 01	**FECHA: 21/10/2024**
	SUSPENSIÓN 02 Suspendido por 45 dias. Nueva fecha de terminación 16 Diciembre 2024.	**FECHA: 31/10/2024**
	REINICIO 02	**FECHA: 16/12/2024**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**POLIZA INICIAL:** **(No 435-47-994000047251)**	**FECHA DE APROBACION:** **24/11/2021**
	VIGENCIA DEL AMPARO: 31/01/2023	
	POLIZA PRIMERA PRORROGA PRIMERA MODIFICACION	**FECHA DE APROBACION:** **30/11/2022**
	VIGENCIA DEL AMPARO: 30/06/2023	
	POLIZA SEGUNDA PRORROGA SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA DE APROBACION:** **23/03/2023**
	VIGENCIA DEL AMPARO:28/02/2023	
	POLIZA TERCERA PRORROGA TERCERA MODIFICACION.	**FECHA DE APROBACION:** **7/09/2023**
	VIGENCIA DEL AMPARO:28/02/2025	
	Reinicio 02	**FECHA DE APROBACION:** **16/12/2024**
	VIGENCIA DEL AMPARO:16/06/2025	
	POLIZA CUARTA PRORROGA CUARTA MODIFICACION	**FECHA DE APROBACION:** **PENDIENTE**
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 181.764.470,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 64.490.034,00
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		N/A
VALOR DE OBRA		$ 5.406.693.215,00
VALOR INTERVENTORÍA		$ 256.444.130,00
VALOR ADICIONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		$108.000.000,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO.	N/A	09/12/2021	$ 2.888.377.985,00
SEGUNDO DESEMBOLSO				
TERCER DESEMBOLSO				
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 2.888.377.985,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 0**

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria, NIT: 860.524.654-6

Cumplimiento

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
435-47-994000047251-6	Cumplimiento	$ 1.132.697.249,20	11/11/2021	30/06/2026
	N.A.			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.		$5.406.693.215,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&g-recaptcha-response=03AIlukzgKuLJgbtTA1_zV67aQzJzK2EObPakV0CyLtSGxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPfPIZr5Hn-tDihbIxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59IEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRZrQ-_h7UvvuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpcf5fhV4ScUlVGt6-qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOl_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPlh_4p4DmFzls_MqpAYjurW7mguRdXYU0lWntb7qrrobXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhmmXqMClEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFQiZx1sBWkGmx0aijmzSqz3xp500Ps4dZHQl6PDVWHQeCb6itV5TspupLwkGnpeOAxwlM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2Ip4oN2FZxtUhIzr1nhvTTxZtURISHIebYOfw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	19/07/2022		$ 108.000.000,00
Nombre contratista	CONSORCIO MICAY 2022 Representante Legal: HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ.		NIT: 901.594.340-6 C.C. 10.538.757 de Popayán
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		6.5 Meses
	OTRO SI No 1	19/07/2022	Adición ($108.000.000)
	SUSPENSIÓN No 1	21/11/2022	5.5 Meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO No 1	02/05/2023	-
	SUSPENSIÓN No 2	8/05/2023	2.5 meses
	REINICIO No 2	20/07/2023	-
	Otro si No 2	23/08/2023	Prorroga
	SUSPENSION No 3	7/12/2023	3 Meses
	REINICIO No 3	1/03/2024	-
	OTRO SI No 3	1/04/2024	Prorroga
	SUSPENSION No 4	12/07/2024	1 Mes
Fecha Inicial de terminación del contrato	**30/12/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato.**	Se encuentra en suspensión.
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 5.514.693.215
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	Cumplimiento 45-44-101138910. Responsabilidad civil extracontractual 4540-101076269		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/06/2022		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 257 del 9 de junio de 2022	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA	$ 256,615,155

Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&g-recaptcha-response=03AIIukzgpk_g1sQzJdd9hlYgtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7KhI3ZwjdL60zGEHSsdguEz-d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-i3ifX4UYLdsqZvFh8hdiRcMGFtSPQ7j02YeMiEEZYvjEQijZBQeSnLcemZTCXzAbjqh609e9aM9lqaRcouOQ88-BOrZCNFR-RLEVjBTiax3YmHcM2U6c3VRsDmqz6b_L_EoMzLZYLr058syO2YLS32ynnKON_dB8OAAi-z9_AnKGj-kUFUJk6WzW-6YpKk2OteHMwNRPh4T6XvBKO3m4o5ShKXBI9064_bM5QROZsQpJF9hb_Pnko3kqAxVloPMOsq83zztzNnUizs6wRIy6TF6SuqKCGPT4nlLZTL4o4QOKfticTZJft94nyET3JsV-iuv6_8EpiO8KLTEVVZ89ks6CIE4CMGOByAgWdbeXtOUwmmGNyPUisc37eNWqAW2heLkoHOxcNHwYGqjmTWmZJAHjHTJJFiTDc19y1g	
Nombre contratista	CONSORCIO VALLECA Representante Legal: Tatiana Janeth Cerón Díaz	NIT. 901.602320-4 C.C. 1.143.832.729

Fecha de Acta de inicio del Contrato	17/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN No 1	21/11/2022	5.5 Meses
	REINICIO No 1	02/05/2023	-
	SUSPENSIÓN No 2	8/05/2023	2.5 Meses
	REINICIO No 2	20/07/2023	-
	SUSPENSION No 3	7/12/2023	3 Meses
	REINICIO No 3	1/03/2024	-
	OTRO SI No 1	1/04/2024	Prorroga
	SUSPENSION No 4	12/07/2024	1 Mes
Fecha Inicial de terminación del contrato.	16/06/2023	**Fecha Actual de terminación del Contrato.**	Se encuentra en suspensión.
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 256.444.130,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	Cumplimiento 45-44-101139110. Responsabilidad civil extracontractual 45-40-101076438		
FECHA DE LA PÓLIZA	14/06/2022		

5. INFORME TECNICO

INFORME DE ACTIVIDADES.	El avance físico acumulado del proyecto se continúa situando en **25,62 %**, frente al **40%** contemplado en el cronograma vigente; esto supone un retraso de 14,38 puntos porcentuales. El desfase obedece a la suspensión de las actividades en obra. Durante el presente periodo se realizó ajuste a los informes financieros y técnicos según solicitud de la supervisión del ministerio del interior. Adicionalmente se sustento ante los supervisores el adicional solicitado por el contratista, interventoría y Municipio. Las actividades de ejecución no podrán reanudarse hasta que se disponga de los fondos necesarios para el cierre financiero.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra No: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	40%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	25,62%
OBSERVACIONES: El proyecto presenta un avance físico de **25,62%** frente al **40%** previsto en el cronograma. La brecha de **14,38** puntos porcentuales obedece a la paralización de las actividades. En el presente periodo el contratista de la mano con interventoría se proyectó la sustentación técnica para solicitud del recurso adicional requerido para el cierre financiero.	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

Contrato de Interventoría N° 257 del 9 de junio del 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	40%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	25,62%
OBSERVACIONES: El proyecto presenta un avance físico de **25,62%** frente al **40%** previsto en el cronograma. La brecha de **14,38** puntos porcentuales obedece a la paralización de las actividades. En el presente periodo el contratista de la mano con interventoría se proyectó la sustentación técnica para solicitud del recurso adicional requerido para el cierre financiero.	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES


FECHA OFICIO	REFERENCIA -RADICADO	ASUNTO	QUIEN ENVIA	OBSERVACION
5/05/2025	2025-3-004010-011461	Se reprograma reunión con la supervisión del Municipio de López de Micay a fin de revisar la justificación técnica del Municipio del incremento en el	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL.	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

		valor del Presupuesto de Obra.		
5/05/2025	Correo electrónico.	Solicitud de aplazamiento de reunión por falta de conectividad en el municipio.	SECRETARIO DE PALNEACION MUNICIPAL.	Anexo
9/05/2025	Correo electrónico.	Seguimiento a Convenio 2057 de 2021 Municipio López de Micay [En persona]	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
20/05/2025	Correo electrónico.	Oficio requerimiento Convenio 2057 de 2021 Municipio López de Micay.	SECRETARIO DE PALNEACION MUNICIPAL.	Anexo

- ***personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
Ing. Ivan Dario Castillo	Supervisor del Municipio deLópez de Micay y secretario de planeación municipal.

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

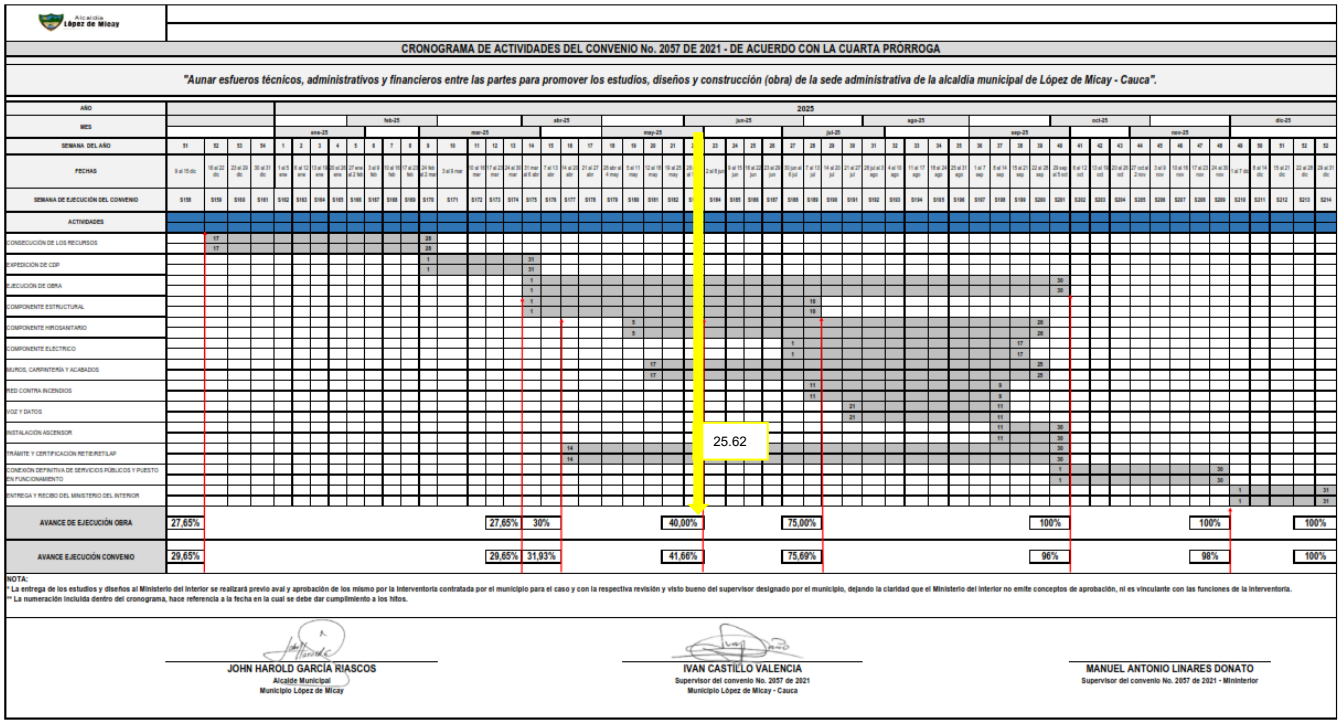


6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS:** No se realizaron visitas en el periodo reportado.	**EJECUTADO**	25,62%
	OBSERVACIONES:		

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

8. SUPERVISOR.

 _____ Ing. IVAN DARIO CASTILLO Secretario de Infraestructura y Planeación.	
