**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT 901.550.980-0
CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO BARRIO LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia
consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. CCCR 30**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 |
| **Dirección** | CALLE 25G N° 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/10/2025, 16:21 |
| **Expedición** | 01/10/2025, 16:22 |
| **Vencimiento** | 15/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE COSTOS No. 26 CONTRATO No. 2252 DE 2021 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL. GRUPO 2. | 60,262,940.00 | 11,449,958.60 | 71,712,898.60 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Setenta y un millones setecientos doce mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con sesenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 60,262,940.00 |
| IVA 19% | 11,449,958.60 |
| **Total a Pagar** | 71,712,898.60 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-15 por $ 71,712,898.60

**Observaciones:** #$24-02-00;2252-2021;WMOLANO@INVIAS.GOV.CO#$

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1094924 - 525925

**Porcentaje de participación de los miembros:**

ESTUTEC SAS - NIT 900.968.904 - 20%
EC CONSULTORIA SAS - NIT 901.450.710 - 25%
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS - NIT 860.043.881 - 35%
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS - NIT 900.871.862 - 20%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077751316 aprobado en 20240823 prefijo CCCR desde el número 21 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** 10794bf4fef19a906204456508eb7e8b42fd699c394188e1d014ebefd334b16307a358d6d829a51dc13173f2e3fba8fa

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:** $ 60.262.940,00

**PERIODO MES:** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 18-sep-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Julio E. Guevara Jaramillo | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 19-sep-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | AJUSTE DE VALORES |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 23-sep-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Julio E. Guevara Jaramillo | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Julio E. Guevara Jaramillo | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Ing. Julio E. Guevara Jaramillo | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Ing. Julio E. Guevara Jaramillo | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL **NIT.** 901.550.980-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 71.712.898,60 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 26 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | Germán Hernández | Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM |
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | Nombre: GERMÁN ALBERTO HERNÁNDEZ GONZALEZ | NombreWILLIAM MOLANO RODRIGUEZ |
| Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD | Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD | Matrícula profesional No.: 25202-39663 CND | Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217 |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA | DIRECTOR TERRITORIAL | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | ORDENADOR DEL PAGO SVR (E) |
| Fecha firma: | Fecha firma: | Fecha firma: | Fecha de Firma: Resolución No 4526 del 26 de septiembre de 2024 |
| (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | |

Original Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias. Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-5-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 18/9/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No. 26 — ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 60,262,940.00

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2252-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 — CONTRATO DE OBRA No.: 18092024-1274
CONTRATISTA: CONSORCIO MAIC 2024 — CONTRATO DE OBRA No.: 18092024-1295
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA DP — CONTRATO DE OBRA No.: 29102024-1472

PLAZO INICIAL: CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/03/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 3/01/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 3/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 13/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 999,980,476.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1,284,980,476.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO PUNTO CINCO (25,5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 1: 20/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 2: 2/08/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 3: 1/07/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES: $ 285,000,000.00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 9 del 23 de abril de 2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director | $ 5,900,000.00 | | 2,60 | $ 15,340,000.00 | | | 6,62 | $ 39,058,000.00 | 0,33 | $ 1,947,000.00 | 5,89 | $ 34,751,000.00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8,00 | $ 32,000,000.00 | | | 15,37 | $ 61,480,000.00 | 0,00 | $ - | 15,37 | $ 61,480,000.00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8,00 | $ 32,000,000.00 | | | 8,66 | $ 34,640,000.00 | 0,33 | $ 1,320,000.00 | 6,22 | $ 24,880,000.00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8,00 | $ 32,000,000.00 | | | 7,43 | $ 29,720,000.00 | 1,00 | $ 4,000,000.00 | 5,36 | $ 21,440,000.00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8,00 | $ 32,000,000.00 | | | 4,60 | $ 18,400,000.00 | 0,13 | $ 520,000.00 | 1,33 | $ 5,320,000.00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar Interventoría | $ 2,800,000.00 | | 3,00 | $ 8,400,000.00 | | | 1,71 | $ 4,788,000.00 | 0,00 | $ - | 1,71 | $ 4,788,000.00 |
| 7 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5,300,000.00 | | 1,30 | $ 6,890,000.00 | | | 1,06 | $ 5,618,000.00 | 0,00 | $ - | 1,06 | $ 5,618,000.00 |
| 8 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5,300,000.00 | | 1,20 | $ 6,360,000.00 | | | 0,44 | $ 2,332,000.00 | 0,00 | $ - | 0,44 | $ 2,332,000.00 |
| 9 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,950,000.00 | | 7,00 | $ 27,650,000.00 | | | 8,69 | $ 34,325,500.00 | 0,90 | $ 3,555,000.00 | 7,04 | $ 27,808,000.00 |
| 10 | 1 | Profesional Social | $ 3,950,000.00 | | 4,00 | $ 15,800,000.00 | | | 7,85 | $ 31,007,500.00 | 0,60 | $ 2,370,000.00 | 6,35 | $ 25,082,500.00 |
| 11 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7,00 | $ 12,600,000.00 | | | 6,85 | $ 12,330,000.00 | 0,00 | $ - | 6,85 | $ 12,330,000.00 |
| 12 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7,00 | $ 12,600,000.00 | | | 6,50 | $ 11,700,000.00 | 1,00 | $ 1,800,000.00 | 4,90 | $ 8,820,000.00 |
| 13 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7,00 | $ 12,600,000.00 | | | 5,30 | $ 9,540,000.00 | 1,00 | $ 1,800,000.00 | 3,70 | $ 6,660,000.00 |
| 14 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7,00 | $ 12,600,000.00 | | | 3,60 | $ 6,480,000.00 | 0,13 | $ 234,000.00 | 0,63 | $ 1,134,000.00 |
| 15 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 4,00 | $ 7,200,000.00 | | | 1,00 | $ 1,800,000.00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1,800,000.00 |
| 16 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 4,00 | $ 7,200,000.00 | | | 0,50 | $ 900,000.00 | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 900,000.00 |
| 17 | 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2,600,000.00 | | 8,00 | $ 20,800,000.00 | | | 21,40 | $ 55,640,000.00 | 1,00 | $ 2,600,000.00 | 19,80 | $ 51,480,000.00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 294,040,000.00** | | | | **$ 359,759,000.00** | | **$ 20,146,000.00** | | **$ 296,623,500.00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **2,34** | | | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 688,053,600.00** | | | | **$ 841,836,060.00** | | **$ 47,141,640.00** | | **$ 694,098,990.00** |
| **DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | **-$ 10,071,735.00** | | | **$ (948,000.00)** | | **$ (11,114,535.00)** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 9 del 23 de abril de 2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Viáticos Director y Especialistas | $ 150,000.00 | Dia | 105,00 | $ 15,750,000.00 | | | 45,27 | $ 6,790,500.00 | 9,00 | $ 1,350,000.00 | 37,27 | $ 5,590,500.00 |
| 19 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 4,900,000.00 | Mes | 8,00 | $ 39,200,000.00 | | | 22,10 | $ 108,290,000.00 | 1,00 | $ 4,900,000.00 | 20,33 | $ 99,617,000.00 |
| 20 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000.00 | | | 7,73 | $ 5,411,000.00 | 0,00 | $ - | 7,73 | $ 5,411,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 8,66 | $ 6.062.000,00 | 0,00 | $ - | 6,06 | $ 4.242.000,00 |
| 22 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 7,00 | $ 4.900.000,00 | 0,13 | $ 91.000,00 | 4,53 | $ 3.171.000,00 |
| 23 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 5,60 | $ 3.920.000,00 | 1,00 | $ 700.000,00 | 3,50 | $ 2.450.000,00 |
| 24 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 3,80 | $ 2.660.000,00 | 1,00 | $ 700.000,00 | 1,70 | $ 1.190.000,00 |
| 25 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 4,10 | $ 2.870.000,00 | 0,13 | $ 91.000,00 | 0,83 | $ 581.000,00 |
| 26 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 27 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 28 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.300.000,00 | Mes | 4,00 | $ 25.200.000,00 | | | 10,38 | $ 65.394.000,00 | 0,50 | $ 3.150.000,00 | 9,38 | $ 59.094.000,00 |
| 29 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 500.000,00 | GL | 8,00 | $ 4.000.000,00 | | | 21,62 | $ 10.810.000,00 | 1,48 | $ 740.000,00 | 10,94 | $ 5.470.000,00 |
| 30 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 850.000,00 | Mes | 8,00 | $ 6.800.000,00 | | | 22,50 | $ 19.125.000,00 | 1,00 | $ 850.000,00 | 21,40 | $ 18.190.000,00 |
| 31 | 1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 850.000,00 | Mes | 8,00 | $ 6.800.000,00 | | | 8,95 | $ 7.607.500,00 | 1,69 | $ 1.436.500,00 | 8,95 | $ 7.607.500,00 |
| 32 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | $ 300.000,00 | Mes | 8,00 | $ 2.400.000,00 | | | 3,30 | $ 990.000,00 | 0,00 | $ - | 1,78 | $ 534.000,00 |
| 33 | 1 | Bolsa insumos de Bioseguridad | $ 3.156.128,00 | GL | 1,00 | $ 3.156.128,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 320.000,00 | Mes | 8,00 | $ 2.560.000,00 | | | 7,57 | $ 2.421.201,00 | 0,19 | $ 60.800,00 | 6,01 | $ 1.923.200,00 |
| 35 | 1 | Veedurías Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | $ 200.000,00 | Mes | 8,00 | $ 1.600.000,00 | | | 4,00 | $ 800.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 152.266.128,00** | | | | **$ 248.051.201,00** | | **$ 14.069.300,00** | | **$ 215.071.200,00** |
| | * | **Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)** | | | | **$ 840.319.728,00** | | | | **$ 1.079.815.526,00** | **Subtotal costos básicos** | **$ 60.262.940,00** | | **$ 898.055.655,00** |
| | * | IVA (D) = (C) * (% IVA) | | | | $ 159.660.748,00 | | | | $ 205.164.950,00 | Iva | $ 11.449.958,60 | | $ 170.630.574,45 |
| | * | Costo Total = (C) + (D) | | | | **$ 999.980.476,00** | | | | **$ 1.284.980.476,00** | Costo Total | **$ 71.712.898,60** | | **1.068.686.229,45** |



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Anticipo Otorgado** | $ 420.159.864,00 | 50,00% |
| **Valor Amortizado Presenta Acta** | $ - | 0,00% |
| **Valor Amortizado Acumulado** | $ 420.159.864,00 | 50,00% |
| **Valor Saldo por Amortizar** | $ - | 0,00% |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 60.262.940,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 60.262.940,00

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 46.193.640,00 | $ 8.776.791,60 | $ 54.970.431,60 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 14.069.300,00 | $ 2.673.167,00 | $ 16.742.467,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | **$ 60.262.940,00** | **$ 11.449.958,60** | **$ 71.712.898,60** |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 71.712.898,60
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 881 CPE

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## AJUSTE DEL FACTOR MULTIPLICADOR

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 9 del 23 de abril de 2025 | | EJECUCIÓN TOTAL ACTA DE COSTOS No. 26 - 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | | VALOR ACTA DE COSTOS No. 26 - 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | VALOR QUE SE DEBERIA PAGAR POR ESPECIALISTAS ACTA DE COSTOS No. 26 - 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | VALOR QUE SE DEBERIA PAGAR POR ESPECIALISTAS ACTA DE COSTOS No. 26 - 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | | | |
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director | $ 5.900.000,00 | | 2,60 | $ 15.340.000,00 | 6,62 | $ 39.058.000,00 | 0,33 | $ 1.947.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | 15,37 | $ 61.480.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | 8,66 | $ 34.640.000,00 | 0,33 | $ 1.320.000,00 | | | |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | 7,43 | $ 29.720.000,00 | 1,00 | $ 4.000.000,00 | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | 4,60 | $ 18.400.000,00 | 0,13 | $ 520.000,00 | | | |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar Interventoria | $ 2.800.000,00 | | 3,00 | $ 8.400.000,00 | 1,71 | $ 4.788.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| 7 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5.300.000,00 | | 1,30 | $ 6.890.000,00 | 1,06 | $ 5.618.000,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | |
| 8 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5.300.000,00 | | 1,20 | $ 6.360.000,00 | 0,44 | $ 2.332.000,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | |
| 9 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.950.000,00 | | 7,00 | $ 27.650.000,00 | 8,69 | $ 34.325.500,00 | 0,90 | $ 3.555.000,00 | $ 3.555.000,00 | $ 3.555.000,00 | $ - |
| 10 | 1 | Profesional Social | $ 3.950.000,00 | | 4,00 | $ 15.800.000,00 | 7,85 | $ 31.007.500,00 | 0,60 | $ 2.370.000,00 | $ 2.370.000,00 | $ 2.370.000,00 | $ - |
| 11 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | 6,85 | $ 12.330.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| 12 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | 6,50 | $ 11.700.000,00 | 1,00 | $ 1.800.000,00 | | | |
| 13 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | 5,30 | $ 9.540.000,00 | 1,00 | $ 1.800.000,00 | | | |
| 14 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | 3,60 | $ 6.480.000,00 | 0,13 | $ 234.000,00 | | | |
| 15 | 1 | Inspector SISO | $ 1.800.000,00 | | 4,00 | $ 7.200.000,00 | 1,00 | $ 1.800.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| 16 | 1 | Inspector SISO | $ 1.800.000,00 | | 4,00 | $ 7.200.000,00 | 0,50 | $ 900.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| 17 | 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2.600.000,00 | | 8,00 | $ 20.800.000,00 | 21,40 | $ 55.640.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 294.040.000,00 | | $ 359.759.000,00 | | $ 20.146.000,00 | $ 5.925.000,00 | $ 5.925.000,00 | $ - |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,34 | | 2,34 | | 2,34 | 2,34 | 2,18 | 2,11 |
| | | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 688.053.600,00 | | $ 841.836.060,00 | | $ 47.141.640,00 | $ 13.864.500,00 | $ 12.916.500,00 | $ - |
| | | DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL | | | | | -$ | 10.071.735,00 | | -$ 948.000,00 | | | |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 9 del 23 de abril de 2025 | | EJECUCIÓN TOTAL ACTA DE COSTOS No. 26 - 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | | VALOR A DESCONTAR ACTA DE COSTOS No. 26 - 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | $ 948.000,00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Total Dedicación Recurso | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR | | | |
| | | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Viáticos Director y Especialistas | $ 150.000,00 | Día | 105,00 | $ 15.750.000,00 | 45,27 | $ 6.790.500,00 | 9,00 | $ 1.350.000,00 | | | |
| 19 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 4.900.000,00 | Mes | 8,00 | $ 39.200.000,00 | 22,10 | $ 108.290.000,00 | 1,00 | $ 4.900.000,00 | ARL | | 0,069 |
| 20 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 7,73 | $ 5.411.000,00 | 0,00 | $ - | PENSION | 0,12 | 0,12 |
| 21 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 8,66 | $ 6.062.000,00 | 0,00 | $ - | CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,04 | 0,04 |
| 22 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 7,00 | $ 4.900.000,00 | 0,13 | $ 91.000,00 | TOTAL | 0,16 | 0,23 |
| 23 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 5,60 | $ 3.920.000,00 | 1,00 | $ 700.000,00 | | | |
| 24 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 3,80 | $ 2.660.000,00 | 1,00 | $ 700.000,00 | | | |
| 25 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 4,10 | $ 2.870.000,00 | 0,13 | $ 91.000,00 | FACTOR MULTIPLICADOR PROPUESTA | 2,34 | 2,34 |
| 26 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | |
| 27 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700.000,00 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR | 2,18 | 2,11 |
| 28 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.300.000,00 | Mes | 4,00 | $ 25.200.000,00 | 10,38 | $ 65.394.000,00 | 0,50 | $ 3.150.000,00 | | | |
| 29 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 500.000,00 | GL | 8,00 | $ 4.000.000,00 | 21,62 | $ 10.810.000,00 | 1,48 | $ 740.000,00 | | | |
| 30 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 850.000,00 | Mes | 8,00 | $ 6.800.000,00 | 22,50 | $ 19.125.000,00 | 1,00 | $ 850.000,00 | | | |
| 31 | 1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 850.000,00 | Mes | 8,00 | $ 6.800.000,00 | 8,95 | $ 7.607.500,00 | 1,69 | $ 1.436.500,00 | | | |
| 32 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | $ 300.000,00 | Mes | 8,00 | $ 2.400.000,00 | 3,30 | $ 990.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| 33 | 1 | Bolsa insumos de Bioseguridad | $ 3.156.128,00 | GL | 1,00 | $ 3.156.128,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 320.000,00 | Mes | 8,00 | $ 2.560.000,00 | 7,57 | $ 2.421.201,00 | 0,19 | $ 60.800,00 | | | |
| 35 | 1 | Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | $ 200.000,00 | Mes | 8,00 | $ 1.600.000,00 | 4,00 | $ 800.000,00 | 0,00 | $ - | | | |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | $ - | | | | | |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | $ 152.266.128,00 | | $ 248.051.201,00 | | $ 14.069.300,00 | | | |
| | | Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B) | | | | $ 840.319.728,00 | | $ 1.079.815.526,00 | | $ 60.262.940,00 | | | |
| | | IVA (F) = (E) * (% IVA) | | | | $ 159.660.748,00 | | $ 205.164.950,00 | | $ 11.449.958,60 | | | |
| | | Costo Total = (E) + (F) | | | | $ 999.980.476,00 | | $ 1.284.980.476,00 | | $ 71.712.898,60 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 12/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 18092024-1274 | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 18092024-1295 | CONSORCIO MAIC 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 29102024-1472 | CONSORCIO OBRAS DP |

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1077721 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | Nación | Principal | $ 390.000.000,00 | $ - |
| 2021 | 1077721 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | Nación | Principal | $ 4.000.000,00 | $ - |
| 2022 | 283622 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 605.980.476,00 | $ - |
| 2023 | 1401423 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal - Restitución de Recursos | $ 100.000.000,00 | $ - |
| 2024 | 1094924 | C-2402-0600-12-0-2402041-03 | 10 | Nación | Principal - Restitución de Recursos | $ 159.528.012,65 | $ 3.007.145,15 |
| 2025 | 525925 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | 10 | Nación | Adicional | $ 285.000.000,00 | |
| | | | TOTAL | | | **$ 1.284.980.476,00** | **$ 3.007.145,15** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.284.980.476,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **283622 - 23/02/2022** | **$ 605.980.476,00** | | | |
| | | | | | | | **$ 378.143.877,60** | 283622 - 23/02/2022 | $ 227.836.598,40 | $ 1.284.980.476,00 | | |
| | | | | | | | | **1077721 - 30/12/2021** | **$ 4.000.000,00** | | | |
| | | | | | | | | **1077721 - 30/12/2021** | **$ 390.000.000,00** | | | |
| 1 | 16 AL 30 DE MARZO DEL 2022 | $ 9.079.480,00 | $ 1.725.101,20 | $ 10.804.581,20 | $ 4.085.766,00 | $ 6.718.815,20 | $ 374.058.111,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 387.281.184,80 | $ 1.274.175.894,80 | | Pagada |
| 2 | 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 | $ 26.276.130,00 | $ 4.992.464,70 | $ 31.268.594,70 | $ 11.824.258,50 | $ 19.444.336,20 | $ 362.233.853,10 | 283622 - 23/02/2022 | $ 208.392.262,20 | $ 1.242.907.300,10 | | Pagada |
| 3 | 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 | $ 29.876.520,00 | $ 5.676.538,80 | $ 35.553.058,80 | $ 13.444.434,00 | $ 22.108.624,80 | $ 348.789.419,10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 365.172.560,00 | $ 1.207.354.241,30 | | Pagada |
| 4 | 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | $ 33.973.380,00 | $ 6.454.942,20 | $ 40.428.322,20 | $ 15.288.021,00 | $ 25.140.301,20 | $ 333.501.398,10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 340.032.258,80 | $ 1.166.925.919,10 | | Pagada |
| 5 | 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 | $ 36.867.420,00 | $ 7.004.809,80 | $ 43.872.229,80 | $ 16.590.339,00 | $ 27.281.890,80 | $ 316.911.059,10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 312.750.368,00 | $ 1.123.053.689,30 | | Pagada |
| 6 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 | $ 43.750.970,00 | $ 8.312.684,30 | $ 52.063.654,30 | $ 19.687.936,50 | $ 32.375.717,80 | $ 297.223.122,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 280.374.650,20 | $ 1.070.990.035,00 | | Pagada |
| 7 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | $ 37.931.540,00 | $ 7.206.992,60 | $ 45.138.532,60 | $ 17.069.193,00 | $ 28.069.339,60 | $ 280.153.929,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 252.305.310,60 | $ 1.025.851.502,40 | | Pagada |
| 8 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 | $ 40.244.200,00 | $ 7.646.398,00 | $ 47.890.598,00 | $ 18.109.890,00 | $ 29.780.708,00 | $ 262.044.039,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 222.524.602,60 | $ 977.960.904,40 | | Pagada |
| 9 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | $ 28.456.905,00 | $ 5.406.811,95 | $ 33.863.716,95 | $ 28.456.905,00 | $ 5.406.811,95 | $ 233.587.134,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 217.117.790,65 | $ 944.097.187,45 | | Pagada |
| 10 | 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | $ 27.588.800,00 | $ 5.241.872,00 | $ 32.830.672,00 | $ 27.588.800,00 | $ 5.241.872,00 | $ 205.998.334,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 111.875.918,65 | $ 911.266.515,45 | | Pagada |
| | | | | | | | | **283622 - 23/02/2022** | **$ 208.392.262,20** | | | |
| | | | | | | | **$ 42.015.986,40** | 283622 - 23/02/2022 | $ 166.376.275,80 | | | |
| 11 | 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 205.998.334,60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 166.376.275,80 | $ 911.266.515,45 | | - |
| 12 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 205.998.334,60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 166.376.275,80 | $ 911.266.515,45 | | - |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | FECHA | 12/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | $ 99.768.220,00 | $ 18.955.961,80 | $ 118.724.181,80 | $ - | $ 118.724.181,80 | $ 205.998.334,60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 47.652.094,00 | $ 792.542.333,65 | | | Pagada |
| | | | | | | | | **1401423 - 20/12/2023** | **$ 100.000.000,00** | | | | |
| 14 | 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | $ 15.845.360,00 | $ 3.010.618,40 | $ 18.855.978,40 | $ 15.845.360,00 | $ 3.010.618,40 | $ 190.152.974,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 96.989.381,60 | $ 773.686.355,25 | | | Pagada |
| 15 | 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 | $ 18.116.420,00 | $ 3.442.119,80 | $ 21.558.539,80 | $ 15.989.987,00 | $ 5.568.552,80 | $ 174.162.987,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 91.420.828,80 | $ 752.127.815,45 | | | Pagada |
| 16 | 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 | $ 16.731.280,00 | $ 3.178.943,20 | $ 19.910.223,20 | $ - | $ 19.910.223,20 | $ 174.162.987,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 71.510.605,60 | $ 732.217.592,25 | | | Pagada |
| 17 | 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 | $ 19.163.380,00 | $ 3.641.042,20 | $ 22.804.422,20 | $ 15.330.704,00 | $ 7.473.718,20 | $ 158.832.283,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 64.036.887,40 | $ 709.413.170,05 | | | Pagada |
| 18 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | $ 15.067.120,00 | $ 2.862.752,80 | $ 17.929.872,80 | $ 12.053.696,00 | $ 5.876.176,80 | $ 146.778.587,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 58.160.710,60 | $ 531.955.284,60 | | | Pendiente de pago |
| 19 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $ 32.705.020,00 | $ 6.213.953,80 | $ 38.918.973,80 | $ 31.069.769,00 | $ 7.849.204,80 | $ 115.708.818,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 50.311.505,80 | $ 208.036.310,80 | | | Pendiente de pago |
| 20 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 | $ 59.633.760,00 | $ 11.330.414,40 | $ 70.964.174,40 | $ 20.652.668,60 | $ 50.311.505,80 | $ 95.056.150,00 | **1401423 - 20/12/2023** | $ - | $ 137.072.136,40 | | | Pendiente de pago |
| | | | | | | | | **1094924 - 1/11/2024** | **$ 159.528.012,65** | $ 296.600.149,05 | | | |
| 21 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | $ 67.523.500,00 | $ 12.829.465,00 | $ 80.352.965,00 | $ 64.147.325,00 | $ 16.205.640,00 | $ 72.924.811,40 | **1094924 - 1/11/2024** | $ 143.322.372,65 | $ 216.247.184,05 | | | Pendiente de pago |
| 22 | 01 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2024 | $ 78.492.600,00 | $ 14.913.594,00 | $ 93.406.194,00 | $ 72.924.811,40 | $ 20.481.382,60 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 122.840.990,05 | $ 122.840.990,05 | | | Pagada |
| 23 | 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 | $ 57.224.260,00 | $ 10.872.609,40 | $ 68.096.869,40 | $ - | $ 68.096.869,40 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 54.744.120,65 | $ 54.744.120,65 | | | Pagada |
| 24 | 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2025 | $ 19.280.900,00 | $ 3.663.371,00 | $ 22.944.271,00 | $ - | $ 22.944.271,00 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 31.799.849,65 | $ 31.799.849,65 | | | Pagada |
| 25 | 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | $ 24.195.550,00 | $ 4.597.154,50 | $ 28.792.704,50 | $ - | $ 28.792.704,50 | $ - | **1094924 - 1/11/2025** | $ 3.007.145,15 | $ 288.007.145,15 | | | Pendiente de pago |
| | | | | | | | | **525925 - 07/07/2025** | **$ 285.000.000,00** | | | | |
| 26 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 | $ 60.262.940,00 | $ 11.449.958,60 | $ 71.712.898,60 | $ - | $ 71.712.898,60 | $ - | **525925 - 07/07/2025** | $ 216.294.246,55 | $ 216.294.246,55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 898.055.655,00** | **$ 170.630.574,45** | **$ 1.068.686.229,45** | **$ 420.159.864,00** | **$ 648.526.365,45** | **$ -** | | **$ 216.294.246,55** | **$ 216.294.246,55** | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | $ 682.984.455,00 | $ 129.767.046,45 | $ 812.751.501,45 |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | $ 215.071.200,00 | $ 40.863.528,00 | $ 255.934.728,00 |
| * | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL** | **$ 898.055.655,00** | **$ 170.630.574,45** | **$ 1.068.686.229,45** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 2252-2021

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 26 | 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1077721 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 54 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 1077721 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | RECURSO No. | 54 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 283622 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 1401423 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 1094924 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 10 | VALOR AFECTADO | $ 3.007.145,15 |
| No. COMPROMISO | 525925 | RUBRO No. | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | RECURSO No. | 10 | VALOR AFECTADO | $ 68.705.753,45 |

TOTAL ACTA **$ 71.712.898,60**

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**
**Supervisor de Contrato de Interventoría**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**CONTRATO N°** 2252-2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETO DEL CONTRATO :** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**Acta N°** 26 Valor basico $ 60.262.940,00 **Período** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

**Valor Incluido Iva** $ 71.712.898,60

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESGUARDO INDÍGENA: DAMASCO | NEIRA | | | $ - | $ - |
| 2 | RESGUARDO INDÍGENA: LA ALBANIA | RISARALDA | | | $ - | $ - |
| 3 | RESGUARDO INDÍGENA: TOTUMAL | BELALCAZAR | | | $ - | $ - |
| 4 | RESGUARDO INDIGENA NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | RIOSUCIO | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 5 | RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMA PRIETA | RIOSUCIO | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 6 | RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO | RIOSUCIO | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 7 | RESGUARDO INDIGENA TRINA EMBERA CHAMI | SUPIA | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 8 | RESGUARDO INDIGENA CAUROMA | SUPIA | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 9 | RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMA PRIETA | SUPIA | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 10 | RESGUARDO INDIGENA ESCOPETARA Y TIRZA | RIOSUCIO Y SUPIA | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 11 | RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD | FILADELFIA | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 12 | RESGUARDO INDIGENA CARTAMA | MARMATO | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 13 | RESGUARDO INDIGENA ANSEA | ANSERMA | | | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 71.712.898,60** | **$ 60.262.940,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO DE CALDAS | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890.801.135-2 | MUNICIPIO 1 | NEIRA | $ - | $ - |
| 800.095.461-1 | MUNICIPIO 2 | RISARALDA | $ - | $ - |
| 890.802.650-9 | MUNICIPIO 3 | BELALCAZAR | $ - | $ - |
| 890.801.138-4 | MUNICIPIO 4 | RIOSUCIO | $ 28.685.159,44 | $ 24.105.176,00 |
| 890.801.150-3 | MUNICIPIO 5 | SUPIA | $ 21.513.869,58 | $ 18.078.882,00 |
| 890801144-9 | MUNICIPIO 6 | FILADELFIA | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 800077897 - 2 | MUNICIPIO 7 | MARMATO | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| 890.801.139-1 | MUNICIPIO 8 | ANSERMA | $ 7.171.289,86 | $ 6.026.294,00 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS** | | **$ 71.712.898,60** | **$ 60.262.940,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

**INTERVENTOR**
**MARIO CABRERA DUSSAN**
**Representante Legal**

**SUPERVISOR**
**JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**
**Supervisor de Contrato de Interventoría**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEP-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1274
**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1295
**CONTRATO DE OBRA No.:** 29102024-1472

**CONTRATISTAS:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024; CONSORCIO MAIC 2024; CONSORCIO OBRAS DP

**NOMBRE ARL:** SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.; ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFAMILIARES; CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 22/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — CALDAS — **ACTA No:** 10

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

**RESOLUCIÓN No.:** 2611 DE 1/08/2023 (Indicar día/mes/año)

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC 2024

**CONTRATO DE OBRA No:** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**PLAZO INICIAL:** CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES (En meses según contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 16/03/2022 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:** 3/01/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** 3/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 3:** 13/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 999.980.476,00 (Según contrato principal)

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 1.284.980.476,00

**PLAZO ACUMULADO:** VEINTICINCO PUNTO CINCO (25,5) (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 1/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE REANUDACIÓN 1:** 20/10/2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE REANUDACIÓN 2:** 2/08/2024 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE REANUDACIÓN 3:** 1/07/2025 (Indique día/mes/año)

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 285.000.000,00

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | MODIFICACIONES | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 26 de fecha agosto de 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 9 de 23 de abril de 2025 | | PRESENTES | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director | $ 5.900.000,00 | | 2,60 | $ 15.340.000,00 | | 6,62 | $ 39.058.000,00 | + | 0,17 | $ 1.003.000,00 | 5,89 | $ 34.751.000,00 | 6,79 | $ 40.061.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | | 15,37 | $ 61.480.000,00 | | | $ - | 15,37 | $ 61.480.000,00 | 15,37 | $ 61.480.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | | 6,66 | $ 34.840.000,00 | - | -1,44 | $ (5.760.000,00) | 6,22 | $ 24.880.000,00 | 7,22 | $ 28.880.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | | 7,43 | $ 29.720.000,00 | - | -0,07 | $ (280.000,00) | 5,36 | $ 21.440.000,00 | 7,36 | $ 29.440.000,00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | | 8,00 | $ 32.000.000,00 | | 4,60 | $ 18.400.000,00 | - | -1,27 | $ (5.080.000,00) | 1,33 | $ 5.320.000,00 | 3,33 | $ 13.320.000,00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar Interventoría | $ 2.800.000,00 | | 3,00 | $ 8.400.000,00 | | 1,71 | $ 4.788.000,00 | | 0,00 | $ - | 1,71 | $ 4.788.000,00 | 1,71 | $ 4.788.000,00 |
| 7 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5.300.000,00 | | 1,30 | $ 6.890.000,00 | | 1,06 | $ 5.618.000,00 | + | 0,36 | $ 1.908.000,00 | 1,06 | $ 5.618.000,00 | 1,42 | $ 7.526.000,00 |
| 8 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5.300.000,00 | | 1,20 | $ 6.360.000,00 | | 0,44 | $ 2.332.000,00 | + | 0,36 | $ 1.908.000,00 | 0,44 | $ 2.332.000,00 | 0,80 | $ 4.240.000,00 |
| 9 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.950.000,00 | | 7,00 | $ 27.650.000,00 | | 6,69 | $ 34.325.500,00 | + | 0,35 | $ 1.382.500,00 | 7,04 | $ 27.808.000,00 | 9,04 | $ 35.708.000,00 |
| 10 | 1 | Profesional Social | $ 3.950.000,00 | | 4,00 | $ 15.800.000,00 | | 7,85 | $ 31.007.500,00 | + | 0,50 | $ 1.975.000,00 | 6,35 | $ 25.082.500,00 | 8,35 | $ 32.982.500,00 |
| 11 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | | 6,85 | $ 12.330.000,00 | + | 1,30 | $ 2.340.000,00 | 6,85 | $ 12.330.000,00 | 8,15 | $ 14.670.000,00 |
| 12 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | | 6,50 | $ 11.700.000,00 | + | 0,40 | $ 720.000,00 | 4,90 | $ 8.820.000,00 | 6,90 | $ 12.420.000,00 |
| 13 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | | 5,30 | $ 9.540.000,00 | + | 0,40 | $ 720.000,00 | 3,70 | $ 6.660.000,00 | 5,70 | $ 10.260.000,00 |
| 14 | 1 | Inspector | $ 1.800.000,00 | | 7,00 | $ 12.600.000,00 | | 3,60 | $ 6.480.000,00 | - | -0,97 | $ (1.746.000,00) | 0,63 | $ 1.134.000,00 | 2,63 | $ 4.734.000,00 |
| 15 | 1 | Inspector SISO | $ 1.800.000,00 | | 4,00 | $ 7.200.000,00 | | 1,00 | $ 1.800.000,00 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.800.000,00 | 1,00 | $ 1.800.000,00 |
| 16 | 1 | Inspector SISO | $ 1.800.000,00 | | 4,00 | $ 7.200.000,00 | | 0,50 | $ 900.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 900.000,00 | 0,50 | $ 900.000,00 |
| 17 | 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2.600.000,00 | | 8,00 | $ 20.800.000,00 | | 21,40 | $ 55.640.000,00 | + | 0,40 | $ 1.040.000,00 | 19,80 | $ 51.480.000,00 | 21,80 | $ 56.680.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 294.040.000,00 | | | $ 359.759.000,00 | | | $ 130.500,00 | | $ 296.623.500,00 | | $ 359.889.500,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,34 | | | 2,34 | | | 2,34 | | 2,34 | | 2,34 |
| | | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 688.053.600,00 | | | $ 841.836.060,00 | | | $ 305.370,00 | | $ 694.098.990,00 | | $ 842.141.430,00 |
| DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | $ (10.071.735,00) | | | $ (4.181.360,00) | | $ (11.114.535,00) | | $ (14.253.095,00) |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Viáticos Director y Especialistas | $ 150,000,00 | Dia | 105,00 | $ 15,750,000,00 | | 45,27 | $ 6,790,500,00 | + | 14,00 | $ 2,100,000,00 | 37,27 | $ 5,590,500,00 | 59,27 | $ 8,890,500,00 |
| 19 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 4,900,000,00 | Mes | 8,00 | $ 39,200,000,00 | | 22,10 | $ 108,290,000,00 | + | 0,23 | $ 1,127,000,00 | 20,33 | $ 99,617,000,00 | 22,33 | $ 109,417,000,00 |
| 20 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 7,73 | $ 5,411,000,00 | | 0,00 | $ - | 7,73 | $ 5,411,000,00 | 7,73 | $ 5,411,000,00 |
| 21 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 8,66 | $ 6,062,000,00 | - | -1,60 | $ (1,120,000,00) | 6,06 | $ 4,242,000,00 | 7,06 | $ 4,942,000,00 |
| 22 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 7,00 | $ 4,900,000,00 | - | -0,47 | $ (329,000,00) | 4,53 | $ 3,171,000,00 | 6,53 | $ 4,571,000,00 |
| 23 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 5,60 | $ 3,920,000,00 | - | -0,10 | $ (70,000,00) | 3,50 | $ 2,450,000,00 | 5,50 | $ 3,850,000,00 |
| 24 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 3,80 | $ 2,660,000,00 | - | -0,10 | $ (70,000,00) | 1,70 | $ 1,190,000,00 | 3,70 | $ 2,590,000,00 |
| 25 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 4,10 | $ 2,870,000,00 | - | -1,27 | $ (889,000,00) | 0,83 | $ 581,000,00 | 2,83 | $ 1,981,000,00 |
| 26 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 0,00 | $ - | + | 2,00 | $ 1,400,000,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 1,400,000,00 |
| 27 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000,00 | Mes | 8,00 | $ 5,600,000,00 | | 0,00 | $ - | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 28 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6,300,000,00 | Mes | 4,00 | $ 25,200,000,00 | | 10,38 | $ 65,394,000,00 | | 0,00 | $ - | 9,38 | $ 59,094,000,00 | 10,38 | $ 65,394,000,00 |
| 29 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 500,000,00 | GL | 8,00 | $ 4,000,000,00 | | 21,62 | $ 10,810,000,00 | - | -4,68 | $ (2,340,000,00) | 10,94 | $ 5,470,000,00 | 16,94 | $ 8,470,000,00 |
| 30 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 850,000,00 | Mes | 8,00 | $ 6,800,000,00 | | 22,50 | $ 19,125,000,00 | + | 0,90 | $ 765,000,00 | 21,40 | $ 18,190,000,00 | 23,40 | $ 19,890,000,00 |
| 31 | 1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 850,000,00 | Mes | 8,00 | $ 6,800,000,00 | | 8,95 | $ 7,607,500,00 | + | 4,44 | $ 3,774,000,00 | 8,95 | $ 7,607,500,00 | 13,39 | $ 11,381,500,00 |
| 32 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | $ 300,000,00 | Mes | 8,00 | $ 2,400,000,00 | | 3,30 | $ 990,000,00 | + | -0,74 | $ (222,000,00) | 1,78 | $ 534,000,00 | 2,56 | $ 768,000,00 |
| 33 | 1 | Bolsa insumos de Bioseguridad | $ 3,156,128,00 | GL | 1,00 | $ 3,156,128,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 320,000,00 | Mes | 8,00 | $ 2,560,000,00 | | 7,57 | $ 2,421,201,00 | + | 0,444 | $ 141,999,00 | 6,01 | $ 1,923,200,00 | 8,01 | $ 2,563,200,00 |
| 35 | 1 | Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | $ 200,000,00 | Mes | 8,00 | $ 1,600,000,00 | | 4,00 | $ 800,000,00 | + | -2,00 | $ (400,000,00) | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 400,000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | $ 7,991,00 | 0 | $ - | | $ 7,991,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 152,266,128,00** | | | **$ 248,051,201,00** | | | **$ 3,875,990,00** | | **$ 215,071,200,00** | | **$ 251,927,191,00** |
| | * | **Subtotal costos básicos Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)** | | | | **$ 840,319,728,00** | | | **$ 1,079,815,526,00** | | | **$ -** | | **$ 898,055,655,00** | | **$ 1,079,815,526,00** |
| | * | IVA (D) = (C) * (% IVA) | | | | $ 159,660,748,00 | | | $ 205,164,950,00 | | | $ - | | $ 170,630,574,45 | | $ 205,164,950,00 |
| | * | **Costo Total = (C) + (D)** | | | | **$ 999,980,476,00** | | | **$ 1,284,980,476,00** | | | **$ -** | | **$ 1,068,686,229,45** | | **$ 1,284,980,476,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 1,079,815,526,00 | $ 205,164,950,00 | $ 1,284,980,476,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO DE 2025: | $ 898,055,655,00 | $ 170,630,574,45 | $ 1,068,686,229,45 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 181,759,871,00 | $ 34,534,375,55 | $ 216,294,246,55 |

| PLAZO EN MESES |
|---|
| 4,50 |
| 16,50 |
| 21,00 |
| 1,50 |

18 de septiembre de 2025

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De conformidad con el instructivo MEPI-MN1-IN-13 SOLICITUD ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN INTERVENTORÍA del Manual de Interventoria previsto por la entidad y el cual se encuentra vigente y la comunicación [INV-CIC-2252-2021-327 de fecha 22 de septiembre de 2025, el Interventor, CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, se permite allegar la presente solicitud de prórroga hasta el 31 de octubre de 2025 al contrato de interventoria No 2252 de 2021

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIO CABRERA SUSSAN
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 881 CPE

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600C LD

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia: NA
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217

Revisión:

Director Territorial

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: GERMÁN ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-396639 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**
**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS *"COLOMBIA RURAL".* GRUPO 2

**CONSORCIO VIAL CALDAS 2025**
**CONTRATO DE OBRA No.19082025-1274**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI(SUPIA), CAUROMA(SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA(SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA)

**CONSORCIO MAIC 2025**
**CONTRATO DE OBRA No. 19082025-1295**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO

**CONSORCIO OBRAS DP**
**CONTRANO DE OBRA No. 29102025-1472**
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA -MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**SOPORTES ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 26**
**ORIGINAL**

**PERIODO**
**01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

# CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

# ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO CABRERA DUSSAN**, identificado con **C.C. 17.087.167 de Bogotá**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** identificado con NIT **901.550.980-0, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** certifico el pago de los aportes salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar; correspondiente a la nómina del periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para el Contrato de Interventoría No. 2252 de 2021, correspondiente al Acta de Costos N°25 periodo del **01 al 31 de AGOSTO de 2025**, cuyo Objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS *"COLOMBIA RURAL".* GRUPO 2**

Dado en Tabio (Cundinamarca) a los treinta y uno (31) días del mes de agosto 2025.

Atentamente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. 17.087.167 DE BOGOTÁ**

# CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR O GESTOR TÉCNICO DE LA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

# COPIA DEL RUT DEL CONSORCIO Y DE CADA CONSORCIADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926750913

(415)7707212489984(8020) 000001492675091 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO ITEC EL CAUCHAL

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO

42. Correo electrónico consorcioitecelcauchal@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4 | 3 0 0 6 1 5 1 4 2 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA DUSSAN MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 2 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 7 8 5 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 4 1 1 1 7 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 1 1 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 1 1 1 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 9 8 1 0 5 9 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | JURADO | YENIFER | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 3 5 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 4 5 0 7 1 0 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: EC CONSULTORIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 5 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: ESTUTEC S A S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 6 1 1 8 9 | | 6 9 0 0 7 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAVE | CADAVID | LUIS | ORLANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 1 2 2 9 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166604615

(415)7707212489984(8020) 000014116660461 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | FERDINCO SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 1 SUR 2 96 BRR PORTAL

42. Correo electrónico ferdincosas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 3 3 5 2 9 4 7 | 3 1 1 5 0 8 7 1 4 7 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 5 0 7 1 5 | 0 1 6 1 | 2 0 2 1 0 1 0 5 | 7 7 1 0 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166604615

(415)7707212489984(8020) **000014116660461 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 5 0 7 1 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 5 0 7 2 3 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 5 9 5 9 8 7 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 5 0 7 1 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 4 0 5 3 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166604615

(415)7707212489984(8020) 000014116660461 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 9 2 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 2 3 5 7 3 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | HECTOR | DAVID |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 5 0 7 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 0 5 7 3 1 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | ELISA | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166604615

(415)7707212489984(8020) **000014116660461 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 6 6 2 1 9 6 0 | 8 | 2 7 6 9 2 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | MURCIA | ALBA | LUCIA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141175955848

(415)7707212489984(8020) 000014117595584 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES

42. Correo electrónico citecoficinacentral@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 3 0 3 2 2 | 4 9 2 1 | 2 0 2 3 0 6 3 0 | 7 7 1 0 | 7 7 3 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 3 8 2 | 4 4 9 |
| 73. Fecha | 1 9 7 6 0 4 0 8 | 1 9 9 5 0 2 0 3 |
| 74. Número de notaría | 1 6 | 7 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 7 6 0 5 1 0 | 1 9 9 5 0 2 1 3 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 7 4 1 1 9 | 7 4 1 1 9 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 0 0 1 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 1 9 7 6 0 5 1 0 |
| 81. Hasta | 2 0 3 0 1 2 3 1 |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 5 1 8 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 1 9 8 2 0 3 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 4 2 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 9 9 6 8 6 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | ANDRADE | MARIAJOSE | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 0 1 9 7 6 0 5 1 0 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 6 1 1 8 9 | | 6 9 0 0 7 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAVE | CADAVID | LUIS | ORLANDO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 4 1 4

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento:

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 2 0 9 9 4 9 6 9 | | 1 3 5 5 4 9 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARIAS | GIRALDO | ALBA | LUCIA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 1 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969663968

(415)7707212489984(8020) 000001496966396 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ESTUTEC S A S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES

42. Correo electrónico estutecsas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 6 0 4 0 6 | 4 1 1 2 | 2 0 1 6 0 4 0 6 | 7 7 1 0 4 9 2 1 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20) | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA DUSSAN MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969663968

(415)7707212489984(8020) **000001496966396 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 6 0 4 0 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6 0 5 0 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 2 6 8 4 5 7 9 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 6 0 4 0 6 |
| 81. Hasta | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 6 0 5 0 6 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14969663968

(415)7707212489984(8020) **000001496966396 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 5 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 6 0 5 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 8 6 5 0 8 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | ANDRADE | ANA | MARIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969663968

(415)7707212489984(8020) **000001496966396 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 6 1 1 8 9 | | 6 9 0 0 7 - T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAVE | CADAVID | LUIS | ORLANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 6 0 4 0 6 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# PAGOS DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NIT: 901.550.980-0

## CONTRATO 2252 DE 2021

## INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

### NOMINA PARA EL PAGO EMPLEADOS
### PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

| NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEVENGADO | | | | | DEDUCCIONES | | | NETO PAGADO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIO BÁSICO | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | DEDICACIÓN MENSUAL | SALARIO DEVENGADO | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | APORTES SALUD | APORTES PENSIÓN | TOTAL DEDUCCIONES | | |
| GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14.139.339 | DIRECTOR | $ 5.900.000 | $ - | 0,33 | $ 1.947.000 | $ - | $ 77.900 | $ 77.900 | $ 155.800 | $ 1.791.200 | |
| PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA | 18.468.702 | INGENIERO RESIDENTE | $ 4.000.000 | $ - | 0,13 | $ 520.000 | $ - | $ 20.800 | $ 20.800 | $ 41.600 | $ 478.400 | |
| IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN | 88.244.403 | INGENIERO RESIDENTE | $ 4.000.000 | $ - | 0,33 | $ 1.320.000 | $ - | $ 52.800 | $ 52.800 | $ 105.600 | $ 1.214.400 | |
| NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ | 1.070.009.699 | INGENIERO RESIDENTE | $ 4.000.000 | $ - | 1,00 | $ 4.000.000 | $ - | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 320.000 | $ 3.680.000 | |
| SERGIO NARVAEZ RANGEL | 1.060.596.262 | INSPECTOR | $ 1.800.000 | $ 200.000 | 0,13 | $ 234.000 | $ 26.000 | $ 9.400 | $ 9.400 | $ 18.800 | $ 241.200 | |
| CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO | 1.005.691.155 | INSPECTOR | $ 1.800.000 | $ 200.000 | 1,00 | $ 1.800.000 | $ 200.000 | $ 72.000 | $ 72.000 | $ 144.000 | $ 1.856.000 | |
| JESUS ANDRES CHAPID PINILLA | 1.110.601.980 | INSPECTOR | $ 1.800.000 | $ 200.000 | 1,00 | $ 1.800.000 | $ 200.000 | $ 72.000 | $ 72.000 | $ 144.000 | $ 1.856.000 | |
| YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | 1.052.398.024 | INGENIERA AUXILIAR ADMON | $ 2.600.000 | $ 200.000 | 1,00 | $ 2.600.000 | $ 200.000 | $ 104.000 | $ 104.000 | $ 208.000 | $ 2.592.000 | |
| **TOTAL** | | | **$ 25.900.000** | **$ 800.000** | | **$ 14.221.000** | **$ 626.000** | **$ 568.900** | **$ 568.900** | **$ 1.137.800** | **$ 13.709.200** | |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,33

**NOMBRE:** GERSON POLOCHE MOSQUERA

**CEDULA NUMERO:** 14.139.339

**CARGO:** DIRECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.947.000 | SALUD | 77.900 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 77.900 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 1.947.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 155.800** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.791.200**

**SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

C.C. 14.139.339

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-14139339 |
| NOMBRE EMPLEADO | GERSON  POLOCHE MOSQUERA |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.655.000 | 0,1600000 | $ 424.800 | $ 0 | $ 0 | $ 424.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.655.000 | 0,0400000 | $ 106.200 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.655.000 | 0,0696000 | $ 184.800 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.655.000 | 0,0400000 | $ 106.200 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 424.800 | $ 106.200 | $ 184.800 | $ 106.200 | $ 822.000 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,13

**NOMBRE:** PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA

**CEDULA NUMERO:** 18.468.702

**CARGO:** INGENIERO RESIDENTE

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 520.000 | SALUD | 20.800 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 20.800 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 520.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 41.600** |

***NETO A PAGAR*** **$ 478.400**

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

C.C. 18.468.702

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-18468702 |
| NOMBRE EMPLEADO | PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | 2025-08-27 |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 27/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 4 | 533.334 | 0,1600000 | $ 85.400 | $ 0 | $ 0 | $ 85.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 4 | 533.334 | 0,0400000 | $ 21.400 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 533.334 | 0,0696000 | $ 37.200 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 4 | 533.334 | 0,0400000 | $ 21.400 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 85.400 | $ 21.400 | $ 37.200 | $ 21.400 | $ 165.400 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,33

**NOMBRE:** IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN **CEDULA NUMERO:** 88.244.403

**CARGO:** INGENIERO RESIDENTE

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.320.000 | SALUD | 52.800 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 52.800 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 1.320.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 105.600** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.214.400**

**SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

C.C. 88.244.403

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-88244403 |
| NOMBRE EMPLEADO | IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | 2025-08-15 |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | 15/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 15 | 2.000.000 | 0,1600000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 15 | 2.000.000 | 0,0400000 | $ 80.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.000.000 | 0,0696000 | $ 139.200 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 15 | 2.000.000 | 0,0400000 | $ 80.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 320.000 | $ 80.000 | $ 139.200 | $ 80.000 | $ 619.200 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 1,00

**NOMBRE:** NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ **CEDULA NUMERO:** 1.070.009.699

**CARGO:** INGENIERO RESIDENTE

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4.000.000 | SALUD | 160.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 160.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 4.000.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 320.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 3.680.000**

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Natalia Arcos G

C.C. 1.070.009.699

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1070009699 |
| NOMBRE EMPLEADO | NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ |
| EPS | ALIANSALUD EPS S.A. |
| AFP | PROTECCION (ING+PROTECCION) |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 4.000.000 | 0,1600000 | $ 640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 4.000.000 | 0,0400000 | $ 160.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.000.000 | 0,0696000 | $ 278.400 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 4.000.000 | 0,0400000 | $ 160.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 640.000 | $ 160.000 | $ 278.400 | $ 160.000 | $ 1.238.400 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2022**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,13

**NOMBRE:** SERGIO NARVAEZ RANGEL **CEDULA NUMERO:** 1.060.596.262

**CARGO:** INSPECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 234.000 | SALUD | 9.400 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 26.000 | PENSION | 9.400 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 260.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 18.800** |

***NETO A PAGAR*** **$ 241.200**

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Sergio Narvaez

C.C. 1.060.596.262

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1060596262 |
| NOMBRE EMPLEADO | SERGIO  NARVAEZ RANGEL |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | 2025-08-27 |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 27/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 4 | 240.000 | 0,1600000 | $ 38.400 | $ 0 | $ 0 | $ 38.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 4 | 240.000 | 0,0400000 | $ 9.600 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 240.000 | 0,0696000 | $ 16.800 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 4 | 240.000 | 0,0400000 | $ 9.600 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 38.400 | $ 9.600 | $ 16.800 | $ 9.600 | $ 74.400 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2022**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 1,00

**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO

**CEDULA NUMERO:** 1.005.691.155

**CARGO:** INSPECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.800.000 | SALUD | 72.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 200.000 | PENSION | 72.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 2.000.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 144.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.856.000**

**SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Carlos Navarrete

C.C. 1.005.691.155

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1005691155 |
| NOMBRE EMPLEADO | CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 1.800.000 | 0,1600000 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.800.000 | 0,0696000 | $ 125.300 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 288.000 | $ 72.000 | $ 125.300 | $ 72.000 | $ 557.300 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 1,00

**NOMBRE:** JESUS ANDRES CHAPID PINILLA **CEDULA NUMERO:** 1.110.601.980

**CARGO:** INSPECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.800.000 | SALUD | 72.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 200.000 | PENSION | 72.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 2.000.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 144.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.856.000**

**SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Jesús Chapid P.

C.C. 1.110.601.980

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1110601980 |
| NOMBRE EMPLEADO | JESUS ANDRES CHAPID PINILLA |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 1.800.000 | 0,1600000 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.800.000 | 0,0696000 | $ 125.300 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 288.000 | $ 72.000 | $ 125.300 | $ 72.000 | $ 557.300 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2022**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 | | |
| **DECIDACIÓN MENSUAL** | 1,00 | | |
| **NOMBRE:** | YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | **CEDULA NUMERO:** | 1.052.398.024 |
| **CARGO:** | INGENIERA AUXILIAR ADMON | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.600.000 | SALUD | 104.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 200.000 | PENSION | 104.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 2.800.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 208.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 2.592.000**

**SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE**

}
RECIBI CONFORME

Yomara Beatriz Hernández C.
C.C. 1.052.398.024

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1052398024 |
| NOMBRE EMPLEADO | YOMARA BEATRIZ HERNANDEZ CEPEDA |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792796 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.600.000 | 0,1600000 | $ 416.000 | $ 0 | $ 0 | $ 416.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.600.000 | 0,0400000 | $ 104.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.600.000 | 0,0696000 | $ 181.000 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.600.000 | 0,0400000 | $ 104.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 416.000 | $ 104.000 | $ 181.000 | $ 104.000 | $ 805.000 |

# CUENTA DE COBRO PROFESIONAL AMBIENTAL

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA N° 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: $ 3.555.000,00

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Prestación de Servicios como profesional ambiental de Interventoría, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto 2025, con una dedicación del 0.90 H/M.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Neiva, Huila; 31 de agosto de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**BELEN ALEXANDRA CERÓN QUINTERO**

**LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 3.555.000,00) M/CTE,** Por concepto de prestación de servicios como Profesional Ambiental de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indígena - CRIDEC - (Enmarcado en el programa Colombia Rural)"*, en el Departamento de Caldas, en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2025 con una dedicación del 0.90 H/M.

Atentamente,

**Belén Alexandra Cerón Quintero.**
Profesional Ambiental
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 55058814 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 67 1A-57 RIVIERA NORTE 2 | TELÉFONO: | 3118182 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 02 - AEROPUERTO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7981371016** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/09/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1741594530 |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 800.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 800.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 625.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 625.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 26.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 26.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.451.100** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.451.100** |

Planilla Pagada

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-55058814 |
| NOMBRE EMPLEADO | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO |
| EPS | Sin EPS |
| AFP | Sin AFP |
| CAJA COMPENSACIÓN | Sin CCF |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792880 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | Y |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-08 |
| TIPO COTIZANTE | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.423.500 | 0,0696000 | $ 99.100 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 99.100 | $ 0 | $ 99.100 |

**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA – COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.**
**PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

El 12 de agosto de 2025, se participó en comité ambiental, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON, Director Territorial INVIAS Caldas, liderada por la Ingeniera Luz Liliana Tibata Castelblanco, Gestora del área técnica del INVIAS.

La reunión se llevó a cabo con el acompañamiento de los directores de los CONSORCIOS CVC 2024, OBRAS DP, MAIC e INNOVA SAS y, profesionales ambientales y sociales.

De parte de la Interventoría, las especialistas ambiental y social.

De parte del INVIAS Bogotá, la Dra. Marcela Pereira gestora social y la Ingeniera Juanita González gestora ambiental, recientemente asignadas a la obra.

- En la reunión se expuso el contexto de la ejecución de los contratistas y, el estado de incumplimiento de los contratistas, en la presentación del documento PAGA de la obra, a pesar de que las profesionales social y ambiental de la interventoría, las han orientado en promedio 5 mesas de trabajo y se ha entregado un paso a paso para la elaboración del documento PAGA, en el marco de la normatividad ambiental vigente y la GMAMC 2022 del INVIAS.
- Otro de los problemas que informó la interventoría, ha sido, la variación de los profesionales que asisten a las reuniones, son diferentes y no hay un responsable de los documentos PAGA.
- El contratista manifiesto tener inconformismo con las observaciones de la interventoría, máxime cuando informan tener inconvenientes con la información del área social, porque los lideres cabildantes de los resguardos no les facilitan información y dificulta la elaboración del componente social.
- La Gestora Técnica Ingeniera Luz Liliana Tibata, solicitó el acompañamiento de las gestoras ambiental y social del INVIAS, en reunión individual con cada contratista y ellas hicieran acompañamiento al trabajo realizado por la interventoría e hicieran sus aportes al proceso con el fin de agilizar la entrega del documento PAGA, de parte de los contratistas.

Como compromisos, quedaron concertadas las reuniones con las gestoras ambiental y social del Invias Bogotá con contratista e interventoría simultaneas, área ambiental y social, relacionadas de la siguiente manera: jueves 14 agosto INNOVA SAS 10 am, martes 19 agosto 10 am CONSORCIO MAIC, miércoles 20 agosto 10 am CONSORCIO VIAS CALDAS 2024 y, jueves 21 agosto 2:30 pm OBRAS DP.

las gestoras ambiental y social de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, al conocer el estado actual del documento PAGA y a dinámica del incumplimiento durante la ejecución contractual, como conclusión general de las reuniones realizadas con los contratistas se estableció que la interventoría ha obrado de conformidad con el Manual de Interventoría y la normatividad ambiental vigente, la Ingeniera Juanita González, informó que, la Doctora Marcela Bermeo escribió a la Gestora Técnica que no asistirían más, a las reuniones solicitadas, hasta que el documento PAGA sea aprobado por la Interventoría, en el marco de sus funciones y la normativa vigente, ya que no hay

documento PAGA terminado para poder pronunciarse como entidad contratante acorde a la normativa vigente del INVIAS y, el contratista y, previas aclaraciones y orientaciones de las profesionales ambiental y social de la interventoría adquirieron el compromiso de entrega del documento PAGA, INNOVA SAS para el 2 de septiembre de 2025, CONSORCIO MAIC, para el 5 de septiembre de 2025, CONSORCIO VIAS CALDAS 2024 para el 5 de septiembre de 2025, y, CONDORCIO OBRAS DP para el 10 de septiembre de 2025.

**SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL POR CONTRATISTA:**

**CONTRATISTA INNOVA SAS:**

La obra termino su plazo de ejecución contractual, al 20 de diciembre de 2024, quedando con los siguientes pasivos ambientales:

.- Los documentos PAGA V5 elaborados para los municipios de Risaralda, Belalcázar y Neira por el contratista, no han sido elaborados con la suficiencia y complementación que la Guía de Manejo Ambiental INVIAS 2022 Modo Carretero y la normativa vigente exige, por tanto no fueron aprobados por la Interventoría.

.- El contratista debe subsanar los tres documentos PAGA a una Versión 6, para la liquidación del contrato, para cada resguardo.

.- Así mismo, Está pendiente la elaboración de los informes ambientales y sociales mensuales y el Informe de balance ambiental a la terminación del contrato de obra, debidamente soportado, bajo los lineamientos del Manual de interventoría del INVIAS vigente.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-323 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto del 2025, se llevó a cabo la reunión concertada, el jueves 14 agosto con el contratista INNOVA SAS, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA el 2 de septiembre de 2025 con verificación de las partes a las 9 am, revisando los tres documentos PAGA en su última versión presentada, para los frentes Albania, Totumal y damasco, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el Oficio INV-CIC-2252-2021-290 del 19 de noviembre de 2025, tomará la lista de chequeo de las observaciones e incluirá una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento y, se incluirían las Actas de radicación ambiental y social diligenciadas y con anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental y social con presupuesto - cero.

.- Por solicitud del contratista, la interventoría remitió el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contratos de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- La interventoría abrió el espacio para orientar al contratista, en el tema de los informes ambientales, llevando el contratista un informe preliminar para aclarar dudas e inquietudes, para el martes 19 de agosto 2 pm, situación que no se dio, porque la profesional ambiental del contratista informó una situación familiar que le impidió asistir, quedando al cierre del periodo, la nueva fecha de parte del contratista.

.- El 14 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 19 de agosto de 2025.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

**CONSORCIO MAIC**

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-027 del 7 de agosto de 2025, apremio de presentación del documento PAGA Versión No. 3 - en reiteración atención observaciones oficio No. INV-CIC-2252-2021-L2R-024 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-028 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto del 2025, se llevó a cabo la reunión concertada, el martes 19 agosto con el CONSORCIO MAIC contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA, el 5 de septiembre de 2025, transcurridos 6,7 meses de ejecución contractual, ajustando el documento PAGA en su última versión presentada, INV-CIC-2252-2021-L2R-010 del 22/11/2024, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

.- Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contratos de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- Según lo concertado, para revisión y orientación del estado de avance del PAGA, se realizaron dos mesas de trabajo los días 19 y 21 de agosto de 2025, donde se trabajo en la identificación del nivel de complejidad de la obra y, adicional a la profesional ambiental, con el acompañamiento del profesional SIG del contratista, se explicó a detalle, como debe ir la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS, acorde a la GMAMC 2022, atendiendo las dudas e inquietudes.

.- El 19 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

**CONSORCIO CVC2024**

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025, se realizó revisión de documentos minero ambientales, de la Cantera LA FELISSA, proveedor propuesto por el CONSORCIO CVC 2024, con requerimiento de observaciones complementarias, recordando al contratista que, los permisos de la obra, deben ser presentados como anexos del documento PAGA, elaborado para cada frente de obra, No individuales. A la fecha del cierre del periodo, continua sin respuesta.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-042 del 5 de agosto de 2025m se realizó reiteración con apremio presentación del PAGA V3 – en atención al oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 DEL 06/02/2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-043 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo la reunión el miércoles 20 agosto con el CONSORCIO MAIC contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA V3, por resguardo, el 5 de septiembre de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

.- Durante la reunión, por solicitud del contratista, se indicó en forma general el contenido de los capítulos de GMAMC 2022 y, a nivel de detalle, la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS. atendiendo las dudas e inquietudes.

.- Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió: Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022, compilada por las especialistas de la Interventoría, el formato el Manual de interventoría del INVIAS vigente, los formatos ambientales, el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra, con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- El 24 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-052 del 25 de agosto de 2025, se dio alcance a la reunión del 21 de agosto de 2025, con el fin de informar a los contratistas, la disponibilidad de colaboración del Coordinador Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, quien, en la reunión con el CONCORCIO CVC 2024, aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, expedida por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual manifestó igualmente, que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores y, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral e, igualmente, También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

**CONSORCIO OBRAS DP**

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025, se realizó revisión de documentos minero ambientales, del Señor ALVARO GOMEZ BOTERO, proveedor propuesto por el CONSORCIO OBRAS DP, con requerimiento de observaciones complementarias, recordando al contratista que, los permisos de la obra, deben ser presentados como anexos del documento PAGA, elaborado para cada frente de obra, No individuales. A la fecha del cierre del periodo, continua sin respuesta.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-018 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo la reunión el jueves 21 agosto, el CONSORCIO OBRAS DP contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA V2, por resguardo, el 5 de septiembre de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

.- Durante la reunión, por solicitud del contratista, se indicó en forma general el contenido de los capítulos de GMAMC 2022 y, a nivel de detalle, la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS. atendiendo las dudas e inquietudes.

.- Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió: una Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022, compilada por las especialistas de la Interventoría, el formato el Manual de interventoría del INVIAS vigente, los formatos ambientales, el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra, con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- El 24 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-021 del 26 de agosto de 2025, se dio alcance a la reunión del 21 de agosto de 2025, con el fin de informar a los contratistas, la disponibilidad de colaboración del Coordinador Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, quien, en la reunión con el CONCORCIO CVC 2024, aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual manifestó igualmente, que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores y, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral e, igualmente, También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

Atte,

BELÉN ALEXANDRA CERON Q.
Esp Ambiental

YINNA A. BEDOYA ROMERO
Esp Social

# CUENTA DE COBRO PROFESIONAL SOCIAL

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA N° 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: $ 2.370.000,00

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Prestación de Servicios como profesional Social de Interventoría, en el periodo comprendido entre el 01 al 12 de febrero 2025, con una dedicación del 0.60 H/M.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ricuarte, Tolima; 31 de agosto de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO**

**LA SUMA DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.370.000,00) M/CTE,** Por concepto de prestación de servicios como Profesional Social de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indígena - CRIDEC - (Enmarcado en el programa Colombia Rural)"*, en el Departamento de Caldas, en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2025 con una dedicación del 0.60 H/M.

Atentamente,



**Yinna Andrea Bedoya Romero.**
Profesional Social
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52906496 | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | Condominio Alto Magdalena | 6018378879 | TRATEMOS@YAHOO.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | RICAURTE | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-07 | I | 26/08/2025 | 88457130 | $440.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 34.700 | | | | 34.700 | 0 | 0 | 34.700 | | | 347 | 34.700 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 34.700 | 34.700 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 440.500 | 440.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 52906496 | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | | Condominio Alto Magdalena | 6018378879 | TRATEMOS@YAHOO.COM |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | RICAURTE | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-07 | I | 26/08/2025 | 88457130 | $440.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52906496 | BEDOYA ROMERO YINNA ANDREA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 178.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-09-23 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-52906496 |
| NOMBRE EMPLEADO | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO |
| EPS | Sin EPS |
| AFP | Sin AFP |
| CAJA COMPENSACIÓN | Sin CCF |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 34792880 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | Y |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD | 2025-08 |
| TIPO COTIZANTE | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | 2025-08-01 |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.423.500 | 0,0696000 | $ 99.100 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 99.100 | $ 0 | $ 99.100 |

**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA – COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.**
**PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

El 12 de agosto de 2025, se participó en comité ambiental, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON, Director Territorial INVIAS Caldas, liderada por la Ingeniera Luz Liliana Tibata Castelblanco, Gestora del área técnica del INVIAS.

La reunión se llevó a cabo con el acompañamiento de los directores de los CONSORCIOS CVC 2024, OBRAS DP, MAIC e INNOVA SAS y, profesionales ambientales y sociales.

De parte de la Interventoría, las especialistas ambiental y social.

De parte del INVIAS Bogotá, la Dra. Marcela Pereira gestora social y la Ingeniera Juanita González gestora ambiental, recientemente asignadas a la obra.

- En la reunión se expuso el contexto de la ejecución de los contratistas y, el estado de incumplimiento de los contratistas, en la presentación del documento PAGA de la obra, a pesar de que las profesionales social y ambiental de la interventoría, las han orientado en promedio 5 mesas de trabajo y se ha entregado un paso a paso para la elaboración del documento PAGA, en el marco de la normatividad ambiental vigente y la GMAMC 2022 del INVIAS.
- Otro de los problemas que informó la interventoría, ha sido, la variación de los profesionales que asisten a las reuniones, son diferentes y no hay un responsable de los documentos PAGA.
- El contratista manifiesto tener inconformismo con las observaciones de la interventoría, máxime cuando informan tener inconvenientes con la información del área social, porque los lideres cabildantes de los resguardos no les facilitan información y dificulta la elaboración del componente social.
- La Gestora Técnica Ingeniera Luz Liliana Tibata, solicitó el acompañamiento de las gestoras ambiental y social del INVIAS, en reunión individual con cada contratista y ellas hicieran acompañamiento al trabajo realizado por la interventoría e hicieran sus aportes al proceso con el fin de agilizar la entrega del documento PAGA, de parte de los contratistas.

Como compromisos, quedaron concertadas las reuniones con las gestoras ambiental y social del Invias Bogotá con contratista e interventoría simultaneas, área ambiental y social, relacionadas de la siguiente manera: jueves 14 agosto INNOVA SAS 10 am, martes 19 agosto 10 am CONSORCIO MAIC, miércoles 20 agosto 10 am CONSORCIO VIAS CALDAS 2024 y, jueves 21 agosto 2:30 pm OBRAS DP.

las gestoras ambiental y social de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, al conocer el estado actual del documento PAGA y a dinámica del incumplimiento durante la ejecución contractual, como conclusión general de las reuniones realizadas con los contratistas se estableció que la interventoría ha obrado de conformidad con el Manual de Interventoría y la normatividad ambiental vigente, la Ingeniera Juanita González, informó que, la Doctora Marcela Bermeo escribió a la Gestora Técnica que no asistirían más, a las reuniones solicitadas, hasta que el documento PAGA sea aprobado por la Interventoría, en el marco de sus funciones y la normativa vigente, ya que no hay

documento PAGA terminado para poder pronunciarse como entidad contratante acorde a la normativa vigente del INVIAS y, el contratista y, previas aclaraciones y orientaciones de las profesionales ambiental y social de la interventoría adquirieron el compromiso de entrega del documento PAGA, INNOVA SAS para el 2 de septiembre de 2025, CONSORCIO MAIC, para el 5 de septiembre de 2025, CONSORCIO VIAS CALDAS 2024 para el 5 de septiembre de 2025, y, CONDORCIO OBRAS DP para el 10 de septiembre de 2025.

**SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL POR CONTRATISTA:**

**CONTRATISTA INNOVA SAS:**

La obra termino su plazo de ejecución contractual, al 20 de diciembre de 2024, quedando con los siguientes pasivos ambientales:

.- Los documentos PAGA V5 elaborados para los municipios de Risaralda, Belalcázar y Neira por el contratista, no han sido elaborados con la suficiencia y complementación que la Guía de Manejo Ambiental INVIAS 2022 Modo Carretero y la normativa vigente exige, por tanto no fueron aprobados por la Interventoría.

.- El contratista debe subsanar los tres documentos PAGA a una Versión 6, para la liquidación del contrato, para cada resguardo.

.- Así mismo, Está pendiente la elaboración de los informes ambientales y sociales mensuales y el Informe de balance ambiental a la terminación del contrato de obra, debidamente soportado, bajo los lineamientos del Manual de interventoría del INVIAS vigente.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-323 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto del 2025, se llevó a cabo la reunión concertada, el jueves 14 agosto con el contratista INNOVA SAS, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA el 2 de septiembre de 2025 con verificación de las partes a las 9 am, revisando los tres documentos PAGA en su última versión presentada, para los frentes Albania, Totumal y damasco, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el Oficio INV-CIC-2252-2021-290 del 19 de noviembre de 2025, tomará la lista de chequeo de las observaciones e incluirá una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento y, se incluirían las Actas de radicación ambiental y social diligenciadas y con anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental y social con presupuesto - cero.

.- Por solicitud del contratista, la interventoría remitió el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contratos de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- La interventoría abrió el espacio para orientar al contratista, en el tema de los informes ambientales, llevando el contratista un informe preliminar para aclarar dudas e inquietudes, para el martes 19 de agosto 2 pm, situación que no se dio, porque la profesional ambiental del contratista informó una situación familiar que le impidió asistir, quedando al cierre del periodo, la nueva fecha de parte del contratista.

.- El 14 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 19 de agosto de 2025.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

**CONSORCIO MAIC**

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-027 del 7 de agosto de 2025, apremio de presentación del documento PAGA Versión No. 3 - en reiteración atención observaciones oficio No. INV-CIC-2252-2021-L2R-024 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-028 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto del 2025, se llevó a cabo la reunión concertada, el martes 19 agosto con el CONSORCIO MAIC contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA, el 5 de septiembre de 2025, transcurridos 6,7 meses de ejecución contractual, ajustando el documento PAGA en su última versión presentada, INV-CIC-2252-2021-L2R-010 del 22/11/2024, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

.- Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contratos de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- Según lo concertado, para revisión y orientación del estado de avance del PAGA, se realizaron dos mesas de trabajo los días 19 y 21 de agosto de 2025, donde se trabajo en la identificación del nivel de complejidad de la obra y, adicional a la profesional ambiental, con el acompañamiento del profesional SIG del contratista, se explicó a detalle, como debe ir la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS, acorde a la GMAMC 2022, atendiendo las dudas e inquietudes.

.- El 19 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

**CONSORCIO CVC2024**

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025, se realizó revisión de documentos minero ambientales, de la Cantera LA FELISSA, proveedor propuesto por el CONSORCIO CVC 2024, con requerimiento de observaciones complementarias, recordando al contratista que, los permisos de la obra, deben ser presentados como anexos del documento PAGA, elaborado para cada frente de obra, No individuales. A la fecha del cierre del periodo, continua sin respuesta.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-042 del 5 de agosto de 2025m se realizó reiteración con apremio presentación del PAGA V3 – en atención al oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 DEL 06/02/2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-043 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo la reunión el miércoles 20 agosto con el CONSORCIO MAIC contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA V3, por resguardo, el 5 de septiembre de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

.- Durante la reunión, por solicitud del contratista, se indicó en forma general el contenido de los capítulos de GMAMC 2022 y, a nivel de detalle, la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS. atendiendo las dudas e inquietudes.

.- Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió: Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022, compilada por las especialistas de la Interventoría, el formato el Manual de interventoría del INVIAS vigente, los formatos ambientales, el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra, con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- El 24 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-052 del 25 de agosto de 2025, se dio alcance a la reunión del 21 de agosto de 2025, con el fin de informar a los contratistas, la disponibilidad de colaboración del Coordinador Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, quien, en la reunión con el CONCORCIO CVC 2024, aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, expedida por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual manifestó igualmente, que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores y, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral e, igualmente, También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

**CONSORCIO OBRAS DP**

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025, se realizó revisión de documentos minero ambientales, del Señor ALVARO GOMEZ BOTERO, proveedor propuesto por el CONSORCIO OBRAS DP, con requerimiento de observaciones complementarias, recordando al contratista que, los permisos de la obra, deben ser presentados como anexos del documento PAGA, elaborado para cada frente de obra, No individuales. A la fecha del cierre del periodo, continua sin respuesta.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-018 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

.- En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo la reunión el jueves 21 agosto, el CONSORCIO OBRAS DP contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA V2, por resguardo, el 5 de septiembre de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

.- Durante la reunión, por solicitud del contratista, se indicó en forma general el contenido de los capítulos de GMAMC 2022 y, a nivel de detalle, la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS. atendiendo las dudas e inquietudes.

.- Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió: una Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022, compilada por las especialistas de la Interventoría, el formato el Manual de interventoría del INVIAS vigente, los formatos ambientales, el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra, con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

.- El 24 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-021 del 26 de agosto de 2025, se dio alcance a la reunión del 21 de agosto de 2025, con el fin de informar a los contratistas, la disponibilidad de colaboración del Coordinador Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, quien, en la reunión con el CONCORCIO CVC 2024, aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual manifestó igualmente, que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores y, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral e, igualmente, También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

.- Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

Atte,

BELÉN ALEXANDRA CERON Q.
Esp Ambiental

YINNA A. BEDOYA ROMERO
Esp Social

# VIÁTICOS DIRECTOR Y ESPECIALISTAS

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 1.350.000,00

Son: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENA MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Viáticos del director para el desplazamiento a la zona del proyecto del contrato de obra en los municipios de Riosucio, Supia y Anserma (Caldas) los días 04, 05, 06, 07, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025. Viáticos para la participación de la reunión del 12 de agosto de 2025, en el marco del desarrollo del contrato de interventoría en el contrato No. 2252-2021

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ibagué, Tolima; 31 de agosto de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**GERSON POLOCHE MOSQUERA**

**LA SUMA DE MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 1.200.0000) M/CTE,** Por concepto de viáticos para el desplazamientos a la zona del proyecto del contrato de obra en los municipios de Riosucio, Supia y Anserma (Caldas) los días 04, 05, 06, 07, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" GRUPO 2"*

Atentamente,

**GERSON POLOCHE MOSQUERA.**
Director de Interventoría
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

Neiva, Huila; 31 de agosto de 2025

**CUENTA DE COBRO**

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**BELEN ALEXANDRA CERÓN QUINTERO**

**LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.0000) M/CTE,** Por concepto de viáticos para la participación de la reunión del 12 de agosto de 2025, en el marco del desarrollo del contrato de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" GRUPO 2"*

Atentamente,

Belén Alexandra Cerón Q

**Belén Alexandra Cerón Quintero.**
Profesional Ambiental
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

# ALQUILER CAMIONETAS

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0
Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca
Celular: 3134239264 – 3133352947
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: $ 4.900.000,00

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible), en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Supia, Caldas; 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT: 901.550.980-0**

DEBE A:

**CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**
**NIT: 860043881**

**LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE**
($ 4.900.000,00

**POR CONCEPTO DE:** Alquiler de camioneta marca Ssangyong, modelo 2012, Placa KOO918, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, para la interventoría Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."**

Firma: _____
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante legal: **CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**
Dirección: Calle 9 No. 0-100 casa 2 Sector el Hato – Barrio los Andes
Ciudad: Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 313 423 9264

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRIENDATARIO** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-1 |
| **DIRECCIÓN** | Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca<br>Cel: 313 429 264<br>consorcioceefcolombiarural@gmail.com |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | Contrato No. 2252-2021 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRENDADOR** | CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS |
| **NIT DEL ARRENDADOR** | 860.043.881 |
| **DIRECCIÓN DEL ARRENDADOR** | Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca<br>Cel: 313 429 264 |
| **PLACA DEL VEHÍCULO** | KOO918 |
| **MARCA DEL VEHÍCULO** | SSANGYONG |
| **LÍNEA DEL VEHÍCULO** | KORANDO |
| **MODELO DEL VEHÍCULO** | 2012 |
| **CARÁCTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO** | CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO |
| | COMBUSTIBLE: DIESEL |
| | CAPACIDAD (Kg/PSJ) 4 |
| **VALOR ARRIENDO VEHÍCULO** | $4´900.000.oo (Incluye conductor, peajes y combustible) |
| **VALOR EN LETRAS** | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (INCLUYE CONDUCTOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE) |
| **PERÍODO DE PAGO** | MENSUAL |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES** | 03 DE JULIO DE 2025 |
| **LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LABORES** | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO** | SUPIA |
| **TERMINO INICIAL DEL CONTRATO** | TRES (3) MESES |
| **VENCE EL DÍA** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

Entre **EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con Nit 901.550.980-1 y **EL ARRENDADOR CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS,** identificado con Nit: 860.043.881, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de vehículo automotor, regido además por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO** arrendar el vehículo de **EL ARRENDADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL ARRENDATARIO** el automotor de marca **SSANGYONG**; modelo **2012**, color **GRIS SABLE**; placa **KOO918** y con el tanque de combustible lleno, con rueda auxiliar y las herramientas que son equipo de norma de fabrica para el citado vehículo

y los correspondientes elementos de seguridad exigidos por las reglamentaciones en materia de tránsito vigente, todo lo cual es recibido por **EL ARRENDATARIO** de conformidad.

**SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL VEHÍCULO EL ARRENDATARIO** recibe el vehículo descrito en la **CLAUSULA PRIMERA** en perfecto estado de funcionamiento y con la carrocería, tapizado, accesorios tales como: radio para vehículo en buenas condiciones de uso.

**TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** por el alquiler del vehículo descrito en la **CLAUSULA PRIMERA**, el valor de **$4.900.000.oo (Cuatro Millones Novecientos Mil pesos Moneda Corriente que incluye conductor, peajes y combustible), pagadero Mensual.**

**PARÁGRAFO UNO**: Todos los costos correspondientes al vehículo automotor serán asumidos por **EL ARRENDEDOR**. Los costos de combustibles, peajes y ferri serán asumidos por **EL ARRENDATARIO** siempre y cuando se utilice en la zona del proyecto.

**CUARTA DEL CONTRATO.** El término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse de un contrato a término fijo inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente.

**QUINTA. USO. EL ARRENDATARIO** destinará el automóvil al transporte personal, en forma exclusiva, sin fines de lucro y dentro de la capacidad normal del vehículo y no podrá subarrendarlo, cederlo o disponer de el en alguna forma sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por **EL ARRENDADOR.**

**SEXTA RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES. EL ARRENDADOR** es enteramente responsable por cualquier daño causado por la motocicleta y para tal efecto deberá tener vigente el seguro obligatorio, pase, seguro todo riesgo y revisión técnico-mecánica.

**SEPTIMA. VENCIMIENTO DE PLAZO ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO** debe devolver el vehículo arrendado en forma inmediata en el mismo estado en que lo recibió y en el domicilio de **EL ARRENDADOR**

**OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES. EL ARRENDATARIO** es enteramente responsable mientras permanezca en la tenencia del automóvil de la guardia material y/o jurídica del mismo, debiendo resarcir al **EL ARRENDADOR** o a su compañía de seguros, los siguientes perjuicios: a) Por cualquier daño a la propiedad causado al o por el vehículo arrendado. b) Por los daños causados a terceras personas. c) Por los daños causados a personas y/o bienes transportados en el automóvil arrendado d) Por las violaciones que cometan o le imputen haber cometido contra los reglamentos de tránsito municipales, departamentales y/o estatales. e) Por el lucro cesante de **EL ARRENDADOR** resultante de la imposibilidad física y/o jurídica de afectación del vehículo al servicio del alquiler.

**NOVENA. COSTOS ADICIONALES. EL ARRENDATARIO** toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados al o por el vehículo objeto del arrendamiento, cualquiera fuera la índole del hecho, choque, vuelco, despeñamiento, incendio, robo, etc. este pago no exime al **ARRENDATARIO** de hacer frente a los gastos de recuperación o reparación del vehículo en el caso de los hechos imputables a su culpa y/o negligencia. En caso de cualquier accidente, EL **ARRENDATARIO** deberá dar aviso inmediato al **EL ARRENDADOR**, a la compañía de seguros y a las autoridades, no pudiendo exceder el lapso para hacerlo de las 24 horas de ocurrido el mismo.

**DECÍMA.** Le está totalmente prohibido al **ARRENDATARIO** conducir el automóvil arrendado en las siguientes condiciones: a) En estado de ebriedad, cuando esté bajo los efectos de calmantes, tranquilizantes o narcóticos. b) Sin licencia para conducir válida, expedida por las autoridades competentes y aceptada por las autoridades colombianas. c) En la violación de los reglamentos de tránsito respectivos. d) Permitiendo a personas menores de edad en algún momento, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia.


**DECÍMA PRIMERA. EL ARRENDATARIO** no podrá dedicar el automóvil arrendado a: a) Usos distintos a los estipulados en este contrato, ni al transporte de pasajeros u otro tipo de servicio público. b) Al transporte de cargas o bultos pesados o peligrosos. c) A labores peligrosas o ilícitas. d) A operaciones de remolque de cualquier clase. e) A conducirlos a lugares distintos de los estipulados por el contrato. f) A participar con él en carreras automovilísticas, pruebas de velocidad, regularidad, etc., o en certámenes de cualquier otro tipo, bajo ningún pretexto. g) No podrá tampoco conducir el automóvil por rutas o caminos que no hayan sido declarados como expeditos al tránsito por las autoridades competentes.

**DÉCIMA SEGUNDA EL ARRENDATARIO** se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al **ARRENDADOR** a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente.

**DÉCIMA TERCERA.** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en un ahoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**DÉCIMA CUARTA. EFECTOS.** El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato. Para constancia, firma **EL ARRENDADOR**, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Supia, Caldas – 03 de julio de 2025 |

| **EL ARRENDATARIO**<br>**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | **EL ARRENDADOR**<br>**CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS** |
|---|---|
|  |  |
| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|  |  |
| **C.C. N° 20.689.054** | **C.C. N° 1.070.016.999** |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180505076

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA TABIO

**NIT:** 901187289

**No. de Certificado de Acreditación:** 21-CDA-087

**Fecha de expedición:** 2025/03/29

**Fecha de vencimiento:** 2026/03/29

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | KOO918 | **CLASE:** | CAMPERO |
| **MARCA:** | SSANGYONG | **MODELO:** | 2012 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |
| **CILINDRAJE:** | 1998 | **NRO. MOTOR:** | 67195000506379 |
| **NRO. CHASIS:** | KPTA0B1SSCP006628 | **VIN:** | KPTA0B1SSCP006628 |
| **LÍNEA:** | KORANDO C | | |
| **COLOR:** | GRIS SABLE | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

JUAN CARLOS TELLEZ TAVERA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020644323

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| KOO918 | SSANGYONG | KORANDO C | 2012 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.998 | GRIS SABLE | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | WAGON | DIESEL | 4 |

NÚMERO DE MOTOR
67195000506379

REG
N

VIN
KPTA0B1SSCP006628

NÚMERO DE SERIE
KPTA0B1SSCP006628

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KPTA0B1SSCP006628

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSULTCRIA INGENIERIA ESTUDIOS EC Y OTRO

IDENTIFICACIÓN
NIT 860043881

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACION
882011000058559

I/E
I

FECHA IMPORT.
28/07/2011

PUERTAS
5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******


FECHA MATRICULA
04/02/2012

FECHA EXP. LIC. TTO
12/06/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO

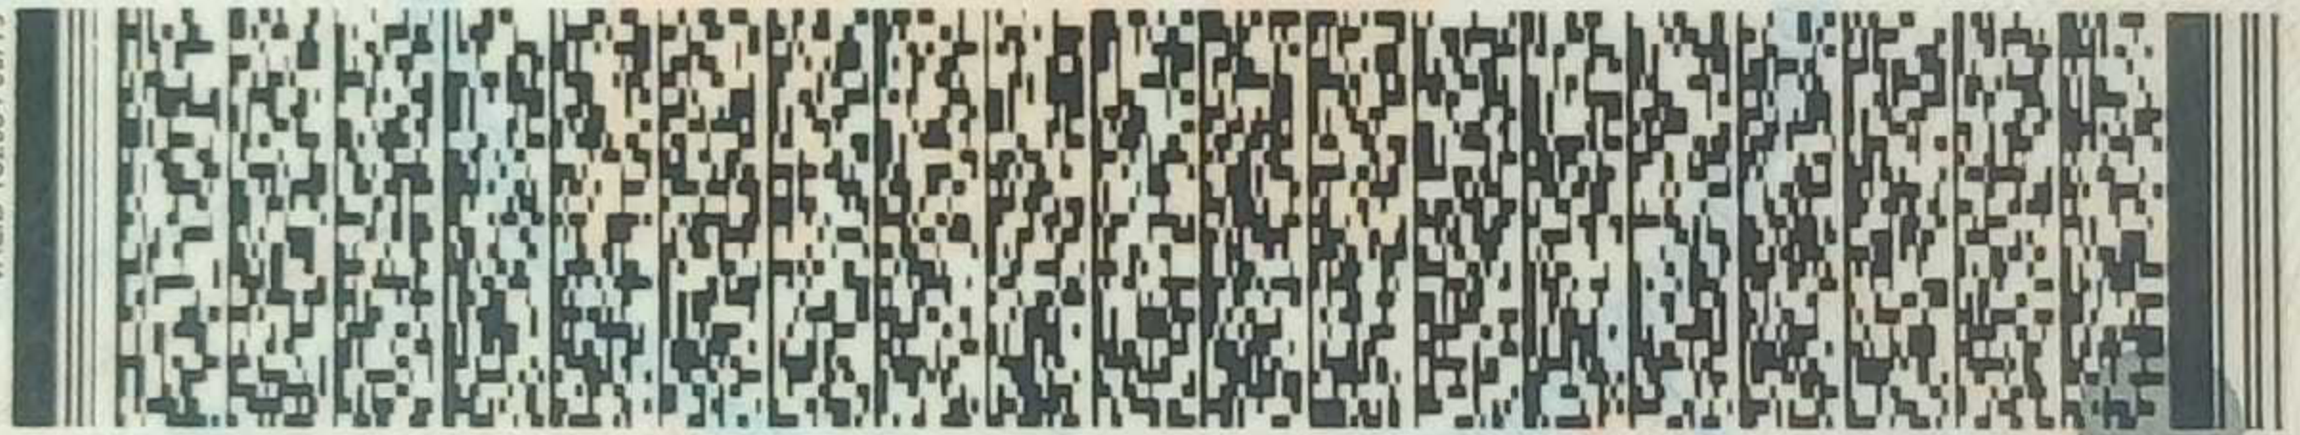

VALID 132634 09/19

LT06002878976

# ALQUILER DE MOTOCICLETAS

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 91.000,00

Son: NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Riosucio, Caldas; 31 de agosto de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**

**LA SUMA DE NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($ 91.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca HONDA, modelo 2016, placa YQY87D, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,

**PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRIENDATARIO** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-1 |
| **DIRECCIÓN** | Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca<br>Cel: 313 429 264<br>consorcioceefcolombiarural@gmail.com |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | Contrato No. 2252-2021 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRENDADOR** | PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA |
| **CEDULA DEL ARRENDADOR** | 18.468.702 |
| **PLACA DE LA MOTO** | YQY87D |
| **MARCA DE LA MOTO** | HONDA |
| **LÍNEA DE LA MOTO** | XRE300 |
| **MODELO DE LA MOTO** | 2016 |
| **CARÁCTERÍSTICAS DE LA MOTO** | CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA |
| | COMBUSTIBLE: GASOLINA |
| | CAPACIDAD (Kg/PSJ) 2 |
| **VALOR ARRIENDO MOTO** | $ 700.000,00 (Incluye combustible y SOAT) |
| **VALOR EN LETRAS** | SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT) |
| **PERÍODO DE PAGO** | MENSUAL |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES** | 27 DE AGOSTO DE 2025 |
| **LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LABORES** | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO** | SUPIA |
| **TERMINO INICIAL DEL CONTRATO** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **VENCE EL DÍA** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

Entre **EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con Nit 901.550.980-1 y **EL ARRENDADOR PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**, identificado con cedula: 18.468.702, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de VEHÍCULO motocicleta, regido además por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO** arrendar la MOTO de **EL ARRENDADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL ARRENDATARIO** la moto de marca **HONDA**; modelo **2016**, color **GRIS ONIX**; placa **YQY87D** y con el tanque de combustible lleno y las herramientas que son equipo de norma de fabrica para el citado VEHÍCULO y los correspondientes elementos de seguridad exigidos por las reglamentaciones en materia de tránsito vigente, todo lo cual es recibido por **EL ARRENDATARIO** de conformidad.

**SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL VEHÍCULO EL ARRENDATARIO** recibe la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA** en perfecto estado de funcionamiento y en buenas condiciones de uso.

**TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** por el alquiler de la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA**, el valor de **$700.000,00 (Setecientos mil pesos Moneda Corriente que incluye combustible y SOAT), pagadero Mensual.**

**PARÁGRAFO UNO**: Todos los costos correspondientes a la MOTO automotor serán asumidos por **EL ARRENDEDOR**. Los costos de combustibles, peajes y ferri serán asumidos por **EL ARRENDATARIO** siempre y cuando se utilice en la zona del proyecto.

**CUARTA DEL CONTRATO.** El término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse de un contrato a término fijo inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente.

**QUINTA. USO. EL ARRENDATARIO** destinará el automóvil al transporte personal, en forma exclusiva, sin fines de lucro y dentro de la capacidad normal de la MOTO y no podrá subarrendarlo, cederlo o disponer de el en alguna forma sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por **EL ARRENDADOR.**

**SEXTA RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES. EL ARRENDADOR** es enteramente responsable por cualquier daño causado por la motocicleta y para tal efecto deberá tener vigente el seguro obligatorio, pase, seguro todo riesgo y revisión técnico-mecánica.

**SEPTIMA. VENCIMIENTO DE PLAZO ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO** debe devolver la MOTO arrendada en forma inmediata en el mismo estado en que lo recibió y en el domicilio de **EL ARRENDADOR**

**OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES. EL ARRENDATARIO** es enteramente responsable mientras permanezca en la tenencia del automóvil de la guardia material y/o jurídica del mismo, debiendo resarcir al **EL ARRENDADOR** o a su compañía de seguros, los siguientes perjuicios: a) Por cualquier daño a la propiedad causado al o por el MOTO arrendado. b) Por los daños causados a terceras personas. c) Por los daños causados a personas y/o bienes transportados en el automóvil arrendado d) Por las violaciones que cometan o le imputen haber cometido contra los reglamentos de tránsito municipales, departamentales y/o estatales. e) Por el lucro cesante de **EL ARRENDADOR** resultante de la imposibilidad física y/o jurídica de afectación del MOTO al servicio del alquiler.

**NOVENA. COSTOS ADICIONALES. EL ARRENDATARIO** toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados al o por la MOTO objeto del arrendamiento, cualquiera fuera la índole del hecho, choque, vuelco, despeñamiento, incendio, robo, etc. este pago no exime al **ARRENDATARIO** de hacer frente a los gastos de recuperación o reparación de la MOTO en el caso de los hechos imputables a su culpa y/o negligencia. En caso de cualquier accidente, EL **ARRENDATARIO** deberá dar aviso inmediato al **EL ARRENDADOR**, a la compañía de seguros y a las autoridades, no pudiendo exceder el lapso para hacerlo de las 24 horas de ocurrido el mismo.

**DECÍMA.** Le está totalmente prohibido al **ARRENDATARIO** conducir el automóvil arrendado en las siguientes condiciones: a) En estado de ebriedad, cuando esté bajo los efectos de calmantes, tranquilizantes o narcóticos. b) Sin licencia para conducir válida, expedida por las autoridades competentes y aceptada por las autoridades colombianas. c) En la violación de los reglamentos de tránsito respectivos. d) Permitiendo a personas menores de edad en algún momento, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia.


**DECÍMA PRIMERA. EL ARRENDATARIO** no podrá dedicar el automóvil arrendado a: a) Usos distintos a los estipulados en este contrato, ni al transporte de pasajeros u otro tipo de servicio público. b) Al transporte de cargas o bultos pesados o peligrosos. c) A labores peligrosas o ilícitas. d) A operaciones de remolque de cualquier clase. e) A conducirlos a lugares distintos de los estipulados por el contrato. f) A participar con él en carreras automovilísticas, pruebas de velocidad, regularidad, etc., o en certámenes de cualquier otro tipo, bajo ningún pretexto. g) No podrá tampoco conducir el automóvil por rutas o caminos que no hayan sido declarados como expeditos al tránsito por las autoridades competentes.

**DÉCIMA SEGUNDA EL ARRENDATARIO** se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al **ARRENDADOR** a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente.

**DÉCIMA TERCERA.** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en un ahoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**DÉCIMA CUARTA. EFECTOS.** El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato. Para constancia, firma **EL ARRENDADOR**, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Supia, Caldas – 27 de agosto de 2025 |

| **EL ARRENDATARIO**<br>**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | **EL ARRENDADOR**<br>**PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA** |
|---|---|
|  |  |
| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|  |  |
| **C.C. N° 20.689.054** | **C.C. N° 1.070.016.999** |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033805141

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| YQY87D | HONDA | XRE 300 | 2016 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 292 | GRIS ONIX | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD KG/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| ND12E1F000273 | N | 9FMND1226GF000150 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 9FMND1226GF000150 | N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

GRANADA VALENCIA PABLO ALEJANDRO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 18468702

---

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 26 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | RE | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 88201500070172 | I | 26/06/2015 | 0 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 29/10/2015 | 29/01/2025 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MCPAL ARMENIA



LT11000110080

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179081765

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SOLOMOTOS ARMENIA SAS

**NIT:** 901313878

**No. de Certificado de Acreditación:** 19-OIN-104

**Fecha de expedición:** 2025/01/27

**Fecha de vencimiento:** 2026/01/27

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** YQY87D

**CLASE:** MOTOCICLETA

**MARCA:** HONDA

**MODELO:** 2016

**SERVICIO:** Particular

**COMBUSTIBLE:** GASOLINA

**CILINDRAJE:** 292

**NRO. MOTOR:** ND12E1F600273

**NRO. CHASIS:** 9FMND1226GF000150

**VIN:** 9FMND1226GF000150

**LÍNEA:** XRE 300

**COLOR:** GRIS ONIX

**NOMBRE PROPIETARIO:** JHONY L. VALENCIA R.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

CARLOS MARIO TOBON ROLDAN

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 26 | 2025 | 1 | 27 | 2026 | 1 | 26 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 90313260 - 611289195 | YQY87D | MOTOCICLETA | PARTICULAR | 292 | 2016 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | HONDA | SIN CARROCERIA |
| | LÍNEA VEHÍCULO: XRE300 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| ND12E1F600273 | 9FMND1226GF000150 | 9FMND1226GF000150 | 0,00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| JHONY VALENCIA | 3148112622 | CC | 9729747 | ARMENIA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 80001522 | 90313260 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 497.500 | $ 258.700 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 758.300**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |


¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:**
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

**Datos personales**
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en www.segurosmundial.com.co/legal/, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

**Topes de cobertura gastos médicos**
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).


¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás [illegible] y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.


Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.26 20:49:13 -05:00

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 700.000,00

Son: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ibagué, Tolima; 31 de agosto de 2025

**CUENTA DE COBRO**

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**OMAR JULIÁN CHAPID PINILLA**

**LA SUMA DE SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($700.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca AKT, modelo 2017, placa GGK13E, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,

**OMAR JULIÁN CHAPID PINILLA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRIENDATARIO** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-1 |
| **DIRECCIÓN** | Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca<br>Cel: 313 429 264<br>consorcioceefcolombiarural@gmail.com |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | Contrato No. 2252-2021 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRENDADOR** | OMAR JULIAN CHAPID PINILLA |
| **CEDULA DEL ARRENDADOR** | 1.121.198.074 |
| **PLACA DE LA MOTO** | GGK13E |
| **MARCA DE LA MOTO** | AKT |
| **LÍNEA DE LA MOTO** | AK180TTR |
| **MODELO DE LA MOTO** | 2017 |
| **CARÁCTERÍSTICAS DE LA MOTO** | CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA |
| | COMBUSTIBLE: GASOLINA |
| | CAPACIDAD (Kg/PSJ) 2 |
| **VALOR ARRIENDO MOTO** | $ 700.000,00 (Incluye combustible y SOAT) |
| **VALOR EN LETRAS** | SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT) |
| **PERÍODO DE PAGO** | MENSUAL |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES** | 03 DE JULIO DE 2025 |
| **LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LABORES** | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO** | SUPIA |
| **TERMINO INICIAL DEL CONTRATO** | TRES (3) MESES |
| **VENCE EL DÍA** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

Entre **EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con Nit 901.550.980-1 y **EL ARRENDADOR OMAR JULIAN CHAPID PINILLA**, identificado con cedula: 1.121.198.074, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de VEHÍCULO motocicleta, regido además por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO** arrendar la MOTO de **EL ARRENDADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL ARRENDATARIO** la moto de marca **AKT**; modelo **2017**, color **NEGRO ROJO**; placa **GGK13E** y con el tanque de combustible lleno y las herramientas que son equipo de norma de fabrica para el citado VEHÍCULO y los correspondientes elementos de seguridad exigidos por las reglamentaciones en materia de tránsito vigente, todo lo cual es recibido por **EL ARRENDATARIO** de conformidad.

**SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL VEHÍCULO EL ARRENDATARIO** recibe la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA** en perfecto estado de funcionamiento y en buenas condiciones de uso.

**TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** por el alquiler de la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA**, el valor de **$700.000,00 (Setecientos mil pesos Moneda Corriente que incluye combustible y SOAT), pagadero Mensual.**

**PARÁGRAFO UNO**: Todos los costos correspondientes a la MOTO automotor serán asumidos por **EL ARRENDEDOR**. Los costos de combustibles, peajes y ferri serán asumidos por **EL ARRENDATARIO** siempre y cuando se utilice en la zona del proyecto.

**CUARTA DEL CONTRATO.** El término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse de un contrato a término fijo inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente.

**QUINTA. USO. EL ARRENDATARIO** destinará el automóvil al transporte personal, en forma exclusiva, sin fines de lucro y dentro de la capacidad normal de la MOTO y no podrá subarrendarlo, cederlo o disponer de el en alguna forma sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por **EL ARRENDADOR.**

**SEXTA RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES. EL ARRENDADOR** es enteramente responsable por cualquier daño causado por la motocicleta y para tal efecto deberá tener vigente el seguro obligatorio, pase, seguro todo riesgo y revisión técnico-mecánica.

**SEPTIMA. VENCIMIENTO DE PLAZO ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO** debe devolver la MOTO arrendada en forma inmediata en el mismo estado en que lo recibió y en el domicilio de **EL ARRENDADOR**

**OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES. EL ARRENDATARIO** es enteramente responsable mientras permanezca en la tenencia del automóvil de la guardia material y/o jurídica del mismo, debiendo resarcir al **EL ARRENDADOR** o a su compañía de seguros, los siguientes perjuicios: a) Por cualquier daño a la propiedad causado al o por el MOTO arrendado. b) Por los daños causados a terceras personas. c) Por los daños causados a personas y/o bienes transportados en el automóvil arrendado d) Por las violaciones que cometan o le imputen haber cometido contra los reglamentos de tránsito municipales, departamentales y/o estatales. e) Por el lucro cesante de **EL ARRENDADOR** resultante de la imposibilidad física y/o jurídica de afectación del MOTO al servicio del alquiler.

**NOVENA. COSTOS ADICIONALES. EL ARRENDATARIO** toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados al o por la MOTO objeto del arrendamiento, cualquiera fuera la índole del hecho, choque, vuelco, despeñamiento, incendio, robo, etc. este pago no exime al **ARRENDATARIO** de hacer frente a los gastos de recuperación o reparación de la MOTO en el caso de los hechos imputables a su culpa y/o negligencia. En caso de cualquier accidente, EL **ARRENDATARIO** deberá dar aviso inmediato al **EL ARRENDADOR**, a la compañía de seguros y a las autoridades, no pudiendo exceder el lapso para hacerlo de las 24 horas de ocurrido el mismo.

**DECÍMA.** Le está totalmente prohibido al **ARRENDATARIO** conducir el automóvil arrendado en las siguientes condiciones: a) En estado de ebriedad, cuando esté bajo los efectos de calmantes, tranquilizantes o narcóticos. b) Sin licencia para conducir válida, expedida por las autoridades competentes y aceptada por las autoridades colombianas. c) En la violación de los reglamentos de tránsito respectivos. d) Permitiendo a personas menores de edad en algún momento, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia.


**DECÍMA PRIMERA. EL ARRENDATARIO** no podrá dedicar el automóvil arrendado a: a) Usos distintos a los estipulados en este contrato, ni al transporte de pasajeros u otro tipo de servicio público. b) Al transporte de cargas o bultos pesados o peligrosos. c) A labores peligrosas o ilícitas. d) A operaciones de remolque de cualquier clase. e) A conducirlos a lugares distintos de los estipulados por el contrato. f) A participar con él en carreras automovilísticas, pruebas de velocidad, regularidad, etc., o en certámenes de cualquier otro tipo, bajo ningún pretexto. g) No podrá tampoco conducir el automóvil por rutas o caminos que no hayan sido declarados como expeditos al tránsito por las autoridades competentes.

**DÉCIMA SEGUNDA EL ARRENDATARIO** se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al **ARRENDADOR** a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente.

**DÉCIMA TERCERA.** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en un ahoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**DÉCIMA CUARTA. EFECTOS.** El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato. Para constancia, firma **EL ARRENDADOR**, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Supia, Caldas – 03 de julio de 2025 |

| **EL ARRENDATARIO**<br>**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | **EL ARRENDADOR**<br>**OMAR JULIAN CHAPID PINILLA** |
|---|---|
|  |  |
| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|  |  |
| **C.C. N° 20.689.054** | **C.C. N° 1.070.016.999** |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033569211

PLACA: GGK13E
MARCA: AKT
LÍNEA: AK180TTR
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 181
COLOR: NEGRO ROJO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA
TIPO CARROCERÍA: SIN CARROCERIA
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD Kg/PSJ: 2
NÚMERO DE MOTOR: 163FMKPQ243104
REG: N
VIN: 9F2A81802H5003820
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9F2A81802H5003820
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CHAPID PINILLA OMAR JULIAN
IDENTIFICACIÓN: C.C. 1121198074



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 15
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902016000200690
I/E: I
FECHA IMPORT.: 30/09/2016
PUERTAS: 0
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/11/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/12/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SUBSTRIA TTOYTTE DTAL NARIÑO/GUACHUCAL

LT02007943307

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 10 | 2024 | 12 | 11 | 2025 | 12 | 10 |

**ASEGURADORA**

sura

890.903.407 – 9

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 40664273 | GGK13E | MOTOCICLETA | PARTICULAR | 181 | 2017 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | AKT | |
| | LÍNEA VEHÍCULO: AK180TTR | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 163FMKPQ243104 | 9F2A81802H5003820 | 9F2A81802H5003820 | 0.0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| OMAR JULIAN CHAPID PINILLA | 3214693315 | CEDULA | 1121198074 | |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1318 | 248 | 4999 | | |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 120 | $ 201,600 | $ 104,800 | $ 2,100 |

**TOTAL A PAGAR** $ 308,500

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |




**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:**
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

**Datos personales**
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

**Topes de cobertura gastos médicos**
**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177752881

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA LA REVISION

**NIT:** 901012825

**No. de Certificado de Acreditación:** 17-OIN-057-001

**Fecha de expedición:** 2024/12/09

**Fecha de vencimiento:** 2025/12/09

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** GGK13E

**CLASE:** MOTOCICLETA

**MARCA:** AKT

**MODELO:** 2017

**SERVICIO:** Particular

**COMBUSTIBLE:** GASOLINA

**CILINDRAJE:** 181

**NRO. MOTOR:** 163FMKPQ243104

**NRO. CHASIS:** 9F2A81802H5003820

**VIN:** 9F2A81802H5003820

**LÍNEA:** AK180TTR

**COLOR:** NEGRO ROJO

**NOMBRE PROPIETARIO:** OMERO D. J. CHAPID G.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

WILSON RAMIREZ VALLEJO

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 700.000,00

Son: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ibagué, Tolima; 31 de agosto de 2025

**CUENTA DE COBRO**

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**

**LA SUMA DE SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($700.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca YAMAHA , modelo 2025, placa QQV55G, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,



**LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRIENDATARIO** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-1 |
| **DIRECCIÓN** | Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca<br>Cel: 313 429 264<br>consorcioceefcolombiarural@gmail.com |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | Contrato No. 2252-2021 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRENDADOR** | LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA |
| **CEDULA DEL ARRENDADOR** | 1.121.198.074 |
| **PLACA DE LA MOTO** | QQV55G |
| **MARCA DE LA MOTO** | YAMAHA |
| **LÍNEA DE LA MOTO** | XTZ150-2(XTZ150) |
| **MODELO DE LA MOTO** | 2025 |
| **CARÁCTERÍSTICAS DE LA MOTO** | CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA |
| | COMBUSTIBLE: GASOLINA |
| | CAPACIDAD (Kg/PSJ) 2 |
| **VALOR ARRIENDO MOTO** | $ 700.000,00 (Incluye combustible y SOAT) |
| **VALOR EN LETRAS** | SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT) |
| **PERÍODO DE PAGO** | MENSUAL |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES** | 03 DE JULIO DE 2025 |
| **LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LABORES** | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO** | SUPIA |
| **TERMINO INICIAL DEL CONTRATO** | TRES (3) MESES |
| **VENCE EL DÍA** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

Entre **EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con Nit 901.550.980-1 y **EL ARRENDADOR LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**, identificado con cedula: 1.121.198.074, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de VEHÍCULO motocicleta, regido además por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO** arrendar la MOTO de **EL ARRENDADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL ARRENDATARIO** la moto de marca **YAMAHA**; modelo **2025**, color **AZUL NEGRO**; placa **QQV55G** y con el tanque de combustible lleno y las herramientas que son equipo de norma de fabrica para el citado VEHÍCULO y los correspondientes elementos de seguridad exigidos por las reglamentaciones en materia de tránsito vigente, todo lo cual es recibido por **EL ARRENDATARIO** de conformidad.

**SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL VEHÍCULO EL ARRENDATARIO** recibe la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA** en perfecto estado de funcionamiento y en buenas condiciones de uso.

**TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** por el alquiler de la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA**, el valor de **$700.000,00 (Setecientos mil pesos Moneda Corriente que incluye combustible y SOAT), pagadero Mensual.**

**PARÁGRAFO UNO**: Todos los costos correspondientes a la MOTO automotor serán asumidos por **EL ARRENDEDOR**. Los costos de combustibles, peajes y ferri serán asumidos por **EL ARRENDATARIO** siempre y cuando se utilice en la zona del proyecto.

**CUARTA DEL CONTRATO.** El término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse de un contrato a término fijo inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente.

**QUINTA. USO. EL ARRENDATARIO** destinará el automóvil al transporte personal, en forma exclusiva, sin fines de lucro y dentro de la capacidad normal de la MOTO y no podrá subarrendarlo, cederlo o disponer de el en alguna forma sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por **EL ARRENDADOR.**

**SEXTA RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES. EL ARRENDADOR** es enteramente responsable por cualquier daño causado por la motocicleta y para tal efecto deberá tener vigente el seguro obligatorio, pase, seguro todo riesgo y revisión técnico-mecánica.

**SEPTIMA. VENCIMIENTO DE PLAZO ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO** debe devolver la MOTO arrendada en forma inmediata en el mismo estado en que lo recibió y en el domicilio de **EL ARRENDADOR**

**OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES. EL ARRENDATARIO** es enteramente responsable mientras permanezca en la tenencia del automóvil de la guardia material y/o jurídica del mismo, debiendo resarcir al **EL ARRENDADOR** o a su compañía de seguros, los siguientes perjuicios: a) Por cualquier daño a la propiedad causado al o por el MOTO arrendado. b) Por los daños causados a terceras personas. c) Por los daños causados a personas y/o bienes transportados en el automóvil arrendado d) Por las violaciones que cometan o le imputen haber cometido contra los reglamentos de tránsito municipales, departamentales y/o estatales. e) Por el lucro cesante de **EL ARRENDADOR** resultante de la imposibilidad física y/o jurídica de afectación del MOTO al servicio del alquiler.

**NOVENA. COSTOS ADICIONALES. EL ARRENDATARIO** toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados al o por la MOTO objeto del arrendamiento, cualquiera fuera la índole del hecho, choque, vuelco, despeñamiento, incendio, robo, etc. este pago no exime al **ARRENDATARIO** de hacer frente a los gastos de recuperación o reparación de la MOTO en el caso de los hechos imputables a su culpa y/o negligencia. En caso de cualquier accidente, EL **ARRENDATARIO** deberá dar aviso inmediato al **EL ARRENDADOR**, a la compañía de seguros y a las autoridades, no pudiendo exceder el lapso para hacerlo de las 24 horas de ocurrido el mismo.

**DECÍMA.** Le está totalmente prohibido al **ARRENDATARIO** conducir el automóvil arrendado en las siguientes condiciones: a) En estado de ebriedad, cuando esté bajo los efectos de calmantes, tranquilizantes o narcóticos. b) Sin licencia para conducir válida, expedida por las autoridades competentes y aceptada por las autoridades colombianas. c) En la violación de los reglamentos de tránsito respectivos. d) Permitiendo a personas menores de edad en algún momento, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia.

**DECÍMA PRIMERA. EL ARRENDATARIO** no podrá dedicar el automóvil arrendado a: a) Usos distintos a los estipulados en este contrato, ni al transporte de pasajeros u otro tipo de servicio público. b) Al transporte de cargas o bultos pesados o peligrosos. c) A labores peligrosas o ilícitas. d) A operaciones de remolque de cualquier clase. e) A conducirlos a lugares distintos de los estipulados por el contrato. f) A participar con él en carreras automovilísticas, pruebas de velocidad, regularidad, etc., o en certámenes de cualquier otro tipo, bajo ningún pretexto. g) No podrá tampoco conducir el automóvil por rutas o caminos que no hayan sido declarados como expeditos al tránsito por las autoridades competentes.

**DÉCIMA SEGUNDA EL ARRENDATARIO** se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al **ARRENDADOR** a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente.

**DÉCIMA TERCERA.** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en un ahoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**DÉCIMA CUARTA. EFECTOS.** El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato. Para constancia, firma **EL ARRENDADOR**, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Supia, Caldas – 03 de julio de 2025 |

| **EL ARRENDATARIO**<br>**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | **EL ARRENDADOR**<br>**LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA** |
|---|---|
|  |  |
| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|  |  |
| **C.C. N° 20.689.054** | **C.C. N° 1.070.016.999** |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031662034

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| QQV55G | YAMAHA | XTZ150-2 (XTZ150) | 2025 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 149 | AZUL NEGRO | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

NÚMERO DE MOTOR: G3L1E127862

REG: N

VIN: 9FKDG3616S2127862

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FKDG3616S2127862

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

DEVIA MEDINA LUIS FERNANDO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1110061114

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902024000041838

I/E: I

FECHA IMPORT.: 11/03/2024

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 26/04/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/04/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE



LT11000002701

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

| FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2026-04-25 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10565300174510 | QQV55G | MOTOS | PARTICULAR | 149 | 2025 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHICUL | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | YAMAHA | XTZ150-2 (XTZ150) | SIN CARROCERIA |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| G3L1E127862 | 9FKDG3616S2127862 | 9FKDG3616S2127862 | 0.00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| DEVIA MEDINA, LUIS FERNANDO | 3228898852 | CC | 1110061114 | IBAGUE |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1329 | 25 | 4013 | 0 | IBAGUE |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 120 | $ 213300 | $ 110900 | $ 2100 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 326300

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA |
|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Protección de datos personales:**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccióndatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

**Topes de cobertura gastos médicos**
**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 91.000,00

Son: NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Anserma, Caldas; 31 de agosto de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**SERGIO NARVAEZ RANGEL**

**LA SUMA DE NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($91.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca SUZUKI, modelo 2023, placa MRA58G, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,

**SERGIO NARVAEZ RANGEL**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRIENDATARIO** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-1 |
| **DIRECCIÓN** | Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca<br>Cel: 313 429 264<br>consorcioceefcolombiarural@gmail.com |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | Contrato No. 2252-2021 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRENDADOR** | SERGIO NARVAEZ RANGEL |
| **CEDULA DEL ARRENDADOR** | 1.060.596.262 |
| **PLACA DE LA MOTO** | MRA58G |
| **MARCA DE LA MOTO** | SUZUKI |
| **LÍNEA DE LA MOTO** | DR150 |
| **MODELO DE LA MOTO** | 2023 |
| **CARÁCTERÍSTICAS DE LA MOTO** | CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA |
| | COMBUSTIBLE: GASOLINA |
| | CAPACIDAD (Kg/PSJ) 2 |
| **VALOR ARRIENDO MOTO** | $ 700.000,00 (Incluye combustible y SOAT) |
| **VALOR EN LETRAS** | SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT) |
| **PERÍODO DE PAGO** | MENSUAL |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES** | 27 DE AGOSTO DE 2025 |
| **LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LABORES** | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO** | SUPIA |
| **TERMINO INICIAL DEL CONTRATO** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **VENCE EL DÍA** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

Entre **EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con Nit 901.550.980-1 y **EL ARRENDADOR SERGIO NARVAEZ RANGEL**, identificado con cedula: 1.060.596.262, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de VEHÍCULO motocicleta, regido además por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO** arrendar la MOTO de **EL ARRENDADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL ARRENDATARIO** la moto de marca **SUZUKI**; modelo **2023**, color **NEGRO**; placa **MRA58G** y con el tanque de combustible lleno y las herramientas que son equipo de norma de fabrica para el citado VEHÍCULO y los correspondientes elementos de seguridad exigidos por las reglamentaciones en materia de tránsito vigente, todo lo cual es recibido por **EL ARRENDATARIO** de conformidad.

**SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL VEHÍCULO EL ARRENDATARIO** recibe la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA** en perfecto estado de funcionamiento y en buenas condiciones de uso.

**TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** por el alquiler de la MOTO descrito en la **CLAUSULA PRIMERA**, el valor de **$700.000,00 (Setecientos mil pesos Moneda Corriente que incluye combustible y SOAT), pagadero Mensual.**

**PARÁGRAFO UNO**: Todos los costos correspondientes a la MOTO automotor serán asumidos por **EL ARRENDEDOR**. Los costos de combustibles, peajes y ferri serán asumidos por **EL ARRENDATARIO** siempre y cuando se utilice en la zona del proyecto.

**CUARTA DEL CONTRATO.** El término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse de un contrato a término fijo inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente.

**QUINTA. USO. EL ARRENDATARIO** destinará el automóvil al transporte personal, en forma exclusiva, sin fines de lucro y dentro de la capacidad normal de la MOTO y no podrá subarrendarlo, cederlo o disponer de el en alguna forma sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por **EL ARRENDADOR.**

**SEXTA RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES. EL ARRENDADOR** es enteramente responsable por cualquier daño causado por la motocicleta y para tal efecto deberá tener vigente el seguro obligatorio, pase, seguro todo riesgo y revisión técnico-mecánica.

**SEPTIMA. VENCIMIENTO DE PLAZO ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO** debe devolver la MOTO arrendada en forma inmediata en el mismo estado en que lo recibió y en el domicilio de **EL ARRENDADOR**

**OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES. EL ARRENDATARIO** es enteramente responsable mientras permanezca en la tenencia del automóvil de la guardia material y/o jurídica del mismo, debiendo resarcir al **EL ARRENDADOR** o a su compañía de seguros, los siguientes perjuicios: a) Por cualquier daño a la propiedad causado al o por el MOTO arrendado. b) Por los daños causados a terceras personas. c) Por los daños causados a personas y/o bienes transportados en el automóvil arrendado d) Por las violaciones que cometan o le imputen haber cometido contra los reglamentos de tránsito municipales, departamentales y/o estatales. e) Por el lucro cesante de **EL ARRENDADOR** resultante de la imposibilidad física y/o jurídica de afectación del MOTO al servicio del alquiler.

**NOVENA. COSTOS ADICIONALES. EL ARRENDATARIO** toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados al o por la MOTO objeto del arrendamiento, cualquiera fuera la índole del hecho, choque, vuelco, despeñamiento, incendio, robo, etc. este pago no exime al **ARRENDATARIO** de hacer frente a los gastos de recuperación o reparación de la MOTO en el caso de los hechos imputables a su culpa y/o negligencia. En caso de cualquier accidente, EL **ARRENDATARIO** deberá dar aviso inmediato al **EL ARRENDADOR**, a la compañía de seguros y a las autoridades, no pudiendo exceder el lapso para hacerlo de las 24 horas de ocurrido el mismo.

**DECÍMA.** Le está totalmente prohibido al **ARRENDATARIO** conducir el automóvil arrendado en las siguientes condiciones: a) En estado de ebriedad, cuando esté bajo los efectos de calmantes, tranquilizantes o narcóticos. b) Sin licencia para conducir válida, expedida por las autoridades competentes y aceptada por las autoridades colombianas. c) En la violación de los reglamentos de tránsito respectivos. d) Permitiendo a personas menores de edad en algún momento, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia.

**DECÍMA PRIMERA. EL ARRENDATARIO** no podrá dedicar el automóvil arrendado a: a) Usos distintos a los estipulados en este contrato, ni al transporte de pasajeros u otro tipo de servicio público. b) Al transporte de cargas o bultos pesados o peligrosos. c) A labores peligrosas o ilícitas. d) A operaciones de remolque de cualquier clase. e) A conducirlos a lugares distintos de los estipulados por el contrato. f) A participar con él en carreras automovilísticas, pruebas de velocidad, regularidad, etc., o en certámenes de cualquier otro tipo, bajo ningún pretexto. g) No podrá tampoco conducir el automóvil por rutas o caminos que no hayan sido declarados como expeditos al tránsito por las autoridades competentes.

**DÉCIMA SEGUNDA EL ARRENDATARIO** se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al **ARRENDADOR** a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente.

**DÉCIMA TERCERA.** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en un ahoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**DÉCIMA CUARTA. EFECTOS.** El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato. Para constancia, firma **EL ARRENDADOR**, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Supia, Caldas – 27 de agosto de 2025 |

| **EL ARRENDATARIO**<br>**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | **EL ARRENDADOR**<br>**SERGIO NARVAEZ RANGEL** |
|---|---|
|  |  |
| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|  |  |
| **C.C. N° 20.689.054** | **C.C. N° 1.070.016.999** |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029259208

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| MRA58G | SUZUKI | DR150 | 2023 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 149 | NEGRO | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

NÚMERO DE MOTOR
157FMJ-3*G2U59504*

REG
N

VIN
LC6JCK4P9P0029002

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
LC6JCK4P9P0029002

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
NARVAEZ RANGEL SERGIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1060596262

Powered by CamScanner

STRICCIÓN MOVIL

****** 12

ARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT | PUERTAS

352023000076651 | I | 16/02/2023 | 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


**PRENDA - CEVECO**

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 02/06/2023 | 02/06/2023 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

**SUB STRIA MOVILIDAD RIOSUCIO**





LTU2007526995

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183444997

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SAN MIGUEL

**NIT:** 900391327

**No. de Certificado de Acreditación:** 14-OIN-031-001

**Fecha de expedición:** 2025/08/24

**Fecha de vencimiento:** 2026/08/24

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | MRA58G | **CLASE:** | MOTOCICLETA |
| **MARCA:** | SUZUKI | **MODELO:** | 2023 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | GASOLINA |
| **CILINDRAJE:** | 149 | **NRO. MOTOR:** | 157FMJ-3*G2U59504* |
| **NRO. CHASIS:** | LC6JCK4P9P0029002 | **VIN:** | LC6JCK4P9P0029002 |
| ***LÍNEA:*** | *DR150* | | |
| **COLOR:** | *NEGRO* | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** SERGIO NARVAEZ R.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
SAN MIGUEL
Supía - Caldas
Cel: 316 867 16 83

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

CARLOS ANDRES COBOS GUTIERREZ



Powered by CamScanner

# SOAT

AXA COLPATRIA

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL AÑO MES DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA |
|---|---|---|
| 2025 8 8 | 2025 8 9 | 2026 8 8 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3429989700 | MRA58G | MOTOS | PARTICULAR | 149 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | SUZUKI | DR150 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 157FMJ3G2U59504 | LC6JCK4P9P0029002 | LC6JCK4P9P0029002 | 0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| NARVAEZ RANGEL, SERGIO | 3153091268 | CC | 1060596262 | SUPIA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 26 | 55763603 | 3429989700 | MANIZALES |

| CLASE | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 112 | $213.300,00 | $110.900,00 | $2.400,00 |

TOTAL A PAGAR

**$326.600,00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| | HASTA | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expida se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

*Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

# ALQUILER DE TOPOGRAFÍA

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0
Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca
Celular: 3134239264 – 3133352947
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 3.150.000,00

Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte), durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Tabio, Cundinamarca; 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

DEBE A

**CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**

NIT:860.043.881-7

LA SUMA DE:

**LA SUMA DE** TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA **MIL PESOS M/CTE ($3.150.000,00) M/CT** POR CONCEPTO: Trabajo de topografía (Incluye personal equipo y transporte) correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2025 con una dedicación del 25%, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2"*

Firma: _____
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante legal: CITEC SAS
Dirección: Calle 9 No.0-100 casa 2 Sector el Hato -Barrio los Andes
Ciudad: Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 313 423 9264

# INFORME DE TOPOGRAFIA

## CONTRATO 2252-2021
## Ref. Contrato SAMC-SI-051-2023
## Ref. Contrato 18092024-1295

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

**MUNICIPIOS: Riosucio,Supia,Filadelfia,Marmato,Anserma**

**DEPARTAMENTO: CALDAS**

**AGOSTO 2025**

# INTRODUCCIÓN

La Topografía, consiste en el levantamiento de los aspectos geográficos existentes en cada uno de los sectores a estudiar en cada uno de los tramos de placa huella y estructuras existentes, señalización existente, entre otros.

- La modelación del terreno,
- la determinación de elementos de interés existentes en el corredor y sus condiciones físicas.

Los anteriores factores permiten plantear y formular el Diseño más conveniente para cada sector. Por lo tanto, el Estudio de Topografía en fundamental para la determinación de los posteriores diseños y finalmente, para la localización de las obras definitivas.

Este documento es presentado al **CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**, en cumplimiento a los compromisos Adquiridos mediante el CONTRATO 2252-2021 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”

## OBJETIVOS

- Revisar la información topográfica entregada por el contratista para definir las cantidades y los diseños de obra.

- Verificar si la información entregada por los contratistas coincide con la realidad del estado actual de la vía en campo.

- Realizar un levantamiento de las zonas donde se ejecutará obra.

- Verificar que las cantidades de obra en las pre-actas coincidan con realidad.

## LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en departamento de Caldas, para este mes se trabajó en el municipio de Risaralda del Departamento de Caldas, a 75° 46' 02" de longitud oeste y a 5° 09' 50" de latitud norte, con una superficie terrestre de 108 km².



**Imagen Información Wikipedia**

https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda_(Caldas)



# DESARROLLO

El objeto es la revisión de información topográfica para la ejecución de los Diseños topográficos y técnicos para los tramos de Placa Huela para el contrato SAMC-SI-051-2023, Contrato 18092024-1295 ubicados en las siguientes Comunidades Indígenas:

## SUPIA

## RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA

- Placa Huella Mejial

| RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA MUNICIPIO DE SUPIA<br>PLACA HUELLA<br>MEJIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEN UNICO NACIONAL | | GEOGRAFICAS | | | GEOGRAFICAS | |
| INICIO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | LATITUD | LONGITUD |
| | 4710207.576 | 2152439.866 | 5.37402 | -75.61586 | 0 | 5º22'26.47'' | 75º36'57.09'' |
| FIN | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | | |
| | 4710288.692 | 2152483.764 | 5.37442 | -75.61513 | 101 | 5º22'27.91'' | 75º36'54.46'' |

## RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA

- Placa Huella Florencia

| RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA MUNICIPIO DE SUPIA<br>PLACA HUELLA<br>FLORENCIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEN UNICO NACIONAL | | GEOGRAFICAS | | | GEOGRAFICAS | |
| INICIO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | LATITUD | LONGITUD |
| | 4705209.043 | 2149697.156 | 5.34903 | -75.66084 | 0 | 5° 20' 57'' | 75° 39' 39'' |
| FIN | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | | |
| | 4705134.475 | 2149631.11 | 5.34843 | -75.66151 | 100 | 5° 20' 54'' | 75° 39' 41'' |

## RESGUARDO INDIGENA CAÑOMOMO Y LOMAPRIETA

- Placa Huella Brasil

| RESGUARDO INDIGENA CAÑOMOMO Y LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA<br>PLACA HUELLA SECTOR BRASIL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEN UNICO NACIONAL | | GEOGRAFICAS | | | GEOGRAFICAS | |
| INICIO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | LATITUD NORTE | LONGITUD OESTE |
| | 4705721.432 | 2156870.548 | 5.4139 | -75.6565 | 0 | 5º24'50,04'' | 75º39'23,39'' |
| FIN | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | | |
| | 4705649.095 | 2156806.708 | 5.41332 | -75.65715 | 100 | 5º24'47,95'' | 75º39'25,74'' |

## RESGUARDO INDIGENA CAÑOMOMO Y LOMAPRIETA

- Placa Huella Alto Sevilla

| RESGUARDO INDIGENA CAÑOMOMO Y LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA<br>PLACA HUELLA<br>ALTO SEVILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEN UNICO NACIONAL | | GEOGRAFICAS | | | GEOGRAFICAS | |
| INICIO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | LATITUD | LONGITUD |
| | 4704825.498 | 2159092.329 | 5.43395 | -75.66467 | 0 | 5° 26' 02'' | 75° 39' 53'' |
| FIN | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | | |
| | 4704743.355 | 2159067.25 | 5.43372 | -75.66541 | 130 | 5° 26' 01'' | 75° 39' 55'' |

## RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI

- Placa Huella El Guascal

| RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI MUNICIPIO DE SUPIA<br>PLACA HUELLA SECTOR<br>EL GUASCAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEN UNICO NACIONAL | | GEOGRAFICAS | | | GEOGRAFICAS | |
| INICIO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | LATITUD | LONGITUD |
| | 4711165.097 | 2155309.401 | 5.3999996 | -75.6073335 | 0 | 5° 24' 00'' | 75° 36' 26'' |
| FIN | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA | | |
| | 4711284.583 | 2155285.311 | 5.3997864 | -75.6062547 | 135 | 5° 23' 59'' | 75° 36' 23'' |

Para estos tramos la topografía de la interventoría realizó levantamiento topográfico con el fin de verificar las coordenadas de ubicación en campo y se tomaron niveles de terreno natural con el fin de verificar volúmenes presentados por el contratista.





**PLACA HUELLA SECTOR EL MEJIAL**




**PERFIL DE ELEVACIÓN PLACA HUELLA SECTOR EL MEJIAL**




**PLACA HUELLA SECTOR FLORENCIA**

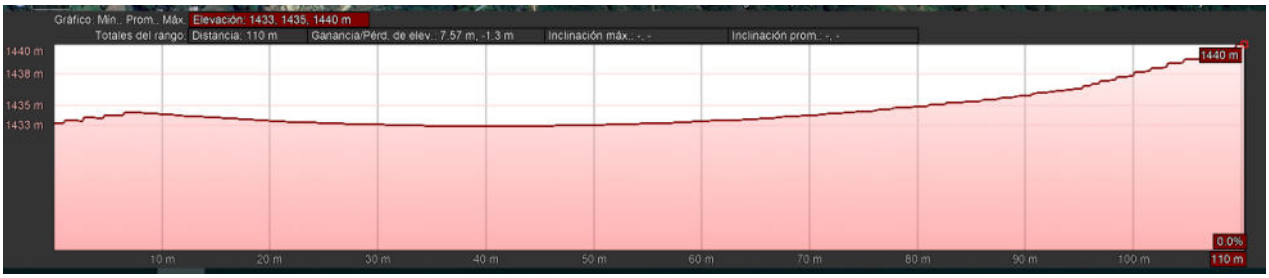


**PERFIL DE ELEVACIÓN PLACA HUELLA SECTOR FLORENCIA**




**PLACA HUELLA SECTOR EL BRASIL**




**PERFIL DE ELEVACIÓN PLACA HUELLA SECTOR EL BRASIL**




**PLACA HUELLA SECTOR ALTO SEVILLA**




**PERFIL DE ELEVACIÓN PLACA HUELLA SECTOR ALTO SEVILLA**




**PLACA HUELLA SECTOR EL GUASCAL**





**PERFIL DE ELEVACIÓN PLACA HUELLA SECTOR EL GUASCAL**

Los anteriores datos fueron tomados en campo por la interventoría se revisaron anchos de vía y se tienen las coordenadas de estos levantamientos con el fin de verificar y comprobar una vez sean entregadas las actas de cobro de contratista.


**ANSERMA**

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**


- Placa huella Tramo 1
- Placa huella tramo 2
- Placa huella tramo 3

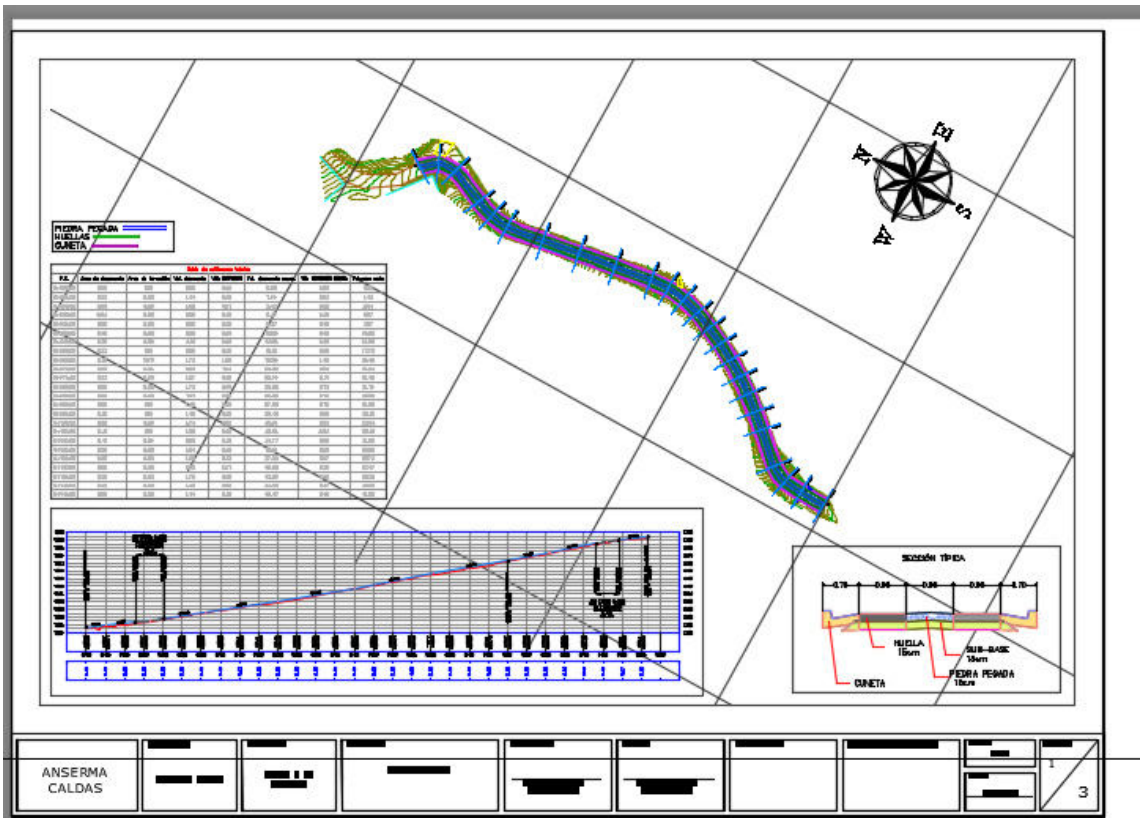


**PLANO TOPOGRAFICO TRAMO 1 ANSEA**

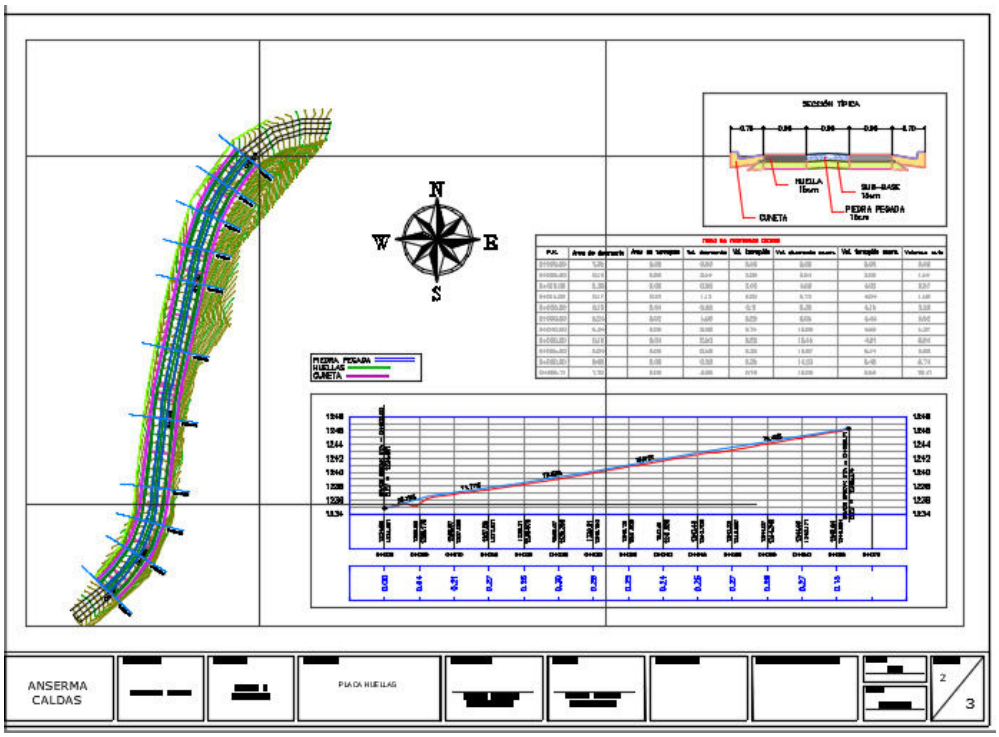


**PLANO TOPOGRAFICO TRAMO 2 ANSEA**

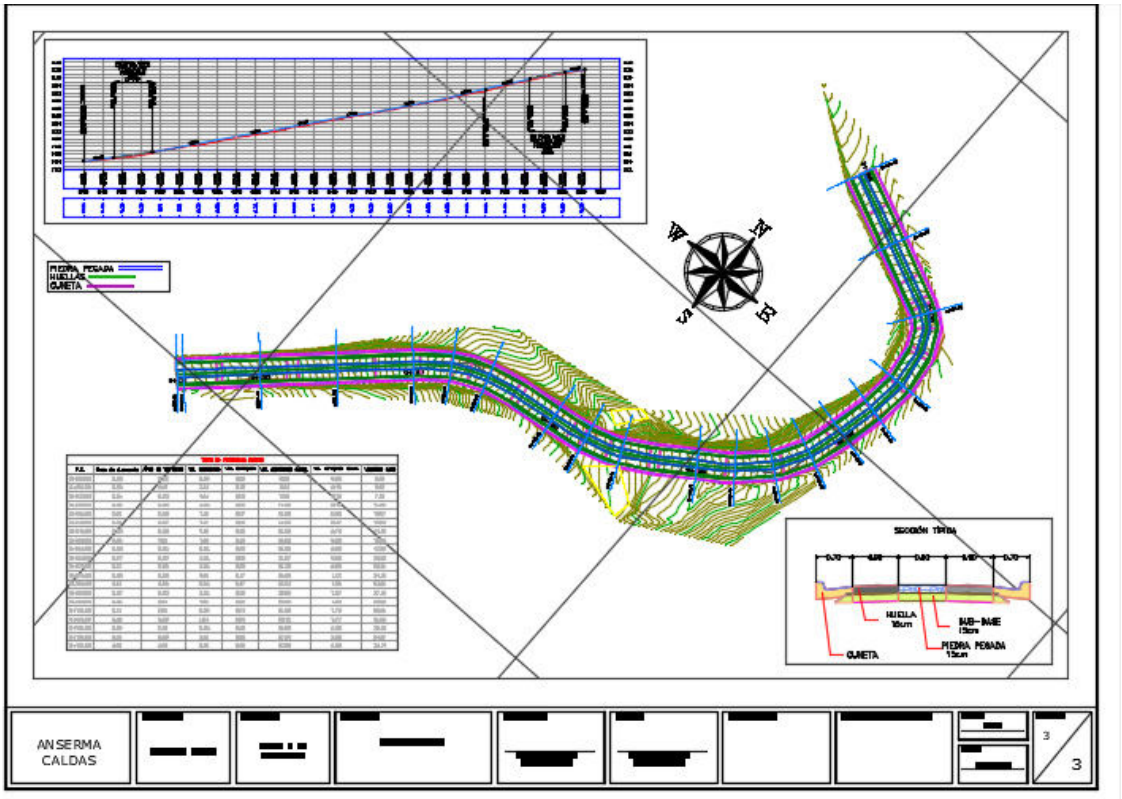


**PLANO TOPOGRAFICO TRAMO 3 ANSEA**


1 de agosto de 2025
5°26'45.841"N 75°37'58.686"W
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Comunidad Escopetera
y Pirza Supia
San José
Google


1 de agosto de 2025
5°26'46.467"N 75°37'58.891"W
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Comunidad Escopetera
y Pirza Supia
San José
Google

- La topografía de interventoría en las anteriores actividades expuestas realizó toma de levantamientos en campos con el fin de verificar los niveles de peraltes y control de pendientes con el fin que tenga una buena ejecución de construcción con los lineamientos de la cartilla de Colombia Rural.

- La interventoría realizó la revisión del levantamiento topográfico de la vía tomando los bordes derechos izquierdo y eje de los sitios de obra, así como la referencia de las alcantarillas existentes y las medidas de las cárcavas existentes en la vía.

- Se realizaron seguimientos y control a los levantamientos ejecutados por el contratista para el mes de septiembre con el fin de verificar lo requerido en el Anexo Técnico de Obra.

**EQUIPOS USADOS**

- Estación Total Marca SOUTH
- Nivel de precisión STONEX
- GPS Garmin precisión métrica
- Vehículo Campero 4x4 KORANDO BTD090
- Computadora portátil Core i7
- Herramienta menor

**RESULTADOS**

El levantamiento topográfico se encuentra localizado con los siguientes parámetros

| | |
|---|---|
| **Sistema de coordenadas:** | Planas de Gauss Kruger |
| **Origen cartográfico:** | ORIGEN NACIONAL |
| **Datum:** | WGS 1984 |
| **Modelo Geoide:** | EGM96 (Global) |

## CONCLUSIONES

- Se realizó la georreferenciación de la zona donde se realizará obra.
- Se realizó un recorrido para verificar el Abscisado en campo hecho por el contratista.
- Se realizo la georreferenciación de los puntos críticos para los diseños.

SOLYDEK
Equipos Topográficos

# CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 24-090

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propietario: | CITEC LTDA | Identificación | 860043881-7 |
| Instrumento: | Nivel Automático | Marca: | GAL32X |
| Modelo: | 32X | Serie: | SIN SERIE |
| Expedición: | 03 de junio de 2025 | Próximo ajuste: | 3 de diciembre de 2025 |
| Estado: | Nuevo: | USADO: | X |

**Patrones utilizados:**

Estación Total TOPCON GTS 235W SN NL2363
Nivel Automático TOPCON ATB3 MX8283

**Especificaciones técnicas según fabricante:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desviación estándar: | 1.5 mm | Mínima distancia focal | 0.4 m |
| Tipo de imagen: | Directa | Relación de estadía | 100 |
| Magnificación: | 32x | Rango de compensador | ±15´ |
| Apertura de objetivo: | 36 mm | Exactitud de compensador | 0.3" |

**Ajustes Efectuados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | 2 | Ajuste del nivel circular | 1 |
| Mantenimiento interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| Tornillo de movimiento fino H | 1 | Ajuste del retículo | 1 |
| Ajuste del compensador | 2 | Ajuste de las mirillas de puntería | 1 |

CODIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

Ing. Vladimir Balaguera Roa

# CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 24-089

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propietario: | CITEC LTDA | Identificación | 860043881-7 |
| Instrumento: | Estación total | Marca: | SOUTH |
| Modelo: | NTS 362 R6L | Serie: | S127709 |
| Expedición: | 3 de junio de 2025 | Próximo ajuste: | 3 de diciembre de 2025 |
| Estado: | Nuevo: | USADO: | X |

**Patrones utilizados:**

Estación Total Topcon GTS 235W SN NL2363
Nivel Automático Topcon ATB3 MX8283 Certificado Trazable al NIST.

**Especificaciones técnicas según fabricante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Precisión Angular DIN 187223 | 2" | Mínima distancia focal | 0.5 m |
| Precisión en distancia: | 3mm+2ppmXD | Relación de estadía | 2500m |
| Aumento del telescopio: | 30x | Rango de compensador | XY |
| Apertura d objetivo: | 30 mm | Exactitud de Compensador | 0.3" |
| Lectura en pantalla: | 1" | | |

**Ajustes Efectuados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | 1 | Ajuste del nivel circular | 1 |
| Mantenimiento interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| Tornillo de movimiento fino H | 1 | Ajuste del retículo | 1 |
| Chequeo del Teclado | 1 | Ajuste de las mirillas de puntería | 1 |
| Ajuste del compensador XY | 2 | | |

CODIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

Ing. Vladimir Balaguera Roa

SOLYDEK
Equipos Topográficos

# CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 24-090

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propietario: | CITEC LTDA | Identificación | 860043881-7 |
| Instrumento: | Nivel Automático | Marca: | GAL32X |
| Modelo: | 32X | Serie: | SIN SERIE |
| Expedición: | 03 de junio de 2025 | Próximo ajuste: | 3 de diciembre de 2025 |
| Estado: | Nuevo: | USADO: | X |

**Patrones utilizados:**

Estación Total TOPCON GTS 235W SN NL2363
Nivel Automático TOPCON ATB3 MX8283

**Especificaciones técnicas según fabricante:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desviación estándar: | 1.5 mm | Mínima distancia focal | 0.4 m |
| Tipo de imagen: | Directa | Relación de estadía | 100 |
| Magnificación: | 32x | Rango de compensador | ±15´ |
| Apertura de objetivo: | 36 mm | Exactitud de compensador | 0.3" |

**Ajustes Efectuados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | 2 | Ajuste del nivel circular | 1 |
| Mantenimiento interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| Tornillo de movimiento fino H | 1 | Ajuste del retículo | 1 |
| Ajuste del compensador | 2 | Ajuste de las mirillas de puntería | 1 |

CODIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

Ing. Vladimir Balaguera Roa

# República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: GERMAN VARON RODRIGUEZ

Cédula: **11,200,909**

Licencia Profesional No: **01-13492**

**Resolución:** **02-3493 - 19/01/2012**

* Experiencia o fecha de grado: **12/12/2003**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia
la documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión
de TOPÓGRAFO en la República de Colombia de acuerdo a la
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

***La experiencia se contará a partir de la fecha de grado para Los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.**

**RUTH ELENA ACUÑA AGUDELO**
PRESIDENTE

**ALIX MUÑIZ SANCHEZ**
SECRETARIA CPNT

**Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email:info@cpnt.org. calle 33 No.7-27 Of.502 Tel:2881490**

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

**CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 573433/2025**

**EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA**

**HACE CONSTAR**

Que el(la) Señor(a) **GERMAN VARON RODRIGUEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 11200909** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-13492** con fecha de expedición del **19 de Enero de 2012.**

Que el(la) Señor(a) **GERMAN VARON RODRIGUEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13492** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **3 días del mes de Septiembre de 2025.**

**LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO**
**Director Ejecutivo**

_____

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

# ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0
Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca
Celular: 3134239264 – 3133352947
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: $ 740.000,00

Son: SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Ensayos de laboratorio (Resistencia de Cilindros y Densidad de Campo), elaborados en el periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2025

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
5f49b296e814026903dc4f56df0bd724fd426cd9b6c8e45ee71fc42db9ba236d75b3ff848dfa3e39a8b523c79b18fe46

**Número de Factura:** FVC-14
**Fecha de Emisión:** 16/09/2025
**Fecha de Vencimiento:** 21/09/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MURILLO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
**Nombre Comercial:** MURILLO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
**Nit del Emisor:** 1110484090
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4290

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** MZ 17 CA 10 BRR VILLA CAFE ET 3
**Teléfono / Móvil:** 3223782717
**Correo:** estudiodesuelosluisc@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901550980
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tabio
**Dirección:** CALLE 9 NO. 0-100 CASA 2
**Teléfono / Móvil:** 3134239264
**Correo:** consorcioceefcolombiarural@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 | Toma de Densidedes en C ampo con cono de arena | NIU | 9,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 540.000,00 |
| 2 | 007 | Servicio de Transporte | NIU | 1,00 | $ 200.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 200.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/09/2025 16:53:15
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2025 16:53:15
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 740000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 740000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 740000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 740000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 740.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 740.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 740.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 740.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764084193990 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-27

# ALQUILER OFICINA/CAMPAMENTO

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 850.000,00

Son: Ochocientos cincuenta mil pesos m/cte.

Por Concepto de: Alquiler oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos), durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Supia, Caldas; 31 de agosto del 2025

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

Debe a:

**HECTOR WILLIAMS BERMÚEDEZ NIETO**
C.C 1.127.598.011

**LA SUMA DE:**

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
**($ 850.000)**

**Por concepto de:** Servicio de arriendo del inmueble ubicado en la dirección Calle 8 No. 6-22 Piso 3 centro, Viterbo - Caldas, para el Contrato No. 1748 de 2019 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente,

C.C. 1127598011

**HECTOR WILLIAMS BERMÚEDEZ NIETO**
**C.C 1.127.598.011**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL ARRIENDATARIO** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-1 |
| **DIRECCIÓN** | Calle 9 No 0 - 100 Casa 2, Sector El Hato Barrio Los Andes, Tabio-Cundinamarca<br>Cel: 3134239264<br>consorcioceefcolombiarural@gmail.com |
| **NOMBRE DEL ARRENDADOR** | HECTOR WILLIAM BERMÚDEZ NIETO |
| **NIT DEL ARRENDADOR** | 1.127.598.011 |
| **DIRECCIÓN DEL ARRENDADOR** | CARRERA 7 MA #33-25, HOTEL MIS NIETOS, PISO 3, APTO 304 |
| **TIPO DE INMUEBLE** | OFICINA |
| **CARACTERÍSTICAS INMUEBLE** | APARTAMENTO SOMETIDO A PROPIEDAD HORIZONTAL, CON DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: AGUA, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, TV/CABLE. |
| **VALOR ARRIENDO INMUEBLE** | $850. 000.oo |
| **VALOR EN LETRAS** | OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE |
| **PERÍODO DE PAGO** | Mensual |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 03 DE JULIO DE 2025 |
| **DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO** | TRES (3) MESES |
| **VENCE EL DÍA** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

Entre **EL ARRENDATARIO** y **EL ARRENDADOR**, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de inmuebles regido además por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO** arrendar el inmueble de **EL ARRENDADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL ARRENDATARIO** el inmueble **OFICINA (incluido dotación y servicios públicos)**; ubicado **CARRERA 7 MA #33-25, HOTEL MIS NIETOS, PISO 3, APTO 304, BARRIO CENTRO**, todo lo cual es recibido por EL **ARRENDATARIO** de conformidad.

**SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL INMUEBLE. EL ARRENDATARIO** recibe el inmueble descrito en la **CLAUSULA PRIMERA** en perfecto estado de funcionamiento y con características tales como: APARTAMENTO SOMETIDO A PROPIEDAD HORIZONTAL, CON DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: AGUA, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, TV/CABLE. en buenas condiciones de uso.

**TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** por el alquiler del inmueble descrito en la **CLAUSULA PRIMERA**, el valor de **$850. 000.oo M/CTE (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (incluye dotación y servicios públicos),** pagadero Mensual, el cual será cancelado dentro de los cinco (5) primeros días de cada vencimiento por mes cumplido.

**CUARTA DESTINACIÓN. El arrendatario** se compromete a utilizar el inmueble para el funcionamiento de un establecimiento de comercio en el cual se desarrollarán únicamente las siguientes actividades: Todas las labores correspondientes al buen funcionamiento de una oficina de ingeniería e interventoría, y no podrá ceder ni subarrendar total o parcialmente el bien sin autorización previa del arrendador salvo los casos señalados en el artículo 523 del C. Co.

**QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO.** El término de este contrato es de TRES (3) MESES, contados a partir deldía **TRES (03)** del mes de **JULIO de DOS MIL VEINTICINCO (2025),** prorrogables automáticamente por UN MES, si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo, mediante aviso escrito dirigido a la otra parte, dirigido a la otra parte, con treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de sus prórrogas. Cuando el arrendatario haya ocupado no menos de dos años consecutivos el inmueble de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos: 1. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. 2. Cuando el propietario necesita el inmueble para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario.3. Cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. En los casos de los numerales 2 y 3 el arrendador informará al arrendatario con no menos de un mes de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que este se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo anterior los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.

**SEXTA. INDEMNIZACIONES**. Si el propietario no da al apartamento el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados según estimación de peritos y las demás indemnizaciones conforme al artículo 522 del C de C.

**SEPTIMA. SUBARRIENDO**. El arrendatario no podrá sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o inmuebles, ni darles en forma que lesione los derechos del arrendador una destinación distinta a la prevista en el contrato. El arrendatario podrá subarrendar hasta la mitad, el inmueble conla misma limitación. La cesión del contrato será válida cuando la autorice el arrendador o sea consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de comercio.

**OCTAVA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO**. 1. Cancelar el canon o precio de arrendamiento por el valor y la puntualidad establecida en este contrato. 2. Restituir el inmueble a **EL ARRENDATARIO** al terminar este contrato, o sus prorrogas, en el mismo estado en el que lo recibe. 3. Efectuar las mejoras necesarias cuando sea por causa de hechos culposos o dolosos realizados por **EL ARRENDATARIO** o sus dependientes.

**NOVENA. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:** 1. Conceder el uso y goce del inmueble y los elementos que lo integran a **EL ARRENDATARIO** en la fecha y condiciones establecidas en este contrato.

**DECIMA. Incumplimiento del contrato**. El incumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato exija, dará lugar al contratante cumplido a terminar el contrato y a exigir indemnización de los perjuicios causados. Así mismo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del **ARRENDATARIO** dará derecho al **ARRENDADOR** a resolver el contrato, a exigir la restitución inmediata del inmueble, sin necesidad de desahucio ni requerimiento alguno, y a cobrar los perjuicios causados por el incumplimiento.

**DECIMA PRIMERA. Solución de controversias**. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Ubaté. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Manizales quien designara los árbitros requeridos conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento.

**DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL**: El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato, lo constituirá en deudor de la otra por la suma de un canon mensual del arrendamiento

vigente a la fecha del incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del canon y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como -consecuencia del incumplimiento.

**DÉCIMA TERCERA.** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en una hoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**DÉCIMA CUARTA. EFECTOS.** El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato.

Para constancia, firma **EL ARRENDADOR**, en la ciudad y fecha que se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | SUPIA, CALDAS – 03 DE JULIO DE 2025 |

| **EL ARRENDATARIO**<br>**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | **EL ARRENDADOR**<br>**HECTOR WILLIAM BERMÚDEZ NIETO** |
|---|---|
|  |  |
| **NIT.** 901.550.980-0 | **C.C. N°** 1.127.598.011 |
| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|  |  |
| **C.C. N°** 8.461.184 | **C.C. N°** 20.994.969 |

# TRANSPORTES AÉREOS, MARÍTIMOS Y/O TERRESTRES

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: $ 1.436.500,00

Son: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| Relación Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) mes de agosto de 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Fecha** | **No factura** | **Concepto** | | **Valor** |
| 9/08/2025 | No. EFCC2136588 | Transporte Aéreo Neiva - Bogotá Profesional Ambiental | $ | 283.900,00 |
| 9/08/2025 | DEFV457344 | Transporte Aéreo Bogotá - Manizales - Profesional Ambiental | $ | 407.600,00 |
| 9/08/2025 | DEFV457347 | Transporte Aéreo Manizales - Bogotá Profesional Ambiental | $ | 409.100,00 |
| 9/08/2025 | DEFV457801 | Transporte Aéreo Bogotá - Neiva Profesional Ambiental | $ | 337.600,00 |
| | | Transporte Terrestre - Director de Interventoría los días 05, 19, 20 y 21 de agosto de 2025 | $ | 1.112.000,00 |
| | | | | |
| | | Valor Total | $ | 2.550.200,00 |

N.I.T.: 890.704.196-6

# BILLETE DE TRANSPORTE AEREO ELECTRONICO

No. EFCC2136588

## AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar
Bogotá, D.c.
www.latam.com

Fecha de Emisión 09/08/2025
Hora: 10:15

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y/o Razón Social Del Adquirente: | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | Codigo Orden/Reserva: | LA0358708EVUG |
| Número De Identificación y/o NIT: | 901550980 | Medio de Pago: | Instrumento no definido |
| E-Mail: | citecoficinacentral@gmail.com | Forma de Pago: | Contado |

| Item | N° Tiquete | Nombre Pasajero | N° Documento | Cant. | U.M | Descripción | Precio Unitario | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0352244994499 | BELEN CERON QUINTERO | 55058814 | 1.00 | Unidad | Vuelo | $ 283,900.00 | 19.00 | $ 283,900.00 |

Total Ítems: 1

| | |
|---|---|
| Base gravable | $ 283,890.00 |

| | |
|---|---|
| Tarifa | $ 283,900.00 |
| IVA | $ 53,940.00 |
| Otras Tasas e Impuestos | $ 24,000.00 |
| **Valor Total** | **$361,840.00** |

**Responsable de IVA**
**Agente Retenedor sobre el Impuesto a las ventas IVA**
**ACTIVIDAD ECONÓMICA 5112 TARIFA 4,14/1000**
**Somos Grandes Contribuyentes según RES. 012220 de Diciembre 2022**
**AUTORETENEDORES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL SEGÚN DECRETO 399 DEL 26*02/1987 ART 2**

Generado por: Signature South Consulting Colombia S A S.
NIT: 900.508.908
Software: Gosocket

CUDE: 49d656c1b7224dc9f341fbd16cfbe95fa405e84049e803ac436b721cf3cfe5888022c8f3970d609b5bc1827a8f0a392e

**EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL SA**
Nit: 900088915-7
AV el dorado # 103 - 08
Tel: (601)7569090
Bogotá, D.C.
facturas@clicair.co
5111-5121
Responsabilidad: Gran Contribuyente - Autoretenedor. DUT 1625 Art. 1.2.4.4.6

**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA ELECTRONIC**

**DEFV457344**

## Cliente

**Nombre:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
**Dirección:** Calle 26 103-09
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Teléfono:** 3134239264
**NIT:** 901550980
**E-mail:** CITECOFICINACENTRAL@GMAIL.COM;facturacion.electronica@clicair.co

**Fecha:** 09-08-2025
**Forma de pago:** CONTADO
**Medio de pago:** 1-Instrumento No definido
**Moneda:** COP
**Vendedor:** Generico
**Fecha vcto:** 09/08/2025

| Servicio | Descripción | Cantidad | Valor bruto | Valor descuentos | Valor IVA | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS42109505 | VENTA DE TIQUETES FEE | 1 | $25,000.00 | $0.00 | $ 4,750.00 | $29,750.00 |
| CS42109513 | TASAS AEROPORTUARIAS | 1 | $22,600.00 | $0.00 | $ 0.00 | $22,600.00 |
| CS27055509 | VENTA DE TIQUETES TARIFA GV | 1 | $360,000.00 | $0.00 | $ 68,400.00 | $428,400.00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $385,000 | 19 % | $73,150 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $407,600.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **SUBTOTAL** | $407,600.00 |
| **IVA** | $73,150.00 |
| **RETENCIONES** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $480,750.00 |

## Notas

TKTT-BOG-MZL-JRGYZX-MASTERCARD-2460234183195-CERON QUINTERO/BELEN ALEXANDRA

REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000200 DEL 27 DICIEMBRE 2024
SOMOS AGENTES DE RETENCION AL REGIMEN COMUN DE IVA E ICA
Por favor abstenerse de efectuar retención en la fuente en la compra de tiquetes de transporte Aéreos, Articulo 1.2.4.4.6,Decreto 1625 de 2016.
Grandes contribuyentes SHD Res.DDI-032117Oct. 25/2019
PAGOS NACIONALES CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE 231037698
PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA SWIF Pay Directly by Fed Wire ABA 066010720 or FW 066010720 Banco de Bogota Miami Agency Miami, Florida
Swift code or Bank Identifier Code (BIC): BBOGUS3M

Autorización Numeración de Facturación No. 18764075481083 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: DEFV1 hasta: DEFV50000000 Vigencia desde: 2024/07/22 hasta: 7/22/2026 - 24 Meses

**CUFE:** a338492c315b53d153fd24a665ebac682a8f80fe95cbc8c874e5ba8c2aca09b5cb42e8b7fdbbef8de15af22edf89ef00

**FIRMA DIGITAL:** NYLiqebSweZnT1pMCPau6iWFFbcKSFZOcMLfBRybFXlDeydmvVvzFXgAoLZ34o6Ojsypw82m6LLeRtytYGDKnB1OxGMb3feo+1chyF80Y5o3mr8dkQX4zXFNnmddrIcX4f5Y4mQpGn+3GGiyi5Bb+jQjwEU/cgsn84FFyMB90bP5p1opzw5vXCnhIM6aVnPnOk3f79sjFkCUPmpaWGwn3CE43iW0LNxCL4Wft6m8YscaCFAM4hISNyZ1AwIFFJGt/HVtn0qjgp3YWeGGIZKC2yFpDf7ZsX5qYi5//mOG7o+cNrJ4Ac82Yt1kqXOfpmx0+HMO9ffABhwRC/AmO5Odgg==

**FECHA DIAN:** 2025-08-10 02:20:39-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

**EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL SA**
Nit: 900088915-7
AV el dorado # 103 - 08
Tel: (601)7569090
Bogotá, D.C.
facturas@clicair.co
5111-5121
Responsabilidad: Gran Contribuyente - Autoretenedor. DUT 1625 Art. 1.2.4.4.6

**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA ELECTRONIC**

**DEFV457347**

## Cliente

**Nombre:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
**Dirección:** Calle 26 103-09
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Teléfono:** 3134239264
**NIT:** 901550980
**E-mail:** CITECOFICINACENTRAL@GMAIL.COM;facturacion.electronica@clicair.co

**Fecha:** 09-08-2025
**Forma de pago:** CONTADO
**Medio de pago:** 1-Instrumento No definido
**Moneda:** COP
**Vendedor:** Generico
**Fecha vcto:** 09/08/2025

| Servicio | Descripción | Cantidad | Valor bruto | Valor descuentos | Valor IVA | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS42109505 | VENTA DE TIQUETES FEE | 1 | $25,000.00 | $0.00 | $ 4,750.00 | $29,750.00 |
| CS42109513 | TASAS AEROPORTUARIAS | 1 | $24,100.00 | $0.00 | $ 0.00 | $24,100.00 |
| CS27055509 | VENTA DE TIQUETES TARIFA GV | 1 | $360,000.00 | $0.00 | $ 68,400.00 | $428,400.00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $385,000 | 19 % | $73,150 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

## Notas

TKTT-MZL-BOG-FFSGMD-MASTERCARD-2460234183201-CERON QUINTERO/BELEN ALEXANDRA

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $409,100.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **SUBTOTAL** | $409,100.00 |
| **IVA** | $73,150.00 |
| **RETENCIONES** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $482,250.00 |

REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000200 DEL 27 DICIEMBRE 2024
SOMOS AGENTES DE RETENCION AL REGIMEN COMUN DE IVA E ICA
Por favor abstenerse de efectuar retención en la fuente en la compra de tiquetes de transporte Aéreos, Articulo 1.2.4.4.6,Decreto 1625 de 2016.
Grandes contribuyentes SHD Res.DDI-032117Oct. 25/2019
PAGOS NACIONALES CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE 231037698
PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA SWIF Pay Directly by Fed Wire ABA 066010720 or FW 066010720 Banco de Bogota Miami Agency Miami, Florida
Swift code or Bank Identifier Code (BIC): BBOGUS3M

Autorización Numeración de Facturación No. 18764075481083 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: DEFV1 hasta: DEFV50000000 Vigencia desde: 2024/07/22 hasta: 7/22/2026 - 24 Meses

**CUFE:** 081e269b1e27eef607faae817b83128ad58d7eed963645ae343495e3ae6a808a6b7b3cf75cb7f33e10f0f56d74bacc97

**FIRMA DIGITAL:** YKKIA/EjH/OowwDvBhy4eNNbrDCX21FAc2+zoIHS2CcX6gGYK1gifcAoqL0qnnP6Qwy1aKtslhofhJd18X0RAlWRFe0j2xDr24o5nNIPY5hyVNRoepmJyWKnbf2C9a0qsmyzL5OrwgfLCNs3np+Rvf+MPYuZCNg+MxQmIysw6FtGR7PYKV+906suThvi894tkGmbDE3H/RuKlPHy+hulfwS0GteCumE5EfZAWsGdxUyIKmJj8YZQmllSvv5AJX0PTIRYE1JwIGj29LFD1arqW/TnC6TCJLsb6L+d6K+RG2bjAN5QSX0bSmao0SZv95HLExMv2bNvIZblf/Stg2Fd9A==

**FECHA DIAN:** 2025-08-10 02:32:39-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

**EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL SA**
Nit: 900088915-7
AV el dorado # 103 - 08
Tel: (601)7569090
Bogotá, D.C.
facturas@clicair.co
5111-5121
Responsabilidad: Gran Contribuyente - Autoretenedor. DUT 1625 Art. 1.2.4.4.6

**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA ELECTRONIC**

**DEFV457801**

## Cliente

**Nombre:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
**Dirección:** Calle 26 103-09
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Teléfono:** 3134239264
**NIT:** 901550980
**E-mail:** CITECOFICINACENTRAL@GMAIL.COM;facturacion.electronica@clicair.co

**Fecha:** 09-08-2025
**Forma de pago:** CONTADO
**Medio de pago:** 1-Instrumento No definido
**Moneda:** COP
**Vendedor:** Generico
**Fecha vcto:** 09/08/2025

| Servicio | Descripción | Cantidad | Valor bruto | Valor descuentos | Valor IVA | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS42109505 | VENTA DE TIQUETES FEE | 1 | $25,000.00 | $0.00 | $ 4,750.00 | $29,750.00 |
| CS42109513 | TASAS AEROPORTUARIAS | 1 | $22,600.00 | $0.00 | $ 0.00 | $22,600.00 |
| CS27055509 | VENTA DE TIQUETES TARIFA GV | 1 | $290,000.00 | $0.00 | $ 55,100.00 | $345,100.00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $315,000 | 19 % | $59,850 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

## Notas

TKTT-BOG-NVA-KMFDWL-MASTERCARD-2460234183668-CERON QUINTERO/BELEN ALEXANDRA

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $337,600.00 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **SUBTOTAL** | $337,600.00 |
| **IVA** | $59,850.00 |
| **RETENCIONES** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $397,450.00 |

REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000200 DEL 27 DICIEMBRE 2024
SOMOS AGENTES DE RETENCION AL REGIMEN COMUN DE IVA E ICA
Por favor abstenerse de efectuar retención en la fuente en la compra de tiquetes de transporte Aéreos, Articulo 1.2.4.4.6,Decreto 1625 de 2016.
Grandes contribuyentes SHD Res.DDI-032117Oct. 25/2019
PAGOS NACIONALES CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE 231037698
PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA SWIF Pay Directly by Fed Wire ABA 066010720 or FW 066010720 Banco de Bogota Miami Agency Miami, Florida
Swift code or Bank Identifier Code (BIC): BBOGUS3M

Autorización Numeración de Facturación No. 18764075481083 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: DEFV1 hasta: DEFV50000000 Vigencia desde: 2024/07/22 hasta: 7/22/2026 - 24 Meses

**CUFE:** 4390723dc24d1d3e44a4ec20ae2362e3a2cfd657d43fb0877eb1e737378e66111750a6f9c4695c29135e84265f1ae902

**FIRMA DIGITAL:** ha9N+Jw3iZXOy6YnwgJE34fJz/5aU6h0YUAd2dxtTEQWClWJ/p3bqx1b0feXf/ZcerQUVy8tQzVuQohSWd58556GxQl3heOODq6m8QXtHyj/dW3c4RW5vOUKulY
/vlUyDdlt49NujsLL5ZYbO5hIVQxkUHhCl3EovNV6Bwc4bdKHpW+poRIuNa0HPMMkxdGsIOuDh6ezjULvLGMMY1+InXamJ2mmC2xH5Atx4ezc/jLWQCMTzL2M6nHhC
rSIN76vpKlzxUrWPRerdSpTrjrqWwKgOT2Ve9c1qcdzIMlrqTlcB1dxWdujxXEgrvO9MbEx5g0Qcn8i0ENSIDoZ9RNjEg==

**FECHA DIAN:** 2025-08-10 02:37:08-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

Ibagué, Tolima; 31 de agosto de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**GERSON POLOCHE MOSQUERA**

**LA SUMA DE** UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE. **($1.112.000,00),** Por concepto de alquiler de vehículo como transporte terrestre (incluye peajes y combustible) los días 04, 05, 06, 07, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2025, lo anterior para el contrato de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" GRUPO 2"*

Atentamente,

**GERSON POLOCHE MOSQUERA.**
Director de Interventoría
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

**OTROSÍ CONTRATO No CTO-CCCR-VEH-2252-2021-002**

Entre los suscritos, **MARIO CABRERA DUSSÁN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 17.087.167 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL identificado con NIT. 901.550.980-1, quien se denominará CONTRATANTE en el presente documento y **GERSON POLOCHE MOSQUERA** Persona mayor de edad, identificado con la cedula de Ciudadanía **No. C.C 14.139.339 DE IBAGUÉ**, quien se denominará en el presente documento EL CONTRATISTA, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO-CCCR-VEH-2252-2021-002**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de TRES (3) MESES, contando a partir del 03 DE JULIO DE 2025 hasta el 01 DE OCTUBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CTO-CCCR-VEH-2252-2021-002**, el 03 DE JULIO DE 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**



**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**GERSON POLOCHE MOSQUERA**



**CÉDULA:** 14.139.339 DE IBAGUE

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032331584

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| KRS336 | CHEVROLET | TRACKER | 2025 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.199 | GRIS RUSH | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | WAGON | GASOLINA | 5 |

NÚMERO DE MOTOR
L4H*240715037*

REG
N

VIN
8AGEA76C0SR100787

NÚMERO DE SERIE
8AGEA76C0SR100787

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
8AGEA76C0SR100787

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
POLOCHE MOSQUERA GERSON

IDENTIFICACIÓN
C.C. 14139339

---

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482024000301392

VE
I

FECHA IMPORT.
06/06/2024

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE

LT11000032579

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AÑO | MES | DÍA | | AÑO | MES | DÍA | | AÑO | MES | DÍA |
| | 2025 | 7 | 22 | DESDE LAS 00 HORAS DEL | 2025 | 7 | 25 | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | 2026 | 7 | 24 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 92013950 - 612717345 | KRS336 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | PARTICULAR | 1199 | 2025 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | CHEVROLET | WAGON |
| | LÍNEA VEHÍCULO: TRACKER | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| L4H240715037 | 8AGEA76C0SR100787 | 8AGEA76C0SR100787 | 0,00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| GERSON POLOCHE MOSQUERA | 3168776408 | CC | 14139339 | IBAGUE |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 92013950 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 21 | $ 518.100 | $ 269.400 | $ 2.400 |

TOTAL A PAGAR

**$ 789.900**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[2] 701,68[3] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77[1] | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180[4] | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750[5] | |




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.22 14:51:13 -05:00

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

**NIT: 901.550.980 - 0**

**Periodo: AGOSTO DE 2025**

| No. | Fecha | Tipo de Comprobante | No. | Pagado A | Valor | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/08/2025 | Tiquete peaje | 583167 | PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA | $ 16.300,00 | Peaje Cocora |
| 2 | 5/08/2025 | Tiquete peaje | 759816 | U.T PEAJES NACIONALES | $ 12.400,00 | Peaje Tunel de la Línea - Tolima |
| 3 | 5/08/2025 | Tiquete peaje | 2078492 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 20.200,00 | Peaje Circasia |
| 4 | 5/08/2025 | Tiquete peaje | 1475329 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 16.900,00 | Peaje Tarapaca II |
| 5 | 5/08/2025 | Tiquete peaje | 189149 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 15.400,00 | Peaje Santagueda |
| 6 | 5/08/2025 | Tiquete peaje | 903112 | CONCESIÓN PACÍFICO TRES | $ 16.700,00 | Peaje Irra |
| 7 | 8/08/2025 | Combustible | E-509342 | ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL SUPIA | $ 156.007,00 | |
| 8 | 5/08/2025 | Rodamiento | | GERSON POLOCHE MOSQUERA | $ 70.000,00 | Rodamiento vehículo KRS336 |
| 9 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 594063 | PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA | $ 16.300,00 | Peaje Cocora |
| 10 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 600233 | U.T PEAJES NACIONALES | $ 12.400,00 | Peaje Tunel de la Línea - Tolima |
| 11 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 609023 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 20.200,00 | Peaje Circasia |
| 12 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 911135 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 16.900,00 | Peaje Tarapaca II |
| 13 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 1167952 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 15.400,00 | Peaje Pavas |
| 14 | 19/08/2025 | Parqueadero | | EDIFICIO EL CASTILLO P | $ 7.563,00 | |
| 15 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 1098680 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 15.400,00 | Peaje San Bernando |
| 16 | 19/08/2025 | Tiquete peaje | 481119 | CONCESIÓN PACÍFICO TRES | $ 16.700,00 | Peaje Irra |
| 17 | 20/08/2005 | Tiquete peaje | 460303 | CONCESIÓN PACÍFICO TRES | $ 16.700,00 | Peaje Irra |
| 18 | 20/08/2005 | Tiquete peaje | 1104860 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 15.400,00 | Peaje San Bernando |
| 19 | 20/08/2005 | Tiquete peaje | 870669 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 15.400,00 | Peaje San Bernando |
| 20 | 20/08/2005 | Tiquete peaje | 912444 | CONCESIÓN PACÍFICO TRES | $ 16.700,00 | Peaje Irra |
| 21 | 21/08/2005 | Combustible | 359145 | ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LORENZO | $ 228.375,00 | |
| 22 | 21/08/2025 | Tiquete peaje | 460812 | CONCESIÓN PACÍFICO TRES | $ 16.700,00 | Peaje Irra |
| 23 | 21/08/2025 | Tiquete peaje | 776868 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 15.400,00 | Peaje Santagueda |
| 24 | 21/08/2025 | Tiquete peaje | 880121 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 16.900,00 | Peaje Tarapaca II |
| 25 | 21/08/2025 | Tiquete peaje | 2145636 | AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA | $ 20.200,00 | Peaje Circasia |
| 26 | 21/08/2025 | Tiquete peaje | 557586 | U.T PEAJES NACIONALES | $ 12.400,00 | Peaje Tunel de la Línea - Quindio |
| 27 | 21/08/2025 | Tiquete peaje | 506724 | PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA | $ 16.300,00 | Peaje Cocora |
| **TOTAL** | | | | | **$** | **835.245,00** |

RELACION DE GASTOS

# CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT 901.550.980 - 0

**Periodo:** 01/ago/2025 AL 30/ago/2025

| No. | Fecha | Tipo de Comprobante | No. | Pagado A | NIT o C.C. | Ingreso | VALOR | | | | Saldo | DESPRIVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Gasto | IVA | Retencion | Total | | Tipo de gasto | Comentarios |
| 1 | 1/08/2025 | | | VIENEN | | -1,968,763 | | | | 0 | (1,968,763) | | CAJA MES DE MAYO |
| 2 | 5/08/2025 | TIQUETE | 583167 | PATRIMONIO AUTONOMO | 800,053,700 | | $ 16,300 | | | 16,300 | (1,985,063) | PEAJES | CANCELACION PEAJE COCORA |
| 3 | 5/08/2025 | TIQUETE | 759816 | CORFICOLOMBIA SA | 800,256,769 | | $ 12,400 | | | 12,400 | (1,997,463) | PEAJES | CANCELACION TUNEL DE LA LINEA |
| 4 | 5/08/2025 | TIQUETE | 2078492 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 20,200 | | | 20,200 | (2,017,663) | PEAJES | CANCELACION PEAJE CIRCACIA |
| 5 | 5/08/2025 | TIQUETE | 1475329 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 16,900 | | | 16,900 | (2,034,563) | PEAJES | CANCELACION PEAJE TARAPACA II |
| 6 | 5/08/2025 | TIQUETE | 189149 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,049,963) | PEAJES | CANCELACION PEAJE SANTAGUEDA |
| 7 | 5/08/2025 | TIQUETE | 903112 | PACIFICO TRES SAS | 900,763,357 | | $ 16,700 | | | 16,700 | (2,066,663) | PEAJES | CANCELACION PEAJE IRRA |
| 8 | 8/08/2025 | FACTURA | 509342 | CESAR ALBERTO GOMEZ | 15,927,273 | | $ 156,007 | | | 156,007 | (2,222,670) | COMBUSTIBLE | CANCELACION COMBUSTIBLE |
| 9 | 8/08/2025 | RECIBO DE CAJA | | GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14,139,339 | | $ 70,000 | | | 70,000 | (2,292,670) | VEHICULO | RODAMIENTO VEHICULO KRS336 |
| 10 | 19/08/2025 | TIQUETE | 594063 | PATRIMONIO AUTONOMO | 830,053,700 | | $ 16,300 | | | 16,300 | (2,308,970) | PEAJES | CANCELACION PEAJE COCORA |
| 11 | 19/08/2025 | TIQUETE | 600233 | CORFICOLOMBIA SA | 800,256,769 | | $ 12,400 | | | 12,400 | (2,321,370) | PEAJES | CANCELACION PEAJE TUNEL DE LA LINEA |
| 12 | 19/08/2025 | TIQUETE | 609023 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 20,200 | | | 20,200 | (2,341,570) | PEAJES | CANCELACION PEAJE CIRCACIA |
| 13 | 19/08/2025 | TIQUETE | 911135 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 16,900 | | | 16,900 | (2,358,470) | PEAJES | CANCELACION PEAJE TARAPPACA II |
| 14 | 19/08/2025 | TIQUETE | 1167952 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,373,870) | PEAJES | CANCELACION PEAJE PAVAS |
| 15 | 19/08/2025 | TIQUETE | | EDIFIO EL CASTILLO | 810,000,278 | | $ 7,563 | 1,437 | | 9,000 | (2,382,870) | PARQUEADERO | CANCELACION PARQUEADERO |
| 16 | 19/08/2025 | TIQUETE | 1098680 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,398,270) | PEAJES | CANCELACION PEAJE SAN BERNARDO |
| 17 | 19/08/2025 | TIQUETE | 481119 | PACIFICO TRES SAS | 900,763,357 | | $ 16,700 | | | 16,700 | (2,414,970) | PEAJES | CANCELACION IRRA |
| 18 | 20/08/2025 | TIQUETE | 460303 | PACIFICO TRES SAS | 900,763,357 | | $ 16,700 | | | 16,700 | (2,431,670) | PEAJES | CANCELACION IRRA |
| 19 | 20/08/2025 | TIQUETE | 1104860 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,447,070) | PEAJES | CANCELACION PEAJE SAN BERNANRDO |
| 20 | 20/08/2025 | TIQUETE | 870669 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,462,470) | PEAJES | CANCELACION PEAJE SAN BERNANRDO |
| 21 | 20/08/2025 | TIQUETE | 912444 | PACIFICO TRES SAS | 900,763,357 | | $ 16,700 | | | 16,700 | (2,479,170) | PEAJES | CANCELACION PEAJE IRRA |
| 22 | 21/08/2025 | TIQUETE | 359145 | MARIA BETTY VELASQUE | 32,423,939 | | $ 228,375 | | | 228,375 | (2,707,545) | COMBUSTIBLE | CANCELACION COMBUSTIBLE |
| 23 | 21/08/2025 | TIQUETE | 460812 | PACIFICO TRES SAS | 900,763,357 | | $ 16,700 | | | 16,700 | (2,724,245) | PEAJES | CANCELACION PEAJE IRRA |
| 24 | 21/08/2025 | TIQUETE | 776868 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,739,645) | PEAJES | CANCELACION PEAJE SANTAGUEDA |
| 25 | 21/08/2025 | TIQUETE | 880121 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 16,900 | | | 16,900 | (2,756,545) | PEAJES | CANCELACION PEAJE TARAPACA 2 |
| 26 | 21/08/2025 | TIQUETE | 2145636 | AUTOPISTA DEL CAFÉ | 830,025,490 | | $ 20,200 | | | 20,200 | (2,776,745) | PEAJES | CANCELACION PEAJE CIRCASIA |
| 27 | 21/08/2025 | TIQUETE | 557586 | CORFICOLOMBIA SA | 800,256,769 | | $ 15,400 | | | 15,400 | (2,792,145) | PEAJES | CANCELACION PEAJE TUNEL DE LA LINEA |
| 28 | 21/08/2025 | TIQUETE | 506724 | PATRIMONIO AUTONOMO | 830,053,700 | | $ 16,300 | | | 16,300 | (2,808,445) | PEAJES | CANCELACION PEAJE COCORA |
| 29 | 21/08/2025 | | | GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14,139,339 | 600,000 | | | | 0 | (2,208,445) | PEAJES | CANCELACION PEAJE CIRCACIA |
| | | | | | **TOTALES** | **-1,368,763** | **838,245** | **1,437** | **0** | **839,682** | **(2,208,445)** | | |

| BALANCE GENERAL MES DE MAYO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **CONCEPTO** | **Ingreso** | **Egreso** | **Saldo** |
| **02-12-2024** | VIENEN | **(1,968,763)** | | **$ -1,968,763** |
| **03-12-2024** | GASTOS | | **839,682** | **$ -2,808,445** |
| **02-12-2024** | INGRESOS | **600,000** | | **$ -2,208,445** |
| | **TOTAL** | **(1,368,763)** | **839,682** | **$ -2,208,445** |

| | |
|---|---|
| VIATICOS | $ - |
| PEAJES | $ 376,300.00 |
| COMBUSTIBLE | $ 384,382.00 |
| FLETES | $ - |
| PARQUEADERO | $ 9,000.00 |
| REFRIGERIO | $ - |
| VEHICULO | $ 70,000.00 |
| **TOTAL** | **$ 839,682.00** |

**GERSON POLOCHE MOSQUERA**
Director de Interventoria

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0037 Numero 287021

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Cocora

Fecha: 05/08/2025 02:29:19
Numero Tiquete: 583167
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-CnJ
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 137000941010 Atendio: jgnr

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,300
TOTAL: $ 16,300
F. Generacion: 05/08/2025 02:29:19
F. Expedicion: 05/08/2025 02:29:19
Documento en validacion por la DIAN
Cude:59808dac361381abd48c67315f997bf349673
83a16409f7263fe8436a9e61de5a00225d f501f0d
ea0ad408ca59c7e8b

Servicio gratuito al usuario: grua carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: atencionalusuario@appgica.com co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecno ogia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0037 Numero 287021

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Cocora

Fecha: 05/08/2025 02:29:19
Numero Tiquete: 583167
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-CnJ
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 137000941010 Atendio: jgnr

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,300
TOTAL: $ 16,300
F. Generacion: 05/08/2025 02:29:19
F. Expedicion: 05/08/2025 02:29:19
Documento en validacion por la DIAN
Cude:59808dac361381abd48c67315f997bf349673
83a16409f7263fe8436a9e61de5a00225d f501f0d
ea0ad408ca59c7e8b

Servicio gratuito al usuario: grua carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: atencionalusuario@appgica.com co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecno ogia
NIT 809002625-7

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0673 Numero 346801

PEAJE Tunel de la Linea Tolima
Fecha: 05/08/2025 03:43:08
Numero Tiquete: 759816
Carril: Carril 3 Sentido: CAJ-CAL
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 13001599329 Atendio: miv

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12,400
TOTAL $12,400
F. Generacion: 05/08/2025 03:43:08
F. Expedicion: 05/08/2025 03:43:08
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:43f145a9da62756576b438bd2af09fa25e828
6cc0c1e4f17b377dd6c256b20e7823d5e8c3e4c07a
e0492e9d70ecac90b

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo de Tecnologia
NIT 809002625-7

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0673 Numero 346801

PEAJE Tunel de la Linea Tolima
Fecha: 05/08/2025 03:43:08
Numero Tiquete: 759816
Carril: Carril 3 Sentido: CAJ-CAL
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 13001599329 Atendio: miv

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12,400
TOTAL $12,400
F. Generacion: 05/08/2025 03:43:08
F. Expedicion: 05/08/2025 03:43:08
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:43f145a9da62756576b438bd2af09fa25e828
6cc0c1e4f17b377dd6c256b20e7823d5e8c3e4c07a
e0492e9d70ecac90b

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo de Tecnologia
NIT 809002625-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: CIRCASIA
Via: VIA 202
Fecha: 05/08/2025
Hora: 04:52:10
Fecha generación: AGO 05 DE 2025 04:52:31
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 04:52:31
No.: 2078492
Código operador: 1750
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 20.200
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000986790
Transacción ID: 212022078492



CUDE: b96531a5047965ff092567de8d[illegible]7d912900
66eaf89d48871f7e619123f1db383[illegible]fe325b688
29e754aff92c347792

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: CIRCASIA
Via: VIA 202
Fecha: 05/08/2025
Hora: 04:52:10
Fecha generación: AGO 05 DE 2025 04:52:31
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 04:52:31
No.: 2078492
Código operador: 1750
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 20.200
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000986790
Transacción ID: 212022078492



CUDE: b96531a5047965ff092567de8d[illegible]7d912900
66eaf89d48871f7e619123f1db383[illegible]fe325b688
29e754aff92c347792

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 406
Fecha: 05/08/2025
Hora: 05:51:01
Fecha generación: AGO 05 DE 2025 05:51:12
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 05:51:12
No.: 1475329
Código operador: 1764
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.900
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0001226080
Transacción ID: 424061475329



CUDE: 52cd51e2c61247513111a5900fc8a7c31caf
5218e170f713072b994a1382533d1e30bcfcf58695
e3e5578adc8f0f9424

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 406
Fecha: 05/08/2025
Hora: 05:51:01
Fecha generación: AGO 05 DE 2025 05:51:12
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 05:51:12
No.: 1475329
Código operador: 1764
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.900
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0001226080
Transacción ID: 424061475329



CUDE: 52cd51e2c61247513111a5900fc8a7c31caf
5218e170f713072b994a1382533d1e30bcfcf58695
e3e5578adc8f0f9424

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SANTAGUEDA
Vía: VIA 704
Fecha: 05/08/2025
Hora: 06:05:15
Fecha generación: AGO 05 DE 2025 06:05:32
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 06:05:32
No.: 189149
Código operador: 1465
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000102267
Transacción ID: 72704189149



CUDE: 2aecfaef7f549e2c4689c802bb2882916719
6e92bfe6192e11149f5a5ef86addfb5d7c4f4dbd7c
ebd97e691004b9fe3f

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SANTAGUEDA
Vía: VIA 704
Fecha: 05/08/2025
Hora: 06:05:15
Fecha generación: AGO 05 DE 2025 06:05:32
Fecha expedición: AGO 05 DE 2025 06:05:32
No.: 189149
Código operador: 1465
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000102267
Transacción ID: 72704189149



CUDE: 2aecfaef7f549e2c4689c802bb2882916719
6e92bfe6192e11149f5a5ef86addfb5d7c4f4dbd7c
ebd97e691004b9fe3f

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

CONCESIÓN PACÍFICO TRES

ANI

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1274042

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 05/08/2025 06:31:11
Tiquete : 903112
Carril : Carril 2
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002141794

Vigilado SuperTransporte

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 05/08/2025 06:31:11
F. Expedicion: 05/08/2025 06:31:13
Documento en validacion por la DIAN
Cude: f093ad8f38fdc4b70992ec5411bcbb0ed6ec
a0f4d47d529ea25a2b6667c0084c76c4bd05951b14
37762ca8d9ef112efb

Vigilado SuperTransporte

ANI

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión
APP - 006 - 2014

CONCESIÓN PACÍFICO TRES

ANI

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1274042

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 05/08/2025 06:31:11
Tiquete : 903112
Carril : Carril 2
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002141794

Vigilado SuperTransporte

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 05/08/2025 06:31:11
F. Expedicion: 05/08/2025 06:31:13
Documento en validacion por la DIAN
Cude: f093ad8f38fdc4b70992ec5411bcbb0ed6ec
a0f4d47d529ea25a2b6667c0084c76c4bd05951b14
37762ca8d9ef112efb

Vigilado SuperTransporte

ANI

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión
APP - 006 - 2014

CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
NIT 15927273-8
Autorizaci$n Resoluci$n de Facturaci$n No 187640
83503241
PREFIJO Y NUM INTERVALO FVE-200001 AL FVE-100000
0
De 15/11/2024 Hasta 15/11/2026
EDS TERPEL SUPIA
CARRERA 7 NO. 26 - 21
TEL#FONO 3104306291

Factura Electr$nica de Venta No:FV
E-509342

Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
011450395
Fecha y hora de Generaci$n 2025-0
8-08 10:01:13
Fecha y hora de Expedici$n 2025-0
8-08 10:01:13
Lugar de Entrega del Bien CAR
RERA 7 NO. 26

=tem Cod. UND Descripci$n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total

1 8 GL GASOLINA CORRIEN
9.77 $15,968.00 $0.00
$156,007.00

Total =tems: 1

Total Valor Bruto
$156,007.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$156,007.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIËN
TOTAL
T. DEBITO
$156,007.00

Cuenta:

CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
NIT 15927273-8
Autorizaci$n Resoluci$n de Facturaci$n No 187640
83503241
PREFIJO Y NUM INTERVALO FVE-200001 AL FVE-100000
0
De 15/11/2024 Hasta 15/11/2026
EDS TERPEL SUPIA
CARRERA 7 NO. 26 - 21
TEL#FONO 3104306291

Factura Electr$nica de Venta No:FV
E-509342

Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
011450395
Fecha y hora de Generaci$n 2025-0
8-08 10:01:13
Fecha y hora de Expedici$n 2025-0
8-08 10:01:13
Lugar de Entrega del Bien CAR
RERA 7 NO. 26

## Recibo de Caja Menor

No.

| Ciudad | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 03 | 08 | 2025 |

Cancelado a: Carson Polocha. — $ 70.000

Por Concepto de: Rodamiento vehiculo.

Kes. 336.

Valor en letras: Setenta mil Pesos MCTE.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C.___ NIT.___ No. 1418949339 Ibgue


## Recibo de Caja Menor

No.

| Ciudad | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 03 | 08 | 2025 |

Cancelado a: Carson Polocha. — $ 70.000

Por Concepto de: Rodamiento vehiculo.

Kes. 336.

Valor en letras: Setenta mil Pesos MCTE.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C.___ NIT.___ No. 1418949339 Ibgue

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0037 Numero 302985

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Cocora

Fecha: 19/08/2025 05:45:30
Numero Tiquete: 594063
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 137000956364 Atendio: nytv

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,300
TOTAL: $ 16,300
F. Generacion: 19/08/2025 05:45:30
F. Expedicion: 19/08/2025 05:45:30
Documento en validacion por la DIAN
Cude:47c28d7994afbf30493923c660f7f04921c36
a286523b19a72085af9115084436aa2884 d7cdb1f
5c33758c5a381a782

Servicio gratuito al usuario: grua carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: atencionalusuario@appgica.com co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0037 Numero 302985

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Cocora

Fecha: 19/08/2025 05:45:30
Numero Tiquete: 594063
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 137000956364 Atendio: nytv

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,300
TOTAL: $ 16,300
F. Generacion: 19/08/2025 05:45:30
F. Expedicion: 19/08/2025 05:45:30
Documento en validacion por la DIAN
Cude:47c28d7994afbf30493923c660f7f04921c36
a286523b19a72085af9115084436aa2884 d7cdb1f
5c33758c5a381a782

Servicio gratuito al usuario: grua carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: atencionalusuario@appgica.com co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0672 Numero 270386

PEAJE Tunel de la Linea Tolima
Fecha: 19/08/2025 06:48:33
Numero Tiquete: 600233
Carril: Carril 2 Sentido: CAJ-CAL
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 112001238145 Atendio: yura

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 12,400
TOTAL: $ 12,400
F. Generacion: 19/08/2025 06:48:33
F. Expedicion: 19/08/2025 06:48:34
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: de6f430c74eef5e3e51e59f2fd97a6bf38fa9
34e6036fffa37265d2c919e67a21723e65a2a31342
df1ba243f331f51f2

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0672 Numero 270386

PEAJE Tunel de la Linea Tolima
Fecha: 19/08/2025 06:48:33
Numero Tiquete: 600233
Carril: Carril 2 Sentido: CAJ-CAL
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 112001238145 Atendio: yura

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 12,400
TOTAL: $ 12,400
F. Generacion: 19/08/2025 06:48:33
F. Expedicion: 19/08/2025 06:48:34
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: de6f430c74eef5e3e51e59f2fd97a6bf38fa9
34e6036fffa37265d2c919e67a21723e65a2a31342
df1ba243f331f51f2

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 203
Fecha: 19/08/2025
Hora: 08:05:31
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 08:05:47
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 08:05:47
No.: 609023
Código operador: 1564
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 20.200
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000414139
Transacción ID: 21203609023



CUDE: 3b5b689899ac4320600d3b38a6f71858cafc
2781a353dffcd2514e99e5456ff484068d25b54191
95c71fd6bfc2aa38d8

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 203
Fecha: 19/08/2025
Hora: 08:05:31
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 08:05:47
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 08:05:47
No.: 609023
Código operador: 1564
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 20.200
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000414139
Transacción ID: 21203609023



CUDE: 3b5b689899ac4320600d3b38a6f71858cafc
2781a353dffcd2514e99e5456ff484068d25b54191
95c71fd6bfc2aa38d8

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 405
Fecha: 19/08/2025
Hora: 09:21:03
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 09:21:16
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 09:21:16
No.: 911135
Código operador: 1775
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.900
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000824068
Transacción ID: 42405911135



CUDE: 4b39574150f8850222f64367c6ce885c3698
ccb5d45724d1477f19bef8e69c51afe47d6b485ae0
dd768e859ccf1aec86

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 405
Fecha: 19/08/2025
Hora: 09:21:03
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 09:21:16
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 09:21:16
No.: 911135
Código operador: 1775
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.900
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000824068
Transacción ID: 42405911135



CUDE: 4b39574150f8850222f64367c6ce885c3698
ccb5d45724d1477f19bef8e69c51afe47d6b485ae0
dd768e859ccf1aec86

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: PAVAS
Via: VIA 602
Fecha: 19/08/2025
Hora: 09:32:03
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 09:32:12
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 09:32:12
No.: 1167952
Código operador: 1731
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000838127
Transacción ID: 616021167952



CUDE: 4f2c7a063d21f8e0064f5c47a97b404925a7
cba4077642b5e061bad7c45ecb502b0ea611087a7f
4dec6d324fdad3d952

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: PAVAS
Via: VIA 602
Fecha: 19/08/2025
Hora: 09:32:03
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 09:32:12
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 09:32:12
No.: 1167952
Código operador: 1731
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000838127
Transacción ID: 616021167952



CUDE: 4f2c7a063d21f8e0064f5c47a97b404925a7
cba4077642b5e061bad7c45ecb502b0ea611087a7f
4dec6d324fdad3d952

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8



**Edificio El Castillo P.**
**PARQUEADERO**
Cra 23 No. 63-15 Manizales
NIT:810.000.278-9
Régimen Común
Tel. 894 6580
Horario: Lunes a Viernes 7:30 am - 06:3
Sabados 7:30 am a 3 pm, Domingos y Fe
no abrimos.

19-ago.-25 1:13:08 p.m.

**Tipo Vehiculo** Automovil

**Placa** GWR51

**TipoCobro:** Horas

**Fecha Entrada** 19/08/2025

**Hora Entrada** 10:35:13 a.m

**Fecha Salida** 19/08/2025

**Hora Salida** 1:11:36 p.m.

**Valor Sin Iva** $ 7.563,03

**Valor Iva** $ 1.436,97

**Vr Descuento**

**Concepto Dto**

**Valor a Pagar** $ 9.000,00



**Edificio El Castillo P.**
**PARQUEADERO**
Cra 23 No. 63-15 Manizales
NIT:810.000.278-9
Régimen Común
Tel. 894 6580
Horario: Lunes a Viernes 7:30 am - 06:3
Sabados 7:30 am a 3 pm, Domingos y Fe
no abrimos.

19-ago.-25 1:13:08 p.m.

**Tipo Vehiculo** Automovil

**Placa** GWR51

**TipoCobro:** Horas

**Fecha Entrada** 19/08/2025

**Hora Entrada** 10:35:13 a.m

**Fecha Salida** 19/08/2025

**Hora Salida** 1:11:36 p.m.

**Valor Sin Iva** $ 7.563,03

**Valor Iva** $ 1.436,97

**Vr Descuento**

**Concepto Dto**

**Valor a Pagar** $ 9.000,00

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 504
Fecha: 19/08/2025
Hora: 13:53:08
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 13:53:27
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 13:53:27
No.: 1098680
Código operador: 1726
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000595730
Transacción ID: 525041098680



CUDE: 9f77a453775560969c7a023ff0d4f9aebc1e
ac562138ec5b8cfeb5c532be35bd769d8664053080
f2c6df5ff0b1ea1f12

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 504
Fecha: 19/08/2025
Hora: 13:53:08
Fecha generación: AGO 19 DE 2025 13:53:27
Fecha expedición: AGO 19 DE 2025 13:53:27
No.: 1098680
Código operador: 1726
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000595730
Transacción ID: 525041098680



CUDE: 9f77a453775560969c7a023ff0d4f9aebc1e
ac562138ec5b8cfeb5c532be35bd769d8664053080
f2c6df5ff0b1ea1f12

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

CONCESIÓN PACIFICO TRES

ANI

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1336669

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 19/08/2025 14:18:55
Tiquete : 481119
Carril : Carril 1
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 121001966105

Vigilado SuperTransporte

ANI

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 19/08/2025 14:18:55
F. Expedicion: 19/08/2025 14:18:58
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 7920e9f4fd790fb7fe17f196a2f408c1a13c
42393a0a5fa31d70a8fbdc1fa80ec9a1c1eace4ce5
a43fc4c70f3f4b6087

Vigilado SuperTransporte

ANI

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacifico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014

CONCESIÓN PACIFICO TRES

ANI

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1336669

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 19/08/2025 14:18:55
Tiquete : 481119
Carril : Carril 1
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 121001966105

Vigilado SuperTransporte

ANI

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 19/08/2025 14:18:55
F. Expedicion: 19/08/2025 14:18:58
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 7920e9f4fd790fb7fe17f196a2f408c1a13c
42393a0a5fa31d70a8fbdc1fa80ec9a1c1eace4ce5
a43fc4c70f3f4b6087

Vigilado SuperTransporte

ANI

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacifico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014

PEAJE IRRA

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1339218

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 20/08/2025 07:22:30
Tiquete : 460303
Carril : Carril 3 Aux
Operador : 30238***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 126000838897

PEAJE IRRA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 20/08/2025 07:22:30
F. Expedicion: 20/08/2025 07:22:34
Documento en validacion por la DIAN
Cude: ca65aa92b42103cab3459a3e97572a3a61bd
1e0975aef8f420119d6c90b658d3bdb8853a5f6cda
96729a4196fb0a4bd8



PEAJE IRRA



Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE IRRA

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1339218

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 20/08/2025 07:22:30
Tiquete : 460303
Carril : Carril 3 Aux
Operador : 30238***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 126000838897

PEAJE IRRA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 20/08/2025 07:22:30
F. Expedicion: 20/08/2025 07:22:34
Documento en validacion por la DIAN
Cude: ca65aa92b42103cab3459a3e97572a3a61bd
1e0975aef8f420119d6c90b658d3bdb8853a5f6cda
96729a4196fb0a4bd8



PEAJE IRRA



Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 501
Fecha: 20/08/2025
Hora: 07:53:22
Fecha generación: AGO 20 DE 2025 07:53:41
Fecha expedición: AGO 20 DE 2025 07:53:41
No.: 1104860
Código operador: 1778
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000571542
Transacción ID: 515011104860



CUDE: 423270b49aa4b4d12f19d3cf13b32ed6970f
6b7866a9f533440353e8b6ec978ef035dbb777b828
7ef79596f0363f030c

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 501
Fecha: 20/08/2025
Hora: 07:53:22
Fecha generación: AGO 20 DE 2025 07:53:41
Fecha expedición: AGO 20 DE 2025 07:53:41
No.: 1104860
Código operador: 1778
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000571542
Transacción ID: 515011104860



CUDE: 423270b49aa4b4d12f19d3cf13b32ed6970f
6b7866a9f533440353e8b6ec978ef035dbb777b828
7ef79596f0363f030c

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 503
Fecha: 20/08/2025
Hora: 15:28:33
Fecha generación: AGO 20 DE 2025 15:28:46
Fecha expedición: AGO 20 DE 2025 15:28:46
No.: 870669
Código operador: 1723
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000585065
Transacción ID: 52503870669



CUDE: 04635fe194ac1e9bcf6012158ad15f8b20ba
57daf3ae3b47b2530ce1d824b932a49435582ca864
f2f649fe3d1628ba43

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 503
Fecha: 20/08/2025
Hora: 15:28:33
Fecha generación: AGO 20 DE 2025 15:28:46
Fecha expedición: AGO 20 DE 2025 15:28:46
No.: 870669
Código operador: 1723
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000585065
Transacción ID: 52503870669



CUDE: 04635fe194ac1e9bcf6012158ad15f8b20ba
57daf3ae3b47b2530ce1d824b932a49435582ca864
f2f649fe3d1628ba43

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Pacifico Tres S.A.S
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2803

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OPO2 Numero 1340792

Vigilado SuperTransporte

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222
PEAJE IRRA

ANI

Fecha : 20/08/2025 16:18:02
Tiquete : 912444
Carril : Carril 2
Operador : 33994***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002162187

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014
Pacifico Tres S.A.S.
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2803

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 20/08/2025 16:18:02
F. Expedicion: 20/08/2025 16:18:04
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 80baf663b5f356a0119f1b8b7456d1505736d1b3857b6b688929718c89e2aa63b29bf76e35ba1b739d3f60363df952e2

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Vigilado SuperTransporte

Pacifico Tres S.A.S
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2803

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OPO2 Numero 1340792

Vigilado SuperTransporte

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222
PEAJE IRRA

ANI

Fecha : 20/08/2025 16:18:02
Tiquete : 912444
Carril : Carril 2
Operador : 33994***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 122002162187

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014
Pacifico Tres S.A.S.
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2803

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 20/08/2025 16:18:02
F. Expedicion: 20/08/2025 16:18:04
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 80baf663b5f356a0119f1b8b7456d1505736d1b3857b6b688929718c89e2aa63b29bf76e35ba1b739d3f60363df952e2

PEAJE IRRA
Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014
Pacifico Tres S.A.S
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2803

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Vigilado SuperTransporte

ESTACION DE SERVICIO
SAN LORENZO
MARIA BETTY VELASQUEZ DE MARIN
NIT: 32423939 2
TEL: (6)8560 860
CALLE 28 No 9 35
SUPIA CALDAS

FECHA: 2025/08/21 HORA: 10:42:53
ORDEN DE VENTA: 359145
TERMINAL: PCA0GZ

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 00 | 02 | 02 |

**ORIGINAL**

| Codigo<br>Descripcion de Item<br>Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 0<br>CORRIENTE<br>14,229 GL | $16.050 | $228.375 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $228.375 | $0 |
| IMPOC | 0% | $228.375 | $0 |

Discriminacion de Medios de Pago

| | Valor |
|---|---|
| EFECTIVO | $228.375 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $228.375 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $228.375 |

CLIENTE: CONSORCIO CFEF COLOM
C.C./NIT:901550980

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

COMBUSTIBLES GARANTIZADOS
CALIDAD Y CANTIDAD.

ESTACION DE SERVICIO
SAN LORENZO
MARIA BETTY VELASQUEZ DE MARIN
NIT: 32423939 2
TEL: (6)8560 860
CALLE 28 No 9 35
SUPIA CALDAS

FECHA: 2025/08/21 HORA: 10:42:53
ORDEN DE VENTA: 359145
TERMINAL: PCA0GZ

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 00 | 02 | 02 |

ORIGINAL

| Codigo<br>Descripcion de Item<br>Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 0<br>CORRIENTE<br>14,229 GL | $16.050 | $228.375 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $228.375 | $0 |
| IMPOC | 0% | $228.375 | $0 |

Discriminacion de Medios de Pago

| | Valor |
|---|---|
| EFECTIVO | $228.375 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $228.375 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $228.375 |

CLIENTE: CONSORCIO CFEF COLOM
C.C./NIT:901550980

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

COMBUSTIBLES GARANTIZADOS
CALIDAD Y CANTIDAD.

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1343641

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 21/08/2025 11:15:10
Tiquete : 460812
Carril : Carril 3 Aux
Operador : 33994***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 126000839796

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 21/08/2025 11:15:10
F. Expedicion: 21/08/2025 11:15:15
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 3bad8b40a5da196e4260df7207d1c20893bc
18f716be07c3d46d843a5234729c9c1bb2f255355
d1b47ecbefc96789ae

ÑE8680E46A73264BZZZ999F9Ñ

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1343641

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 21/08/2025 11:15:10
Tiquete : 460812
Carril : Carril 3 Aux
Operador : 33994***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 126000839796

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 21/08/2025 11:15:10
F. Expedicion: 21/08/2025 11:15:15
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 3bad8b40a5da196e4260df7207d1c20893bc
18f716be07c3d46d843a5234729c9c1bb2f255355
d1b47ecbefc96789ae

ÑE8680E46A73264BZZZ999F9Ñ

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SANTAGUEDA
Vía: VIA 701
Fecha: 21/08/2025
Hora: 11:42:45
Fecha generación: AGO 21 DE 2025 11:43:09
Fecha expedición: AGO 21 DE 2025 11:43:09
No.: 776868
Código operador: 1287
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000402579
Transacción ID: 71701776868



CUDE: b008e12496c69492955ef5fd3a0f26941302
41ff1ff6ca85e064d61ab0c93555927cb1fb2211aa
fdb016591cac329bbf

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: SANTAGUEDA
Vía: VIA 701
Fecha: 21/08/2025
Hora: 11:42:45
Fecha generación: AGO 21 DE 2025 11:43:09
Fecha expedición: AGO 21 DE 2025 11:43:09
No.: 776868
Código operador: 1287
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000402579
Transacción ID: 71701776868



CUDE: b008e12496c69492955ef5fd3a0f26941302
41ff1ff6ca85e064d61ab0c93555927cb1fb2211aa
fdb016591cac329bbf

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: TARAPACA II
Via: VIA 404
Fecha: 21/08/2025
Hora: 11:57:48
Fecha generación: AGO 21 DE 2025 11:58:02
Fecha expedición: AGO 21 DE 2025 11:58:02
No.: 880121
Código operador: 1792
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.900
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000753752
Transacción ID: 4140488012



CUDE: ecd7d6e7495f04005615fd2033475f6647f2
81e620a518d579cbc497bd18fd460a6e7484957af9
387c1248845a09bc4f

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: TARAPACA II
Via: VIA 404
Fecha: 21/08/2025
Hora: 11:57:48
Fecha generación: AGO 21 DE 2025 11:58:02
Fecha expedición: AGO 21 DE 2025 11:58:02
No.: 880121
Código operador: 1792
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.900
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000753752
Transacción ID: 4140488012



CUDE: ecd7d6e7495f04005615fd2033475f6647f2
81e620a518d579cbc497bd18fd460a6e7484957af9
387c1248845a09bc4f

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 204
Fecha: 21/08/2025
Hora: 13:54:16
Fecha generación: AGO 21 DE 2025 13:54:47
Fecha expedición: AGO 21 DE 2025 13:54:47
No.: 2145636
Código operador: 1746
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 20.200
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0001069140
Transacción ID: 222042145636



CUDE: 5da9053aab7d595fa1717b736d9d2990e9f0
3de591de7d59bb71ef4879b881502e0174f2fca24f
57f038b0c764021ce7

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

---

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 204
Fecha: 21/08/2025
Hora: 13:54:16
Fecha generación: AGO 21 DE 2025 13:54:47
Fecha expedición: AGO 21 DE 2025 13:54:47
No.: 2145636
Código operador: 1746
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 20.200
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0001069140
Transacción ID: 222042145636



CUDE: 5da9053aab7d595fa1717b736d9d2990e9f0
3de591de7d59bb71ef4879b881502e0174f2fca24f
57f038b0c764021ce7

---

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Recibo 0683 Numero 319640

PEAJE Tunel de la Linea Quindio
Fecha: 21/08/2025 14:40:34
Numero Tiquete: 557586
Carril: Carril 3 Sentido: CAL-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 123001420615 Atendio: Sami

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
OBJ: PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cant: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12,400
TOTAL: $12,400
F.Generacion: 21/08/2025 14:40:34
F.Expedicion: 21/08/2025 14:40:34
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: e492152ad009a0cb1174b0429dd6a4d22ddlad
8037d7e51ee135283338976b97644115a1a745a0ac
b6afcff81b46cc2a4

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Recibo 0683 Numero 319640

PEAJE Tunel de la Linea Quindio
Fecha: 21/08/2025 14:40:34
Numero Tiquete: 557586
Carril: Carril 3 Sentido: CAL-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 123001420615 Atendio: Sami

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
OBJ: PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cant: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12,400
TOTAL: $12,400
F.Generacion: 21/08/2025 14:40:34
F.Expedicion: 21/08/2025 14:40:34
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: e492152ad009a0cb1174b0429dd6a4d22ddlad
8037d7e51ee135283338976b97644115a1a745a0ac
b6afcff81b46cc2a4

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0032 Numero 316278

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Cocora

Fecha: 21/08/2025 15:52:33
Numero Tiquete: 506724
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: CAJ-IBA
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 132000815002 Atendio: nyrc

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,300
TOTAL: $ 16,300
F. Generacion: 21/08/2025 15:52:33
F. Expedicion: 21/08/2025 15:52:33
Documento en validacion por la DIAN
Cude:b1b86e3ca60538d607623d0914afb961db11f
33256cc59501c7a0f382e8d27858f36a74078c3aa4
a072468130ed25eff

Servicio gratuito al usuario: grua, carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: atencionalusuario@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0032 Numero 316278

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE Cocora

Fecha: 21/08/2025 15:52:33
Numero Tiquete: 506724
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: CAJ-IBA
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 132000815002 Atendio: nyrc

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,300
TOTAL: $ 16,300
F. Generacion: 21/08/2025 15:52:33
F. Expedicion: 21/08/2025 15:52:33
Documento en validacion por la DIAN
Cude:b1b86e3ca60538d607623d0914afb961db11f
33256cc59501c7a0f382e8d27858f36a74078c3aa4
a072468130ed25eff

Servicio gratuito al usuario: grua, carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: atencionalusuario@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

# COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)

Supia, Caldas., 31 de agosto de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $160.000,00

Son: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** |
| AGOSTO 2025 | Plan Celular Representante Legal - Mario Cabrera Dussán | $ 60,849.98 | $ - | $ 60,849.98 |
| **TOTAL** | | **$ 60,849.98** | **$ -** | **$ 60,849.98** |

**NOTA:** Los valores que se discriminan en el cuadro de comunicaciones se encuentran sin IVA, debido a que este es sumado al final del Acta de Costos.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## MARIO CABRERA DUSSAN

**CIUDAD:** TABIO / CUNDINAMARCA
**DIRECCIÓN:** CALLE 9 NUMERO 0- 77 SECTOR EL HATO ANDE
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 5969085095

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.50200878

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 10-Sep-2025 | 5502008782 | $136,287.97 |

### TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 105 GB + familia y amigos + SMS Ilimitados Todo Destino

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $136,287.97 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-136,287.97 | |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 26-Ago-2025 | 25-Sep-2025 | $48,496.21 | $60,849.98 |
| Cargo fijo mensual | 26-Ago-2025 | 25-Sep-2025 | $2,552.43 | |
| Impuestos | | | $9,801.34 | |

#### EQUIPO A CRÉDITO

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Total equipos financiados | $75,437.99 | $75,437.99 |
| Impuestos | $0.00 | |

#### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:9,699.24 Consumo:102.10 * La tasa de interés moratorio es del 25.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS**: 26-Ago-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN**: 26-Jul-2025 a 25-Ago-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN**: 26-Ago-2025

**TOTAL A PAGAR** $136,287.97

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)550200878210(3902)0136287(97)

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 136,287.97

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

## MARIO CABRERA DUSSAN

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5502008782 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 17087167 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5969085095 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 26-Jul-2025 a 25-Ago-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3134239264 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **12-Sep-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$136,287.97** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**Contrato de Obra No.** 18092024-1274 / 18092024-1295 / 29102024-1472 **Contratista:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 / CONSORCIO MAIC 2024 / CONSORCIO OBRA DP

**Contrato de Interventoría No.** 2252 DE 2021 **Interventoría:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**Objeto Contrato de Obra:**
MANTEMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUCRE - GUARIPA - EL CAUCHAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

**INFORME MENSUAL No.** 26 **MES O PERIODO:** AGO 2025.


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 - 2. |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 4 - 9. |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 16 - 24. |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 25 - 26. |
| 2.1 | Localización | | 26 - 30. |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 30 - 31. |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 31 - 71. |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 72 - 73. |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 74 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 74 |
| 3,1,1 | Información general del contrato 17112023-1630 | | 74 - 75 |
| 3,1,2 | Información general del contrato 18092024-1274 | | 75 |
| 3,1,3, | Información general del contrato 18092024-1295 | | 76 |
| 3.1.4 | Información general del contrato 29102024-1472 | | 76 - 77 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 77 |
| 3.2.1 | Contrato 17112023-1630 | | 77 |
| 3.2.2 | Contrato 18092024-1274 | | 78 - 92. |
| 3.2.3 | Contrato 18092024-1295 | | 92 - 94, |
| 3.2.4 | Contrato 29102024-1472 | | 94 - 108, |
| 3.3 | Seguimiento Items no previstos | | 108 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 108 - 122 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 123 |
| | **Contrato 18092024-1274** | | 123 |
| 4.1.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 125 - 141 |
| 4.2.1 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 142 |
| 4.3.1 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 143 - 144 |
| 4.4.1 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 145 |
| 4.5.1 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 146 |
| 4.6.1 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 147 - 148 |
| 4.7.1 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 149 - 150 |
| 4.8.1 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 151 |
| 4.9.1 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 152 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 153 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 154 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 155 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 124 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 156 - 158 |
| | **Contrato 18092024-1295** | | 160 |
| 4.1.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 162 - 181 |
| 4.2.1 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 182 |
| 4.3.1 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 183 |
| 4.4.1 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 184 |
| 4.5.1 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 185 |
| 4.6.1 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 186 |
| 4.7.1 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 187 - 188 |
| 4.8.1 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 189 - 190 |
| 4.9.1 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 191 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 192 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 193 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 194 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 161 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 195 - 197 |
| | **Contrato 29102024-1472** | | 198 |
| 4.1.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 200 - 214 |
| 4.2.1 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 215 |
| 4.3.1 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 216 |
| 4.4.1 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 217 |
| 4.5.1 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 218 |
| 4.6.1 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 219 |
| 4.7.1 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 220 - 221 |
| 4.8.1 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 222 - 223 |
| 4.9.1 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 224 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 225 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 226 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 227 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 199 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 228 - 231 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 232 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 232 - 234 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 234 - 236 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 236 - 242 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 242 - 244 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 244 - 249 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 249 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | 249 |
| **6** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 250 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 251 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 256 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 254 - 255 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 257 - 258 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 252 - 253 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 260 - 261 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 262 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 259 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 250 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 263 - 265 |
| **8** | **Anexos** | | 266 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 266 - 275 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 276 - 299 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 276 - 299 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 300 -316 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor contrato de interventoría
Resolución de designación No 2611 del 01/08/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2252-2021**

# "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.26
**Original**

**PERIODO**
**01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**SEPTIEMBRE, 2025**

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0
Calle 9 No 0-100, Casa 2, Sector el Hato, Barrio Los Andes, Tabio – C/marca
Celular: 3134239264 - 3133352947
e-mal: consorcioceefcolombiarural@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** agosto-2025

**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1274

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 (3 MESES)
**FECHA DE INICIO:** 3/10/2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 30 DE JULIO DE 2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/09/2025

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2.700.064.310,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 2.700.064.310,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 300.000.000,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 32.038.159,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| RESGUARDO - ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| LA TRINA EMBERA CHAMI | Placa Huella | m | 215 |
| | Camino Ancestral | m | 336 |
| ESCOPETERA Y PIRZA | Placa Huella | m | 716 |
| | Camino Ancestral | m | 1090 |
| CAUROMÁ | Placa Huella | m | 142 |
| | | | |
| CAÑAMOMO LOMAPRIETA | Placa Huella | m | 635 |
| | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| RESGUARDO - ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| LA TRINA EMBERA CHAMI | Placa Huella | m | 25,8 | 25,82 |
| | Camino Ancestral | m | 0,0 | 0,00 |
| ESCOPETERA Y PIRZA | Placa Huella | m | 62,27 | 104,37 |
| | Camino Ancestral | m | 0,0 | 0,00 |
| CAUROMÁ | Placa Huella | m | 0,0 | 0,00 |
| | | | | |
| CAÑAMOMO LOMAPRIETA | Placa Huella | m | 61,30 | 64,03 |
| | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 2.653.461.473,73 | 0,00 | 2.653.461.473,73 |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | 18.000.000,00 | 3.420.000,00 | 21.420.000,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | 25.182.836,32 | 0,00 | 25.182.836,32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 2.696.644.310,05 | 3.420.000,00 | 2.700.064.310 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | #¡REF! | | #¡REF! | #¡REF! |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | #¡REF! | | #¡REF! | #¡REF! |
| | | | | |
| | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | 0,00 | |
| VALOR EJECUTADO | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.228.287.316,19
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 227.021.685,34
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8,56%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 25
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **32**

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA - MEJIAL**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA COMUNIDAD EL BRASIL**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA**



**RESGUARDO INDIGENA DE LA TRINA - TRAMO 1**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

La Interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-031 del 25 de enero de 2025 envía a la Gobernación de Caldas respuesta al comunicado DSI-0030, así mismo se remite la actualización de la tasación de la multa teniendo en cuenta la reprogramación presentada en el modificatorio contractual No 1, prorroga del plazo de ejecución (contrato de obra No 18092024-1274), la cual fue suscrita el 27 de diciembre de 2024, por un plazo de uno punto cinco (1.5) meses, contados a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 15 de febrero de 2025.

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 1/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** agosto-2025

**CONTRATO DE OBRA No.:** 1810/2024-1295

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAC-2024

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2024
**FECHA DE INICIO:** 1/10/2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 13/02/2026
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 1/04/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/09/2025

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 3.568.032.325,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 3.568.032.325,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 713.606.465,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 245.846.741,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| RESGUARDO - ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| CAÑAMOMO - LOMAPRIETA | placa huella | m | 897 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | placa huella | m | 430 |
| | camino ancestral | m | 1985 |
| SAN LORENZO | placa huella | m | 439 |
| | camino ancestral | m | 1398 |
| | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| RESGUARDO - ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| CAÑAMOMO - LOMAPRIETA | placa huella | m | 179,92 | 738,005 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | placa huella | m | 118,1 | 217,1 |
| | camino ancestral | m | 361,97 | 866,97 |
| SAN LORENZO | placa huella | m | 164,15 | 458,01 |
| | camino ancestral | m | 3,93 | 159,93 |
| | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 3.513.609.095,42 | 0,00 | 3.513.609.095,42 |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | 15.000.000,00 | 2.850.000,00 | 17.850.000,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | 36.573.229,00 | 0,00 | 36.573.229,00 |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 3.565.182.324,42 | 2.850.000,00 | 3.568.032.324,42 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | 0,00 | | 0,00 | 2.133.170,68 |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | 0,00 | |
| VALOR EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133.170,68 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.153.576.316,39
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.921.313.277,43
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 84,57%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 42
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 62

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 1/09/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Resguardo Cañamomo-lomaprieta, placa huella: Paneso



Resguardo Cañamomo-lomaprieta, placa huella: Amoladora



sguardo Cañamomo - Lomaprieta, placa huella: Planad



Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1



Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1



Reunion en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta



Resguardo San Lorenzo, placa huella: El Carmelo



Resguardo San Lorenzo, camino ancestral: La Escuela



Resguardo San Lorenzo, camino ancestral: La Pradera



Resguardo San Lorenzo, placa huella : San Jose 2



Resguardo San Lorenzo, placa huella : San Jose 2



Resguardo San Lorenzo, placa huella : Costa Rica



Resguardo La Montaña, camino ancestral: El Salado



Resguardo La Montaña, placa huella : La Esperanza



Resguardo La Montaña, placa huella : La Esperanza



Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Estancia



Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Candelar



sguardo La Montaña, camino ancestral: La Candela

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NO APLICA**

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Technical.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** agosto-2025

**CONTRATO DE OBRA No.:** 29102024-1472

**OBJETO:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2024
**FECHA DE INICIO:** 27/11/2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 31 DE JULIO DE 2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/09/2025

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 898.043.437,75
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 898.043.437,75
**ANTICIPO CONCEDIDO:**
**ANTICIPO AMORTIZADO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| PARCIALIDAD - ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| CARTAMA | Camino Ancestral | m | 1108 |
| LA SOLEDAD | Camino Ancestral | m | 165 |
| ANSEA | Placa Huella | m | 305 |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| RESGUARDO - ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|
| CARTAMA | Camino Ancestral | m | 0,0 | 0,0 |
| LA SOLEDAD | Camino Ancestral | m | 0,0 | 0,0 |
| ANSEA | Placa Huella | m | 149,9 | 177,5 |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 879.413.460,23 | 0,00 | **879.413.460,23** |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | 8.500.000,00 | 1.615.000,00 | **10.115.000,00** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | 8.514.977,52 | 0,00 | **8.514.977,52** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 896.428.437,75 | 1.615.000,00 | **898.043.437,75** |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | 0,00 | | 0,00 | #¡REF! |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡REF! |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | 0,00 | | 0,00 | #¡REF! |
| | | | | |
| | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | 0,00 | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | 0,00 | |
| VALOR EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡REF! |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 265.231.099,61
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 236.319.736,65
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 26,87%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **27**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**RESGUARDO INDIGENA ANSEA - LA QUEBRADA**



**RESGUARDO INDIGENA ANSEA - EL AGUACATE**



**RESGUARDO INDIGENA ANSEA - LA ESCUELA**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NO APLICA**

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 26**
**DEL PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2252-2021**
"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

**CONTRATOS DE OBRA A INTEVENIR**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | RESGUARDOS INDIGENAS |
|---|---|---|
| CALDAS | NEIRA | • DAMASCO |
| | RISARALDA | • LA ALBANIA |
| | BELALCAZAR | • TOTUMAL |
| | RIOSUCIO | • CAÑAMOMO LOMAPRIETA RIOSUCIO<br>• SAN LORENZO<br>• NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA |
| | RIOSUCIO Y SUPÍA | • ESCOPETERA Y PIRZA<br>• CAÑAMOMO LOMAPRIETA SUPÍA<br>• CAUROMA<br>• TRINA EMBERA CHAMI |
| | MARMATO | • CARTAMA |
| | FILADELFIA | • LA SOLEDAD |
| | ANSERMA | • ANSEA |

| CONTROL DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **AREA O ENTIDAD** | **FECHA** |
| **LUZ ANGELA LOZANO** | GESTORA TÉCNICA DEL PROYECTO<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍA (INVIAS) | Julio - 2025 |
| **JULIO ENRIQUE GUEVARA** | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍA (INVIAS) | Julio - 2025 |
| **LUZ LILIANA TIBATA** | SUPERVISORA DEL CONVENIO<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍA (INVIAS) | Julio - 2025 |
| **GERSON POLOCHE** | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | Julio - 2025 |

| CONTROL DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| | | |
| Versión | **Descripción de las Modificaciones** | **Fecha** |
| 0 | Versión original | Julio - 2025 |
| | | |

| TABLA DE CONTROL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Nombre** | **Cargo** | **M.P.N°** | **Firma** |
| **ELABORÓ** | Natalia María Arcos González | Residente de Interventoría | **25202355216 CND** | |
| | Iván Darío Peñaloza Suescun | Residente de Interventoría | **54202-164359 NTS** | |
| | Gerson Poloche Mosquera | Director de Interventoría | **70202128485 TLM** | |

**Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad única del TERRITORIAL DE CALDAS-SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Ninguna parte de este Documento de autoría del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de información y sistema de recuperación sin la previa autorización escrita del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, entidad contratante.**

**TABLA DE CONTENIDO**

PÁG.

0. ANTECEDENTES....16
1. INTRODUCCION....24
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....25
2.1. LOCALIZACIÓN....26
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO....30
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA....31
2.3.1. MUNICIPIO DE SUPIA....31
2.3.2. MUNICIPIO DE RIOSUCIO....52
2.3.3. MUNICIPIO DE ANSERMA....66
2.3.4. MUNICIPIO DE MARMATO....68
2.3.5. MUNICIPIO DE FILADELFIA....69
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....72
3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA....74
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS....74
3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 17112023-1630....74
3.1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 18092024-1274....75
3.1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 18092024-1295....76
3.1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 29102024-1472....76
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....77
3.2.1. CONTRATO No 17112023-1630....77
3.2.2. CONTRATO No 18092024-1274....78
3.2.3. CONTRATO No 18092024-1295....92
3.2.3. CONTRATO No 29102024-1472....94
3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS....108
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA....108
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....123
4.0. CONTRATO No 18092024-1274 (Municipio de Supia)....123

**4.1. INFORMACIÓN SEMANAL** ..... 123
**4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** ..... 123
**4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA** 123
**4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** ..... 123
**4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** ..... 123
**4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** ..... 123
**4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** ..... 123
**4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** ..... 123
**4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL** ..... 124
**4.0. CONTRATO No 18092024-1295 (Municipio de Riosucio)** ..... 160
**4.1. INFORMACIÓN SEMANAL** ..... 160
**4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** ..... 160
**4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA** 160
**4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** ..... 160
**4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** ..... 160
**4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** ..... 160
**4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** ..... 160
**4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** ..... 160
**4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL** ..... 160
**4.0. CONTRATO No 29102024-1472 (Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma)** ..... 198
**4.1. INFORMACIÓN SEMANAL** ..... 198
**4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** ..... 198
**4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA** 198
**4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** ..... 198
**4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** ..... 198
**4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** ..... 198
**4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** ..... 198
**4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** ..... 198

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 198
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 232
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 232
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ..... 234
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES ..... 236
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC ..... 242
5.4.1. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Belalcazar, Risaralda y Neira ..... 242
5.4.2. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Supia ..... 242
5.4.3. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Riosucio ..... 243
5.4.4. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Marmato ..... 243
5.4.5. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Filadelfia ..... 243
5.4.6. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Anserma ..... 243
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS ..... 244
5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA ..... 249
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 250
6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 250
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 250
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 250
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 250
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 250
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 250
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 263
8. ANEXOS ..... 266
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO ..... 266
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS ..... 276
8.2.1. Registro Fotográfico - Municipio de Risaralda, Resguardo Indígena La Albanía ..... 276
8.2.2. Registro Fotográfico - Municipio de Belalcázar, Resguardo Indígena Totumal ..... 278
8.2.3. Registro Fotográfico - Municipio de Neira Resguardo indígena Damasco ..... 279

**8.2.4. Registro Fotográfico - Municipio de Supia** ..... 280
**8.2.5. Registro Fotográfico - Municipio de Riosucio** ..... 288
**8.2.6. Registro Fotográfico - Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma** ..... 296
**8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE** ..... 300

# 0. ANTECEDENTES

## 0.1. PROCESO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LP-SI-007-2021

El programa del Gobierno Nacional **"COLOMBIA RURAL"** además de garantizar la transitabilidad y accesibilidad de la red rural del país, priorizando corredores viales que permitan incrementar la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollan bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, y de beneficiar a las comunidades que hacen parte del CRIDEC, en aras de disminuir los costos de producción y transporte, aumentar comercialización agrícola y avanzar en la reducción de la brecha entre el desarrollo urbano y rural de estas subregiones, busca realizar acompañamiento y seguimiento de los Contratistas de Obra a partir de las Interventorías, razón por la cual, el Instituto Nacional de Vías "INVIAS" mediante la celebración de contratos con contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la Entidad, ha suscrito Contratos de Interventoría para la red vial terciaria a nivel nacional, teniendo como principio ejecutar para los Contratos de Obra la financiación con recursos nación, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. SVR 98837 del 27 de diciembre de 2021.

Por lo anterior y de acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en la minga social por la defensa de la vida, mediante acta 011 del 04 de abril de 2019, la Gobernación de Caldas estructuró y adjudicó el proyecto que tiene por objeto el **MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,** con el fin de apoyar el programa de "Colombia Rural", en el cual proyecta el mejoramiento de vías terciarias en resguardos, parcialidades y asentamientos indígenas en varias subregiones del departamento, a través de placa huella y caminos ancestrales, en aras de disminuir los costos de producción y transporte, aumentar comercialización agrícola y avanzar en la reducción de la brecha entre el desarrollo urbano y rural de estas subregiones.

Es por ello que, la Gobernación de Caldas, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1266 de 2021 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC - EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL, del cual se originó, por parte de la Gobernación de Caldas el Contrato de Obra No. 07022022-0897, el cual tienen como objeto el mejoramiento de vías terciarias en resguardos de ocho (08) municipios del departamento de Caldas (Anserma, Belalcázar, Filadelfia, Marmato, Neira, Riosucio, Risaralda y Supia). Sin embargo, la secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas, liquido unilateral el Contrato de Obra No. 07022022-0897 mediante la Resolución Número 1518-4 del 13 de abril del 2023, por los motivos que se exponen a continuación:

## 0.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA:

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN** | Proceso de licitación pública LP-SI-007-2021 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Gobernación de Caldas |
| **CONTRATISTA** | Consorcio Vial Belén |
| **NIT** | 901.554.843-8 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Samuel Narciso Ramírez De La Hoz |
| **INTEGRANTES** | KONTROLLER SAS (50%), BETCON INGENIERÍA SAS (45%), TECNICAL CIVIL SAS (5%) |
| **TELÉFONO** | +57 300 649 8071 |
| **E-MAIL** | consorciovialbeleninvias@gmail.com |
| **DIRECCIÓN** | Calle 65 No. 30 – 38, Oficina 407 – Edificio vía 30 - Bogotá D.C. |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 07022022-0897 |
| **OBJETO** | Mantenimiento mejoramiento y rehabilitación de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del consejo regional indígena - CRIDEC (enmarcado en el programa Colombia rural), en el departamento de Caldas |
| **VALOR TOTAL INICIAL** | Ocho mil ciento veintitrés millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y un pesos ($8.123.285.331,00) M/CTE |
| **ADICIONES** | N/A |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO** | Ocho mil ciento veintitrés millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y un pesos ($8.123.285.331,00) M/CTE |
| **MODIFICACIONES** | Una (1) – Se modifica la cláusula séptima que establece la apropiación presupuestal del contrato CO1.PCCNTR.3213556.<br><br>Dos (2) – Se modifica la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 07022022-0897, cuadro de presupuesto; en el cual se modifica la unidad de medida de los ítems No. 42-84-115- 128-185 denominados: “ACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR CON DESNIVEL PROMEDIO >=80% (HOMBRO/LOMO DE MULA)”. |
| **ACLARACIONES** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **REANUDACIONES** | N/A |
| **FECHA DE INICIO** | Diecisiete (17) de marzo de 2022 |
| **PLAZO INICIAL** | Siete (7) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | Dieciséis (16) de octubre de 2022 |
| **PRÓRROGA *** | Una (1) – A partir del diecisiete (17) de octubre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022 * |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** | Treinta y uno (31) de diciembre de 2022 * |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>No. 75-44-101119480 y 75-40-101043968 |

*** Prorroga No. 1**: El 28 de septiembre de 2022 se suscribió la prórroga No. 01 al contrato de obra pública No. 07022022-0897 celebrada entre el Departamento de Caldas y el CONSORCIO VIAL BELÉN, con fecha de finalización del contrato el 31 de diciembre del 2022. Sin embargo, de conformidad con el análisis establecido por la Entidad contratante, la prórroga no cumplió con los requisitos de ejecución consagrados en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

A continuación, se presenta el resumen del desarrollo referente al Contrato de Obra No. 07022022-0897:

- La Secretaría de Infraestructura por medio de la Resolución número 5647-4 dio apertura en la plataforma SECOP II, proceso de Licitación Pública LP-SI-007-2021 con el objeto: "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

- Una vez surtido el proceso de verificación y evaluación por el comité se le recomendó al ordenador del gasto, adjudicar el proceso al CONSORCIO VIAL BELÉN; contrato que fue suscrito por un valor de OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($8.123.285.331). Lo anterior se surtió mediante acto administrativo - Resolución número 0117-4 del 12 de enero de 2022.

- De acuerdo a lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, para lo cual, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, adelantó el respectivo proceso contractual del cual obró como resultante la suscripción del contrato de interventoría con el CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, identificado con el NIT 901.550.980-0

- Con ocasión a la orden de inicio dada para el día diecisiete (17) de marzo de 2022, el contratista inició la respectiva socialización con las diferentes comunidades indígenas beneficiarias del proyecto a ejecutar, presentándose situaciones externas con estas comunidades que impidieron el acceso durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022. Una vez se llegó a un acuerdo con los gobernadores indígenas se pudo dar inicio al contrato, sucediendo esto para el mes de junio de 2022.

- El Interventor, de conformidad con las obligaciones contraídas; para el diecinueve (19) de agosto de 2022, mediante documento INV-CIC-2252-2021-088, realiza la siguiente narrativa: En el marco de sus

obligaciones contractuales, esta Interventoría, se ha permitido informar el incumplimiento que presenta el CONSORCIO VIAL BELÉN, debido a que una vez evaluado el avance de obra para el mes de julio de 2022 se tiene una ejecución del 3.0% respecto a una programación de obra del 24%, representando un atraso significativo del 21%, tal y como se pasará a exponer:

- El 01 de abril de 2022, mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-029, la Interventoría solicitó al Contratista un plan de contingencia, teniendo en cuenta que pasados 15 días calendario de la orden de inicio del contrato de obra no se estaba cumpliendo con la programación de ejecución de obra, ni tampoco se evidenciaba la presencia del personal con dedicación completa en la zona del proyecto.

- El 19 de abril de 2022 mediante oficio INV-CIC-2252-2021-037 se informa a la Gobernación de Caldas los documentos no subsanados por parte del Contratista de Obra, entre los cuales se encontraba el plan de contingencia, que a la fecha no ha sido enviado de manera detallada por el Contratista y no permite realizar un debido seguimiento al mismo donde se evidencie desatrasar el programa de inversiones.

- El 02 de agosto de 2022, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-082, se solicita nuevamente al contratista la entrega del plan de contingencia, debido al atraso presentado en el cronograma de obra, atraso que la Interventoría ha manifestado en los comités de obra celebrados, de la misma forma en dichos comité se ha informado al contratista de obra la necesidad de incrementar los frentes de trabajo, con el fin de obtener un avance significativo en la ejecución de las actividades de obra establecidas contractualmente.

- El 04 de agosto de 2022, mediante oficio CVB-PROV-071-08-22, el contratista de obra, da respuesta a lo solicitado en el oficio INV-CIC-2252-2021-082, referente a la solicitud de plan de contingencia, el contratista de obra menciona que se tendrá como plan de contingencia lo siguiente:

  *Se iniciarán más tramos de placas huella y caminos ancestrales en Riosucio y en otros municipios donde haya tramos con fácil acceso de material.*

  *Se hará el ingreso de nuevo personal para atender todos los nuevos tramos que se van a iniciar.*
  *Se comprará volqueta y dos motocarros ayudándonos con el suministro de los diferentes materiales los cuales presentan por el transporte unos costos muy elevados como igual el sobre acarreo*
  *Se incrementará el personal de mano de obra en los tramos que se encuentran en ejecución para evitar el traslado de los mismos de un lado a otro, esto con el fin de optimizar los tiempos de obra.*
  *Se incrementará el equipo mínimo*
  *Se adelantarán compras de materiales para tener un stop representativo en cada municipio intervenido.*

Ante la respuesta del contratista de obra a la solicitud del plan de contingencia, la Interventoría se manifiesta mediante oficio INV-CIC-2252-2021-086 del 09 de agosto de 2022, aclarando que se hace necesario que en el

plan de contingencia establezca información detallada que permita evaluar el avance de ejecución de actividades establecidas contractualmente y que garantice nivelar el atraso de la programación de obra presentada a esta interventoría, ya que al finalizar el mes de julio de 2022 presentaba un atraso del 21%.

- Mediante comunicados INV-CIC-2252-2021-085 del 09 de agosto de 2022 e INV-CIC-2252-2021-089 del 19 de agosto de 2022, se solicita al contratista de obra reactivación de frentes de trabajo, toda vez que en recorrido de seguimiento a los frentes de trabajo que se tienen con desarrollo de actividades y los frentes que se tenían previsto iniciar en el Resguardo de San Lorenzo, el día 8 de agosto de 2022 solo un frente contaba con personal activo, que nuevamente en recorrido de inspección el día 17 de agosto de 2022 se evidencia que solo existe un frente de trabajo activo.

- Con base en lo manifestado por el interventor, la Entidad, haciendo uso de sus facultades conminatorias al cumplimiento contractual ante el contratista de obra, inicia Proceso Administrativo Sancionatorio el día 20 de septiembre de 2022.

- Dentro de los argumentos que presentó el contratista de obra en la etapa de descargos (desarrollo de la audiencia de Proceso Administrativo Sancionatorio, artículo 86 de la ley 1474 de 2011), se encontró que el contrato tuvo dificultades para su inicio debido a los inconvenientes con las comunidades indígenas para la autorización de ingreso a los territorios, por lo tanto, y por ser una causa externa y no imputable al contratista, el ordenador del gasto determinó conducente realizar MODIFICACIÓN - PRÓRROGA al contrato en mención, de manera que el contratista realizó reprogramación de obra para ajustar al nuevo plazo de ejecución. La prórroga quedó propuesta en la diligencia, por un término de DOS MESES Y MEDIO, es decir a partir del 17 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022.

- Los comunicados INV-CIC-2252-2021-143 del 31 de octubre de 2022, INV-CIC-2252-2021-145 del 03 de noviembre de 2022 e INV-CIC-2252-2021-151 del 24 de noviembre de 2022, suscritos por la interventoría CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, la Administración Departamental decide iniciar actuación administrativa sancionatoria, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 86, con la finalidad de declarar la caducidad del contrato y aplicar la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato ante el incumplimiento presentado por el contratista, el cual afecta de manera grave la ejecución del contrato de obra. No obstante, se logró dilucidar en la diligencia que el contratista de obra incumplió con los requisitos de ejecución atinentes a la modificación - prórroga propuesta en audiencia del 20 de septiembre y en concordancia con las disposiciones inmersas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; por lo tanto, el contrato de obra continuó con el plazo inicial: SIETE MESES contados a partir del 17 de marzo hasta el 16 de octubre de 2022. El secretario de Infraestructura, como director de la audiencia, manifiesta que la decisión a adoptarse por parte de la Secretaría es ordenar su archivo por ser improcedente declarar la caducidad contractual a un contrato que, para la fecha de tal actuación, ya había fenecido, por la no acreditación de requisitos de ejecución.

- La Gobernación en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, haciendo uso de los mecanismos de control

establecidos en la normativa vigente, además fundamentándose en el informe recibido por parte del interventor CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-165 del 15 de diciembre de 2022; procede a iniciar la actuación administrativa sancionatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con la finalidad de determinar la inejecución de la obra y otros presuntos incumplimientos por parte del contratista de obra, que darían como resultado la declaratoria de incumplimiento grave del contrato para proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria convenida contractualmente en contrato de obra número 07022022-0897; esto, mediante acto administrativo motivado de manera suficiente.

- En desarrollo de lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra pública, la entidad celebró audiencia de Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, la cual inició el día 26 de diciembre de 2022, realizando varias suspensiones; proceso que tuvo culminación el 13 de febrero de 2023.

- Mediante Acto Administrativo resolución número 0274-4 del 25 de enero de 2023, declaró que el Contratista CONSORCIO VIAL BELÉN, representado legalmente por SAMUEL NARCISO RAMIREZ DE LA HOZ, identificado con cédula de ciudadanía 7.573.021 de Valledupar, incurrió en el incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y como consecuencia del incumplimiento decretado, se hizo efectiva la cláusula penal convenida en el contrato; la cual, de acuerdo a la tasación realizada y aplicado el criterio de proporcionalidad, corresponde a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($2’354.128.088,82) en consideración al valor pendiente de ejecutar del contrato; de los cuales, fueron siniestrados ante la compañía de seguros MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (1’624.657.066,23) y el valor excedente y que no hace parte del amparo de la garantía, es decir, SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTIDÓS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($729.471.022,69) estarán a cargo del contratista de obra el CONSORCIO VIAL BELÉN.

  Que dicho acto administrativo fue recurrido y se decidió el recurso mediante acto administrativo resolución número 0593-4 del 13 de febrero de 2023, reponiendo parcialmente la decisión, pero confirmando tanto el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales como el valor de la cláusula penal pecuniaria.

- Finalizado el plazo de ejecución del contrato, el contratista de obra solo ejecutó el 5.6%, sin embargo, frente a este porcentaje existe obras ejecutadas que no fueron recibidas por la interventoría porque no cumplen con las exigencias contractuales, toda vez que la interventoría debe verificar y certificar que las obras recibidas cumplan con los requerimientos de calidad, normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto, por lo que se precisa que las obras ejecutadas recibidas por la Interventoría corresponden a la sumatoria de las obras físicas más la revisión a diseños lo que representa un 3.4% del valor total del contrato. Decisión que se adopta con fundamento en el resultado de los ensayos de

laboratorio realizados.

La ejecución del contrato N° 07022022-0897 presentó el siguiente balance:

| | | |
|---|---|---|
| **Valor inicial del Contrato ($):** | | $ 8.123.285.331,00 |
| **Adiciones** | | $ 0,00 |
| **Vr. Pago acta 01** | $ 205.283.345,00 | |
| **Vr. Pago acta 02** | $ 112.847.738,00 | |
| **Vr. Pago acta 03** | $ 136.504.053,00 | |
| **Vr. Pago acta 04** | $ 0,00 | |
| **Vr. Pago acta 05** | $ 0,00 | |
| **Saldo del contrato** | $ 7.668.650.195,00 | |
| **Sumas Iguales:** | $ 8.123.285.331,00 | $ 8.123.285.331,00 |

**NOTA ACLARATORIA:**

El valor que corresponde al saldo del contrato ($ 7.668.650.195), al no haberse ejecutado por el contratista Consorcio Vial Belén, dichos recursos fueron OBJETO DE LIBERACIÓN PRESUPUESTAL por parte del Departamento de Caldas - Secretaría de Hacienda.

| **RESUMEN DEL ANTICIPO** | | |
|---|---|---|
| **Valor del Anticipo:** | $ 1.624.657.046,00 | $ 1.624.657.046,00 |
| **Amortización del Anticipo Acta 01** | $ 41.056.669,00 | |
| **Amortización del Anticipo Acta 02** | $ 22.568.548,00 | |
| **Amortización del Anticipo Acta 03** | $ 27.300.811,00 | |
| **Amortización del Anticipo Acta 04** | $ 0,00 | |
| **Amortización del Anticipo Acta 05** | $ 0,00 | |
| **Saldo por amortizar:** | $ 1.533.731.018,00 | |
| **Sumas Iguales:** | $ 1.624.657.046,00 | $ 1.624.657.046,00 |

**NOTA ACLARATORIA:**

El saldo por amortizar a cargo del contratista fue de $1.533.731.018, la INTERVENTORÍA CEEF COLOMBIA RURAL, autorizó $ 1.228.469.171,8 de los cuales se amortizaron $90.926.028,00, pero el saldo real por amortizar es de $1.137.543.143,8, ya que LA FIDUCIARIA aún tiene en la cuenta un saldo de $396.187.874,2

| **ESTADO PROCESAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Legales en Proceso (Incumplimientos) | | | | | |
| **CLASE** | **ETAPA PROCESAL** | **FECHA** | **DESPACHO** | **Nº EXPEDIENTE** | **Nº RESOLUCIÓN** |
| Proceso Administrativo | Acto administrativo (R.0593-4 del 13 de | | Secretaría de Infraestructura | | R.0274-4 del 25 de enero de 2023 |

| ESTADO PROCESAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Legales en Proceso (Incumplimientos) | | | | | | |
| **CLASE** | **ETAPA PROCESAL** | **FECHA** | **DESPACHO** | **Nº EXPEDIENTE** | **Nº RESOLUCIÓN** | |
| (art.86 ley 1174 de 2011 | febrero de 2023) en firme | 13 de febrero de 2023 | | | R.0593-4 del 13 de febrero de 2023 | |
| **ITEM** | | | | | **SI** | **NO** |
| El (La) Contratista ejecutó para el Departamento de Caldas el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto | | | | | | x |
| El (la) suscrito (a) supervisor (a) del contrato de obra verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 | | | | | | x |
| Se verificó la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato, EXCEPTUANDO las garantías correspondientes al modificatorio - prórroga No.1, ya que no fueron aportadas por el contratista para cumplir con requisitos de ejecución. | | | | | | x |

- En virtud de la Resolución Número 0274-4 del 25 de enero de 2023 y Resolución Número 0293-4 del 13 de febrero de 2023, se procedió a la liquidación del Contrato de Obra No. 07022022-097, razón por la cual se remitió el 06 de marzo del 2023 la correspondiente acta de liquidación bilateral para que en un término no mayor a diez (10) días, y en caso de que no tuviera observaciones, la regresará debidamente firmada, preferiblemente de puño y letra (medio físico).

- Dado que el Contratista de Obra CONSORCIO VIAL BELÉN no se manifestó al respecto de dicha acta de liquidación bilateral, en los términos establecidos; la secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas procedió a realizar la liquidación unilateral del contrato mediante la Resolución Número 1518-4 del 13 de abril del 2023.

# 1. INTRODUCCION

El programa del Gobierno Nacional **"COLOMBIA RURAL"** además de garantizar la transitabilidad y accesibilidad de la red rural del país, priorizando corredores viales que permitan incrementar la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollan bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, y de beneficiar a las comunidades que hacen parte del CRIDEC, en aras de disminuir los costos de producción y transporte, aumentar comercialización agrícola y avanzar en la reducción de la brecha entre el desarrollo urbano y rural de estas subregiones, busca realizar acompañamiento y seguimiento de los Contratistas de Obra a partir de las Interventorías, razón por la cual, el Instituto Nacional de Vías "INVIAS" mediante la celebración de contratos con contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la Entidad, ha suscrito Contratos de Interventoría para la red vial terciaria a nivel nacional, teniendo como principio ejecutor para los Contratos de Obra la financiación con recursos nación, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. SVR 98837 del 27 de diciembre de 2021.

Por lo anterior y de acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en la minga social por la defensa de la vida, mediante acta 011 del 04 de abril de 2019, la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS (Subdirección de Vías Regionales),consideraron oportuno adelantar el proceso de selección para la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2, proceso que fue adjudicado al **CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con orden de inicio el 16 de marzo del 2022.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó como **Supervisor del Contrato de Interventoría** al Ing. **JULIO ENRIQUE GUEVERA JARAMILLO**, mediante resolución No. 2611 de 01 de agosto de 2023 y como **Gestor Técnico del Proyecto** la Ing. **LUZ ANGELA LOZANO PARRA hasta el año 2024, a partir del año 2025 el** Ing. **GERMÁN ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.**

En el presente informe mensual de Interventoría se hace una descripción general de las actividades ejecutadas en obra de acuerdo al proyecto y a las gestiones inherentes al cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría en relación con la supervisión, vigilancia y control a la correcta ejecución de los contratos de obra No 17112023-1630, No 18092024-1274, No 18092024-1295 y No 29102024-1472 durante el período del **01 al 31 de agosto de 2025**, en cumplimiento en lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de vías, del 2022.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Contrato de Interventoría tiene por objetivo realizar las labores de vigilancia, control y seguimiento durante la ejecución de los siguientes contratos:

- CONTRATO No 18092024-1295

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO" – LOTE 2

- CONTRATO No 18092024-1274

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA)" – LOTE 1

- CONTRATO No. 29102024-1472

"MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA - MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

En los cuales se debe dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

- Atender las necesidades de mejoramiento y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento rutinario de los corredores rurales en los resguardos y asentamientos que hacen parte del consejo regional indígena -CRIDEC garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.
- Construcción de placa huella y/o caminos ancestrales.
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje.

Así mismo es importante resaltar que todas las actividades constructivas realizadas por parte de los Contratistas de Obra deben cumplir con las Normas de Ensayos de Materiales del Instituto Nacional de vías INVIAS y lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se encuentren vigentes como la Guía de

diseño de pavimentos con Placa Huella, la cual fue adoptada mediante Resolución No 04401 de 2017, siempre y cuando apliquen y la cartilla de obras y drenajes menores del programa Colombia Rural.

## 2.1. LOCALIZACIÓN


Este proyecto se localiza en ocho (08) Municipios del Departamento de Caldas, mencionados anteriormente, en los corredores rurales, en los Resguardos y Asentamientos que hacen parte del Consejo Regional Indígena – CRIDEC. Se ilustra de la siguiente forma:

Fotografía 1. Localización general del proyecto – Departamento de Caldas




Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Mapas de Colombia htpp://www.igac.gov.co

Fotografía 2. Localización general del proyecto – Municipios a Intervenir Departamento de Caldas

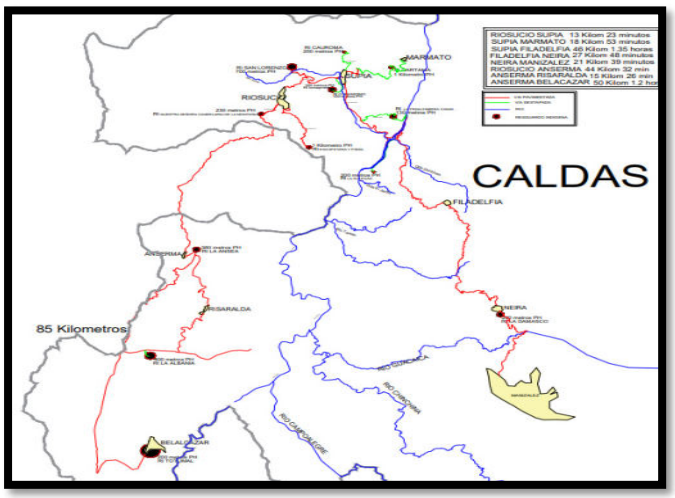



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Mapas de Colombia htpp://www.igac.gov.co

- **MUNICIPIO DE RIOSUCIO**

Se encuentra ubicado en el sector nor-occidental del Departamento de Caldas, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de Colombia; con topografía ondulada y precipitaciones medias anuales de 2.556 milímetros al año. Extensión total: 429,1 km$^2$

El municipio de Riosucio tiene 3 Resguardos Indígenas: *Cañamomo y Lomaprieta, San Lorenzo y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.*


Fotografía 3.Localización Resguardos Indígenas – Municipio Riosucio

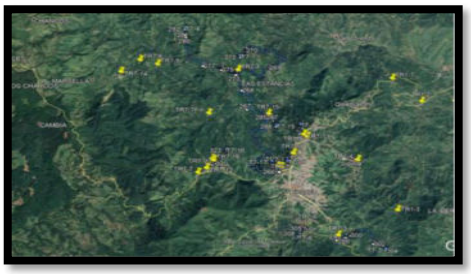

Nuestra Señora Candelaria de la Montaña



Cañamomo Loma Prieta

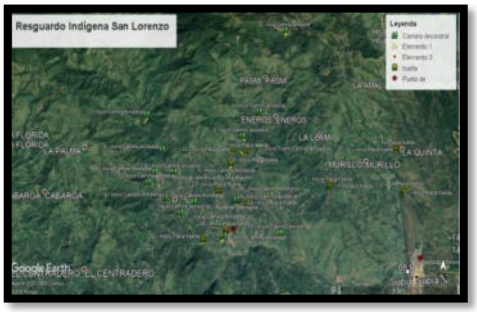


San Lorenzo
Fuente: INVIAS

La meta física a ejecutar corresponde a una longitud total de 1766 m para estructura tipo placa huella y 3383 m para caminos ancestrales.

- **MUNICIPIO DE SUPÍA Y RIOSUCIO**


Se encuentra ubicado en el noroccidente del Departamento de Caldas, Colombia. Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con los municipios de La Merced y Marmato, al occidente y al sur con el Municipio de Riosucio. Extensión total 118,5 km2.

El Municipio de Supía tiene 3 Resguardos Indígenas *Cañamomo y Lomaprieta Supía, Cauroma y La Trina Embera Chami* y el Municipio de Riosucio tiene 1 Resguardo Indígena Escopetera y Pirza


Fotografía 4. Localización Resguardos Indígenas – Municipio de Supia y Riosucio




Cañamomo Lomaprieta

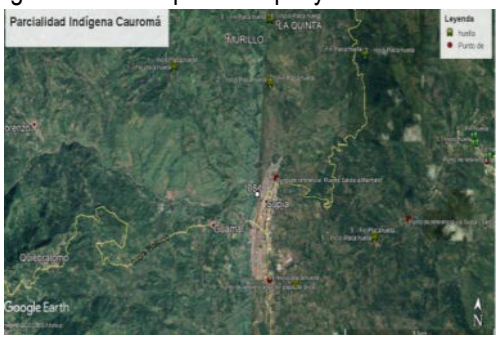


Cauroma

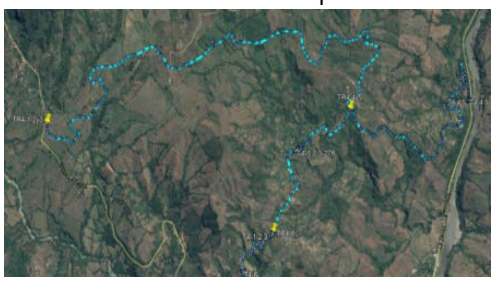

Trina Embera Chami

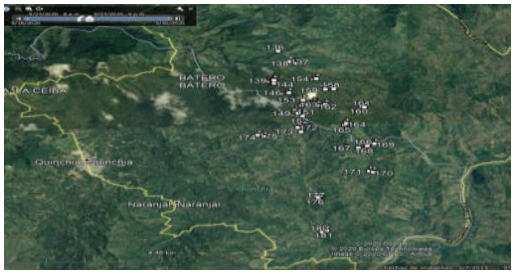

Escopetera y Pirza

Fuente: INVIAS

La meta física a ejecutar corresponde a una longitud total de 1708 m para estructura tipo placa huella y 1426 m para caminos ancestrales.

- **MUNICIPIO DE MARMATO**

Se encuentra ubicado al noroeste del Departamento de Caldas, en el flanco oriental de la cordillera occidental y en la vertiente occidental del río Cauca. Se encuentra topográficamente en el occidente del relieve conocido como el macizo de los mellizos. Sus coordenadas son cinco grados 29 minutos de latitud norte y 75 grados 36 minutos de longitud oeste. Está ubicado a una altura de 1310 metros sobre el nivel del mar. Extensión total: 44 km2.

El Municipio de Marmato tiene una Parcialidad Indígena: *Cartama*

Fotografía 5. Localización Parcialidad Indígena – Municipio de Marmato




Fuente: INVIAS

La meta física a ejecutar corresponde a una longitud total de 1108 m para estructura tipo Camino ancestral.

- **MUNICIPIO DE FILADELFIA**

Se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento de Caldas, posee una extensión total de 193 km², cuenta con una temperatura media de 24 °C y su altura sobre el nivel del mar es de 1.550 m.

El municipio de Filadelfia tiene una Parcialidad Indígena: *La Soledad*

Fotografía 6. Localización Parcialidad Indígena – Municipio de Filadelfia




Fuente: INVIAS


La meta física a ejecutar corresponde a una longitud total de 165 m para estructura tipo Camino ancestral.

- **MUNICIPIO DE ANSERMA**

Se encuentra ubicado al occidente del Departamento de Caldas, enmarcado por los valles de los ríos Cauca y Risaralda sobre la zona montañosa de la cordillera de Belalcázar y una altura de 1.768 metros sobre el nivel del mar. Extensión de 206.4 Km².

El municipio de Anserma tiene un *Parcialidad Indígena: Ansea*

Fotografía 7. Localización Parcialidad Indígena – Municipio de Anserma

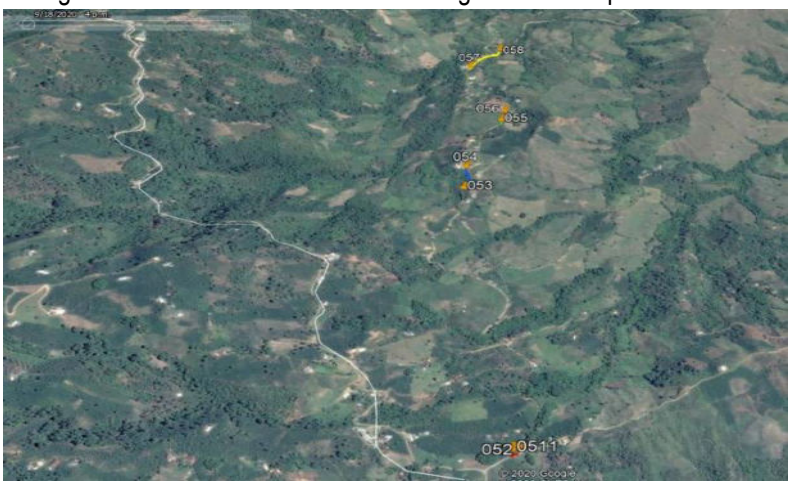


Fuente: INVIAS

La meta física a ejecutar corresponde a una longitud total de 305 m para estructura tipo Placa Huella

## 2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Para este contrato los Municipios del Departamento de Caldas que están en la zona de influencia son los siguientes:

- Municipio de Neira
- Municipio de Risaralda
- Municipio de Belalcázar
- Municipio de Riosucio
- Municipio de Supía
- Municipio de Marmato
- Municipio de Filadelfia
- Municipio de Anserma

Los Beneficios de la ejecución del proyecto son:

- Disminuir los costos de producción y transporte, aumentar comercialización agrícola y avanzar en la reducción de la brecha entre el desarrollo urbano y rural de estas subregiones.
- Promocionar corredores productivos y turísticos que conecten los territorios y potencialicen el campo colombiano.
- Mejorar la competitividad y transitabilidad de los corredores productivos, lograr mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia, disminución en los costos de producción, transporte y comercialización agrícola, entre otros.

El mejoramiento de estos tramos viales permitirá entre otros aspectos:

- Generar ahorros para los usuarios viales, en costos de operación vehicular y en tiempos de recorrido, ofreciendo vías en condiciones físicas homogéneas a lo largo de todo el recorrido.
- Afectar positivamente la calidad de vida por medio de la generación de empleo local durante la construcción del proyecto.
- Alcanzar mayor eficacia medida en cobertura de longitud en kilómetros de red vial intervenida.
- El proyecto permitirá el desarrollo del flujo vehicular y peatonal de forma sostenible en cumplimiento de normas de confort y seguridad, y desde luego, mejorará el acceso a los servicios médicos y educativos de las comunidades indígenas del departamento.

## 2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

### 2.3.1. MUNICIPIO DE SUPIA

- **RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

La Interventoría junto con el Contratista de Obra y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Se encontró una vía compuesta por un carril, con un ancho aproximado de 4.1 metros. La estructura de material en la cual se encuentra la vía, corresponde a material de afirmado, así mismo material de relleno que la comunidad ha estado instalando para el paso de vehículos. Ésta también cuenta con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.

**INVENTARIO DE LA VIA**

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir se evidencio una alcantarilla la cual se encuentra en el Tramo 3 con un diámetro aproximado de 24". no existen más estructuras u obras de drenaje que interfieran o no permitan el desarrollo de las obras. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella:** 215 m – 3 tramos

- Tramo 1 (Vía la Clara – Entrada) - 80 m

Fotografía 8. Tramo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 2 (Vía Guascal) – 50 m

Fotografía 9. Tramo 2





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 3 (Vía Guascal) – 85 m

Fotografía 10. Tramo 3



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Camino Ancestral:** 336 m - 1 tramo

- Gaspar – 336 m

Fotografía 11. Tramo Gaspar





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**

La Interventoría junto con el Contratista de Obra y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

## COMPONENTE CAPA DE RODADURA

Se encontró una vía compuesta por un carril, con un ancho aproximado de 4.5 metros. La estructura de material en la cual se encuentra la vía, corresponde a material de afirmado, así mismo material de relleno que la comunidad ha estado instalando para el paso de vehículos. Ésta también cuenta con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.

## INVENTARIO DE LA VIA

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir se evidenciaron estructuras u obras de drenaje las cuales no interfieren con el desarrollo de la obra. En el tramo de Mejial se debe realizar la demolición de una Placa Huella existente. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella:** 716 m – 8 tramos

- Bonafont - 95 m

Fotografía 12. Tramo Bonafont





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- San Antonio – 80 m

Fotografía 13. Tramo San Antonio




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Florencia – 100 m

Fotografía 14. Tramo Florencia



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Alto Bonito – 80 m

Fotografía 15. Tramo Alto Bonito





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- San Jose 1 – 90 m

Fotografía 16. Tramo San José 1






Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- San José 2 – 80 m

Fotografía 17. Tramo San José 2








Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Pirza – 90 m

Fotografía 18. Tramo Pirza



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Mejial 100 m

Fotografía 19. Tramo Mejial




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Camino Ancestral:** 1090 m **-** 4 tramos

- Bonafot – 300 m

Fotografía 20. Tramo Bonafot



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Quimbaya – 300 m

Fotografía 21. Tramo Quimbaya









Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Agua Bonita - 190 m

Fotografía 22. Tramo Agua Bonita















Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Alto Bonito – 300 m

Fotografía 23. Tramo Alto Bonito





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **RESGUARDO INDÍGENA CAUROMÁ**

La Interventoría junto con el Contratista de Obra y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

## COMPONENTE CAPA DE RODADURA

Se encontró una vía compuesta por un carril, con un ancho aproximado de 4.5 metros. La estructura de material en la cual se encuentra la vía, corresponde a material de afirmado, así mismo material de relleno que la comunidad ha estado instalando para el paso de vehículos. Ésta también cuenta con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.

## INVENTARIO DE LA VIA

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir no se evidencio ninguna estructura u obra de drenaje que interfiera o no permita el desarrollo de la obra. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella:** 142 m – 2 tramos

- Vía Media Caral (La Bodega) - 80 m

Fotografía 24. Tramo Via Media Caral




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- La Divisa – 62 m

Fotografía 25. Tramo La Divisa




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA SUPIA**

La Interventoría junto con el Contratista de Obra y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Se encontró una vía compuesta por un carril, con un ancho aproximado de 4.5 metros. La estructura de material en la cual se encuentra la vía, corresponde a material de afirmado, así mismo material de relleno que la comunidad ha estado instalando para el paso de vehículos. Ésta también cuenta con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.

**INVENTARIO DE LA VIA**

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir no se evidencio ninguna estructura u obra de drenaje que interfiera o no permita el desarrollo de la obra. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella:** 635 m – 8 tramos

- Vía San Pablo Sector el Guaico - 100 m

Fotografía 26. Tramo San Pablo – El Guaico



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Vía San Pablo Sector Granatal – 100 m


Fotografía 27. Tramo San Pablo Granatal




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Vía Comunidad el Brasil – 100 m

Fotografía 28. Tramo Comunidad el Brasil

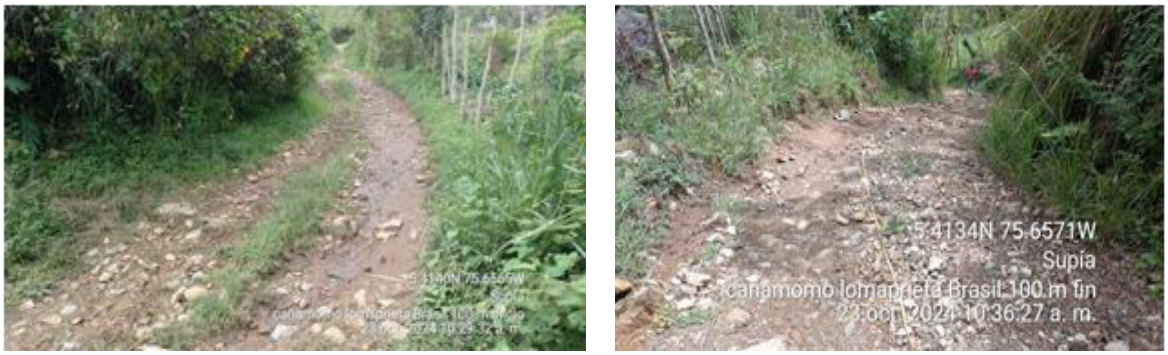


Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Vía Alto Sevilla Sector Santa Elena – 90 m

Fotografía 29. Tramo Alto Sevilla




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Vía de Tizamal – 85 m

Fotografía 30. Tramo Tizamal




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Vía Santa Ana Parte Alta 1 – 39 m

Fotografía 31. Tramo Santa Ana Parte Alta 1




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Vía Santa Ana Parte Alta 2 – 41 m

Fotografía 32. Tramo Santa Ana Parte Alta 2




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Comunidad Dosquebradas - 80 m

Fotografía 33. Tramo Comunidad Dosquebradas




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 2.3.2. MUNICIPIO DE RIOSUCIO

- **Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta**

El consorcio CEEF Colombia Rural como interventor, el Consorcio MAIC-2024 como contratista de obra, guiados por un delegado del resguardo, realizan de manera conjunta visita a los sitios donde se realizarán las obras para que el delegado del resguardo indique la ubicación del inicio de cada intervención. De esta visita a obra se obtiene la siguiente información:

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Los diferentes puntos de intervención se ubican sobre una vía que presenta un solo carril, con un ancho promedio de vía de 4.15 metros, la cual se encuentra en terreno natural con mejoras realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña con diámetro menor a 10 centímetros para mejorar el paso de los vehículos en los puntos más críticos, cunetas en tierra, en sección a media ladera con cultivos de café y plátano o vegetación nativa a los lados.

**INVENTARIO DE LA VÍA**

Dentro de los tramos de intervención no se ha encontrado obras de infraestructura previas a la ejecución del presente contrato, a excepción del frente de Iberia Baja que presenta dos alcantarillas de 24" las cuales se presumen realizadas por la comunidad ya que una de ellas presenta el descole desplomado y sin aletas con peligro de volcamiento por estas condiciones ; dentro del sector del frente de Cañamomo 2 presenta una tubería de PVC DE 14 " solo con cabezote para el paso de aguas lluvias, se hace necesario para la estabilidad de la placa huella la construcción de la estructura de descole y alargar en 1,50 metros mínimo la longitud de la tubería existente, el frente de Portachuelo 2 entrega el agua de la cunetas a una alcantarilla existente de 24".
De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella**: 897 m – 8 tramos

- Planadas – 157 m

Fotografía 34. Tramo Planadas



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Cañamomo 1 – 100 m

Fotografía 35. Tramo Cañamomo 1




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Cañamomo 2 – 100 m

Fotografía 36. Tramo Cañamomo 2



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Iberia Baja – 170 m

Fotografía 37. Tramo Iberia Baja



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Portachuelo 1 – 120 m

Fotografía 38. Tramo Portachuelo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Portachuelo 2 – 50 m

Fotografía 39. Tramo Portachuelo 2



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Panesso – 100 m

Fotografía 40. Tramo Panesso



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Amolador – 100 m

Fotografía 41. Tramo Amolador



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Resguardo Indígena Nuestra Señora de la Montaña**

El consorcio CEEF Colombia Rural como interventor, el Consorcio MAIC-2024 como contratista de obra, guiados por un delegado del resguardo, realizan de manera conjunta visita a los sitios donde se realizarán las obras para que el delegado del resguardo indique la ubicación del inicio de cada intervención. De esta visita a obra se obtiene la siguiente información:

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Los diferentes puntos de intervención para la obra de Placa Huella se ubican sobre una vía que presenta un solo carril, con un ancho promedio de vía de 4.00 metros, la cual se encuentra en terreno natural con mejoras realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña con diámetro menor a 10 centímetros para mejorar el paso de los vehículos en los puntos más críticos, cunetas en tierra, en sección a media ladera con cultivos de café y plátano o vegetación nativa a los lados. Así mismo para la obra de Camino Ancestral se ubican sobre un camino, con un ancho promedio de 1.5 metros, el cual se encuentra en terreno natural con mejores realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña para mejorar el paso de la comunidad y los animales de carga en los puntos más críticos

**INVENTARIO DE LA VÍA**

Dentro de los tramos de intervención no se ha encontrado obras de infraestructura previas a la ejecución del presente contrato, a excepción del frente de La Esperanza que entrega el agua de las cunetas a una estructura de un puente modulado metálico.

De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella**: 430 m – 3 tramos

- La Cabaña – 115 m

Fotografía 42. Tramo La Cabaña



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Ubarba – 115 m

Fotografía 43. Tramo Ubarba



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- La Esperanza – 200 m

Fotografía 44. Tramo La Esperanza



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Camino Ancestral**: 1985 m – 7 tramos

- La Candelaria – 400 m


Fotografía 45. Tramo La Candelaria



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tumbabarreto – 285 m

Fotografía 46. Tramo Tumbabarreto

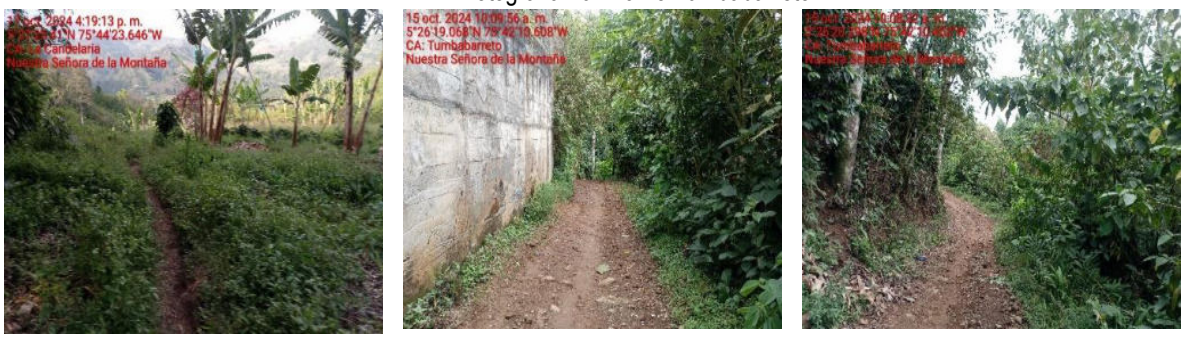

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Las Minas – 200 m


Fotografía 47. Tramo Las Minas



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Las Estancias – 200 m

Fotografía 48. Tramo Las Estancias

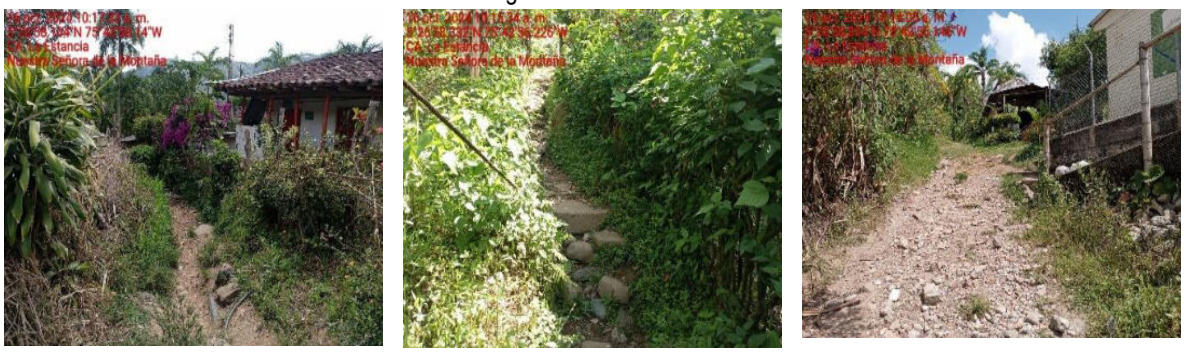

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- El Salado – 300 m

Fotografía 49. Tramo El Salado




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- El Eden – 200 m

Fotografía 50. Tramo El Eden



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Santa Inés – 400 m

Fotografía 51. Tramo Santa Ines



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Resguardo Indígena San Lorenzo**

El consorcio CEEF Colombia Rural como interventor, el Consorcio MAIC-2024 como contratista de obra, guiados por un delegado del resguardo, realizan de manera conjunta visita a los sitios donde se realizarán las obras para que el delegado del resguardo indique la ubicación del inicio de cada intervención. De esta visita a obra se obtiene la siguiente información:

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Los diferentes puntos de intervención para la obra de Placa Huella se ubican sobre una vía que presenta un solo carril, con un ancho promedio de vía de 4.15 metros, la cual se encuentra en terreno natural con mejoras realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña con diámetro menor a 10 centímetros para mejorar el paso de los vehículos en los puntos más críticos, cunetas en tierra, en sección a media ladera con cultivos de café y plátano o vegetación nativa a los lados. Así mismo para la obra de Camino Ancestral se ubican sobre un camino, con un ancho promedio de 1.5 metros, el cual se encuentra en terreno natural con mejores realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña para mejorar el paso de la comunidad y los animales de carga en los puntos más críticos

**INVENTARIO DE LA VÍA**

Dentro de los tramos de intervención no se ha encontrado obras de infraestructura previas a la ejecución del presente contrato.

De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella**: 430 m – 6 tramos

- San Jose 1 – 65 m

Fotografía 52. Tramo San Jose 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- San Jose 2 – 99 m

Fotografía 53. Tramo San Jose 2




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Costa Rica – 65 m

Fotografía 54. Tramo Costa Rica




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Llano Grande – 65 m

Fotografía 55. Tramo Llano Grande




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- El Carmelo – 65 m

Fotografía 56. Tramo El Carmelo



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Centro Poblado – 80 m

Fotografía 57. Tramo Centro Poblado




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Camino Ancestral**: 1398 m – 17 tramos

- Veneros – 78 m

Fotografía 58. Tramo Veneros





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- San Miguel – 78 m

Fotografía 59. Tramo San Miguel





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- El Roble – 150 m

Fotografía 60. Tramo El Roble





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- El Tunzara – 78 m

Fotografía 61. Tramo Tunzara





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- El Cacho – 78 m

Fotografía 62. Tramo El Cacho





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Taparco – 78 m

Fotografía 63. Tramo Taparco





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- La Escuela – 78 m

Fotografía 64. Tramo La Escuela




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Honduras – 78 m

Fotografía 65. Tramo Honduras




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- La Pradera – 78 m

Fotografía 66. Tramo La Pradera



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Buenos Aires – 78 m

Fotografía 67. Tramo Buenos Aires



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Pasmi – 78 m
- Jagual – 78 m
- Sisirra – 78 m

Fotografía 68. Tramo Sisirra



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tres Esquinas – 78 m

Fotografía 69. Tramo Tres Esquinas



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Once Casas – 78 m

Fotografía 70. Tramo Once Casas



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Danubio – 78 m
- La Línea – 78 m

### 2.3.3. MUNICIPIO DE ANSERMA

- **PARCIALIDAD INDÍGENA ANSEA**

La Interventoría junto con el Contratista de Obra, el Gobernador de la Parcialidad Indigna y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Se encontró una vía compuesta por un carril, con un ancho aproximado de 4.1 metros. La estructura de material en la cual se encuentra la vía, corresponde a material de afirmado, así mismo material de relleno que la comunidad ha estado instalando para el paso de vehículos. Ésta también cuenta con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.

**INVENTARIO DE LA VIA**

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir no se evidencio ninguna obra de arte u obras de drenaje que interfieran o no permitan el desarrollo de las obras, a excepción del frente Tramo 1 (La Escuela) que entrega el agua de la cuneta izquierda a una caja en material natural.
. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Placa Huella:** 305 m – 3 tramos

- Tramo 1 (La Escuela) - 135 m

Fotografía 71. Tramo 1 (La Escuela)





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 2 (El Aguacate) - 61 m

Fotografía 72. Tramo 2 (El Aguacate)





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 3 (La Quebrada – La Cancha) - 109 m

Fotografía 73. Tramo 3 (La Quebrada - La Cancha)





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 2.3.4. MUNICIPIO DE MARMATO

- **PARCIALIDAD INDÍGENA CARTAMA**

La Interventoría junto con el Contratista de Obra, la Gobernadora de la Parcialidad Indigna y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

**COMPONENTE CAPA DE RODADURA**

Se encontraron Caminos con un ancho promedio de 1.5 metros, los cuales se encuentran en terreno natural con mejores realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña para mejorar el paso de la comunidad y los animales de carga en los puntos más críticos. Éstos también cuentan con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.


**INVENTARIO DE LA VIA**

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir no se evidencio ninguna obra de arte u obras de drenaje que interfieran o no permitan el desarrollo de las obras. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Camino Ancestral:** 1108 m – 3 tramos

- Tramo 1 (Centro Poblado San Juan Iglesia) - 217 m

Fotografía 74. Tramo 1 (Centro Poblado San Juan Iglesia)

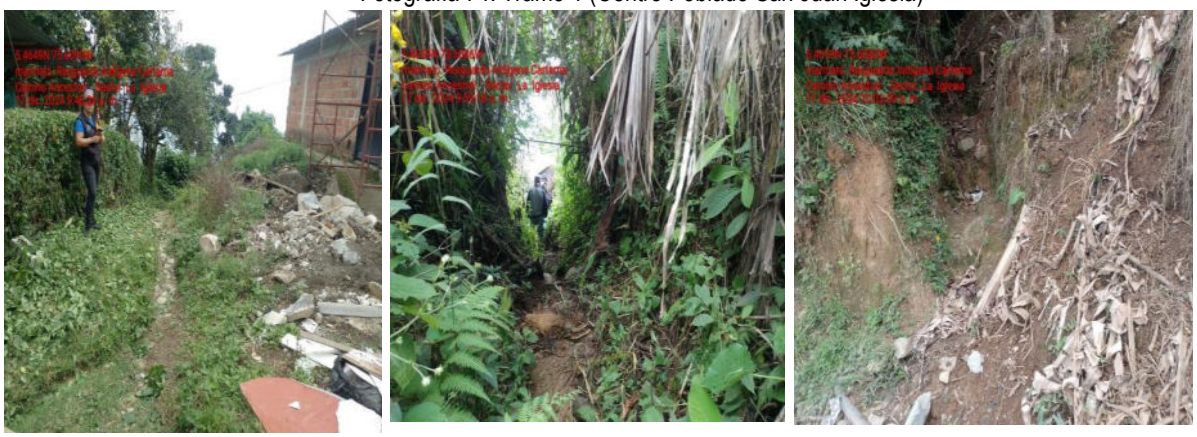

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 2 (Comunidad Jimenez Alto a Quebrada) - 304 m

Fotografía 75. Tramo 2 (Comunidad Jimenez Alto a Quebrada)






Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 3 (Monterredondo) - 587 m

Fotografía 76. Tramo 3 (Monterredondo)



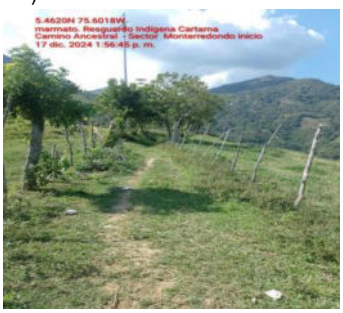


Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 2.3.5. MUNICIPIO DE FILADELFIA

### - PARCIALIDAD INDÍGENA LA SOLEDAD

La Interventoría junto con el Contratista de Obra, el Gobernador de la Parcialidad Indigna y los diferentes Cabildos de la zona realizaron visita técnica, (recorrido) por cada uno de los tramos a intervenir, teniendo así la siguiente descripción del estado inicial de la vía y su respectivo inventario.

### COMPONENTE CAPA DE RODADURA

Se encontraron Caminos con un ancho promedio de 1.5 metros, los cuales se encuentran en terreno natural con mejores realizadas por la comunidad con material rocoso y material de peña para mejorar el paso de la comunidad

y los animales de carga en los puntos más críticos. Éstos también cuentan con material vegetal abundante a cada lado, predominando arbustos de mediana altura y pastos.

**INVENTARIO DE LA VIA**

Durante el recorrido por los diferentes tramos a intervenir no se evidencio ninguna obra de arte u obras de drenaje que interfieran o no permitan el desarrollo de las obras. De lo anterior se tiene el siguiente registro:

**Camino Ancestral:** 165 m – 5 tramos

- Tramo 1 (Sector el Filo) - 25 m


Fotografía 77. Tramo 1 (Sector el Filo)



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 2 (El Caserío) - 25 m

Fotografía 78. Tramo 2 (El Caserío)

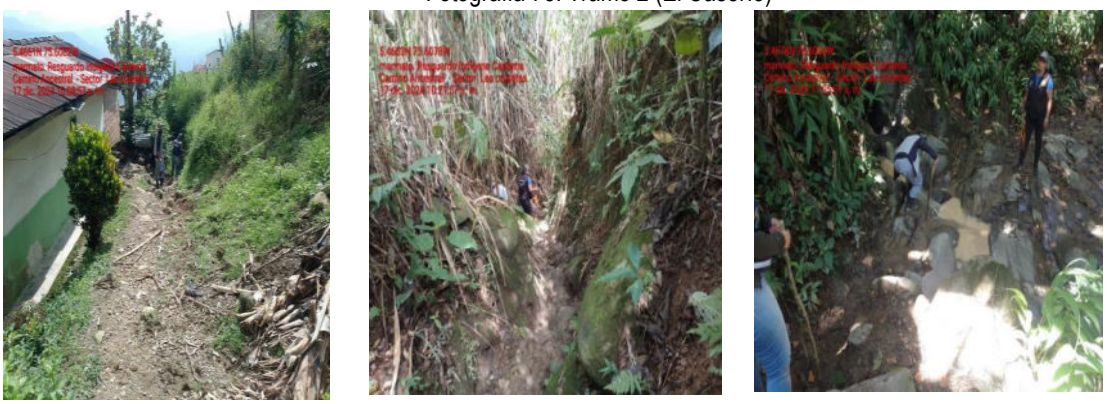

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 3 (El Cartucho Cabecera) - 30 m

Fotografía 79. Tramo 3 (El Cartucho Cabecera)



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 4 (Cartucho Pie) - 25 m

Fotografía 80. Tramo 4 (Cartucho Pie)



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- Tramo 5 (La Y) - 60 m

Fotografía 81. Tramo 5 (La Y)



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Al ser un proyecto financiado en el marco del programa “Colombia rural” y de acuerdo a la cartilla del INVIAS "OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL” se tiene el diseño tipo de la estructura de pavimento placa-huella, caminos ancestrales y Obras de drenaje menor (Alcantarilla) que hacen parte integral de la calzada de una carretera.

- **Estructura Placa Huella**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espesor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendrán sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varía entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

- **Caminos Ancestrales**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de 3000 psi, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8’’ y flejes cada 0.25 m de 1/4’’; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo para cada Municipio es la siguiente:

Tabla 1. Metas físicas obras a ejecutar

| MUNICIPIO | DISEÑO TIPO | LONGITUD (m) | TRAMOS |
|---|---|---|---|
| **NEIRA** | PLACA HUELLA | 177 | 3 |
| **RISARALDA** | PLACA HUELLA | 285 | 4 |
| **BELALCÁZAR** | PLACA HUELLA | 160 | 3 |
| **SUPIA** | PLACA HUELLA | 1708 | 21 |
| | CAMINO ANCESTRAL | 1426 | 5 |
| **RIOSUCIO** | PLACA HUELLA | 1766 | 17 |

| MUNICIPIO | DISEÑO TIPO | LONGITUD (m) | TRAMOS |
|---|---|---|---|
| | CAMINO ANCESTRAL | 3383 | 24 |
| **ANSERMA** | PLACA HUELLA | 305 | 3 |
| **MARMATO** | CAMINO ANCESTRAL | 1108 | 3 |
| **FILADELFIA** | CAMINO ANCESTRAL | 165 | 5 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

# 3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA

## 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

### 3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 17112023-1630

Tabla 2. Información Contrato de obra No. 17112023-1630

| **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección** | SAMC-SI-052-2023 |
| **Número del contrato** | 17112023-1630 |
| **Objeto** | MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, (RESGUARDOS INDIGENAS LA ALBANIA, TOTUMAL Y DAMASCO) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS" |
| **Contratista** | INNOVA PROYECTOS SAS |
| **NIT** | 900.359.695-5 |
| **Valor Total Inicial** | $ 815.513.513,73 |
| **Adiciones** | N/A |
| **Valor acumulado del contrato** | $ 815.513.513,73 |
| **Modificaciones** | N/A |
| **Aclaraciones** | N/A |
| **Fecha de Iniciación y terminación** | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Plazo Inicial** | UN (1) MES |
| **Prorrogas** | SI – CINCO (5) |
| **Prorroga 1** | CUATRO (4) MESES, A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **Prorroga 2** | UN (1) MES, A PARTIR DEL 01 MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 |
| **Prorroga 3** | UN (1) MES Y 4 DIAS, A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **Prorroga 4** | UN (1) MES Y 20 DÍAS, A PARTIR DEL 01 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **Prorroga 5** | UN (1) MES, A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Suspensiones 1** | SI – UNA (1) |
| **Fecha Suspensión 1** | 10 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 |
| **Prórroga 1 a la suspensión 1** | 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 |
| **Prórroga 2 a la suspensión 1** | 02 DE AGOSTO DE 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **Fecha Reanudación** | 06 DE AGOSTO DE 2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Terminación Actual del contrato** | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Dirección** | Carrera 18 # 4ª – 92 Barrio la Francia |
| **Número de Teléfono** | 3218110913 – 3145077334 - 8891270 |

Fuente: INNOVA PROYECTOS SAS

### 3.1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 18092024-1274

Tabla 3.Información Contrato de obra No. 18092024-1274

| **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección** | LP-SI-024-2023 |
| **Número del contrato** | 18092024-1274 |
| **Objeto** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1). |
| **Contratista** | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| **NIT** | 901.864.199-2 |
| **Valor Total Inicial** | $ 2.700.064.310 |
| **Adiciones** | N/A |
| **Valor acumulado del contrato** | $ 2.700.064.310 |
| **Modificaciones** | N/A |
| **Aclaraciones** | N/A |
| **Fecha de Iniciación y terminación** | 03 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Plazo Inicial** | TRES (3) MESES |
| **Prorrogas** | SI – DOS (2) |
| **Prorroga 1** | UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Prorroga 2** | DOS (2) MESES, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Suspensiones 1** | 14 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Fecha reanudación** | 30 DE JULIO DE 2025 |
| **Fecha de Terminación Actual del contrato** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Dirección** | MZ 4 E LT 16 BRR EL ALIVIO |
| **Número de Teléfono** | 3174281136 |

Fuente: CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

### 3.1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 18092024-1295

Tabla 4. Información Contrato de obra No. 18092024-1295

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección** | LP-SI-024-2023 |
| **Número del contrato** | 18092024-1295 |
| **Objeto** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2) |
| **Contratista** | CONSORCIO MAIC 2024 |
| **NIT** | 901.866.191-3 |
| **Valor Total Inicial** | $ 3.568.032.325 |
| **Adiciones** | N/A |
| **Valor acumulado del contrato** | $ 3.568.032.325 |
| **Modificaciones** | N/A |
| **Aclaraciones** | N/A |
| **Fecha de Iniciación y terminación** | 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Plazo Inicial** | TRES (3) MESES |
| **Prorrogas** | SI – DOS (2) |
| **Prorroga 1** | UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Prórroga 2** | DOS PUNTO DOS (2.2) MESES, A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Suspensiones 1** | 13 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Fecha reanudación** | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **Fecha de Terminación Actual del contrato** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Dirección** | Calle 36 # 27-71 of 810 |
| **Número de Teléfono** | 6016826902 |

Fuente: CONSORCIO MAIC 2024

### 3.1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 29102024-1472

Tabla 5. Información Contrato de obra No. 29102024-1472

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección** | SAMC-SI-001-2024 |
| **Número del contrato** | 29102024-1472 |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **Objeto** | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **Contratista** | CONSORCIO OBRAS DP |
| **NIT** | 901.866.191-3 |
| **Valor Total Inicial** | $ 898.043.438 |
| **Adiciones** | N/A |
| **Valor acumulado del contrato** | $ 898.043.438 |
| **Modificaciones** | N/A |
| **Aclaraciones** | N/A |
| **Fecha de Iniciación y terminación** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Plazo Inicial** | UN (1) MESE |
| **Prorrogas** | SI – DOS (2) |
| **Prorroga 1** | UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Prorroga 2** | UN PUNTO NOVENTA Y SIETE (1.97) MESES, A PARTIR DEL 02 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Suspensiones 1** | 13 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Fecha reanudación** | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **Fecha de Terminación Actual del contrato** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Dirección** | Calle 36 # 27-71 of 810 |
| **Número de Teléfono** | 6016826902 |

Fuente: CONSORCIO OBRAS DP

## 3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

### 3.2.1. CONTRATO No 17112023-1630

En el periodo del presente informe mensual no se relaciona ninguna actividad de dicho contrato debido a que tuvo fecha de finalización el 20 de diciembre de 2024.

### 3.2.2. CONTRATO No 18092024-1274

**El día viernes 1 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal para la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal para los dos módulos de huella izq que hacían falta por construir, de la abscisa (K0+058.63 a K0+065)

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**El día sábado 2 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)

- Se inicio con el armado de acero de refuerzo transversal para la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)
- Se inicio con la adecuación de la entrada al predio para posterior armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo transversal para los dos módulos de huella izq que hacían falta por construir, de la abscisa (K0+058.63 a K0+065)

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).
- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+100).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).
- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+100).

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+120).

**El día domingo 3 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se continuo con el armado de acero de refuerzo transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04).
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la entrada al predio.

**El día lunes 4 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065).
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq de la abscisa (K0+058.83 a K0+065)

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+040).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+050).

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+050).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+120 a la abscisa K0+130).
- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).

**El día martes 5 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04) y de la entrada al predio.

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+040 a la abscisa K0+060).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+050 a la abscisa K0+070).

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+050 a la abscisa K0+070).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+040).

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

**El día miércoles 6 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la piedra pegada izq a=0.45 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+100.16)

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+100).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+070 a la abscisa K0+100).

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+070 a la abscisa K0+90).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+040 a la abscisa K0+080).

**El día jueves 7 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la piedra pegada a=0.90 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+032.95)
- Se inicio con la excavación e instalación de la subbase en la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+080 a la abscisa K0+100).

**El día viernes 8 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en la piedra pegada izq a=0.90 de la abscisa (K0+033.15 a la abscisa K0+065)
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+001.34 a K0+101.32)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065) y de la abscisa (K0+081.25 a K0+101.32)

**Florencia (PH – 100 m)**

- Se realizó la toma de densidades por el método del cono de arena.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se realizó la toma de densidades por el método del cono de arena.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se realizó la toma de densidades por el método del cono de arena.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+100 a la abscisa K0+130).

**El día sábado 9 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+101.32)

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicio con la excavación de la rampa de acceso de inicio de la abscisa (K0+000 a K0+001.2)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de inicio de la abscisa (K0+000 a K0+001.2)
- Se inicio con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+001.2 a K0+022.2)

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicio con la excavación de la rampa de acceso de inicio de la abscisa (K0+000 a K0+000.93)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de inicio de la abscisa (K0+000 a K0+000.93)
- Se inicio con la excavación de 11 vigas riostra de la abscisa (K0+000.93 a K0+031.08)

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se realizó la toma de densidades por el método del cono de arena.

**El día domingo 10 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo en la piedra pegada der a=0.45 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+048.97)

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**El día lunes 11 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en la piedra pegada der a=0.45 de la abscisa (K0+49.17 a la abscisa K0+101.32)
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001.14)
- Se inicio en el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001.14)

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicio con la instalación de 8 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+001.2 a K0+022.2).
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+001.39 a K0+021.98).
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der de la abscisa (K0+001.39 a K0+021.98).
- Se continua con la excavación de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+024.68 a K0+042.13).

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicio con la instalación de 11 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+000.93 a K0+031.08).
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+001.13 a K0+030.87).
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der de la abscisa (K0+001.13 a K0+030.87).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicio con la excavación de la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001)
- Se inicio con el armado de la formaleta para la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001)
- Se inicio con el armado acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001)
- Se inicio con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+001 a K0+022.21).
- Se inicio con la instalación de 8 canastillas en las vigas riostra de la abscisa (K0+001 a K0+022.21).

**El día martes 12 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se continuo con en el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001.14)
- Se inicio con el vaciado de concreto de la rampa de acceso de la abscisa (K0+000 a K0+001.14)
- Se inicio con la excavación e instalación del acero de refuerzo en los espacios de las vigas riostra, de la 1 (K0+001.14 a K0+001.34) a la 21 (K0+065 a K0+065.20)

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+001.39 a K0+021.98)
- Se inicio con el vaciado de concreto en 7 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+001.2 a K0+019.18)
- Se continua con la instalación de 7 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+024.68 a K0+042.13)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der de la abscisa (K0+022.2 a K0+041.95)

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto de la rampa de acceso de inicio de la abscisa (K0+000 a K0+000.93)
- Se inicio con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+001.13 a K0+030.87)
- Se inicio con el vaciado de concreto en 11 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+000.93 a K0+031.08)
- Se continua con la excavación de 12 vigas riostra de la abscisa (K0+033.86 a K0+067.16)
- Se continua con la instalación de 12 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+033.86 a K0+067.16)

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicio con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+001.21 a K0+022.01)

- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+001.21 a K0+022.01)
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la piedra pegada de la abscisa (K0+022.21a K0+043.92)
- Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+022.21a K0+043.92)

En horas de la mañana se realizó reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA.

**El día miércoles 13 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto de 21 vigas riostras de la 1 (K0+001.14 a K0+001.34) a la 21 (K0+065 a K0+065.20).
- Se inicio con el vaciado de concreto de los espacios que hacían falta en 11 vigas riostras de la 22 (K0+068.22) a la 32 (K0+100.36)

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en 8 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+021.98 a K0+042.13)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+022.2 a K0+041.95)

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+031.08 a K0+066.96)

- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+031.08 a K0+066.96)

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la rampa de inicio de la abscisa (K0+000 a K0+001)
- Se inicio con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+001.21 a K0+022.01).
- Se inicio con el vaciado de concreto en 8 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+001 a K0+022.21).
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la piedra pegada de la abscisa (K0+044.12 a K0+074.42).
- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+044.12 a K0+074.42).

Por parte de la Interventoría se tomaron muestras de concreto (cilindros)

**El día jueves 14 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Mejial (PH - 101.52 m)**

- Se inicio con el relleno detrás del bordillo del costado izq de la abscisa (K0+000 a K0+059.75) y de la abscisa (K0+0067.25 a K0+097.34)

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+001.39 a K0+021.98)
- Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+001.39 a K0+021.98)

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+031.08 a K0+066.96)
- Se continuo con el vaciado de concreto en 11 vigas riostra de la abscisa (K0+033.86 a K0+064.09)

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+001.21 a K0+022.01)
- Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+001.21 a K0+022.01)
- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+022.21 a K0+074.42)

**El día viernes 15 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+022.2 a K0+041.95)
- Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+022.2 a K0+041.95)

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+001.13 a K0+066.96)
- Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+001.13 a K0+066.96)

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para la piedra pegada de la abscisa (K0+074.62 a K0+092.48)
- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+074.62 a K0+092.48)

**El día sábado 16 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+074.62 a K0+092.48).

**Del 19 al 30 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Florencia (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

- No se realizó ninguna actividad física de obra.

Por parte de la Interventoría se tomaron densidades por el método cono y arena.

### 3.2.3. CONTRATO No 18092024-1295

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, se tiene el siguiente registro:

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO – LOMAPRIETA**

***PLACA HUELLA***

- PLANADAS: 157 m de meta física; 157 m de meta ejecutada.
- CAÑAMOMO 1: 100 m de meta física; 100,75 m de meta ejecutada;
- CAÑAMOMO 2: 100 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
- IBERIA BAJA: 170 m de meta física; 174,075 m de meta ejecutada;
- PORTACHUELO 1: 120 m de meta física; 3 m de meta ejecutada.
- PORTACHUELO 2: 50 m de meta física; sin inicio de actividades.
- PANESSO: 100 m de meta física; 101,93 m de meta ejecutada;
- AMOLADOR: 100 m de meta física; 104,25 m de meta ejecutada

**RESGUARDO INDIGENA NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA**

***PLACA HUELLA***

- LA CABAÑA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
- UBARBA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
- LA ESPERANZA: 200 m de meta física; 217,1 m de meta ejecutada;

***CAMINO ANCESTRAL***

- LA CANDELARIA: 400 m de meta física; 400,22 m de meta ejecutada.
- TUMBABARRETO: 285 m de meta física; sin inicio de actividades.
- LAS MINAS: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
- LAS ESTANCIAS: 200 m de meta física; 201,25 m de meta ejecutada.
- EL SALADO: 300 m de meta física; 295,5 m de meta ejecutada;
- EL EDEN: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
- SANTA INES: 400 m de meta física; sin inicio de actividades.

**RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO**

***PLACA HUELLA***

- SAN JOSE 1: 65 m de meta física; 69,1 m de meta ejecutada.
- SAN JOSE 2: 99 m de meta física; 100,65 m de meta ejecutada.
- COSTA RICA: 65 m de meta física; 71,87 m de meta ejecutada.
- CENTRO POBLADO: 80 m de meta física; 84,08 m de meta ejecutada.
- EL CARMELO: 65 m de meta física; 65,37 m de meta ejecutada.
- LLANO GRANDE: 65 m de meta física; 66,94 m de meta ejecutada.

***CAMINO ANCESTRAL***

- VENEROS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- SAN MIGUEL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- EL ROBLE: 150 m de meta física; sin inicio de actividades.
- TUNZARA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- EL CACHO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- TAPARCO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- LA ESCUELA: 78 m de meta física; 80 m de meta ejecutada;
- HONDURAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- LA PRADERA: 78 m de meta física; 79,93 m de meta ejecutada;
- BUENOS AIRES: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- PASMI: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- JAGUAL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- SISIRRA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- TRES ESQUINAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- ONCE CASAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

- DANUBIO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
- LA LINEA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

### 3.2.3. CONTRATO No 29102024-1472

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

**El día viernes 1 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se inició con el vaciado de concreto en la rampa de acceso inicial de la abscisa (K0+000 a K0+002.63)
- Se inició con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+002.83 a K0+025.11)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
- Se continuo con la excavación de 11 vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+020 a K0+50).

**El día sábado 2 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
- Se inició con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+002.83 a K0+077.19)
- Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)

- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la entrada al predio izq (K0+028.54 a K0+031.54)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+050 a K0+70)
- Se inicio con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular de la abscisa (K0+000 a K0+30)

**El día lunes 4 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+002.63 a K0+022.08)
- Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
- Se inicio con el vaciado de concreto de la entrada al predio izq (K0+028.54 a K0+031.54)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular de la abscisa (K0+030 a K0+070)
- Se inicio con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+042.42)
- Se inicio con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)

**El día martes 5 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con la instalación de 11 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)
- Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)

- Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
- Se continuo con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+103.19 a K0+125.92)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
- Se inicio con la con la instalación de 8 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+042.42)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- El contratista de obra inicio con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+000 a K0+034.76)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

**El día miércoles 6 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de 13 vigas riostra de la abscisa (K0+025.11 a K0+064.47)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se inicio con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
- Se continuo con la excavación de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+039.47 a K0+020.10)
- Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)
- Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+034.76 a K0+070.16), teniendo aprox 70 m de excavación y conformación de vía.

**El día jueves 7 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
- Se continuo con la excavación de 9 vigas riostra de la abscisa (K0+128.95 a K0+150.43)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)
- Se continua con la instalación de 7 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+039.47 a K0+020.10)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- El contratista de obra inicia con la actividad de extendida, nivelación y compactación de los 15 cm de Material Subbase Granular de la abscisa (K0+000 a K0+034.76)

**El día viernes 8 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+042.42 a K0+020.30)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+042.42 a K0+020.30)
- Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+020.10 a K0+000.60)
- Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+020.10 a K0+000.50)
- Se continuo con la excavación de 6 vigas riostra de la abscisa (K0+017.17 a K0+000.50)
- Se inicio con la excavación de la entrada al predio izq de la abscisa (K0+020.10 a K0+013.98)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- El contratista de obra continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación de los 15 cm de Material Subbase Granular de la abscisa (K0+034.76 a K0+070.16), teniendo aprox 70 m de Material Subbase Granular

**El día sábado 9 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con la instalación de 15 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+103.19 a K0+147.92)
- Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+103.16 a K0+147.74)
- Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+103.16 a K0+147.74)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto en 7 vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+045.59)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se inicio con la excavación de 9 vigas riostra de la abscisa (K0+005.90 a K0+031.76)
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la colocación de piedras y posterior vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)

- Se inicio con la colocación de piedras para posterior vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
- Se inició con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)

**El día lunes 11 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+042.42 a K0+020.30)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+020.10 a K0+000.69)
- Se continuo con la instalación de 6 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+017.17 a K0+000.50)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se inicio con la actividad de instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
- Se inicio con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
- Se inicio con la instalación de la canastilla en las 9 vigas riostra excavadas de la abscisa (K0+005.90 a K0+031.76)

**El día martes 12 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de 10 vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)

- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+103.6 a K0+147.74)
- Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+103.36 a K0+147.74)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+103.36 a K0+147.74)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+020.10 a K0+000.69)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+020.10 a K0+000.69)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la entrada al predio izq de la abscisa (K0+020.10 a K0+013.98)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto de la huella izq y der de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
- Se inicio con el vaciado de concreto de 9 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+005.90 a K0+031.76)

En horas de la mañana se realizó reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA.

**El día miércoles 13 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+103.36 a K0+147.74)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+103.36 a K0+147.74)
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso final abscisa (K0+147.92 a K0+150.13)

- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso final abscisa (K0+147.92 a K0+150.13)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+020.10 a K0+000.69)
- Se inicio con el vaciado de concreto para la entrada al predio izq de la abscisa (K0+020.10 a K0+013.98)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se inicio con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+006.11 a K0+021.92)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der (K0+006.11 a K0+021.92)
- Se inicio con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+006.11 a K0+015.52)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+006.11 a K0+015.52).
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la colocación de piedras y posterior vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+031.76 a K0+066.76)
- Se continuo con la colocación de piedras para posterior vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+031.76 a K0+066.76)
- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+031.76 a K0+066.76)

**El día jueves 14 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de 16 vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+150.43)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la rampa de acceso final de la abscisa (K0+103.19 a K0+150.13)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+064.63 a K0+000.69)
- Se inició con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+064.63 a K0+000.69)

- Se inicio con la excavación de placa pequeña de la abscisa (K0+000.50 a K0+000)
- Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la placa pequeña de la abscisa abscisa (K0+000.50 a K0+000).

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la excavación de 11 vigas riostra de la abscisa (K0+034.76 a K0+057.34)
- Se continuo con la instalación de la canastilla en las 11 vigas riostra excavadas de la abscisa (K0+034.76 a K0+057.34)
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+031.76 a K0+057.15)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+031.76 a K0+057.15)

**El día viernes 15 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+103.36 a K0+147.74)
- Se inicio con el relleno detrás de los bordillos con material de excavación de la abscisa (K0+000 a K0+150.43)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de 14 vigas riostra de la abscisa (K0+042.60 a K0+000.50)
- Se inicio con el relleno detrás de los bordillos con material de excavación de la abscisa (K0+000 a K0+64.83)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de la huella izq y der de la abscisa (K0+031.76 a K0+057.15)
- Se continuo con el vaciado de concreto de 8 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+034.76 a K0+057.34)

**El día sábado 16 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+022.13 a K0+031.55)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+022.13 a K0+031.55)
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+015.72 a K0+031.55)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+015.72 a K0+031.55)
- Se continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+070.16 a K0+100).

**El día martes 19 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se inicio con el vaciado de concreto de la cuneta der de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
- Se inicio con el vaciado de concreto de la cuneta izq de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
- Se continuo con el vaciado de concreto de las vigas de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+031.76).
- Se continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+100 a K0+130).
- En horas de la tarde se continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación de los 15 cm de Material Subbase Granular de la abscisa (K0+070.16 a K0+100).

En horas de la mañana se realizó reunión técnica en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual del contrato de Interventoría y verificar las funciones de cada uno de los profesionales de este contrato.

**El día miércoles 20 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Por parte de la Interventoría se realizó la toma de las densidades por el método del cono y arena en este tramo.
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones de la secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con la participación de la Supervisora del Convenio del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de obra, los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el avance de las actividades de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA DE CARTAMA:**

- El Contratista de Obra en compañía de la Interventoría realizó la socialización del proyecto.

**El día jueves 21 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
- Se continuo con la excavación de 3 vigas riostra de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96)
- Se continuo con la instalación de la canastilla en las 3 vigas riostra excavadas de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96)

**El día viernes 22 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)
- Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)
- Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)

**El día sábado 23 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- El Contratista de Obra no realizó ninguna actividad de obra, debido a problemas con la llegada del material.

**El día lunes 25 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- El Contratista de Obra no realizó ninguna actividad de obra, debido a problemas con la llegada del material.
- Se realizaron actividades de limpieza del acero

**El día martes 26 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+031.76 a K0+057.15)
- Se continuo con el vaciado de concreto de las vigas de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+034.76 a K0+057.34).

- Se continuo con el vaciado de concreto de la huella izq y der de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
- Se continuo con el vaciado de concreto de 3 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96)
- Por parte del Contratista de Obra se tomaron las muestras del concreto (cilindros) vaciado en huellas y cuneta.

**El día miércoles 27 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con el vaciado de concreto de la cuneta izq y derecha de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
- Se continuo con el vaciado de concreto de las vigas de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96).
- Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90) y de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90) y de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90) y de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
- Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
- Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
- Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+002.90 a K0+002.70)
- Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo (K0+002.90 a K0+002.70)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar los compromisos adquiridos por todas las partes el día 5 de agosto de 2025, así mismo evaluar el estado actual de las actividades de obra.

**El día jueves 28 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
- Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
- Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+069.96 a K0+073.36)
- Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo de la abscisa (K0+069.96 a K0+073.36)
- Se continuo con el vaciado de concreto de 2 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+069.96 a K0+073.36)

**El día viernes 29 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
- Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
- Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
- Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+076.37 a K0+076.57)
- Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo de la abscisa (K0+076.37 a K0+076.57)

**El día sábado 30 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

- Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)

- Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
- Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)

### 3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025 los contratistas de obra de Riosucio y Marmato no presentaron ítems no previstos; sin embargo, el contratista de Supia adelantó el trámite correspondiente, el cual se menciona a continuación:

- **Contrato No 18092024-1274 (Municipio de Supia)**

**FILTRO:**

| **ITEM** | **DESCRIPCIÒN** | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NP 1 | Geotextil Tipo NT 2500 | M2 | 7800 | 12.825 | $ 100.035.000,00 |
| NP 2 | Material Granular Drenante | M3 | 42 | 94.038 | $ 3.949.596,00 |
| NP 3 | Tubería para filtro D= 4” | ml | 100 | 24.408 | $ 2.440.800,00 |

Este Ítem no previsto se encuentra en revisión por parte del Instituto Nacional de Vías

### 3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Siguiendo la trazabilidad que se ha llevado mediante los informes semanales, a fecha del 31 de agosto de 2025 los Contratistas de Obra han realizado actividades constructivas en los tramos a intervenir objeto del contrato, realizando actividades para placa huella y camino ancestral.

**MUNICIPIO DE BELALCÁZAR - RESGUARDO INDIGENA TOTUMAL**

El Contratista de Obra finalizó las actividades físicas de obra el 20 de diciembre de 2024 en los Tramos Centro Poblado, El Brasil y La Pampa, cumpliendo a satisfacción la meta física.

**MUNICIPIO DE RISARALDA - RESGUARDO INDIGENA LA ALBANIA**

El Contratista de Obra finalizó las actividades físicas de obra el 20 de diciembre de 2024 en los 4 Tramos, cumpliendo a satisfacción la meta física.

**MUNICIPIO DE NEIRA - ASENTAMIENTO INDIGENA DAMASCO**

El Contratista de Obra finalizó las actividades físicas de obra el 20 de diciembre de 2024 en los 3 Tramos, cumpliendo a satisfacción la meta física.

**MUNICIPIO DE SUPIA**

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

TRAMO 1 - (Via la Clara – Entrada)

- Sector con una longitud actualizada de 130 m
- El Contratista de obra inició con las actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas, colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo (a= 0.90) e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de vigas riostra.
- 0 m de Placa Huella

TRAMO 2 - (Via Guascal)

- Sector con una longitud contractual de 85 m
- El Contratista de obra no ha iniciado con las actividades físicas de obra que estableció dentro de su programación, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Placa Huella

GASPAR

- Sector con una longitud contractual de 336 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Camino Ancestral

**RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA**

BONAFONT

- Sector con una longitud contractual de 95 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Placa Huella

SAN ANTONIO

- Sector con una longitud contractual de 80 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Placa Huella

FLORENCIA

- Sector con una longitud contractual de 100 m
- El Contratista de obra inició las actividades de Excavación y conformación del tramo, así mismo con la actividad de descargue, extendida, nivelación y compactación del material Subbase Granular (15cm)
- 0 m de Placa Huella

ALTO BONITO

- Sector con una longitud contractual de 80 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Placa Huella

SAN JOSE

- Sector con una longitud actualizada de 170 m
- El Contratista de obra no ha realizado las actividades físicas de obra debido a que el Gobernador del Resguardo solicito unificar los tramos de San Jose 1 (90 m) y San Jose 2 (80m), para un solo tramos de 170 m.
- 0 m de Placa Huella

PIRZA

- Sector con una longitud contractual de 90 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Placa Huella

MEJIAL

- Sector con una longitud contractual de 101 m
- El Contratista de obra continuó con las actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas y cunetas, así mismo continuó con las actividades de colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo en anchos de 0.90 y 0.45 e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de las vigas riostra. Tramo finalizado
- 101.52 m de Placa Huella

BONAFONT

- Sector con una longitud contractual de 300 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Camino Ancestral

QUIMBAYA

- Sector con una longitud contractual de 300 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral

AGUA BONITA

- Sector con una longitud contractual de 190 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral

ALTO BONITO

- Sector con una longitud contractual de 300 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral

**RESGUARDO INDIGENA CAUROMÁ**

VÍA MEDIA CARAL (LA BODEGA)

- Sector con una longitud contractual de 80 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Placa Huella

LA DIVISA

- Sector con una longitud contractual de 62 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Placa Huella

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**

VÍA SAN PABLO

- Sector con una longitud actualizada de 200 m
- El Contratista de obra no ha continuado con las actividades físicas de obra debido a que el Gobernador del Resguardo solicito unificar los tramos de San Pablo Sector el Guaico (100 m) y San Pablo Sector Granatal (100 m), para un solo tramos de 200 m. Solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico de la mitad del nuevo tramo.
- 0 m de Placa Huella

VÍA COMUNIDAD EL BRASIL

- Sector con una longitud contractual de 100 m

- El Contratista de obra inició con las actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas, colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo (a= 0.90) e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de vigas riostra, así mismo instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto de algunos módulos de cuneta.
- 0 m de Placa Huella

VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA

- Sector con una longitud contractual de 90 m
- El Contratista de obra inició con las actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas, colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo (a= 0.90) e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de vigas riostra.
- 0 m de Placa Huella

VÍA DE TIZAMAL

- Sector con una longitud contractual de 85 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Placa Huella

VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1

- Sector con una longitud contractual de 39 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Placa Huella

VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2

- Sector con una longitud contractual de 41 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Placa Huella

COMUNIDAD DOSQUEBRADAS

- Sector con una longitud contractual de 80 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra, solo se realizó la actividad de levantamiento topográfico.
- 0 m de Placa Huella

**MUNICIPIO DE RIOSUCIO**

En relación con las metas físicas para placa huela se tienen terminados 1416.115 metros de una meta total de 1766 metros del alcance del contrato; para caminos ancestrales se tienen terminados 1056.9 metros de una meta total de 3383 metros del alcance del contrato.

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA RIOSUCIO**

CAÑAMOMO 2

- Sector con una longitud contractual de 100 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 100 m de Placa Huella

CAÑAMOMO 1

- Sector con una longitud contractual de 100 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 100.75 m de Placa Huella

IBERIA BAJA

- Sector con una longitud contractual de 170 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 174.075 m de Placa Huella

PLANADAS

- Sector con una longitud contractual de 157 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 157 m de Placa Huella

PORTACHUELO 1

- Sector con una longitud contractual de 120 m
- El Contratista de obra se encuentra ejecutando actividades físicas de obra
- Ejecutado 27 m de Placa Huella

PORTACHUELO 2

- Sector con una longitud contractual de 50 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Placa Huella

PANESSO

- Sector con una longitud contractual de 100 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 101.93 m de Placa Huella

AMOLADOR

- Sector con una longitud contractual de 100 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 104.25 m de Placa Huella

**REGUARDO INDIGENA NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA**

LA CABAÑA

- Sector con una longitud contractual de 115 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Placa Huella.

UBARBA

- Sector con una longitud contractual de 115 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Placa Huella.

LA ESPERANZA

- Sector con una longitud contractual de 200 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 217.1 m de Placa Huella

LA CANDELARIA

- Sector con una longitud contractual de 400 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 400.22 m de Camino Ancestral

TUMBABARRETO

- Sector con una longitud contractual de 285 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

LAS MINAS

- Sector con una longitud contractual de 200 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra

- 0 m de Camino Ancestral.

LAS ESTANCIAS

- Sector con una longitud contractual de 200 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 201.25 m de Camino Ancestral

EL SALADO

- Sector con una longitud contractual de 300 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 295.5 m de Camino Ancestral

EL EDEN

- Sector con una longitud contractual de 200 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

SANTA INES

- Sector con una longitud contractual de 400 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

**RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO**

CENTRO POBLADO

- Sector con una longitud contractual de 80 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 84.08 m de Placa Huella.

LLANO GRANDE

- Sector con una longitud contractual de 65 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 66.94 m de Placa Huella.

SAN JOSE 1

- Sector con una longitud contractual de 65 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 69.1 m de Placa Huella.

SAN JOSE 2

- Sector con una longitud contractual de 99 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 100.65 m de Placa Huella.

COSTA RICA

- Sector con una longitud contractual de 65 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 71.87 m de Placa Huella.

EL CARMELO

- Sector con una longitud contractual de 65 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 65.37 m de Placa Huella.

VENEROS

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

SAN MIGUEL

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

EL ROBLE

- Sector con una longitud contractual de 150 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

TUNZARA

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

EL CACHO

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

TAPARCO

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

LA ESCUELA

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 80 m de Camino Ancestral.

HONDURAS

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

LA PRADERA

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra ya terminó las actividades físicas de obra
- Ejecutado 79.93 m de Camino Ancestral.

BUENOS AIRES

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

PASMI

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

JAGUAL

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

SISIRRA

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

TRES ESQUINAS

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

ONCE CASAS

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

DANUBIO

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

LA LINEA

- Sector con una longitud contractual de 78 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra
- 0 m de Camino Ancestral.

**MUNICIPIO DE MARMATO**

**PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA**

TRAMO 1 - CENTRO POBLADO SAN JUAN IGLESIA

- Sector con una longitud contractual de 217 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

TRAMO 2 - COMUNIDAD JIMENEZ ALTO A QUEBRADA

- Sector con una longitud contractual de 304 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

TRAMO 3 – MONTERREDONDO

- Sector con una longitud contractual de 587 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

**MUNICIPIO DE FILADILFIA**

**PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD**

TRAMO 1 - SECTOR EL FILO

- Sector con una longitud contractual de 25 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

TRAMO 2 - EL CASERIO

- Sector con una longitud contractual de 25 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

TRAMO 3 - EL CARTUCHO CABECERA

- Sector con una longitud contractual de 30 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

TRAMO 4 - CARTUCHO PIE

- Sector con una longitud contractual de 25 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

TRAMO 5 - LA Y

- Sector con una longitud contractual de 60 m
- El Contratista de obra no ha realizado actividades físicas de obra.
- 0 m de Camino Ancestral

**MUNICIPIO DE ANSERMA**

**PARCIALIDAD INDIGENA ANSEA**

TRAMO 1 - LA ESCUELA

- Sector con una longitud contractual de 130 m
- El Contratista de obra inicio con las actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas y cunetas, así

mismo inicio con las actividades de colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo (a= 0.90) e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de las vigas riostra.
- 70 m de Placa Huella

TRAMO 2 - EL AGUACATE
- Sector con una longitud actualizada de 61 m
- El Contratista de obra realizó actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas y cunetas, así mismo inicio con las actividades de colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo (a= 0.90) e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de las vigas riostra. Tramo Finalizado.
- 64.83 m de Placa Huella

TRAMO 3 - LA QUEBRADA (LA CANCHA)
- Sector con una longitud contractual de 109 m
- El Contratista de obra realizó actividades de instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para huellas y cunetas, así mismo inicio con las actividades de colocación de piedras y vaciado de concreto ciclópeo (a= 0.90) e instalación de las canastillas y vaciado de concreto de las vigas riostra. Tramo Finalizado.
- 150 m de Placa Huella

A corte del 31 de agosto de 2025, fecha del presente informe mensual los Contratistas de Obra tienen el siguiente avance:

**Municipio de Belalcázar**

Tabla 6.Belalcazar

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 100 | $221.387.742,93 |
| **INVERSIÓN META FÍSICA EJECUTADA ACUMULADA** | 62.89 | $139.158.185,70 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Risaralda**

Tabla 7. Risaralda

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 100 | $407.574.313,88 |
| **INVERSIÓN META FÍSICA EJECUTADA ACUMULADA** | 63,80 | $258.107.701,80 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Neira**

Tabla 8. Neira

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 100 | $186.551.457,10 |
| **INVERSIÓN META FÍSICA EJECUTADA ACUMULADA** | 85.39 | $159.295.474,50 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Supia**

Tabla 9. Supia

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 46.29 | $ 1.228.287.316,19 |
| **INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA** | 8.56 | $ 227.021.685,34 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Riosucio**

Tabla 10. Riosucio

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 66.14 | $2.323.857.517,29 |
| **INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA** | 52.09 | $1.830.178.981,54 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Marmato**

Tabla 11. Marmato

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 12 | $ 105.529.615 |
| **INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA** | 0 | $ 0 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Filadelfia**

Tabla 12. Filadelfia

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 0.50 | $ 4.397.067 |
| **INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA** | 0 | $ 0 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Municipio de Anserma**

Tabla 13. Anserma

| | % | VALOR (Miles de Pesos) |
|---|---|---|
| **INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA** | 15 | $ 131.912.019 |
| **INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA** | 58.20 | $ 236.319.736,65 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

Por otro lado, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025, la Interventoría realizó seguimiento, control y revisión a las actividades realizadas por los contratistas de obra en el marco del desarrollo de los Contratos de Obra No 18092024-1274 (Municipio de Supia), No 18092024-1295 (Municipio de Riosucio) y al No 29102024-1472 (Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma) conforme está establecido en el Manual de Interventoría del INVÍAS versión 2022 y demás documentos técnicos contractuales, así como la elaboración y remisión de respuestas a las comunicaciones de los contratistas.

La Interventoría tiene previsto para el siguiente mes de ejecución de los contratos, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades previstas por los contratistas en su programa de inversiones, teniendo en cuenta, Pliego de Condiciones, Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de la Entidad y normatividad vigente sobre el tema a intervenir.

# 4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.0. CONTRATO No 18092024-1274 (Municipio de Supia)

### 4.1. INFORMACIÓN SEMANAL

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3

### 4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

### 4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

### 4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

### 4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

### 4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

### 4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

## 4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

## 4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
Se anexa formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

- Actas de Comité de Obra

No se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1; toda vez que, durante el periodo del mes de agosto de 2025 no se realizó comité de obra

- Actas de Reunión

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2;

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 25 del 01/08/25 al 07/08/25 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215 m** | **PLACA HUELLA** | **215 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **336 m** |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 80 m | TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 m | GASPAR | 336 m |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 50 m | TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 m | | |
| TRAMO 3 (VIA GUASCAL) | 85 m | | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716 m** | **PLACA HUELLA** | **717 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **1090 m** |
| BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 300 m |
| SAN ANTONIO | 80 m | SAN ANTONIO | 80 m | QUIMBAYA | 300 m |
| FLORENCIA | 100 m | FLORENCIA | 100 m | AGUA BONITA | 190 m |
| ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 300 m |
| SAN JOSE 1 | 90 m | SAN JOSE 1 | 90 m | | |
| SAN JOSE 2 | 80 m | SAN JOSE 2 | 80 m | | |
| PIRZA | 90 m | PIRZA | 90 m | | |
| MEJIAL | 101 m | MEJIAL | 101,52 m | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142 m** |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 m |
| LA DIVISA | 62 m |

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635 m** |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 m |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 m |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 m |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 m |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 m |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 m |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espesor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para el Municipio de Supia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 1708 m – 21 tramos

Camino Ancestral: 1426 m – 5 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| **INTEGRANTES:** | 90% GRAND CONSTRUCCIONES SAS - 10% COSTRUVIAL LP S.A.S. |
| **CONTRATO No.** | 18092024-1274 |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/10/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.700.064.310,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 2.700.064.310,00 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 300.000.000,00 |
| **VALOR AMORTIZADO:** | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1:** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2:** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 30 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S |
| **CONTRATO No.** | 2252 DE 2021 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 999.980.476,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 285.000.000,00 |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 1.284.980.476,00 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 420.159.864,00 |
| **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420.159.864,00 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | **RECURSOS POR VIGENCIA** | | | | $ 2.700.064.310 | |
| | **EJECUTADO DE LA VIGENCIA** | | | | | |
| | **SALDO DE VIGENCIA** | | | | $ 2.700.064.310 | |
| INTERVENTORÍA | **RECURSOS POR VIGENCIA** | $ 394.000.000,00 | $ 605.980.476 | $ 100.000.000 | $ 159.528.013 | $ 285.000.000,00 |
| | **EJECUTADO DE LA VIGENCIA** | $ 282.124.081,35 | $ 558.328.382 | $ 49.688.494 | $ 36.687.023 | |
| | **SALDO DE VIGENCIA** | $ 111.875.918,65 | $ 47.652.094 | $ 50.311.506 | $ 122.840.990 | $ 285.000.000,00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.653.461.473,73 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.094.287.511,77 | 41,24% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 118.196.507,22 | 4,45% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (976.091.004,55) | -36,79% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 46.602.836,32 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 46.602.836,32 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (46.602.836,32) | -100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 2.700.064.310,05 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.140.890.348,09 | 42,25% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 118.196.507,22 | 4,38% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (1.022.693.840,87) | -37,88% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 44.578.152,76 | 1,68% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 71.078.075,41 | 2,68% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoría y la gobernación de caldas el 7 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Vial Caldas 2024 tuvo fecha de reinicio el 30 de julio de 2025.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.194.157.248,64 | 92,93% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.015.696.967,39 | 79,04% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VLVRAZ-064220

PERIODO FACTURADO: 1 al 12 Febrero 2025

VALOR FACTURA: $ 22.944.271,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:** Por solicitud del area juridica de la Gobernación de Caldas la Interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-038 del 5 de febrero de 2025 remite a la Secretaria de Infraestructura ajuste a la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No 18092024-1274.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 300.000.000 |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | 300.000.000 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 8,593290879 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420.159.864 |
| **Amortizado $** | 420.159.864 |
| **Saldo $** | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 25 del 01/08/25 al 07/08/25 — Último Informe Semanal SI

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 41,24%
Meta Física Ejecutada %: 4,45%
Avance o Atraso Físico %: -36,79%

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Resguardo 4 | Total | % |
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | | Prog | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 400,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | | |
| * PLACA HUELLA | m | 1708 | 1708 | | Prog | 215,00 | 716,00 | 142,00 | 635,00 | 1708,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 0,71 | 78,54 | | 25,20 | 104,45 | 6,12% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1426 | 1426 | | Prog | 336,00 | 1090,00 | N/A | N/A | 1426,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | | | N/A | N/A | | |
| * | | | | | Prog | | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | |
| Compactador manual | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: | LA TRINA EMBERA CHAMI | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 215 | 215 | 0,71 | ATRASO | 99,67% | Se presenta un atraso del 99,67%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | CAMINO ANCESTRAL | 336 | 336 | | ATRASO | 100,00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| RESGUARDO 2: | ESCOPETERA Y PIRZA | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 716 | 716 | 78,54 | ATRASO | 89,03% | Se presenta un atraso del 89,03%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | CAMINO ANCESTRAL | 1090 | 1090 | | ATRASO | 100,00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 3: | CAUROMÁ | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 142 | 142 | | ATRASO | 100,00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 4: | CAÑAMOMO LOMAPRIETA | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 635 | 635 | 25,20 | ATRASO | 96,03% | Se presenta un atraso del 96,03%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA LA FELISA | PERMISO MINERO: | SI | NO x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO x |

**OBSERVACIONES:**
Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025 la Interventoria da respuesta a la comunicación CVC24-18092024-1274-022 del 6 de febrero de 2025. Así mismo luego de revisar la documentación remitida por el Consorcio Vial Caldas 2024, la Interventoría remite una serie de observaciones las cuales se solicita sean remitidas en un lapso clasificado como inmediato.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024)

**OBSERVACIONES:** La Interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-042 del 5 de agosto de 2025 remite al Contratista de Obra reiteración con apremio presentación del documento PAGA V3 - ATENCIÓN OFICIO INV-CIC-2252-2021-L1S-033 DEL 06/02/2025, lo anterior en un lapso clasificado como inmediato en el marco de su obligación contractual.

Así mismo el Contratista de Obra mediante el oficio CVC24-18092024-1274-025 del 6 de agosto de 2025 manifiesta a la Interventoría que en el marco del seguimiento a las actividades vinculadas con la presentación del Plan de Gestión Ambiental (PAGA) y luego de realizar una reunión técnica con la participación del ingeniero civil de apoyo a la supervisión y el profesional social del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el representante legal del Consorcio Vial Caldas 2024, el gobernador del Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, y el inspector de la interventoría CEEF, se acordó realizar una nueva reunión con la participación de los profesionales sociales y ambientales de las entidades, con el objetivo de concertar de manera conjunta la metodología, los lineamientos y el contenido técnico para la elaboración y presentación del PAGA. Dicha reunión quedo establecida para el 12 de agosto de 2025.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 28 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 25 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** Por otro lado, el 5 de agosto de 2025, se realizó en horas de la mañana reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaría de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El día 1 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal para la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal para los dos módulos de huella izq que hacían falta por construir, de la abscisa (K0+058.63 a K0+065)

***Florencia (PH – 100 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

***Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**El día 2 de agosto de 2025:**
**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo transversal para la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)
•Se inicio con la adecuación de la entrada al predio para posterior armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo transversal para los dos módulos de huella izq que hacían falta por construir, de la abscisa (K0+058.63 a K0+065)
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+100).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+100).
***Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+120).

**El día 3 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**
***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la entrada al predio

**El día 4 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065).
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq de la abscisa (K0+058.83 a K0+065)
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+040).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+050).
***Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+050).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+120 a la abscisa K0+130).
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).

**El día 5 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04) y de la entrada al predio.
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+040 a la abscisa K0+060).

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 25 del 01/08/25 al 07/08/25 Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+050 a la abscisa K0+070).
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+050 a la abscisa K0+070).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+040).

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

**El dia 6 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la piedra pegada izq a=0.45 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+100.16)
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+100).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+070 a la abscisa K0+100).
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+070 a la abscisa K0+90).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+040 a la abscisa K0+080).

**El dia 7 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la piedra pegada izq a=0.90 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+032.95)
•Se inicio con la excavación e instalación de la subbase en la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)

***Florencia (PH – 100 m)**
•Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+080 a la abscisa K0+100).

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETRA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo en la piedra pegada izq a=0.90
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la cuneta y bordillo der
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo en la pieda pegada der a=0.45
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso
•Se iniciará con en el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de acceso
•Se iniciará con la excavación e instalación del acero de refuerzo en los espacios de las vigas riostra
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra
•Se iniciará con el relleno detrás del bordillo del costado izq y der
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.
•Se iniciará con la excavación de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con la excavación de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.
•Se iniciará con la excavación de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con la excavación de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se iniciará con la instalación del Material Subbase Granular
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.
•Se iniciará con la excavación de la rampa de acceso
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso
•Se iniciará con el armado acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso
•Se iniciará con la excavación de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de la formaleta de la huella izq y der
•Se iniciará con el armado acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la piedra pegada
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de inicio
•Se iniciará con el vaciado de concreto de huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo (a=0.90)

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

### RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215** | | |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 | | |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 | | |
| | | | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **336** | | |
| GASPAR | 336 | | |
| | | | |

### RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716** | | |
| BONAFONT | 95 | | |
| SAN ANTONIO | 80 | | |
| FLORENCIA | 100 | | |
| ALTO BONITO | 80 | | |
| SAN JOSE 1 | 90 | | |
| SAN JOSE 2 | 80 | | |
| PIRZA | 90 | | |
| MEJIAL | 101 | | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1090** | | |
| BONAFONT | 300 | | |
| QUIMBAYA | 300 | | |
| AGUA BONITA | 190 | | |
| ALTO BONITO | 300 | | |
| | | | |
| | | | |

### RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142** | | |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 | | |
| LA DIVISA | 62 | | |
| | | | |

### RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635** | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 | | |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 | | |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 | | |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 | | |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 25 del 01/08/25 al 07/08/25 Último Informe Semanal SI

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA - MEJIAL**





**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA COMUNIDAD EL BRASIL**





**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |
| | | FECHA | 15/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 26 del 08/08/25 al 14/08/25 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215 m** | **PLACA HUELLA** | **215 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **336 m** |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 80 m | TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 m | GASPAR | 336 m |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 50 m | TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 m | | |
| TRAMO 3 (VIA GUASCAL) | 85 m | | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716 m** | **PLACA HUELLA** | **717 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **1090 m** |
| BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 300 m |
| SAN ANTONIO | 80 m | SAN ANTONIO | 80 m | QUIMBAYA | 300 m |
| FLORENCIA | 100 m | FLORENCIA | 100 m | AGUA BONITA | 190 m |
| ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 300 m |
| SAN JOSE 1 | 90 m | SAN JOSE 1 | 90 m | | |
| SAN JOSE 2 | 80 m | SAN JOSE 2 | 80 m | | |
| PIRZA | 90 m | PIRZA | 90 m | | |
| MEJIAL | 101 m | MEJIAL | 101,52 m | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142 m** |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 m |
| LA DIVISA | 62 m |

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635 m** |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 m |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 m |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 m |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 m |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 m |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 m |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espesor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para el Municipio de Supia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 1708 m – 21 tramos

Camino Ancestral: 1426 m – 5 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| **INTEGRANTES:** | 90% GRAND CONSTRUCCIONES SAS - 10% COSTRUVIAL LP S.A.S. |
| **CONTRATO No.** | 18092024-1274 |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/10/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.700.064.310,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 2.700.064.310,00 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 300.000.000,00 |
| **VALOR AMORTIZADO:** | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1:** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2:** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 30 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S |
| **CONTRATO No.** | 2252 DE 2021 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 999.980.476,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 285.000.000,00 |
| **VALOR ACUMULADO:** | $ 1.284.980.476,00 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 420.159.864,00 |
| **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420.159.864,00 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | **RECURSOS POR VIGENCIA** | | | | $ 2.700.064.310 | |
| | **EJECUTADO DE LA VIGENCIA** | | | | | |
| | **SALDO DE VIGENCIA** | | | | $ 2.700.064.310 | |
| INTERVENTORÍA | **RECURSOS POR VIGENCIA** | $ 394.000.000,00 | $ 605.980.476 | $ 100.000.000 | $ 159.528.013 | $ 285.000.000,00 |
| | **EJECUTADO DE LA VIGENCIA** | $ 282.124.081,35 | $ 558.328.382 | $ 49.688.494 | $ 36.687.023 | |
| | **SALDO DE VIGENCIA** | $ 111.875.918,65 | $ 47.652.094 | $ 50.311.506 | $ 122.840.990 | $ 285.000.000,00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.653.461.473,73 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.139.131.010,67 | 42,93% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 219.949.970,02 | 8,29% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (919.181.040,65) | -34,64% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 46.602.836,32 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 46.602.836,32 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (46.602.836,32) | -100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 2.700.064.310,05 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.185.733.846,99 | 43,92% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 219.949.970,02 | 8,15% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (965.783.876,97) | -35,77% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 44.578.152,76 | 1,68% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 101.753.462,80 | 3,83% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoría y la gobernación de caldas el 30 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Vial Caldas 2024 tuvo fecha de reinicio el 30 de julio de 2025.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.205.930.629,96 | 93,85% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.034.420.603,93 | 80,50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-064220

PERIODO FACTURADO: 1 al 12 Febrero 2025

VALOR FACTURA: $ 22.944.271,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:** Por solicitud del area juridica de la Gobernación de Caldas la Interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-038 del 5 de febrero de 2025 remite a la Secretaria de Infraestructura ajuste a la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No 18092024-1274.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 300.000.000 |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | 300.000.000 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4,702981336 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420.159.864 |
| **Amortizado $** | 420.159.864 |
| **Saldo $** | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 26 del 08/08/25 al 14/08/25 — Último Informe Semanal SI

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 42,93%
Meta Física Ejecutada %: 8,29%
Avance o Atraso Físico %: -34,64%

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| * PLACA HUELLA | m | 1708 | 1708 | |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1426 | 1426 | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Resguardo 4 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 400,00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | 215,00 | 716,00 | 142,00 | 635,00 | 1708,00 | 100,00% |
| Ejec | 24,87 | 104,37 | | 59,26 | 188,50 | 11,04% |
| Prog | 336,00 | 1090,00 | N/A | N/A | 1426,00 | 100,00% |
| Ejec | | | N/A | N/A | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | |
| Compactador manual | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: | LA TRINA EMBERA CHAMI | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 215 | 215 | 24,87 | ATRASO | 88,43% | Se presenta un atraso del 88,43%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | CAMINO ANCESTRAL | 336 | 336 | | ATRASO | 100,00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| RESGUARDO 2: | ESCOPETERA Y PIRZA | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 716 | 716 | 104,37 | ATRASO | 85,42% | Se presenta un atraso del 85,42%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | CAMINO ANCESTRAL | 1090 | 1090 | | ATRASO | 100,00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 3: | CAUROMÁ | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 142 | 142 | | ATRASO | 100,00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 4: | CAÑAMOMO LOMAPRIETA | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 635 | 635 | 59,26 | ATRASO | 90,67% | Se presenta un atraso del 90,67%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA LA FELISA | PERMISO MINERO: | SI | NO x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO x |

**OBSERVACIONES:**
El Contratista de obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024)

**OBSERVACIONES:** El martes 12 de agosto de 2025 se realizó reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA. Como conclusion de la reunión se establecieron mesas de trabajo con los pares socioambientales y los gestores del Invias para revisar el tema del documento PAGA y establecer como se iban a desarrollar los informes.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER. |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 28 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 3 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 25 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** El martes 12 de agosto de 2025 se realizó reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA. Como conclusion de la reunión se establecieron mesas de trabajo con los pares socioambientales y los gestores del Invias para revisar el tema del documento PAGA y establecer como se iban a desarrollar los informes.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El dia 1 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal para la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal para los dos módulos de huella izq que hacían falta por construir, de la abscisa (K0+058.63 a K0+065)

***Florencia (PH – 100 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+090).

**El dia 2 de agosto de 2025:**
RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo transversal para la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)
•Se inicio con la adecuación de la entrada al predio para posterior armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo transversal para los dos módulos de huella izq que hacían falta por construir, de la abscisa (K0+058.63 a K0+065)
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+100).

RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+100).
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).

RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+090 a la abscisa K0+120).

**El dia 3 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.
***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la entrada al predio

**El dia 4 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la huella der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065).
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq de la abscisa (K0+058.83 a K0+065)
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+040).

RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+050).
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+050).

RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la actividad de conformación de la Vía (de la abscisa K0+120 a la abscisa K0+130).
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+020).

**El dia 5 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+029.94 a K0+097.04) y de la entrada al predio.
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+040 a la abscisa K0+060).

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 26 del 08/08/25 al 14/08/25 | Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+050 a la abscisa K0+070).
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+050 a la abscisa K0+070).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+020 a la abscisa K0+040).

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

**El día 6 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la piedra pegada izq a=0.45 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+100.16)
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+060 a la abscisa K0+100).

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+070 a la abscisa K0+100).
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+070 a la abscisa K0+90).

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+040 a la abscisa K0+080).

**El día 7 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la piedra pegada izq a=0.90 de la abscisa (K0+001.34 a la abscisa K0+032.95)
•Se inicio con la excavación e instalación de la subbase en la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+001.34 a K0+065)

***Florencia (PH – 100 m)**
•Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.
***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se realizó por parte de la interventoría un apique en diferentes puntos del tramo para verificar que se hayan instalado los 15 cm mientras se programa el laboratorio para la toma de densidades.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se inicia con la instalación del Material Subbase Granular de la abscisa K0+080 a la abscisa K0+100).

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETRA Y PIRZA.**

***Mejial (PH - 101.52 m)**
•Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo en la piedra pegada izq a=0.90
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la cuneta y bordillo der
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo en la piedra pegada der a=0.45
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso
•Se iniciará con en el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de acceso
•Se iniciará con la excavación e instalación del acero de refuerzo en los espacios de las vigas riostra
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra
•Se iniciará con el relleno detrás del bordillo del costado izq y der
***Florencia (PH – 100 m)**
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

***Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.
•Se iniciará con la excavación de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con la excavación de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

***Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.
•Se iniciará con la excavación de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con la excavación de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de acceso de inicio
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

***Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se iniciará con la instalación del Material Subbase Granular
•Se realizará la toma de densidades por el método del cono de arena.
•Se iniciará con la excavación de la rampa de acceso
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso
•Se iniciará con el armado acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso
•Se iniciará con la excavación de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con la instalación de la formaleta de la huella izq y der
•Se iniciará con el armado acero de refuerzo longitudinal y transversal de la huella izq y der
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la piedra pegada
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de inicio
•Se iniciará con el vaciado de concreto de huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de las vigas riostra
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo (a=0.90)

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215** | | |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 | | |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 | | |
| | | | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **336** | | |
| GASPAR | 336 | | |
| | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716** | | |
| BONAFONT | 95 | | |
| SAN ANTONIO | 80 | | |
| FLORENCIA | 100 | | |
| ALTO BONITO | 80 | | |
| SAN JOSE 1 | 90 | | |
| SAN JOSE 2 | 80 | | |
| PIRZA | 90 | | |
| MEJIAL | 101 | | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1090** | | |
| BONAFONT | 300 | | |
| QUIMBAYA | 300 | | |
| AGUA BONITA | 190 | | |
| ALTO BONITO | 300 | | |
| | | | |
| | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142** | | |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 | | |
| LA DIVISA | 62 | | |
| | | | |

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635** | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 | | |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 | | |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 | | |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 | | |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 26 del 08/08/25 al 14/08/25 Último Informe Semanal SI

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA - MEJIAL**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA COMUNIDAD EL BRASIL**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA**



**RESGUARDO INDIGENA DE LA TRINA - TRAMO 1**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.<br>Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.<br>Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.<br>Demás actividades referidas en los documentos contractuales. | FIRMA<br>NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA<br>Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1).

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 27 del 15/08/25 al 21/08/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1).

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215 m** | **PLACA HUELLA** | **215 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **336 m** |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 80 m | TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 m | GASPAR | 336 m |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 50 m | TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 m | | |
| TRAMO 3 (VIA GUASCAL) | 85 m | | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716 m** | **PLACA HUELLA** | **716.5 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **1090 m** |
| BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 300 m |
| SAN ANTONIO | 80 m | SAN ANTONIO | 80 m | QUIMBAYA | 300 m |
| FLORENCIA | 100 m | FLORENCIA | 100 m | AGUA BONITA | 190 m |
| ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 300 m |
| SAN JOSE 1 | 90 m | SAN JOSE 1 | 90 m | | |
| SAN JOSE 2 | 80 m | SAN JOSE 2 | 80 m | | |
| PIRZA | 90 m | PIRZA | 90 m | | |
| MEJIAL | 101 m | MEJIAL | 101.52 m | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142 m** |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 m |
| LA DIVISA | 62 m |

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635 m** |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 m |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 m |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 m |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 m |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 m |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 m |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" v estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para el Municipio de Supia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 1708 m – 21 tramos

Camino Ancestral: 1426 m – 5 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 | | |
| **INTEGRANTES:** | 90% GRAND CONSTRUCCIONES SAS - 10% COSTRUVIAL LP S.A.S. | | |
| **CONTRATO No.** | 1809/2024-1274 | **VALOR INICIAL:** | $ 2,700,064,310.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/10/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 2,700,064,310.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 300,000,000.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 32,038,159.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 267,961,841.00 |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1:** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2:** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 30 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2202 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 999,980,476.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285,000,000.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1,284,980,476.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 2,700,064,310 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | $ 128,152,637.00 |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 2,700,064,310 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000.00 | $ 605,980,476 | $ 100,000,000 | $ 159,526,013 | $ 285,000,000.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081.35 | $ 558,328,382 | $ 49,688,494 | $ 36,687,023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,918.65 | $ 47,652,094 | $ 50,311,506 | $ 122,840,990 | $ 285,000,000.00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Incluir valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2,653,461,473.73 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1,183,709,163.43 | 44.61% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 227,021,685.34 | 8.56% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1956,687,478.09 | -36.05% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 46,602,836.32 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 46,602,836.32 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (46,602,836.32) | -100.00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 2,700,064,310.05 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,230,311,999.75 | 45.57% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 227,021,685.34 | 8.41% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ (1,003,290,314.41) | -37.16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 44,578,152.76 | 1.65% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 7,071,715.32 | 0.27% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13 de Agosto de 2025

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ 128,152,637.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoria y la gobernación de caldas el 30 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoria a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Vial Caldas 2024 tuvo fecha de reinicio el 30 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,217,704,011.29 | 94.78% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,053,144,240.47 | 81.96% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:** la Interventoria iniciara con la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No 18092024-1274.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 300,000,000 |
| **Amortizado $** | 32,038,159 |
| **Saldo $** | 267,961,841 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4.63895878 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420,159,864 |
| **Amortizado $** | 420,159,864 |
| **Saldo $** | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 5 |
| | | FECHA | 22/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 27 del 15/08/25 al 21/08/25 | Último Informe Semanal SI

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 44.61%
Meta Física Ejecutada %: 8.56%
Avance o Atraso Físico %: -36.05%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| * PLACA HUELLA | m | 1708 | 1708 | |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1426 | 1426 | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Resguardo 4 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 400.00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | 215.00 | 716.00 | 142.00 | 635.00 | 1708.00 | 100.00% |
| Ejec | 25.82 | 104.37 | | 64.03 | 194.22 | 11.37% |
| Prog | 336.00 | 1090.00 | N/A | N/A | 1426.00 | 100.00% |
| Ejec | | | N/A | N/A | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | |
| Compactador manual | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: | LA TRINA EMBERA CHAMI | PLACA HUELLA | 215 | 215 | 25.82 | ATRASO | 87.99% | Se presenta un atraso del 87,99%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | | CAMINO ANCESTRAL | 336 | 336 | | ATRASO | 100.00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| RESGUARDO 2: | ESCOPETERA Y PIRZA | PLACA HUELLA | 716 | 716 | 104.37 | ATRASO | 85.42% | Se presenta un atraso del 85,42%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | | CAMINO ANCESTRAL | 1090 | 1090 | | ATRASO | 100.00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 3: | CAUROMÁ | PLACA HUELLA | 142 | 142 | | ATRASO | 100.00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 4: | CAÑAMOMO LOMAPRIETA | PLACA HUELLA | 635 | 635 | 64.03 | ATRASO | 89.92% | Se presenta un atraso del 89,92%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA LA FELISA | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |

**OBSERVACIONES:**
El Contratista de obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoría mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024)

**OBSERVACIONES:** El miércoles 21 de agosto de 2025 se realizó mesa de trabajo entre los pares Socio Ambiental de la Supervisión de Sostenibilidad, el Contratista de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA. Como conclusión de la reunión se establecieron los siguientes compromisos:
1.- El contratista, elaborará los documentos PAGA V3, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 del 12 de noviembre de 2024, tomará la lista de chequeo de las observaciones e incluirá una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento.

No obstante, los profesionales del contratista, manifestaron evaluar, si es mejor iniciar un nuevo documento para agilizar el proceso.

Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.

- Fecha de entrega del documento, máximo 2 semanas, teniendo en cuenta que la obra vence el plazo el 30 de septiembre de 2025, aproximadamente al 5 de septiembre de 2025.
- Se incluirán las Actas de radicación ambiental y social diligenciadas, con sus respectivos anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental y social con presupuesto - cero.

2.- La interventoría remitirá el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento, al correo del contratista.
3.- La Interventoría facilita al contratista, la lista de chequeo de la estructura y contenido, para la elaboración y presentación del PAGA actualizado, acorde a la GMAMC 2022.
4.- El contratista hará la revisión del manual de interventoría del INVIAS, con el apoyo de la interventoría, para revisar los lineamientos para la elaboración de los informes mensuales, tan pronto presente los documentos PAGA de la obra.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 14 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 10 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** el miércoles 21 de agosto de 2025 se realizó mesa de trabajo entre los pares Socio Ambiental de la Supervisión de Sostenibilidad, el Contratista de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El día 15 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**
**Florencia (PH – 100 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**
**Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+022.2 a K0+041.95)
•Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+022.2 a K0+041.95)
**Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se inicio con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+001.13 a K0+066.96)
•Se inicio con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+001.13 a K0+066.96)

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**
**Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con la instalación de la formaleta para la piedra pegada de la abscisa (K0+074.62 a K0+092.48)
•Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+074.62 a K0+092.48)

**El día 16 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**
**Florencia (PH – 100 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**
**Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra.
**Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**
**Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 de la abscisa (K0+074.62 a K0+092.48)

**El día 19, 20 y 21 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Florencia (PH – 100 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra. Por parte de la interventoría, se toman ensayos de densidades al material granular instalado, teniendo come resultado porcentajes de compactación inferiores a los requeridos en la especificación.

**Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•No se realizó ninguna actividad física de obra. Por parte de la interventoría, se toman ensayos de densidades al material granular instalado, teniendo come resultado porcentajes de compactación inferiores a los requeridos en la especificación.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**
**Florencia (PH – 100 m)**
•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se iniciará la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se iniciará la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**
**Via Comunidad el Brasil (PH – 100 m) y Via Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**
•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**
**Tramo 1 Via Guascal (PH – 130 m)**
•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |
| | | FECHA | 22/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 27 del 15/08/25 al 21/08/25 | Último Informe Semanal SI

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

### RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI

| | META |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215** |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 |

| EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | META |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **336** |
| GASPAR | 336 |

| EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|
| | |
| | |

### RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA

| | META |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716** |
| BONAFONT | 95 |
| SAN ANTONIO | 80 |
| FLORENCIA | 100 |
| ALTO BONITO | 80 |
| SAN JOSE 1 | 90 |
| SAN JOSE 2 | 80 |
| PIRZA | 90 |
| MEJIAL | 101 |

| EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | META |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1090** |
| BONAFONT | 300 |
| OLIMPAYA | 300 |
| AGUA BONITA | 190 |
| ALTO BONITO | 300 |

| EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

### RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ

| | META |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142** |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 |
| LA DIVISA | 62 |

| EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

### RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| | META |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635** |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 |

| EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA - MEJIAL



RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA COMUNIDAD EL BRASIL



RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA



RESGUARDO INDIGENA DE LA TRINA - TRAMO 1

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 1 de 3 |
| | FECHA | 29/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1).

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 26 del 22/08/25 al 28/08/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1).

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215 m** | **PLACA HUELLA** | **215 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **336 m** |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 80 m | TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 m | GASPAR | 336 m |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 50 m | TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 m | | |
| TRAMO 3 (VIA GUASCAL) | 85 m | | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716 m** | **PLACA HUELLA** | **716.5 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **1090 m** |
| BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 300 m |
| SAN ANTONIO | 80 m | SAN ANTONIO | 80 m | QUIMBAYA | 300 m |
| FLORENCIA | 100 m | FLORENCIA | 100 m | AGUA BONITA | 190 m |
| ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 300 m |
| SAN JOSE 1 | 90 m | SAN JOSE 1 | 90 m | | |
| SAN JOSE 2 | 80 m | SAN JOSE 2 | 80 m | | |
| PIRZA | 90 m | PIRZA | 90 m | | |
| MEJIAL | 101 m | MEJIAL | 101.52 m | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142 m** |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 m |
| LA DIVISA | 62 m |

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635 m** |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 m |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 m |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 m |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 m |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 m |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 m |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" v estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para el Municipio de Supia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 1708 m – 21 tramos

Camino Ancestral: 1426 m – 5 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 | | |
| **INTEGRANTES:** | 90% GRAND CONSTRUCCIONES SAS - 10% COSTRUVIAL LP S.A.S. | | |
| **CONTRATO No.** | 1809/2024-1274 | **VALOR INICIAL:** | $ 2,700,064,310.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/10/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 2,700,064,310.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 300,000,000.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 32,038,159.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 267,961,841.00 |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1:** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2:** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 30 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2202 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 999,980,476.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285,000,000.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1,284,980,476.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSION 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 2,700,064,310 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | $ 128,152,637.00 |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 2,700,064,310 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000.00 | $ 605,980,476 | $ 100,000,000 | $ 159,528,013 | $ 285,000,000.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081.35 | $ 558,328,382 | $ 49,688,494 | $ 36,687,023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,918.65 | $ 47,652,094 | $ 50,311,506 | $ 122,840,990 | $ 285,000,000.00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2,653,461,473.73 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1,228,287,316.19 | 46.29% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 227,021,685.34 | 8.56% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (1,001,265,630.85) | -37.73% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 46,602,836.32 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 46,602,836.32 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (46,602,836.32) | -100.00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 2,700,064,310.05 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,274,890,152.51 | 47.22% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 227,021,685.34 | 8.41% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ (1,047,868,467.17) | -38.81% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 44,578,152.76 | 1.65% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13 de Agosto de 2025

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ 128,152,637.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoria y la gobernación de caldas el 30 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Vial Caldas 2024 tuvo fecha de reinicio el 30 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,229,477,392.61 | 95.68% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,071,867,877.01 | 83.42% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:** la Interventoria iniciara con la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No 18092024-1274.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 300,000,000 |
| **Amortizado $** | 32,038,159 |
| **Saldo $** | 267,961,841 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4.721433882 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420,159,864 |
| **Amortizado $** | 420,159,864 |
| **Saldo $** | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |
| | | FECHA | 29/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 26 del 22/08/25 al 28/08/25 | Último Informe Semanal SI

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 46.29%
Meta Física Ejecutada %: 8.56%
Avance o Atraso Físico %: -37.73%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| * PLACA HUELLA | m | 1708 | 1708 | |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1426 | 1426 | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Resguardo 4 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 400.00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | 215.00 | 716.00 | 142.00 | 635.00 | 1708.00 | 100.00% |
| Ejec | 25.82 | 104.37 | | 64.03 | 194.22 | 11.37% |
| Prog | 336.00 | 1090.00 | N/A | N/A | 1426.00 | 100.00% |
| Ejec | | | N/A | N/A | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | |
| Compactador manual | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: | LA TRINA EMBERA CHAMI | PLACA HUELLA | 215 | 215 | 25.82 | ATRASO | 87.99% Se presenta un atraso del 87,99%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | | CAMINO ANCESTRAL | 336 | 336 | | ATRASO | 100.00% Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| RESGUARDO 2: | ESCOPETERA Y PIRZA | PLACA HUELLA | 716 | 716 | 104.37 | ATRASO | 85.42% Se presenta un atraso del 85,42%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | | CAMINO ANCESTRAL | 1090 | 1090 | | ATRASO | 100.00% Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 3: | CAUROMÁ | PLACA HUELLA | 142 | 142 | | ATRASO | 100.00% Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 4: | CAÑAMOMO LOMAPRIETA | PLACA HUELLA | 635 | 635 | 64.03 | ATRASO | 89.92% Se presenta un atraso del 89,92%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA LA FELISA | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |

**OBSERVACIONES:**
El Contratista de obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoría mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024)

**OBSERVACIONES:** El martes 26 de agosto de 2025 mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-052 se da alcance a la reunión socio ambiental 20/08/2025 entrega documentos paga – con atención solicitud oficio cvc24-18092024-1274-025 del 06/08/2025 y solicitud de aclaración profesionales ambiental y social contratista.
Del alcance se tienen las siguientes observaciones o requerimientos:
- Sea lo primero aclarar que, fue atendida su solicitud del oficio CVC24-18092024-1274-025 del 06/08/2025, con las reuniones realizadas los días 12 y 20 de agosto de 2025, donde se estableció el estado documental y las orientaciones necesarias para elaborar y/o complementar los documentos PAGA.

El borrador preliminar del acta de trabajo y compromisos establecidos, fue remitido por las profesionales de la interventoría, se encuentran en el correo electrónico del contratista, pendiente de confirmación para las firmas respectiva.
- Como relevantes de los compromisos, se tiene la entrega de los documentos PAGA, para el día 05 de septiembre de 2025.
- Asistieron profesionales diferentes a los aprobados por la interventoría y, por tanto, se solicita la remisión de las hojas de vida correspondientes, para proceder de conformidad, acorde a las obligaciones contractuales de las partes.
- En atención a la orientación dada por la Gestora ambiental de la SS del INVIAS, se solicita que el manejo de los residuos RESPEL, sigan bajo custodia del contratista y, se vayan acopiando en la medida de su uso en obra y, sean acopiados en la oficina SAU del contratista, hasta que tenga el volumen suficiente, para su entrega a un Gestor de RESPEL legal, o se informe la adecuada disposición final que realizará para su manejo en la obra.
- Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información de la lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información ambiental y social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.

La anterior información es para ratificación de los relevantes de los compromisos adquiridos en los ajustes de los documentos PAGA en los tiempos concertados en la reunión y, se de claridad de parte del contratista, respecto a los profesionales ambiental y social, que estarán atendiendo la obra, para los componentes ambiental y social, en un lapso de tres días hábiles, una vez recibido el presente comunicado.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 4 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** La profesional del contratista de obra se encuentra subsanando las observacions al documento PAGA, el cual sera entregado el día 05 de septiembre de 2025.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**Los días 22, 23, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Florencia (PH – 100 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

El 27 de agosto de 2025, en horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaría de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar los compromisos adquiridos por todas las partes el día 5 de agosto de 2025, así mismo evaluar el estado

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**

**Florencia (PH – 100 m)**

•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se iniciará la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se iniciará la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m) y Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215** | | |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 | | |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 | | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **336** | | |
| GASPAR | 336 | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716** | **101.52** | |
| BONAFONT | 95 | | |
| SAN ANTONIO | 80 | | |
| FLORENCIA | 100 | | |
| ALTO BONITO | 80 | | |
| SAN JOSE 1 | 90 | | |
| SAN JOSE 2 | 80 | | |
| PIRZA | 90 | | |
| MEJIAL | 101 | 101.52 | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1090** | | |
| BONAFONT | 300 | | |
| QUIMBAYA | 300 | | |
| AGUA BONITA | 190 | | |
| ALTO BONITO | 300 | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142** | | |
| VÍA MIFINA CARAI | 80 | | |
| LA DIVISA | 62 | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |
| | | FECHA | 29/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 26 del 22/08/25 al 29/08/25 Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635** | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 | | |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 | | |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 | | |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 | | |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRAFICO**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA COMUNIDAD EL BRASIL**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA**



**RESGUARDO INDIGENA DE LA TRINA - TRAMO 1**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |
| | | FECHA | 05/09/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1).

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 29 del 29/08/25 al 04/09/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1).

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **215 m** | **PLACA HUELLA** | **215 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **336 m** |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 80 m | TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 m | GASPAR | 336 m |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 50 m | TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 m | | |
| TRAMO 3 (VIA GUASCAL) | 85 m | | | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | | Meta Física Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **716 m** | **PLACA HUELLA** | **716.5 m** | **CAMINO ANCESTRAL** | **1090 m** |
| BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 95 m | BONAFONT | 300 m |
| SAN ANTONIO | 80 m | SAN ANTONIO | 80 m | QUIMBAYA | 300 m |
| FLORENCIA | 100 m | FLORENCIA | 100 m | AGUA BONITA | 190 m |
| ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 80 m | ALTO BONITO | 300 m |
| SAN JOSE 1 | 90 m | SAN JOSE 1 | 90 m | | |
| SAN JOSE 2 | 80 m | SAN JOSE 2 | 80 m | | |
| PIRZA | 90 m | PIRZA | 90 m | | |
| MEJIAL | 101 m | MEJIAL | 101.52 m | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **142 m** |
| VÍA MEDIA CARAL | 80 m |
| LA DIVISA | 62 m |

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | |
|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635 m** |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 m |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 m |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 m |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 m |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 m |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 m |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 m |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" v estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para el Municipio de Supia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 1708 m – 21 tramos

Camino Ancestral: 1426 m – 5 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 | | |
| **INTEGRANTES:** | 90% GRAND CONSTRUCCIONES SAS - 10% COSTRUVIAL LP S.A.S. | | |
| **CONTRATO No.** | 1809/2024-1274 | **VALOR INICIAL:** | $ 2,700,064,310.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/10/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 2,700,064,310.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 300,000,000.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 32,038,159.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 267,961,841.00 |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1:** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2:** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 30 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2202 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 999,980,476.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285,000,000.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1,284,980,476.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSION 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 2,700,064,310 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | $ 128,152,637.00 |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 2,700,064,310 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000.00 | $ 605,980,476 | $ 100,000,000 | $ 159,526,013 | $ 285,000,000.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081.35 | $ 558,328,382 | $ 49,688,494 | $ 36,687,023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,918.65 | $ 47,652,094 | $ 50,311,506 | $ 122,840,990 | $ 285,000,000.00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2,653,461,473.73 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1,348,489,120.95 | 50.82% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 227,021,685.34 | 8.56% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (1,121,467,435.61) | -42.26% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 46,602,836.32 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 46,602,836.32 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (46,602,836.32) | -100.00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 2,700,064,310.05 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,395,091,957.27 | 51.67% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 227,021,685.34 | 8.41% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ (1,168,070,271.93) | -43.26% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 120,201,804.76 | 4.53% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 13 de Agosto de 2025

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ 128,152,637.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoria y la gobernación de caldas el 30 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoria a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Vial Caldas 2024 tuvo fecha de reinicio el 30 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,239,568,892.32 | 96.47% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,090,591,513.55 | 84.87% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:** La Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-053 del 29 de agosto de 2025 reitera al Contratista de Obra el retraso progresivo en la ejecución de obra, así mismo le solicita sea entregado un Plan de Contingencia de forma detallada semana a semana y se tomen las acciones necesarias para la materialización de actividades de obra, que representen un avance significativo de ejecución en obra, de tal forma que, el atraso en la reprogramación de obra se minimice.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 300,000,000 |
| **Amortizado $** | 32,038,159 |
| **Saldo $** | 267,961,841 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4.803908983 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420,159,864 |
| **Amortizado $** | 420,159,864 |
| **Saldo $** | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |
| | | FECHA | 05/09/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 29 del 29/08/25 al 04/09/25 Último Informe Semanal SI

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 50.82%
Meta Física Ejecutada %: 8.56%
Avance o Atraso Físico %: -42.26%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| * PLACA HUELLA | m | 1708 | 1708 | |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1426 | 1426 | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Resguardo 4 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 400.00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | 215.00 | 716.00 | 142.00 | 635.00 | 1708.00 | 100.00% |
| Ejec | 25.82 | 104.37 | | 64.03 | 194.22 | 11.37% |
| Prog | 336.00 | 1090.00 | N/A | N/A | 1426.00 | 100.00% |
| Ejec | | | N/A | N/A | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | |
| Compactador manual | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: | LA TRINA EMBERA CHAMI | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 215 | 215 | 25.82 | ATRASO | 87.99% | Se presenta un atraso del 87,99%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | CAMINO ANCESTRAL | 336 | 336 | | ATRASO | 100.00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| RESGUARDO 2: | ESCOPETERA Y PIRZA | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 716 | 716 | 104.37 | ATRASO | 85.42% | Se presenta un atraso del 85,42%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |
| | CAMINO ANCESTRAL | 1090 | 1090 | | ATRASO | 100.00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 3: | CAUROMÁ | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 142 | 142 | | ATRASO | 100.00% | Se presenta un atraso del 100%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona y dificultad en el desplazamiento por la lejanía del tramo. |
| RESGUARDO 4: | CAÑAMOMO LOMAPRIETA | | | | | | |
| | PLACA HUELLA | 635 | 635 | 64.03 | ATRASO | 89.92% | Se presenta un atraso del 89,92%, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | CANTERA LA FELISA | PERMISO MINERO: SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | x |

**OBSERVACIONES:**
El Contratista de obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoría mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO VIAL CALDAS 2024)

**OBSERVACIONES:** El martes 26 de agosto de 2025 mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-052 se da alcance a la reunión socio ambiental 20/08/2025 entrega documentos paga – con atención solicitud oficio cvc24-18092024-1274-025 del 06/08/2025 y solicitud de aclaración profesionales ambiental y social contratista.
Del alcance se tienen las siguientes observaciones o requerimientos:
- Sea lo primero aclarar que, fue atendida su solicitud del oficio CVC24-18092024-1274-025 del 06/08/2025, con las reuniones realizadas los días 12 y 20 de agosto de 2025, donde se estableció el estado documental y las orientaciones necesarias para elaborar y/o complementar los documentos PAGA.

El borrador preliminar del acta de trabajo y compromisos establecidos, fue remitido por las profesionales de la interventoría, se encuentran en el correo electrónico del contratista, pendiente de confirmación para las firmas respectiva.
- Como relevantes de los compromisos, se tiene la entrega de los documentos PAGA, para el día 05 de septiembre de 2025.
- Asistieron profesionales diferentes a los aprobados por la interventoría y, por tanto, se solicita la remisión de las hojas de vida correspondientes, para proceder de conformidad, acorde a las obligaciones contractuales de las partes.
- En atención a la orientación dada por la Gestora ambiental de la SS del INVIAS, se solicita que el manejo de los residuos RESPEL, sigan bajo custodia del contratista y, se vayan acopiando en la medida de su uso en obra y, sean acopiados en la oficina SAU del contratista, hasta que tenga el volumen suficiente, para su entrega a un Gestor de RESPEL legal, o se informe la adecuada disposición final que realizará para su manejo en la obra.
- Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información de la lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información ambiental y social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.

La anterior información es para ratificación de los relevantes de los compromisos adquiridos en los ajustes de los documentos PAGA en los tiempos concertados en la reunión y, se de claridad de parte del contratista, respecto a los profesionales ambiental y social, que estarán atendiendo la obra, para los componentes ambiental y social, en un lapso de tres días hábiles, una vez recibido el presente comunicado.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** La profesional del contratista de obra se encuentra subsanando las observacions al documento PAGA, el cual sera entregado el día 05 de septiembre de 2025.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**Los días 29 y 30 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2025:**

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA.**

**Florencia (PH – 100 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA.**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

•No se realizó ninguna actividad física de obra.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA**

**Florencia (PH – 100 m)**

•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se iniciará la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se iniciará la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

**RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**

**Vía Comunidad el Brasil (PH – 100 m) y Vía Alto Sevilla sector Santa Elena (PH – 90 m)**

•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

**RESGUARDO INDÍGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

**Tramo 1 Vía Guascal (PH – 130 m)**

•Se continuará con la actividad de excavación e instalación de canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la actividad de instalación de formaleta para huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas y cunetas.
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto en huellas y cunetas
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con la actividad de colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la actividad de vaciado de concreto ciclópeo a=0.90

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA LA TRINA EMBERA CHAMI**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| PLACA HUELLA | 215 | | |
| TRAMO 1 (VÍA LA CLARA - ENTRADA) | 130 | | |
| TRAMO 2 (VIA GUASCAL) | 85 | | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| CAMINO ANCESTRAL | 336 | | |
| GASPAR | 336 | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| PLACA HUELLA | 716 | 101.52 | |
| BONAFONT | 95 | | |
| SAN ANTONIO | 80 | | |
| FLORENCIA | 100 | | |
| ALTO BONITO | 80 | | |
| SAN JOSE 1 | 90 | | |
| SAN JOSE 2 | 80 | | |
| PIRZA | 90 | | |
| MEJIAL | 101 | 101.52 | |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| CAMINO ANCESTRAL | 1090 | | |
| BONAFONT | 300 | | |
| QUIMBAYA | 300 | | |
| AGUA BONITA | 190 | | |
| ALTO BONITO | 300 | | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAUROMÁ**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| PLACA HUELLA | 142 | | |
| VIA MEDIA CARAL | 80 | | |
| LA DIVISA | 62 | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |
| | | FECHA | 05/09/25<br>(Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO; DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 29 del 29/08/25 al 04/09/25 Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **635** | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR EL GUAICO | 100 | | |
| VÍA SAN PABLO SECTOR GRANATAL | 100 | | |
| VÍA COMUNIDAD EL BRASIL | 100 | | |
| VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA | 90 | | |
| VÍA DE TIZAMAL | 85 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 1 | 39 | | |
| VÍA SANTA ANA PARTE ALTA 2 | 41 | | |
| COMUNIDAD DOSQUEBRADAS | 80 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA COMUNIDAD EL BRASIL**



**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA - VÍA ALTO SEVILLA SECTOR SANTA ELENA**



**RESGUARDO INDIGENA DE LA TRINA - TRAMO 1**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATO No.** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **UNIDADES** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| **Mejoramiento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroexcavadora sobre llantas | | Motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros | 4 | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Compactador manual (SALTARIN) | | Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN)12 | 4 | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Carrotanque de agua | | 1000 Galones | 4 | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Estación Total | Foif - RTS - 1012 | | | A | A | I | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Volqueta | | Capacidad entre 5 y 12 metros cúbicos | 4 | I | I | I | A | A | I | I | A | I | I | A | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mezcladora de concreto | | 1 bulto | 4 | I | I | I | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Vibrocompactadora | Benitin | 700 kg a 1.5 toneladas | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compresor (barrido y soplado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mantenimiento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrotanque de agua | | 1000 Galones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motoniveladora | | Potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibrocompactadora | Dynapac | 10 ton | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroexcavadora sobre llantas TIPO PAJARITA | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 186 | 100 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 44 | 23,7% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 142 | 76,3% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** El Contratista de Obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 a corte del presente informe mensual solo realizó actividades fisicas de obra hasta el 16 de agosto de 2025

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Natalia Arcos G
Firma
Nombre: NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-355216 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/08/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**NOMBRE ARL:** AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indica Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rafael Antonio Zapata Marquez | 72.305.268 | Representante Legal | | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | V | | | | | | | | | | |
| 2 | Leonardo Fabio Marquez Castañeda | 8.048.961 | Director de Obra | | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | V | | | | | | | | | | |
| 3 | Hermes Suarez Caballero | 1.095.794.526 | Residente de Obra 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Juan Carlos Arroyo Arrieta | 8.048.525 | Residente de Obra 2 | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | V | | | | | | | | | | |
| 5 | Maria Jose Enciso Castaño | 1.038.137.436 | Profesional Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Karina Andrea Coronado Rojas | 1.038.101.424 | Profesional SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Greeidy Yeimison Cárdenas Vera | 1.060.593.252 | Profesional Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Consorcio Vial Caldas 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resguardo Indigena Escopetera y Pirza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tramo - Mejian PH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reinel De Jesus Suarez Tapasco | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Marco Tulio Reyes | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mario Gozalo Hernandez Guapacha | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resguardo Indigena Escopetera y Pirza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tramo - Florencia PH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wilmer Andres Marulanda Rojas | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Luis Hernando Suarez Cruz | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Carlos Armando Suarez Ladino | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Darwin Andrey Trejos Bernal | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jaiber Estiben Trejos Bernal | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Robinson La Verde | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tramo - Alto Sevilla PH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gustavo Vergara Valencia | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Alonso De Jesus Trejos | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aldemar Guerrero | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Reyson Fidel Tabares | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Andru Calvo Tapasco | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Arley De Jesus Tapasco | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tramo - Brasil PH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jhon Jairo Guerrero | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Marcelino Largo | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dioner Guerrero | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Julian Gomez | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cesar Mesa | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nimay Gopal Guerrero Parra | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 31/08/2025<br>(Dia / Mes / Año) |

**Resguardo Indigena La Trina**

**Tramo 1 PH**

| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1274

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**MES INFORME MENSUAL:** agosto-2025

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4500026100 | I.23-0094/001 REHABILITACION, MEJORAMIENOT Y MANTENIMI | 1 | Nación | Contrato Principal | $ 2.700.064.310 | $ 2.700.064.310 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | | $ 2.700.064.310 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 2.700.064.310,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar Gobernacion Caldas | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | $ 2.700.064.310 | $ 2.700.064.310 | | | | condición inicial |
| 1 | Parcial de Obra | 3 de Octubre de 2025 a 13 de Agosto de 2025 | $ 160.190.796 | | $ 160.190.796 | $ 32.038.159 | $ 128.152.637 | $ 267.961.841,00 | | $ 2.700.064.310 | $ 2.571.911.673 | n/a | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ 2.700.064.310** | **$ 2.571.911.673** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 2.653.461.473,73 | | **$ 2.653.461.474** |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 18.000.000,00 | $ 3.420.000 | **$ 21.420.000** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 25.182.836,32 | | **$ 25.182.836** |
| **VALOR TOTAL** | $ 2.696.644.310 | $ 3.420.000 | **$ 2.700.064.310** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

**RESGUARDO INDIGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 248 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total horas** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | |

**RESGUARDO INDIGENA DE CAÑOMOMO LOMAPRIETA**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 248 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total horas** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | |

**0**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 248 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total horas** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:** El estado del tiempo se tomará desde las 07:00 horas hasta las 16:00

**OBSERVACIONES:**

En términos generales se contó con un total de 248 horas sol en los 3 Resguardos Indigenas, lo que hubiese permitido el desarrollo de las actividades fisicas de obra.

Firma

Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Firma Natalia Arcos G

Nombre: NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-355216 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)




**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 1 | *Fecha de Ensayo: 1/08/2025 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA | I.N.V. E - 161 | Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta - Brasil (PH) | 3 | % de Compactación en el terreno > = 95% "Según las especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 320-07 Numerales 320.5.2.2; el porcentaje de compactación de los materiales de Sub-base debe ser como mínimo Dm - (k*s) >= 0,95 De , según relación de densidad de campo contra densidad máxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V E - 142 - 07" |  | SI | |
| 2 | *Fecha de Ensayo: 1/08/2025 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA | I.N.V. E - 161 | Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta - Alto Sevilla (PH) | 3 | % de Compactación en el terreno > = 95% "Según las especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 320-07 Numerales 320.5.2.2; el porcentaje de compactación de los materiales de Sub-base debe ser como mínimo Dm - (k*s) >= 0,95 De , según relación de densidad de campo contra densidad máxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V E - 142 - 07" |  | SI | |
| 3 | *Fecha de Ensayo: 1/08/2025 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA | I.N.V. E - 161 | Resguardo Indigena Escopetera y Pirza - Florencia (PH) | 3 | % de Compactación en el terreno > = 95% "Según las especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 320-07 Numerales 320.5.2.2; el porcentaje de compactación de los materiales de Sub-base debe ser como mínimo Dm - (k*s) >= 0,95 De , según relación de densidad de campo contra densidad máxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V E - 142 - 07" |  | SI | |
| 4 | *Fecha de Ensayo: 1/08/2025 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA | I.N.V. E - 161 | Resguardo Indigena - La Trina - La Escuela (PH) | 3 | % de Compactación en el terreno > = 95% "Según las especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 320-07 Numerales 320.5.2.2; el porcentaje de compactación de los materiales de Sub-base debe ser como mínimo Dm - (k*s) >= 0,95 De , según relación de densidad de campo contra densidad máxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V E - 142 - 07" |  | SI | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Fecha de Toma: 1/08/25<br>*Fecha Prueba: 8/8/25 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO | I.N.V. E - 410 | Resguardo Indigena Escopetera y Pirza - Mejial (PH) | Muestra 1 - 7 dias | Asentamiento (Pulg.)<br>210 Resistencia Esperada Kgf/cm2) | RESISTENCIA kgf/cm²: ESPECIFICADA 28 DIAS: 210; 7 DIAS: 144; 14 dias: ; 28 DIAS: ; PROBABLE A 28 DIAS: 213 | SI | |
| 2 | *Fecha de Toma: 1/08/25<br>*Fecha Prueba: 8/8/25 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO | I.N.V. E - 410 | Resguardo Indigena Escopetera y Pirza - Mejial (PH) | Muestra 2 - 7 dias | Asentamiento (Pulg.)<br>210 Resistencia Esperada Kgf/cm2) | RESISTENCIA kgf/cm²: ESPECIFICADA 28 DIAS: 210; 7 DIAS: 144; 14 dias: ; 28 DIAS: ; PROBABLE A 28 DIAS: 213 | SI | |
| 3 | *Fecha de Toma: 1/08/25<br>*Fecha Prueba: 8/8/25 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO | I.N.V. E - 410 | Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta - Brasil (PH) | Muestra 1 - 7 dias | Asentamiento (Pulg.)<br>210 Resistencia Esperada Kgf/cm2) | RESISTENCIA kgf/cm²: ESPECIFICADA 28 DIAS: 210; 7 DIAS: 147; 14 dias: ; 28 DIAS: ; PROBABLE A 28 DIAS: 216 | SI | |
| 4 | *Fecha de Toma: 1/08/25<br>*Fecha Prueba: 8/8/25 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO | I.N.V. E - 410 | Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta - Brasil (PH) | Muestra 2 - 7 dias | Asentamiento (Pulg.)<br>210 Resistencia Esperada Kgf/cm2) | RESISTENCIA kgf/cm²: ESPECIFICADA 28 DIAS: 210; 7 DIAS: 145; 14 dias: ; 28 DIAS: ; PROBABLE A 28 DIAS: 214 | SI | |
| 5 | *Fecha de Toma: 3/08/25<br>*Fecha Prueba: 10/8/25 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO | I.N.V. E - 410 | Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta - Alto Sevilla (PH) | Muestra 2 - 7 dias | Asentamiento (Pulg.)<br>210 Resistencia Esperada Kgf/cm2) | RESISTENCIA kgf/cm²: ESPECIFICADA 28 DIAS: 210; 7 DIAS: 148; 14 dias: ; 28 DIAS: ; PROBABLE A 28 DIAS: 217 | SI | |
| 6 | *Fecha de Toma: 3/08/25<br>*Fecha Prueba: 10/8/25 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO | I.N.V. E - 410 | Resguardo Indigena Cañamomo Lomaprieta - Alto Sevilla (PH) | Muestra 2 - 7 dias | Asentamiento (Pulg.)<br>210 Resistencia Esperada Kgf/cm2) | RESISTENCIA kgf/cm²: ESPECIFICADA 28 DIAS: 210; 7 DIAS: 150; 14 dias: ; 28 DIAS: ; PROBABLE A 28 DIAS: 219 | SI | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 durante el periodo del presente informe mensual entrego resultados de Densidades y Resistencia a la Compresion de cilindros de concreto.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**FECHA DE INICIO:** 3/10/2024

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 (3 MESES)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 2.700.064.310,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 2.700.064.310,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 18.000,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 18.000,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 540.012.862,01 | 3 | 10 | 2024 | 30 | 6 | 2025 |
| Prestaciones Sociales | 20% | $ 540.012.862,01 | 3 | 10 | 2024 | 31 | 12 | 2027 |
| Buen Manejo del Anticipo | 20% | $ 540.012.862,01 | 3 | 10 | 2024 | 30 | 6 | 2025 |
| Estabilidad de la Obra | 30,00% | $ 810.019.293,02 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2029 |
| Calidad del Servicio | 0% | $ 1.500.000,00 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CRC-100020344

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 23/10/2024

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10% | $ 390.000.000,0 | 9 | 9 | 24 | 31 | 12 | 24 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100006388 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 23/10/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 540.012.862,01 | 30 | 7 | 2025 | 31 | 1 | 2026 |
| Prestaciones sociales | 20% | $ 540.012.862,01 | 30 | 7 | 2025 | 31 | 7 | 2028 |
| Buen manejo del anticipo | 20% | $ 540.012.862,01 | 30 | 7 | 2025 | 31 | 1 | 2026 |
| Estabilidad de la Obra | 30,00% | $ 810.019.293,02 | 31 | 7 | 2025 | 31 | 7 | 2030 |
| Calidad del Servicio | 0% | $ 1.500.000,00 | 31 | 7 | 2025 | 31 | 7 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CRC-100020344

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10% | $ 427.050.000,00 | 9 | 9 | 2024 | 31 | 7 | 2025 |
| PATRONAL | 10% | $ 427.050.000,00 | 9 | 9 | 2024 | 31 | 7 | 2025 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10% | $ 427.050.000,00 | 9 | 9 | 2024 | 31 | 7 | 2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10% | $ 427.050.000,00 | 9 | 9 | 2024 | 31 | 7 | 2025 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100006388 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1274 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**FECHA DE INICIO:** 3/10/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 (3 MESES) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. V2 FECHA DE VERSIÓN: **7-nov-24**

**OBSERVACIONES:**

El Plan de Calidad V2 enviado por el Contratista de Obra fue aprobado por la Interventoria

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

**OBSERVACIONES:**

No presento ningun Programa de auditoria

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: **7-nov-24**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES **2** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: **2**

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra realizo la toma de DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA y la toma de CILINDROS DE CONCRETO

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra no reporto ninguna no conformidad en el periodo del presente informe mensual

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Titulo indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación Total | SOUTH - NTS 362R6L | 362R6L | | | | |
| 1 | Nivel de Presición | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra no ha entregado los documentos de calibración de los equipos de topografia

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: GERSON PALOSCHE MOSQUERA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gobierno de CALDAS | **GOBERNACIÓN DE CALDAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)



**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1274 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**JUSTIFICACIÓN:**
En aras de que el Contratista de Obra tenga una mayor ejecución de meta fisica se decidio aumentar el item de Compras de materiales y/o insumos y/o accesorios y se prescinde del Item Mano de Obra

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compra de materiales y/o insumos y/o accesorios | $ 174.020.000,00 | $ 227.092.862,00 | | | $ 401.112.862,00 | 74% |
| 2 | Mano de Obra | $ - | $ - | | | $ - | 0% |
| 3 | Transporte de Material | $ 38.900.000,00 | $ - | | | $ 38.900.000,00 | 7% |
| 4 | Alquiler de Maquinaria | $ 87.080.000,00 | $ 12.920.000,00 | | | $ 100.000.000,00 | 19% |
| N | | | | | | $ - | |
| TOTAL | | $ 300.000.000,00 | $ 240.012.862,00 | | | $ 540.012.862,00 | 100% |

Firma:
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS 1 de 1

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1274 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 17417 **DE** 7/10/2024 (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo) ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. - SOCIEDAD FIDUCIARIA

**CUENTA BANCARIA No.** 56900008053 **BANCO** BANCOLOMBIA (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta) SUCURSAL: MEDELLIN

**ANTICIPO OTORGADO:** 65 %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 319.383.998,67** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZAMAR THE GREAT COMPANY OF CONSTRUCCTION AND EXPORTS S.A.S | $ 100.000.000,00 | 4 | Alquiler de maquinaria, equipos y/o herramienta |
| | | | CONSTRUINGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S | $ 119.382.999,86 | 1 | Compra de materiales y/o insumos y/o accesorios |
| | | | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ROPP SAS | $ 100.000.998,81 | 1 | Compra de materiales y/o insumos y/o accesorios |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - |
| | TOTALES | $ - | | | $ - | $ - |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

El 2 de diciembre de 2024 mediante correo electronico el Contratista de Obra CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 modifica el Plan de Inversión del Anticipo el cual fue aprobado por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-021 el 13 de diciembre de 2024.

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No. 021037-0592381 ATL

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o Delegado
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 31/07/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PROGRAMA DE INVERSIONES**

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 18092024-1274

**OBJETO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: Hasta Diciembre 31 de 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/10/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.700.064.310,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.700.064.310,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta Febrero 15 de 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1<br>10-2024 | 2<br>11-2024 | 3<br>1 al 12 diciembre de 2024 | 3<br>12 al 31 diciembre de 2024 | 4<br>01-2025 | 5<br>1 al 15 febrero de 2025 | 7<br>Indicar mes y año | 8<br>Indicar mes y año | 9<br>Indicar mes y año | 10<br>Indicar mes y año N... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Placa Huella | $263.659.405,49 | 9,94% | 0,00% | % P | 32,64% | 63,83% | 3,53% | 0,67% | 4,70% | 33,58% | | | | | 100% |
| | $263.659.405,49 | 9,94% | $0 | $ P | $86.049.295,67 | $168.301.942,57 | $9.308.167,25 | $1.760.508,27 | $12.384.567,77 | $88.544.861,03 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 90% |
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Camino Ancestral | $114.601.579,18 | 4,32% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,06% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | | | | | |
| | $114.601.579,18 | 4,32% | $0 | $ P | $0,00 | $65.889.094,56 | $44.190.415,54 | $1.732.058,18 | $5.039.299,11 | $37.863.610,55 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 80% |
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Mantenimiento | $29.799.815,09 | 1,12% | 0,00% | % P | 0,07% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $29.799.815,09 | 1,12% | $0 | $ P | $21.500.404,88 | $8.299.410,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $11.606.417,49 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 70% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Placa Huella | $831.776.455,74 | 31,35% | 5,03% | % P | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | | | | | |
| | $831.776.455,74 | 31,35% | $41.853.272 | $ P | $183.744.818,27 | $372.671.630,54 | $185.247.477,67 | $4.803.343,78 | $52.388.494,08 | $341.788.548,95 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $27.405.817,77 | $14.447.454,23 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 60% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Camino Ancestral | $356.843.240,38 | 13,45% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $356.843.240,38 | 13,45% | $0 | $ P | $6.530.686,04 | $146.438.765,75 | $97.892.465,32 | $4.532.955,95 | $16.684.543,5201263 | $147.130.943,54 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 50% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Mantenimiento | $58.985.544,62 | 2,22% | 0,00% | % P | 0,03% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | | | | | |
| | $58.985.544,62 | 2,22% | $0 | $ P | $15.991.278,84 | $29.492.736,31 | $13.501.529,47 | $0,00 | $0,00 | $28.293.750,38 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 40% |
| Resguardo Indígena Cauromá - Supia<br>Placa Huella | $182.871.528,08 | 6,89% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,07% | | | | | |
| | $182.871.528,08 | 6,89% | $0 | $ P | $0,00 | $0,00 | $63.302.087,09 | $5.422.530,01 | $19.504.030,42 | $121.045.141,21 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 30% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Supia<br>Placa Huella | $785.169.003,28 | 29,59% | 0,44% | % P | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | | | | | |
| | $785.169.003,28 | 29,59% | $3.459.965 | $ P | $172.083.743,32 | $348.031.099,47 | $182.283.109,04 | $8.312.878,35 | $45.144.503,59 | $296.212.039,59 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $3.459.965,40 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 20% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Supia<br>Mantenimiento | $29.754.901,87 | 1,12% | 0,00% | % P | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $29.754.901,87 | 1,12% | $0 | $ P | $15.976.030,94 | $13.778.870,93 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $13.251.133,55 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 0% |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$ 2.653.461.473,73** | **100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$ 2.653.461.473,73** | **100%** | | | | | | | | | | | | | |

REPROGRAMACION 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **18,91%** | **43,45%** | **22,45%** | **1,00%** | **5,70%** | **40,92%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$501.876.257,96** | **$1.152.903.550,34** | **$595.725.251,37** | **$26.564.274,54** | **$151.145.438,49** | **$1.085.736.445,80** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **18,91%** | **62,36%** | **84,81%** | **53,36%** | **59,06%** | **100%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$501.876.257,96** | **$1.654.779.808,30** | **$2.250.505.059,67** | **$1.415.916.702,18** | **$1.567.062.140,67** | **$2.652.798.586,47** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0,00%** | **1,16%** | **0,54%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0,00** | **$30.865.783,17** | **$14.447.454,23** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **1,16%** | **1,71%** | **1,71%** | **1,71%** | **1,71%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0,00** | **$30.865.783,17** | **$45.313.237,40** | **$45.313.237,40** | **$45.313.237,40** | **$45.313.237,40** | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 18.000.000,00 / $ 18.000.000,00 | $ - | 0,00% |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 3.420.000,00 / $ 3.420.000,00 | $ - | 0,00% |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 25.182.836,32 / $ 25.182.836,32 | $ - | 0,00% |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| * | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 46.602.836,32 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 46.602.836,32 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ 2.700.064.310,05 | $ 45.313.237,40 | **1,68%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ 2.700.064.310,05 | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: MARIOCABRERA DUSSAN
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PROGRAMA DE INVERSIONES**

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 18992024-1274

**OBJETO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: Hasta Diciembre 31 de 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: Hasta Febrero 15 de 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.700.064.310,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.700.064.310,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | 1<br>10-2024 | 2<br>11-2024 | 3<br>1 al 12 diciembre de 2024 | 3<br>12 al 31 diciembre de 2024 | 4<br>01-2025 | 5<br>1 al 15 febrero de 2025 | 7<br>Indicar mes y año | 8<br>Indicar mes y año | 9<br>Indicar mes y año | 10<br>Indicar mes y año N… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Placa Huella | $263.659.405,49 | 9,94% | 0,00% | % P | 32,64% | 63,83% | 3,53% | 0,67% | 4,70% | 33,58% | | | | | 100% |
| | $263.659.405,49 | 9,94% | $0 | $ P | $86.049.295,67 | $168.301.942,57 | $9.308.167,25 | $1.760.508,27 | $12.384.567,77 | $88.544.861,03 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 90% |
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Camino Ancestral | $114.601.579,18 | 4,32% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,06% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | | | | | |
| | $114.601.579,18 | 4,32% | $0 | $ P | $0,00 | $65.889.094,56 | $44.190.415,54 | $1.732.058,18 | $5.039.299,11 | $37.863.610,85 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 80% |
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Mantenimiento | $29.799.815,09 | 1,12% | 0,00% | % P | 0,07% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $29.799.815,09 | 1,12% | $0 | $ P | $21.500.404,88 | $8.299.410,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $11.606.417,49 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 70% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Placa Huella | $831.776.455,74 | 31,35% | 5,03% | % P | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | | | | | |
| | $831.776.455,74 | 31,35% | $41.853.272 | $ P | $183.744.818,27 | $372.671.630,54 | $185.247.477,67 | $4.803.343,78 | $52.388.494,08 | $341.788.548,95 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $27.405.817,77 | $14.447.454,23 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 60% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Camino Ancestral | $356.843.240,38 | 13,45% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $356.843.240,38 | 13,45% | $0 | $ P | $6.530.686,04 | $146.438.765,75 | $97.892.465,32 | $4.532.955,95 | $16.684.543,5201263 | $147.130.943,54 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 50% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Mantenimiento | $58.985.544,62 | 2,22% | 0,00% | % P | 0,03% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | | | | | |
| | $58.985.544,62 | 2,22% | $0 | $ P | $15.991.278,84 | $29.492.736,31 | $13.501.529,47 | $0,00 | $0,00 | $28.293.750,38 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 40% |
| Resguardo Indígena Cauromá - Supia<br>Placa Huella | $182.871.528,08 | 6,89% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,07% | | | | | |
| | $182.871.528,08 | 6,89% | $0 | $ P | $0,00 | $0,00 | $63.302.087,09 | $5.422.530,01 | $19.504.030,42 | $121.045.141,21 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 30% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Supia<br>Placa Huella | $785.169.003,28 | 29,59% | 0,44% | % P | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | | | | | |
| | $785.169.003,28 | 29,59% | $3.459.965 | $ P | $172.083.743,32 | $348.031.099,47 | $182.283.109,04 | $8.312.878,35 | $45.144.503,59 | $296.212.039,59 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $3.459.965,40 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 20% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Supia<br>Mantenimiento | $29.754.901,87 | 1,12% | 0,00% | % P | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $29.754.901,87 | 1,12% | $0 | $ P | $15.976.030,04 | $13.778.870,93 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $13.251.133,55 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0% |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 2.653.461.473,73 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 2.653.461.473,73 | 100% | | | | | | | | | | | | | |

REPROGRAMACION 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 18,91% | 43,45% | 22,45% | 1,00% | 5,70% | 40,92% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $501.876.257,96 | $1.152.903.550,34 | $595.725.251,37 | $26.564.274,54 | $151.145.438,49 | $1.085.736.445,80 | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 18,91% | 62,36% | 84,81% | 53,36% | 59,06% | 100% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $501.876.257,96 | $1.654.779.808,30 | $2.250.505.059,67 | $1.415.916.702,18 | $1.567.062.140,67 | $2.652.798.586,47 | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 1,16% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0,00 | $30.865.783,17 | $14.447.454,23 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 1,16% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0,00 | $30.865.783,17 | $45.313.237,40 | $45.313.237,40 | $45.313.237,40 | $45.313.237,40 | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL – VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 18.000.000,00 | $ - | 0,00% |
| | $ 18.000.000,00 | | |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 3.420.000,00 | $ - | 0,00% |
| | $ 3.420.000,00 | | |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 25.182.836,32 | $ - | 0,00% |
| | $ 25.182.836,32 | | |
| * | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| * | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| * | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| * | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 46.602.836,32 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 46.602.836,32 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ 2.700.064.310,05 | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ 2.700.064.310,05 | $ 45.313.237,40 | **1,68%** |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: MARIOCABRERA DUSSAN
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/08/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 18092024-1274

**OBJETO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: Hasta Diciembre 31 de 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.700.064.310,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.700.064.310,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta Febrero 15 de 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1<br>10-2024 | 2<br>11-2024 | 3<br>1 al 12 diciembre de 2024 | 3<br>12 al 31 diciembre de 2024 | 4<br>01-2025 | 5<br>1 al 15 febrero de 2025 | 7<br>Indicar mes y año | 8<br>Indicar mes y año | 9<br>Indicar mes y año | 10<br>Indicar mes y año N… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Placa Huella | $263.659.405,49 | 9,94% | 0,00% | % P | 32,64% | 63,83% | 3,53% | 0,67% | 4,70% | 33,58% | | | | | 100% |
| | $263.659.405,49 | 9,94% | $0 | $ P | $86.049.295,67 | $168.301.942,57 | $9.308.167,25 | $1.760.508,47 | $12.384.567,77 | $88.544.861,03 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 90% |
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Camino Ancestral | $114.601.579,18 | 4,32% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,06% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | | | | | |
| | $114.601.579,18 | 4,32% | $0 | $ P | $0,00 | $65.889.694,56 | $44.190.415,54 | $1.732.058,18 | $5.039.299,11 | $37.963.610,05 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 80% |
| Resguardo Indígena La Trina Embera Chami - Supia<br>Mantenimiento | $29.799.815,09 | 1,12% | 0,00% | % P | 0,07% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $29.799.815,09 | 1,12% | $0 | $ P | $21.500.404,88 | $8.299.410,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $11.606.417,49 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 70% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Placa Huella | $831.776.455,74 | 31,35% | 5,03% | % P | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | | | | | |
| | $831.776.455,74 | 31,35% | $41.853.272 | $ P | $183.744.818,27 | $372.671.630,54 | $185.247.477,67 | $4.803.343,78 | $52.388.494,08 | $341.788.548,95 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $27.405.817,77 | $14.447.454,23 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 60% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Camino Ancestral | $356.843.240,38 | 13,45% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $356.843.240,38 | 13,45% | $0 | $ P | $6.530.686,04 | $146.438.765,75 | $97.892.465,32 | $4.532.955,95 | $16.684.543,5201263 | $147.130.943,54 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 50% |
| Resguardo Indígena Escopetera y Pirza - Riosucio<br>Mantenimiento | $58.985.544,62 | 2,22% | 0,00% | % P | 0,03% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | | | | | |
| | $58.985.544,62 | 2,22% | $0 | $ P | $15.991.278,84 | $29.492.776,31 | $13.501.529,47 | $0,00 | $0,00 | $28.293.750,38 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 40% |
| Resguardo Indígena Cauromá - Supia<br>Placa Huella | $182.871.528,08 | 6,89% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,07% | | | | | |
| | $182.871.528,08 | 6,89% | $0 | $ P | $0,00 | $0,00 | $63.302.087,09 | $5.422.530,01 | $19.504.030,42 | $121.045.141,21 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 30% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Supia<br>Placa Huella | $785.169.003,28 | 29,59% | 0,44% | % P | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | | | | | |
| | $785.169.003,28 | 29,59% | $3.459.965 | $ P | $172.083.743,32 | $348.031.099,47 | $182.283.109,04 | $8.312.878,35 | $45.144.503,59 | $296.212.039,59 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $3.459.965,40 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 20% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Supia<br>Mantenimiento | $29.754.901,87 | 1,12% | 0,00% | % P | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | | | | | |
| | $29.754.901,87 | 1,12% | $0 | $ P | $15.976.030,94 | $13.778.870,93 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $13.251.133,55 | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 0% |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$ 2.653.461.473,73** | **100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$ 2.653.461.473,73** | **100%** | | | | | | | | | | | | | |

REPROGRAMACION 1

| | | 1<br>10-2024 | 2<br>11-2024 | 3<br>1 al 12 diciembre de 2024 | 3<br>12 al 31 diciembre de 2024 | 4<br>01-2025 | 5<br>1 al 15 febrero de 2025 | 7<br>Indicar mes y año | 8<br>Indicar mes y año | 9<br>Indicar mes y año | 10<br>Indicar mes y año N… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 18,91% | 43,45% | 22,45% | 1,00% | 5,70% | 40,92% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $501.876.257,96 | $1.152.903.550,34 | $595.725.251,37 | $26.564.274,54 | $151.145.438,49 | $1.085.736.445,80 | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 18,91% | 62,36% | 84,81% | 53,36% | 59,06% | 100% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $501.876.257,96 | $1.654.779.808,30 | $2.250.505.059,67 | $1.415.916.702,18 | $1.567.062.140,67 | $2.652.798.586,47 | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 1,16% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0,00 | $30.865.783,17 | $14.447.454,23 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 1,16% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0,00 | $30.865.783,17 | $45.313.237,40 | $45.313.237,40 | $45.313.237,40 | $45.313.237,40 | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 18.000.000,00 / $ 18.000.000,00 | $ - | 0,00% |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 3.420.000,00 / $ 3.420.000,00 | $ - | 0,00% |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 25.182.836,32 / $ 25.182.836,32 | $ - | 0,00% |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 46.602.836,32 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 46.602.836,32 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ 2.700.064.310,05 | $ 45.313.237,40 | **1,68%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ 2.700.064.310,05 | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | - - - - - - - | ——— |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: MARIOCABRERA DUSSAN
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 20/08/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 23
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1274
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento al componente socio-ambiental al CONTRATO DE OBRA No 18092024-1274 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)"

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1.-Aclaraciones sobre la reunión ambiental y social
2.- Estado actual trazabilidad incumplimiento documentos PAGA COP No.18092024-1274 CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
3.- Atención dudas e inquietudes elaboración documento PAGA para los cuatro resguardos indígenas.
4.- Informes ambientales mensuales y, de Balance ambiental a la terminación del contrato de obra

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En atención a los compromisos concertados en el comité de la DT Caldas del día 12/08/2025, se realizó la reunión con las profesionales del área ambiental y Social: Ingeniero ambiental Andrés Felipe Álzate – Trabajadora Social Julieth Cuaran Lauren – Ingeniero Civil Rubén Zabala, del CONSORCIO CVC 2024 contratista, Especialista Ambiental Belén Alexandra Cerón Q, Especialista Social Yina Andrea Bedoya - CONSORCIO CEEF interventoría – Coordinador Ambiental del CRIDEC Juan Carlos Vega e, Ingeniera Juanita Gonzalez – gestora ambiental de la SS INVIAS, en el cual se establecieron las siguientes aclaraciones y, compromisos:

Los temas tratados fueron:
1.-Aclaraciones sobre la reunión ambiental y social
2.- Estado actual trazabilidad incumplimiento documentos PAGA COP No.18092024-1274 CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
3.- Atención dudas e inquietudes elaboración documento PAGA para los cuatro resguardos indígenas.
4.- Informes ambientales mensuales y, de Balance ambiental a la terminación del contrato de obra.

Desarrollo de la reunión:

1.- Aclaraciones realizadas por las profesionales de la Interventoría:
• La reunión con el acompañamiento de las gestoras ambiental y social con los contratistas de obra y la interventoría, se realiza a solicitud de la Gestora técnica Ingeniera Liliana Tibatá, en el comité socioambiental del 12/08/2025 en la DT Caldas, dado que no se han aprobado por la interventoría, los documentos PAGA presentados por los contratistas.
• Las reuniones, eran simultaneas entre los profesionales de los componentes ambiental y social, a las 10 a.m. del 20/08/2025, programación que fue concertada en la reunión del 12/08/2025 en la DT Caldas y, a petición de la Ingeniera Juanita González, la del área ambiental fue trasladada para las 11 am del mismo día, con la situación de que los profesionales del área social, del CONSORCIO CVC 2024 y de la SS del INVIAS, no asistieron a la reunión de las 10 am del área social. No obstante, acorde al estado documental, ya que aún no está aprobado el documento PAGA, la gestora Social de la SS del INVIAS, informó no se volverá a conectar porque no hay ni siquiera un punto de revisar.
• El contratista informó que asumieron que la reunión de las áreas ambiental y social, se trasladó a las 11 am y serian a la misma hora con todos los profesionales citados y, adicionalmente, invitaron al Señor Juan Carlos Vega, coordinador del área ambiental de los resguardos indígenas, del área de influencia de la obra, quien manifiesta estar de apoyo para facilitar la información que los formatos del proyecto requiera y, por tanto, se unieron las dos reuniones.
• La Ingeniera Juanita González, informa que, la Doctora Marcela Bermeo escribió a la Gestora Técnica que no asistiría a las reuniones solicitadas, hasta que el documento PAGA sea aprobado por la Interventoría, en el marco de sus funciones y la normativa vigente, ya que no hay documento PAGA terminado para poder pronunciarse.

• Los profesionales ambiental y social del CONSORCIO CVC 2024, no son los aprobados por la interventoría, no obstante, se aceptó que participen en la reunión siempre y cuando el contratista garantice su idoneidad y, posterior a la reunión se realizará la verificación de las hojas de vida.

2.- Estado actual trazabilidad incumplimiento documentos PAGA COP No.18092024-1274 CONSORCIO VIAL CALDAS 2024.

Las especialistas ambiental y social de la interventoría, reporta a la gestora ambiental de la SS del INVIAS, el estado del seguimiento de los incumplimientos del CONSORCIO CVC 2024, relacionados de la siguiente manera:

• La interventoría manifiesta su preocupación, ya que la obra tiene un plazo acumulado de 4,5 meses, con fecha de vencimiento prorrogados al 30 de septiembre del presente y, a la fecha, pese a las 5 mesas de trabajo conjuntas, tiene siete apremios por incumplimiento reiterado, para que subsane las observaciones realizadas al último documento PAGA presentado por el contratista, que va en la Versión No.2, realizadas por la interventoría para los componentes ambiental y social, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 del 12 de noviembre de 2024, donde se tiene como relevantes: no se tiene identificado el nivel de complejidad de la obra, los permisos, ni actas de radicación, ni planes de inversión, ambiental y social y, otras observaciones puntuales, relacionadas en el oficio. La trazabilidad del incumplimiento se relaciona en el oficio con apremio No. INV-CIC-2252-2021-L1S- 042 del 5 de agosto de 2025.
• Adicionalmente se recordó que deben presentarse un documento PAGA, por resguardo objeto de intervención. Ratificado en la reunión de la DT Caldas del 12/08/2025.
• La profesional social de la Interventoría informa que, a pesar de todas las aclaraciones dadas en las mesas de trabajo, para la elaboración de los documentos PAGA, hay vacío de información en el área social de los resguardos, se requiere definir las áreas territoriales mayor y menor con información secundaria y si tienen información secundaria y primaria puedan obtener, pueden sustentarla, pero se han presentado documentos sin diligenciamientos firmas y afines, entonces no se puede aprobar un PAGA formulado incompleto. Diferente seria si el contratista a los requerimientos de la normativa del INVIAS, sustenta que no se tuvo acceso la información, documentando para poder aprobarlo.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Otro de los problemas ha sido, la variación de los profesionales que asisten a las reuniones, son diferentes y no hay un responsable de los documentos PAGA. La interventoría ha remitido las observaciones necesarias para la elaboración del PAGA y el contratista, no ha realizado las subsanaciones ingresan otros profesionales a la reunión, manifiestan han leído la Guía de manejo ambiental del INVIAS, ya han leído el documento PAGA, en esta reunión lo esperado es que trajeran las inquietudes respecto a esas observaciones.
Las profesionales de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, han evidenciado que la labor de la interventoría es en el marco de la normativa vigente sin exceder sus funciones y es por ello que no van a participar mas en las reuniones, hasta tanto el contratista cumpla con la normatividad vigente, en la elaboración del documento PAGA.

• La dilación al cumplimiento, ha sido reiterativa de parte del contratista, lo cual se ratifica en el último oficio remitido por él, el 6 de agosto del presente, donde después de todo este proceso en este lapso, manifiesta que solicitaba una reunión con la interventoría, con el objetivo de concertar de manera conjunta la metodología, los lineamientos y el contenido técnico para la elaboración y presentación del PAGA, aclaraciones realizadas en la reunión de la DT Caldas del 12/08/2025, donde se les solicitó leer la GMAMC 2022 y, los oficios reiterados de requerimientos de la interventoría, para asistir a la presente reunión, con dudas e inquietudes respecto a las observaciones del PAGA V2.
• Los profesionales ambiental y social del contratista, manifiestan que son nuevos en la obra y, existe la voluntad de presentar los documentos PAGA, acorde a la normativa ambiental vigente.
• Interviene el Señor Juan Carlos Vega, informando que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores de los resguardos, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral

También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

Así mismo, informa que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, "Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades", expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, por tanto, pueden colaborar igualmente con el contratista.

3.- Atención dudas e inquietudes de parte de la interventoría, para la elaboración documento PAGA para los cuatro resguardos indígenas.

.- La interventoría socializa los ajustes puntuales al documento PAGA V2, que deben subsanarse, relacionados en el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 del 12 de noviembre de 2024, incluyendo el Acta de radicación ambiental y el Plan de Inversión ambiental, que debe ir en ceros, ya que, quedó claro que la provisión del PAGA solo paga costos de compensaciones por permisos que se generen directamente ante autoridad ambiental, en el marco de la obra, (Reunión DT CALDAS 12-08-2025)

.- Se atendió las inquietudes respecto a la cartografía, socializando los mapas que debe elaborarse para la línea base ambiental y social, informado que:

• Se debe presentar un anexo cartográfico en donde se organiza la información cartográfica generada para la línea base, área de influencia y demás análisis, y los metadatos, en los diferentes archivos (Shape, KMZ, PGAX y PDF), incluyendo la cartografía social, ubicando en un plano SIG, los polígonos de los Resguardos, la división política – administrativa municipal, la localización de los tramos, para definir la Unidad Territorial Mayor y las Unidades Territoriales Menores.

La cartografía a emplear para implantar las coordenadas del proyecto, las pueden realizar en plataformas SIAC – Tremarctos, mapas de sensibilidad socioambiental del INVIAS, sistemas de Información Geográfica - Visor Geográfico ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia – Geoparques, servicio geológico colombiano, datos abierto cartografía y geografía - instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), IDEAM, POT- EOT y PBOT, entre otras

Estos son acompañados por la GDB del proyecto en la cual se estructura y almacena las capas que se utilizaron para la generación de la cartografía.

.- La interventoría manifiesta que es necesario solicitar la colaboración de las autoridades de los resguardos, acorde a sus facultades normativas, para que se faciliten las autorizaciones necesarias, que el contratista en obra requiere para la construcción de la placa huella, como son: Infraestructuras asociadas para almacenamiento de materiales de construcción y herramientas menores, baños, por uso de recursos naturales específicamente del suministro de aguas lluvias proveniente de jagüeyes, el servicio, para el manejo que se da a los residuos convencionales y RCD. El responsable de las bolsas de cemento es y seguirá siendo el contratista, quien informará el manejo y acopio hasta disposición final con el gestor de RESPEL legal.

Se recuerda que los permisos minero ambientales y los citados, son determinantes de aprobación del documento PAGA para su aprobación, al igual que las actas de radicación y planes de inversión, ambiental y social, con sus respectivos anexos.

**Quedando los siguientes compromisos:**

**1.- El contratista, elabora los documentos PAGA V3, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 del 12 de noviembre de 2024, tomará la lista de chequeo de las observaciones e incluirá una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento.**

**No obstante, los profesionales del contratista, manifestaron evaluar, si es mejor iniciar un nuevo documento para agilizar el proceso.**

**Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.**

**.- Fecha de entrega del documento, máximo 2 semanas, teniendo en cuenta que la obra vence el plazo el 30 de septiembre de 2025, aproximadamente al 5 de septiembre de 2025.**

**.- Se incluirán las Actas de radicación ambiental y social diligenciadas, con sus respectivos anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental y social con presupuesto - cero.**


**2.- La interventoría remitirá el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento, al correo del contratista.**


**3.- La Interventoría facilita al contratista, la lista de chequeo de la estructura y contenido, para la elaboración y presentación del PAGA actualizada, acorde a la GMAMC 2022.**

**4.- El contratista hará la revisión del manual de interventoría del INVIAS, con el apoyo de la interventoría, para revisar los lineamientos para la elaboración de los informes mensuales, tan pronto presente los documentos PAGA de la obra.**

Anexos:
1.- Formatos y Manual de Interventoría del INVIAS, vigente
2.- Cuadro en Excel para registro de soportes consolidado de seguimiento.
3.- Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

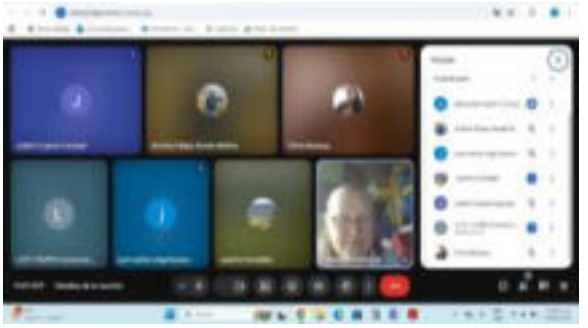

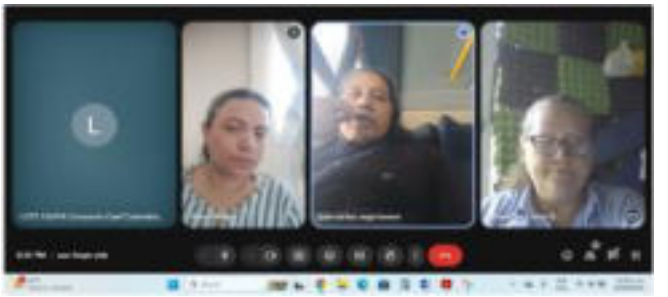

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Fecha de entrega del documento PAGA de según comunicación NV-CIC-2252-2021-L1S-033 de fecha 12 de noviembre de 2024 | DOS SEMANAS CONTADAS DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE REUNIÓN (05/09/25) | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| Reunión de verificación entre las profesionales para revisión del PAGA | A CONCRETAR SEGÚN AVANCE | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024<br>CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| Remitir Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales | domingo, 24 de agosto de 2025 | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Juanita del Pilar González Bulla | Gestora Ambiental | Subdiección de Sostenibilidad - INVIAS | |
| Andres Felipe Alzate Molina | Profesional Ambiental | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 | |
| Julieth Vaneza Cuaron Laurean | Profesional Social | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 | |
| Rubén Zabala | Profesional Técnico | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 | |
| Juan Carlos Vega | Coordinador Ambiental | CRIDEC | |
| Yinna Andrea Bedova | Profesional Social | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | |
| Belén Alexandra Cerón Quintero | Profesional Ambiental | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

## 4.0. CONTRATO No 18092024-1295 (Municipio de Riosucio)

### 4.1. INFORMACIÓN SEMANAL

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3

### 4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

### 4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

### 4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

### 4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

### 4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

### 4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

### 4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

### 4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
Se anexa formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

- Actas de Comité de Obra

No se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1; toda vez que, durante el periodo del mes de agosto de 2025 no se realizó comité de obra

- Actas de Reunión

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 26 del 01/08/25 al 07/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| PLACA HUELLA | 897 m |
|---|---|
| PLANADAS | 157 m |
| CAÑAMOMO 1 | 100 m |
| CAÑAMOMO 2 | 100 m |
| IBERIA BAJA | 170 m |
| PORTACHUELO 1 | 120 m |
| PORTACHUELO 2 | 50 m |
| PANESSO | 100 m |
| AMOLADOR | 100 m |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| PLACA HUELLA | 430 m |
|---|---|
| LA CABAÑA | 115 m |
| UBARBA | 115 m |
| LA ESPERANZA | 200 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1985 m |
|---|---|
| LA CANDELARIA | 400 m |
| TUMBABARRETO | 285 m |
| LAS MINAS | 200 m |
| LAS ESTANCIAS | 200 m |
| EL SALADO | 300 m |
| EL EDEN | 200 m |
| SANTA INES | 400 m |

### RESGUARDO SAN LORENZO

| PLACA HUELLA | 439 m |
|---|---|
| SAN JOSE 1 | 65 m |
| SAN JOSE 2 | 99 m |
| COSTA RICA | 65 m |
| CENTRO POBLADO | 80 m |
| EL CARMELO | 65 m |
| LLANO GRANDE | 65 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1398 m |
|---|---|
| VENEROS | 78 m |
| SAN MIGUEL | 78 m |
| EL ROBLE | 150 m |
| TUNZARA | 78 m |
| EL CACHO | 78 m |
| TAPARCO | 78 m |
| LA ESCUELA | 78 m |
| HONDURAS | 78 m |
| LA PRADERA | 78 m |
| BUENOS AIRES | 78 m |
| PASMI | 78 m |
| JAGUAL | 78 m |
| SISIRRA | 78 m |
| TRES ESQUINAS | 78 m |
| ONCE CASAS | 78 m |
| DANUBIO | 78 m |
| LA LINEA | 78 m |

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**CAMINO ANCESTRAL**

Los caminos ancestrales presentan un tráfico particular, principalmente compuesto vehículos motorizados pequeños, motocicletas, bicicletas y peatones. La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada #5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y ancho total de 1.5 m.

**PLACA HUELLA**

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de dos franjas de huellas de concreto de resistencia F'c=21 Mpa con ancho de 0.90 m y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se encuentra un concreto ciclopeo con piedra a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor. la longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre,se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m, y el confinamiento lateral por berma cunetas en concreto de 0.55 de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MAIC 2024
50% ICSSA SAS
INTEGRANTES: 50% PROMAQCO S.A.S.
CONTRATO No. 18092024-1295
FECHA DE INICIO: 1/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: sin definir la prorroga

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 3,568,032,325.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 3,568,032,325.00 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 713,606,465.00 |
| VALOR AMORTIZADO: | $ 245,846,741.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 467,759,724.00 |

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 2 DEL 25 DE JULIO AL 3015 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN 1 | DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | REANUDACION | 1 DE ABRIL DE 2025 |
| AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 | DEL 15 DE FEBRERO AL 25 DE JULIO DE 2025 | REANUDACION | 25 DE JULIO DE 2025 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
INTEGRANTES: 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S
CONTRATO No. 2252 DE 2021
FECHA DE INICIO: 16/03/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 999,980,476.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ 285,000,000.00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 1,284,980,476.00 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 420,159,864.00 |
| VALOR AMORTIZADO: | $ 347,235,052.60 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 72,924,811.40 |

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 DEL31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 MAYO DE 2024
PRORROGA 4 DEL 31 DE AGOSTO AL 21 NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA 5 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 6 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 7 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 ENERO DE 2023 AL 2 JUNIO DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 JUNIO DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE JUNIO DE 2023 AL 2 OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 OCTUBRE DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **SUSPENSIÓN 2** | DEL 3 DE MAYO DE 2024 AL 1 JULIO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE JULIO DE 2024 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 2** | DEL 2 DE JULIO DE 2024 AL 1 AGOSTO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3** | DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIODE 2025 | **REANUDACION 2** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 26 del 01/08/25 al 07/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | $ 3.568.032.325 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | $ 1.229.233.705 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | $ 2.338.798.620 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394.000.000 | $ 605.980.476 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282.124.081 | $ 558.328.382 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111.875.919 | $ 47.652.094 | | |

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 3.513.609.095,42 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.692.006.353,16 | 48,16% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.300.843.064,66 | 37,02% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (391.163.288,50) | -11,13% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 54.423.229,00 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 54.423.229,00 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (54.423.229,00) | -100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 3.568.032.324,42 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.746.429.582,16 | 48,95% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.300.843.064,66 | 36,46% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (445.586.517,50) | -12,49% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 153.842.987,74 | 4,38% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 71.609.359,26 | 2,04% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: n/a
PERIODO FACTURADO: 1-12-2024 a 31-1-2025
VALOR FACTURA: $ 984.038.365,03

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
*Reprogramacion de obra #1 a partir del 12 diciembre de 2024 -*Reprogramacion de obra #2 a partir del 25 julio de 2025

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.109.631.246,55 | 86,35% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.116.429.538,15 | 86,88% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21.451.612,00 | 1,67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 21.451.612,00 | 1,67% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PA 2025E-VUVRAZ-064220
PERIODO FACTURADO: 1 al 12 Febrero 2025
VALOR FACTURA: $ 22.944.271,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 713.606.465 |
| Amortizado $ | 245.846.741 |
| Saldo $ | 467.759.724 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,0 |
| Acumulado: | 0,858235377 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 420.159.864 |
| Amortizado $ | 347.235.053 |
| Saldo $ | 72.924.811 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,16% 100,00% Avance o Atraso Físico % -11,13%
Meta Física Ejecutada % 37,02% 33,82%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Total | % |
| PLACA HUELLA | m | 1766 | 1766 | | Prog | 897,00 | 430,00 | 439,00 | 1766,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 581,005 | 99 | 302,39 | 982,395 | 55,63% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 3383 | 3383 | | Prog | n/a | 1985,00 | 1398,00 | 3383,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | | 598,950 | 159,930 | 758,880 | 22,43% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | | |
| Retroexcavadora | | |
| Vibrocompactador | | |
| Compresor | | |
| Compactador manual | | |
| Mezcladora de concreto | | |
| Volqueta | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA | 897 | 897,00 | 581,005 | ATRASO | 35,23% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 2: NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | 2415 | 2415,00 | 697,95 | ATRASO | 71,10% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 3: SAN LORENZO | 1837 | 1837,00 | 462,32 | ATRASO | 74,83% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Se presentò dificultad para el ingreso a San Lorenzo hasta el 10 de enero debido al pare -siga de los trabajos desarrollados para sitios criticos con tiempos mayores a la hora de espera.Festividades de fin de año. Fiestas del Diablo |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA | PERMISO MINERO: SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X | NO |
| UBICACIÓN: INES CASTRO DE PELAEZ | PERMISO MINERO: SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** revisado los documentos de la nueva Cantera propuesta, de propiedad de la Señora Inés castro de Peláez, hasta su complementación quedando aprobados los permisos minero ambientales internamente el 30 de diciembre de 2024, se dio respuesta el 7 de enero .

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Pendiente por entregar correciones

**OBSERVACIONES**: Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-020 la Interventoria da concepto de NO APROVACION con requerimientos al PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA) – versión 2.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 26 del 01/08/25 al 07/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 22 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle 17 A # 5C-22 Barrio La Maria

**OBSERVACIONES:**

no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD AL PRESENTE CONTATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**PLACA HUELLA**

*RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA:
PLANADAS: 157 m de meta física; 0 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 1: 100 m de meta física; 100,75 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 2: 100 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
IBERIA BAJA: 170 m de meta física; 174,075 m de meta ejecutada;
PORTACHUELO 1: 120 m de meta física; sin inicio de actividades.
PORTACHUELO 2: 50 m de meta física; sin inicio de actividades.
PANESSO: 100 m de meta física; 101,93 m de meta ejecutada;
AMOLADOR: 100 m de meta física; 104,25 m de meta ejecutada;

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CABAÑA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
UBARBA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESPERANZA: 200 m de meta física; 99 m de meta ejecutada;

* RESGUARDO SAN LORENZO:
SAN JOSE 1: 65 m de meta física; 69,1 m de meta ejecutada;
SAN JOSE 2: 99 m de meta física; 0 m de meta ejecutada;
COSTA RICA: 65 m de meta física; 16,9 m de meta ejecutada;
CENTRO POBLADO: 80 m de meta física; 84,08 m de meta ejecutada;
EL CARMELO: 65 m de meta física; 65,37 m de meta ejecutada;
LLANO GRANDE: 65 m de meta física; 66,94 m de meta ejecutada;

**CAMINO ANCESTRAL**

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CANDELARIA: 400 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
TUMBABARRETO: 285 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS MINAS: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS ESTANCIAS: 200 m de meta física; 201,25 m de meta ejecutada;
EL SALADO: 300 m de meta física; 295,5 m de meta ejecutada;
EL EDEN: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
SANTA INES: 400 m de meta física; sin inicio de actividades.

* RESGUARDO SAN LORENZO:
VENEROS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SAN MIGUEL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL ROBLE: 150 m de meta física; sin inicio de actividades.
TUNZARA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL CACHO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TAPARCO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESCUELA: 78 m de meta física; 80 m de meta ejecutada;
HONDURAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA PRADERA: 78 m de meta física; 79,93 m de meta ejecutada;
BUENOS AIRES: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
PASMI: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
JAGUAL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SISIRRA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TRES ESQUINAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
ONCE CASAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
DANUBIO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA LINEA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* No se ha dado orden de inicio al contrato de obra
* se realiza verificacion de documentos de reinicio de actividades .
* Se realiza recorrido con los resguardo indigenas entregando obras realizadas,

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **897** | **581,005** | 65% |
| PLANADAS | 157 | | |
| CAÑAMOMO 1 | 100 | 100,75 | 100% |
| CAÑAMOMO 2 | 100 | 100,00 | 100% |
| IBERIA BAJA | 170 | 174,08 | 100% |
| PORTACHUELO 1 | 120 | | |
| PORTACHUELO 2 | 50 | | |
| PANESSO | 100 | 101,93 | 100% |
| AMOLADOR | 100 | 104,25 | 100% |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **430** | **99** | 23% |
| LA CABAÑA | 115 | | |
| UBARBA | 115 | | |
| LA ESPERANZA | 200 | 99,00 | 50% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1985** | **598,95** | 30% |
| LA CANDELARIA | 400 | 102,20 | 26% |
| TUMBABARRETO | 285 | | |
| LAS MINAS | 200 | | |
| LAS ESTANCIAS | 200 | 201,25 | 100% |
| EL SALADO | 300 | 295,50 | 99% |
| EL EDEN | 200 | | |
| SANTA INES | 400 | | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 26 del 01/08/25 al 07/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

**RESGUARDO NUESTRA SAN LORENZO**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **439** | **302,39** | 69% |
| SAN JOSE 1 | 65 | 69,10 | 100% |
| SAN JOSE 2 | 99 | | |
| COSTA RICA | 65 | 16,90 | 26% |
| CENTRO POBLADO | 80 | 84,08 | 100% |
| EL CARMELO | 65 | 65,37 | 100% |
| LLANO GRANDE | 65 | 66,94 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1398** | **159,93** | 11% |
| VENEROS | 78 | | |
| SAN MIGUEL | 78 | | |
| EL ROBLE | 150 | | |
| TUNZARA | 78 | | |
| EL CACHO | 78 | | |
| TAPARCO | 78 | | |
| LA ESCUELA | 78 | 80,00 | 100% |
| HONDURAS | 78 | | |
| LA PRADERA | 78 | 79,93 | 100% |
| BUENOS AIRES | 78 | | |
| PASMI | 78 | | |
| JAGUAL | 78 | | |
| SISIRRA | 78 | | |
| TRES ESQUINAS | 78 | | |
| ONCE CASAS | 78 | | |
| DANUBIO | 78 | | |
| LA LINEA | 78 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Resguardo Cañamomo-lomaprieta, placa huella: Paneso


Resguardo Cañamomo-lomaprieta, placa huella: Amolador


Resguardo San Lorenzo, placa huella: El Carmelo


Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Candelaria


Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Estancia


Resguardo La Montaña, camino ancestral: El Salado


Resguardo San Lorenzo, camino ancestral: La Escuela


Resguardo San Lorenzo, camino ancestral: La Pradera


Resguardo San Lorenzo, placa huella: Costa Rica

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista , basados en la programación general
* Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.
* Realizar el seguimiento continuo al componente tecnico, administrativo y financiero del contrato de obra.
* Demas actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 27 del 08/08/25 al 14/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ANGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| PLACA HUELLA | 897 m |
|---|---|
| PLANADAS | 157 m |
| CAÑAMOMO 1 | 100 m |
| CAÑAMOMO 2 | 100 m |
| IBERIA BAJA | 170 m |
| PORTACHUELO 1 | 120 m |
| PORTACHUELO 2 | 50 m |
| PANESSO | 100 m |
| AMOLADOR | 100 m |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| PLACA HUELLA | 430 m |
|---|---|
| LA CABAÑA | 115 m |
| UBARBA | 115 m |
| LA ESPERANZA | 200 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1985 m |
|---|---|
| LA CANDELARIA | 400 m |
| TUMBABARRETO | 285 m |
| LAS MINAS | 200 m |
| LAS ESTANCIAS | 200 m |
| EL SALADO | 300 m |
| EL EDEN | 200 m |
| SANTA INES | 400 m |

### RESGUARDO SAN LORENZO

| PLACA HUELLA | 439 m |
|---|---|
| SAN JOSE 1 | 65 m |
| SAN JOSE 2 | 99 m |
| COSTA RICA | 65 m |
| CENTRO POBLADO | 80 m |
| EL CARMELO | 65 m |
| LLANO GRANDE | 65 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1398 m |
|---|---|
| VENEROS | 78 m |
| SAN MIGUEL | 78 m |
| EL ROBLE | 150 m |
| TUNZARA | 78 m |
| EL CACHO | 78 m |
| TAPARCO | 78 m |
| LA ESCUELA | 78 m |
| HONDURAS | 78 m |
| LA PRADERA | 78 m |
| BUENOS AIRES | 78 m |
| PASMI | 78 m |
| JAGUAL | 78 m |
| SISIRRA | 78 m |
| TRES ESQUINAS | 78 m |
| ONCE CASAS | 78 m |
| DANUBIO | 78 m |
| LA LINEA | 78 m |

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**CAMINO ANCESTRAL**

Los caminos ancestrales presentan un tráfico particular, principalmente compuesto vehículos motorizados pequeños, motocicletas, bicicletas y peatones. La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada #5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y ancho total de 1.5 m.

**PLACA HUELLA**

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de dos franjas de huellas de concreto de resistencia F'c=21 Mpa con ancho de 0.90 m y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se encuentra un concreto ciclopeo con piedra a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor. la longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre,se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m, y el confinamiento lateral por berma cunetas en concreto de 0.55 de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MAIC 2024
50% ICSSA SAS
INTEGRANTES: 50% PROMAQCO S.A.S.
CONTRATO No. 18092024-1295
FECHA DE INICIO: 1/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: sin definir la prorroga

VALOR INICIAL: $ 3,568,032,325.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 3,568,032,325.00
VALOR ANTICIPO: $ 713,606,465.00
VALOR AMORTIZADO: $ 245,846,741.00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 467,759,724.00

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 2 DEL 25 DE JULIO AL 3015 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

SUSPENSIÓN 1 DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 REANUDACION 1 DE ABRIL DE 2025
AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 DEL 15 DE FEBRERO AL 25 DE JULIO DE 2025 REANUDACION 25 DE JULIO DE 2025

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
INTEGRANTES: 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S
CONTRATO No. 2252 DE 2021
FECHA DE INICIO: 16/03/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

VALOR INICIAL: $ 999,980,476.00
VALOR ADICIONES: $ 285,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 1,284,980,476.00
VALOR ANTICIPO: $ 420,159,864.00
VALOR AMORTIZADO: $ 347,235,052.60
SALDO POR AMORTIZAR: $ 72,924,811.40

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 DEL31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 MAYO DE 2024
PRORROGA 4 DEL 31 DE AGOSTO AL 21 NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA 5 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 6 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 7 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 ENERO DE 2023 AL 2 JUNIO DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 JUNIO DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE JUNIO DE 2023 AL 2 OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 OCTUBRE DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **SUSPENSIÓN 2** | DEL 3 DE MAYO DE 2024 AL 1 JULIO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE JULIO DE 2024 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 2** | DEL 2 DE JULIO DE 2024 AL 1 AGOSTO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3** | DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIODE 2025 | **REANUDACION 2** | 1 DE JULIO DE 2025 |

FECHA: 15/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 27 del 08/08/25 al 14/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | $ 3.568.032.325 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | $ 1.229.233.705 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | $ 2.338.798.620 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394.000.000 | $ 605.980.476 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282.124.081 | $ 558.328.382 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111.875.919 | $ 47.652.094 | | |

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 3.513.609.095,42 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.845.849.340,90 | 52,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.556.486.020,54 | 44,30% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (289.363.320,36) | -8,24% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 54.423.229,00 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 54.423.229,00 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (54.423.229,00) | -100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 3.568.032.324,42 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.900.272.569,90 | 53,26% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.556.486.020,54 | 43,62% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (343.786.549,36) | -9,64% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 153.842.987,74 | 4,38% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 255.642.955,88 | 7,28% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: n/a
PERIODO FACTURADO: 1-12-2024 a 31-1-2025
VALOR FACTURA: $ 984.038.365,03

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
*Reprogramacion de obra #1 a partir del 12 diciembre de 2024 -*Reprogramacion de obra #2 a partir del 25 julio de 2025

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.131.082.858,55 | 88,02% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.137.881.150,15 | 88,55% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21.451.612,00 | 1,67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 21.451.612,00 | 1,67% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PA 2025E-VUVRAZ-064220
PERIODO FACTURADO: 1 al 12 Febrero 2025
VALOR FACTURA: $ 22.944.271,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 713.606.465 |
| Amortizado $ | 245.846.741 |
| Saldo $ | 467.759.724 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,0 |
| Acumulado: | 0,731057738 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 420.159.864 |
| Amortizado $ | 347.235.053 |
| Saldo $ | 72.924.811 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52,53% 100,00% Avance o Atraso Físico % -8,24%
Meta Física Ejecutada % 44,30% 40,50%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Total | % |
| PLACA HUELLA | m | 1766 | 1766 | | Prog | 897,00 | 430,00 | 439,00 | 1766,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 656,945 | 146,71 | 371,89 | 1175,545 | 66,57% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 3383 | 3383 | | Prog | n/a | 1985,00 | 1398,00 | 3383,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | | 750,050 | 159,930 | 909,980 | 26,90% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | | |
| Retroexcavadora | | |
| Vibrocompactador | | |
| Compresor | | |
| Compactador manual | | |
| Mezcladora de concreto | | |
| Volqueta | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA | 897 | 897,00 | 656,945 | ATRASO | 26,76% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 2: NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | 2415 | 2415,00 | 896,76 | ATRASO | 62,87% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 3: SAN LORENZO | 1837 | 1837,00 | 531,82 | ATRASO | 71,05% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Se presentò dificultad para el ingrso a San Lorenzo hasta el 10 de enero debido al pare -siga de los trabajos desarrollados para sitios criticos con tiempos mayores a la hora de espera.Festividades de fin de año. Fiestas del Diablo |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA | PERMISO MINERO: SI X NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO | |
| UBICACIÓN: INES CASTRO DE PELAEZ | PERMISO MINERO: SI X NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES:** revisado los documentos de la nueva Cantera propuesta, de propiedad de la Señora Inés castro de Peláez, hasta su complementación quedando aprobados los permisos minero ambientales internamente el 30 de diciembre de 2024, se dio respuesta el 7 de enero .

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Pendiente por entregar correciones

**OBSERVACIONES**: Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-020 la Interventoria da concepto de NO APROVACION con requerimientos al PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA) – versión 2.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 27 del 08/08/25 al 14/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 22 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle 17 A # 5C-22 Barrio La Maria

**OBSERVACIONES:**

no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD AL PRESENTE CONTATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**PLACA HUELLA**

*RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA:
PLANADAS: 157 m de meta física; 75,94 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 1: 100 m de meta física; 100,75 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 2: 100 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
IBERIA BAJA: 170 m de meta física; 174,075 m de meta ejecutada;
PORTACHUELO 1: 120 m de meta física; sin inicio de actividades.
PORTACHUELO 2: 50 m de meta física; sin inicio de actividades.
PANESSO: 100 m de meta física; 101,93 m de meta ejecutada;
AMOLADOR: 100 m de meta física; 104,25 m de meta ejecutada;

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CABAÑA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
UBARBA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESPERANZA: 200 m de meta física; 146,71 m de meta ejecutada;

* RESGUARDO SAN LORENZO:
SAN JOSE 1: 65 m de meta física; 69,1 m de meta ejecutada;
SAN JOSE 2: 99 m de meta física; 48,5 m de meta ejecutada;
COSTA RICA: 65 m de meta física; 37,9 m de meta ejecutada;
CENTRO POBLADO: 80 m de meta física; 84,08 m de meta ejecutada;
EL CARMELO: 65 m de meta física; 65,37 m de meta ejecutada;
LLANO GRANDE: 65 m de meta física; 66,94 m de meta ejecutada;

**CAMINO ANCESTRAL**

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CANDELARIA: 400 m de meta física; 251,1 m de meta ejecutada;
TUMBABARRETO: 285 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS MINAS: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS ESTANCIAS: 200 m de meta física; 201,25 m de meta ejecutada;
EL SALADO: 300 m de meta física; 295,5 m de meta ejecutada;
EL EDEN: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
SANTA INES: 400 m de meta física; sin inicio de actividades.

* RESGUARDO SAN LORENZO:
VENEROS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SAN MIGUEL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL ROBLE: 150 m de meta física; sin inicio de actividades.
TUNZARA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL CACHO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TAPARCO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESCUELA: 78 m de meta física; 80 m de meta ejecutada;
HONDURAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA PRADERA: 78 m de meta física; 79,93 m de meta ejecutada;
BUENOS AIRES: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
PASMI: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
JAGUAL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SISIRRA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TRES ESQUINAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
ONCE CASAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
DANUBIO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA LINEA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* No se ha dado orden de inicio al contrato de obra
* se realiza verificacion de documentos de reinicio de actividades .
* Se realiza recorrido con los resguardo indigenas entregando obras realizadas,

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **897** | **656,945** | 73% |
| PLANADAS | 157 | 75,94 | 48% |
| CAÑAMOMO 1 | 100 | 100,75 | 100% |
| CAÑAMOMO 2 | 100 | 100,00 | 100% |
| IBERIA BAJA | 170 | 174,08 | 100% |
| PORTACHUELO 1 | 120 | | |
| PORTACHUELO 2 | 50 | | |
| PANESSO | 100 | 101,93 | 100% |
| AMOLADOR | 100 | 104,25 | 100% |

**RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **430** | **146,71** | 34% |
| LA CABAÑA | 115 | | |
| UBARBA | 115 | | |
| LA ESPERANZA | 200 | 146,71 | 73% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1985** | **750,05** | 38% |
| LA CANDELARIA | 400 | 253,30 | 63% |
| TUMBABARRETO | 285 | | |
| LAS MINAS | 200 | | |
| LAS ESTANCIAS | 200 | 201,25 | 100% |
| EL SALADO | 300 | 295,50 | 99% |
| EL EDEN | 200 | | |
| SANTA INES | 400 | | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 27 del 08/08/25 al 14/08/25 Último Informe Semanal SI ☐

**RESGUARDO NUESTRA SAN LORENZO**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **439** | **371,89** | 85% |
| SAN JOSE 1 | 65 | 69,10 | 100% |
| SAN JOSE 2 | 99 | 48,50 | 49% |
| COSTA RICA | 65 | 37,90 | 58% |
| CENTRO POBLADO | 80 | 84,08 | 100% |
| EL CARMELO | 65 | 65,37 | 100% |
| LLANO GRANDE | 65 | 66,94 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1398** | **159,93** | 11% |
| VENEROS | 78 | | |
| SAN MIGUEL | 78 | | |
| EL ROBLE | 150 | | |
| TUNZARA | 78 | | |
| EL CACHO | 78 | | |
| TAPARCO | 78 | | |
| LA ESCUELA | 78 | 80,00 | 100% |
| HONDURAS | 78 | | |
| LA PRADERA | 78 | 79,93 | 100% |
| BUENOS AIRES | 78 | | |
| PASMI | 78 | | |
| JAGUAL | 78 | | |
| SISIRRA | 78 | | |
| TRES ESQUINAS | 78 | | |
| ONCE CASAS | 78 | | |
| DANUBIO | 78 | | |
| LA LINEA | 78 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Candelaria


Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Candelaria


Resguardo La Montaña, placa huella : La Esperanza


Resguardo Cañamomo - Lomaprieta, placa huella: Planadas


Resguardo Cañamomo - Lomaprieta, placa huella: Planadas


Resguardo San Lorenzo, placa huella : San Jose 2


Resguardo San Lorenzo, placa huella : San Jose 2


Resguardo San Lorenzo, placa huella : Costa Rica


Resguardo San Lorenzo, placa huella : Costa Rica

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista , basados en la programación general
* Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.
* Realizar el seguimiento continuo al componente tecnico, administrativo y financiero del contrato de obra.
* Demas actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 28 del 15/08/25 al 21/08/25 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ANGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| **PLACA HUELLA** | **897 m** |
|---|---|
| PLANADAS | 157 m |
| CAÑAMOMO 1 | 100 m |
| CAÑAMOMO 2 | 100 m |
| IBERIA BAJA | 170 m |
| PORTACHUELO 1 | 120 m |
| PORTACHUELO 2 | 50 m |
| PANESSO | 100 m |
| AMOLADOR | 100 m |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| **PLACA HUELLA** | **430 m** |
|---|---|
| LA CABAÑA | 115 m |
| UBARBA | 115 m |
| LA ESPERANZA | 200 m |

| **CAMINO ANCESTRAL** | **1985 m** |
|---|---|
| LA CANDELARIA | 400 m |
| TUMBABARRETO | 285 m |
| LAS MINAS | 200 m |
| LAS ESTANCIAS | 200 m |
| EL SALADO | 300 m |
| EL EDEN | 200 m |
| SANTA INES | 400 m |

### RESGUARDO SAN LORENZO

| **PLACA HUELLA** | **439 m** |
|---|---|
| SAN JOSE 1 | 65 m |
| SAN JOSE 2 | 99 m |
| COSTA RICA | 65 m |
| CENTRO POBLADO | 80 m |
| EL CARMELO | 65 m |
| LLANO GRANDE | 65 m |

| **CAMINO ANCESTRAL** | **1398 m** |
|---|---|
| VENEROS | 78 m |
| SAN MIGUEL | 78 m |
| EL ROBLE | 150 m |
| TUNZARA | 78 m |
| EL CACHO | 78 m |
| TAPARCO | 78 m |
| LA ESCUELA | 78 m |
| HONDURAS | 78 m |
| LA PRADERA | 78 m |
| BUENOS AIRES | 78 m |
| PASMI | 78 m |
| JAGUAL | 78 m |
| SISIRRA | 78 m |
| TRES ESQUINAS | 78 m |
| ONCE CASAS | 78 m |
| DANUBIO | 78 m |
| LA LINEA | 78 m |

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**CAMINO ANCESTRAL**

Los caminos ancestrales presentan un tráfico particular, principalmente compuesto vehículos motorizados pequeños, motocicletas, bicicletas y peatones. La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada #5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4"; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y ancho total de 1.5 m.

**PLACA HUELLA**

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de dos franjas de huellas de concreto de resistencia F'c=21 Mpa con ancho de 0.90 m y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se encuentra un concreto ciclopeo con piedra a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor. la longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre,se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m, y el confinamiento lateral por berma cunetas en concreto de 0.55 de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MAIC 2024
50% ICSSA SAS
INTEGRANTES: 50% PROMAQCO S.A.S.
CONTRATO No. 18092024-1295
FECHA DE INICIO: 1/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

VALOR INICIAL: $ 3,568,032,325.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 3,568,032,325.00
VALOR ANTICIPO: $ 713,606,465.00
VALOR AMORTIZADO: $ 245,846,741.00
SALDO POR AMORTIZAR $ 467,759,724.00

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 2 DEL 25 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

SUSPENSIÓN 1 DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 REANUDACION 1 DE ABRIL DE 2025
AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 DEL 15 DE FEBRERO AL 25 DE JULIO DE 2025 REANUDACION 25 DE JULIO DE 2025

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S,
INTEGRANTES: 20% BESTUTEC S.A.S. 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S
CONTRATO No. 2252 DE 2021
FECHA DE INICIO: 16/03/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

VALOR INICIAL: $ 999,980,476.00
VALOR ADICIONES: $ 285,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 1,284,980,476.00
VALOR ANTICIPO: $ 420,159,864.00
VALOR AMORTIZADO: $ 420,159,864.00
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 DEL31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 MAYO DE 2024
PRORROGA 4 DEL 31 DE AGOSTO AL 21 NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA 5 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 6 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 7 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 ENERO DE 2023 AL 2 JUNIO DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 JUNIO DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE JUNIO DE 2023 AL 2 OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 OCTUBRE DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **SUSPENSIÓN 2** | DEL 3 DE MAYO DE 2024 AL 1 JULIO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE JULIO DE 2024 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 2** | DEL 2 DE JULIO DE 2024 AL 1 AGOSTO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3** | DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIODE 2025 | **REANUDACION 2** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 28 del 15/08/25 al 21/08/25 Último Informe Semanal SI

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | $ 3,568,032,325 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | $ 1,229,233,705 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | $ 2,338,798,620 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000 | $ 605,980,476 | | $ 285,000,000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081 | $ 558,328,382 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,919 | $ 47,652,094 | | |

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 3,513,609,095.42 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1,999,692,328.65 | 56.91% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1,809,708,558.79 | 51.51% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (189,983,769.86) | -5.41% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 54,423,229.00 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 54,423,229.00 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (54,423,229.00) | -100.00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 3,568,032,324.42 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2,054,115,557.65 | 57.57% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,809,708,558.79 | 50.72% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (244,406,998.86) | -6.85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 153,842,987.74 | 4.38% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 253,222,538.25 | 7.21% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: n/a

PERIODO FACTURADO: 1-12-2024 a 31-1-2025

VALOR FACTURA: $ 984,038,365.03

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

*Reprogramacion de obra #1 a partir del 12 diciembre de 2024 -*Reprogramacion de obra #2 a partir del 25 julio de 2025

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,217,704,011.29 | 94.76% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,053,144,240.47 | 81.96% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | #¡VALOR! | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | #¡VALOR! | 1.46% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 713,606,465 |
| Amortizado $ | 245,846,741 |
| Saldo $ | 467,759,724 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | 0.581941349 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 420,159,864 |
| Amortizado $ | 347,235,053 |
| Saldo $ | 72,924,811 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 56.91% 100.00% Avance o Atraso Físico % -5.41%
Meta Física Ejecutada % 51.51% 47.97%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Total | % |
| PLACA HUELLA | m | 1766 | 1766 | | Prog | 897.00 | 430.00 | 439.00 | 1766.00 | 100.00% |
| | | | | | Ejec | 738.005 | 217.1 | 458.01 | 1413.115 | 80.02% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 3383 | 3383 | | Prog | n/a | 1985.00 | 1398.00 | 3383.00 | 100.00% |
| | | | | | Ejec | | 896.970 | 159.930 | 1056.900 | 31.24% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | | |
| Retroexcavadora | | |
| Vibrocompactador | | |
| Compresor | | |
| Compactador manual | | |
| Mezcladora de concreto | | |
| Volqueta | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA | 897 | 897.00 | 738.005 | ATRASO | 17.73% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del |
| RESGUARDO 2: NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | 2415 | 2415.00 | 1114.07 | ATRASO | 53.87% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 3: SAN LORENZO | 1837 | 1837.00 | 617.94 | ATRASO | 66.36% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Se presentó dificultad para el ingreso a San Lorenzo hasta el 10 de enero debido al pare -siga de los trabajos desarrollados para sitios criticos con tiempos mayores a la hora de espera.Festividades de fin de año. Fiestas del Diablo |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: ASOCIACION ARENEROS DE LA FELISA | PERMISO MINERO: SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | X | NO |
| UBICACIÓN: INES CASTRO DE PELAEZ | PERMISO MINERO: SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | | NO |

**OBSERVACIONES:**revisado los documentos de la nueva Cantera propuesta, de propiedad de la Señora Inés castro de Peláez, hasta su complementación quedando aprobados los permisos minero ambientales internamente el 30 de diciembre de 2024, se dio respuesta el 7 de enero .

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Pendiente por entregar correciones

**OBSERVACIONES**: Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-020 la Interventoria da concepto de NO APROVACION con requerimientos al PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA) – versión 2.

FECHA: 22/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 28 del 15/08/25 al 21/08/25 Último Informe Semanal SÍ

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 22 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 17 A # 5C-22 Barrio La Maria

**OBSERVACIONES:**

se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N /A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N /A
AVALÚOS APROBADOS: N /A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N /A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD AL PRESENTE CONTATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**PLACA HUELLA**

*RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA:
PLANADAS: 157 m de meta física; 157 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 1: 100 m de meta física; 100,75 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 2: 100 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
IBERIA BAJA: 170 m de meta física; 174,075 m de meta ejecutada;
PORTACHUELO 1: 120 m de meta física; sin inicio de actividades.
PORTACHUELO 2: 50 m de meta física; sin inicio de actividades.
PANESSO: 100 m de meta física; 101,93 m de meta ejecutada;
AMOLADOR: 100 m de meta física: 104.25 m de meta eiecutada:

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CABAÑA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
UBARBA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESPERANZA: 200 m de meta física; 217,1 m de meta ejecutada;

* RESGUARDO SAN LORENZO:
SAN JOSE 1: 65 m de meta física; 69,1 m de meta ejecutada;
SAN JOSE 2: 99 m de meta física; 100,65 m de meta ejecutada;
COSTA RICA: 65 m de meta física; 71,87 m de meta ejecutada;
CENTRO POBLADO: 80 m de meta física; 84,08 m de meta ejecutada;
EL CARMELO: 65 m de meta física; 65,37 m de meta ejecutada;
LLANO GRANDE: 65 m de meta física; 66,94 m de meta ejecutada;

**CAMINO ANCESTRAL**

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CANDELARIA: 400 m de meta física; 398,02 m de meta ejecutada;
TUMBABARRETO: 285 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS MINAS: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS ESTANCIAS: 200 m de meta física; 201,25 m de meta ejecutada;
EL SALADO: 300 m de meta física; 295,5 m de meta ejecutada;
EL EDEN: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
SANTA INES: 400 m de meta física; sin inicio de actividades.

* RESGUARDO SAN LORENZO:
VENEROS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SAN MIGUEL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL ROBLE: 150 m de meta física; sin inicio de actividades.
TUNZARA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL CACHO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TAPARCO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESCUELA: 78 m de meta física; 80 m de meta ejecutada;
HONDURAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA PRADERA: 78 m de meta física; 79,93 m de meta ejecutada;
BUENOS AIRES: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
PASMI: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
JAGUAL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SISIRRA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TRES ESQUINAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
ONCE CASAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
DANUBIO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA LINEA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* No se ha dado orden de inicio al contrato de obra
* se realiza verificacion de documentos de reinicio de actividades .
* Se realiza recorrido con los resguardo indigenas entregando obras realizadas,

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **897** | **738.005** | 82% |
| PLANADAS | 157 | 157.00 | 100% |
| CAÑAMOMO 1 | 100 | 100.75 | 100% |
| CAÑAMOMO 2 | 100 | 100.00 | 100% |
| IBERIA BAJA | 170 | 174.08 | 100% |
| PORTACHUELO 1 | 120 | | |
| PORTACHUELO 2 | 50 | | |
| PANESSO | 100 | 101.93 | 100% |
| AMOLADOR | 100 | 104.25 | 100% |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **430** | **217.1** | 50% |
| LA CABAÑA | 115 | | |
| UBARBA | 115 | | |
| LA ESPERANZA | 200 | 217.10 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1985** | **896.97** | 45% |
| LA CANDELARIA | 400 | 400.22 | 100% |
| TUMBABARRETO | 285 | | |
| LAS MINAS | 200 | | |
| LAS ESTANCIAS | 200 | 201.25 | 100% |
| EL SALADO | 300 | 295.50 | 99% |
| EL EDEN | 200 | | |
| SANTA INES | 400 | | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 28 del 15/08/25 al 21/08/25 Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO NUESTRA SAN LORENZO**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **439** | **458.01** | 100% |
| SAN JOSE 1 | 65 | 69.10 | 100% |
| SAN JOSE 2 | 99 | 100.65 | 100% |
| COSTA RICA | 65 | 71.87 | 100% |
| CENTRO POBLADO | 80 | 84.08 | 100% |
| EL CARMELO | 65 | 65.37 | 100% |
| LLANO GRANDE | 65 | 66.94 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1398** | **159.93** | 11% |
| VENEROS | 78 | | |
| SAN MIGUEL | 78 | | |
| EL ROBLE | 150 | | |
| TUNZARA | 78 | | |
| EL CACHO | 78 | | |
| TAPARCO | 78 | | |
| LA ESCUELA | 78 | 80.00 | 100% |
| HONDURAS | 78 | | |
| LA PRADERA | 78 | 79.93 | 100% |
| BUENOS AIRES | 78 | | |
| PASMI | 78 | | |
| JAGUAL | 78 | | |
| SISIRRA | 78 | | |
| TRES ESQUINAS | 78 | | |
| ONCE CASAS | 78 | | |
| DANUBIO | 78 | | |
| LA LINEA | 78 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Candelaria


Resguardo La Montaña, camino ancestral: La Candelaria


Resguardo La Montaña, placa huella : La Esperanza


Resguardo La Montaña, placa huella : La Esperanza


Resguardo Cañamomo - Lomaprieta, placa huella: Planadas


Resguardo Cañamomo - Lomaprieta, placa huella: Planadas


Resguardo San Lorenzo, placa huella : San Jose 2


Resguardo San Lorenzo, placa huella : San Jose 2


Resguardo San Lorenzo, placa huella : Costa Rica

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista , basados en la programación general
* Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.
* Realizar el seguimiento continuo al componente tecnico, administrativo y financiero del contrato de obra.
* Demas actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 29/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 29 del 22/08/25 al 28/08/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ANGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| PLACA HUELLA | 897 m |
|---|---|
| PLANADAS | 157 m |
| CAÑAMOMO 1 | 100 m |
| CAÑAMOMO 2 | 100 m |
| IBERIA BAJA | 170 m |
| PORTACHUELO 1 | 120 m |
| PORTACHUELO 2 | 50 m |
| PANESSO | 100 m |
| AMOLADOR | 100 m |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| PLACA HUELLA | 430 m |
|---|---|
| LA CABAÑA | 115 m |
| UBARBA | 115 m |
| LA ESPERANZA | 200 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1985 m |
|---|---|
| LA CANDELARIA | 400 m |
| TUMBABARRETO | 285 m |
| LAS MINAS | 200 m |
| LAS ESTANCIAS | 200 m |
| EL SALADO | 300 m |
| EL EDEN | 200 m |
| SANTA INES | 400 m |

### RESGUARDO SAN LORENZO

| PLACA HUELLA | 439 m |
|---|---|
| SAN JOSE 1 | 65 m |
| SAN JOSE 2 | 99 m |
| COSTA RICA | 65 m |
| CENTRO POBLADO | 80 m |
| EL CARMELO | 65 m |
| LLANO GRANDE | 65 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1398 m |
|---|---|
| VENEROS | 78 m |
| SAN MIGUEL | 78 m |
| EL ROBLE | 150 m |
| TUNZARA | 78 m |
| EL CACHO | 78 m |
| TAPARCO | 78 m |
| LA ESCUELA | 78 m |
| HONDURAS | 78 m |
| LA PRADERA | 78 m |
| BUENOS AIRES | 78 m |
| PASMI | 78 m |
| JAGUAL | 78 m |
| SISIRRA | 78 m |
| TRES ESQUINAS | 78 m |
| ONCE CASAS | 78 m |
| DANUBIO | 78 m |
| LA LINEA | 78 m |

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**CAMINO ANCESTRAL**

Los caminos ancestrales presentan un tráfico particular, principalmente compuesto vehículos motorizados pequeños, motocicletas, bicicletas y peatones. La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada #5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y ancho total de 1.5 m.

**PLACA HUELLA**

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de dos franjas de huellas de concreto de resistencia F'c=21 Mpa con ancho de 0.90 m y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se encuentra un concreto ciclopeo con piedra a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor. la longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre,se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m, y el confinamiento lateral por berma cunetas en concreto de 0.55 de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MAIC 2024
INTEGRANTES: 50% ICSSA SAS; 50% PROMAQCO S.A.S.
CONTRATO No. 18092024-1295
FECHA DE INICIO: 1/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 3,568,032,325.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 3,568,032,325.00 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 713,606,465.00 |
| VALOR AMORTIZADO: | $ 245,846,741.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 467,759,724.00 |

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 2 DEL 25 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN 1 | DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | REANUDACION | 1 DE ABRIL DE 2025 |
| AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 | DEL 15 DE FEBRERO AL 25 DE JULIO DE 2025 | REANUDACION | 25 DE JULIO DE 2025 |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
INTEGRANTES: 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S
CONTRATO No. 2252 DE 2021
FECHA DE INICIO: 16/03/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 999,980,476.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ 285,000,000.00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 1,284,980,476.00 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 420,159,864.00 |
| VALOR AMORTIZADO: | $ 420,159,864.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 DEL31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 MAYO DE 2024
PRORROGA 4 DEL 31 DE AGOSTO AL 21 NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA 5 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 6 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 7 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN 1 | DEL 3 ENERO DE 2023 AL 2 JUNIO DE 2023 | REANUDACION 1 | 3 JUNIO DE 2023 |
| AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 | DEL 3 DE JUNIO DE 2023 AL 2 OCTUBRE DE 2023 | REANUDACION 1 | 3 OCTUBRE DE 2023 |
| AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 | DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | REANUDACION 1 | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| SUSPENSIÓN 2 | DEL 3 DE MAYO DE 2024 AL 1 JULIO DE 2024 | REANUDACION 2 | 2 DE JULIO DE 2024 |
| AMPLIACION SUSPENSIÓN 2 | DEL 2 DE JULIO DE 2024 AL 1 AGOSTO DE 2024 | REANUDACION 2 | 2 DE AGOSTO DE 2024 |
| SUSPENSIÓN 3 | DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIODE 2025 | REANUDACION 2 | 1 DE JULIO DE 2025 |

FECHA: 29/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 29 del 22/08/25 al 28/08/25 Último Informe Semanal SI

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | $ 3,568,032,325 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | $ 1,229,233,705 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | $ 2,338,798,620 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000 | $ 605,980,476 | | $ 285,000,000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081 | $ 558,328,382 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,919 | $ 47,652,094 | | |

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 3,513,609,095.42 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 2,153,535,316.39 | 61.29% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1,821,313,277.43 | 51.84% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (332,222,038.96) | -9.46% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 54,423,229.00 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 54,423,229.00 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (54,423,229.00) | -100.00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 3,568,032,324.42 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2,207,958,545.39 | 61.88% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,821,313,277.43 | 51.05% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (386,645,267.96) | -10.84% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 153,842,987.74 | 4.38% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11,604,718.64 | 0.33% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: n/a

PERIODO FACTURADO: 1-12-2024 a 31-1-2025
VALOR FACTURA: $ 984,038,365.03

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
*Reprogramacion de obra #1 a partir del 12 diciembre de 2024 -*Reprogramacion de obra #2 a partir del 25 julio de 2025

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 713,606,465 |
| Amortizado $ | 245,846,741 |
| Saldo $ | 467,759,724 |

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,229,477,392.61 | 95.68% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21,451,612.00 | 1.67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 21,451,612.00 | 1.67% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | 0.010280294 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 420,159,864 |
| Amortizado $ | 347,235,053 |
| Saldo $ | 72,924,811 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 61.29% 100.00% Avance o Atraso Físico % -9.46%
Meta Física Ejecutada % 51.84% 47.97%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Total | % |
| PLACA HUELLA | m | 1766 | 1766 | | Prog | 897.00 | 430.00 | 439.00 | 1766.00 | 100.00% |
| | | | | | Ejec | 738.005 | 217.1 | 458.01 | 1413.115 | 80.02% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 3383 | 3383 | | Prog | n/a | 1985.00 | 1398.00 | 3383.00 | 100.00% |
| | | | | | Ejec | | 896.970 | 159.930 | 1056.900 | 31.24% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | | |
| Retroexcavadora | | |
| Vibrocompactador | | |
| Compresor | | |
| Compactador manual | | |
| Mezcladora de concreto | | |
| Volqueta | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA | 897 | 897.00 | 738.005 | ATRASO | 17.73% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 2: NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | 2415 | 2415.00 | 1114.07 | ATRASO | 53.87% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 3: SAN LORENZO | 1837 | 1837.00 | 617.94 | ATRASO | 66.36% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Se presentò dificultad para el ingrso a San Lorenzo hasta el 10 de enero debido al pare -siga de los trabajos desarrollados para sitios criticos con tiempos mayores a la hora de espera.Festividades de fin de año. Fiestas del Diablo |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |
| UBICACIÓN: INES CASTRO DE PELAEZ | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:**revisado los documentos de la nueva Cantera propuesta, de propiedad de la Señora Inés castro de Peláez, hasta su complementación quedando aprobados los permisos minero ambientales internamente el 30 de diciembre de 2024, se dio respuesta el 7 de enero .

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: Pendiente por entregar correciones

**OBSERVACIONES**: Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-020 la Interventoria da concepto de NO APROVACION con requerimientos al PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA) – versión 2.

FECHA: 29/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 29 del 22/08/25 al 28/08/25 Último Informe Semanal SI

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 22 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Calle 17 A # 5C-22 Barrio La Maria

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N /A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N /A
AVALÚOS APROBADOS: N /A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N /A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD AL PRESENTE CONTATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**PLACA HUELLA**

*RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA:
PLANADAS: 157 m de meta física; 157 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 1: 100 m de meta física; 100,75 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 2: 100 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
IBERIA BAJA: 170 m de meta física; 174,075 m de meta ejecutada;
PORTACHUELO 1: 120 m de meta física; sin inicio de actividades.
PORTACHUELO 2: 50 m de meta física; sin inicio de actividades.
PANESSO: 100 m de meta física; 101,93 m de meta ejecutada;
AMOLADOR: 100 m de meta física; 104,25 m de meta ejecutada;
*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CABAÑA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
UBARBA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESPERANZA: 200 m de meta física; 217,1 m de meta ejecutada;
* RESGUARDO SAN LORENZO:
SAN JOSE 1: 65 m de meta física; 69,1 m de meta ejecutada;
SAN JOSE 2: 99 m de meta física; 100,65 m de meta ejecutada;
COSTA RICA: 65 m de meta física; 71,87 m de meta ejecutada;
CENTRO POBLADO: 80 m de meta física; 84,08 m de meta ejecutada;
EL CARMELO: 65 m de meta física; 65,37 m de meta ejecutada;
LLANO GRANDE: 65 m de meta física; 66,94 m de meta ejecutada;

**CAMINO ANCESTRAL**

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CANDELARIA: 400 m de meta física; 400,22 m de meta ejecutada;
TUMBABARRETO: 285 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS MINAS: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS ESTANCIAS: 200 m de meta física; 201,25 m de meta ejecutada;
EL SALADO: 300 m de meta física; 295,5 m de meta ejecutada;
EL EDEN: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
SANTA INES: 400 m de meta física; sin inicio de actividades.
* RESGUARDO SAN LORENZO:
VENEROS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SAN MIGUEL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL ROBLE: 150 m de meta física; sin inicio de actividades.
TUNZARA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL CACHO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TAPARCO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESCUELA: 78 m de meta física; 80 m de meta ejecutada;
HONDURAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA PRADERA: 78 m de meta física; 79,93 m de meta ejecutada;
BUENOS AIRES: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
PASMI: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
JAGUAL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SISIRRA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TRES ESQUINAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
ONCE CASAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
DANUBIO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA LINEA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* No se ha dado orden de inicio al contrato de obra
* se realiza verificacion de documentos de reinicio de actividades .
* Se realiza recorrido con los resguardo indigenas entregando obras realizadas,

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **897** | **738.005** | 82% |
| PLANADAS | 157 | 157.00 | 100% |
| CAÑAMOMO 1 | 100 | 100.75 | 100% |
| CAÑAMOMO 2 | 100 | 100.00 | 100% |
| IBERIA BAJA | 170 | 174.08 | 100% |
| PORTACHUELO 1 | 120 | | |
| PORTACHUELO 2 | 50 | | |
| PANESSO | 100 | 101.93 | 100% |
| AMOLADOR | 100 | 104.25 | 100% |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **430** | **217.1** | 50% |
| LA CABAÑA | 115 | | |
| UBARBA | 115 | | |
| LA ESPERANZA | 200 | 217.10 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1985** | **896.97** | 45% |
| LA CANDELARIA | 400 | 400.22 | 100% |
| TUMBABARRETO | 285 | | |
| LAS MINAS | 200 | | |
| LAS ESTANCIAS | 200 | 201.25 | 100% |
| EL SALADO | 300 | 295.50 | 99% |
| EL EDEN | 200 | | |
| SANTA INES | 400 | | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 29 del 22/08/25 al 28/08/25 Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO NUESTRA SAN LORENZO**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **439** | **458.01** | 100% |
| SAN JOSE 1 | 65 | 69.10 | 100% |
| SAN JOSE 2 | 99 | 100.65 | 100% |
| COSTA RICA | 65 | 71.87 | 100% |
| CENTRO POBLADO | 80 | 84.08 | 100% |
| EL CARMELO | 65 | 65.37 | 100% |
| LLANO GRANDE | 65 | 66.94 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1398** | **159.93** | 11% |
| VENEROS | 78 | | |
| SAN MIGUEL | 78 | | |
| EL ROBLE | 150 | | |
| TUNZARA | 78 | | |
| EL CACHO | 78 | | |
| TAPARCO | 78 | | |
| LA ESCUELA | 78 | 80.00 | 100% |
| HONDURAS | 78 | | |
| LA PRADERA | 78 | 79.93 | 100% |
| BUENOS AIRES | 78 | | |
| PASMI | 78 | | |
| JAGUAL | 78 | | |
| SISIRRA | 78 | | |
| TRES ESQUINAS | 78 | | |
| ONCE CASAS | 78 | | |
| DANUBIO | 78 | | |
| LA LINEA | 78 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista , basados en la programación general
* Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.
* Realizar el seguimiento continuo al componente tecnico, administrativo y financiero del contrato de obra.
* Demas actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 05/09/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 30 del 29/08/25 al 04/09/25 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ANGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| PLACA HUELLA | 897 m |
|---|---|
| PLANADAS | 157 m |
| CAÑAMOMO 1 | 100 m |
| CAÑAMOMO 2 | 100 m |
| IBERIA BAJA | 170 m |
| PORTACHUELO 1 | 120 m |
| PORTACHUELO 2 | 50 m |
| PANESSO | 100 m |
| AMOLADOR | 100 m |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| PLACA HUELLA | 430 m |
|---|---|
| LA CABAÑA | 115 m |
| UBARBA | 115 m |
| LA ESPERANZA | 200 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1985 m |
|---|---|
| LA CANDELARIA | 400 m |
| TUMBABARRETO | 285 m |
| LAS MINAS | 200 m |
| LAS ESTANCIAS | 200 m |
| EL SALADO | 300 m |
| EL EDEN | 200 m |
| SANTA INES | 400 m |

### RESGUARDO SAN LORENZO

| PLACA HUELLA | 439 m |
|---|---|
| SAN JOSE 1 | 65 m |
| SAN JOSE 2 | 99 m |
| COSTA RICA | 65 m |
| CENTRO POBLADO | 80 m |
| EL CARMELO | 65 m |
| LLANO GRANDE | 65 m |

| CAMINO ANCESTRAL | 1398 m |
|---|---|
| VENEROS | 78 m |
| SAN MIGUEL | 78 m |
| EL ROBLE | 150 m |
| TUNZARA | 78 m |
| EL CACHO | 78 m |
| TAPARCO | 78 m |
| LA ESCUELA | 78 m |
| HONDURAS | 78 m |
| LA PRADERA | 78 m |
| BUENOS AIRES | 78 m |
| PASMI | 78 m |
| JAGUAL | 78 m |
| SISIRRA | 78 m |
| TRES ESQUINAS | 78 m |
| ONCE CASAS | 78 m |
| DANUBIO | 78 m |
| LA LINEA | 78 m |

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**CAMINO ANCESTRAL**

Los caminos ancestrales presentan un tráfico particular, principalmente compuesto vehículos motorizados pequeños, motocicletas, bicicletas y peatones. La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada #5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.25 m reforzados con varilla de 3/8'' y flejes cada 0.25 m de 1/4"; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y ancho total de 1.5 m.

**PLACA HUELLA**

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de dos franjas de huellas de concreto de resistencia F'c=21 Mpa con ancho de 0.90 m y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se encuentra un concreto ciclopeo con piedra a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor. la longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre,se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m, y el confinamiento lateral por berma cunetas, en concreto de 0.55 de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MAIC 2024
INTEGRANTES: 50% ICSSA SAS; 50% PROMAQCO S.A.S.
CONTRATO No. 18092024-1295
FECHA DE INICIO: 1/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 3,568,032,325.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 3,568,032,325.00 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 713,606,465.00 |
| VALOR AMORTIZADO: | $ 245,846,741.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 467,759,724.00 |

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 2 DEL 25 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN 1 | DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | REANUDACION | 1 DE ABRIL DE 2025 |
| AMPLIACION SUSPENSIÓN 1 | DEL 15 DE FEBRERO AL 25 DE JULIO DE 2025 | REANUDACION | 25 DE JULIO DE 2025 |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
INTEGRANTES: 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S
CONTRATO No. 2252 DE 2021
FECHA DE INICIO: 16/03/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/10/2025

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 999,980,476.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ 285,000,000.00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 1,284,980,476.00 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 420,159,864.00 |
| VALOR AMORTIZADO: | $ 347,235,052.60 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 72,924,811.40 |

**PRORROGAS**

PRORROGA 1 DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 DEL31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 MAYO DE 2024
PRORROGA 4 DEL 31 DE AGOSTO AL 21 NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA 5 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 6 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 7 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 ENERO DE 2023 AL 2 JUNIO DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 JUNIO DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE JUNIO DE 2023 AL 2 OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 3 OCTUBRE DE 2023 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 1** | DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **REANUDACION 1** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **SUSPENSIÓN 2** | DEL 3 DE MAYO DE 2024 AL 1 JULIO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE JULIO DE 2024 |
| **AMPLIACION SUSPENSIÓN 2** | DEL 2 DE JULIO DE 2024 AL 1 AGOSTO DE 2024 | **REANUDACION 2** | 2 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3** | DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIODE 2025 | **REANUDACION 2** | 1 DE JULIO DE 2025 |

FECHA: 05/09/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 30 del 29/08/25 al 04/09/25 Último Informe Semanal SI

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | $ 3,568,032,325 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | $ 1,229,233,705 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | $ 2,338,798,620 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000 | $ 605,980,476 | | $ 285,000,000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081 | $ 558,328,382 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,919 | $ 47,652,094 | | |

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 3,513,609,095.42 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 2,323,857,517.29 | 66.14% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1,830,178,981.54 | 52.09% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (493,678,535.75) | -14.05% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 54,423,229.00 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 54,423,229.00 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (54,423,229.00) | -100.00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 3,568,032,324.42 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2,378,280,746.29 | 66.66% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,830,178,981.54 | 51.29% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (548,101,764.75) | -15.36% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 153,842,987.74 | 4.38% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11,604,718.64 | 0.33% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: n/a

PERIODO FACTURADO: 1-12-2024 a 31-1-2025
VALOR FACTURA: $ 984,038,365.03

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
*Reprogramacion de obra #1 a partir del 12 diciembre de 2024 -*Reprogramacion de obra #2 a partir del 25 julio de 2025

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 713,606,465 |
| Amortizado $ | 245,846,741 |
| Saldo $ | 467,759,724 |

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,195,437,694.55 | 93.03% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,202,235,986.15 | 93.56% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 21,451,612.00 | 1.67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 21,451,612.00 | 1.67% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | 0.656895308 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 420,159,864 |
| Amortizado $ | 347,235,053 |
| Saldo $ | 72,924,811 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 66.14% 100.00% Avance o Atraso Físico % -14.05%
Meta Física Ejecutada % 52.09% 48.20%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | Total | % |
| PLACA HUELLA | m | 1766 | 1766 | | Prog | 897.00 | 430.00 | 439.00 | 1766.00 | 100.00% |
| | | | | | Ejec | 743.005 | 217.1 | 458.01 | 1418.115 | 80.30% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 3383 | 3383 | | Prog | n/a | 1985.00 | 1398.00 | 3383.00 | 100.00% |
| | | | | | Ejec | | 896.970 | 166.930 | 1063.900 | 31.45% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | | |
| Retroexcavadora | | |
| Vibrocompactador | | |
| Compresor | | |
| Compactador manual | | |
| Mezcladora de concreto | | |
| Volqueta | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA | 897 | 897.00 | 743.005 | ATRASO | 17.17% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 2: NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | 2415 | 2415.00 | 1114.07 | ATRASO | 53.87% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Festividades de fin de año.Fiestas del Diablo |
| RESGUARDO 3: SAN LORENZO | 1837 | 1837.00 | 624.94 | ATRASO | 65.98% | Debido a los periodos de lluvias de los primeros 3 meses, que dificultò el ingreso de materieles y la apertura de nuevos frentes, en contratista mantiene el suministro de materiales para los frentes abiertos, se deben abrir mas frentes de trabajo. Se presentò dificultad para el ingreso a San Lorenzo hasta el 10 de enero debido al pare -siga de los trabajos desarrollados para sitios criticos con tiempos mayores a la hora de espera.Festividades de fin de año. Fiestas del Diablo |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACION: ASOCIACIÓN ARENEROS DE LA FELISA | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |
| UBICACION: INES CASTRO DE PELAEZ | PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:** Revisado los documentos de la nueva Cantera propuesta, de propiedad de la Señora Inés castro de Peláez, hasta su complementación quedando aprobados los permisos minero ambientales internamente el 30 de diciembre de 2024, se dio respuesta el 7 de enero .

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Pendiente por entregar correciones

**OBSERVACIONES**: Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-020 la Interventoria da concepto de NO APROVACION con requerimientos al PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA) – versión 2.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 30 del 29/08/25 al 04/09/25 Último Informe Semanal SI

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 75 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 23 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 52 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 22 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 82

no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Calle 17 A # 5C-22 Barrio La Maria

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N /A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N /A
AVALÚOS APROBADOS: N /A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N /A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD AL PRESENTE CONTATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**PLACA HUELLA**

*RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA:
PLANADAS: 157 m de meta física; 157 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 1: 100 m de meta física; 100,75 m de meta ejecutada;
CAÑAMOMO 2: 100 m de meta física; 100 m de meta ejecutada;
IBERIA BAJA: 170 m de meta física; 174,075 m de meta ejecutada;
PORTACHUELO 1: 120 m de meta física; 5 m de meta ejecutada;.
PORTACHUELO 2: 50 m de meta física; sin inicio de actividades.
PANESSO: 100 m de meta física; 101,93 m de meta ejecutada;
AMOLADOR: 100 m de meta física; 104,25 m de meta ejecutada;
*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CABAÑA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
UBARBA: 115 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESPERANZA: 200 m de meta física; 217,1 m de meta ejecutada;
* RESGUARDO SAN LORENZO:
SAN JOSE 1: 65 m de meta física; 69,1 m de meta ejecutada;
SAN JOSE 2: 99 m de meta física; 100,65 m de meta ejecutada;
COSTA RICA: 65 m de meta física; 71,87 m de meta ejecutada;
CENTRO POBLADO: 80 m de meta física; 84,08 m de meta ejecutada;
EL CARMELO: 65 m de meta física; 65,37 m de meta ejecutada;
LLANO GRANDE: 65 m de meta física; 66,94 m de meta ejecutada;

**CAMINO ANCESTRAL**

*RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA:
LA CANDELARIA: 400 m de meta física; 400,22 m de meta ejecutada;
TUMBABARRETO: 285 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS MINAS: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
LAS ESTANCIAS: 200 m de meta física; 201,25 m de meta ejecutada;
EL SALADO: 300 m de meta física; 295,5 m de meta ejecutada;
EL EDEN: 200 m de meta física; sin inicio de actividades.
SANTA INES: 400 m de meta física; sin inicio de actividades.
* RESGUARDO SAN LORENZO:
VENEROS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SAN MIGUEL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL ROBLE: 150 m de meta física; sin inicio de actividades.
TUNZARA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
EL CACHO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TAPARCO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA ESCUELA: 78 m de meta física; 80 m de meta ejecutada;
HONDURAS: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
LA PRADERA: 78 m de meta física; 79,93 m de meta ejecutada;
BUENOS AIRES: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
PASMI: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
JAGUAL: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
SISIRRA: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.
TRES ESQUINAS: 78 m de meta física; 5 m de meta ejecutada;
ONCE CASAS: 78 m de meta física; 2 m de meta ejecutada;
DANUBIO: 78 m de meta física; sin inicio de actividades.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* No se ha dado orden de inicio al contrato de obra
* se realiza verificacion de documentos de reinicio de actividades .
* Se realiza recorrido con los resguardo indigenas entregando obras realizadas,

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

### RESGUARDO CAÑAMOMO - LOMAPRIETA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **897** | **743.005** | 83% |
| PLANADAS | 157 | 157.00 | 100% |
| CAÑAMOMO 1 | 100 | 100.75 | 100% |
| CAÑAMOMO 2 | 100 | 100.00 | 100% |
| IBERIA BAJA | 170 | 174.08 | 100% |
| PORTACHUELO 1 | 120 | 5.00 | 4% |
| PORTACHUELO 2 | 50 | | |
| PANESSO | 100 | 101.93 | 100% |
| AMOLADOR | 100 | 104.25 | 100% |

### RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **430** | **217.1** | 50% |
| LA CABAÑA | 115 | | |
| UBARBA | 115 | | |
| LA ESPERANZA | 200 | 217.10 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1985** | **896.97** | 45% |
| LA CANDELARIA | 400 | 400.22 | 100% |
| TUMBABARRETO | 285 | | |
| LAS MINAS | 200 | | |
| LAS ESTANCIAS | 200 | 201.25 | 100% |
| EL SALADO | 300 | 295.50 | 99% |
| EL EDEN | 200 | | |
| SANTA INES | 400 | | |

FECHA: 05/09/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 30 del 29/08/25 al 04/09/25 Último Informe Semanal SI

**RESGUARDO NUESTRA SAN LORENZO**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **439** | **458.01** | 100% |
| SAN JOSE 1 | 65 | 69.10 | 100% |
| SAN JOSE 2 | 99 | 100.65 | 100% |
| COSTA RICA | 65 | 71.87 | 100% |
| CENTRO POBLADO | 80 | 84.08 | 100% |
| EL CARMELO | 65 | 65.37 | 100% |
| LLANO GRANDE | 65 | 66.94 | 100% |

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1398** | **166.93** | 12% |
| VENEROS | 78 | | |
| SAN MIGUEL | 78 | | |
| EL ROBLE | 150 | | |
| TUNZARA | 78 | | |
| EL CACHO | 78 | | |
| TAPARCO | 78 | | |
| LA ESCUELA | 78 | 80.00 | 100% |
| HONDURAS | 78 | | |
| LA PRADERA | 78 | 79.93 | 100% |
| BUENOS AIRES | 78 | | |
| PASMI | 78 | | |
| JAGUAL | 78 | | |
| SISIRRA | 78 | | |
| TRES ESQUINAS | 78 | 5.00 | 6% |
| ONCE CASAS | 78 | 2.00 | 3% |
| DANUBIO | 78 | | |
| LA LINEA | 78 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1


Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1



Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Placa Huella: Portachuelo 1



Resguardo San Lorenzo, camino ancestras tres esquinas


Resguardo San Lorenzo, camino ancestras tres esquinas


Resguardo San Lorenzo, camino ancestras tres esquinas



Resguardo San Lorenzo, camino ancestras Once Csas



Resguardo San Lorenzo, camino ancestras Once Csas



Resguardo San Lorenzo, camino ancestras Once Csas

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista , basados en la programación general
* Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.
* Realizar el seguimiento continuo al componente tecnico, administrativo y financiero del contrato de obra.
* Demas actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1/01/1900 |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATO No.** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Retrocargador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volqueta WBB408 | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | |
| Volqueta WBB619 | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | |
| Vibrocompactador | | | | A | A | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | |
| Mezcladora 1 | | | | A | A | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | |
| Mezcladora 2 | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | |
| Mezcladora 3 | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | |
| Mezcladora 4 | | | | | | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladora 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladora 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladora 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladora 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | | | | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INACTIVO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 136 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 136 | 100,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 0 | 0,0% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 05202-106359 ANT

Firma

Nombre: IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 1/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CARAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 01

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | Santiago Andrés Sánchez | 1.098.682.166 | Director | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 3.100.000,00 | $ 215.800 | V | SURA | 79654444 | $ 124.000 | COLPENSIONES | 79654444 | $ 496.000 | $ 124.000 | | | |
| 2 | Martha Rojas Vásquez | 43.618.811 | Residente - R.L. | $ 3.100.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 3.100.000,00 | $ 215.800 | V | SURA | 79654444 | $ 124.000 | COLPENSIONES | 79654444 | $ 496.000 | $ 124.000 | | | |
| 3 | Rosa Emilia Sierra Serna | 43.570.818 | Social | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 1.500.000,00 | $ 215.800 | V | SURA | 79654444 | $ 124.000 | COLPENSIONES | 79654444 | $ 496.000 | $ 124.000 | | | |
| 4 | Laura Catalina Camargo | 37.948.423 | Ambiental | $ 2.100.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 2.100.000,00 | $ 99.100 | V | NUEVA EPS | 7965444 | $ 57.000 | COLPENSIONES | 7965444 | $ 227.800 | $ 57.000 | | | |
| 5 | Marlon Giovany Sanchez | 1.039.703.97 | Maestro | $ 3.000.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 3.000.000,00 | $ 208.800 | V | NUEVA EPS | 7965444 | $ 120.000 | PORVENIR | 79654444 | $ 480.000 | $ 120.000 | | | |
| 6 | Camilo Alberto Restrepo | 1.017.173.246 | Maestro | $ 3.000.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 3.000.000,00 | $ 208.800 | V | SURA | 7965444 | $ 120.000 | PROTECCION | 79654444 | $ 480.000 | $ 120.000 | | | |
| 7 | Jeison de Jesus Zamora | 9.867.339 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 1.423.500,00 | | V | SURA | | | PROTECCION | | | | | | |
| 8 | Yeferson Alberto Cañas Reyes | 1.007.326.708 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | PORVENIR | | | | | | |
| 9 | Jhair Stevin Hernandez | 1.059.700.148 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | PROMAQCO SAS | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | | | | | | | |
| 10 | Aldemar de Jesus Guerrero | 15.922.990 | Ayudante | $ 1.600.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.600.000,00 | | V | ASOC. INDUSTRIA DEL | | | PORVENIR | | | | | | |
| 11 | Luis Alejandro Rojo Gonzalez | 1.035.809 | Oficial de obra | $ 2.100.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 2.100.000,00 | | V | NUEVA EPS | | | COLPENSIONES | | | | | | |
| 12 | Juan Evangelista Tapasco V | 15.930.582 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | COLFONDOS | | | | | | |
| 13 | Jhon Alexander Bueno Gañan | 1.059.695.689 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | SALUD TOTAL | | | COLPENSIONES | | | | | | |
| 14 | Jose Maria Bueno Betancur | 15.919.485 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | PORVENIR | | | | | | |
| 15 | Cornelio Gañan Andica | 15.922.586 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | PROTECCION | | | | | | |
| 16 | Luis Ferney Bueno Gañan | 1.007.497.480 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | SANITAS | | | PORVENIR | | | | | | |
| 17 | Oscar de Jesus Largo B | 15.923.899 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | COLFONDOS | | | | | | |
| 18 | Jose Leonardo Rojas Andica | 15.918.691 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | COLFONDOS | | | | | | |
| 19 | Hernan de Jesus Gañan | 9.910.141 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | COLFONDOS | | | | | | |
| 20 | Edilson Betancur Bueno | 1.088.247.068 | Ayudante | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.423.500,00 | | V | NUEVA EPS | | | COLFONDOS | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-249576 CND

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**MES INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4500026170 | I.23-0094/001 REHABILITACION, MEJORAMIENOT Y MANTENIMI | 1 | Nación | Contrato Principal | $ 3.568.032.325 | $ 2.338.798.620 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 3.568.032.325 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 3.568.032.325,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar Gobernacion Caldas | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | $ 3.568.032.325 | $ 3.568.032.325 | n/a | | | condición inicial |
| | | | | | | | | $ 713.606.465 | | $ 2.854.425.860 | $ 3.568.032.325 | n/a | | | entrega anticipo |
| 1 | OBRA | 1-10-24 a 30-11-24 | $ 245.195.340,37 | $ - | $ 245.195.340 | $ 49.039.068 | $ 196.156.272,37 | $ 664.567.397 | | $ 2.658.269.588 | $ 3.322.836.985 | n/a | X | | |
| 2 | OBRA | 1-12-24 a 31-1-25 | $ 984.038.365,03 | $ - | $ 1.229.233.705 | $ 196.807.673 | $ 787.230.692,03 | $ 467.759.724 | | $ 1.871.038.896 | $ 2.338.798.620 | n/a | X | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 1.229.233.705,40** | **$ -** | **$ 1.229.233.705** | **$ 245.846.741** | **$ 983.386.964** | **$ 467.759.724** | | **$ 1.871.038.896** | **$ 2.338.798.620** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 1.229.233.705,40 | | **$ 1.229.233.705** |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ - | $ - | **$ -** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ - | | **$ -** |
| **VALOR TOTAL** | $ 1.229.233.705 | $ - | **$ 1.229.233.705** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-249576 CND

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 686 |
| Lluvias moderadas | 3 | 2 | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 4 | | 3 | | | | | | | 44 |
| Lluvias intensas | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 14 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 05202-106359 ANT

Firma
Nombre: IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1295

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

NO se presentaron actividades en el periodo

NO se presentaron actividades en el periodo

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-249576 CND

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 1 (Día) | 8 (Mes) | 2025 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**FECHA DE INICIO:** 1/10/2024

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 3.568.032.325,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 3.568.032.325,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 15.000.000,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 15.000.000,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 713.606.465 | 16 | 9 | 24 | 30 | 6 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 713.606.465 | 16 | 9 | 24 | 30 | 6 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 713.606.465 | 16 | 9 | 24 | 31 | 12 | 27 |
| Calidad del Servicio | 0,15% | $ 5.355.000 | 16 | 9 | 24 | 16 | 9 | 29 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 1.070.409.697 | 31 | 12 | 24 | 31 | 12 | 29 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100082444

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 11/10/2024

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 15% | $ 520.000.000,0 | 16 | 9 | 24 | 31 | 12 | 24 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021665 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 11/10/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 1 (Día) | 8 (Mes) | 2025 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 713.606.465 | 28 | 12 | 2024 | 15 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 713.606.465 | 28 | 12 | 2024 | 15 | 8 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 713.606.465 | 28 | 12 | 2024 | 15 | 8 | 2025 |
| Calidad del Servicio | 0,15% | $ 5.355.000 | 1 | 10 | 2024 | 1 | 10 | 29 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 1.070.409.697 | 15 | 2 | 2025 | 15 | 8 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100082444

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 13/01/2025

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 16% | $ 569.400.000 | 16 | 9 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021665 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 13/01/2025

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 1/09/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**FECHA DE INICIO:** 1/10/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ NO ---X-- APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ----X-- APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 1/09/2025
(Día) (Mes) (Año)

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 25202-249576 CND

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| GOBIERNO DE CALDAS | **GOBERNACIÓN DE CALDAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 22/10/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Departamento de Caldas

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | $ 570.885.172,00 | | | | $ 570.885.172,00 | 84,21% |
| 2 | ALQUILER DE EQUIPOS | $ 107.040.970,00 | | | | $ 107.040.970,00 | 15,79% |
| | TOTAL | $ 677.926.142,00 | | | | $ 677.926.142,00 | 100% |

Firma:
Nombre: MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO MAIC 2024
Matrícula Profesional No. 05202-106359 ANT

Firma: Natalia Arcos G
Nombre. Natalia Maria Arcos Gonzalez
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Matrícula Profesional No.25202-355216

Original: Archivo Gobernación de Caldas
Copias: Contratista, Interventor.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 01/09/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1 **MES:** agosto-2025 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295
(Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 312148 **DE** ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA POPULAR SA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 500806324638 **BANCO** SUCURSAL: bucaramanga
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 20 %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 713.606.465,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | $ 570.885.172 | $ 570.885.172 | | $ 570.885.172,00 | $ - |
| 2 | ALQUILER DE EQUIPOS | $ 107.040.970 | $ 107.040.970 | | $ 107.040.970,00 | $ - |
| | **TOTALES** | $ 677.926.142 | | | $ 677.926.142,00 | $ - |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No. 05202-106359 ANT

Firma: Natalia Arcos G
Nombre: Natalia María Arcos Gonzalez
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Matrícula Profesional No.25202-355216

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
**PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 01/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 18092024-1295

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC-2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 25/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.568.032.325,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.568.032.326,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | 10-2024 | 11-2024 | 1/12/2024 A 12/12/2024 | 13/12/2024 A 31/12/2024 | 01-2025 | 02-2025 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | Indicar mes y año N… | 100% |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Riosucio Placa Huella | $1.158.384 | 32,97% | 82,00% | % P | 7,43% | 14,28% | 21,41% | 1,68% | 11,20% | 44,00% | 1,72% | 18,16% | 24,07% | | |
| | $1.158.384 | 32,97% | $949.875 | $ P | $86.073 | $165.400 | $248.000 | $19.468 | $129.788 | $509.653,92 | $19.893,00 | $210.393,40 | $278.857,00 | | 90% |
| | | | | $ E | $23.064 | $133.257 | | $93.453,87 | $145.430,76 | $146.366,75 | | $409.362,23 | | | |
| | | | | % E | 1,99% | 11,50% | 0,00% | 8,07% | 12,55% | 12,54% | 0,00% | 35,34% | 0,00% | | |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Riosucio Mantenimiento | $58.259 | 1,66% | 0,00% | % P | 13,92% | 20,60% | 41,20% | 1,73% | 11,52% | 10,88% | 0,24% | 3,07% | 88,84% | | |
| | $58.259 | 1,66% | $0 | $ P | $8.110 | $12.000 | $24.000 | $1.007 | $6.712 | $6.341,08 | $137,00 | $1.786,15 | $51.756,00 | | 80% |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña Placa Huella | $560.842 | 15,96% | 50,00% | % P | 6,73% | 8,47% | 11,02% | 2,07% | 13,81% | 57,50% | 1,68% | 22,92% | 48,89% | | |
| | $560.842 | 15,96% | $280.421 | $ P | $37.728 | $47.500 | $61.800 | $11.621 | $77.470 | $322.723,00 | $9.426,00 | $128.545,76 | $274.191,00 | | 70% |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $76.648,05 | $76.648,05 | | $121.872,95 | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,50% | 14,29% | 0,00% | 31,21% | 0,00% | | |
| Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña Camino Ancestral | $660.168 | 18,79% | 45,00% | % P | 0,00% | 15,52% | 17,57% | 1,79% | 11,93% | 53,19% | 1,13% | 17,78% | 38,71% | | |
| | $660.168 | 18,79% | $297.076 | $ P | $0 | $102.430 | $116.000 | $11.814 | $78.760 | $351.163,30 | $7.490,00 | $117.377,20 | $255.522,00 | | 60% |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $23.064,45 | $106.430,00 | $80.365,55 | | $190.494,45 | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,34% | 21,08% | 9,05% | 0,00% | 11,53% | 0,00% | | 50% |
| Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña Mantenimiento | $57.345 | 1,63% | 0,00% | % P | 0,31% | 9,24% | 32,00% | 2,72% | 13,63% | 42,10% | 0,90% | 11,68% | 79,71% | | |
| | $57.345 | 1,63% | $0 | $ P | $180 | $5.300 | $18.350 | $1.557 | $7.818 | $24.140,70 | $515,00 | $6.696,75 | $45.707,00 | | 40% |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Resguardo Indígena San Lorenzo Placa Huella | $558.433 | 15,89% | 100,00% | % P | 0,00% | 4,06% | 6,41% | 2,55% | 16,97% | 70,01% | 1,94% | 18,97% | 17,83% | | |
| | $558.433 | 15,89% | $558.433 | $ P | $0 | $22.700 | $35.800 | $14.215 | $94.770 | $390.947,03 | $10.839,00 | $105.908,58 | $99.552,00 | | 30% |
| | | | | $ E | $0 | $52.720 | | $53.632,46 | $109.641,70 | $120.159,00 | | $243.406,86 | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 9,44% | 0,00% | 9,43% | 19,63% | 17,91% | 0,00% | 43,59% | 0,00% | | |
| Resguardo Indígena San Lorenzo Camino Ancestral | $430.606 | 12,26% | 11,00% | % P | 0,00% | 9,60% | 12,81% | 2,27% | 15,12% | 60,09% | 1,86% | 25,37% | 61,01% | | |
| | $430.606 | 12,26% | $47.367 | $ P | $0 | $41.350 | $55.600 | $9.769 | $65.128 | $258.762,97 | $8.019,00 | $109.255,65 | $262.712,07 | | 20% |
| | | | | $ E | $0 | $0 | | | $77.112,36 | $30.254,80 | | -$0,47 | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,97% | 7,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 10% |
| Resguardo Indígena San Lorenzo Mantenimiento | $29.572 | 0,84% | 0,00% | % P | 0,00% | 18,97% | 52,08% | 12,78% | 12,78% | 16,32% | 0,35% | 4,54% | 87,39% | | |
| | $29.572 | 0,84% | $0 | $ P | $0 | $5.000 | $15.400 | $567 | $3.779 | $4.826,00 | $103,00 | $1.341,10 | $25.844,00 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0% |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | $ 3.513.609 | | 2.133.171 | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | $ 3.513.609 | | | | | | | REPROGRAMACION 1 | | | REPROGRAMACION 2 | | | | |

-$2.031.775,87829

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 3,76% | 11,43% | 16,36% | 1,99% | 13,21% | 53,24% | 1,61% | 19,39% | 36,83% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $132.091 | $401.680 | $574.950 | $70.017 | $464.222 | $1.870.558 | $56.422 | $681.305 | $1.294.141 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 3,76% | 15,19% | 31,56% | 33,55% | 46,76% | 100,00% | 43,78% | 63,17% | 100,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $132.091 | $533.771 | $1.108.721 | $1.178.739 | $1.642.960 | $3.513.518 | $1.538.163 | $2.219.468 | $3.513.609 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,66% | 5,29% | 0,00% | 4,78% | 12,43% | 11,82% | 0,00% | 25,73% | 0,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $23.064 | $185.976 | $0 | $168.117 | $436.593 | $415.484 | $0 | $903.937 | $0 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,66% | 5,95% | 5,95% | 10,73% | 23,16% | 34,98% | 34,98% | 60,71% | 60,71% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $23.064 | $209.040 | $209.040 | $377.156 | $813.750 | $1.229.234 | $1.229.234 | $2.133.171 | $2.133.171 | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| ***Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta** REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 5.000 / $ 5.000 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta** IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 950 / $ 950 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta** OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 13.150 / $ 13.150 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña** REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA | $ 5.000 / $ 5.000 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña** IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE | $ 950 / $ 950 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña** OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA | $ 12.843 / $ 12.843 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena San Lorenzo** REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 5.000 / $ 5.000 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena San Lorenzo** IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 950 / $ 950 | $ - | 0,00% |
| ***Resguardo Indígena San Lorenzo** OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 10.580 / $ 10.580 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 54.423 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 54.423 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ 3.568.032 | $ 2.133.170,68 | **59,79%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ 3.568.032 | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ valor | $ valor |
| CURVAS | | |
| | REPROGRAMADO | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: MA...OCABRERA DUSSAN
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 01/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

**SEGUIMIENTO No.** 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 18092024-1295

**OBJETO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO – LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

**CONTRATISTA:** CONTRATISTA MAIC-2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 3.568.032.325,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 3.568.032.325,00

PLAZO ACUMULADO: 6,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 25/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | ((%) OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 10-2024 | 11-2024 | 1/12/2024 12/12/2024 | 13/12/2024 31/12/2024 | 01-2025 | 02-2025 | 07-2025 | 08-2025 | 09-2025 | Indicar mes y año N… | |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Riosucio Placa Huella | $ 1.158.384 | 32,97% | 82,00% | % P | 7,43% | 14,28% | 21,41% | 1,68% | 11,20% | 44,00% | 1,72% | 18,16% | | | 100% |
| | $ 1.158.384 | 32,97% | $949.875 | $ P | $86.073 | $165.400 | $248.000 | $19.468 | $129.788 | $509.654 | $19.893 | $210.393 | $278.857 | | |
| | | | | $ E | $23.064 | $133.257 | $0,00 | $69.455,67 | $145.430,76 | $145.345,70 | $0,00 | $409.302,23 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 1,99% | 11,50% | 0,00% | 8,07% | 12,55% | 12,54% | 0,00% | 35,34% | | | |
| Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - Riosucio Mantenimiento | $ 58.259 | 1,66% | 0,00% | % P | 13,92% | 20,60% | 41,20% | 1,73% | 11,52% | 10,88% | 0,24% | 3,07% | | | |
| | $ 58.259 | 1,66% | $0 | $ P | $8.110 | $12.000 | $24.000 | $1.007 | $6.712 | $6.341 | $137 | $1.786 | $51.756 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña Placa Huella | $ 560.842 | 15,96% | 50,00% | % P | 6,73% | 8,47% | 11,02% | 2,07% | 13,81% | 52,90% | 1,68% | 22,92% | | | |
| | $ 560.842 | 15,96% | $280.421 | $ P | $37.728 | $47.500 | $61.800 | $11.621 | $77.470 | $324.723 | $9.426 | $128.546 | $274.191 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $26.228,78 | $281.140,16 | $0,00 | $139.208,65 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,50% | 14,29% | 0,00% | 31,21% | | | |
| Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña Camino Ancestral | $ 660.168 | 18,79% | 45,00% | % P | 0,00% | 15,52% | 17,57% | 1,79% | 11,93% | 53,19% | 1,13% | 17,78% | | | |
| | $ 660.168 | 18,79% | $297.076 | $ P | $0 | $102.430 | $116.000 | $11.814 | $78.760 | $351.163 | $7.490 | $117.377 | $255.522 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $22.028,45 | $139.175,06 | $59.772,32 | $0,00 | $76.699,70 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,34% | 21,08% | 9,05% | 0,00% | 11,53% | | | |
| Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña Mantenimiento | $ 57.345 | 1,63% | 0,00% | % P | 0,31% | 9,24% | 32,00% | 2,72% | 13,63% | 42,10% | 0,90% | 11,68% | | | 50% |
| | $ 57.345 | 1,63% | $0 | $ P | $180 | $5.300 | $18.350 | $1.557 | $7.818 | $24.141 | $515 | $6.697 | $45.707 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Resguardo Indígena San Lorenzo Placa Huella | $ 558.433 | 15,89% | 100,00% | % P | 0,00% | 4,06% | 6,41% | 2,55% | 16,97% | 70,01% | 1,94% | 18,97% | | | |
| | $ 558.433 | 15,89% | $558.433 | $ P | $0 | $22.700 | $35.800 | $14.215 | $94.770 | $390.947 | $10.839 | $105.909 | $99.552 | | |
| | | | | $ E | $0 | $52.220 | $0,00 | $52.852,46 | $109.691,70 | $109.692,00 | $0,00 | $243.456,88 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 9,44% | 0,00% | 9,43% | 19,63% | 17,91% | 0,00% | 43,59% | | | |
| Resguardo Indígena San Lorenzo Camino Ancestral | $ 430.606 | 12,26% | 11,00% | % P | 0,00% | 9,60% | 12,91% | 2,27% | 15,12% | 60,09% | 1,86% | 25,37% | | | |
| | $ 430.606 | 12,26% | $47.367 | $ P | $0 | $41.350 | $55.600 | $9.769 | $65.128 | $258.763 | $8.019 | $109.256 | $262.712 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $17.112,36 | $30.254,80 | $0,00 | $0,47 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,97% | 7,03% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Resguardo Indígena San Lorenzo Mantenimiento | $ 29.572 | 0,84% | 0,00% | % P | 0,00% | 16,91% | 52,08% | 1,92% | 12,78% | 16,32% | 0,35% | 4,54% | | | |
| | $ 29.572 | 0,84% | $0 | $ P | $0 | $5.000 | $15.400 | $567 | $3.779 | $4.826 | $103 | $1.341 | $25.844 | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | $ 3.513.609 | | $2.133.171 | | | | | REPROGRAMACION 1 | | | REPROGRAMACION 2 | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | $ 3.513.609 | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ valor | $ valor |
| CURVAS | | |
| | REPROGRAMADO | |

-2031776,878

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 3,76% | 11,43% | 16,36% | 1,99% | 13,21% | 53,24% | 1,61% | 19,39% | 36,83% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $132.091 | $401.680 | $574.950 | $70.017 | $464.222 | $1.870.558 | $56.422 | $681.305 | $1.294.141 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 3,76% | 15,19% | 31,56% | 33,55% | 46,76% | 100,00% | 43,78% | 63,17% | 100,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $132.091 | $533.771 | $1.108.721 | $1.178.739 | $1.642.960 | $3.513.518 | $1.538.163 | $2.219.468 | $3.513.609 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,66% | 5,29% | 0,00% | 4,78% | 12,43% | 11,82% | 0,00% | 25,73% | 0,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $23.064 | $185.976 | $0 | $168.117 | $436.593 | $415.484 | $0 | $903.937 | $0 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,66% | 5,95% | 5,95% | 10,73% | 23,16% | 34,98% | 34,98% | 60,71% | 60,71% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $23.064 | $209.040 | $209.040 | $377.156 | $813.750 | $1.229.234 | $1.229.234 | $2.133.171 | $2.133.171 | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 15.000 / $ 15.000 | $ - | 0,00% |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 2.850 / $ 2.850 | $ - | 0,00% |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 36.573 / $ 36.573 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 54.423 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 54.423 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ 3.568.032 | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ 3.568.032 | $ 2.133.170,68 | 0,00% |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 05202-106359 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 19/08/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 22
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC 2024

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RISOSUCIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO - LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2).

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento al componente ambiental al Contrato de Obra No. 17112023-1630 de 2023, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, (RESGUARDOS INDÍGENAS LA ALBANIA, TOTUMAL Y DAMASCO) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1.- Estado actual documentos PAGA COP No.18092024-1295 MAIC 2024
2.- Informes ambientales mensuales y, de Balance ambiental a la terminación del contrato de obra

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En atención a los compromisos concertados en el comité de la DT Caldas del día 12 de agosto de 2025, se realizó la reunión con las profesionales del área ambiental: Ingenieras Laura Catalina Camargo Jiménez – MAIC 2024 contratista, Belén Alexandra Cerón Q - CONSORCIO CEEF interventoría e, Ingeniera Juanita Gonzalez - Gestora Ambiental de la SSINVIAS, en el cual se establecieron las siguientes aclaraciones y, compromisos:

Los temas tratados fueron:

1.- Estado actual documentos PAGA COP No.18092024-1295 MAIC 2024

2.- Informes ambientales mensuales y, de Balance ambiental a la terminación del contrato de obra.

.- El contratista informa que está en el proceso de ajustes al documento PAGA de los tres frentes de obra.

.- La interventoría manifiesta su preocupación con el plazo de ejecución acumulado de 6,7 meses y, que aún hay ajustes pendiente puntuales que atender relacionados en el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-024 de fecha 10 de febrero de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y el Plan de Inversión ambiental, que debe ir en ceros, ya que, quedó claro que la provisión del PAGA solo paga costos de compensaciones por permisos que se generen directamente ante autoridad ambiental, en el marco de la obra, (Reunión DT CALDAS 12-08-2025)

.- Permisos ambientales por frente de obra: El contratista informa que los Indígenas en los resguardos como son autoridad en su territorio, se hacen cargo de los residuos y obtener cualquier tipo de permisos no es sencillo ya que ellos no dejan que nadie ingrese al resguardo, que ni siquiera el carro recolector de basuras de empresas públicas.

.- La interventoría y la Gestora ambiental, manifiestan que: No obstante la situación de autoridades en los resguardos que son de conocimiento público, es necesario que el contratista en obra, sea el responsable de las bolsas de cemento y, se tenga los permisos de aguas lluvias de los jagüeyes de los resguardos, los certificados de los cabildantes, sobre su condición de autoridad y el manejo que se da a los residuos convencionales y RCD y afines, el certificado de empresas públicas que no pueden ingresar, que son el sustento del documento PAGA para su aprobación.

.- El contratista hará la revisión del manual de interventoría del INVIAS, con el apoyo de la interventoría, para revisar los lineamientos para la elaboración de los informes mensuales.

Quedando los siguientes compromisos:

1.- El contratista, elabora el documento PAGA V2, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el Oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-010 de fecha 22 de noviembre de 2024, tomará la lista de chequeo de las observaciones e incluirá una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento.

.- **Fecha de entrega del documento, máximo 2 semanas, teniendo en cuenta que la obra vence el plazo el 30 de septiembre de 2025**, si puede lo hará antes de la fecha.

.- Posterior a ello, se hará **reunión de verificación entre las profesionales para revisión del PAGA, en fecha que será concertada**, para avanzar en el proceso.

.- **Se incluirán las Actas de radicación ambiental diligenciadas y con anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental con presupuesto - cero.**

2.- **La interventoría remitirá el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales** y el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento, al correo del contratista.

3.- Por solicitud de la Gestora ambiental de la SS del INVIAS, **la interventoría oficiará al contratista, para que el manejo de los residuos RESPEL, sigan bajo su custodia y se vayan acopiando en la medida de su uso y sean acopiados en la oficina de Riosucio, hasta que tenga el volumen suficiente, para su entrega a un Gestor de RESPEL**

| FECHA | 19/08/2025 |
|---|---|

(Día / Mes / Año)


**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Anexos:

1.- Formatos y Manual de Interventoría del INVIAS, vigente

2.- Cuadro en Excel para registro de soportes consolidado de seguimiento.



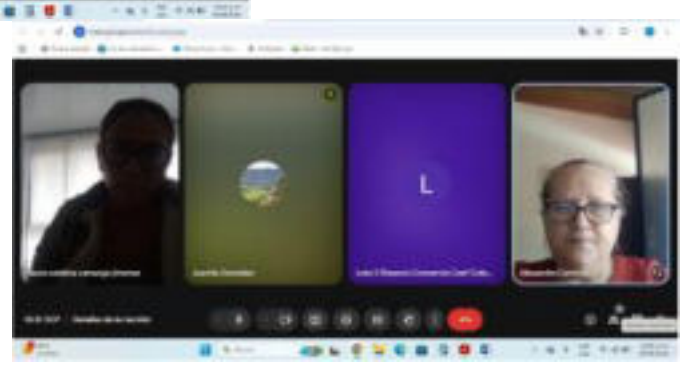

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Fecha de entrega del documento PAGA de según comunicación NV-CIC-2252-2021-L2R-010 de fecha 22 de noviembre de 2024 | DOS SEMANAS CONTADAS DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE REUNIÓN | CONSORCIO MAIC 2024 |
| Reunión de verificación entre las profesionales para revisión del PAGA | A CONCRETAR SEGÚN AVANCE | CONSORCIO MAIC 2024<br>CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| Remitir Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales | miércoles, 20 de agosto de 2025 | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Juanita del Pilar González Bulla | Gestora Ambiental | Subdiección de Sostenibilidad - INVIAS | |
| Laura Catalina Camargo | Profesional Ambiental | CONSORCIO MAIC 2024 | |
| Belén Alexandra Cerón Quintero | Profesional Ambiental | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/08/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 3 Mesa de trabajo social
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC 2024

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RISOSUCIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO - LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2).

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento al Contrato de Obra No. 18092024 - 1295, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RISOSUCIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: CAÑAMOMO - LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2).

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**


Mesa de trabajo para la revisión del estado del componente social en conjunto con las gestoras sociales INVIAS territorial Caldas y Bogotá, el contratista y la interventoría.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Saludo y agradecimiento por las partes, la mesa de trabajo inició a las 10:00 a.m., contó con la asistencia de la gestora social Territorial Caldas Dra. Tatiana Ospina, la gestora social Territorial Bogotá Dra.Marcela Pereira y la T.S. Yinna Bedoya de interventoría, esta reunión fue concertada por todas las partes en el desarrollo de la reunión presencial en DT Manizales el pasado martes 12 de agosto del año en curso. De parte de MAIC, en dicha reunión presencial, asistió la representante legal del Consorcio Ing. Martha Rojas Vasquez.

Pasados veinte minutos de reunión y ante la ausencia de la profesional social del contratista MAIC se da por cierre a la reunión y la gestora social DT informará lo sucedido a la supervisora del contrato DT Ing. Liliana Tibata.

Finalmente, las asistentes se despiden y agradecen el espacio.




| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Informar a la supervisora DT INVIAS Ing. Liliana Tibatá la inasistencia de la profesional social del contratista | martes, 19 de agosto de 2025 | Profesional social DT Caldas INVIAS |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Tatiana Ospina | Gestora social | DT INVIAS CALDAS | |
| Marcela Pereira | Gestora social | SS INVIAS BOGOTÁ | |
| Yinna Andrea Bedoya Romero | Especialista social | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

## 4.0. CONTRATO No 29102024-1472 (Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma)

### 4.1. INFORMACIÓN SEMANAL

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3

### 4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

### 4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

### 4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

### 4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

### 4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

### 4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

### 4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

### 4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
Se anexa formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

- Actas de Comité de Obra

No se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1; toda vez que, durante el periodo del mes de agosto de 2025 no se realizó comité de obra

- Actas de Reunión

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 08/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 17 del 01/08/25 al 07/08/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108 m** |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165 m** |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 |
| Tramo 5 - La Y | 60 |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| Meta Fisica Original | | Meta Fisica Actualizada | |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305 m** | **PLACA HUELLA** | **344,83 m** |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | Tramo 1 - La Escuela | 130 |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | Tramo 2 - El Aguacate | 64,83 |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 150 |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.20 m reforzados con varilla de 3/8'' y fijes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para los Municipios de Marmato, Anserma y Filadelfia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 305 m – 3 tramos

Camino Ancestral: 1273 m – 10 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS DP | | | | |
| **INTEGRANTES:** | PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L SAS participación del 90% - DMI INGENIERIA SAS participación del 10% | | | | |
| **CONTRATO No.** | 29102024-1472 | **VALOR INICIAL:** | $ | 898.043.437,75 | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/11/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ | - | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ | 898.043.437,75 | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ | - | |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ | - | |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ | - | |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 31 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | | | |
| **CONTRATO No.** | 2252 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ | 999.980.476,00 | |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ | 285.000.000,00 | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ | 1.284.980.476,00 | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ | 420.159.864,00 | |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ | 420.159.864,00 | |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ | - | |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 898.043.437,75 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | $ - | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 898.043.437,75 | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394.000.000,00 | $ 605.980.476 | $ 100.000.000 | $ 159.528.013 | $ 285.000.000,00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282.124.081,35 | $ 558.328.382 | $ 49.688.494 | $ 36.687.023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111.875.918,65 | $ 47.652.094 | $ 50.311.506 | $ 122.840.990 | $ 285.000.000,00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 879.413.460,23 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 155.304.417,08 | 17,66% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 128.554.740,06 | 14,62% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (26.749.677,02) | -3,04% |
| | | |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 18.629.977,52 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 18.629.977,53 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (18.629.977,53) | -100,00% |
| | | |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 898.043.437,75 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 173.934.394,60 | 19,37% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 128.554.740,06 | 14,31% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (45.379.654,54) | -5,05% |
| | | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 36.671.541,29 | 4,17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 91.722.638,27 | 10% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoría y la gobernación de caldas el 7 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Obras DP tuvo fecha de reinicio el 31 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.194.157.248,64 | 92,93% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.015.696.967,39 | 79,04% |
| | | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-064220
PERIODO FACTURADO: 1 al 12 Febrero 2025
VALOR FACTURA: $ 22.944.271,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-013 del 10 de febrero de 2025, la Interventoría le solicita a la Gobernación de Caldas IMPOSICIÓN DE MULTA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 29102024-1472, ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011. Por solicitud del área jurídico de la Gobernación de Caldas la Interventoría mediante correo electrónico remite a la Secretaria de Infraestructura ajuste a la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No 29102024-1472

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 7,900890834 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420.159.864 |
| **Amortizado $** | 420.159.864 |
| **Saldo $** | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 17,66%
Meta Física Ejecutada % 14,62%
Avance o Atraso Físico % -3,04%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción de la Meta Física Contractual** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vigencia 2024** | **Vigencia (n)** | **Avance Físico** | **Resguardo 1** | **Resguardo 2** | **Resguardo 3** | | **Total** | **%** |
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | | Prog | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 9,00 | 300,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | | |
| * PLACA HUELLA | m | 305 | 305 | | Prog | N/A | N/A | 159,96 | | 159,96 | 52,45% |
| | | | | | Ejec | N/A | N/A | 96,54 | | 96,54 | 31,65% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1273 | 1273 | | Prog | 506,91 | 8,81 | N/A | | 515,72 | 40,51% |
| | | | | | Ejec | | | N/A | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | 1 |
| Compactador manual | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CARTAMA | CAMINO ANCESTRAL | 1108 | 506,91 | | ATRASO | 45,75% | Se presenta un atraso del 45,75 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 2: LA SOLEDAD | CAMINO ANCESTRAL | 165 | 8,81 | | ATRASO | 5,34% | Se presenta un atraso del 5,34 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 3: ANSEA | PLACA HUELLA | 305 | 159,96 | 96,54 | ATRASO | 20,79% | Se presenta un atraso del 20,79 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 08/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL). (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 17 del 01/08/25 al 07/08/25 — Último Informe Semanal SI

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | POR DEFINIR | PERMISO MINERO: SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | x |

Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025 la Interventoría luego de revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra Consorcio Obras DP mediante el oficio ODP-005 del 10 de febrero de 2025, remite una serie de observaciones, las cuales se solicita se subsanen en un lapso de tiempo clasificado como inmediato, ya que dichos documentos deben ser entregados previos al inicio de la materialización de actividades de obra.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP)

**OBSERVACIONES**: Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-017 del 4 de agosto de 2025 la Interventoría luego de revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra Consorcio Obras DP mediante el oficio ODP-009 del 12 de febrero de 2025, remite una serie de observaciones, las cuales se solicita se ajusten en un lapso de tiempo clasificado como inmediato, en el marco de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022, normativa vigente y, su obligación contractual.

## V. GESTION SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 27 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 20 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** Por otro lado, el 5 de agosto de 2025, se realizó en horas de la mañana reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

## VI. GESTION PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El día 1 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se inició con el vaciado de concreto en la rampa de acceso inicial de la abscisa (K0+000 a K0+002.63)
•Se inició con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+002.83 a K0+025.11)
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se continuo con la excavación de 11 vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)

***Tramo 2 – El Aguacata (PH = 64.83 m)**
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via de la abscisa (K0+020 a K0+50).

**El día 2 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se inició con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+002.83 a K0+077.19)
•Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la entrada al predio izq (K0+028.54 a K0+031.54)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via de la abscisa (K0+050 a K0+70)
•Se inicio con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular de la abscisa (K0+000 a K0+30)
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via de la abscisa (K0+020 a K0+50).

**El día 4 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+002.63 a K0+022.08)
•Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se inicio con el vaciado de concreto de la entrada al predio izq (K0+028.54 a K0+031.54)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular de la abscisa (K0+030 a K0+070)
•Se inicio con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+042.42)
•Se inicio con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)

**El día 5 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con la instalación de 11 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)
•Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
•Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
•Se continuo con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+103.19 a K0+125.92)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se inicio con la con la instalación de 8 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+042.42)

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•El contratista de obra inicio con la actividad de excavación y conformación de la via del (Mod1 al Mod 10)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

**El día 6 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con el vaciado de concreto de 13 vigas riostra de la abscisa (K0+025.11 a K0+064.47)
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se inicio con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se continuo con la excavación de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+039.47 a K0+020.10)
•Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)
•Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (k0+42.42 a K0+020.30)

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via del (Mod 10 al Mod 20), teniendo aprox 64 m de excavación y conformación de via.

**El día 7 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+ 103.19)
•Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+077.38 a K0+ 103.19)
•Se continuo con la excavación de 9 vigas riostra de la abscisa (K0+128.95 a K0+150.43)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)
•Se continua con la instalación de 7 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+039.47 a K0+020.10)

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•El contratista de obra inicia con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular del (Mod 1 al Mod 10)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuará con el vaciado de concreto de la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la instalación de formaleta para la huella izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se continuará con el vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con el vaciado de concreto de huella izq y der
•Se continuará con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso final
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso final.
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de acceso final.

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se continuará con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con la instalación de formaleta para la huella izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se continuará con la excavación de vigas riostra
•Se iniciará con la excavación de la entrada al predio izq
•Se iniciará con el vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con el vaciado de concreto de la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se continuará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la entrada al predio izq
•Se iniciará con el vaciado de concreto para la entrada al predio izq
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se iniciará con la excavación de placa pequeña
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la placa pequeña

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•Se continuará con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular
•Se iniciará con la actividad de instalación de formaleta para la huella izq y der
•Se iniciará con la excavación de vigas riostra
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de vigas riostra
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la piedra pegada

Se programará reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-F.R-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 08/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL). (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 17 del 01/08/25 al 07/08/25 | Último Informe Semanal SI

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108** | | |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 | | |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 | | |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 | | |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165** | | |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 | | |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 | | |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 | | |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 | | |
| Tramo 5 - La Y | 60 | | |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305** | | |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | | |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | | |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**TRAMO 3 LA QUEBRADA**





**TRAMO 2 EL AGUACATE**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general. | |
| Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto. | FIRMA |
| Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra. | NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA |
| Demás actividades referidas en los documentos contractuales. | Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 18 del 08/08/25 al 14/08/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108 m** |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165 m** |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 |
| Tramo 5 - La Y | 60 |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| Meta Fisica Original | | Meta Fisica Actualizada | |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305 m** | **PLACA HUELLA** | **344,83 m** |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | Tramo 1 - La Escuela | 130 |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | Tramo 2 - El Aguacate | 64,83 |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 150 |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espedor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.20 m reforzados con varilla de 3/8" y flejes cada 0.25 m de 1/4"; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para los Municipios de Marmato, Anserma y Filadelfia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 305 m – 3 tramos

Camino Ancestral: 1273 m – 10 tramos

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS DP | | |
| **INTEGRANTES:** | PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L SAS participación del 90% - DMI INGENIERIA SAS participación del 10% | | |
| **CONTRATO No.** | 29102024-1472 | **VALOR INICIAL:** | $ 898.043.437,75 |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/11/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 898.043.437,75 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ - |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

**PRORROGA 1** DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025
**PRORROGA 2** DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

**SUSPENSIÓN 1:** DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025
**REANUDACION 1:** 31 DE JULIO DE 2025

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2252 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 999.980.476,00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285.000.000,00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1.284.980.476,00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 1/10/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420.159.864,00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420.159.864,00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 898.043.437,75 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | $ - | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 898.043.437,75 | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394.000.000,00 | $ 605.980.476 | $ 100.000.000 | $ 159.528.013 | $ 285.000.000,00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282.124.081,35 | $ 558.328.382 | $ 49.688.494 | $ 36.687.023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111.875.918,65 | $ 47.652.094 | $ 50.311.506 | $ 122.840.990 | $ 285.000.000,00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 879.413.460,23 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 191.975.958,37 | 21,83% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 199.911.861,50 | 22,52% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 6.035.903,13 | 0,69% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 18.629.977,52 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 18.629.977,53 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (18.629.977,53) | -100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN : | $ 898.043.437,75 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 210.605.935,90 | 23,45% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 198.011.861,50 | 22,05% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (12.594.074,40) | -1,40% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 39.573.605,71 | 4,17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 69.457.121,44 | 7,9% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoría y la gobernación de caldas el 31 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Obras DP tuvo fecha de reinicio el 31 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.205.930.629,96 | 93,85% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.034.420.603,93 | 80,50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18.723.636,54 | 1,46% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-064220
PERIODO FACTURADO: 1 al 12 Febrero 2025
VALOR FACTURA: $ 22.944.271,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** Mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-013 del 10 de febrero de 2025, la Interventoría le solicita a la Gobernación de Caldas IMPOSICIÓN DE MULTA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 29102024-1472, ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011. Por solicitud del área jurídico de la Gobernación de Caldas la Interventoría mediante correo electrónico remite a la Secretaria de Infraestructura ajuste a la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No 29102024-1472

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 5,224033531 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420.159.864 |
| **Amortizado $** | 420.159.864 |
| **Saldo $** | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 21,83%
Meta Física Ejecutada % 22,52%
Avance o Atraso Físico % 0,69%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción de la Meta Física Contractual** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vigencia 2024** | **Vigencia (n)** | **Avance Físico** | **Resguardo 1** | **Resguardo 2** | **Resguardo 3** | | **Total** | **%** |
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | | Prog | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 9,00 | 300,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | | |
| * PLACA HUELLA | m | 305 | 305 | | Prog | N/A | N/A | 167,58 | | 167,58 | 54,94% |
| | | | | | Ejec | N/A | N/A | 148,72 | | 148,72 | 48,76% |
| * CAMINO ANCESTRAL | m | 1273 | 1273 | | Prog | 512,24 | 9,00 | N/A | | 521,24 | 40,95% |
| | | | | | Ejec | | | N/A | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | 1 |
| Compactador manual | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CARTAMA | CAMINO ANCESTRAL | 1108 | 512,24 | | ATRASO | 46,23% | Se presenta un atraso del 46,23 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 2: LA SOLEDAD | CAMINO ANCESTRAL | 165 | 9,00 | | ATRASO | 5,46% | Se presenta un atraso del 5,46 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 3: ANSEA | PLACA HUELLA | 305 | 167,58 | 148,72 | ATRASO | 6,18% | Se presenta un atraso del 6,18 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 18 del 08/08/25 al 14/08/25 — Último Informe Semanal SI

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | POR DEFINIR | PERMISO MINERO: SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | x |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | x |

El Contratista de obra CONSORCIO OBRAS DP a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP)

**OBSERVACIONES**: El Contratista de obra CONSORCIO OBRAS DP a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-017 del 4 de agosto de 2025.

## V. GESTION SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 27 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 20 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** PEI martes 12 de agosto de 2025 se realizó reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA. Como conclusion de la reunión se establecieron mesas de trabajo con los pares socioambientales y los gestores del Invias para revisar el tema del documento PAGA y establecer como se iban a desarrollar los informes.

## VI. GESTION PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El día 1 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se inició con el vaciado de concreto en la rampa de acceso inicial de la abscisa (K0+000 a K0+002.63)
•Se inició con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+002.83 a K0+025.11)
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se continuo con la excavación de 11 vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)

***Tramo 2 – El Aguacata (PH = 64.83 m)**
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via de la abscisa (K0+020 a K0+50).

**El día 2 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se inició con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+002.83 a K0+077.19)
•Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la entrada al predio izq (K0+028.54 a K0+031.54)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via de la abscisa (K0+050 a K0+70)
•Se inicio con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular de la abscisa (K0+000 a K0+30)
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via de la abscisa (K0+020 a K0+50).

**El día 4 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+002.63 a K0+022.08)
•Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+025.31 a K0+077.19)
•Se inicio con el vaciado de concreto de la entrada al predio izq (K0+028.54 a K0+031.54)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular de la abscisa (K0+030 a K0+070)
•Se inicio con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+042.42)
•Se inicio con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)

**El día 5 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con la instalación de 11 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+067.57 a K0+100.13)
•Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
•Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
•Se continuo con la excavación de 8 vigas riostra de la abscisa (K0+103.19 a K0+125.92)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se inicio con la con la instalación de 8 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+064.83 a K0+042.42)

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•El contratista de obra inicio con la actividad de excavación y conformación de la via del (Mod1 al Mod 10)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indígenas, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de las obras en cada uno de los tramos a intervenir.

**El día 6 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con el vaciado de concreto de 13 vigas riostra de la abscisa (K0+025.11 a K0+064.47)
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se inicio con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se inicio con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se continuo con la excavación de 7 vigas riostra de la abscisa (K0+039.47 a K0+020.10)
•Se continuo con la instalación de formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)
•Se continuo con la con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (k0+42.42 a K0+020.30)

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•El contratista de obra continuo con la actividad de excavación y conformación de la via del (Mod 10 al Mod 20), teniendo aprox 64 m de excavación y conformación de via.

**El día 7 de agosto de 2025:**

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**

•Se continuo con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+103.19)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+077.38 a K0+ 103.19)
•Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+077.38 a K0+ 103.19)
•Se continuo con la excavación de 9 vigas riostra de la abscisa (K0+128.95 a K0+150.43)

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**

•Se inicio con el vaciado de concreto en la cuneta y bordillo izq y der de la abscisa (K0+064.63 a K0+042.60)
•Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+42.42 a K0+020.30)
•Se continua con la instalación de 7 canastillas de las vigas riostra de la abscisa (K0+039.47 a K0+020.10)

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

•El contratista de obra inicia con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular del (Mod 1 al Mod 10)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:

***Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuará con el vaciado de concreto de la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se continuará con la instalación de formaleta para la huella izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se continuará con el vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con el vaciado de concreto de huella izq y der
•Se continuará con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la rampa de acceso final
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa de acceso final.
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la rampa de acceso final.

***Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se continuará con la instalación de formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con la instalación de formaleta para la huella izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se continuará con la excavación de vigas riostra
•Se iniciará con la excavación de la entrada al predio izq
•Se iniciará con el vaciado de concreto de vigas riostra
•Se continuará con el vaciado de concreto de la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se continuará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la entrada al predio izq
•Se iniciará con el vaciado de concreto para la entrada al predio izq
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se iniciará con la excavación de placa pequeña
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de la placa pequeña

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•Se continuará con la actividad de extendida, nivelación y compactación del Material Subbase Granular
•Se iniciará con la actividad de instalación de formaleta para la huella izq y der
•Se iniciará con la excavación de vigas riostra
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se iniciará con la instalación de las canastillas de las vigas riostra
•Se iniciará con el vaciado de concreto de la huella izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto de vigas riostra
•Se iniciará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se iniciará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se iniciará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se iniciará con la instalación de la formaleta para la piedra pegada

Se programará reunión Socio Ambiental en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio, el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-F.R-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/08/25 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL). (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 18 del 08/08/25 al 14/08/25 — Último Informe Semanal SI

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108** | | |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 | | |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 | | |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 | | |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165** | | |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 | | |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 | | |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 | | |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 | | |
| Tramo 5 - La Y | 60 | | |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305** | | |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | | |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | | |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





**TRAMO 3 LA QUEBRADA**





**TRAMO 2 EL AGUACATE**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general. | |
| Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto. | FIRMA |
| Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra. | NOMBRE: GIBRSON POLOCHE MOSQUERA |
| Demás actividades referidas en los documentos contractuales. | Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 22/08/25 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 19 del 15/08/25 al 21/08/25 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108 m** |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165 m** |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 |
| Tramo 5 - La Y | 60 |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305 m** | **PLACA HUELLA** | **344.83 m** |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | Tramo 1 - La Escuela | 130 |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | Tramo 2 - El Aguacate | 64.83 |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 150 |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0.90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espesor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.20 m reforzados con varilla de 3/8" y fijes cada 0.25 m de 1/4"; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para los Municipios de Marmato, Anserma y Filadelfia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 305 m – 3 tramos

Camino Ancestral: 1273 m – 10 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS DP | | |
| **INTEGRANTES:** | PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L SAS participación del 90% - DMI INGENIERIA SAS participación del 10% | | |
| **CONTRATO No.** | 29102024-1472 | **VALOR INICIAL:** | $ 898,043,437.75 |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/11/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 898,043,437.75 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/06/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ - |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 31 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2252 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 898,980,476.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285,000,000.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1,284,980,476.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 01/01/26 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 898,043,437.75 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | $ - | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 898,043,437.75 | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000.00 | $ 605,980,476 | $ 100,000,000 | $ 159,528,013 | $ 285,000,000.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081.35 | $ 558,326,382 | $ 49,688,494 | $ 36,687,023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,918.65 | $ 47,652,094 | $ 50,311,506 | $ 122,840,990 | $ 285,000,000.00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 879,413,460.23 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 229,095,556.31 | 25.99% |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 222,109,029.16 | 25.26% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (6,400,526.15) | -0.73% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 18,629,977.52 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | 18,629,977.53 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ - | 0.00% |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (18,629,977.53) | -100.00% |
| TOTAL INVERSION : | $ 898,043,437.75 | |
| TOTAL INVERSION PROGRAMADA: | $ 247,189,535.84 | 27.53% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 222,109,029.16 | 24.73% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ (25,080,506.68) | -2.79% |
| INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 36,671,541.29 | 4.17% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 29,097,167.66 | 2.74% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoría y la gobernación de caldas el 31 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Obras DP tuvo fecha de reinicio el 31 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,217,704,011.29 | 94.76% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,053,144,240.47 | 81.96% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** la Interventoria iniciara con la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No contrato de Obra No 29102024-1472

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4.741564287 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420,159,864 |
| **Amortizado $** | 420,159,864 |
| **Saldo $** | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 25.99%
Meta Física Ejecutada %: 25.26%
Avance o Atraso Físico %: -0.73%

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| PLACA HUELLA | m | 305 | 305 | |
| CAMINO ANCESTRAL | m | 1273 | 1273 | |
| | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 9.00 | 300.00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | N/A | N/A | 175.20 | | 175.20 | 57.44% |
| Ejec | N/A | N/A | 166.83 | | 166.83 | 54.70% |
| Prog | 517.57 | 9.19 | N/A | | 526.76 | 41.38% |
| Ejec | | | N/A | | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | 1 |
| Compactador manual | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CARTAMA | CAMINO ANCESTRAL | 1108 | 517.57 | | ATRASO | 46.71% | Se presenta un atraso del 46,71 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 2: LA SOLEDAD | CAMINO ANCESTRAL | 165 | 9.19 | | ATRASO | 5.57% | Se presenta un atraso del 5,57 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 3: ANSEA | PLACA HUELLA | 305 | 175.20 | 166.83 | ATRASO | 2.74% | Se presenta un atraso del 2,74 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 22/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 19 del 15/08/25 al 21/08/25 | Último Informe Semanal SI

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACION: | POR DEFINIR | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |
| UBICACION: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |

El Contratista de obra CONSORCIO OBRAS DP a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO: | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP)

**OBSERVACIONES:** El miércoles 21 de agosto de 2025 se realizó mesa de trabajo entre los pares Socio Ambiental de la Supervisión de Sostenibilidad, el Contratista de Obra y la Interventoría, con el objetivo de dar aclaraciones sobre el estado actual de la elaboración y presentación de los documentos PAGA, de parte del contratista y, de la interventoría, a la cual se da alcance con las siguientes observaciones o requerimientos:
•Se tiene la entrega de los documentos PAGA, para el día 10 de septiembre de 2025.
•Asistieron profesionales diferentes a los aprobados por la interventoría y, por tanto, se solicita la remisión de las hojas de vida correspondientes, para proceder de conformidad, acorde a las obligaciones contractuales de las partes.
•En atención a la orientación dada por la Gestora ambiental de la SS del INVIAS, se solicita que el manejo de los residuos RESPEL sigan bajo custodia del contratista y, se vayan acopiando en la medida de su uso en obra y, sean acopiados en la oficina SAU del contratista, hasta que tenga el volumen suficiente, para su entrega a un Gestor de RESPEL legal, o se informe la adecuada disposición final que realizará para su manejo en la obra.
•Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información de la lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información ambiental y social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.

Así mismo, se aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, "Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades", expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, por tanto, pueden colaborar igualmente con el contratista, por medio del Coordinador Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega.

La anterior información es para ratificación de los relevantes de los compromisos adquiridos en los ajustes de los documentos PAGA en los tiempos concertados en la reunión y, se de claridad de parte del contratista, respecto a los profesionales ambiental y social, que estarán atendiendo la obra, para los componentes ambiental y social, en un lapso de tres días hábiles, una vez recibido el presente comunicado.

## V. GESTION SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 12 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 8 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** el miércoles 21 de agosto de 2025 se realizó mesa de trabajo entre los pares Socio Ambiental de la Supervisión de Sostenibilidad, el Contratista de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual de la elaboración del documento PAGA

## VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N /A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N /A
AVALUOS APROBADOS: N /A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N /A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El día 15 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indígena de Ansea:**

**Tramo 3 – La Quebrada (PH = 150 m)**
•Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en los módulos de la abscisa (K0+103.36 a K0+147.74)
•Se inicio con el relleno detrás de los bordillos con material de excavación de la abscisa (K0+000 a K0+150.43)

**Tramo 2 – El Aguacate (PH = 64.83 m)**
•Se continuo con el vaciado de concreto de 15 vigas riostra de la abscisa (K0+042.42 a K0+064.83)
•Se inicio con el relleno detrás de los bordillos con material de excavación de la abscisa (K0+000 a K0+64.83)

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•Se continuo con el vaciado de concreto de la huella izq y der de la abscisa (K0+031.76 a K0+057.15)
•Se continuo con el vaciado de concreto de 8 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+034.76 a K0+057.34)

**El día 16 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indígena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+022.13 a K0+031.55)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+022.13 a K0+031.55)
•Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+015.72 a K0+031.55)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+015.72 a K0+031.55)
•Se continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+070.16 a K0+100).

**El día 19 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indígena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•Se inicio con el vaciado de concreto de la cuneta der de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
•Se inicio con el vaciado de concreto de la cuneta izq de la abscisa (K0+006.11 a K0+031.55)
•Se continuo con el vaciado de concreto de las vigas de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+031.76).
•Se continuo con la actividad de excavación y conformación de la vía de la abscisa (K0+100 a K0+130).
•En horas de la tarde se continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación de los 15 cm de Material Subbase Granular de la abscisa (K0+070.16 a K0+100).

En horas de la mañana se realizó reunión técnica en las instalaciones de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la participación de la Supervisora del Convenio y la Interventoría, con el objetivo de revisar el estado actual del contrato de Interventoría y verificar las funciones de cada uno de los profesionales de este contrato.

**El día 20 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indígena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
•Por parte de la Interventoría se realizó la toma de las densidades por el método del cono y arena en este tramo.
•Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)
•Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+031.76 a K0+050.74)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones de la secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con la participación de la Supervisora del Convenio del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Supervisor del Contrato de obra, los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar el avance de las actividades de obra.

**El día 21 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indígena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

•Se continuo con la instalación de la formaleta para la huella izq y der de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
•Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
•Se continuo con la excavación de 3 vigas riostra de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96)
•Se continuo con la instalación de la canastilla en las 3 vigas riostra excavadas de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

•Se continuará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
•Se continuará con el vaciado de concreto de cuneta izq y der
•Se continuará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
•Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
•Se continuará con el vaciado de concreto de huella izq y der
•Se continuará con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
•Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
•Se continuará con la excavación de las vigas riostra
•Se continuará con la instalación de la canastilla de la viga riostra
•Se continuará con el vaciado de concreto de las vigas riostra

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108** | | |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 | | |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 | | |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 | | |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165** | | |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 | | |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 | | |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 | | |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 | | |
| Tramo 5 - La Y | 60 | | |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305** | | |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | | |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | | |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 22/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 19 del 15/08/25 al 21/08/25 Último Informe Semanal SI

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



TRAMO 3 LA QUEBRADA



TRAMO 2 EL AGUACATE



TRAMO 1 LA ESCUELA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PAI/AS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 29/08/25 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 20 del 22/08/25 al 28/08/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108 m** |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165 m** |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 |
| Tramo 5 - La Y | 60 |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305 m** | **PLACA HUELLA** | **344.83 m** |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | Tramo 1 - La Escuela | 130 |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | Tramo 2 - El Aguacate | 64.83 |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 150 |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0.90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espesor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.20 m reforzados con varilla de 3/8'' y fijes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para los Municipios de Marmato, Anserma y Filadelfia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 305 m – 3 tramos

Camino Ancestral: 1273 m – 10 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS DP | | |
| **INTEGRANTES:** | PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L SAS participación del 90% - DMI INGENIERIA SAS participación del 10% | | |
| **CONTRATO No.** | 29102024-1472 | **VALOR INICIAL:** | $ 898,043,437.75 |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/11/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 898,043,437.75 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ - |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 31 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2552 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 898,980,476.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285,000,000.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1,284,980,476.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 01/01/26 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 898,043,437.75 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | $ - | $ 214,986,728.00 |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 898,043,437.75 | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000.00 | $ 605,980,476 | $ 100,000,000 | $ 159,528,013 | $ 285,000,000.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081.35 | $ 558,326,382 | $ 49,688,494 | $ 36,687,023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,918.65 | $ 47,652,094 | $ 50,311,506 | $ 122,840,990 | $ 285,000,000.00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 879,413,460.23 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 265,231,099.61 | 30.16% |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 236,319,736.65 | 26.87% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (28,911,362.96) | -3.29% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 18,629,977.52 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | 18,629,977.53 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ 18,629,977.53 | 100.00% |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ (0.00) | 0.00% |
| TOTAL INVERSION : | $ 898,043,437.75 | |
| TOTAL INVERSION PROGRAMADA: | $ 283,861,077.13 | 31.61% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 236,319,736.65 | 26.31% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ (47,541,340.48) | -5.29% |
| INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 60,503,646.06 | 6.88% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 14,210,707.48 | 1.62% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 22 de agosto de 2025
PERIODO FACTURADO: 27 de noviembre de 2024 al 13 de Agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 214,986,728.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoria y la gobernación de caldas el 31 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoria a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Obras DP tuvo fecha de reinicio el 31 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,229,477,392.61 | 95.68% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,071,867,877.01 | 83.42% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** la Interventoria iniciara con la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No contrato de Obra No 29102024-1472

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4.535668041 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420,159,864 |
| **Amortizado $** | 420,159,864 |
| **Saldo $** | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 30.16%
Meta Física Ejecutada %: 26.87%
Avance o Atraso Físico %: -3.29%

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| PLACA HUELLA | m | 305 | 305 | |
| CAMINO ANCESTRAL | m | 1273 | 1273 | |
| | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 9.00 | 300.00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | N/A | N/A | 182.82 | | 182.82 | 59.94% |
| Ejec | N/A | N/A | 177.51 | | 177.51 | 58.20% |
| Prog | 522.90 | 9.19 | N/A | | 532.09 | 41.80% |
| Ejec | | | N/A | | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | 1 |
| Compactador manual | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CARTAMA | CAMINO ANCESTRAL | 1108 | 522.90 | | ATRASO | 47.19% | Se presenta un atraso del 47,19 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 2: LA SOLEDAD | CAMINO ANCESTRAL | 165 | 9.19 | | ATRASO | 5.57% | Se presenta un atraso del 5,57 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 3: ANSEA | PLACA HUELLA | 305 | 182.82 | 177.51 | ATRASO | 1.74% | Se presenta un atraso del 1,74 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 29/08/25 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 20 del 22/08/25 al 28/08/25 | Último Informe Semanal SI

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACION: | POR DEFINIR | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |
| UBICACION: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |

El Contratista de obra CONSORCIO OBRAS DP a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO: | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP)

**OBSERVACIONES:** El martes 26 de agosto de 2025 mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-021 se da alcance a la reunión socio ambiental 21/08/2025 entrega documentos paga y solicitud de aclaracion profesionales ambiental y social contratista. Del alcance se tienen las siguientes observaciones o requerimientos:

- Se tiene la entrega de los documentos PAGA, para el dia 10 de septiembre de 2025.
- Asistieron profesionales diferentes a los aprobados por la interventoria y, por tanto, se solicita la remisión de las hojas de vida correspondientes, para proceder de conformidad, acorde a las obligaciones contractuales de las partes.
- En atención a la orientación dada por la Gestora ambiental de la SS del INVIAS, se solicita que el manejo de los residuos RESPEL, sigan bajo custodia del contratista y, se vayan acopiando en la medida de su uso en obra y, sean acopiados en la oficina SAU del contratista, hasta que tenga el volumen suficiente, para su entrega a un Gestor de RESPEL legal, o se informe la adecuada disposición final que realizará para su manejo en la obra.
- Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información de la lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información ambiental y social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.

La anterior información es para ratificación de los relevantes de los compromisos adquiridos en los ajustes de los documentos PAGA en los tiempos concertados en la reunión y, se de claridad de parte del contratista, respecto a los profesionales ambiental y social, que estarán atendiendo la obra, para los componentes ambiental y social, en un lapso de tres días hábiles, una vez recibido el presente comunicado.

## V. GESTION SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 12 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 8 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** La profesional del contratista de obra se encuentra subsanando las observacions al documento PAGA, el cual sera entregado el dia 10 de septiembre de 2025.

## VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N /A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N /A
AVALUOS APROBADOS: N /A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N /A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El dia 22 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
-Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)
-Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)
-Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta izq de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)
-Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq de la abscisa (K0+050.94 a K0+066.76)

**El dia 25 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
-El Contratista de Obra no realizó ninguna actividad de obra, debido a problemas con la llegada del material.
-Se realizaron actividades de limpieza del acero

**El dia 26 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
-Se continuo con el vaciado de concreto de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+031.76 a K0+057.15)
-Se continuo con el vaciado de concreto de las vigas de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+034.76 a K0+057.34).
-Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
-Se continuo con el vaciado de concreto de 3 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96)
-Por parte del Contratista de Obra se tomaron las muestras del concreto (cilindros) vaciado en huellas y cuneta.

**El dia 27 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
-Se continuo con el vaciado de concreto de la cuneta izq y derecha de la abscisa (K0+057.34 a K0+066.76)
-Se continuo con el vaciado de concreto de las vigas de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+060.34 a K0+066.96).
-Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90) y de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
-Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90) y de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
-Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90) y de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
-Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
-Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
-Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
-Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+002.90 a K0+002.70)
-Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo (K0+002.90 a K0+002.70)

En horas de la mañana se realizó reunión en las instalaciones del CRIDEC, con la participación de los Gobernadores de los Resguardos Indigenas, el Instituto Nacional de Vias (INVIAS), el Supervisor del Contrato de Obra (Secretaria de Infraestructura de Gobernación de Caldas), los Contratistas de Obra y la Interventoría, con el objetivo de revisar los compromisos adquiridos por todas las partes el dia 5 de agosto de 2025, así mismo evaluar el estado actual de las actividades de obra.

**El dia 28 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
-Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
-Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
-Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+066.96 a K0+073.16)
-Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+069.96 a K0+073.36)
-Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo de la abscisa (K0+069.96 a K0+073.36)
-Se continuo con el vaciado de concreto de 2 vigas riostra (2.70 de largo) de la abscisa (K0+069.96 a K0+073.36)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

-Se continuará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
-Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
-Se continuará con el vaciado de concreto de cuneta izq y der
-Se continuará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
-Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
-Se continuará con el vaciado de concreto de huella izq y der
-Se continuará con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
-Se continuará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
-Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
-Se continuará con la excavación de las vigas riostra
-Se continuará con la instalación de la canastilla de la viga riostra
-Se continuará con el vaciado de concreto de las vigas riostra

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108** | | |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Idlesia | 217 | | |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 | | |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 | | |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165** | | |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 | | |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 | | |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 | | |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 | | |
| Tramo 5 - La Y | 60 | | |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305** | **200.00** | |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | | |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | 50.00 | |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | 150.00 | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 29/08/25<br>(Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 20 del 22/08/25 al 28/08/25 Último Informe Semanal SI

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



TRAMO 3 LA QUEBRADA



TRAMO 2 EL AGUACATE



TRAMO 1 LA ESCUELA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación general.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 05/09/25 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 21 del 29/08/25 al 04/09/25 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):**

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108 m** |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | |
|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165 m** |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 |
| Tramo 5 - La Y | 60 |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| Meta Física Original | | Meta Física Actualizada | |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305 m** | **PLACA HUELLA** | **344.83 m** |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | Tramo 1 - La Escuela | 130 |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | Tramo 2 - El Aguacate | 64.83 |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 150 |

**DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

**PLACA HUELLA**

El sistema consiste en la colocación de 2 franjas delgadas de placas de concreto de resistencia F'c = 21 MPa, separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0.90 m cada una y espesor de 0.15 m, reforzadas con varillas de acero de 3/8" en ambos sentidos separadas cada 0.20 m, en medio de las huellas se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada a la vista de ancho 0.90 m y 0.15 m de espesor y en los tramos donde el terreno lo permita se tendran sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. La longitud de estos módulos varia entre 2.50 y 3.00 m de luz libre. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras de sección de 0.20 x 0.25 m, reforzada con 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.25 m y lateralmente por berma cunetas en concreto de 0.55 m de placa de luz libre en planta reforzada con varilla de 3/8" en ambos sentidos con separación de 0.20 m, y bordillo de concreto de 0.15 x 0.30 reforzado longitudinalmente por 2 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" separados cada 0.20 m.

**CAMINOS ANCESTRALES**

La estructura corresponde a una losa de Concreto Hidráulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada No 5, confinada por unos dentellones de sección de 0.10 x 0.20 m reforzados con varilla de 3/8'' y fijes cada 0.25 m de 1/4''; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la base; y anchos sugeridos de 1.5 y 2.0 m.

De acuerdo a la descripción anterior para los Municipios de Marmato, Anserma y Filadelfia la longitud total (m) a ejecutar en cada diseño tipo es la siguiente:

Placa Huella: 305 m – 3 tramos

Camino Ancestral: 1273 m – 10 tramos

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS DP | | |
| **INTEGRANTES:** | PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L SAS participación del 90% - DMI INGENIERIA SAS participación del 10% | | |
| **CONTRATO No.** | 29102024-1472 | **VALOR INICIAL:** | $ 898,043,437.75 |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/11/2024 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/12/2024 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 898,043,437.75 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 30/09/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ - |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 2** | DEL 30 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES**

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN 1:** | DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025 |
| **REANUDACION 1:** | 31 DE JULIO DE 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **INTEGRANTES:** | 35% CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S , 25% EC CONSULTORIA S.A.S, 20% BESTUTEC S.A.S, 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S | | |
| **CONTRATO No.** | 2552 DE 2021 | **VALOR INICIAL:** | $ 898,980,476.00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/03/2022 | **VALOR ADICIONES:** | $ 285,000,000.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:** | 31/07/2022 | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1,284,980,476.00 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** | 01/10/2025 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **VALOR AMORTIZADO:** | $ 420,159,864.00 |
| | | **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ - |

**PRORROGAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1** | DEL 31 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRORROGA 2** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| **PRORROGA 3** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 |
| **PRORROGA 4** | DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 5** | DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 6** | DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 7** | DEL 1 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 1:** | DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 | **FECHA DE REANUDACIÓN 1:** | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 2:** | DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024 | **FECHA DE REANUDACIÓN 2:** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUSPENSIÓN 3 :** | DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION 3:** | DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | **FECHA DE REANUDACIÓN 3:** | 1 DE JULIO DE 2025 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | | | $ 898,043,437.75 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | $ - | $ 214,986,728.00 |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | $ 898,043,437.75 | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 394,000,000.00 | $ 605,980,476 | $ 100,000,000 | $ 159,528,013 | $ 285,000,000.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 282,124,081.35 | $ 558,326,382 | $ 49,688,494 | $ 36,687,023 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 111,875,918.65 | $ 47,652,094 | $ 50,311,506 | $ 122,840,990 | $ 285,000,000.00 |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 879,413,460.23 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 325,754,745.67 | 37.04% |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 247,642,850.40 | 28.16% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (78,091,915.27) | -8.88% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| VALOR TOTAL OTRAS INVERSIONES: | $ 18,629,977.52 | |
| OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS ACUMULADA: | $ 18,629,977.52 | 100.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS: | $ 18,629,977.52 | 100.00% |
| AVANCE O ATRASO DE OTRAS INVERSIONES: | $ - | 0.00% |
| TOTAL INVERSION : | $ 898,043,437.75 | |
| TOTAL INVERSION PROGRAMADA: | $ 344,384,723.20 | 38.35% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 247,642,850.40 | 27.58% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ (96,741,872.80) | -10.77% |
| INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 60,503,646.06 | 6.88% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11,995,646.91 | 1.29% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 22 de agosto de 2025
PERIODO FACTURADO: 27 de noviembre de 2024 al 13 de Agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 214,986,728.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** La información registrada en el cuadro anterior corresponde a la reprogramación No 2 de obra entregada por el contratista el 2 de julio de 2025 y posteriormente aprobada por la interventoría y la gobernación de caldas el 31 de julio de 2024 y conforme a esta reprogramación se iniciará a realizar el seguimiento de avance de obra y reporte de los informes semanales de interventoría a la entidad contratante y comités de obra realizados.

El Contratista de Obra Consorcio Obras DP tuvo fecha de reinicio el 31 de julio de 2025.

**INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1,239,568,862.32 | 96.47% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1,090,591,513.55 | 84.87% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 18,723,636.54 | 1.46% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**OBSERVACIONES:** la Interventoria iniciara con la solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento de contrato de Obra No contrato de Obra No 29102024-1472

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | 4.403888906 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 420,159,864 |
| **Amortizado $** | 420,159,864 |
| **Saldo $** | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37.04% | Avance o Atraso Físico %: -8.88%
Meta Física Ejecutada %: 28.16%

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | gl | 3 | 3 | |
| PLACA HUELLA | m | 305 | 305 | |
| CAMINO ANCESTRAL | m | 1273 | 1273 | |
| | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Resguardo 1 | Resguardo 2 | Resguardo 3 | | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 9.00 | 300.00% |
| Ejec | | | | | | |
| Prog | N/A | N/A | 182.82 | | 182.82 | 59.94% |
| Ejec | N/A | N/A | 177.51 | | 177.51 | 58.20% |
| Prog | 522.90 | 9.19 | N/A | | 532.09 | 41.80% |
| Ejec | | | N/A | | | |
| Prog | | | | | | |
| Ejec | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Tanque irrigador | 1 | 1 |
| Retroexcavadora | 1 | 1 |
| Vibrocompactador | 1 | |
| Compresor | 1 | 1 |
| Compactador manual | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Volqueta | 1 | 1 |
| **Total** | 7 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

| | | META | PROGRAMADO | EJECUTADO | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO 1: CARTAMA | CAMINO ANCESTRAL | 1108 | 522.90 | | ATRASO | 47.19% | Se presenta un atraso del 47,19 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 2: LA SOLEDAD | CAMINO ANCESTRAL | 165 | 9.19 | | ATRASO | 5.57% | Se presenta un atraso del 5,57 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |
| RESGUARDO 3: ANSEA | PLACA HUELLA | 305 | 182.82 | 177.51 | ATRASO | 1.74% | Se presenta un atraso del 1,74 %, debido a que no se iniciaron las actividades en la fecha establecida, falta de personal en la zona dificultad en el desplazamiento por la lejanía de los tramos y por las condiciones climaticas. |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 05/09/25 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 21 del 29/08/25 al 04/09/25 | Último Informe Semanal SI

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACION: | POR DEFINIR | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |
| UBICACION: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | x |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x |

El Contratista de obra CONSORCIO OBRAS DP a la fecha del presente informe semanal no ha subsanado las observaciones remitidas por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO: | SI | x | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | x |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | x |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES**:
El contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP) no ha presentado ubicación de zonas de deposito para sobrantes de excavación.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO: En subsanación por parte del Contratista de obra (CONSORCIO OBRAS DP)

**OBSERVACIONES:** El martes 26 de agosto de 2025 mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-021 se da alcance a la reunión socio ambiental 21/08/2025 entrega documentos paga y solicitud de aclaracion profesionales ambiental y social contratista. Del alcance se tienen las siguientes observaciones o requerimientos:

- Se tiene la entrega de los documentos PAGA, para el dia 10 de septiembre de 2025.
- Asistieron profesionales diferentes a los aprobados por la interventoria y, por tanto, se solicita la remisión de las hojas de vida correspondientes, para proceder de conformidad, acorde a las obligaciones contractuales de las partes.
- En atención a la orientación dada por la Gestora ambiental de la SS del INVIAS, se solicita que el manejo de los residuos RESPEL, sigan bajo custodia del contratista y, se vayan acopiando en la medida de su uso en obra y, sean acopiados en la oficina SAU del contratista, hasta que tenga el volumen suficiente, para su entrega a un Gestor de RESPEL legal, o se informe la adecuada disposición final que realizará para su manejo en la obra.
- Entre los profesionales del contratista y el Coordinador ambiental del CRIDEC, revisaran la información de la lista de chequeo de observaciones del documento PAGA V2, con el fin de identificar cual es la información ambiental y social que tiene salvaguardas, y sea certificado por la autoridad del resguardo y, facilitar la que no tiene restricción.

La anterior información es para ratificación de los relevantes de los compromisos adquiridos en los ajustes de los documentos PAGA en los tiempos concertados en la reunión y, se de claridad de parte del contratista, respecto a los profesionales ambiental y social, que estarán atendiendo la obra, para los componentes ambiental y social, en un lapso de tres días hábiles, una vez recibido el presente comunicado.

## V. GESTION SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 12 | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 4 | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 8 | - |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | - |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Sin definir

**OBSERVACIONES:** La profesional del contratista de obra se encuentra subsanando las observacions al documento PAGA, el cual sera entregado el dia 10 de septiembre de 2025.

## VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N /A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N /A
AVALUOS APROBADOS: N /A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N /A

**OBSERVACIONES:**
Para la ejecución del contrato de obra no se requiere la compra de predios, por este motivo no es necesario realizar fichas prediales ni avalúos.

## VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD EN EL PRESENTE CONTRATO

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**El dia 29 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

-Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
-Se continuo con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90) de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
-Se continuo con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90 en la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
-Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+076.37 a K0+076.57)
-Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo de la abscisa (K0+076.37 a K0+076.57)

**El dia 30 de agosto de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

-Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
-Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)
-Se continuo con el vaciado de concreto en la huella izq y der de la abscisa (K0+073.36 a K0+076.37)

**El dia 1 de septiembre de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**
Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)

-Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der e izq de la abscisa (K0+066.96 a K0+076.37)
-Se continuo con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo der e izq de la abscisa (K0+066.96 a K0+076.37)

**Resguardo Indigena de Cartama:**

**Tramo Monte Redondo (CA = 587 m):**
-El Contratista de Obra en compañía de la Interventoria realizó el levantamiento de 20 actas de vecindad

**El dia 2 de septiembre de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**
-Se continuo con la actividad de extendida, nivelación y compactación de los 15 cm de Material Subbase Granular de la abscisa (K0+100 a K0+130).

**El dia 3 de septiembre de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)
-Se continuo con el vaciado de concreto en la cuneta der e izq de la abscisa (K0+066.96 a K0+076.37)

**El dia 4 de septiembre de 2025:**

**Resguardo Indigena de Ansea:**

**Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

-Se continuo con la instalación de la formaleta para la cuneta der e izq de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
-Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta der e izq de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
-Se continuo con el vaciado de concreto de la cuneta izq y der de la abscisa (K0+005.90 a K0+002.90)
-Se continuo con el vaciado de concreto de la viga riostra de la abscisa (K0+002.90 a K0+002.70)
-Se continuo con la instalación de la formaleta para el vaciado de concreto de la rampa de la abscisa (K0+002.70 a K0+000.2)
-Se continuo con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la rampa incluidas sus cunetas izq y der de la abscisa (K0+002.70 a K0+000.2)
-Se continuo con el vaciado de concreto de la rampa incluidas sus cunetas izq y der de la abscisa (K0+002.70 a K0+000.2)
-Se continuo con la excavación de la viga riostra de la abscisa (K0+000.20 a K0+000)
-Se continuo con la instalación de la canastilla de la viga riostra que se excavo (K0+000.20 a K0+000)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA:**

***Tramo 1 – La Escuela (PH = 130 m)**

-Se continuará con la instalación de la formaleta para la cuneta y bordillo izq y der
-Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la cuneta y bordillo izq y der
-Se continuará con el vaciado de concreto de cuneta izq y der
-Se continuará con la instalación de la formaleta para la huella izq y der
-Se continuará con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para la huella izq y der
-Se continuará con el vaciado de concreto de huella izq y der
-Se continuará con la instalación de la formaleta para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
-Se continuará con la colocación de piedras para el vaciado del concreto ciclópeo (a=0.90)
-Se continuará con el vaciado de concreto ciclópeo a=0.90
-Se continuará con la excavación de las vigas riostra
-Se continuará con la instalación de la canastilla de la viga riostra
-Se continuará con el vaciado de concreto de las vigas riostra

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

**RESGUARDO INDIGENA CARTAMA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **1108** | | |
| Tramo 1 - Centro Poblado San Juan Iglesia | 217 | | |
| Tramo 2 - Comunidad Jimenez Alto a Quebrada | 304 | | |
| Tramo 3 - Monterredondo | 587 | | |

**RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **CAMINO ANCESTRAL** | **165** | | |
| Tramo 1 - Sector el Filo | 25 | | |
| Tramo 2 - El Caserio | 25 | | |
| Tramo 3 - El Cartucho Cabecera | 30 | | |
| Tramo 4 - Cartucho Pie | 25 | | |
| Tramo 5 - La Y | 60 | | |

**RESGUARDO INDIGENA ANSEA**

| | META | EJEC | RELACION EJECUTADO / META |
|---|---|---|---|
| **PLACA HUELLA** | **305** | **214.83** | |
| Tramo 1 - La Escuela | 135 | | |
| Tramo 2 - El Aguacate | 61 | 64.83 | |
| Tramo 3 - La Quebrada (La Cancha) | 109 | 150.00 | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/09/25 (Día / Mes / Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | SEMANA No.: 21 del 29/08/25 al 04/09/25 | Último Informe Semanal SI ☐

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



RESGUARDO INDIGENA ANSEA - TRAMO 1 LA ESCUELA - PH



RESGUARDO INDIGENA CARTAMA - TRAMO MONTE REDONDO - CA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Realizar el seguimiento a las actividades que realice el contratista, basados en la programación generat.

Continuar con la revisión de documentos de acuerdo a los requerimientos contractuales del proyecto.

Realizar el seguimiento continuo al componente técnico, administrativo y financiero del contrato de obra.

Demás actividades referidas en los documentos contractuales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:

NOMBRE: GERSON POLOCHE MOSQUERA

Matrícula Profesional No.: 70202 128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** agosto-2025

**PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO No.** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **PARCIALIDAD INDIGENA ANSEA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA MEJORAMIENTO** | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Retroexcavadora | | | | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I |
| Compactador manual (SALTARIN) | | | | I | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I |
| Carrotanque de agua | | 1000 Galones | | I | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I |
| Estación Total | Foif - RTS – 102 | | | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Volqueta | | 8 m3 | | I | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mezcladora de concreto | | 1 bulto | | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | A | I | I | I | I | I | I | A | A | A | I | I | I |
| **PARA MANTENIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrotanque de agua | | 1000 Galones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motoniveladora | | 140HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibrocompactador | Dynapac | 10Ton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroexcavadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | **TOTAL ACTIVO** | | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | | **TOTAL EN REPARACIÓN** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **TOTAL INACTIVO** | | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 217 | 100 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 62 | 28,6% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 155 | 71,4% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** Durante el periodo del presente informe mensual solo se observo maquinaria para Mejoramiento

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: ABRAHAM JOSE ALVAREZ DIAZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 13202-175605

Firma Natalia Arcos G

Nombre: NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-355216 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CCF DE CALDAS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| **MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO | 9.103.138 | Director de Obra | $ 2.800.000 | X | X | | X | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | NUEVA EPS | | | PORVENIR | | | | N/A | N/A | |
| 2 | ABRAHAM JOSE ALVAREZ DIAZ | 9.097.330 | Residente de Obra | $ 2.400.000 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | SANITAS S.A. | | | PROTECCIÓN | | | | N/A | N/A | |
| 3 | KARLA VANESSA PATIÑO | 1.060.651.018 | Profesional SISO - Social | $ 1.800.000 | | X | | | X | | | X | | | | X | | X | | X | | | | X | | X | | | | X | | X | | X | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | NUEVA EPS | | | PORVENIR | | | | N/A | N/A | NO LABORO EN ESTE MES |
| 4 | EVELIN JULIANA PINZON VERA | 1.072.750.335 | Profesional Ambiental | $ 2.400.000 | | X | | | X | | | X | | | | X | | X | | X | | | | X | | X | | | | X | | X | | X | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | SANITAS S.A. | | | PROTECCIÓN | | | | N/A | N/A | |
| 5 | EDISON ALBERTO RESTREPO VELEZ | 1.054.920.528 | Inspector | $ 2.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | SALUD TOTAL | | | COLPENSIONES | | | | N/A | N/A | NO LABORO EN ESTE MES |
| 6 | FABIO ORDOÑEZ | 9.050.390 | Topografo | $ 3.000.000 | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | Independiente | | | V | | | | | | | | | | |
| 7 | JOHN CAMPOS MEDINA | 83.091.149 | Maestro | $ 1.423.500 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | NUEVA EPS CM | | | COLPENSIONES | | | | N/A | N/A | |
| | **PARCIALIDAD INDIGENA ANSEA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DIDIER MAURICIO BETANCUR | 1.059.699.602 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 2 | SAMUEL GOMEZ TREJOS | 1.088.825.924 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 3 | JORGUE AUGUSTO GONZALEZ | 1.109.420.902 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 4 | NEIDER ALEXANDER LADINO | 1.054.926.771 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 5 | GILDARDO LARGO | 15.918.414 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 6 | CRISTIAN ANDRES RENDON | 1.024.576.247 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 7 | LUCAS RODRIGUEZ GOMEZ | 1.056.123.436 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 8 | LUIS ROSENDO URIBE | 9.725.072 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |
| 9 | LUIS FELIPE URIBE | 1.087.985.706 | Ayudante de Obra | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | CONSORCIO OBRAS DP | | | V | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El Contratista de Obra Consorcio Obras DP para el periodo del presente informe mensual reporto los datos suministradis en este formato, sin embargo a corte del 31 de agosto de 2025 no presento la Planilla de seguridad social del personal Calificado y No Calificado (establecido en el anexo tecnico). Se comprometio a entregarlas el 11 de septiembre de 2025

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 13202-093546

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 29102024-1472

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**MES INFORME MENSUAL:** ago-25

**PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3500044375 | I.23-0094/001 REHABILITACION, MEJORAMIENOT Y MANTENIMI | 1 | Nación | Contrato Principal | $ 898.043.437,75 | $ 898.043.437,75 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 898.043.437,75 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 898.043.437,75**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar Gobernacion Caldas | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | $ 683.056.710 | $ 683.056.710 | | | | Condición inicial |
| 1 | Parcial de Obra | 27 de Noviembre de 2025 a 13 de Agosto de 2025 | $ 214.986.728 | | $ 214.986.728 | | | | | $ 683.056.710 | $ 468.069.982 | n/a | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ 683.056.710** | **$ 468.069.982** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 879.413.460,23 | | **$ 879.413.460,23** |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 8.500.000,00 | $ 1.615.000,00 | **$ 10.115.000,00** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 8.514.977,52 | | **$ 8.514.977,52** |
| **VALOR TOTAL** | $ 896.428.437,75 | $ 1.615.000 | **$ 898.043.438** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 13202-093546

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | | VERSIÓN | 1 |
| | | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No:** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

**PARCIALIDAD INDIGENA ANSEA**

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 248 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total horas** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:** El estado del tiempo se tomará desde las 07:00 horas hasta las 16:00

**OBSERVACIONES:**

En terminos generales se contó con un total de 248 horas sol en la zona del proyecto.

Firma
Nombre: ABRAHAM JOSE ALVAREZ DIAZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 13202-175605

Natalia Arcos G
Firma
Nombre: NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-355216 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)



**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.:** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** agosto-2025 **PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 16-063 | *Fecha de Ensayo: 1/08/2025 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA | INV E-161: 07 / E-150:07 / E-228: 07 | Resguardo Indigena Ansea - Tramo la Quebrada | 5 | % de Compactación en el terreno > = 95% "Según las especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 320-07 Numerales 320.5.2.2; el porcentaje de compactación de los materiales de Sub-base debe ser como mínimo Dm - (k*s) >= 0,95 De , según relación de densidad de campo contra densidad máxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V E - 142 - 07" |  | SI | |
| 1 | *Fecha de Ensayo: 8/08/2025 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA | I.N.V. E 161 - 13 | Resguardo Indigena Ansea - Tramo El Aguacate | 4 | % de Compactación en el terreno > = 95% "Según las especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 320-07 Numerales 320.5.2.2; el porcentaje de compactación de los materiales de Sub-base debe ser como mínimo Dm - (k*s) >= 0,95 De , según relación de densidad de campo contra densidad máxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V E - 142 - 07" |  | SI | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra CONSORCIO OBRAS DP realizó ENSAYO DE CBR CON CONO DINAMICO (PDC) el 28 de enero de 2024 en la Parcialidad Indigena Ansea, sin embargo para el periodo del presente informe mensual el Contratista no ha entregado los resultados.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 13202-093546

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**FECHA DE INICIO:** 27/11/2024

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 898.043.437,75

**VALOR ACUMULADO:** $ 898.043.437,75
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 8.500,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 8.500,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | 20% | $ 179.608.687,60 | 27 11 2024 | 27 6 2025 |
| Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo | 20% | $ 179.608.687,60 | 27 11 2024 | 27 6 2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | 20% | $ 179.608.687,60 | 27 11 2024 | 27 2 2028 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 30,00% | $ 269.413.031,40 | 5 AÑOS | 5 AÑOS |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 75-44-101140466

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 2/12/2024

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios Labores y Operaciones | 10% | $ 260.000.000,0 | 27 11 2024 | 27 2 2025 |
| Daño Emergente y Lucro Cesante | 10% | $ 260.000.000,0 | 27 11 2024 | 27 2 2025 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales | 10% | $ 260.000.000,0 | 27 11 2024 | 27 2 2025 |
| Contratistas y Subcontratistas | 10% | $ 260.000.000,0 | 27 11 2024 | 27 2 2025 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 10% | $ 260.000.000,0 | 27 11 2024 | 27 2 2025 |
| Vehiculos Propios y No Propios | 10% | $ 260.000.000,0 | 27 11 2024 | 27 2 2025 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 75-40-101052908 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 2/12/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 31 | 8 | 2025 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | 20% | $ 179.608.687,60 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 6 | 2025 |
| Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo | 20% | $ 179.608.687,60 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 6 | 2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | 20% | $ 179.608.687,60 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2028 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 20% | $ 179.608.687,60 | 5 AÑOS | | | 5 AÑOS | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 75-44-101140466

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predios Labores y Operaciones | 10% | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
| Daño Emergente y Lucro Cesante | 10% | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales | 10% | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
| Contratistas y Subcontratistas | 10% | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 10% | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
| Vehiculos Propios y No Propios | 10% | $ 260.000.000,00 | 27 | 11 | 2024 | 15 | 2 | 2025 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 75-40-101052908 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 29102024-1472 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**FECHA DE INICIO:** 27/11/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2252 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ NO ---X-- APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra no ha entregado el Plan de Calidad solicitado por la Interventoria mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-001 el 4 de diciembre de 2024 y reiterado mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-002 el 30 de enero de 2025

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO X ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO X ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra no presento ningun Programa de Auditoria

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ---X-- APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 2 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 2

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra realizo la toma de DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA y la toma de CILINDROS DE CONCRETO

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra no reporto ninguna no conformidad en el periodo del presente informe mensual

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación Total | Foif - RTS – 102 | A07229 | 26/07/2024 | 3339 - 26/07/2024 | 26/01/2025 | Precisión angular 5" seg |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

El Contratista de Obra no ha presentado el certificado de Calibraciòn de los equipos actualizado

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025
(Día) (Mes) (Año)

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma N/A | Firma | Firma N/A |
| Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO | Nombre: | Nombre: GERSON BOLOCHE MOSQUERA | Nombre: |
| Director de la Obra | Profesional en Calidad Contrato de Obra | Director de la Interventoría | Profesional en Calidad Contrato de Interventoría |
| Matrícula Profesional No. 13202-093546 | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No. 70202-128485 TLM | Matrícula Profesional No.: |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025

1 de(Día / Mes / Año) .

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** .....

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 29102024-1472 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | $ - | |
| 2 | | | | | | $ - | |
| 3 | | | | | | $ - | |
| N | | | | | | | |
| TOTAL | | $ - | | | | $ - | 0% |

CONSORCIO OBRAS DP NO HA ENTREGADO EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 29102024-1472 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** _____ **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** _____ **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CONSORCIO OBRAS DP NO HA ENTREGADO EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - |
| | TOTALES | $ - | | | $ - | $ - |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: _____
Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma: _____
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o Delegado
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**GOBERNACION DE CALDAS**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PROGRAMA DE INVERSIONES** 11

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 29102024-1472

**OBJETO:**
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC - (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDÍGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA- ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: 1,16 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 898.043.438,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 898.043.438,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 31/07/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 nov-24 | 2 Del 01 al 12 de Diciembre 2024 | Del 13 al 31 de Diciembre 2024 | 3 ene-25 | 4 feb-25 | 5 jul-25 | 6 ago-25 | 7 sep-25 | 8 Indicar mes y año | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO INDIGENA ANSEA | $436.053 | 49,58% | $32.362 | % P | 0,00% | 44,63% | 0,20% | 15,14% | 34,25% | 10,00% | 15,00% | 18,18% | | | | 100% |
| | | | | $ P | $0 | $392.447 | $1.750 | $133.136 | $301.186 | $87.941 | $131.912 | $159.877 | | | | |
| | | | | $ E | | | | | $32.362 | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | 9,58% | | | | | | | 75% |
| PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA | $397.473 | 45,20% | | % P | 0,00% | 40,68% | 0,38% | 2,94% | 41,88% | 7,00% | 12,00% | 20,36% | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $357.726 | $3.300 | $25.851 | $368.322 | $61.559 | $105.530 | $179.049 | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | 50% |
| PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD | $45.887 | 5,22% | | % P | 0,00% | 4,70% | 0,49% | 0,27% | 4,45% | 0,25% | 0,50% | 3,80% | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $41.299 | $4.350 | $2.388 | $39.150 | $2.199 | $4.397 | $33.418 | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | 25% |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | 0% |
| **VALOR BASICO DE OBRA ( A )** | **$ 879.413,46** | **100%** | | | | | REPROGRAMACION 1 | | | REPROGRAMACION 2 | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **0,00%** | **90,00%** | **1,07%** | **18,35%** | **80,58%** | **17,25%** | **27,50%** | **42,34%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$791.472** | **$9.400** | **$161.375** | **$708.638** | **$151.699** | **$241.839** | **$372.344** | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **90,00%** | **1,07%** | **19,42%** | **100,00%** | **30,16%** | **57,66%** | **100,00%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$791.472** | **$9.400** | **$170.775** | **$879.413** | **$265.231** | **$507.070** | **$879.413** | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **3,68%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$32.362** | **$0** | **$0** | **$0** | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **3,68%** | **3,68%** | **3,68%** | **3,68%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$32.362** | **$32.362** | **$32.362** | **$32.362** | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **Parcialidad Indígena La Soledad** | | | |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 2.500,00 | | **0,00%** |
| IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 475,00 | | **0,00%** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 382,16 | | **0,00%** |
| **Parcialidad Indígena Cartama** | | | |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 3.000,00 | | **0,00%** |
| IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 570,00 | | **0,00%** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 4.061,77 | | **0,00%** |
| **Resguardo Indígena Ansea** | | | |
| REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 3.000,00 | | **0,00%** |
| IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 570,00 | | **0,00%** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 4.071,04 | | **0,00%** |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 18.629,98** | | **0,00%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 898.043,44** | | **0,00%** |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | - - - - - - | ——— |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
**Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO**
**Representante legal o apoderado del Contratista**

Aprueba Firma:
**Nombre: Mario Cabrera Dussan**
**Representante legal o apoderado del Interventor**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/08/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 29102024-1472

**OBJETO:**
"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: 1,16 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 13/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 898.043.437,75 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 898.043.437,75

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | 1 / 11-2024 | 2 / Del 01 al 12 de Diciembre 2024 | Del 13 al 31 de Diciembre 2024 | 3 / ene-25 | 4 / feb-25 | 6 / Indicar mes y año | 7 / Indicar mes y año | 8 / Indicar mes y año | 9 / Indicar mes y año | 10 / Indicar mes y año N... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESGUARDO INDIGENA ANSEA | $436.052,67 | 49,58% | | % P | 0,00% | 44,63% | 0,20% | 15,14% | 34,25% | | | | | | 100% |
| | | | | $ P | $0,00 | $392.447,40 | $1.750,00 | $133.136 | $301.166,33 | | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | 75% |
| PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA | $397.473,35 | 45,20% | | % P | 0,00% | 40,68% | 0,38% | 2,94% | 41,88% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0,00 | $357.726,01 | $3.300,00 | $25.851,13 | $368.322,22 | | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | 50% |
| PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD | $45.887,44 | 5,22% | | % P | 0,00% | 4,70% | 0,49% | 0,27% | 4,45% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0,00 | $41.298,70 | $4.350,00 | $2.388 | $39.150 | | | | | | |
| | | | | $ E | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | 25% |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | 0% |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$ 879.413,46** | **100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | | | | | | | | | | | | | |

REPROGRAMACION 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **0,00%** | **90,00%** | **1,07%** | **18,35%** | **80,58%** | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$791.472** | **$9.400** | **$161.375** | **$708.638** | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **90,00%** | **1,07%** | **19,42%** | **100,00%** | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$791.472** | **$9.400** | **$170.775** | **$879.413** | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **Parcialidad Indigena La Soledad** | | | |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 2.500,00 | | 0,00% |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 475,00 | | 0,00% |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 382,16 | | 0,00% |
| **Parcialidad Indigena Cartama** | | | |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 3.000,00 | $ - | 0,00% |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 570,00 | $ - | 0,00% |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 4.061,77 | $ - | 0,00% |
| **Parcialidad Indigena Ansea** | | | |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) | $ 3.000,00 | $ - | 0,00% |
| *IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE) | $ 570,00 | $ - | 0,00% |
| *OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE) | $ 4.071,04 | $ - | 0,00% |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 18.629,98** | | **0,00%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B' )** | **$ 898.043,44** | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: MARIOCABRERA DUSSAN
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBIERNO DE CALDAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

CIUDAD Y FECHA: 12 - 08 - 2025 Manizales | HORA: 8:30 | AM am-pm | DURACIÓN: | LUGAR DEL EVENTO: INVIAS - Manizales

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☒ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☐ OTRO CUAL:

MODALIDAD: DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:

TEMA / ASUNTO: Mesa de reunion componentes Ambiental y Social contratos CRIDEC

FACILITADOR:

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO:

Por favor diligenciar con letra legible *Grupo Poblacional (1) Persona con discapacidad (2) NARP (3) Indígena (4) Menor de 18 años (5) Desmovilizados (6) Adulto Mayor (7) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Mig

| Nombre y apellido | Entidad/Dependencia | Cargo/Ocupación | Teléfono | Email | *Grupo Poblacional | Victima SI | Victima NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalina Cortazo | Consorcio Mar C | RES Socio Amb | 3012968064 | INFO mar@gmail.com | | | X |
| Viviana Angel Cuenteo | Consorcio OBDP | Social | 3175217731 | vivitangel@hotmail.com | | | X |
| Natalia Arcos L | Consorcio Ced | Residente Fot | 3118916990 | natalia.arcos320@gmail.com | | | X |
| Juan Carlos Giraldo Mejia | Depto Caldas | prof. univers | 3137150190 | jcgiraldo@caldas.gov.co | | | |
| Miguel Angel Vera Quiroga | Consorcio Obras OP | | 3228562367 | miguel-jk20@hotmail.com | | | X |
| Ruben Zabala | CVC 2024 | Sog Residente | 3134290999 | ruben.zabala.c@gmail.com | | | X |
| Andres Felipe Alzate Molina | CVC 2024 | Ing Ambiental | 3016665534 | andres.fanze@gmail.com | | | |
| Joliedth Lorena Cuaran Laurean | CVC 2024 | Trabajo Social | 3176000210 | joliedthlaurean3@gmail.com | indigena | | X |
| Beatriz Helena Ocampo | Invias | Esp. Ambiental | 3217690124 | beto.ocamp@gmail.com | | | X |
| Mª Victoria Rojas D. | INNOVA Proyect | Trab. Social | 3102065658 | mariavrojasd@gmail.com | | | X |
| Tatiana Ospina Cárdenas | INVIAS | Apoyo a Superv. | 3215868961 | tospina@invias.gov.co | | | X |
| Liliana Tibata C. | INVIAS | Supervisor | 3157679135 | ltibata@invias.gov.co | | | X |
| Laura Gonzalez Marin | Gobernacion | Sg. Social | 3135249081 | lgmgobernaciondecaldas@gmail.com | | | X |
| Belén Alexandra Cano Or | C.CEEFC Rural | Esp Ambiental | 3118182539 | Coordinador.pipma.UTC@gmail.com | | | X |
| Marta Rojas Vasquez | C. Fbc 2024 | Dep. Legal | 3225199 | consorciomanizales24@gmail.com | | | X |
| | | | | | | | |

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobe

FECHA: 21/08/2025
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 24
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 29102024-1472
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
"MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC - (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD- FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento al componente socio-ambiental al CONTRATO DE OBRA No 29102024-1472 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC - (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD- FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1.-Aclaraciones sobre la reunión ambiental y social
2.- Estado actual trazabilidad incumplimiento documentos PAGA COP No.29102024-1472 CONSORCIO OBRAS DP
3.- Atención dudas e inquietudes elaboración documento PAGA para los cuatro resguardos indígenas.
4.- Informes ambientales mensuales y, de Balance ambiental a la terminación del contrato de obra.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En atención a los compromisos concertados en el comité de la DT Caldas del día 12/08/2025, se realizó la reunión con las profesionales del área ambiental y Social: Ingeniera ambiental Evelin Juliana Pinzón – Trabajadora Social Karla Vanesa Patiño – Ingeniero Civil Miguel Ángel Vera, del CONSORCIO OBRAS DP contratista, Especialista Ambiental Belén Alexandra Cerón Q, Especialista Social Yina Andrea Bedoya - CONSORCIO CEEF interventoría –en el cual se establecieron las siguientes aclaraciones y, compromisos:

Los temas tratados fueron:
1.-Aclaraciones sobre la reunión ambiental y social
2.- Estado actual trazabilidad incumplimiento documentos PAGA COP No.29102024-1472 CONSORCIO OBRAS DP
3.- Atención dudas e inquietudes elaboración documento PAGA para los cuatro resguardos indígenas.
4.- Informes ambientales mensuales y, de Balance ambiental a la terminación del contrato de obra.

Desarrollo de la reunión:

1.- Aclaraciones realizadas por las profesionales de la Interventoría:
• La reunión con el acompañamiento de las gestoras ambiental y social con los contratistas de obra y la interventoría, se realiza a solicitud de la Gestora técnica Ingeniera Liliana Tibatá, en el comité socioambiental del 12/08/2025 en la DT Caldas, dado que no se han aprobado por la interventoría, los documentos PAGA presentados por los contratistas. La Doctora Marcela Bermeo gestora social de la SS del INVIAS, escribió a la Gestora Técnica que las profesionales ambiental y social, no asistiría a las reuniones solicitadas, hasta que el documento PAGA sea aprobado por la Interventoría, en el marco de sus funciones y la normativa vigente, ya que no hay documento PAGA terminado para poder pronunciarse.

• La interventoría informa que, los profesionales ambiental y social del CONSORCIO OBRAS DP que están presentes en la reunión, no son los aprobados por la interventoría, no obstante, se aceptó que participen en la reunión siempre y cuando el contratista garantice su idoneidad y, posterior a la reunión se realizará la verificación de las hojas de vida.

• El contratista manifiesta que los cambios de los profesionales, es en consecuencia de las suspensiones que ha sufrido el contrato.

2.- Estado actual trazabilidad incumplimiento documentos PAGA COP No.29102024-1472 CONSORCIO OBRAS DP.

• La interventoría manifiesta su preocupación, ya que la obra tiene un plazo acumulado de 4,5 meses, con fecha de vencimiento prorrogados al 30 de septiembre del presente y, a la fecha, se tienen tres apremios por incumplimiento reiterado, a pesar de que se ha invitado a mesas de trabajo a los profesionales del contratista, estos no han asistido.

Está pendiente que se subsane las observaciones realizadas al último documento PAGA presentado por el contratista, que va en la Versión No.1, realizadas por la interventoría para los componentes ambiental y social, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-009 del 06 de febrero de 2025, donde se tiene como relevantes: no se tiene identificado el nivel de complejidad de la obra acorde a la metodología de la GMAMC 2022, sin permisos mineros y ambientales para la implementación de la obra, ni actas de radicación, ni planes de inversión, ambiental y social y, otras observaciones puntuales, relacionadas en el oficio. La trazabilidad del incumplimiento se relaciona en el oficio con nuevo apremio No. INV-CIC-2252-2021-MFA- 017 del 4 de agosto de 2025.
• Ante la solicitud del contratista de presentar un solo documento PAGA para los tres resguardos indígenas, se recordó que deben presentarse un documento PAGA, por resguardo objeto de intervención, previa consulta realizada cuando inicio el convenio, con las coordinadoras ambiental y social de la SS del INVIAS y, ratificado en la reunión de la DT Caldas del 12/08/2025.
• La profesional social de la Interventoría informa igualmente que, a pesar delo requerimientos realizados al contratista, para la elaboración de los documentos PAGA, hay vacío de información en el área social de los resguardos, documentos sin diligenciamientos firmas y afines, entonces no se puede aprobar un PAGA formulado incompleto.
El otro problema ha sido, la variación de los profesionales que asisten a las reuniones, son diferentes y no hay un responsable del documento.
• A lo cual el contratista manifiesta las dificultades para conseguir la información de los resguardos y los permisos en los mismos.
• El contratista ha presentado documentos incompletos o vencidos de proveedores de materiales de construcción y, está pendiente de subsanación, No obstante, se le recordó que hacen parte del documento PAGA.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

3.- Atención dudas e inquietudes de parte de la interventoría, para la elaboración documento PAGA para los cuatro resguardos indígenas.

Se socializa el documento PAGA V1 presentado por el contratista y, como lo ha manifestado la interventoría, no cumple por las siguientes razones:

a.-Se presenta un solo documento para todos los resguardos indígenas y, es claro que es uno por cada frente de obra, dadas las características ambientales y sociales por Municipio.

b.- En el documento PAGA presentado, No se tiene identificado el nivel de complejidad de la obra acorde a la metodología de la GMAMC 2022, sin la cartografía ni los capítulos completos, en el marco de la estructura y contenido de la normativa vigente.

c.- No se incluyen permisos mineros y ambientales para la implementación de la obra, ni de infraestructuras asociadas, (Escombrera, baños, campamentos, bodegas y afines) y, por uso de recursos naturales, como el gua y los que apliquen.

d.- No se presentan las actas de radicación ambiental y social, ni los planes de inversión, ambiental y social.

Estos dos últimos requisitos, son determinantes de aprobación del PAGA y, son requisitos legales que también, deben presentarse para los tres frentes de obra.

A solicitud del contratista, se socializó los mapas que debe elaborarse para la línea base ambiental y social, informado que:

Se indico que debe presentar un anexo en donde se organiza la información cartográfica generada para la línea base, área de influencia y demás análisis, y los metadatos, en los diferentes archivos (Shape, KMZ, PGAX y PDF), incluyendo la cartografía social, ubicando en un plano SIG, los polígonos de los Resguardos, la división política – administrativa municipal, la localización de los tramos, para definir la Unidad Territorial Mayor y las Unidades Territoriales Menores.

La cartografía a emplear para implantar las coordenadas del proyecto, las pueden realizar en plataformas SIAC – Tremarctos, mapas de sensibilidad socioambiental del INVIAS, sistemas de Información Geográfica - Visor Geográfico ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia – Geoparques, servicio geológico colombiano, datos abierto cartografía y geografía - instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), IDEAM, POT- EOT y PBOT, entre otras

Estos son acompañados por la GDB del proyecto en la cual se estructura y almacena las capas que se utilizaron para la generación de la cartografía.

La interventoría informa al contratista que, acorde a reunión celebrada con otro contratista del mismo convenio, ingresó el coordinador ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, informando que, maneja información cartográfica de los resguardos, de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar, siempre y cuando la información del área social, no tenga salvaguardas de protección constitucional.

Así mismo, informó que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, "Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades", expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, por tanto, pueden colaborar igualmente con el contratista.

.- La interventoría manifiesta que es necesario solicitar la colaboración de las autoridades de los resguardos, acorde a sus facultades normativas, para que se faciliten las autorizaciones necesarias, que el contratista en obra requiere para la construcción de la placa huella, como son: Infraestructuras asociadas para almacenamiento de materiales de construcción y herramientas menores, baños, por uso de recursos naturales específicamente del suministro de aguas lluvias proveniente de jagüeyes, el servicio, para el manejo que se da a los residuos convencionales y RCD.

Se deja en claro que, el responsable de las bolsas de cemento es y seguirá siendo el contratista, quien informará el manejo y acopio hasta disposición final con el gestor de RESPEL legal o el mismo proveedor del cemento, que tienen programas de reciclaje de los residuos que se generan con sus productos, certificando la adecuada disposición final.

Ante la consulta de la profesional social del contratista, la profesional de la interventoría, aclara:
Que la diferencia entre el comité de participación comunitaria y la veeduría no radica exactamente en el número de personas que ellos asistan al espacio de socialización, sino en la iniciativa ciudadana que tengan ellos de conformarse como veeduría. Nosotros como proyecto, lo que tenemos que hacer es estar prestos a si ellos quieren conformar veeduría, estar atentos porque eso es una iniciativa propia de ellos y, deben presentarse ante la personería municipal y ellos allá radican un acta y la personería les da un número de resolución para que queden conformes como veeduría.

Y pues de ahí en adelante nos empiezan a acompañar.

Y si por iniciativa propia no quieren conformar la veeduría, sino solamente participar con nosotros, con los mecanismos y canales que dispone el proyecto., entonces quedarían solamente como comité de participación comunitaria, que igual se maneja de la misma manera. Entonces por eso la veeduría ya es si ellos la quieren hacer, de acuerdo a la ley 80.

**Quedando los siguientes compromisos:**

**1.- El contratista, elabora los documentos PAGA V2, por resguardo, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-009 del 06 de febrero de 2025.**

**No obstante, a solicitud del contratista, la interventoría remitirá la lista de chequeo para evaluar cumplimiento documento PAGA - en el marco de la guía de manejo ambiental modo carretero 2022 -volumen 6- lineamientos para la elaboración y presentación del documento PAGA, actualizado.**

**2.- Los profesionales del contratista contactaran al Coordinador ambiental del CRIDEC, con el fin recepcionar la información ambiental y social que no tenga restricciones y, la que no pueda obtenerse por respeto ancestral, sea certificado por la autoridad del resguardo.**

**3.- Fecha de entrega de los documentos, PAGA, 10 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta que la obra vence el plazo prorrogado el 30 de septiembre de 2025, si puede lo hará antes de la fecha.**


**Se incluirán las Actas de radicación ambiental y social diligenciadas, con sus respectivos anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental y social con presupuesto - cero.**


**4.- La interventoría remitirá el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento y elaboración de los informes modalidad INVIAS, al correo del contratista.**

**5.- El contratista hará la revisión del manual de interventoría del INVIAS, con el apoyo de la interventoría, para revisar los lineamientos para la elaboración de los informes mensuales, tan pronto presente los documentos PAGA de la obra.**

Anexos:
1.- Formatos y Manual de Interventoría del INVIAS, vigente
2.- Cuadro en Excel para registro de soportes consolidado de seguimiento.
3.- Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

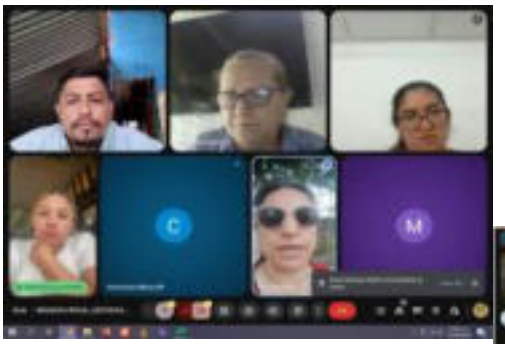

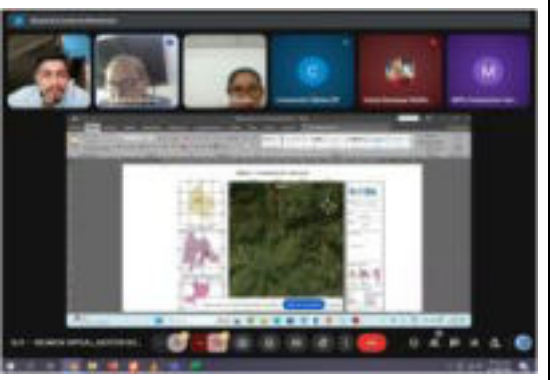

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Fecha de entrega del documento PAGA de según comunicación NV-CIC-2252-2021-MFA-009 de fecha 06 de febrero de 2025 | DOS SEMANAS CONTADAS DESDE LA FECH DE LA PRESENTE REUNIÓN (10/09/25) | CONSORCIO OBRAS DP |
| Reunión de verificación entre las profesionales para revisión del PAGA | A CONCRETAR SEGÚN AVANCE | CONSORCIO OBRAS DP<br>CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| Remitir Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales | domingo, 24 de agosto de 2025 | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Vera Quiroga | Profesional Ambiental | CONSORCIO OBRAS DP | |
| Evelin Juliana Pinzón | Profesional Ambiental | CONSORCIO OBRAS DP | |
| Karla Vanessa Patiño | Profesional Social | CONSORCIO OBRAS DP | |
| Yinna Andrea Bedoya | Profesional Social | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | |
| Belén Alexandra Cerón Quintero | Profesional Ambiental | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 14. Información contrato de interventoría

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección** | CMA-DO-SRT-180-2021 |
| **Número del contrato** | 2252-2021 |
| **Objeto** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS *"COLOMBIA RURAL"*. GRUPO 2. |
| **Interventor** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| **NIT** | 901.550.980-0 |
| **Valor Total Inicial** | $ 999.980.476,00 incluido IVA |
| **Adiciones** | $ 285.000.000,00 incluido IVA |
| **Valor acumulado del contrato** | $ 1.284.980.476,00 incluido IVA |
| **Modificación No. 1** | Las partes pactan suscribir la modificación No 1, la cual se rige por las siguientes disposiciones del contrato número 2252 de 2021:<br><br>**CLÁUSULA PRIMERA: RESTITUIR PARCIALMENTE** al Contrato Número 2252 de 2021, recursos de la vigencia 2021 fenecidos a 31 de diciembre de 2022 por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000.00) los cuales serán incluidos en la vigencia 2023.<br><br>**PARÁGRAFO PRIMERO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 77923 del 30 de marzo de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la<br>Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se tomará la suma de $100.000.000 del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11.<br><br>**CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. - EL INTERVENTOR** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento. |
| **Aclaraciones** | N/A |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **Plazo inicial** | Cuatro punto cinco (4.5) meses (Hasta el 31 de julio de 2022) |
| **Fecha de Inicio** | 16 de marzo de 2022 |
| **Suspensiones** | SI - tres (3) |
| **Fecha Suspensión No. 1** | 03 de enero de 2023 al 02 de junio de 2023 |
| **Fecha de Ampliación No. 1** | 03 de junio de 2023 al 02 de octubre de 2023 |
| **Fecha de Ampliación No. 2 Suspensión No 1** | 03 de octubre de 2023 al 19 de octubre del 2023 |
| **Fecha de Reanudación 1** | 20 de octubre de 2023 |
| **Fecha Suspensión No. 2** | 03 de mayo 2024 al 01 de julio de 2024 |
| **Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No 2** | 02 de julio de 2024 al 01 de agosto 2024 |
| **Fecha de Reanudación 2** | 02 de agosto 2024 |
| **Fecha Suspensión No. 3** | 13 de febrero de 2025 |
| **Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No 3** | 01 de abril de 2025 al 15 de mayo de 2025 |
| **Fecha de Ampliación No. 2 Suspensión No 3** | 16 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 |
| **Fecha de Ampliación No. 3 Suspensión No 3** | 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 |
| **Fecha de Reanudación 3** | 01 de junio de 2025 |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **Prorrogas** | Siete (7) |
| **Prórroga No. 1** | Cinco (5) meses - (Desde el 31 de julio de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022) |
| **Prórroga No. 2** | Dos punto cinco (2.5) meses - (Desde el 31 de diciembre de 2022, hasta el 15 de marzo de 2023) |
| **Prórroga No. 3** | Cinco (5) meses - (Desde el 31 de diciembre de 2023, hasta el 31 de mayo de 2024) |
| **Prorroga No. 4** | Dos punto siete (2.7) meses - (Desde el 31 de agosto de 2024, hasta el 21 de noviembre de 2024) |
| **Prorroga No. 5** | Un punto tres (1.3) meses - (Desde el 22 de noviembre de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024) |
| **Prorroga No. 6** | Uno punto cinco (1.5) meses – (Desde el 1 de enero de 2025, hasta el 15 de febrero de 2025) |
| **Prórroga No 7** | Tres (3) meses – (Desde el 02 de julio de 2025, hasta el 01 de octubre de 2025) |
| **Plazo acumulado actual** | Veinticinco punto cinco (25.5) meses |
| **Fecha de Terminación Actual del contrato** | 01 de octubre de 2025 |
| **Dirección** | Calle 9 No 0 -100, casa 2, sector el hato, barrio los andes – Tabio (Cundinamarca) |
| **Número de Teléfono** | 313 423 9264 |
| **Correo Electrónico** | consorcioceefcolombiarural@gmail.com<br>lote2.riosucio.consorcioceef@gmail.com<br>lote1.supia.consorcioceef@gmail.com<br>mfaconsorcioceefcolombiarural@gmail.com |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, la Interventoría realizó para cada uno de los tramos de los diferentes Municipios las siguientes actividades administrativas y técnicas:

- Se realizó control de actividades y una memoria de la obra en la Bitácora, en donde se registraron las acciones realizadas diariamente.
- Se realizó antes y durante la ejecución de las diferentes actividades la toma de las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que se permitiera llevar un control de las cantidades ejecutadas.
- A través del profesional estipulado se verifico directa y continuamente en la obra la calidad y cantidad del personal, de acuerdo con lo establecido en la propuesta, dejando constancia de esto en la bitácora y en los informes periódicos.

- Se realizó control directo en obra de la calidad de los materiales e ítems de construcción establecidos contractualmente, mediante análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales en sí mismos o sobre su aplicación en obra.
- Se verifico directa y continuamente la operación de la maquinaria y equipos requeridos.
- Se realizaron reuniones técnicas y comités de obra con el acompañamiento del Supervisor del Contrato de Interventoría, la Supervisora del Convenio, la Gestora del Proyecto, la Secretaría de Infraestructura, el Contratista de Obra y la Interventoría con el objetivo de revisar el estado actual de la obra y el avance en las actividades a ejecutar.
- Seguimiento a las actividades de identificación y Georreferenciación realizadas por los Contratistas de Obra.
- Seguimiento a las actividades de excavación, conformación e instalación del Material Subbase Granular, así mismo a las actividades de instalación de formaleta, armado de acero y vaciado de concreto realizadas por los Contratistas de Obra.

**REUNIONES Y COMITÉ TÉCNICO.**

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento técnico y socio ambiental, así mismo comité técnico en el marco del desarrollo de los contratos:

- **Contrato No 18092024-1274 (Municipio de Supia)**

Tabla 15.Comité de Obra y Reuniones

| **REUNION - SUPIA** | | |
|---|---|---|
| CRIDEC | No 1 | 5 de agosto de 2025 |
| SOCIO AMBIENTAL | No 2 | 12 de agosto de 2025 |
| Técnica INVIAS e Interventoría | No 3 | 19 de agosto de 2025 |
| CRIDEC | No 4 | 27 de agosto de 2025 |

| **COMITES - SUPIA** | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Caldas | No 1 | 20 de agosto de 2025 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Contrato No 18092024-1295 (Municipio de Riosucio)**

Tabla 16. Comité de Obra y Reuniones

| **REUNION - Riosucio** | | |
|---|---|---|
| CRIDEC | No 1 | 5 de agosto de 2025 |
| SOCIO AMBIENTAL | No 2 | 12 de agosto de 2025 |
| Técnica INVIAS e Interventoría | No 3 | 19 de agosto de 2025 |
| CRIDEC | No 4 | 27 de agosto de 2025 |

| COMITES - Riosucio | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Caldas | No 1 | 20 de agosto de 2025 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Contrato No 29102024-1472 (Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma)**

Tabla 17. Comité de Obra

| REUNION - Marmato, Filadelfia y Anserma | | |
|---|---|---|
| CRIDEC | No 1 | 5 de agosto de 2025 |
| SOCIO AMBIENTAL | No 2 | 12 de agosto de 2025 |
| Técnica INVIAS e Interventoría | No 3 | 19 de agosto de 2025 |
| CRIDEC | No 4 | 27 de agosto de 2025 |

| COMITES - Marmato, Filadelfia y Anserma | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Caldas | No 1 | 20 de agosto de 2025 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

Las anteriores reuniones y comités técnicos se realizaron con el acompañamiento del Instituto Nacional de Vías, La Gobernación de Caldas, los Contratistas de Obra y la Interventoría.

## 5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

El 12 de agosto de 2025, se participó en comité ambiental, citado por el Ingeniero Santiago Hernández Rendon, director territorial INVIAS Caldas, liderada por la Ingeniera Luz Liliana Tibata Castelblanco, Gestora del área técnica del INVIAS.

La reunión se llevó a cabo con el acompañamiento de los directores de los CONSORCIOS CVC 2024, OBRAS DP, MAIC e INNOVA SAS y, profesionales ambientales y sociales.

De parte de la Interventoría, las especialistas ambiental y social.

De parte del INVIAS Bogotá, la Dra. Marcela Pereira gestora social y la Ingeniera Juanita González gestora ambiental, recientemente asignadas a la obra.

En la reunión se expuso el contexto de la ejecución de los contratistas y, el estado de incumplimiento de los contratistas, en la presentación del documento PAGA de la obra, a pesar de que las profesionales social y ambiental de la interventoría, las han orientado en promedio 5 mesas de trabajo y se ha entregado un paso a paso para la elaboración del documento PAGA, en el marco de la normatividad ambiental vigente y la GMAMC 2022 del INVIAS.

Otro de los problemas que informó la interventoría, ha sido, la variación de los profesionales que asisten a las reuniones, son diferentes y no hay un responsable de los documentos PAGA.

El contratista manifiesto tener inconformismo con las observaciones de la interventoría, máxime cuando informan tener inconvenientes con la información del área social, porque los lideres cabildantes de los resguardos no les facilitan información y dificulta la elaboración del componente social.

La Gestora Técnica Ingeniera Luz Liliana Tibata, solicitó el acompañamiento de las gestoras ambiental y social del INVIAS, en reunión individual con cada contratista y ellas hicieran acompañamiento al trabajo realizado por la interventoría e hicieran sus aportes al proceso con el fin de agilizar la entrega del documento PAGA, de parte de los contratistas.

Como compromisos, quedaron concertadas las reuniones con las gestoras ambiental y social del Invias Bogotá con contratista e interventoría simultaneas, área ambiental y social, relacionadas de la siguiente manera: jueves 14 agosto INNOVA SAS 10 am, martes 19 agosto 10 am CONSORCIO MAIC, miércoles 20 agosto 10 am CONSORCIO VIAS CALDAS 2024 y, jueves 21 agosto 2:30 pm OBRAS DP.

las gestoras ambiental y social de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, al conocer el estado actual del documento PAGA y a dinámica del incumplimiento durante la ejecución contractual, como conclusión general de las reuniones realizadas con los contratistas se estableció que la interventoría ha obrado de conformidad con el Manual de Interventoría y la normatividad ambiental vigente, la Ingeniera Juanita González, informó que, la Doctora Marcela Bermeo escribió a la Gestora Técnica que no asistirían más, a las reuniones solicitadas, hasta que el documento PAGA sea aprobado por la Interventoría, en el marco de sus funciones y la normativa vigente, ya que no hay documento PAGA terminado para poder pronunciarse como entidad contratante acorde a la normativa vigente del INVIAS y, el contratista y, previas aclaraciones y orientaciones de las profesionales ambiental y social de la interventoría adquirieron el compromiso de entrega del documento PAGA, INNOVA SAS para el 2 de septiembre de 2025, CONSORCIO MAIC, para el 5 de septiembre de 2025, CONSORCIO VIAS CALDAS 2024 para el 5 de septiembre de 2025, y, CONDORCIO OBRAS DP para el 10 de septiembre de 2025.

- **Contrato No 17112023-1630 (Municipio de Risaralda, Belalcazar y Neira)**

La obra termino su plazo de ejecución contractual, al 20 de diciembre de 2024, quedando con los siguientes pasivos ambientales:

- Los documentos PAGA V5 elaborados para los municipios de Risaralda, Belalcázar y Neira por el contratista, no han sido elaborados con la suficiencia y complementación que la Guía de Manejo Ambiental INVIAS 2022 Modo Carretero y la normativa vigente exige, por tanto no fueron aprobados por la Interventoría.

- El contratista debe subsanar los tres documentos PAGA a una Versión 6, para la liquidación del contrato, para cada resguardo.

- Así mismo, Está pendiente la elaboración de los informes ambientales y sociales mensuales y el Informe de balance ambiental a la terminación del contrato de obra, debidamente soportado, bajo los lineamientos del Manual de interventoría del INVIAS vigente.

- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-323 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

- .En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto del 2025, se llevó a cabo la reunión concertada, el jueves 14 agosto con el contratista INNOVA SAS, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA el 2 de septiembre de 2025 con verificación de las partes a las 9 am, revisando los tres documentos PAGA en su última versión presentada, para los frentes Albania, Totumal y damasco, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el Oficio INV-CIC-2252-2021-290 del 19 de noviembre de 2025, tomará la lista de chequeo de las observaciones e incluirá una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento y, se incluirían las Actas de radicación ambiental y social diligenciadas y con anexos por frente de obra y, el Plan de Inversión Ambiental y social con presupuesto - cero.

- .Por solicitud del contratista, la interventoría remitió el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contratos de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

- .La interventoría abrió el espacio para orientar al contratista, en el tema de los informes ambientales, llevando el contratista un informe preliminar para aclarar dudas e inquietudes, para el martes 19 de agosto 2 pm, situación que no se dio, porque la profesional ambiental del contratista informó una situación familiar que le impidió asistir, quedando al cierre del periodo, la nueva fecha de parte del contratista.

- .El 14 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 19 de agosto de 2025.

- .Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

- **Contrato No 18092024-1274 (Municipio de Supia)**

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-041 del 5 de agosto de 2025, se realizó revisión de documentos minero ambientales, de la Cantera LA FELISSA, proveedor propuesto por el CONSORCIO CVC 2024, con requerimiento de observaciones complementarias, recordando al contratista que, los permisos de la obra, deben ser presentados como anexos del documento PAGA, elaborado para cada frente de obra, No individuales. A la fecha del cierre del periodo, continua sin respuesta.

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-042 del 5 de agosto de 2025m se realizó reiteración con apremio presentación del PAGA V3 – en atención al oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-033 DEL 06/02/2025.

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-043 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero SANTIAGO HERNANDEZ RENDON Director Territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo la reunión el miércoles 20 agosto con el CONSORCIO MAIC contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA V3, por resguardo, el 5 de septiembre de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

Durante la reunión, por solicitud del contratista, se indicó en forma general el contenido de los capítulos de GMAMC 2022 y, a nivel de detalle, la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS. atendiendo las dudas e inquietudes.

Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió: Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022, compilada por las especialistas de la Interventoría, el formato el Manual de interventoría del INVIAS vigente, los formatos ambientales, el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra, con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

El 24 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-052 del 25 de agosto de 2025, se dio alcance a la reunión del 21 de agosto de 2025, con el fin de informar a los contratistas, la disponibilidad de colaboración del Coordinador Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, quien, en la reunión con el CONCORCIO CVC 2024, aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos

naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual manifestó igualmente, que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores y, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral e, igualmente, También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

- **Contrato No 18092024-1295 (Municipio de Riosucio)**

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-027 del 7 de agosto de 2025, apremio de presentación del documento PAGA Versión No. 3 - en reiteración atención observaciones oficio No. INV-CIC-2252-2021-L2R-024 del 10 de febrero de 2025.

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-028 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de “Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero Santiago Hernández Rendon director territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto del 2025, se llevó a cabo la reunión concertada, el martes 19 agosto con el CONSORCIO MAIC 2024contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA, el 5 de septiembre de 2025, transcurridos 6,7 meses de ejecución contractual, ajustando el documento PAGA en su última versión presentada, INV-CIC-2252-2021-L2R-010 del 22/11/2024, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió el Manual de interventoría del INVIAS vigente y los formatos ambientales y el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

Según lo concertado, para revisión y orientación del estado de avance del PAGA, se realizaron dos mesas de trabajo los días 19 y 21 de agosto de 2025, donde se trabajó en la identificación del nivel de complejidad de la obra y, adicional a la profesional ambiental, con el acompañamiento del profesional SIG del contratista, se explicó a detalle, como debe ir la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS, acorde a la GMAMC 2022, atendiendo las dudas e inquietudes.

El 19 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

- **Contrato No 29102024-1472 (Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma)**

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-016 del 4 de agosto de 2025, se realizó revisión de documentos minero ambientales, del Señor Álvaro Gómez Botero, proveedor propuesto por el CONSORCIO OBRAS DP, con requerimiento de observaciones complementarias, recordando al contratista que, los permisos de la obra, deben ser presentados como anexos del documento PAGA, elaborado para cada frente de obra, No individuales. A la fecha del cierre del periodo, continua sin respuesta.

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-018 del 8 de agosto de 2025 se trasladó la comunicación No. 2025S-VCAL-056443 la solicitud de reunión de "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021, para el 12 de agosto de 2025, citado por el Ingeniero Santiago Hernández Rendon director territorial Caldas, para que asistan los contratistas con los profesionales ambiental y social e igualmente, los profesionales de la interventoría.

En cumplimiento de los compromisos del comité del 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo la reunión el jueves 21 agosto, el CONSORCIO OBRAS DP contratista, el cual se comprometió a presentar el documento PAGA V2, por resguardo, el 5 de septiembre de 2025, incluyendo el Acta de radicación ambiental y social y el Plan de Inversión ambiental y social, que debe ir en ceros.

Durante la reunión, por solicitud del contratista, se indicó en forma general el contenido de los capítulos de GMAMC 2022 y, a nivel de detalle, la cartografía que debe incluirse en el documento PAGA modalidad INVIAS. atendiendo las dudas e inquietudes.

Para conocimiento y atención del contratista, la interventoría remitió: una Lista de chequeo actualizada, para elaboración del documento PAGA en el marco de la GMAMC 2022, compilada por las especialistas de la Interventoría, el formato el Manual de interventoría del INVIAS vigente, los formatos ambientales, el de informes de balance ambiental al término del contrato de obra, con sus respectivos manuales, que contienen el paso a paso para su diligenciamiento.

El 24 de agosto de 2025, se remitió correo electrónico con los compromisos adquiridos en la reunión y, previa confirmación de las profesionales del INVIAS y del contratista, se remitió el acta para firma de las partes, el 26 de agosto de 2025.

Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-021 del 26 de agosto de 2025, se dio alcance a la reunión del 21 de agosto de 2025, con el fin de informar a los contratistas, la disponibilidad de colaboración del Coordinador

Ambiental del CRIDEC, Señor Juan Carlos Vega, quien, en la reunión con el CONSORCIO VIAL CALDAS 2024, aclaró que los resguardos indígenas tienen autonomía para que el gobernador emita los permisos por uso de recursos naturales e infraestructuras asociadas, para la implementación en la obra, facultades otorgadas por el Decreto 1275 de 2024, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual manifestó igualmente, que maneja la información del componente ambiental de los resguardos Indígenas de las unidades territoriales mayores y menores y, que puede colaborar con la información Cultural, ambiental y ancestral siempre y cuando no esté protegida por un patrimonio cultural ancestral e, igualmente, También que, maneja información cartográfica de los resguardos y de los componentes de flora y fauna entre otras en las que puede colaborar y, reitera, siempre y cuando la información del área social, la que no tenga salvaguardas de protección constitucional.

Al cierre del periodo, se está a la espera del cumplimiento del contratista, con los compromisos adquiridos.

## 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC

Se presenta la programación mensual de los recursos programados comparados con la ejecución mensual realizada para los contratos de obra e interventoría:

- **CONTRATO DE OBRA**

### 5.4.1. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Belalcazar, Risaralda y Neira

El Contrato de Obra No 29102024-1472 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA - MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS" finalizó el 20 de diciembre de 2024.

### 5.4.2. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Supia

Tabla 18. PAC Supia

| MES DE EJECUCIÓN | TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA | RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS | RECURSOS EJECUTADOS EN EL MES |
|---|---|---|---|
| 01 al 31 de agosto 2025 | $ 1.228.287.316,19 | $ 227.021.685,34 | $ 227.021.685,34 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 5.4.3. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Riosucio

Tabla 19. PAC Riosucio

| MES DE EJECUCIÓN | TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA | RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS | RECURSOS EJECUTADOS EN EL MES |
|---|---|---|---|
| 01 al 31 de agosto 2025 | $ 785.694.151,87 | $1.830.178.981,54 | $ 600.945.276,14 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 5.4.4. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Marmato

Tabla 20.PAC Marmato

| MES DE EJECUCIÓN | TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA | RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS | RECURSOS EJECUTADOS EN EL MES |
|---|---|---|---|
| 01 al 31 de agosto 2025 | $ 105.529.615 | $ 0 | $0 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 5.4.5. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Filadelfia

Tabla 21. PAC Filadelfia

| MES DE EJECUCIÓN | TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA | RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS | RECURSOS EJECUTADOS EN EL MES |
|---|---|---|---|
| 01 al 31 de agosto 2025 | $ 4.397.067 | $0 | $0 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 5.4.6. Informe Programa Anual de Caja, Municipio de Anserma

Tabla 22.PAC Anserma

| MES DE EJECUCIÓN | TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA | RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS | RECURSOS EJECUTADOS EN EL MES |
|---|---|---|---|
| 01 al 31 de agosto 2025 | $ 131.912.019 | $ 236.319.736,65 | $ 236.319.736,65 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Interventoría a los Municipios de Neira, Risaralda, Belalcazar, Supia, Riosucio, Marmato, Filadelfia y Anserma

Tabla 23. PAC CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL - Municipios de Neira, Risaralda, Belalcazar, Supia, Riosucio, Marmato, Filadelfia y Anserma

| MES DE EJECUCION | TOTAL, INVERSION PROGRAMADA | RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS |
|---|---|---|
| 01 al 31 de agosto 2025 | $ 1.229.477.392,61 | $ 1.070.048.422,45 |

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Teniendo en cuenta la matriz de riesgo del proyecto y el periodo del presente documento, se presenta informe de seguimiento a los riesgos previsibles que puedan afectar al desarrollo de los Contratos de Obra No 17112023-1630, No 18092024-1274, No 18092024-1295 y No 29102024-1472:

Tabla 24. Matriz de riesgos del proyecto

| Numero | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | No presentación de propuestas dentro del proceso contractual | Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal |
| 3 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Compartido |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad Estatal |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal |

| Numero | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos, conflictos y demoras causados por las exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna. | Retraso en las actividades contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por causa de actividades de la obra | Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por ajustes y/o complemento de los estudios y diseños | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por gestión predial, social, ambiental y arqueológica | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por interferencia de redes de servicios públicos | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios normativos o legislativos | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |

| Numero | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo Biológico | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuación de precios o escasez de material | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido |

| | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
| 1 | Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Durante la selección | En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado | Cuando se requiera |
| 2 | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Después de adjudicación | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria |
| 3 | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.).<br>2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Después de la suscripción | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria |
| 4 | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | a través de los Informes de Supervisión | Cuando se requiera |

| | | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato | Cuando se requiera |
| 6 | Notificación a la oficina Jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | NO | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiera |
| 7 | Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato | Quincenal |
| 8 | Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta | Cuando se requiera |
| 9 | Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Solicitud de las nóminas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales | Quincenal |
| 10 | Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales | Cuando se requiera |

| | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 11 | Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial. Cubrimiento mediante garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Verificación oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos | Diaria |
| 12 | Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago | Cuando se requiera |
| 13 | Retrasos por ajustes y/o complemento de los estudios y diseños | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Verificación oportuna de los ajustes a realizar detectados por el contratista | Cuando se requiere |
| 14 | Retrasos por gestión predial, social, ambiental y arqueológica | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 15 | Retrasos por interferencia de redes de servicios públicos | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 16 | Cambios normativos o legislativos | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 17 | Riesgo Biológico | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Compartido | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |

| | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 18 | Fluctuación de precios o escasez de material | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Compartido | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |

Fuente: Secop II

## 5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

La Interventoría teniendo en cuenta el proceso de gestión de calidad que adelanta el INVÍAS, elaboró y presentó los reportes de avance semanal y mensual del contrato de obra e interventoría, mediante el Manual y Formatos de Interventoría del INVÍAS 2022, formatos los cuales hacen parte del presente informe mensual de Interventoría No. 26 correspondiente al **mes de agosto de 2025.**

Adicionalmente a la fecha de corte de este informe mensual se ésta actualizando los informes semanales de cada uno de los Contratos de Obra asociados a esta Interventoría, en el Sistema de Información Gerencial (CIFRA), teniendo en cuenta que la plataforma ha presentado problemas en su funcionamiento.

# 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

## 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

## 6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

## 6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

## 6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-15

## 6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-3-FR-1
Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-3-FR-2

- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-9-FR-2

- Seguimiento al Plan de Cargas

No se anexa el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 correspondientes al SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS, debido a que el documento no se encuentra dentro de la información suministrada por el INVIAS para el reporte de la ejecución mensual del contrato de interventoría.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL** 1/08/2025

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
**CONTRATO DE OBRA No.** 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC 2024
**CONTRATO DE OBRA No.** 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHICULOS | Vehículo marca Ssangyong, modelo 2012, Placa KOO918, | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| EQUIPOS DE TOPOGRAFIA | ESTACION TOTAL MARCA SOUTH NTS 326 R6L; SERIE S127709 | | A | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | A | A | A | A | | | | |
| | NIVEL AUTOMATICO MARCA GAL32X 32X; SIN SERI | | A | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | A | A | A | A | | | | |
| MOTOCICLETAS | Motocicleta marca HONDA, modelo 2016, placa YQY87D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A |
| | Motocicleta marca AKT, modelo 2017, placa GGK13E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | Motocicleta marca YAMAHA , modelo 2025, placa QQV55G, | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | Motocicleta marca SUZUKI, modelo 2023, placa MRA58G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A |
| OFICINA/CAMPAMENTO | INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÒN CARRERA 7 No 33-29 PISO 3 CENTRO, SUPIA - CALDAS | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: GERSON POLANCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202128485 TLM

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**FECHA DE INICIO:** 16/03/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4,5 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE OBRA No:** 18092024-1274 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSION No. 1 FECHA DE VERSION: N/A

**OBSERVACIONES:**
NO SE HAN PRESENTADO

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 4

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** N/A **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** N/A

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** N/A **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** N/A

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** N/A

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** N/A **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** N/A

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** N/A **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** N/A

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** N/A **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** N/A

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | No. ensayos que cumplen con la especificacion / No. ensayos realizados |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | Quejas solucionadas de manera efectiva/quejas manifestadas |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | Cumplimiento avance del contrato: planeado/ejecutado |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | Recursos Planeados/recursos disponibles |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | Facturacion planeada/facturacion ejecutada |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

No se relaciona comentarios de los indices de gestion ; toda vez que; no se ha presentado el plan de calidad.

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION TOTAL | SOUTH | S127709 | 25/09/2023 | 23-280 | 3/04/2025 | |
| **2** | NIVEL AUTOMATICO | GAL32X | SIN SERIE | 25/09/2023 | 23-281 | 3/04/2025 | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma

Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202 - 128485 TLM

Firma NO APLICA

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 12/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 18092024-1274 | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 18092024-1295 | CONSORCIO MAIC 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 29102024-1472 | CONSORCIO OBRAS DP |

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1077721 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | Nación | Principal | $ 390.000.000,00 | $ - |
| 2021 | 1077721 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | Nación | Principal | $ 4.000.000,00 | $ - |
| 2022 | 283622 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 605.980.476,00 | $ - |
| 2023 | 1401423 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal - Restitución de Recursos | $ 100.000.000,00 | $ - |
| 2024 | 1094924 | C-2402-0600-12-0-2402041-03 | 10 | Nación | Principal - Restitución de Recursos | $ 159.528.012,65 | $ 3.007.145,15 |
| 2025 | 525925 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | 10 | Nación | Adicional | $ 285.000.000,00 | |
| | | **TOTAL** | | | | **$ 1.284.980.476,00** | **$ 3.007.145,15** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.284.980.476,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **283622 - 23/02/2022** | **$ 605.980.476,00** | | | |
| | | | | | | | **$ 378.143.877,60** | 283622 - 23/02/2022 | $ 227.836.598,40 | $ 1.284.980.476,00 | | |
| | | | | | | | | **1077721 - 30/12/2021** | **$ 4.000.000,00** | | | |
| | | | | | | | | **1077721 - 30/12/2021** | **$ 390.000.000,00** | | | |
| 1 | 16 AL 30 DE MARZO DEL 2022 | $ 9.079.480,00 | $ 1.725.101,20 | $ 10.804.581,20 | $ 4.085.766,00 | $ 6.718.815,20 | $ 374.058.111,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 387.281.184,80 | $ 1.274.175.894,80 | | Pagada |
| 2 | 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 | $ 26.276.130,00 | $ 4.992.464,70 | $ 31.268.594,70 | $ 11.824.258,50 | $ 19.444.336,20 | $ 362.233.853,10 | 283622 - 23/02/2022 | $ 208.392.262,20 | $ 1.242.907.300,10 | | Pagada |
| 3 | 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 | $ 29.876.520,00 | $ 5.676.538,80 | $ 35.553.058,80 | $ 13.444.434,00 | $ 22.108.624,80 | $ 348.789.419,10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 365.172.560,00 | $ 1.207.354.241,30 | | Pagada |
| 4 | 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | $ 33.973.380,00 | $ 6.454.942,20 | $ 40.428.322,20 | $ 15.288.021,00 | $ 25.140.301,20 | $ 333.501.398,10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 340.032.258,80 | $ 1.166.925.919,10 | | Pagada |
| 5 | 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 | $ 36.867.420,00 | $ 7.004.809,80 | $ 43.872.229,80 | $ 16.590.339,00 | $ 27.281.890,80 | $ 316.911.059,10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 312.750.368,00 | $ 1.123.053.689,30 | | Pagada |
| 6 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 | $ 43.750.970,00 | $ 8.312.684,30 | $ 52.063.654,30 | $ 19.687.936,50 | $ 32.375.717,80 | $ 297.223.122,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 280.374.650,20 | $ 1.070.990.035,00 | | Pagada |
| 7 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | $ 37.931.540,00 | $ 7.206.992,60 | $ 45.138.532,60 | $ 17.069.193,00 | $ 28.069.339,60 | $ 280.153.929,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 252.305.310,60 | $ 1.025.851.502,40 | | Pagada |
| 8 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 | $ 40.244.200,00 | $ 7.646.398,00 | $ 47.890.598,00 | $ 18.109.890,00 | $ 29.780.708,00 | $ 262.044.039,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 222.524.602,60 | $ 977.960.904,40 | | Pagada |
| 9 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | $ 28.456.905,00 | $ 5.406.811,95 | $ 33.863.716,95 | $ 28.456.905,00 | $ 5.406.811,95 | $ 233.587.134,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 217.117.790,65 | $ 944.097.187,45 | | Pagada |
| 10 | 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | $ 27.588.800,00 | $ 5.241.872,00 | $ 32.830.672,00 | $ 27.588.800,00 | $ 5.241.872,00 | $ 205.998.334,60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 111.875.918,65 | $ 911.266.515,45 | | Pagada |
| | | | | | | | | **283622 - 23/02/2022** | **$ 208.392.262,20** | | | |
| | | | | | | | **$ 42.015.986,40** | 283622 - 23/02/2022 | $ 166.376.275,80 | | | |
| 11 | 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 205.998.334,60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 166.376.275,80 | $ 911.266.515,45 | | - |
| 12 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 205.998.334,60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 166.376.275,80 | $ 911.266.515,45 | | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | FECHA | 12/09/2025 |
| 13 | 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | $ 99.768.220,00 | $ 18.955.961,80 | $ 118.724.181,80 | $ - | $ 118.724.181,80 | $ 205.998.334,60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 47.652.094,00 | $ 792.542.333,65 | | Pagada |
| | | | | | | | | **1401423 - 20/12/2023** | **$ 100.000.000,00** | | | |
| 14 | 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | $ 15.845.360,00 | $ 3.010.618,40 | $ 18.855.978,40 | $ 15.845.360,00 | $ 3.010.618,40 | $ 190.152.974,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 96.989.381,60 | $ 773.686.355,25 | | Pagada |
| 15 | 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 | $ 18.116.420,00 | $ 3.442.119,80 | $ 21.558.539,80 | $ 15.989.987,00 | $ 5.568.552,80 | $ 174.162.987,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 91.420.828,80 | $ 752.127.815,45 | | Pagada |
| 16 | 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 | $ 16.731.280,00 | $ 3.178.943,20 | $ 19.910.223,20 | $ - | $ 19.910.223,20 | $ 174.162.987,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 71.510.605,60 | $ 732.217.592,25 | | Pagada |
| 17 | 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 | $ 19.163.380,00 | $ 3.641.042,20 | $ 22.804.422,20 | $ 15.330.704,00 | $ 7.473.718,20 | $ 158.832.283,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 64.036.887,40 | $ 709.413.170,05 | | Pagada |
| 18 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | $ 15.067.120,00 | $ 2.862.752,80 | $ 17.929.872,80 | $ 12.053.696,00 | $ 5.876.176,80 | $ 146.778.587,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 58.160.710,60 | $ 531.955.284,60 | | Pendiente de pago |
| 19 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $ 32.705.020,00 | $ 6.213.953,80 | $ 38.918.973,80 | $ 31.069.769,00 | $ 7.849.204,80 | $ 115.708.818,60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 50.311.505,80 | $ 208.036.310,80 | | Pendiente de pago |
| 20 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 | $ 59.633.760,00 | $ 11.330.414,40 | $ 70.964.174,40 | $ 20.652.668,60 | $ 50.311.505,80 | $ 95.056.150,00 | **1401423 - 20/12/2023** | $ - | $ 137.072.136,40 | | Pendiente de pago |
| | | | | | | | | **1094924 - 1/11/2024** | **$ 159.528.012,65** | $ 296.600.149,05 | | |
| 21 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | $ 67.523.500,00 | $ 12.829.465,00 | $ 80.352.965,00 | $ 64.147.325,00 | $ 16.205.640,00 | $ 72.924.811,40 | **1094924 - 1/11/2024** | $ 143.322.372,65 | $ 216.247.184,05 | | Pendiente de pago |
| 22 | 01 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2024 | $ 78.492.600,00 | $ 14.913.594,00 | $ 93.406.194,00 | $ 72.924.811,40 | $ 20.481.382,60 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 122.840.990,05 | $ 122.840.990,05 | | Pagada |
| 23 | 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 | $ 57.224.260,00 | $ 10.872.609,40 | $ 68.096.869,40 | $ - | $ 68.096.869,40 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 54.744.120,65 | $ 54.744.120,65 | | Pagada |
| 24 | 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2025 | $ 19.280.900,00 | $ 3.663.371,00 | $ 22.944.271,00 | $ - | $ 22.944.271,00 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 31.799.849,65 | $ 31.799.849,65 | | Pagada |
| 25 | 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | $ 24.195.550,00 | $ 4.597.154,50 | $ 28.792.704,50 | $ - | $ 28.792.704,50 | $ - | **1094924 - 1/11/2025** | $ 3.007.145,15 | $ 288.007.145,15 | | Pendiente de pago |
| | | | | | | | | **525925 - 07/07/2025** | **$ 285.000.000,00** | | | |
| 26 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 | $ 60.262.940,00 | $ 11.449.958,60 | $ 71.712.898,60 | $ - | $ 71.712.898,60 | $ - | **525925 - 07/07/2025** | $ 216.294.246,55 | $ 216.294.246,55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 898.055.655,00** | **$ 170.630.574,45** | **$ 1.068.686.229,45** | **$ 420.159.864,00** | **$ 648.526.365,45** | **$ -** | | **$ 216.294.246,55** | **$ 216.294.246,55** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | $ 682.984.455,00 | $ 129.767.046,45 | $ 812.751.501,45 |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | $ 215.071.200,00 | $ 40.863.528,00 | $ 255.934.728,00 |
| * | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL** | **$ 898.055.655,00** | **$ 170.630.574,45** | **$ 1.068.686.229,45** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/08/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1274 **CONTRATISTAS:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1295 CONSORCIO MAIC 2024
**CONTRATO DE OBRA No.:** 29102024-1472 CONSORCIO OBRAS DP

**NOMBRE ARL:** SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFAMILIARES
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 a 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14.139.339 | Director de Interventoria | $ 1.947.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 184.800,00 | V | SANITAS | | $ 106.200,00 | COLPENSIONES | | $ 424.800,00 | $ 106.200,00 | $ - | $ - | |
| 2 | PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA | 18.468.702 | Ingeniero Residente | $ 520.000,00 | X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 37.200,00 | V | SANITAS | | $ 21.400,00 | PORVENIR | | $ 85.400,00 | $ 21.400,00 | $ - | $ - | |
| 3 | IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN | 88.244.403 | Ingeniero Residente | $ 1.320.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 139.200,00 | V | SANITAS | | $ 80.000,00 | COLPENSIONES | | $ 320.000,00 | $ 80.000,00 | $ - | $ - | |
| 4 | NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ | 1.070.009.699 | Ingeniero Residente | $ 4.000.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 278.400,00 | V | ALIANZASALUD | | $ 160.000,00 | PROTECCION | | $ 640.000,00 | $ 160.000,00 | $ - | $ - | |
| 5 | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO | 55.058.814 | Profesional Ambiental | $ 3.555.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | INDEPENDIENTE | | $ 99.100,00 | V | | 34792796 | | | 34792796 | | | $ - | $ - | |
| 6 | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | 52.906.496 | Profesional Social | $ 2.370.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | INDEPENDIENTE | | $ 99.100,00 | V | | | | | | | | $ - | $ - | |
| 7 | CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO | 1.005.691.155 | Inspector | $ 1.800.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 125.300,00 | V | SANITAS | | $ 72.000,00 | COLPENSIONES | | $ 288.000,00 | $ 72.000,00 | $ - | $ - | |
| 8 | JESUS ANDRES CHAPID PINILLA | 1.110.601.980 | Inspector | $ 1.800.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 125.300,00 | V | NUEVA EPS | | $ 72.000,00 | COLPENSIONES | | $ 125.300,00 | $ 72.000,00 | $ - | $ - | |
| 9 | SERGIO NARVAEZ RANGEL | 1,060,596,262 | Inspector | $ 234.000,00 | X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 16.800,00 | V | NUEVA EPS | | $ 9.600,00 | PORVENIR | | $ 38.400,00 | $ 9.600,00 | $ - | $ - | |
| 10 | YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | 1.052.398.024 | Ingeniero Auxiliar administrativo | $ 2.600.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | $ 181.000,00 | V | FAMISANAR | | $ 104.000,00 | PORVENIR | | $ 416.000,00 | $ 104.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | **$ 20.146.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE 2 |

FECHA: 1/09/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**FECHA DE INICIO:** 16 DE MARZO 2022

**PLAZO INICIAL:** 4.5 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 DE DICIEMBRE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 999.980.476,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 999.980.476,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | 99.998.047,00 | 28 | 12 | 2021 | 1 | 2 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | 420.159.864,00 | 28 | 12 | 2021 | 1 | 2 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | 199.996.095,20 | 28 | 12 | 2021 | 31 | 7 | 2025 |
| Calidad del servicio | 30 | 299.994.142,80 | 31 | 7 | 2022 | 31 | 7 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101372142

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGURO DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 1/04/2022

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10 | 99.998.047,00 | 29 | 12 | 2021 | 3 | 1 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | 420.159.864,00 | 29 | 12 | 2021 | 3 | 1 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | 199.996.095,20 | 29 | 12 | 2021 | 3 | 7 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30 | 299.994.142,80 | 15 | 8 | 2023 | 15 | 8 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101372142

**Certificado de modificación o anexo No.:** 29

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN PRÓRROGA NUMERO SIETE (7), ADICIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2025. AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 2252 DE 2021, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0886 CPE

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 LD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 7 |

FECHA: 21/02/2022
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
(Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**JUSTIFICACIÓN:**

En base a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO del contrato de Interventoria No 2252 de 2021 que menciona: "*Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).*", nos permitimos solicitar la suma de trescientos setenta y ocho millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos setenta y siete pesos con sesenta centavos moneda corriente ($378.143.877,60) equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor básico del contrato.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS PERSONAL | $ 68.805.360,00 | $ 68.805.360,00 | $ 68.805.360,00 | $ 68.805.360,00 | $ 68.805.360,00 | $ 344.026.800,00 | 91% |
| 2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 5.175.000,00 | $ 5.175.000,00 | $ 5.175.000,00 | $ 5.175.000,00 | $ 5.175.000,00 | $ 25.875.000,00 | 7% |
| 3 | OTROS COSTOS | $ 1.648.415,52 | $ 1.648.415,52 | $ 1.648.415,52 | $ 1.648.415,52 | $ 1.648.415,52 | $ 8.242.077,60 | 2% |
| | **TOTAL** | **$ 75.628.775,52** | **$ 75.628.775,52** | **$ 75.628.775,52** | **$ 75.628.775,52** | **$ 75.628.775,52** | **$ 378.143.877,60** | **100%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 881 CPE

Firma:
Nombre: HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520245135 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 06/10/2023

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2252 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
(Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

**JUSTIFICACIÓN:**

Teniendo en cuenta el contrato de Interventoría No 2252 de 2021, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO del contrato de Interventoría No 2252 de 2021 que menciona: "Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)."

A la fecha esta Interventoría tiene aprobado el 45% del anticipo, tal como se observa en el Plan de Inversión No. 1 de fecha 21 de febrero de 2022. Por lo tanto, nos permitimos solicitar el saldo porcentual del anticipo restante previsto contractualmente, correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato, que equivale a la suma de cuarenta y dos millones quince mil novecientos ochenta y seis pesos con cuarenta centavos moneda corriente ($42.015.986,40).

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS PERSONAL | $ 34,402,680.00 | | | $ 34,402,680.00 | 82% |
| 2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 5,692,500.00 | | | $ 5,692,500.00 | 14% |
| 3 | OTROS COSTOS | $ 1,920,806.40 | | | $ 1,920,806.40 | 5% |
| **TOTAL** | | **$ 42,015,986.40** | **$ -** | **$ -** | **$ 42,015,986.40** | **100%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada,
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 881 CPE

Firma: Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 99100711 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: CAJICA (CUNDINAMARCA)

**ANTICIPO OTORGADO:** 50 %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 420.159.864,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS PERSONAL | $ 378.429.480,00 | $ 182.355.030,00 | | $ 182.355.030,00 | $ 196.074.450,00 |
| 2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 31.567.500,00 | $ 19.134.660,00 | | $ 19.134.660,00 | $ 12.432.840,00 |
| 3 | OTROS COSTOS | $ 10.162.884,00 | $ 2.491.200,00 | | $ 2.491.200,00 | $ 7.671.684,00 |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 420.159.864,00** | **$ 203.980.890,00** | **$ -** | **$ 203.980.890,00** | **$ 216.178.974,00** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (Diciembre 2023):** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 23.247,31 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.564,00 | $ - | jun-22 | 15/09/22 | $ 2.564,00 |
| 2 | $ 2.972,00 | $ - | jul-22 | 15/09/22 | $ 5.536,00 |
| 3 | $ 1.866,00 | $ - | ago-22 | 15/09/22 | $ 7.402,00 |
| 4 | $ 1.742,00 | $ - | sep-22 | 12/10/22 | $ 9.144,00 |
| 5 | $ 1.613,00 | $ - | oct-22 | 15/11/22 | $ 10.757,00 |
| 6 | $ 1.559,00 | $ - | nov-22 | 13/12/22 | $ 12.316,00 |
| 7 | $ 1.610,38 | $ - | dic-22 | 31/07/23 | $ 13.926,38 |
| 8 | $ 1.610,39 | $ - | ene-23 | 31/07/23 | $ 15.536,77 |
| 9 | $ 1.455,28 | $ - | feb-23 | 31/07/23 | $ 16.992,05 |
| 10 | $ 1.610,60 | $ - | mar-23 | 31/07/23 | $ 18.602,65 |
| 11 | $ 1.562,75 | $ - | abr-23 | 31/07/23 | $ 20.165,40 |
| 12 | $ 1.610,64 | $ - | may-23 | 31/07/23 | $ 21.776,04 |
| 13 | $ 1.471,27 | $ - | jun-23 | 31/07/23 | $ 23.247,31 |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 881 CPE

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma:
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contrato de Interventoría registra una ejecución acumulada del 83.27% que corresponde a $1.070.048.422,45 en función de los recursos disponibles para el Contrato 2252-de 2021, la planilla de la Interventoría actualmente registra la actividad del Director, 2 Ingenieros Residentes, 1 Ingeniero Administrativo, 2 Inspector, 1 Topógrafo, 1 Especialista Ambiental y 1 Especialista Social.

- Se realiza control semanal del avance del proyecto y atención de novedades por medio de la realización de comités de obra entre la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los Contratistas de Obra y la Interventoría.

**Contratos de Obra No 17112023-1630**

- El contrato de obra No.17112023-2023 adjudicado al Contratista de Obra INNOVA PROYECTOS SAS, a corte del 20 de diciembre de 2024 fecha de finalización del Contrato de Obra registra una ejecución acumulada de 61.01% equivalente a $544.661.362, frente a la inversión programada acumulada del 100% equivalente a $796.242.128 a la misma fecha, lo cual da como resultado un atraso acumulado del 38.99% respecto de valor total del Contrato de obra.

,

- Respecto a la meta física programada del proyecto el Contratista de Obra INNOVA PROYECTOS SAS ejecuto los 622 m de la obra de Placa Huella que estaban contractualmente establecidos, los cuales a su vez equivalen al 100% de las actividades, cumpliendo así con la meta física objeto del Contrato de Obra.

- En cuanto el componente Socio Ambiental el Contratista de Obra INNOVA PROYECTOS SAS, bajo sus obligaciones contractuales no se encuentra al 100% en calidad y entrega del documento **PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** (PAGA).

  El día 26 de diciembre de 2024 la Entidad Contratante (GOBERNACIÓN DE CALDAS) del proceso de Licitación Publica optó por culminar el proceso de presunto incumplimiento contractual, en contra de la firma INNOVA PROYECTOS SAS Contratista de obra, bajo la premisa del hecho superado, con lo cual se colige que el mencionado Contratista se encuentra al día con el avance de obra y entregables previstos en el contrato de la referencia. Razón por la cual esta Interventoría (CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL) remite concepto de no aprobación al documento **PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** (PAGA) por medio del oficio INV-CIC-2252-2021-298 de fecha 20 de diciembre de 2024.

  Así mismo remite comunicación INV-CIC-2252-2021-303, donde solicita pronunciamiento de la Entidad Contratante (GOBERNACIÓN DE CALDAS) para que indiquen las directrices que se deberán seguir

entorno a la entrega en calidad y recibo final del documento **PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** (PAGA).

**Contrato de Obra No 18092024-1274**

- Dentro del presente periodo y luego de ser aprobada la solicitud de Prórroga hasta el 30 de septiembre de 2025 junto con su Reprogramación No 2 se tiene un porcentaje de obra programado acumulado del 46.29 % correspondiente a $ 1.228.287.316,19 y un porcentaje ejecutado acumulado de obra de 8.56% correspondiente a $ 227.021.685,34 de lo anterior se puede inferir que se presenta una desviación (atraso) según el programa de inversión del 37.73% correspondiente a $ 1.001.265.630,85

- Durante el periodo del presente informe mensual el Contratista de Obra realizó actividades físicas de obra en el tramo de Mejial (PH=100 m) y Florencia (PH=100 m) del Resguardo Indígena de Escopetera y Pirza, en los tramos Brasil (PH=100 m) y Alto Sevilla (PH=90 m) del Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta y en el tramo 1 (PH=130 m) del Resguardo Indígena de la Trina (PH=100 m).

- A corte del presente informe mensual el Contratista de Obra se encuentra atendiendo las observaciones entregadas por la Interventoría y avaladas por la Subdirección de sostenibilidad referente al **PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** (PAGA); el cual debe contener programas y/o proyectos de gestión ambiental, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo y gestión social aplicables al proyecto, con el fin de mitigar los posibles impactos negativos que se pudiera generar y estar bajo los lineamientos de la GMAMC 2022 para realizar su respectivo seguimiento.

.

**Contrato de Obra No 18092024-1295:**

- Dentro del presente periodo y luego de ser aprobada la solicitud de Prórroga hasta el 30 de septiembre de 2025 junto con su Reprogramación No 2 se tiene un porcentaje de obra programado acumulado del 462.29 % correspondiente a $ 2.153.535.316,39 y un porcentaje ejecutado acumulado de obra de 51.84% correspondiente a $ 1.821.313.277,43, de lo anterior se puede inferir que se presenta una desviación (atraso) según el programa de inversión del 9.46% correspondiente a $ 332.222.038,96.

- En relación con las metas físicas para placa huella se tienen terminados 1.416,115 metros de una meta total de 1.766 metros del alcance del contrato; para caminos ancestrales se tienen terminados 1.056,0 metros de una meta total de 3.383 metros del alcance del contrato.

- A corte del presente informe mensual el Contratista de Obra se encuentra atendiendo las observaciones entregadas por la Interventoría y avaladas por la Subdirección de sostenibilidad referente al **PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** (PAGA); el cual debe contener programas y/o proyectos de gestión ambiental, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo y gestión social aplicables al proyecto,

con el fin de mitigar los posibles impactos negativos que se pudiera generar y estar bajo los lineamientos de la GMAMC 2022 para realizar su respectivo seguimiento.

**Contrato de Obra No 29102024-1472**

- Dentro del presente periodo y luego de ser aprobada la solicitud de Prórroga hasta el 30 de septiembre de 2025 junto con su Reprogramación No 2 se tiene un porcentaje de obra programado acumulado del 30.16 % correspondiente a $ 265.231.099,61 y un porcentaje ejecutado acumulado de obra de 26.87% correspondiente a $ 236.319.736,65 de lo anterior se puede inferir que se presenta una desviación (atraso) según el programa de inversión del 3.29% correspondiente a $ 28.911.362,96

- Durante el periodo del presente informe mensual el Contratista de Obra realizó actividades físicas de obra en el tramo de La Quebrada (PH=150 m), El Aguacate (PH=64.83 m) y La Escuela (PH=130 m.

- A corte del presente informe mensual el Contratista de Obra se encuentra atendiendo las observaciones entregadas por la Interventoría y avaladas por la Subdirección de sostenibilidad referente al **PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** (PAGA); el cual debe contener programas y/o proyectos de gestión ambiental, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo y gestión social aplicables al proyecto, con el fin de mitigar los posibles impactos negativos que se pudiera generar y estar bajo los lineamientos de la GMAMC 2022 para realizar su respectivo seguimiento.

# 8. ANEXOS

## 8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

### CONTRATOS DE OBRA No 18092024-1274

### Correspondencia recibida

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO 2025**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** Interventoría Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indigena - CRIDEC en el Departamento de Caldas "Colombia RURAL". GRUPO 2.

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo Electrónico | 1 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Solicitud de reubicación de tramo de placa huella. |
| Correo Electrónico | 1 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Solicitud de segundo anticipo – Consorcio Vial Caldas 2024 |
| Correo Electrónico | 4 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | APU FILTRO |
| Correo Electrónico | 4 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Plan de Manejo de Anticipo |
| Correo Electrónico | 5 de agosto de 2025 | Profesional Ambiental de la Interventoría | RESPUESTA A OFICIO INV-CIC-2252-2021-L1S-035 CORRECCION DE LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA "LA FELISA" |
| Correo Electrónico | 5 de agosto de 2025 | Profesional Ambiental de la Interventoría | Apremio doc PAGA V3 CVC 2024 |
| CVC24-18092024-1274-025 | 6 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Presentación Plan de Gestión Ambiental (PAGA). |
| CVC24-18092024-1274-026 | 8 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Remisión de documentación – (Acta Parcial No. 1) |
| CVC24-18092024-1274-027 | 9 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Remisión de documentación – (Acta Parcial No. 1) |
| CVC24-18092024-1274-028 | 10 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Radicación de las 2° Aprobación de Desembolso de Anticipo a Proveedores |
| CVC24-18092024-1274-029 | 10 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Radicación de las 2° Aprobación de Desembolso de Anticipo a Proveedores |

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO 2025**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** Interventoría Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indigena - CRIDEC en el Departamento de Caldas "Colombia RURAL". GRUPO 2.

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CVC24-18092024-1274-030 | 10 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Radicación de las 2° Aprobación de Desembolso de Anticipo a Proveedores |
| CVC24-18092024-1274-031 | 11 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Remisión de documentos corregidos |
| CVC24-18092024-1274-032 | 12 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Documentación Acta Parcial No.1 |
| CVC24-18092024-1274-033 | 12 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | ESTADO DE DESEMBOLSOS Y EMISIÓN DE ÓRDENES DE OPERACIÓN. |
| CVC24-18092024-1274-034 | 16 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Remisión de oficio enviado al gobernador Resguardo la trina – restricción de tránsito vehicular sobre placa huella “la trina – sector colegio”. |
| CVC24-18092024-1274-035 | 29 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | PLAN DE CONTINGENCIA |

## Correspondencia enviada

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA EN EL MES DE AGOSTO 2025**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** Interventoría Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indigena - CRIDEC en el Departamento de Caldas "Colombia RURAL". GRUPO 2.

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 4 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | AJUSTES - Solicitud de segundo anticipo – Consorcio Vial Caldas 2024 |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-041 | 4 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | RESPUESTA OFICIO CVC24-18092024-1274-022 DEL 06 DE FEBRERO DE 2024 CON RADICADO 25 DE FEBRERO DE 2025 – 2DO CONCEPTO DE REVISIÓN "DOCUMENTOS AMBIENTALES DE LA CANTERA LA FELISSA" – CON REQUERIMIENTOS DE COMPLEMENTACIÓN. |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-042 | 5 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | REITERACIÓN CON APREMIO PRESENTACIÓN DEL PAGA V3 - ATENCIÓN OFICIO INV-CIC-2252-2021-L1S-033 DEL 06/02/2025. |
| Correo electrónico | 7 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 - Supervisor Contrato de Interventoria - Supervisor Contrato de Obra - Supervisora del Convenio - Gestora del Proyecto - Lina Ochoa | ACTA DE REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 05/08/2025 CRIDEC |
| Correo electrónico | 7 de agosto de 2025 | Profesional Ambiental de la Interventoría | Presentación Plan de Gestión Ambiental (PAGA). |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-043 | 9 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Traslado comunicación 2025S-VCAL-056443 "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021. CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL" |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-044 | 12 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Respuesta a los OFICIOS CVC24-18092024-1274-028 del 10 de agosto de 2025 "Radicación de las 2° Aprobación de Desembolso de Anticipo a Proveedores"; CVC24-18092024-1274-029 del 10 de agosto de 2025 "Radicación de las 2° Aprobación de Desembolso de Anticipo a Proveedores" y CVC24-18092024-1274-030 del 10 de agosto de 2025 "Radicación de las 2° Aprobación de Desembolso de Anticipo a Proveedores" y CVC24-18092024-1274-031 del 11 de agosto de 2025 "Remisión de documentos corregidos" |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-045 | 13 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | RESPUESTA A COMUNICADO CVC24-18092024-1274-032 - ACTA PARCIAL No.1 |

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA EN EL MES DE AGOSTO 2025**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA) CAUROMA (SUPIA) CAÑAMOMO – LOMAPRIETA (SUPIA), ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)

**CONTRATISTA** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** Interventoría Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indigena - CRIDEC en el Departamento de Caldas "Colombia RURAL". GRUPO 2.

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 19 de agosto de 2025 | Profesional Social de la Interventoría | COMUNICACIONESGESTION SOCIOAMBIENTAL_CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-046 | 19 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 - Supervisor Contrato de Interventoria - Supervisor Contrato de Obra - Supervisora del Convenio - Gestora del Proyecto - Lina Ochoa | RESPUESTA A REUBICACIÓN TRAMOS DE PLACA HUELLA |
| Correo electrónico | 19 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Ajustes APU |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-047 | 19 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | REITERACIÓN ENTREGA REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-048 | 22 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | OBLIGACIONES GENERALES |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-049 | 22 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | RETRASO PROGRESIVO EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-050 | 22 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | SOLICITUD ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-051 | 22 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | CALIDAD EN EJECUCIÓN DE OBRAS |
| Correo electrónico | 26 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | Fwd: Compromisos reunión CVC2024 20082025 Interventoría contratista SSINVIAS |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-052 | 26 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | ALCANCE REUNIÓN SOCIO AMBIENTAL 20/08/2025 ENTREGA DOCUMENTOS PAGA – CON ATENCIÓN SOLICITUD OFICIO CVC24-18092024-1274-025 DEL 06/08/2025 Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN PROFESIONALES AMBIENTAL Y SOCIAL CONTRATISTA. |
| INV-CIC-2252-2021-L1S-053 | 29 de agosto de 2025 | Consorcio Vial Caldas 2024 | RETRASO PROGRESIVO EN EJECUCIÓN DE OBRA |

## CONTRATOS DE OBRA No 18092024-1295

### Correspondencia recibida

| RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1295** | | | |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO" – LOTE 2 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MAIC 2024 | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021** | | | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2 | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **RADICADO** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **PROCEDENCIA** | **ASUNTO** |
| Correo Electronico | 6 ago 2025, 16:18 | Alexandra Cerón Quintero <coordinadorpipma.ut@gmail.com> | Apremio CONSORCIO MAIC 2024 DOC PAGA V3 |
| Correo Electronico | 9 ago 2025, 11:06 | Lote 2 Riosucio Consorcio Ceef Colombia Rural <lote2.riosucio.consorcioceef@gmail.com> | INV-CIC-2252-2021-L2R-028_traslado comunicación 2025S-VCAL-056443 |
| Correo Electronico | 10 ago 2025, 13:12 | **Ivan Peñaloza** <ivandario.civil@gmail.com> | formatos y datos de obra informe mensual julio 2025 |
| Correo Electronico | 14 ago 2025, 14:28 | Juanita del Pilar Gonzalez Bulla <jgonzalezb@invias.gov.co> | Aceptado: REUNIÓN VIRTUAL_GESTIÓN AMBIENTAL_OBRA CONSORCIO MAIC 2024 |
| Correo Electronico | 19 ago 2025, 8:22 | Tatiana Ospina Cardenas <tospina@invias.gov.co> | Aceptado: REUNION VIRTUAL_GESTION SOCIAL_CONSORCIO MAIC 2024 |
| Correo Electronico | 19 ago 2025, 9:06 | Marcela Pereira <marcelapp13@gmail.com> | Accepted: REUNION VIRTUAL_GESTION SOCIAL_CONSORCIO MAIC 2024 @ Tue Aug 19, 2025 10am - 11am (GMT-5) (lote2.riosucio.consorcioceef@gmail.com) |
| Correo Electronico | 19 ago 2025, 17:54 | Yinna Bedoya <gestionsocialyinnabedoya@gmail.com> | Saludo y remisión oficio llamado de atención por inasistencia MAIC a comité social INVIAS |
| Correo Electronico | 20 ago 2025, 21:08 | Alexandra Cerón Quintero <coordinadorpipma.ut@gmail.com> | Compromisos reunión 19082025 Interventoria contratista SSINVIAS |
| Correo Electronico | 27 ago 2025, 11:20 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> | ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA |

## Correspondencia enviada

| RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1295** | | | |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO" – LOTE 2 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MAIC 2024 | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021** | | | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2 | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **RADICADO** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **PROCEDENCIA** | **ASUNTO** |
| Correo Electronico | 3 ago 2025, 13:45 | gpoloche@gmail.com, consorcioceefcolombiarural@gmail.com, gvr192@gmail.com | Informe semanal 25 (25-31 julio) riosucio |
| Correo Electronico | 6 ago 2025, 15:20 | Ing. Alexandra Ceron" <coordinadorpipma.ut@gmail.com> | APREMIO POR INCUMPLIMIENTO EN PRESENTACIÓN DOCUMENTO PAGA |
| Correo Electronico | 6 ago 2025, 20:23 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> | ACTA DE REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 05/08/2025 CRIDEC |
| Correo Electronico | 7 ago 2025, 9:57 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> Cc: jguevara@invias.gov.co, ltibata@invias.gov.co, lalozano@invias.gov.co, jcgiraldo@caldas.gov.co, jibarra@invias.gov.co, lmvelez@invias.gov.co Cco: "Ing. Alexandra Ceron" <coordinadorpipma.ut@gmail.com>, gpoloche@gmail.com | OFICIO INV-CIC-2252-2021-L2R-027_APREMIO DE PRESENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL VERSIÓN No. 3 - (PAGA) – REITERACIÓN ATENCIÓN OBSERVACIONES OFICIO No. INV-CIC-2252-2021-L2R-024 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 |

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE AGOSTO DE 2025.**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1295**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO" – LOTE 2

**CONTRATISTA** CONSORCIO MAIC 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo Electronico | 9 ago 2025, 11:06 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com>, Información Consorcio Maic 2024 <infomaic2024@gmail.com> Cc: ltibata@invias.gov.co, jguevara@invias.gov.co, jcgiraldo@caldas.gov.co, lmvelez@invias.gov.co, lmochoalc@caldas.gov.co, jibarra@invias.gov.co, spuerta@invias.gov, "Ing. Alexandra Ceron" <coordinadorpipma.ut@gmail.com>, consorcioceefcolombiarural@gmail.com Cco: mariocabrera1493@gmail.com | INV-CIC-2252-2021-L2R-028_traslado comunicación 2025S-VCAL-056443 |
| Correo Electronico | 9 ago 2025, 20:56 | gpoloche@gmail.com, consorcioceefcolombiarural@gmail.com, gvr192@gmail.com | Informe semanal 26 (1 a7 de agosto 2025) |
| Correo Electronico | 19 ago 2025, 12:36 | gestionsocialyinnabedoya@gmail.com | COMUNICACIONES GESTION SOCIOAMBIENTAL_CONSORCIO MAIC 2024 |
| Correo Electronico | 20 ago 2025, 12:22 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com>, Información Consorcio Maic 2024 <infomaic2024@gmail.com> Cc: gestionsocialyinnabedoya@gmail.com, mpereira@invias.gov.co, jcgiraldo@caldas.gov.co, jguevara@invias.gov.co | OFICIO INV-CIC-2252-2021-L2R-029_LLAMADO DE ATENCIÓN POR INASISTENCIA PROFESIONAL SOCIAL COMITÉ SOCIAL INVIAS 19 DE AGOSTO DE 2025 |
| Correo Electronico | 20 ago 2025, 12:35 | Información Consorcio Maic 2024 <infomaic2024@gmail.com>, CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> Cc: gestionsocialyinnabedoya@gmail.com, mpereira@invias.gov.co, jcgiraldo@caldas.gov.co, jguevara@invias.gov.co, ltibata@invias.gov.co | ACTA REUNIÓN GESTIÓN SOCIAL_CONTRATISTA DE OBRA:CONSORCIO MAIC 2024 _19 DE AGOSTO DE 2025 |

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE AGOSTO DE 2025.**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1295**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO" – LOTE 2

**CONTRATISTA** CONSORCIO MAIC 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | 20 ago 2025, 21:08 | "consorciomaic2024@gmail.com" <consorciomaic2024@gmail.com>, "infomaic2024@gmail.com" <infomaic2024@gmail.com>, CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL <consorcioceefcolombiarural@gmail.com>, Lote 2 Riosucio Consorcio Ceef Colombia Rural <lote2.riosucio.consorcioceef@gmail.com> | Compromisos reunión 19082025 Interventoria contratista SSINVIAS |
| Correo Electronico | 22 ago 2025, 17:24 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> Cc: Juan Carlos Giraldo Mejia <jcgiraldo@caldas.gov.co>, hchicaac@gobernaciondecaldas.gov.co, Julio Enrique Guevara Jaramillo <jguevara@invias.gov.co>, ltibata@invias.gov.co | SOLICITUD ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA |
| Correo Electronico | 22 ago 2025, 17:39 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> Cc: Juan Carlos Giraldo Mejia <jcgiraldo@caldas.gov.co>, hchicaac@gobernaciondecaldas.gov.co, Julio Enrique Guevara Jaramillo <jguevara@invias.gov.co>, ltibata@invias.gov.co | OBLIGACIONES GENERALES |
| Correo Electronico | 22 ago 2025, 18:52 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com> Cc: Juan Carlos Giraldo Mejia <jcgiraldo@caldas.gov.co>, hchicaac@gobernaciondecaldas.gov.co, Julio Enrique Guevara Jaramillo <jguevara@invias.gov.co>, ltibata@invias.gov.co | ATRASO EN EJECUCIÓN DE OBRA |

**RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE AGOSTO DE 2025.**

**CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1295**

**OBJETO** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO" – LOTE 2

**CONTRATISTA** CONSORCIO MAIC 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021**

**OBJETO** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2

**INTERVENTOR** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

| RADICADO | FECHA DE ELABORACIÓN | PROCEDENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo Electronico | 26 ago 2025, 8:49 | CONSORCIO MAIC 2024 <consorciomaic2024@gmail.com>, Información Consorcio Maic 2024 <infomaic2024@gmail.com>, Juanita del Pilar Gonzalez Bulla <jgonzalezb@invias.gov.co> Cc: "Ing. Alexandra Ceron" <coordinadorpipma.ut@gmail.com> | Compromisos reunión 19082025 Interventoria contratista SSINVIAS |

## CONTRATOS DE OBRA No 29102024-1472

### Correspondencia enviada

| RELACIÓN CORRESPONDENCIA REMITIDA POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No: 29102024-1472** | | | |
| **OBJETO** | "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA - MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS" | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS DP | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2252 DE 2021** | | | |
| **OBJETO** | Interventoría Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indigena - CRIDEC en el Departamento de Caldas "Colombia RURAL". GRUPO 2. | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| **CONSECUTIVO** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
| INV-CIC-2252-2021-MFA-018 | 9 de agosto de 2025 | Consorcio Obras DP | Traslado comunicación 2025S-VCAL-056443 "Seguimiento de gestión social y ambiental convenio N°1266-2021. CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL" |
| Correo electrónico | 9 de agosto de 2025 | Ingeniero Santiago Puertas | INV-CIC-2252-2021-MFA-018_traslado comunicación 2025S-VCAL-056443 |
| Correo electrónico | 26 de agosto de 2025 | Consorcio Obras DP | Re: Compromisos reunión Obras DP 21082025 Interventoría contratista |

## 8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades de seguimiento y acompañamiento a los contratos de obra en las actividades físicas de obra:

### 8.2.1. Registro Fotográfico - Municipio de Risaralda, Resguardo Indígena La Albanía

- **Tramo 1**


Fotografía 82.Tramo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 2**

Fotografía 83. Tramo 2

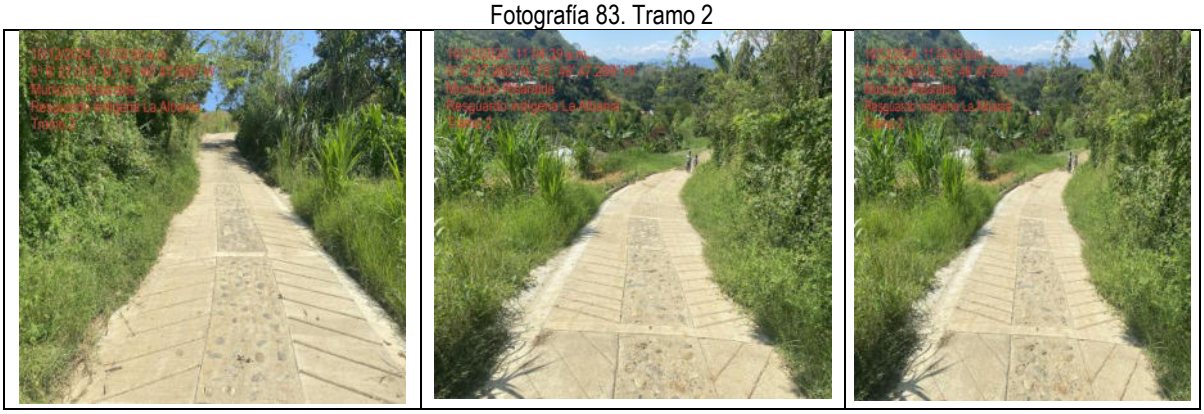

Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 3**

Fotografía 84. Tramo 3




Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 4**

Fotografía 85. Tramo 4



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 8.2.2. Registro Fotográfico - Municipio de Belalcázar, Resguardo Indígena Totumal

- **Tramo 1 – Centro Poblado**

Fotografía 86.Tramo 1 – Centro Poblado



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 2 – La Pampa**

Fotografía 87. Tramo 2 – La Pampa



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 3 – El Brasil**

Fotografía 88. Tramo 3 – El Brasil



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 8.2.3. Registro Fotográfico - Municipio de Neira Resguardo indígena Damasco

- **Tramo 1**

Fotografía 89. Tramo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 2**

Fotografía 90. Tramo 2



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Tramo 3**

Fotografía 91. Tramo 3



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 8.2.4. Registro Fotográfico - Municipio de Supia

**Semana comprendida entre el 1 al 7 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDÍGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA**

- **Mejial (PH=100 m)**

Fotografía 92.Mejial



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Florencia (PH=100 m)**

Fotografía 93. Florencia



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA**

- **Brasil (PH=100 m)**

Fotografía 94. Brasil



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Alto Sevilla (PH=90 m)**

Fotografía 95. Alto Sevilla



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 8 al 14 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA

- **Mejial (PH=100 m)**

Fotografía 96. Mejial



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA

- **Brasil (PH=100 m)**

Fotografía 97. Brasil



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Alto Sevilla (PH=90 m)**

Fotografía 98. Alto Sevilla



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDÍGENA DE LA TRINA

- **Tramo 1 (PH=130 m)**

Fotografía 99. Tramo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 15 al 21 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE ESCOPETERA Y PIRZA

- **Mejial (PH=100 m)**

Fotografía 100. Mejial





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA

- **Brasil (PH=100 m)**

Fotografía 101. Brasil



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Alto Sevilla (PH=90 m)**

Fotografía 102. Alto Sevilla



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDÍGENA DE LA TRINA

- **Tramo 1 (PH=130 m)**

Fotografía 103. Tramo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 22 al 30 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA

- **Brasil (PH=100 m)**

Fotografía 104. Brasil



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Alto Sevilla (PH=90 m)**

Fotografía 105. Alto Sevilla



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDÍGENA DE LA TRINA

- **Tramo 1 (PH=130 m)**

Fotografía 106. Tramo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 8.2.5. Registro Fotográfico - Municipio de Riosucio

**Semana comprendida entre el 1 al 7 de agosto de 2025**

**RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA**

- **Paneso**

Fotografía 107. Paneso



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Amolador**

Fotografía 108. Amolador



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO

- **El Carmelo**

Fotografía 109. El Carmelo



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **La Escuela**

Fotografía 110. La Escuela



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **La Padrera**

Fotografía 111. La Pradera



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Costa Rica**

Fotografía 112. Costa Rica



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDIGENA LA MONTAÑA

- **La Candelaria**

Fotografía 113. La Candelaria



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **La Estancia**

Fotografía 114. La Estancia



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **El Salado**

Fotografía 115. El Salado



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 8 al 14 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA

- **Planadas**

Fotografía 116. Planadas



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO

- **San Jose 2**

Fotografía 117. San Jose 2



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Costa Rica**

Fotografía 118. Costa Rica



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDIGENA LA MONTAÑA

- **La Candelaria**

Fotografía 119. La Candelaria



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **La Esperanza**

Fotografía 120. La Esperanza



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 15 al 21 de enero de 2025**

## RESGUARDO INDIGENA LA MONTAÑA

- **La Candelaria**

Fotografía 121. La Candelaria



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **La Esperanza**

Fotografía 122. La Esperanza



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA

- **Planadas**

Fotografía 123. Planadas



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO

- **San Jose 2**

Fotografía 124. San Jose 2



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **Costa Rica**

Fotografía 125. Costa Rica



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 22 al 30 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA

- **Portachuelo 1**

Fotografía 126. Portachuelo 1



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

### 8.2.6. Registro Fotográfico - Municipio de Marmato, Filadelfia y Anserma

**Semana comprendida entre el 1 al 7 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA

- **LA QUEBRADA (PH=150 m)**

Fotografía 127. La Quebrada



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **EL AGUACATE (PH=64.83 m)**

Fotografía 128. El Aguacate



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 8 al 14 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA

- **LA QUEBRADA (PH=150 m)**

Fotografía 129. La Quebrada



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **EL AGUACATE (PH=64.83 m)**

Fotografía 130. El Aguacate



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **LA ESCUELA (PH=130 m)**

Fotografía 131. La Escuela



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 15 al 21 de enero de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA

- **LA QUEBRADA (PH=150 m)**

Fotografía 132. La Quebrada



Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **EL AGUACATE (PH=64.83 m)**

Fotografía 133. El Aguacate





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

- **LA ESCUELA (PH=130 m)**

Fotografía 134. La Escuela





Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

**Semana comprendida entre el 22 al 30 de agosto de 2025**

## RESGUARDO INDÍGENA DE ANSEA

- **LA ESCUELA (PH=130 m)**

Fotografía 135. La Escuela







Fuente: Consorcio Ceef Colombia Rural

## 8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta copia de la bitácora del periodo correspondiente al informe mensual de interventoría No 26.

## CONTRATOS DE OBRA No 18092024-1274

## CONTRATOS DE OBRA No 18092024-1295

Día 1 Agosto 2025 Viernes

Clima: lluvia en la tarde (3HF)

Intervenantes: Residente, Inspector

Obra: Residente, Ambiental

Inicio de labores de Acopio y Almacenamiento de materiales, se delimitaron áreas designadas y se recibieron materiales.

Día 2 Agosto 2025 Sábado

Clima: lluvia mañana (2HS)

Intervenantes: Residente, Inspector

Obra: Residente, Ambiental

Continuación de labores de Acopio y Almacenamiento de materiales, se realizó limpieza del área designada y se organizaron los materiales recibidos.

Día 3 Agosto 2025 Domingo

Clima: Seco

Inspector

Obra: Día de descanso laboral

Dia 4 Agosto 2025 (Viernes)
Clima: Seco
Interventoria: Residente y Director
Obra: Residente y Ambiental

Se ejecutaron trabajos en el vertedero
la Candelaria, logrando un avance de 5m
lineales. Se realizo mantenimiento y se realizo

Dia 5 Agosto 2025 Martes
Clima: Seco
Interventoria: Todos
Obra: Todos

Se realizo reunion para establecer fechas
del proyecto, participaron representantes del
invias, la gobernacion, Director de Infraestructura
del ministerio de trasporte, se brindaron
fecha para realizacion y cumplimiento de
obras.

Dia 6 Agosto 2025 Miercoles.
Clima: lluvia en la mañana (1HS)
Interventoria: Residente, Inspector.
Obra: Residente, Ambiental:

Se realizo visita tecnica en el resguardo de la montaña para la georeferenciacion de los puntos de inicio y final de las placas huellas de Ubarba y la Cabaña, en la Cabaña se cambiaron los puntos establecidos, con lo cual quedaron en acuerdo con los nuevos puntos, en Ubarba se dejaron los mismos puntos establecidos, todas las partes estuvieron de acuerdo con las decisiones.

Dia 7 Agosto 2025 Jueves
Clima: lluvia suave en la tarde (3HS)
Interventorca: Residente, Inspector.
Obra: Residente Ambiental

Se realizaron labores de acopio y almacenamiento de materiales para inicio de Obra.

Dia 8 Agosto 2025 Viernes
Clima: lluvia en la tarde (4Hs)
Interventoria Residente, Inspector
Obra: Residente, Ambiental, social.

PH planadas: Replanteo y excavación inicial en el tramo. Se avanzaron 10 m lineales.
PH la Esperanza: Continuación de excavación y confinamiento en area de trabajo
CA Condelaria: Continuación de conformación de subrasante.
PH Costa Rica: Se continuo con la instalacion de berma.
PH San Jose 2: Se realizo excavación y replanteo.

Dia 9 Agosto 2025 Sabado
Clima: lluvia en la tarde (3Hs)
Interventoria: Inspector, Residente.
Obra: Residente, Ambiental

Se realizaron labores de acopio y almacenamiento de materiales.

Dia 10 Agosto 2025 Domingo
Clima: lluvia en la mañana (3Hs)
Interventoria: Residente, Inspector
Obra: Residente, Ambiental

Dia de descanso laboral.

Dia 11 Agosto 2025 Lunes
Clima: lluvia en la madrugada (5HF)
Interventoria: Residente, Inspector.
Obra: Residente, Ambiental

PH Planadas: Armado de la parrilla de Varillas para el refuerzo de las huellas y preparación de formaletas.
PH Esperanza: Vaciado de la cuneta y las bermas en concreto.
CRA La Candelaria: Colocación de malla electrosoldada.

Paul

Dia 12 Agosto 2025 Martes.
Clima: lluvia en la madrugada (3HF)
Interventoria: Residente, Inspector.
Obra: Residente.

PH Costa Rica inicio de vaciado en huella con esfuerzo de Varilla.

PH San Jose 2 Armado de varilla para la huella, se realizo vaciado.

Paul

Dia 13 Agosto 2025 Miercoles

Clima: lluvia en la madrugada (2HS)

Interventoria: Residente, Inspector

Obra: Residente, Ambiental

PH planadas vaciado de concreto en las huellas, se cubrio el area para el curado.

PH La Esperanza · curado de concreto y desencofrado

Ca Candelaria vaciado de ciclope y de huellas en 21 m.

Dia 14 Agosto 2025 Jueves.

Clima: Seco

Interventoria: Residente, Inspector

Obra: Residente, Ambiental

PH Costa Rica: vaciado en huella y ciclope, berma cuneta.

PH San Jose 2 Vaciado de bordillo y cuneta en 10 m.

Dia 15 Agosto 2025 Viernes.
Clima: Seco.
Interventoria.. Residente, Inspector.
Obra: Residente, Ambiental.

PH planadas se realizo vaciado de cunetas y las demas
PH La Esperanza: se realico el vaciado de las bermas y las cunetas.

Dia 16 Agosto 2025 Sabado.
Clima: lluvia en la tarde (3Hs)
Interventoria: Residente, Inspector.
Obra: Residente, Ambiental

Se realizo acopio de materiales y almacenamiento de ellos.

Dia 17 Agosto 2025 Domingo.
Clima: (3Hs) lluvia en la madrugada.
Interventoria: Residente, Inspector.
Obra: Residente, Ambiental

Dia de descanso laboral.

Dia 18 Agosto 2025 Lunes
Clima: lluvia en la madrugada (3HF)
Interventoria: Residente, Inspector.
Obra: Residente, Ambiental

Dia Festivo, No laborable.

Dia 19 Agosto 2025 Martes.
Clima: lluvia en la madrugada (4HF)
Interventoria: Todos.

El objetivo de la reunión en Manizales con la Ingeniera del Invias y el personal de Interventoria es revisar que las actividades se esten ejecutando de manera correcta. Y asegurando la calidad de la Obra, tambien confirmar los fechas claves para su cumplimiento.

Dia 20 Agosto 2025 Miercoles.
Clima: Seco.
Interventoria: Inspector
Obra: Residente, Ambiental.

Se realizo acta de vecindad por parte de la Ingeniera Ambiental y el residente del contratista con representación de representante de resguardo de Cotamomo-Lomapineta en el tramo de Portachuelo.

Dia 21 Agosto 2025 Jueves.
Clima: lluvia en la madrugada (4HF)
Interventoria: Inspector.
Obra: Residente. Ambiental.

Se realizo acopio de materiales y almacenamiento

Dia 22 Agosto 2025 Viernes
Clima: lluvia en la madrugada (5HF)
Interventoria: Inspector.
Obra: Residente

Continuación de laborer de acopio y almacenamiento de materiales para su posterior traslado al frente de Portachuelo 1 y 2.

Dia 23 Agosto 2025 sabado
Clima: lluvia en la mañana (4HS)
Interventoria: Inspector.
Obra: Residente, Ambiental.

Se realizaron labores de acopio de materiales y almacenamiento

Dia 24 Agosto 2025 Domingo
Clima: seco
Interventoria: Inspector.
Obra: Residente, Ambiental.

Dia de descanso laboral

Dia 25 Agosto 2025 lunes.
Clima: lluvia en la madrugada (3HS)
Interventoria: Inspector.
Obra: Residente, Ambiental.

PH portachuelo se realiza descapote del terreno en el tramo inicial de la via en 11 m lineales, de manera paralela se llevo acabo el replanteo preliminar.

Dia 26 Agosto 2025 Martes
Clima: Seco
Interventoria: Inspector.
Obra: Residente, Ambiental

Se continuo con labores de descapote y excavación manual, tambien se siguio paralelamente con el replanteo y se preparo el area para el material de base.

Dia 27 Agosto 2025 Miercoles
Clima: Seco
Interventoria: Inspector
Obra: Residente, Ambiental

Se realizo acopio de materiales, tambien se instalo material de subbase, para posterormente compactar.

Dia 28 Agosto 2025 Jueves

Clima: seco

Interventoria: Inspector

Obra: Rendente, Ambiental:

Se realiza acompañamiento para realizar actas de vecindad en los frentes del Resguardo de San Lorenzo, Buenos Aires, tres Esquinas y Once Casas, participaron el residente, Ambiental y representante del Resguardo.

Dia 29 Agosto 2025 Viernes

Clima: Seco

Interventoria: Inspector

Obra: Residente, Ambiental

Se Instala encofrado y acero de refuerzo para posterior vaciado de concreto, se vaciaron 4 m lineales de vigas y huellas.

Dia 30 Agosto 2025 Sabado.

Clima: Seco

Interventoria: Residente, Inspector.

Obra: Residente.

Se realiza acopio de materiales y encofrado, se instala acero de refuerzo. de 9 m lineales.

Dia 31 Agosto 2025 Domingo

Clima: seco

Interventoria: Residente, Inspector

Obra: Residente

Dia de descanso Laboral

**CONTRATOS DE OBRA No 29102024-1472**

Manizales, 23 de septiembre de 2025

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2252 DE 2021, CUYO OBJETO ES**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

**CERTIFICA:**

Que revisados y constatados los soportes por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentada por el contratista: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL con Nit No. 901.550.980-0, ha cumplido con los requisitos de ley para el Contrato No. 2252-2021, **durante el periodo de agosto de 2025.**

Se expide en Manizales, a los 23 días de septiembre de 2025.

**ING. JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
