

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
321		ACOPLE RANURADO 4" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 0,00	100%
322		STRAP DE 4" X 3/4" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 3.048.910,62	100%
323		TRANS PVC C-900 A ACERO CARBONO 4" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 1.320.988,02	0%
324		RESTRICTOR TUBO-ACCESORIO DE 4" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 469.212,03	0%
325		VALVULA EXPULSORA AIRE ¾" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 1.176.230,72	100%
326		SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 502.117,56	100%
327		STRAP 2"X1" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 1.071.429,67	100%
328		VALVULA MARIPOSA 2" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 761.298,51	100%
329		VALVULA CHEQUE 2" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 1.136.140,71	100%
330		SENSOR FLUJO 2" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 564.240,71	100%
331		VALVULA PRUEBA Y DRENAJE 1. ¼" UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 6.595.458,03	100%
332		ROCIADOR COLGANTE QR, TEM.ORDINARIA, COBERTURA NORMAL, K=5,6 (STOCK)	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 10.621.576,84	100%
333		PUNTO DE ROCIADOR (50 cm Tubería, copa 1"x1/2" y tapón 1/2") UL/FM	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 2.165.342,41	100%
334		SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2"	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 822.530,52	100%
335		SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1. ½"	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 318.778,39	100%
336		SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1. ¼"	22 días	mar 08/04/25	sáb 03/05/25	$ 1.678.812,45	100%
337		SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1"	22 días	mar 08/04/25	sáb 03/05/25	$ 0,00	100%
338		ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	22 días	mar 08/04/25	sáb 03/05/25	$ 0,00	100%
339		PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	55,13 días	mar 08/04/25	vie 06/06/25	$ 0,00	100%
340		PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	22 días	mar 08/04/25	sáb 03/05/25	$ 0,00	100%
341		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**316,88 días**	**lun 23/12/24**	**jue 27/11/25**	**$ 84.869.864,24**	**49%**
342		Suministro e instalacion de salida de luminaria en tuberia PVC 3/4" retardante al fuego" con conductor 1x12+1x12+1x14T libre de halogeno, incluye caja 5800 para conexión, elementos de fiojacion, interuptor y accesorios, (ni incluye luminaria)	121,13 días	lun 23/12/24	jue 08/05/25	$ 37.620.635,36	100%
343		Suministro e instalacion de salida para tomacorriente monofásico con polo a tierra en tubería PVC 3/4" retardante al fuego y conductor 1x12+1x12+1x14T libre de halogeno AWG incluye caja 5800, accesorios y elementos de fijación para primer piso	121,13 días	lun 23/12/24	jue 08/05/25	$ 14.925.013,95	100%
344		Suministro e instalacion de tablero de distribución MONOFASICO (T-REG) de 6 circuitos , incluye protecciones 4x(1x20)	119,13 días	jue 26/12/24	jue 08/05/25	$ 702.688,21	100%
345		Suministro e instalacion de tablero de distribución TRIFASICO (T1) de 36 circuitos con espacio para totalizador, incluye protecciones 1x(3x70A) - 25x(1x20) - 1x(1x30)	306 días	vie 27/12/24	mié 19/11/25	$ 2.376.795,12	27%
346		Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra	121,13 días	lun 23/12/24	jue 08/05/25	$ 5.223.379,49	100%
347		Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra leviton toma regulada	121,13 días	lun 23/12/24	vie 09/05/25	$ 886.988,97	100%
348		Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra GFCI	121,13 días	lun 23/12/24	vie 09/05/25	$ 1.003.245,60	100%
349		Suministro e instalación de acometida trifasica a una distancia de 10 mts incluyendo accesorios (caja de medidor-. Ducto de entrada- pin de corte proteccion - cable de bajante 3x6 +6 - puesta a tierra)	299 días	jue 09/01/25	mié 19/11/25	$ 6.624.773,89	23%
350		Suministro e instalación de parcial trifasica a una distancia de 30 mts incluyendo accesorios (cable 1x6 F + 1x6 F + 1x6 F + 1x6N + 1X8T incluye ductos de proteccion 1 y 1/2"	279 días	jue 30/01/25	mié 19/11/25	$ 6.970.573,89	21%
351		Certificado Retie y Retilap	148,13 días	lun 23/12/24	jue 05/06/25	$ 0,00	0%

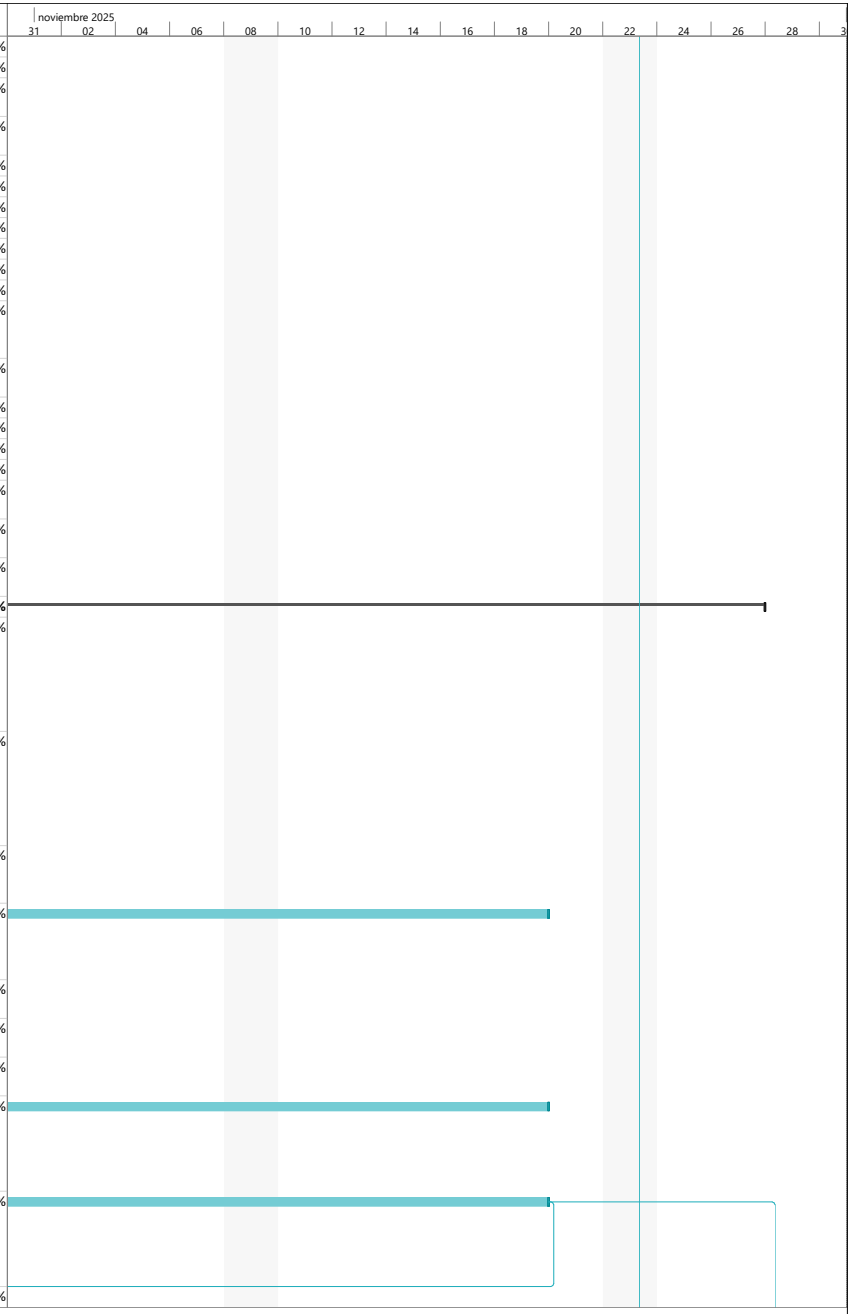

Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 23/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
352		**INSTALACION ILUMINACION DE EMERGENCIA**	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24	$ 0,00	100%
353		Suministro e instalacion de salida de luminaria de emergencia en tuberia PVC 1/2" con conductor 1x12+1x12+1x12, incluye caja 5800 para conexión, elementos de fiojacion, interuptor y accesorios, (ni incluye luminaria)	103,13 días	vie 14/02/25	jue 05/06/25	$ 2.012.039,96	100%
354		**SISTEMA DE UPS.**	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24	$ 0,00	100%
355		Suministro e instalación de sistema de UPS 3KVA/120V Online Doble Conversion, MONOFASICA, Voltaje entrada: 120V AC, Voltaje salida: 120V AC, PWM, DSP, TVSS, Torre, Incluye Baterías.	272,88 días	jue 13/02/25	jue 27/11/25	$ 6.523.729,80	0%
356		**MONTAJE ASCENSOR**	**274,5 días**	**mié 12/02/25**	**jue 27/11/25**	**$ 152.987.293,00**	**17%**
357		SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ELECTROMECANICO DE USO PARA PASAJEROS, 2 PARADAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450 KG, ESPECIFICACIONES DE LA CABINA DE 1,00mX1,25m Y ALTURA DE 2.20m; PUERTAS 0,80mX2,00m ACABADO PUERTA PISO PRINCIPAL EN ACERO INOXIDABLE,	274,5 días	mié 12/02/25	jue 27/11/25	$ 152.987.293,00	17%
358		**IMPERMEABILIZANTE**	**30 días**	**sáb 01/02/25**	**mar 04/03/25**	**$ 59.995.116,73**	**100%**
359		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA EN FRIO	30 días	sáb 01/02/25	mar 04/03/25	$ 59.995.116,73	100%
360		**CUBIERTA**	**40 días**	**jue 14/11/24**	**vie 27/12/24**	**$ 7.094.573,12**	**100%**
361		BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	40 días	jue 14/11/24	vie 27/12/24	$ 7.094.573,12	100%
362		**PISOS**	**20 días**	**jue 12/12/24**	**jue 09/01/25**	**$ 9.826.839,28**	**100%**
363		MEDIA CAÑA EN CONCRETO	20 días	jue 12/12/24	jue 09/01/25	$ 9.826.839,28	100%
364		**NO PREVISTOS MODIFICATORIO 04**	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	$ 0,00	100%
365		**MAMPOSTERIA**	**10 días**	**lun 14/04/25**	**vie 25/04/25**	**$ 1.257.315,50**	**100%**
366		DOVELA, GROUTING 3000 PSI	10 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	$ 1.257.315,50	100%
367		**CARPINTERIA METALICA**	**191,25 días**	**jue 15/05/25**	**vie 28/11/25**	**$ 89.459.408,56**	**33%**
368		BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO DE 2" AGUAS NEGRAS CALIBRE 16 PARALES EN TUBO 1 1/2 CUADRADO, HILOD EN HILO DE 1" CALIBRE 18 CON PLATINAS DE ANCLJE, CON ACABADO EN PINTURA ELECROESTATICA	177,75 días	jue 15/05/25	vie 14/11/25	$ 20.611.616,48	0%
369		PUERTA VIDRIO TIPO PV01 (1,60 X 2,20) : Hoja en estructura perimetral perfil tubular rectangular 6cm x 3cm acabado en esmalte horneado color negro, vidrio templado de 6mm, trasparente incoloro; Marco en perfil tubular de aluminio rectangular de 6cm x 3cm	75,38 días	jue 15/05/25	jue 31/07/25	$ 12.321.971,20	100%
370		PUERTA VIDRIO TIPO PV01 (1,20 X 2,20) : Hoja en estructura perimetral perfil tubular rectangular 6cm x 3cm acabado en esmalte horneado color negro, vidrio templado de 6mm, trasparente incoloro; Marco en perfil tubular de aluminio rectangular de 6cm x 3cm	75,38 días	jue 15/05/25	jue 31/07/25	$ 11.551.848,00	100%
371		PUERTA VIDRIO TIPO PV01 (1,45 X 2,20) : Hoja en estructura perimetral perfil tubular rectangular 6cm x 3cm acabado en esmalte horneado color negro, vidrio templado de 6mm, trasparente incoloro; Marco en perfil tubular de aluminio rectangular de 6cm x 3cm	30 días	sáb 14/06/25	mié 16/07/25	$ 2.887.962,00	100%
372		CELOSIA TUBULAR PARA CUBIERTA ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTUA Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN FABRIACION, SUMINISTRO Y MONTAJE.	30 días	sáb 14/06/25	mié 16/07/25	$ 0,00	0%
373		VIDRIO LAMINADO TEMPLEDO 4 MM + 4MM	161,25 días	sáb 14/06/25	vie 28/11/25	$ 42.086.010,88	0%

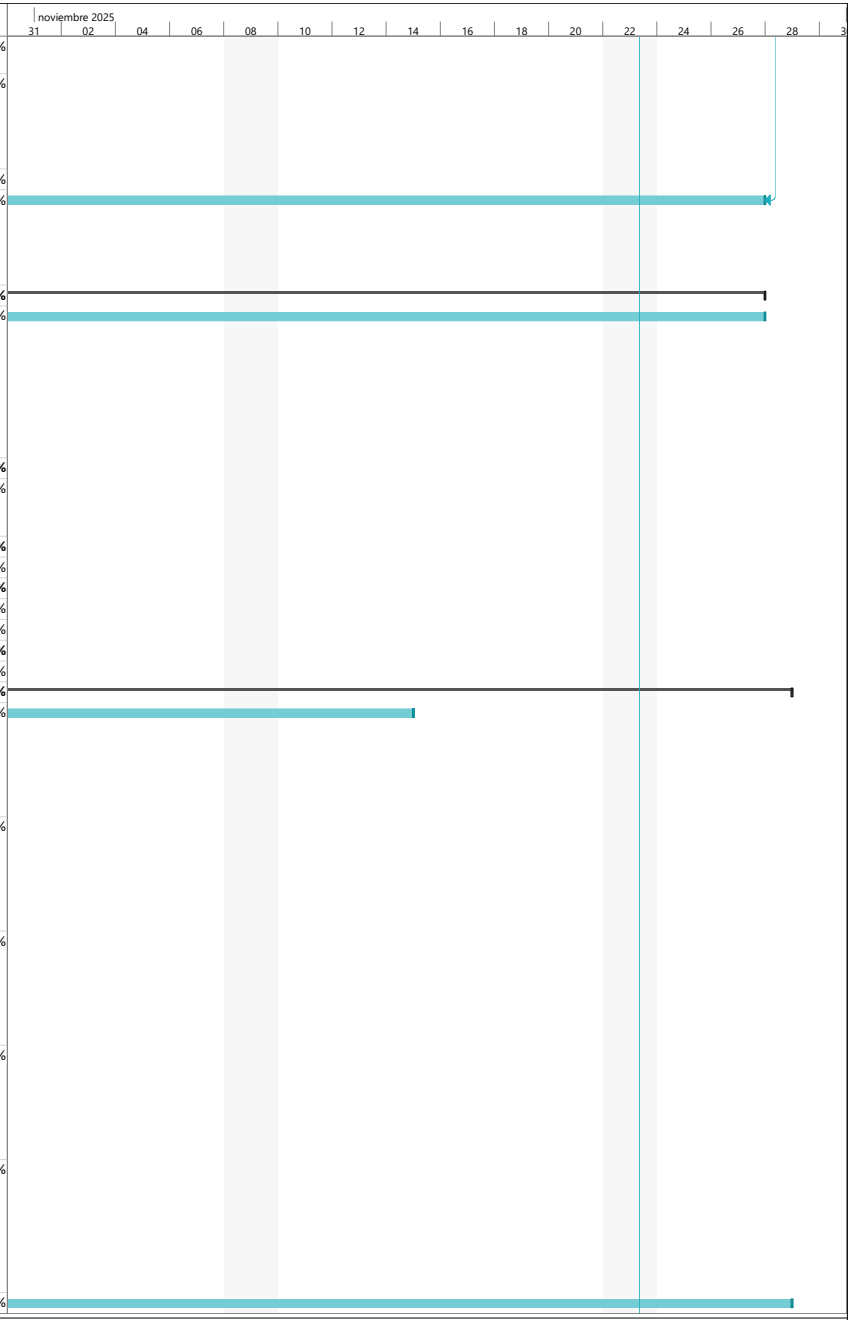

Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 23/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
374		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**143,75 días**	**mar 24/12/24**	**mar 03/06/25**	**$ 3.223.377,09**	**100%**
375		RED SANITARIA PVC-S 4"	5 días	mar 24/12/24	sáb 04/01/25	$ 1.595.676,54	100%
376		TAPA REGISTRO 20 X 20	5 días	jue 29/05/25	mar 03/06/25	$ 184.969,75	100%
377		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	5 días	vie 18/04/25	mié 23/04/25	$ 882.521,50	100%
378		REGISTRO 1/2"	5 días	jue 29/05/25	mar 03/06/25	$ 560.209,30	100%
379		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**213,75 días**	**mar 22/04/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 151.959.720,91**	**17%**
380		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR, BAJATE EN TUBO IMC DE 2", CAPACETE, CINTA BANDIT, TENSOR DE CABLEADO, CONECTORES DE PRESIÓN PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DEFINITIVA.	213,75 días	mar 22/04/25	sáb 29/11/25	$ 1.579.412,24	0%
381		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFERENCIA Y PROTECCIÓN DE 150 A, 2 TOTALIZADORES DE 60 A Y 2 TOTALIZADORES DE 50 A, INCLUYE MARQUILLAS, BARRAJE EN COBRE DE 250 A Y FRENTE MUERTO, CON CERTIFICACIÓN RETIE.	213,75 días	mar 22/04/25	sáb 29/11/25	$ 17.896.480,00	0%
382		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE 2/0 EN COBRE (3X2/0 + 1X2/0 + 1X2)	177 días	vie 23/05/25	sáb 22/11/25	$ 16.641.598,40	0%
383		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EN COBRE DESNUDO 2/0 PARA ANILLO PERIMETRAL DE PUESTA A TIERRA.	172,5 días	lun 02/06/25	jue 27/11/25	$ 36.309.000,00	0%
384		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 3 VARILLAS, INCLUYE MOLDE Y PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA.	155,75 días	jue 12/06/25	jue 20/11/25	$ 2.171.101,31	0%
385		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBROM DE 8 MM, PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.	3 días	mié 18/06/25	sáb 21/06/25	$ 8.205.435,00	50%
386		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA DE 60 CM, INCLUYE SOPORTE.	4 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	$ 1.268.766,80	50%
387		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJETADORES DE ALAMBRON, INCLUE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	4 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	$ 1.956.164,00	50%
388		SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4", INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIOAMIENTO.	25 días	mar 22/04/25	lun 19/05/25	$ 1.609.286,70	100%
389		SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1", INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIOAMIENTO.	25 días	mar 22/04/25	lun 19/05/25	$ 1.387.695,40	100%
390		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 1", PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE ELEMETOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	204,75 días	mar 22/04/25	jue 20/11/25	$ 2.783.490,50	0%
391		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PUESTA A TIERRA DE 30X30 CM PARA CONEXIÓN DE APANTALLAMIENTO.	198 días	mar 22/04/25	jue 13/11/25	$ 897.883,00	0%
392		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA EN COBRE DE 2.40 CM PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO.	204,75 días	mar 22/04/25	jue 20/11/25	$ 2.173.762,64	0%
393		CONSTRUCCIÓN DE CAJA CS-274 PARA CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO TGD, INCLUYE TAPA Y MARCO CERTIFICADO.	199,13 días	mar 22/04/25	vie 14/11/25	$ 2.177.491,96	0%
394		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4" PARA CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL A TGD.	10 días	mar 22/04/25	vie 02/05/25	$ 1.486.314,90	100%
395		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 20X20 METALICA CON CHAPA.	10 días	mar 22/04/25	vie 02/05/25	$ 245.253,33	100%

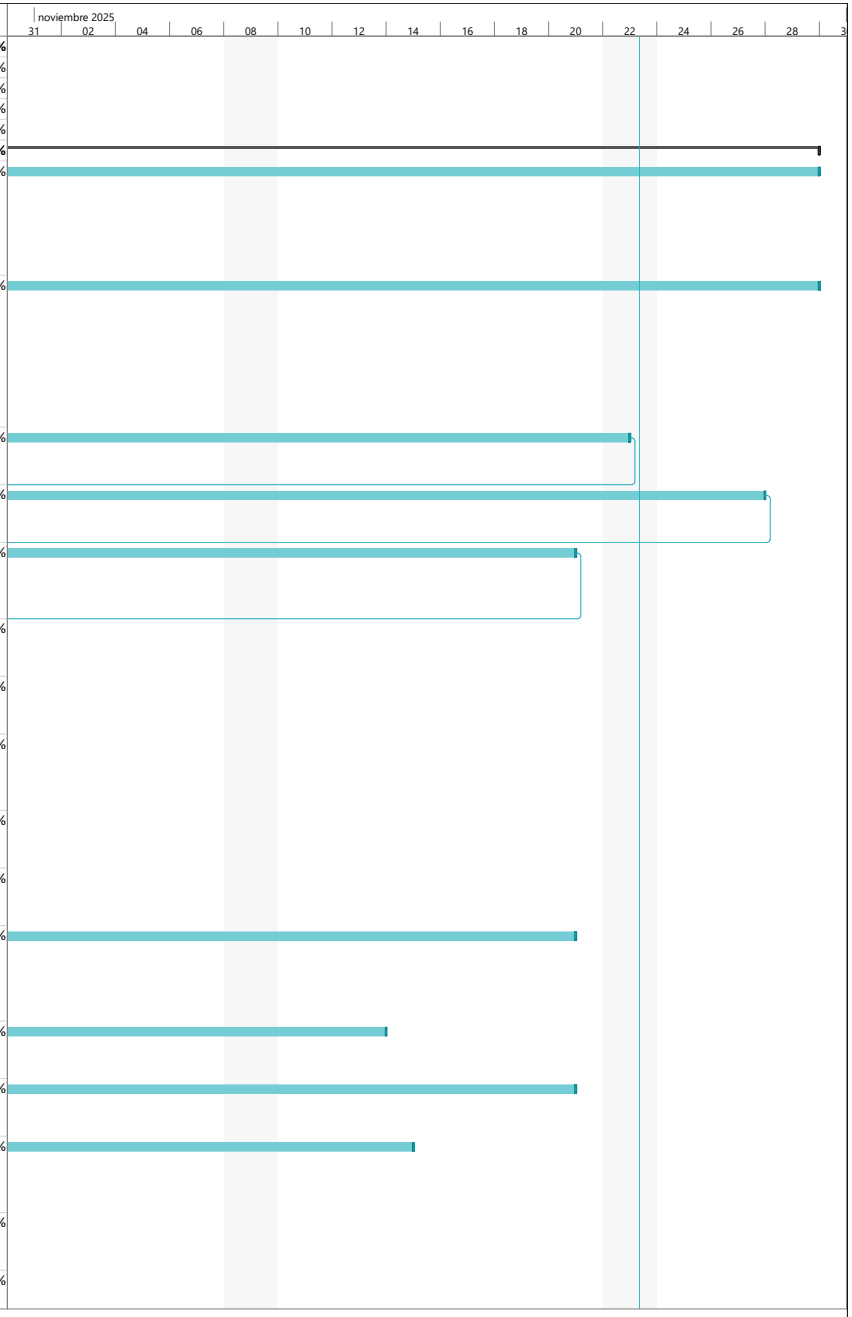

Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 23/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
396		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE HUMO DE TECHO, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15 días	mar 22/04/25	jue 08/05/25	$ 8.003.453,22	100%
397		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTROBOSCOPICA DE INCENDIOS, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	15 días	mar 22/04/25	jue 08/05/25	$ 4.764.985,68	100%
398		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIOS CON ACRILICO DE PROTECCIÓN, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	10 días	mar 22/04/25	vie 02/05/25	$ 4.116.187,74	100%
399		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPLR 2X18 PARA INCENDIOS.	15 días	mar 22/04/25	jue 08/05/25	$ 5.596.773,00	100%
400		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	5 días	mar 22/04/25	sáb 26/04/25	$ 10.022.813,50	100%
401		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE CU No 12 (3X12,F,N,T)	204,75 días	mar 22/04/25	jue 20/11/25	$ 5.724.472,74	76%
402		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE CU No 10 (3X10,F,N,T)	213,75 días	mar 22/04/25	sáb 29/11/25	$ 8.914.214,20	73%
403		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SCH 40 DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	207 días	mar 22/04/25	sáb 22/11/25	$ 3.619.617,90	2%
404		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SCH 40 DE 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	199,13 días	mar 22/04/25	vie 14/11/25	$ 2.408.066,75	3%
405		**APARATOS SANITARIOS**	**513,88 días**	**vie 17/05/24**	**sáb 22/11/25**	**$ 9.688.539,28**	**1%**
406		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBRE PONER	513,88 días	vie 17/05/24	sáb 22/11/25	$ 5.772.588,36	1%
407		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	513,88 días	vie 17/05/24	sáb 22/11/25	$ 3.215.998,52	1%
408		SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL CON	513,88 días	vie 17/05/24	sáb 22/11/25	$ 699.952,40	1%
409		**EXCAVACIONES RCI**	**148,13 días**	**mié 16/04/25**	**vie 19/09/25**	**$ 4.094.999,32**	**90%**
410		EXCAVACION VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)	148,13 días	mié 16/04/25	vie 19/09/25	$ 4.094.999,32	90%
411		**INSTALACION DE RED DE GAS**	**15 días**	**mar 23/04/24**	**jue 09/05/24**	**$ 11.438.000,00**	**100%**
412		PUNTO DE GAS PARA EL CORECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DOTACIONES (INCLUYE TUBERIA PEALPE EMPOTRADA DE 1", VALVULA DE PASO, SUMINISTRO DE NICHO ESPECIAL, CONEXIÓN DE GASDOMESTICOS, CONSTRUCCION DE MURO Y SERVICIOS ADICIONES)	15 días	mar 23/04/24	jue 09/05/24	$ 11.438.000,00	100%
413		**TANQUE RCI**	**48 días**	**lun 21/04/25**	**mar 10/06/25**	**$ 4.451.579,56**	**52%**
414		NIPLE PASA MURO 2"	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$ 1.184.615,04	100%
415		NIPLE PASA MURO 4"	3 días	jue 22/05/25	lun 26/05/25	$ 1.755.876,64	100%
416		SUMINISTRO E INTALACINO DE CINTA PVC IMPERMEABILIZAR	5 días	mié 21/05/25	lun 26/05/25	$ 630.566,67	100%
417		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR	10 días	vie 30/05/25	mar 10/06/25	$ 880.521,21	0%
418		**PISOS Y ACABADOS**	**263,13 días**	**mié 26/02/25**	**dom 30/11/25**	**$ 200.582.181,00**	**15%**
419		REMATES BOCEL WING ALUMINIO	5 días	mié 26/02/25	lun 03/03/25	$ 2.131.337,48	100%
420		MEDIA CAÑA EN GRANITO	214,13 días	mié 09/04/25	jue 20/11/25	$ 8.799.819,28	3%
421		GUARDA ESCOBRA EN GRAVILLA	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	$ 1.412.887,97	0%
422		PISO CERAMICA AGATA GREY 0,30M X 0,60 M O SIMILAR	10 días	mié 16/04/25	lun 28/04/25	$ 2.983.288,21	100%
423		PISO CERAMICA NORDICO GRIS CLARO 0,61 X 0,61 O SIMILAR	15,75 días	jue 10/04/25	lun 28/04/25	$ 33.084.429,16	100%
424		PISO CERAMICA AGUA BLANCO 0,30 M X 0,30 M O SIMILAR	15 días	mié 16/04/25	lun 05/05/25	$ 5.090.588,35	100%

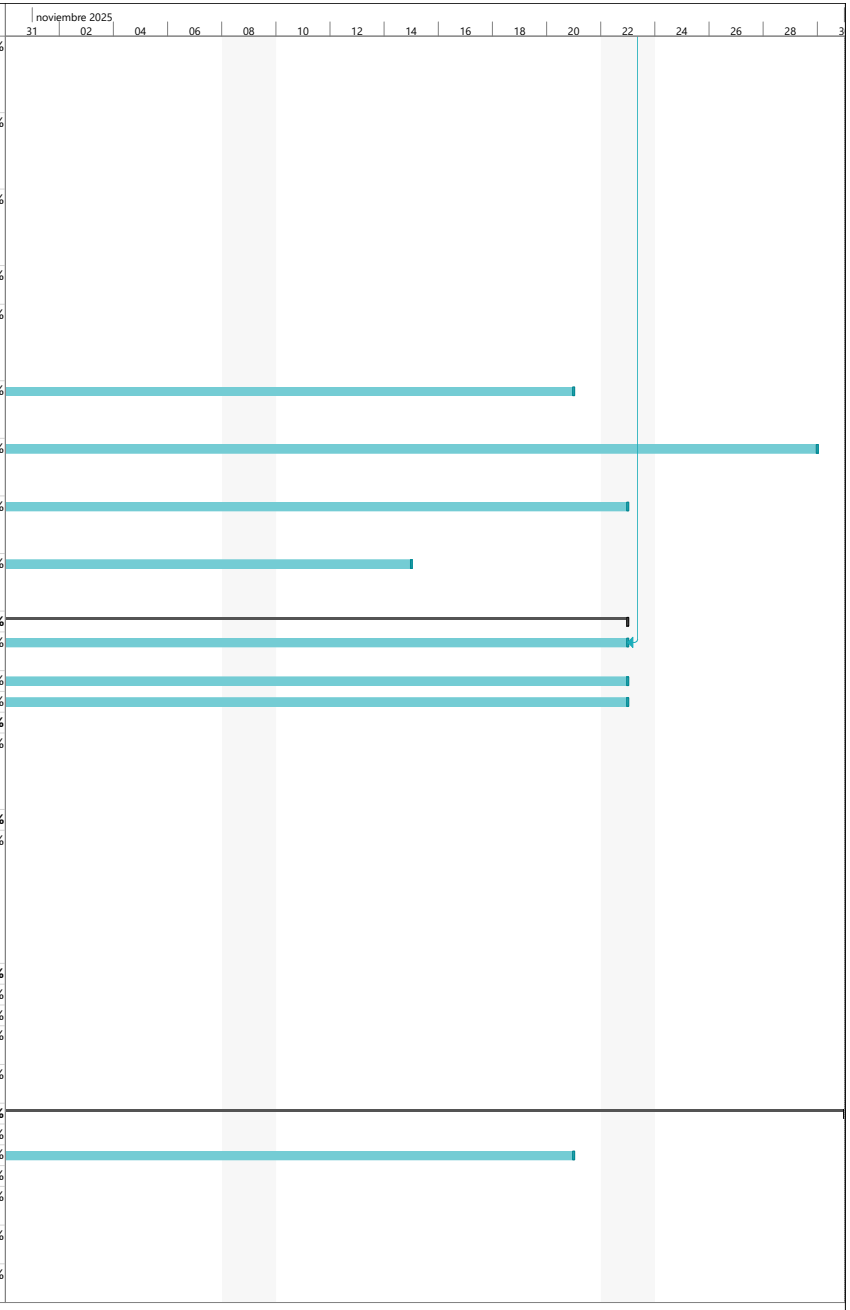

Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 23/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
425		GUARDA ESCOBRA CERAMICA AGATA GREY 0,30 X 0,60 OSIMILAR	10 días	lun 28/04/25	jue 08/05/25	$ 660.146,92	100%
426		GUARDA ESCOBRA CERAMICA NORDICO GRIS CLARO 0,61 X 0,61 O SIMILAR	10 días	mar 29/04/25	vie 09/05/25	$ 6.341.382,27	100%
427		GUARDA ESCONRA CERAMICA AGUA BLANCO 0,3 X 0,3 O SIMILAR	1 día	sáb 03/05/25	lun 05/05/25	$ 0,00	100%
428		**NO PREVISTOS MODIFICATORIO 05**				$ 0,00	0%
429		**CARPINTERIA METALICA**	**54 días**	**sáb 20/09/25**	**vie 14/11/25**	**$ 76.409.231,50**	**0%**
430		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES BATERIAS SANITARIOS CON PUERTAS BATIENTES INGRESO A BAÑOS EN ALUMINIO,CON ENTAMBORADO EN ACRILICO BLANCO	43,88 días	mié 01/10/25	vie 14/11/25	$ 28.617.344,00	0%
431		SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL ESTRUCTRUAL	49,5 días	sáb 20/09/25	lun 10/11/25	$ 47.791.887,50	0%
432		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**87,75 días**	**lun 01/09/25**	**dom 30/11/25**	**$ 63.669.069,86**	**0%**
433		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	88,88 días	lun 01/09/25	dom 30/11/25	$ 63.669.069,86	0%
434		**TRAMITES**	**195,75 días**	**jue 01/05/25**	**jue 20/11/25**	**$ 35.442.000,00**	**6%**
435		CERTIFICADO RETIE Y RETILAP (IVA INCLUIDO)	165,38 días	vie 02/05/25	lun 20/10/25	$ 22.211.000,00	0%
436		TRAMITES PARA AUMENTO DE CARGA TRIFASICA ANTE OPERADOR DE RED	167,63 días	sáb 31/05/25	jue 20/11/25	$ 3.831.000,00	0%
437		DISEÑO SERIE 5 (IVA INCLUIDO)	196,88 días	jue 01/05/25	jue 20/11/25	$ 9.400.000,00	15%

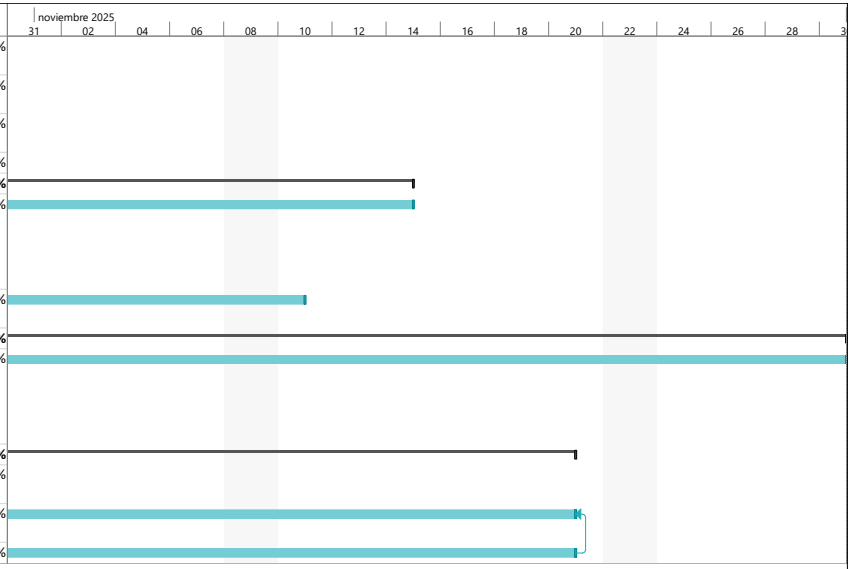

Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 23/10/25

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo
