**MUNICIPIO DE PASTO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN**




# SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 20252550 DE 2025 Y DE INTERVENTORIA No 20252540 DE 2025

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 7 A 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-007)"

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3


Ing. Wilber Efrén Morillo Arteaga
Supervisor


31 de octubre de 2025

## 1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad presentar el avance en la ejecución del Contrato No. 20252550 que tiene por objeto EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 7 A 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-007)", durante el periodo relacionado.

En este documento, se proporciona información detallada sobre el estado actual de la obra, destacando el seguimiento realizado por el Municipio de Pasto en relación al cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

Es importante mencionar que el proceso de ejecución de la obra se inició formalmente con la suscripción del Acta de Inicio del 14 de julio de 2025 En dicho acto, es designado supervisor el Secretario de Infraestructura y Valorización, el ingeniero Wilber Efrén Morillo Arteaga, actual supervisor, quien ejerce en el cargo desde el 01 de enero de 2024 hasta la fecha.

En el presente informe de supervisión No 2, se muestra el desarrollo de las actividades y labores ejecutadas durante el periodo del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 del seguimiento al contrato de obra e interventoría.

## 2. DATOS DEL CONTRATO OBRA

No Contrato: 20252550
Fecha Contrato: 01 de julio de 2025
Valor Contrato: $1.834.096.149
Objeto: el contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaria de infraestructura y valorización, a realizar la obra de mantenimiento y rehabilitación malla vial urbana comunas 7 a 9 del municipio de pasto (SIVM-SU0045-007)".
Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio.
Contratista Obra: CONSORCIO COMUNAL
Supervisor: Ing. Wilber Efrén Morillo Arteaga
Pólizas y vigencia: Entidad Seguros del estado S.A.
Pólizas y vigencia: SEGUROS DEL ESTADO SA No 45-44-101167566
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ANEXO 2 – TRASLADO DE VIGENCIA

- Vigencia Cumplimiento: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/07/ 2026
- Vigencia Anticipo: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/07/ 2026

- Vigencia Prestaciones Sociales: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/01/ 2029
- Vigencia Póliza Estabilidad: Ampara 3 años, 0 meses, 0 días.

Pólizas y vigencia: SEGUROS DEL ESTADO SA No 45-40-101101272
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2 – TRASLADO DE VIGENCIA

- Vig. Predios Labores y Operaciones: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/01/ 2026
- Vig. Contratistas y subcontratistas: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/01/ 2026
- Vig. Vehículos propios y no propios: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/01/ 2026

**2.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

No Contrato: 20252540
Fecha Contrato: 18 de junio de 2025
Valor Contrato: $139.999.995,00
Objeto: El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraestructura y Valorización, a realizar "LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 7 A 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-008)".
Plazo: El plazo de ejecución del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio.
Contratista Obra: Javier Enríquez Bravo
Supervisor: Ing. Wilber Efrén Morillo Arteaga
Pólizas y vigencia: Entidad Seguros del estado S.A.
Pólizas y vigencia: SEGUROS DEL ESTADO SA No 41-44-101294571
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ANEXO 2 – TRASLADO DE VIGENCIA

- Vigencia Cumplimiento: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/07/ 2026
- Vigencia Anticipo: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/07/ 2026
- Vigencia Prestaciones Sociales: **desde** 14/07/ 2025 **hasta** 13/01/ 2029
- Vigencia Calidad de servicios: **desde** 13/01/ 2026 **hasta** 13/01/ 2029

**3. ACTAS** (fecha y descripción de cada una de las actas)

- Acta de inicio contrato obra No 20252550: 14 de julio 2025– Suscrita entre el supervisor y Consorcio Comunal.
- Acta anticipo 40% contrato de obra No 20252550: De fecha de 19-09-2025 por un valor a pagar de $733.638.459,60.
- Acta de inicio contrato interventoría No 20252540: 14 de julio 2025– Suscrita entre el supervisor y Javier Enríquez Rosero.
- Acta modificación No 1 Clausula No 4 Plazo al Contrato No 20252540 de 2025: 15 de septiembre de 2025 – Suscrita entre el municipio en representación por

Directora D.A.C.P, Dra. Diana Carolina Mosquera Calonge y contratista interventoría Ing. Javier Enríquez Bravo

- Acta parcial de obra No 1: Se tramita acta parcial de obra No 1 por un valor ejecutado de $578.789.337, 00 M/cte y valor a cancelar de $347.273.602,20 M/cte, con fecha de 22 de octubre de 2025.

## 4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- Estado inicial de la obra.

Actualmente se encuentran en intervención 2 frentes de obra, en los cual se presentan un deterioro notable de la vía carrera 36b, sentido oriente – occidente en el Barrio Panorámico y en la carrera 42 del Barrio Morasurco, actualmente se encuentran tramos en carpeta de asfalto, concreto rígido, de los cuales varían espesores y estado físico, por lo que se hace necesario el reemplazo.




Frente 2. Barrio Panorámico







Frente 3. Barrio Morasurco

- **AVANCE FÍSICO**

Durante el periodo del presente informe se han adelantado las siguientes actividades:

1. Compactación subrasante.
2. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.

- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS EJECUTADOS, ACOMPAÑADOS CON MEMORIAS DE CÁLCULOS DE CANTIDADES Y FOTOGRAFÍAS**

1. Compactación subrasante: Actividad que se realiza para homogeneizar, densificar y estabilizar el terreno, aumentando su capacidad portante y reduciendo la deformación futura, se la desarrolla a lo largo de la vía calle 3ª y cra 36 b en el barrio Panorámico y en la calle 21 con cra 42 en el barrio Morasurco, exactamente en los puntos de intervención realizados en la vía.

2. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible: Colocación de mezcla asfáltica en caliente de granulometría densa (MDC-19) como carpeta de rodadura. El proceso contempla: Imprimación sobre la superficie preparada, extendido y compactación de la mezcla, sellado de juntas para asegurar continuidad y durabilidad. Dicha actividad se realiza a lo largo de la vía calle 3ª y cra 36 b en el barrio Panorámico y en la calle 21 con cra 42 en el barrio Morasurco.




1. COMPACTACION SUBRASANTE.




2. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC – 19, INCLUYE IMPRIMACION Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FELXIBLE




1. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC – 19, INCLUYE IMPRIMACION Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FELXIBLE













2. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC – 19

- **AVANCE DE TIEMPO**.


  A la fecha del presente informe el tiempo de ejecución presenta un avance físico de 64,77%, trascurridos 110 días y un tiempo restante de 61 días, de un tiempo total de 171 días aprobado mediante acta de inicio de obra firmada el 14 de julio de 2025.

- **AVANCE FINANCIERO.**

  A la fecha del presente informe con corte a 31 de octubre de 2025, se presenta un avance financiero de $1.188.012.795,65 que corresponde a un porcentaje de ejecución en obra de 64,77%.
  Valor total de contrato: $1.834.096.149

Valor físico ejecutado: $1.188.012.795,65
Porcentaje físico ejecutado: 64,77%

| 0 | programado | ejecutado |
|---|---|---|
| semana 1 | $ - | $ - |
| semana 2 | $ - | $ - |
| semana 3 | $ 30.899.866,00 | $ 30.899.866,00 |
| semana 4 | $ 39.797.991,00 | $ 39.797.991,00 |
| semana 5 | $ 305.473.897,00 | $ 305.473.897,00 |
| semana 6 | $ 327.138.918,00 | $ 327.138.918,00 |
| semana 7 | $ 578.789.338,00 | $ 578.789.338,00 |
| semana 8 | $ 596.663.814,63 | $ 621.908.486,00 |
| semana 9 | $ 615.072.258,43 | $ 633.992.516,00 |
| semana 10 | $ 633.480.704,23 | $ 633.992.516,00 |
| semana 11 | $ 710.041.609,76 | $ 633.992.516,00 |
| semana 12 | $ 786.602.517,28 | $ 633.992.516,00 |
| semana 13 | $ 863.163.426,80 | $ 633.992.516,00 |
| semana 14 | $ 998.100.145,58 | $ 1.015.699.246,24 |
| semana 15 | $ 1.133.036.865,36 | $ 1.188.012.795,65 |
| semana 16 | $ 1.267.973.586,13 | |
| semana 17 | $ 1.343.930.390,66 | |
| semana 18 | $ 1.419.887.196,18 | |
| semana 19 | $ 1.495.844.002,71 | |
| semana 20 | $ 1.572.291.781,99 | |
| semana 21 | $ 1.640.917.587,61 | |
| semana 22 | $ 1.703.101.119,72 | |
| semana 23 | $ 1.765.284.652,83 | |
| semana 24 | $ 1.833.367.888,72 | |
| semana 25 | $ 1.834.096.149,00 | |

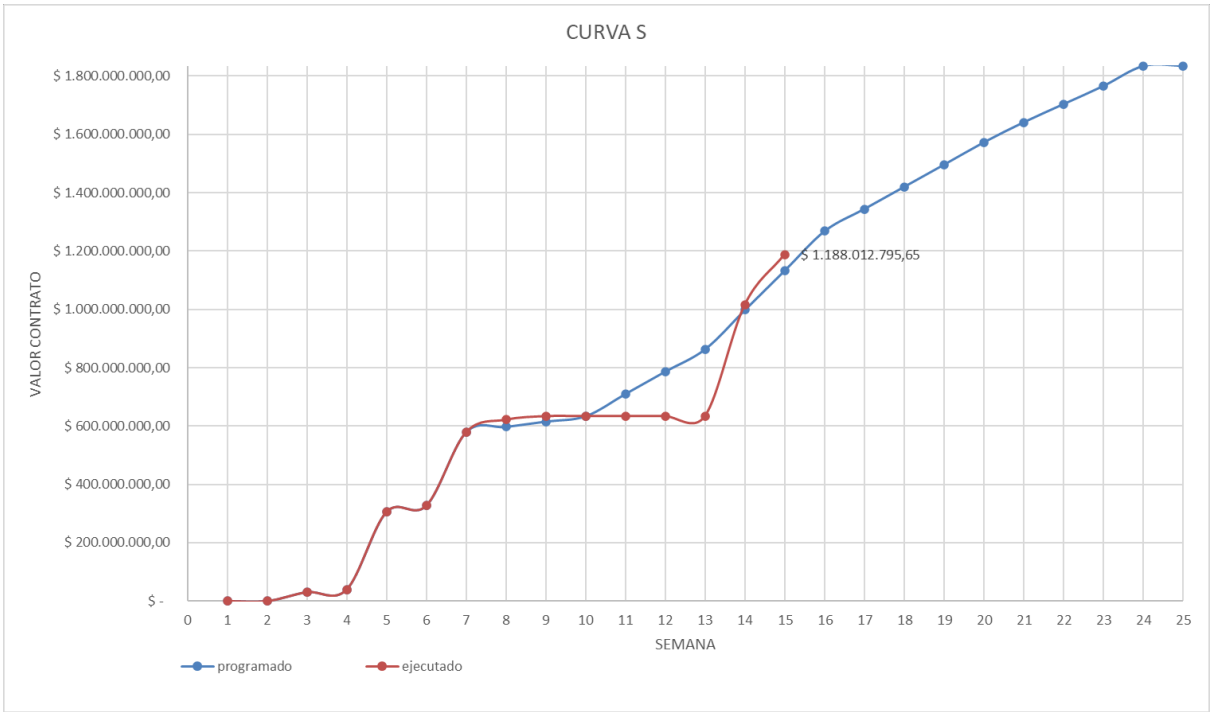


Actualmente se ha realizado el desembolso de anticipo a contratista de obra por un valor de $733.638.459,60 M/CTE, del cual neto a pagar $680.450.559,60; además se realizó el trámite de acta parcial No 1de obra por un valor de $578.789.337,00 M/CTE y un neto a pagar de $347.273.602,20 M/CTE, la cual se encuentra en tramite de desembolso a contratista de obra.

A fecha de realización de informe interventoría a cargo de Ing. Javier Enríquez Bravo, no ha presentado documentación para tramite de anticipo de 40%; por consiguiente, tramite de acta parcial No 1, pese a las solicitudes por parte de la supervisión del contrato.

- **CONTROL AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN.**

  Según el instructivo IN-I-002 se observa que hasta el momento se cumple con el plan de acción socioambiental en la obra.

- **COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO.**

  A fecha de realización de informe se tiene un porcentaje programado de 61,78%, con un valor programado de $1.133.036.865,36; sin registrarse retrasos frente a lo programado. Este comportamiento refleja una ejecución en tiempo, acorde a lo estipulado en el contrato y en las obligaciones pactadas entre las partes.

- **ANÁLISIS DE PROBLEMAS SURGIDOS Y EMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:**

  Se presento que la comunidad de Barrio Panorámico existe un descontento por el alcance asignado a vías incluidas dentro de rehabilitación para la licitación LP-2025-4, que dentro de esta están incluidas las comunas de 7 a 9.
  Se convoca por parte de la comunidad a reunión el día 17 de octubre de 2025 a las 7:00 pm sobre la cra 36b, en la cual solicita que se intervengan otras vías que también se encuentran afectadas, desde la Secretaria de Infraestructura y Valorización en cabeza de la Secretaria de la dependencia se aclara que las necesidades del municipio son grandes y se debe intervenir otras vías en las comunas que comprenden la licitación mencionada.

  Desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización se reitera que la intervención de las vías actualmente intervenidas beneficia directamente la movilidad y el acceso al sector, mejorando las condiciones de transitabilidad, movilidad, seguridad peatonal y calidad de vida.

  Se reconoce la preocupación y el sentido de pertenencia de la comunidad del Barrio Panorámico I y II y se destaca la importancia de su participación activa en los espacios de diálogo y seguimiento a la obra.

## 5. ENSAYOS DE LABORATORIO

*Se realiza la toma de densidades en terreno por método de cono y arena a subbase sobre la cra 36b del barrio Panorámico 1, se toman dos muestras en las* abscisas *PRO+040 EJE y PRO+100 EJE, arrojando un resultado de compactación especificada de 95,00% en cada una de ellas, se anexa registro de toma de densidades.*

JUAN CARLOS TRUJILLO D.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

## DENSIDADES EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA
**INV E-161 22**

PROYECTO : PAVIMENTACIÓN BARRIO PANORAMICO

LOCALIZACION : MUNICIPIO DE PASTO

FECHA : jueves, 16 de octubre de 2025

SOLICITA: **CONSORCIO COMUNAL**

| MUESTRA No. | Unidad | 1 | 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | | PR0+040 EJE | PR0+100 EJE | | |
| MATERIAL | | MATERIAL GRANULAR | | | |
| FUENTE | | SITIO | | | |
| PESO FRASCO ARENA INICIAL | g | 5660,0 | 5760,0 | | |
| PESO FRASCO ARENA RESTANTE | g | 1590,0 | 1640,0 | | |
| PESO ARENA TOTAL USADA | g | 4270 | 4120 | | |
| CONSTANTE DEL CONO | g | 1610,00 | 1610,00 | | |
| PESO DE ARENA EN EL HUECO | g | 2660,00 | 2510,00 | | |
| DENSIDAD DE LA ARENA | g/cm3 | 1,400 | 1,400 | | |
| VOLUMEN DEL HUECO | cm3 | 1900,00 | 1792,86 | | |
| PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO | g | 3630 | 3360 | | |
| HUMEDAD | % | **10,45** | **8,74** | | |
| PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO | g | 3286,54 | 3089,86 | | |
| DENSIDAD DEL MATERIAL | g/cm3 | 1,73 | 1,72 | | |
| DENSIDAD MX LABORATORIO | g/cm3 | 1,800 | 1,800 | | |
| HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO | % | 9,50 | 9,50 | | |
| COMPACTACION TERRENO | % | **96,10** | **95,75** | | |
| COMPACTACION ESPECIFICADA | % | 95 | 95 | | |

**HUMEDAD**

| Profundidad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cápsula No.** | | **15** | **13** | | |
| **Peso Cápsula + suelo húmedo** | **g** | 170,14 | 161,3 | | |
| **Peso Cápsula + suelo seco** | **g** | 157,2 | 151,09 | | |
| **Peso Cápsula** | **g** | 33,36 | 34,31 | | |
| **Humedad** | **%** | 10,45 | 8,74 | | |

OBSERVACIONES DATOS DEL PROCTOR PARA EL CALCULO DE LAS DENSIDADES SUMINSTRADOS POR EL CONTRATANTE

ELABORÓ: CONSUELO CRIOLLO A.

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS TRUJILLO D.

## 6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

| Concepto | Valor | Amortizaciones | Pagos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato | $1.834.096.149 | | | $1.834.096.149 |
| Pago anticipo obra 40% | $733.638.459,60. | $0,00 | $680.450.559,60 | |
| Pago Acta parcial obra No. 1 | $578.789.337,00 | $231.515.734,80 | $347.273.602,20 | $753.184.087,20 |
| **Totales** | | | | |
| | | | % ejecución | 64,77% |

En el tiempo trascurrido desde el 01 de septiembre hasta el 31 de octubre, se realizó el desembolso de anticipo 40% y se da tramite a acta parcial de obra No 1 enviada a hacienda el 22 de octubre de 2025.

## 7.ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

En el tiempo trascurrido desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre se ha realizado:

- Acta parcial de pago No 1 de obra: De fecha de 22 de octubre de 2025 por un valor ejecutado de $578.789.337,00 y un valor a pagar de $347.273.602,20 (actualmente se encuentra en hacienda en revisión y tramite de pago)

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL | | | |
| | FECHA | VERSIÓN | CODIGO | PAGINA |
| | 16/01/2023 | 05 | IN-F-025 | de |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE:** | CONTRATO DE OBRA |
| **Fecha de la presente acta:** | 22 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| **ACTA No.:** | UNO (1) |
| **Contrato No.:** | 20252550 |
| **Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:** | SAN JUAN DE PASTO, 01 DE JULIO DEL 2025 |
| **Contratante:** | MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891.280.000-3 |
| **Representante legal:** | NICOLAS MARTÍN TORO MUÑOZ, Identificado con C.C No 12.986.382 de Pasto |
| **Contratista:** | CONSORCIO COMUNAL |
| **Identificación:** | NIT. 901960323-0 |
| **Representante legal:** | BRAYAN STEVENS GARCÍA GARCIA |
| **Identificación:** | c.c 1.024.488.768 |
| **Objeto:** | El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MALLA VIAL URBANA COMUNAS 7 A 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-007). |
| **Plazo inicia contractual:** | EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO TERMINARA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| **Fecha de inicio:** | 14 DE JULIO DEL 2025 |
| **Fecha de Finalización contractual:** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| **Valor Contrato inicial:** | MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 1.834.096.149,00 M/CTE |
| **Valor Contrato adicional (si aplica):** | N/A |
| **Valor ejecutado presente acta:** | QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE |

| | |
|---|---|
| | PESOS CON CERO CENTAVOS $ 578.789.337,00 M/CTE |
| **Valor a cancelar presente acta:** | TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS $ 347.273.602,20 M/CTE |
| **Valor facturado acumulado incluida la presente acta:** | QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS $ 578.789.337,00 M/CTE |
| **Valor Contrato final (si aplica):** | MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 1.834.096.149,00 M/CTE |
| **Prorroga No. (si aplica):** | N/A |
| **Fecha suspensión No. (si aplica):** | N/A |
| **Fecha reinicio No. (si aplica):** | N/A |
| **Nueva fecha de finalización (si aplica):** | N/A |
| **Supervisores (histórico de supervisores):** | WILBER EFRÉN MORILLO ARTEAGA |
| **Identificación:** | 1.085.900.404 |
| **Cargo:** | SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION |
| **Interventor de obra:** | JAVIER ENRÍQUEZ BRAVO |
| **Identificación:** | 98.379.545 |

En la presente fecha, en la dependencia de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Municipio de San Juan de Pasto, se reunieron: Wilber Efrén Morillo Subsecretario de Infraestructura del Municipio de Pasto, Javier Enríquez Bravo Contratista de Interventoría y CONSORCIO COMUNAL en R/L el Sr. Brayan Stevens García García, en calidad de contratista de Obra, con el fin de protocolizar la presente Acta de recibo parcial No 1 del Contrato de Obra No 20252550 cuyo objeto es "El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A

| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL | | | |
| | FECHA<br>16/01/2023 | VERSIÓN<br>05 | CODIGO<br>IN-F-025 | PAGINA<br>de |

REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MALLA VIAL URBANA COMUNAS 7 A 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-007)", de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

**CONSORCIO COMUNAL**
R/L **BRAYAN STEVENS GARCÍA GARCIA**
Contratista de Obra

**JAVIER ENRIQUEZ BRAVO**
Interventor de Obra

**WILBER MORILLO ARTEAGA**
Subsecretario de Infraestructura Urbana
Supervisor del Contrato

**JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA**
Secretaria de Infraestructura y Valorización

## 8.SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO | ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido) |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento del cronograma. | Avance acorde al programado. | En proceso |

**ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA**
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR

Proyectó: Arq. Fabian Rodríguez – Contratista SIVM
