ACTA No. 025	CIUDAD Y FECHA: Armenia, 27 de octubre de 2025	HORA DE INICIO: 8:15 a. m.	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 a.m.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío - Instituto Nacional de Vías - INVÍAS.			
CONVOCADA POR: Dirección Territorial Quindío - Instituto Nacional de Vías - INVÍAS.		LUGAR: Sala de Juntas - Dirección Territorial Quindío	MODALIDAD: Presencial

Nota: En los casos en que se requiera dejar firmada el acta de reunión, esta deberá ser suscrita por los participantes. De lo contrario, deberá anexarse como respaldo el formato físico ETHU-FR-25 o el formulario de asistencia virtual utilizado durante la reunión.

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Fernando García Giraldo	Funcionario	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Eliana Zuluaga Marín	Contratista - Profesional jurídico	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Santiago Ospina Vargas	Contratista - Profesional social	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista - Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Fabian Fernando Rincón Alzate	Contratista - Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Victor Julio Guayambuco Quintero	Director de Interventoría	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Carlos Arturo Suárez	Ingeniero residente	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Ingeniera residente	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Profesional contable	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Jairo David Guerrero Erazo	Inspector	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Luisa Fernanda Zapata López	Profesional social	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024

2. AGENDA DE LA REUNIÓN

TEMA	RESPONSABLE
1. Saludo Inicial y varios.	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024
2. Componente técnico.	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA 1: Saludo inicial y varios.

Se da bienvenida al equipo de Interventoría al comité de seguimiento No. 25, donde se realiza la presentación de cada uno de los asistentes por parte de la Dirección Territorial Quindío y la Interventoría No. 3668 de 2024. En primer lugar, la Interventoría No. 3668 de 2024 expresa diversas situaciones que han acontecido con la ausencia de personal en la ejecución del convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Topacia Alta del municipio de Génova (Quindío); para lo cual, la Dirección Territorial Quindío le reitera la figura que tiene como supervisor del contrato de Interventoría, no de los convenios solidarios e interadministrativos; la Interventoría es precisamente la figura que debe ejercer la supervisión a los convenios solidarios e interadministrativos, ejerciendo el control, el seguimiento y la verificación de la ejecución de los convenios, situación que en múltiples ocasiones no se evidencia adecuadamente.

La interventoría expresa diferentes actuaciones que ha realizado a lo largo de esta situación, no obstante, la DT Quindío manifiesta que esta situación ya se ha presentado de manera similar con otros convenios, asimismo se expresa la preocupación y la necesidad de que las obras del convenio con Topacia Alta culminen a satisfacción, al igual que, se le recuerda a la Interventoría la necesidad de ser participativa con la comunidad objeto de los convenios, lo anterior considerando la falta de experiencia de las juntas. Por otro lado, se le expresa a la Interventoría la necesidad de tomar actuaciones en torno a los contratistas que se tienen y no limitarse al envío únicamente de oficios, al igual que, se le recuerda los procesos sancionatorios relacionados con los incumplimientos. Ante lo anterior, la Interventoría expresa que ha realizado todas las actuaciones que han estado en su mano, al igual que manifiesta que los acompañara en la medida que les sea posible.

Ahora bien, la DT Quindío manifiesta el derecho de petición que instauró el convenio solidario No. 3419 de 2024 con la Junta de Acción Comunal de la vereda Ríoverde Bajo y Paraguaicito concerniente al municipio de Buenavista (Quindío), donde la representante legal de la JAC solicita la contratación de sus familiares que son miembros y habitantes de la Junta. En ese sentido, la DT Quindío realizó las consultas legales pertinentes para poder responder dicho requerimiento, en ese sentido, se le expresa a la Interventoría la respuesta jurídica y las acciones a realizar para ejecutar y acoplarse a dicha postura.


Por otro lado, con relación a la JAC Barcelona Alta, la interventoría manifiesta que se reanudarán las actividades en campo que estima tomarse un tiempo de tres días de ejecución. Asimismo, se expresa que hoy 27 de octubre del año en curso, el personal estará en obra. Ahora bien, con relación a la JAC La Coqueta, se expresa la necesidad de revisar minuciosamente los acabados relacionados con la placa huella.

Con relación a la JAC San Juan de Carolina, la Interventoría menciona que hubo un cambio de ingeniero residente, por lo cual, las actividades en obra sufrieron retrasos considerables por la ausencia de personal en obra. No obstante, a la fecha, se expresa que ya hay personal nuevamente trabajando y que ya se tienen los insumos necesarios para ejecutar. En ese sentido, la DT Quindío expresa la problemática relacionada con la OPC, reiterando la ausencia de la supervisión a la planificación y ejecución desde el componente técnico y ambiental, por lo cual, se le reitera el trabajo mancomunado que debe tener la interventoría con sus diferentes componentes.

En cuanto a la JAC Dorado Alto Las Camelias, la interventoría expresa la situación relacionada con el material que se estropeó en obra y con los pagos de insumos necesarios para garantizar la seguridad vial en la vía. La Interventoría expresa que ya se subsano esta situación y que ya se están trabajando en torno a la vía. Con relación a la Obra de Participación Comunitaria, se expresa que ya se cuenta con la propuesta, los permisos y una (01) cotización de las tres (03), se espera radicar entre hoy y mañana.

TEMA 2: Componente técnico

La Interventoría en aras de organizar y tener los estados reales del componente financiero de los convenios solidarios e interadministrativo, realizó un documento Excel con varias hojas que incluyen: Plan de compras, presupuesto, cotizaciones, balance de obra, nóminas, etc.

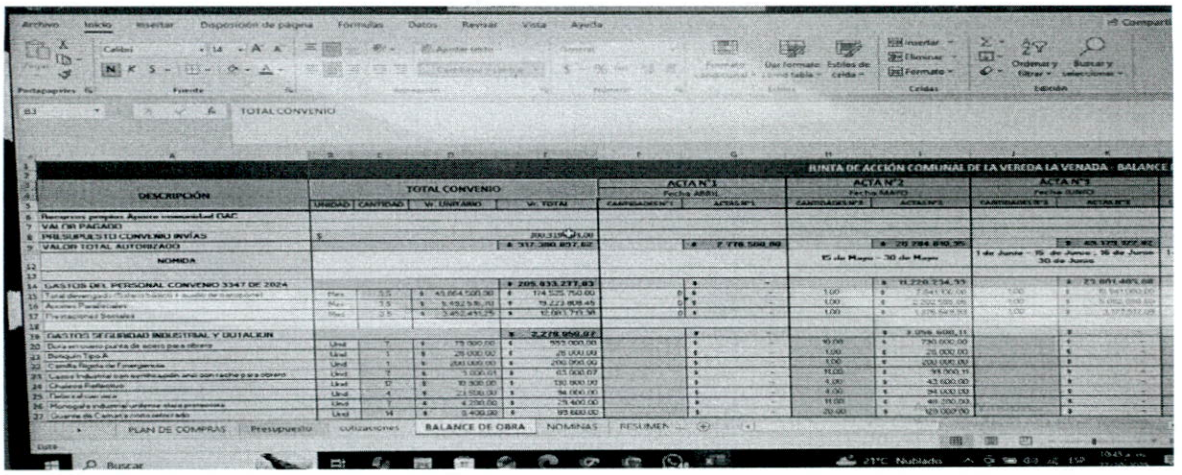

Desde la DT Quindío, se brindan recomendaciones, sugerencias y observaciones en torno al proceso que la Interventoría No. 3668 de 2024 ha realizado, al igual que se brindaron observaciones en torno a los procesos de liquidación que serán subyacentes toda vez que los convenios culminen su ejecución.

Por otro lado, se procede con la presentación de los avances presentados en la interventoría No. 3668 de 2024:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.

CCPT INTERVENTORIA 3668 de 2024

DESARROLLO VIAL 2T

COMITÉ DE SEGUIMIENTO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

En cuanto al avance de los convenios solidarios e interadministrativo:


1. Convenio 2470 de 2024: JAC La Venada

CONVENIO 2470-2024, GENOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

•La obra ha sido dada por terminada, se realizan actividades en caseta comunal. está pendiente subsanar observaciones del acta previa de recibo definitivo de obra





PROGRAMADA	(99.34%)
EJECUTADA	(89.44%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(9.90%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en cerramiento con malla para la cancha de la escuela La Venada. En ejecución. Con compromiso de entrega el 24 de octubre

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


2. Convenio 2454 de 2024: JAC Buenavista:

CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

>No hay actividad en obra





PROGRAMADA	(97,32%)
EJECUTADA	(95,50%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-1,81%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la adecuación de un Shut En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

3. Convenio 2552 de 2024: JAC Barcelona Alta:

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra





PROGRAMADA	(97,78%)
EJECUTADA	(92,19%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(5,59%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuación de salón comunal. Pendiente respuesta de SS por segunda radicación 2025E-VUVRAZ-10455 18 de septiembre de 2025 En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


4. Convenio 4272 de 2024: JVC Vereda Villa Éxito:

CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

➢ *Se construye un disipador de energía con el fin de garantizar la durabilidad de la obra, evitando filtraciones y procesos de socavación. La estructura está conformada por ocho escalones con una huella de 50 cm y una contrahuella de 27 cm, un escalón adicional de 50 cm x 50 cm, y una zanja de disipación de 2.80 m de longitud, 1.40 m de ancho y 1.40 m de profundidad.*





PROGRAMADA	(98,88%)
EJECUTADA	(85,33%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-15,54%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC carpa movil, placa en concreto y pedestales Ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


5. Convenio 2388 de 2024: JAC La Topacia y Río Lejos:

CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RIO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

➢ La obra ha sido dada por terminada, se realizan actividades en caseta comunal. está pendiente subsanar observaciones del acta previa de recibo definitivo de obra.





PROGRAMADA	(96.10%)
EJECUTADA	(97.44%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(1.34%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en construcción de placa en concreto, pedestales, estructura en guadua y cubierta en zinc. En ejecución, con compromiso de entrega el 24 de octubre

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

6. Convenio 2235 de 2024: JAC Topacia Alta:

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se instalan formaletas y se vacía concreto de 21 MPa para la construcción del bordillo derecho del tramo 2, comprendido entre las abscisas K0+029 y K0+048.
- Asimismo, se instalan formaletas y se vacía concreto de 21 MPa en la sección central de las vigas riostras, en los puntos de encuentro con el concreto ciclópeo, para un total de siete (7) vigas riostras ubicadas entre las abscisas K0+019 y K0+059.
- Adicionalmente, se vacía concreto ciclópeo de 14 MPa en once (11) unidades centrales, localizadas entre las abscisas K0+003 y K0+058.
- Se utiliza sikadur 32 prime como puente de adherencia entre concreto de diferente edades, previo a la fundida de la riostra central en la zona del ciclopeo





PROGRAMADA	(99.24%)
EJECUTADA	(83.93%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-9.31%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuación de salón comunal (muro en sistema liviano, puerta metálica, ventana en aluminio, puntos eléctricos. En ejecución. con compromiso de entrega el 24 de octubre

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

7. Convenio 2638 de 2024: JAC Patio Bonito

CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Acopio de agregados arena - piedra de mano
- Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para bordillo costado derecho - k0+039





PROGRAMADA	(96.92%)
EJECUTADA	(96.61%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-0.31%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de 16 luminarias solares. Terminada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

8. Convenio 3539 de 2024: JAC Cantores

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Posterior a la finalización del proyecto el día 27 de septiembre del 2025, el día jueves 9 de octubre del 2025 se realizó la entrega oficial del convenio 3539 – 2024 , asimismo, se realizó la respectiva socialización de la obra, tanto de la placa huella como de los OPC*



PROGRAMADA	(94,95%)
EJECUTADA	(83.45%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,95%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC Shut ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


9. Convenio 4006 de 2024: JAC Padilla

CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *No se realizaron actividades en obra.*



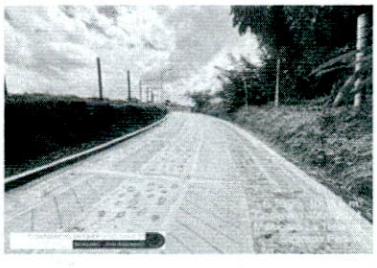

PROGRAMADA	(94,95%)
EJECUTADA	(79,73%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-15,22%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de 8 luminarias y 8 postes Ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


10. Convenio 2968 de 2024: JAC Maravelez


CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realiza la fundición del concreto de 14 Mpa del concreto ciclópeo de 19 módulos en total para el sobreancho del costado derecho de la placa huella.*
- *Se realiza la fundición de concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y vigas para los 7 módulos faltantes y completar 19 en total, del costado derecho de la placa huella del primer tramo.*

PROGRAMADA	(96..6%)
EJECUTADA	(92.38%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-4.57%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30-10-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC consiste en la instalación de 20 luminarias. En ejecución





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


11. Convenio 3922 de 2024: JAC La Popa


CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realiza el vaciado de concreto premezclado de resistencia de 21 mpa dividido en tres fundidas, en catorce módulos de placa huella, siete a cada lado de la vía, en ocho vigas riostras de 4.1 m , diez módulos, cinco a cada costado de la vía.*
- *Ademas se funden 13 módulos de concreto ciclópeo en las abscisas K0+045 a K0+073.6*
- *En el tramo 2 se completan 73.6 ml de construcción de placa huella completa, exceptuando bordillo a cada costado, entre las abscisas K0+000 a K0+073.6 y 8 modulos de placa más entre las abscisas K0+073.6 a K0+086.4*

PROGRAMADA	(94,2%)
EJECUTADA	(82,4%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,82%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10.25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC consiste en la instalación de 20 luminarias. En ejecución





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

12. Convenio 2996 de 2024: JAC La Montaña

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se ejecutó el vaciado de trece (13) módulos de placa huella en el costado izquierdo, correspondientes al tramo 2, entre las abscisas K0+000 y K0+039, utilizando concreto con una resistencia especificada de 21 MPa. Adicionalmente, se realizó el vaciado de diez (10) módulos de concreto ciclópeo en la cinta lateral izquierda del mismo tramo, entre las abscisas K0+000 y K0+030, empleando concreto de 14 MPa. Finalmente, se llevó a cabo la instalación del encofrado lateral izquierdo del tramo 1, destinado a la conformación de cuneta y bordillo.*

PROGRAMADA	(95,5%)
EJECUTADA	(71,8%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-23,65%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10.25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC consiste en la instalación de gimnasio. Pendiente aprobación de desembolso En ejecución





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


13. Convenio 2767 de 2024: JAC Los Balsos

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalación de acero longitudinal y transversal cuneta Izquierda desde la absc k0+043 hasta k0+085
- Instalación de acero del bordillo izquierdo desde la absc k0+043 hasta k0+085
- Instalación de acero del bordillo izquierdo desde la absc k0+043 hasta k0+085
- Terminación completa de 12 vigas riostras





PROGRAMADA	(93.05%)
EJECUTADA	(55.66%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-33.54%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de 16 luminarias solares. Ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

14. Convenio 2764 de 2024: JAC Los Juanes

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Amarre de acero #3 para malla de refuerzo cuenta costado derecho k0+042-k0+070
- Fabricacion de aisladores para acero
- Alistamiento, preparacion y vaciado de concreto para cuneta costado derecho k0+042 - k0+070
- Alistamiento, preparacion y vaciado de concreto ciclopeo para franja costado derecho k0+027- k0+045





PROGRAMADA	(93.38%)
EJECUTADA	(54.16%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-39.22%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de 16 luminarias solares. Pendiente inisar ejecución de la obra

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

15. Convenio 2385 de 2024: JAC La Mariela

CONVENIO 2385-2024, PIJAO VEREDA LA MARIELA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalacion de acero de 13 vigas riostras desde la absc k0+066 hasta k0+106
- Instalacion de acero longitudinal y transversal desde la absc k0+066 hasta k0+106
- Encofrado huella izquierda y derecha desde k0+045 hasta k0+066
- Fundida de huella izquierda y derecha desde k0+045 hasta k0+066





PROGRAMADA	(92.16%)
EJECUTADA	(57.17%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-38.99%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuación del salón comunal con la reposicion de la red eléctrica. En trámitre la presentacion y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


16. Convenio 3419 de 2024: JAC Rioverde Bajo y Paraguaicito

CONVENIO 3419-2024, BUENA VISTA, VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUACITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Avance en la fundición de bordillos en concreto de 21 MPa, costado izquierdo de la placa huella, abscisa K0+022
- Avance en el armado de acero de refuerzo de berma-cuneta, costado derecho de la placa huella, abscisa K0+054.





PROGRAMADA	(95.2%)
EJECUTADA	(35%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-60.15%)
ACTA DE VISITA PREVIA	————
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de parque infantil en escuela. Ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


17. Convenio 3347 de 2024: JAC Canaán

CONVENIO 3347-2024, SALENTO VEREDA CANAAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realizó vaciado de 19 módulos de cuneta izquierda, con concreto de 21 mpa hasta k0+105.6*
- *Se realizó vaciado de 23 módulos de cuneta derecha, con concreto de 21 mpa hasta k0+105.6*





PROGRAMADA	(93,03%)
EJECUTADA	(81,69%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,34%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuaciones para el centro de salud de la vereda Canaán. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

18. Convenio 2664 de 2024: JAC Los Pinos

CONVENIO 2664-2024, SALENTO VEREDA LOS PINOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realizó la instalación de formaleta y vaciado de 5 módulos de bordillo derecho desde K0+080.*
- *Se realizó el vaciado de 5 módulos de ciclópeo de sobreancho derecho y central desde el k0+080 a K0+096, con resistencia de 14MPa.*





PROGRAMADA	(93,6%)
EJECUTADA	(68,1%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-25,52%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC Consiste en adecuación, arreglo de humedades del salón comunal. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS


19. Convenio 2728 de 2024: JAC Chagualá

CONVENIO 2728-2024, SALENTO VEREDA CHAGUALA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realiza vaciado de 10 módulos de franja de ciclópeo central, con concreto de 14MPa, desde k0+064 a k0+096.*
- *> Se realiza instalación de formaletas, armado de acero de refuerzo y vaciado de 10 módulos, de ambas franjas de circulación, con concreto de 21MPa desde K0+064 a K0+096.*
- *> Se realiza instalación de formaletas, armado de acero de refuerzo y vaciado de 20 módulos, de ambas cunetas, con concreto de 21MPa desde K0+032 a K0+096.*
- *> Se realiza vaciado de 20 vigas riostra , con concreto de 21MPa, desde k0+032.*





PROGRAMADA	(88,9%)
EJECUTADA	(76,1%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-12,8%)
ACTA DE VISITA PREVIA	14-11-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12-12-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC Consiste en instalación de baranda y pintura para las locaciones de la Escuela Santísima Trinidad. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


20. Convenio 3156 de 2024: JAC Pavas

CONVENIO 3156-2024, FILANDIA VEREDA PAVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Alistamiento, preparación y vaciado de concreto en la franja central ciclópeo, entre los abscisados K0+027 - K0+040, además en la cuneta costado derecho e izquierdo, entre los abscisados K0+040 - K0+050.*



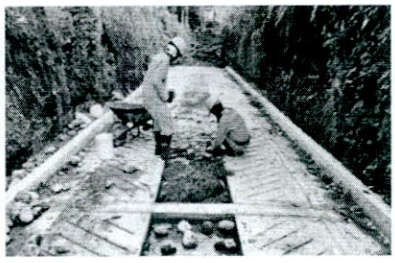

PROGRAMADA	(84,84%)
EJECUTADA	(88,9%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-1.14%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30/10/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	20/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de un parque infantil en la escuela rural. Pte de respuesta a la segunda radicación por la SS. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS


21. Convenio 3160 de 2024: JAC Piamonte

CONVENIO 3160-2024, CIRCASIA VEREDA PIAMONTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Tramo 2 - Alistamiento, preparación y vaciado de concreto en la franja huella costado derecho e izquierdo y franja central ciclópeo en el abscisado K0+076 - K0+083.*
- *Vaciado de concreto en cuneta costado derecho e izquierdo, entre los abscisados K0+061 - K0+083 y bordillo costado izquierdo abscisado K0+000 - K0+083.*

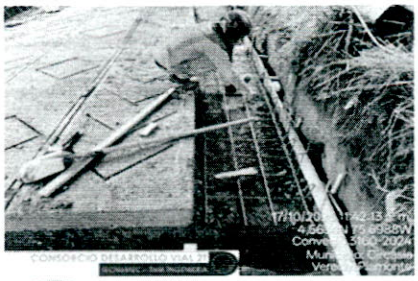

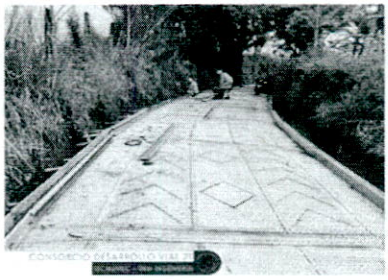

PROGRAMADA	(89,58%)
EJECUTADA	(96,85%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(7,27%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de luminarias solares En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS


22. Convenio 3777 de 2024: JAC San Juan de Carolina

CONVENIO 3777-2024, SALENTO VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Esta semana se detuvieron las actividades en la obra por el cambio de ingeniero residente y su nueva orden para ponerse al tanto de la obra y además realizar la reestructuración del personal.*





PROGRAMADA	(90,9%)
EJECUTADA	(47,50%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-43,36%)
ACTA DE VISITA PREVIA	14/11/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC Consiste en adecuaciones del salón comunal, reposición de sanitarios. En ejecución.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS


23. Convenio 2703 de 2024: JAC La Argentina

CONVENIO 2703-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA ARGENTINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se ejecuto el vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 MPa, en 8 módulos de placa huella, distribuidos en 4 a cada costado de la vía. Trabajo realizado entre las abscisas a K0+108.8 a K0+ 121.4*
- *Se ejecuto vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 Mpa, en 51.2 ml de bordillo en el costado derecho entre las abscisas K0+ 006.4 a K0+057.8*
- *Se ejecuto el vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 MPa, en 16 módulos de cuneta, distribuidos en 8 a cada costado de la vía. Trabajo realizado entre las abscisas a K0+057.6 a K0+ 083.2*
- *Se ejecuto vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 Mpa, en 16 ml de bordillo en el costado izquierdo entre las abscisas K0+ 022.6 a K0+38.6*





PROGRAMADA	(85,5%)
EJECUTADA	(76,43%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-9,06%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la reposición del cielo raso de la escuela Rural El Ocaso.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

24. Convenio 4100 de 2024: CIM Resguardo Dachi Agore Drua

CONVENIO 4100-2024, CALARCA CABILDO MAYOR INDIGENA DACHI AGORE DRUA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo la fundición de la cuneta lateral derecha y la rampa de acceso para el tramo 1.
- Se finaliza con la fundida de las vigas riostras en este tramo aplicando sikadur 32 para las juntas frías
- Se realizó el encofrado y vaciado de 5 modulos de concreto ciclópeo en el tramo 2





PROGRAMADA	(89.54%)
EJECUTADA	(35.64%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-53.90%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30/10/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en en la instalación de un parque infantil en el resguardo indígena. En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

25. Convenio 2695 de 2024: JAC Arenales

CONVENIO 2695-2024, PIJAO VEREDA ARENALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Amarre , Corte y figurado de acero #3 para huellas y cunetas
- Localizaciuon y replanteo tramo #3
- Encofrado de huellas ambos costados k0+000 - k0+021
- Instalacion de acero para vigas riostras y malla de refuerzo para huellas k0+000 - k0+021





PROGRAMADA	(89.88%)
EJECUTADA	(24.94%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-64.95%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de tanque de almacenamiento de agua (1000 litros) en la Escuela rural Santander. En trámitre la presentación y aprobación del plan de compras

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

26. Convenio 3628 de 2024: Asociación de Juntas de Acción Comunal de Calarcá

CONVENIO 3628-2024, CALARCA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- No se llevaron a cabo actividades en la semana
- El contratista no entregó oportunamente la relación de los pagos de nómina, por tal motivo los desembolsos no fueron realizados dentro de los tiempos establecidos para el pago de los mismos.





PROGRAMADA	(93.22%)
EJECUTADA	(11.42%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-81.80%)
ACTA DE VISITA PREVIA	14/11/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la construcción de un paradero Público en la entrada al ramal Pela carriel, área de influencia de la obra. Pendiente respuesta de SS. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


27. Convenio 2479 de 2024: JAC La Coqueta

CONVENIO 2479-2024, GENOVA - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó la toma de densidades sobre la subrasante previamente alistada para verificar la adecuada compactación del material. Posteriormente, se ejecutó la excavación de las vigas y la instalación del acero de refuerzo de la placa huella. Se fundieron en forma de "H" cuatro (4) módulos con sus cinco (5) vigas respectivas, las cuales fueron vaciadas completamente para conformar la estructura de la placa huella.





PROGRAMADA	(87.58%)
EJECUTADA	(40.27%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-47.31%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en reposición de cielo raso de la Escuela rural La Coqueta. Pendiente de presentar plan de compras

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

Para finalizar, se procede a exponer el avance general del contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 y de los convenios solidarios e interadministrativos:

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #3

Total Inversión =$ 1´264.100.957_____100%
Inversión programada = $ 921,884,874,67_____ 72,93%
Inversión ejecutada = $ 695,884,874,67_____ 55,05%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5´842.265.473_(100%)____ VS.___Total Ejecución =$ 2´848.278.842,40 (49%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

Una vez terminada la reunión, se acuerda que, a partir de la fecha, los comités de seguimiento se realizarán los lunes a las 2:00Pm en la Dirección Territorial Quindío, toda vez que se cuente con la disponibilidad de la sala de juntas.

4. COMPROMISO* (Descripción puntual el compromiso)	**4.1 RESPONSABLE**		**4.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO**
	NOMBRE SERVIDOR / CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	
N/A			

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	**FIRMA**
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	
Santiago Ospina Vargas	

NOMBRE	FIRMA
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Fabian Fernando Rincón Alzate	
Victor Julio Guayambuco Quintero	
Carlos Arturo Suárez	
Sara Sofía Monsalve Verjan	Sara Monsalve Verjan
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Sandra P. Oviedo R.
Jairo David Guerrero Erazo	Jairo David Guerrero.
Luisa Fernanda Zapata López	Luisa Fernanda Zapata L.

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	ETHU-FR-25
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	Versión	2
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión:	Dirección Territorial Quindio	**Ciudad:**	Armenia (Quindio)	**Fecha:**	27/10/2025
Nombre del evento:	Seguimiento al contrato de Interventoria No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindio – INVÍAS	**Lugar:**	Sala de Juntas - DT Quindio	**Responsable**	Dirección Territorial Quindio

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Nacionalidad	Edad	Sexo			Discapacidad (Ver Referencia)		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la organización o grupo	Firma
		CC	CE	P				H	M	I	SI	NO		–	N	R	G	P	NA				
1	Diego Alberto Aragon Oliver	x			1109264004	CoL	39	x				x	—						x	daragon@invias.gov.co	316 6460661	DT Quindio	
2	FERNANDO GARCIA G	x			9730458	Col	46	x				x	N/A						x	fgarcia@inviasgv.co	3113250287	INVIAS DT. QUINDIO	
3.	Fabian Fdo Rincón A.	x			1094955904	col	29	x				x	N/A.						x	frincon@inviasgov.co	3102031685.	INVIAS DT-QUINDIO	
4	Eliana Zolaga M.	x			52189792 5	Col	37		x			x	N/A						x	ezolaga@inviasg.	3244195590	Incigo DT-Quindo	
5	Sara Gonsalve Vertán	x			1234644394	Col	26		x			x	N/A						x	Saragonsalve.cdvzt@gmail.com	3143132496	CDVZT	Sara Gonsalve
6	Jairo David Guerrero	x			1085090745	col	26	x				x	N/A						x	jairodavid.98@hotmail.com	3107A32160	CDVZT	Jairo David G.
7	Carlos Arturo Suarez C.	x			1.110.443.993	Col.	39	x				x	N/A						x	residenteinterventoria2cdvzt@gmail.com	3125491709	CDVZT	
8	Victor Goyamburo	x			79451399	col.	57	x				x	N/A						x	Directordesarrollovial2t@gmail.com	3124839825	CDV 2T	
9	Sandra Patricia Cuesta				43607040	col	48		x			x	N/A.							coordcalidad-1-cdvzt@hotmail.com	3169	CDVZT	
10	Luisa Fernanda Zapata L.	x			1094883518	Col	39		x			x	N/A						x	profesionalsocial2t@gmail.com.	3128538893	CDVZT	Luisa F Zapata L.
11	Santiago Ospina Vargas	x			1192791833	Col	29	x				x	N/A						x	Soipna@invias.gov.co	3117601124	INVIAS DTQuindio	

Discapacidad: Marque con una **X SI** tiene o **NO** alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.

A	* Auditiva	S/C	* Sordo ceguera
V	* Visual -Persona ciega	PS	* Psicosocial
F	* Física	M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad

Tipo de documento: Marque con un **X** el tipo que corresponda	
CC	Cédula
CE	Cédula de Extranjeria
P	Pasaporte

Sexo	
H	Hombre
M	Mujer
I	Intersexual

Etnia	
I	Indigena
N	Negro
R	Raizal
P	Palenquero
G	Gitano/Rom
N/A	No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link: **https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022**
