1308

GOBERNACION DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas
Radicado No. 0038632
Fecha Día 22 Mes 08 Año 2025
Hora 3:45
Origen
Prioridad
Radicado Nombre:
Anexos
Copias
Modulo No.:

OFI-052-CO

Neiva, 22 de agosto de 2025

Ingeniero,
ALVARO LIS ROJAS
SECRETARÍA VÍAS E INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL HUILA
CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
NEIVA – HUILA

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA 959 DE 2024**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Asunto: **INFORME COBRO ACTA PARCIAL 2 DE OBRA E INTERVENTORIA**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito comunicar que como representante legal de la Interventoría **CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL**, nos permitimos hacer entrega de la respectiva documentación para segundo cobro acta parcial, informe de Obra e Interventoría del 11 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025, con los siguientes anexos:

1. Acta parcial
2. Acta de recibo parcial
3. Informe de actividades de contratista de Obra
4. Informe de actividades de interventor
5. Memorias de cálculo – cantidades ejecutadas
6. Acreditación de la seguridad social del personal de Obra
7. Factura
8. Contrato + RP
9. Acta de inicio
10. Pólizas iniciales legalizadas
11. dos copias de la cedula
12. Certificado bancario
13. Cronograma de actividades
14. Certificado paz y salvo aporte al sistema de seguridad social y parafiscales
15. Rut
16. Identificación tributaria

Calle 70 #2w 02 T2 Apto 603 teléfono: 8622293 Celular 3133727612
Correo electrónico consorciointerconstruccionvial@gmail.com

130

Lo anterior para tramites correspondientes del desarrollo del contrato de obra y/o comunicaciones de la supervisión del proyecto.

Agradecemos cualquier aclaración, observación o comunicación que deseen remitir al correo: consorciointerconstruccionvial@gmail.com

Cordialmente,

Juan Garcia R.

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

Folios = 351

ACTA PARCIAL 2

1. ACTA PARCIAL (FORMATO WORD)

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: 002				
_X_ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	959	AÑO:	2024
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL		
	NIT O CC:	901840107-1		
	DIRECCIÒN:	CALLE 70 N° 2W – 02 TORRE 2 APTO 603 BALCONES DE HAYUELOS	TEL:	313372 7612
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ		
	CC:	1.001.276.642 DE NEIVA (H)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 11,048 _ FECHA (dd/mm/aa): 22/07/2024**			
CUENTA BANCARIA	**No. 45500005976 banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: Ahorros**			
VALOR INICIAL	**$ 443.156.000 M/CTE**			
	Valor en Letras: Valor en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.			
APORTANTE O CONVINIENTE:	**$ 0**			
	Valor en Letras:			
	$ 0			
	Valor en Letras:			
	$ 0			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
	Nº2	**$**		
	Nº3	**$**		

VALOR TOTAL	$ 443.156.000 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.		
PLAZO ADICIONAL:	N°1	N/A	
	N°2	N/A	
	N°3	N/A	
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 DE SEPTIEMBRE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	N°1	SUSPENSIÓN	24/02/2025
		REINICIACIÓN	10/04/2025
	N°2	SUSPENSIÓN	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N°3	SUSPENSIÓN	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N°4	SUSPENSIÓN	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA LA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	16/10/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	11/12/2024 AL 23/02/2025 Y 10/04/2025 AL 31/05/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	
	EN CALIDAD DE:	R L CONSORCIO INTER CONTRUCCIÓN VIAL	
	NOMBRE:	ALVARO LIS ROJAS	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/09/2024		$ 443.156.000,00	$443.156.000,00
1. ACTA PARCIAL N° 1	10/12/2024	$152.660.340,0		$290.495.660,00

2. ACTA PARCIAL N° 2	16/10/2025	$146.775.552,00		$143.720.108,00
TOTAL		**$299.435.892,00**	**$443.156.000,00**	**$143.720.108,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ representante legal del CONSORCIO INTER CONTRUCCIÓN VIAL en calidad de contratista de Interventoría, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las siguientes planillas No. 31674653 y No. 31674690 del mes de SEPTIEMBRE DEL 2024, No. 31578869, No. 32475612 y No. 33824050 del mes de OCTUBRE DEL 2024, Planilla No. 31938613, No. 32475633 y No. 33824093 del mes de NOVIEMBRE DEL 2024, No. 32252774, No. 32475670 y No. 33824135 del mes de DICIEMBRE DEL 2024, No. 32475785, No. 32475799 y No. 33824176 del mes de ENERO DEL 2025, No. 32813347, No. 32813322 y No. 33824252 del mes de FEBRERO DEL 2025, No. 33356735 y No. 33824346 del mes de ABRIL DEL 2025, No. 33719942 y No. 33824460 del mes de MAYO DEL 2025 con los siguientes valores:

Planilla No. 31674653 del mes de SEPTIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 880.000	Salud	$ 36.500
	Pensión	$ 146.000
	ARL	$ 63.600
	CCF	$ 36.500

Planilla No. 31674690 del mes de SEPTIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 2.492.000	Salud	$ 322.100
	Pensión	$ 1.287.500
	ARL	$ 560.400
	CCF	$ 322.000

Planilla No. 31578869 del mes de OCTUBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 2.200.000	Salud	$ 89.100
	Pensión	$ 356.300
	ARL	$ 155.100
	CCF	$ 89.100

Planilla No. 32475612 del mes de OCTUBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 673.500	Salud	$ 87.100
	Pensión	$ 347.900
	ARL	$ 151.400
	CCF	$ 87.100

Planilla No. 33824050 del mes de OCTUBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 5.721.300	Salud	$ 739.300
	Pensión	$ 2.956.500
	ARL	$ 1.286.300
	CCF	$ 739.200

Planilla No. 31938613 del mes de NOVIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 2.200.000	Salud	$88.800
	Pensión	$355.100
	ARL	$ 154.600
	CCF	$ 88.800

Planilla No. 32475633 del mes de NOVIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.118.200	Salud	$ 144.500
	Pensión	$ 577.800
	ARL	$ 251.400
	CCF	144.500

Planilla No. 33824093 del mes de NOVIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 5.123.400	Salud	$ 662.000
	Pensión	$ 2.647.500
	ARL	$ 1.151.900
	CCF	$ 662.000

Planilla No. 32252774 del mes de DICIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 2.200.000	Salud	$ 89.400
	Pensión	$ 357.600
	ARL	$ 155.600
	CCF	$ 89.400

Planilla No. 32475670 del mes de DICIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.096.400	Salud	$ 141.700
	Pensión	$ 566.500
	ARL	$246.500
	CCF	$ 141.700

Planilla No. 33824135 del mes de DICIEMBRE DEL 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 5.035.700	Salud	$ 650.600
	Pensión	$ 2.602.400
	ARL	$1.132.100
	CCF	$ 650.600

Planilla No. 32475785 del mes de ENERO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 2.200.000	Salud	$ 89.300
	Pensión	$ 357.000
	ARL	$ 155.400
	CCF	$ 89.300

Planilla No. 32475799 del mes de ENERO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.075.200	Salud	$ 139.000
	Pensión	$ 555.500
	ARL	$ 241.700
	CCF	$ 139.000

Planilla No. 33824176 del mes de ENERO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 4.950.300	Salud	$ 639.600
	Pensión	$ 2.558.200
	ARL	$ 1.112.900
	CCF	$ 639.600

Planilla No. 32813347 del mes de FEBRERO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 2.200.000	Salud	$ 89.700
	Pensión	$ 358.700
	ARL	$ 156.100
	CCF	$ 89.700

Planilla No. 32813322 del mes de FEBRERO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.080.200	Salud	$ 139.600
	Pensión	$ 558.200
	ARL	$ 242.800
	CCF	$ 139.600

Planilla No. 33824252 del mes de FEBRERO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 3.898.000	Salud	$ 503.700
	Pensión	$ 2.014.200
	ARL	$ 876.400
	CCF	$ 503.700

Planilla No. 33356735 del mes de ABRIL DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.663.500	Salud	$ 225.500
	Pensión	$ 901.100
	ARL	$ 340.900
	CCF	$ 196.000

Planilla No. 33824346 del mes de ABRIL DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 3.293.200	Salud	$ 425.500
	Pensión	$ 1.701.700
	ARL	$ 740.500
	CCF	$ 425.500

Planilla No. 33719942 del mes de MAYO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.598.300	Salud	$ 226.500
	Pensión	$ 905.200
	ARL	$ 296.300
	CCF	$ 170.300

Planilla No. 33824460 del mes de MAYO DEL 2025

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 4.620.900	Salud	$ 597.100
	Pensión	$ 2.387.900
	ARL	$ 1.038.900
	CCF	$ 597.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): **N/A** Quien suscribe: _____**N/A**_____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. En la Ejecución del contrato se autorizó y se desembolsó el anticipo correspondiente al 30% por el valor de **$132.946.800,00** por parte del Departamento del Huila.
3. Que en ejecución del contrato se autorizó el pago: ACTA PARCIAL N° 02 de fecha 07/10/2025 correspondiente al periodo del 11/12/2024 AL 23/02/2025 Y 10/04/2025 AL 31/05/2025, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($146.775.552,00)** Valor al que se amortizara **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($44.032.665,60)** por concepto de anticipo; por lo tanto el valor neto a pagar es la suma de **CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($102.742.886,40).**
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial N° 002.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

ALVARO LIS ROJAS
SUPERVISOR DESIGNADO
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO INTER CONTRUCCIÓN VIAL
R/L. JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

HANS JAIVER MUÑOZ
TECNICO OPERATIVO SVI

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL (FORMATO EXCEL)

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión: 3
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL N°2

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	959	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:	$ 443.156.000,00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	2	HOJA	1	DE	1	PLAZO INICIAL	8 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
SUPERVISOR:	ALVARO LIS ROJAS		16	10	2025			PLAZO ADICIONAL	0 MESES	$ 0,00	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELIAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARIA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					PLAZO TOTAL	8 MESES	V.R. TOTAL	
19/sep/2024	Nº 1 24/feb/2025 10/abr/2025									$ 443.156.000,00	
	Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N. 1		PRESENTE ACTA N.2		ACUMULADA	
ITEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACIÓN (%)	CANT.	MESES	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR	MESES	VALOR	MESES	VR/TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL											
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.500.000,00	50%	1,00	8,00	$ 18.000.000,00	2,76	$ 6.210.000,00	2,64	$ 5.940.000,00	5,40	$ 12.150.000,00
2	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.500.000,00	100%	1,00	8,00	$ 28.000.000,00	2,76	$ 9.660.000,00	3,48	$ 12.180.000,00	6,24	$ 21.840.000,00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	$ 4.000.000,00	15%	1,00	8,00	$ 4.800.000,00	2,76	$ 1.656.000,00	2,64	$ 1.584.000,00	5,40	$ 3.240.000,00
4	ESPECIALISTA VIAS Y/O PAVIMENTOS	$ 4.000.000,00	15%	1,00	8,00	$ 4.800.000,00	2,76	$ 1.656.000,00	2,64	$ 1.584.000,00	5,40	$ 3.240.000,00
5	INGENIERO AMBIENTAL	$ 3.000.000,00	100%	1,00	8,00	$ 24.000.000,00	2,76	$ 8.280.000,00	2,64	$ 7.920.000,00	5,40	$ 16.200.000,00
6	TECNOLOGO SISO	$ 2.200.000,00	100%	1,00	8,00	$ 17.600.000,00	2,76	$ 6.072.000,00	2,64	$ 5.808.000,00	5,40	$ 11.880.000,00
7	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1	$ 2.000.000,00	100%	1,00	8,00	$ 16.000.000,00	2,76	$ 5.520.000,00	2,64	$ 5.280.000,00	5,40	$ 10.800.000,00
8	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 2	$ 2.000.000,00	100%	1,00	8,00	$ 16.000.000,00	2,76	$ 5.520.000,00	2,64	$ 5.280.000,00	5,40	$ 10.800.000,00
	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO											
9	TOPOGRAFO	$ 2.360.000,00	100%	1,00	8,00	$ 18.880.000,00	2,76	$ 6.513.600,00	2,64	$ 6.230.400,00	5,40	$ 12.744.000,00
10	CADENERO 1	$ 1.300.000,00	100%	1,00	8,00	$ 10.400.000,00	2,76	$ 3.588.000,00	2,64	$ 3.432.000,00	5,40	$ 7.020.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 158.480.000,00		$ 54.675.600,00		$ 55.238.400,00		$ 109.914.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,00		2,00		2,00		2,00
	VALOR TOTAL DEL PERSONAL					$ 316.960.000,00		$ 109.351.200,00		$ 110.476.800,00		$ 219.828.000,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS											
11	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	$ 1.600.000,00	1		8,00	$ 12.800.000,00	2,76	$ 4.416.000,00	2,64	$ 4.224.000,00	5,40	$ 8.640.000,00
12	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMIENTOS (LIMITES, DENSIDADES: PROCTOR, GRANULOMETRIA , RESISTENCIA - CONCRETO FLEXION .. ETC.	$ 2.130.000,00	1		8,00	$ 17.040.000,00	2,76	$ 5.878.800,00	0,00	$ 0,00	2,76	$ 5.878.800,00
13	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA 2000 CC PICK-UP O SIMILAR (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)	$ 3.200.000,00	1		8,00	$ 25.600.000,00	2,70	$ 8.640.000,00	2,70	$ 8.640.000,00	5,40	$ 17.280.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTO					$ 55.440.000,00		$ 18.934.800,00		$ 12.864.000,00		$ 31.798.800,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					$ 372.400.000,00		$ 128.286.000,00		$ 123.340.800,00		$ 251.626.800,00
	IVA 19%					$ 70.756.000,00		$ 24.374.340,00		$ 23.434.752,00		$ 47.809.092,00
	VALOR PRESENTE ACTA					$ 443.156.000,00		$ 152.660.340,00		$ 146.775.552,00		- $ 299.435.892,00
	DESCUENTO AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30%)						34,45%	-$ 45.798.102,00	33,12%	-$ 44.032.665,60	67,57%	-$ 89.830.767,60
	VALOR TOTAL					$ 443.156.000,00		$ 106.862.238,00		$ 102.742.886,40		$ 209.605.124,40

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Rep. Legal JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTORÍA

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISÒ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

1316

3. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

HUILA 1905	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila

INFORME DE INTERVENTORIA PARCIAL CONTRATO No. 959 de 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

PERIODO: DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 AL 23 DE FEBRERO 2025 Y 10 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2025

MUNICIPIOS: ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA

DEPARTAMENTO: HUILA

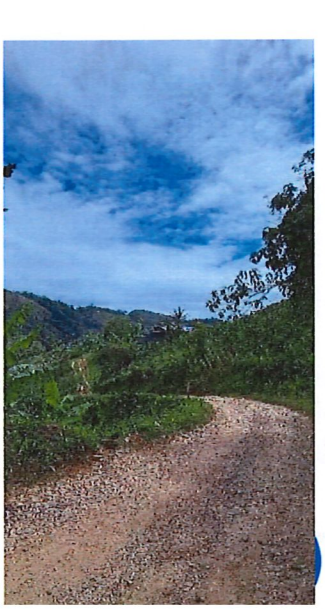




TABLA DECONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. MUNICIPO DE ELIAS 4
2.2. MUNICIPIO DE YAGUARA 4
2.3. MUNICIPIO DE PALERMO, SANTA MARIA Y NEIVA 5
2.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1 CONTROL DE POLIZAS 9
4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS OBRAS EJECUTADA 11
SEPTIEMBRE ..... ¡Error! Marcador no definido.
5. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA 18
6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 18
7. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA 18
8. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA 19
9. TIEMPO DE EJECUCIÓN 19
10. NFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 20
10.1. CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA 20
10.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 22
10.2.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 22
10.2.2. ACTIVIDADES GENERALES 22
10.2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 23
10.2.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS 23
10.2.5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 23
10.3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA 25
10.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 25
10.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA 26
11. PLAN DE CALIDAD 26
11.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 26
11.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL INTERVENTOR 26
12. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 27
13. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 27

1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 959 se ve la necesidad de fortalecer la comunicación vial y la inversión en el sector transporte constituye para el país uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, pues a partir de éste se pueden generar cambios, los cuales permitan reducir las brechas referentes a infraestructura para la intercomunicación municipal y al mismo tiempo mejorar las dinámicas comerciales de los territorios, propendiendo por un panorama más alentador para el sector productivo local. En muchas de las zonas de Colombia, pero sobre todo en la parte rural se cuenta con serias limitaciones en relación con la prestación de servicios e infraestructura, por lo que se hace necesario emprender todo tipo de acciones que contribuyan a la disminución de las disparidades presentadas entre las zonas urbanas y rurales, y al mismo tiempo permita mejorar las condiciones de competitividad de los territorios.

Bajo este contexto y como parte de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, el mejoramiento y desarrollo de infraestructura vial terciaria en el país se constituye en uno de los principales referentes en la apuesta por dignificar y reducir las brechas tan marcadas en las zonas rurales de Colombia. Es así como el presente proyecto de obra tiene como propósito mejorar la red vial terciaria de los Municipios de Elías, Palermo, Yaguará, Santa María y Neiva, lo cual permitirá un mejor acceso. De esta manera se aportará el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas.

Igualmente, en desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024 y mediante la Resolución No.135 de 2024 adjudicó el proceso de Concurso de Mérito No SVCMIN0032-23, cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. La cual fue adjudicada al proponente CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($443.156.000) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, representado legalmente por JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ, con cedula de ciudadanía No. 1.001.276.642 de Neiva y con un plazo estimado de OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La fecha de Inicio del Proyecto es el 19 de septiembre del 2024 y Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos se realiza el presente Informe Parcial que comprende las actividades ejecutadas que sería el informe No. 4, 5, 6, 7 y 8 de Interventoría, correspondiente a las labores ejecutadas en el periodo del 11 de diciembre 2024 al 24 de febrero 2025 y 10 de abril al 31 de mayo del 2025.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. MUNICIPO DE ELIAS

Elías es un municipio colombiano localizado al suroriente del departamento del Huila. Yace sobre la Serranía de la Ceja y las estribaciones de la cordillera central. Hace parte de la región Subsur del departamento. Su extensión territorial es de 82 km², su altura es de 1425 msnm y su temperatura promedio es de 20 °C.



Imagen 1. Localización Municipio Elías - Huila en Colombia – Fuente Wikipedia

2.2. MUNICIPIO DE YAGUARA

Yaguará es un municipio colombiano ubicado en el centro del departamento del Huila. Yace entre los valles del río Yaguará y el río Magdalena, en la vertiente oriental de la cordillera central. Hace parte de la región SubNorte del departamento. Su extensión territorial es de 329 km², su altura es de 560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 25 °C.5



Imagen 2 Localización Municipio de Yaguará– Fuente Wikipedia.

2.3. MUNICIPIO DE PALERMO, SANTA MARIA Y NEIVA

Palermo es un municipio colombiano ubicado en el noroccidente del departamento del Huila. Hace parte de la región andina, localizado en el alto del valle del Magdalena al oriente de la cordillera Central y hace parte de la región Sub-Norte del departamento. Su extensión territorial es de 917 km², su altura es de 690 msnm y su temperatura promedio es de 27 °C.

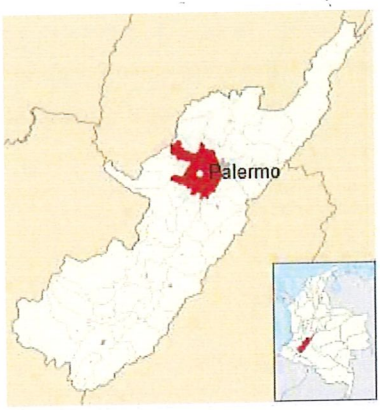


Imagen 2 Localización Municipio de Palermo – Fuente Wikipedia.

Santa María es un municipio colombiano ubicado en el noroccidente del departamento del Huila. Yace sobre las estribaciones de la cordillera central. Comprende la cuenca alta del río Baché y un sector de la cuenca alta del río Saldaña; drenando sus aguas al río Magdalena. Su extensión territorial es de 378 km², su altura es de 1320 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.



Imagen 3 Localización Municipio de Santa María – Fuente Wikipedia.

Neiva es un municipio colombiano, capital del departamento de Huila. Situado entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por

los ríos Las Ceibas y del Oro. Su extensión territorial de 1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 27.7 °C.

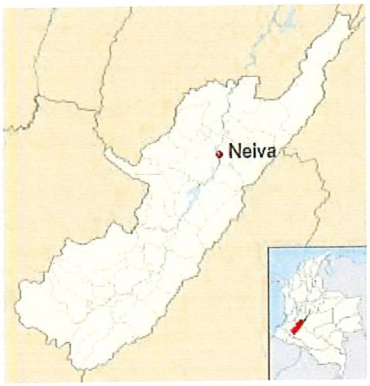


Imagen 4 Localización Municipio de Neiva – Fuente Wikipedia.

2.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La placa huella es una técnica utilizada para mejorar vías terciarias, ésta tiene uso difundido en el país, particularmente en convenios establecidos entre el INVIAS y las entidades territoriales. Es importante mencionar que las afectaciones o deterioro de las vías regularmente están asociadas a la existencia de condiciones críticas que afectan las condiciones de esta como es el caso del drenaje, estabilidad de taludes o condiciones geológicas o geotécnicas. De igual forma es necesario tener en cuenta que la técnica de placa huella está basada para ser funcional en condiciones de bajo tránsito de vías terciarias.

Específicamente la placa huella se ha utilizado en el mejoramiento de vías terciarias afectadas en su superficie, con continuas suspensiones del tránsito vehicular, en tramos con pendientes longitudinales iguales o mayores al 10%. La placa huella consiste en una configuración de placas de concreto hidráulico, separadas entre sí por piedra pegada; las placas están confinadas por viguetas reforzadas. En la capa de relleno inferior de 15 cm de subbase granular se deberá considerar la conformación de una pendiente transversal mínima del 2% para generar el bombeo que facilitará el escurrimiento del agua sobre la placa huella hacia las cunetas.

Para el presente proyecto la infraestructura constará en realizar el mejoramiento de un total de 4400 metros de vías terciarias en el Departamento del Huila mediante la construcción de placas huellas, distribuidos así:

- MUNICIPIO DE ELIAS

VEREDA SECTOR TRAMO	LONGITUD (M)
Vereda El progreso - Sector Alto oritoguaz.	200
Vereda Oritoguaz - Sector alto oritoguaz	200
Vereda Gallardito - Sector delicias	200
Vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T1	100
Vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T2	200
LONGITUD TOTAL PARA INTERVENIR (mt)	**900**

- MUNICIPIO DE YAGUARA

TRAMO - VEREDA	LONG.
Vereda upar - subida y bajada finca las nubes tramo 1	120
Vereda upar - subida y bajada finca las nubes tramo 2	180
Vereda la paz - sector subida finca San Nicolas	100
Vereda la paz- sector finca Miraflores y la Esmeralda	100
Vereda viso - sector subida antes de llegar al primer cruce	250
Vereda viso - sector subida antes de llegar al primer cruce olivo	100
Vereda viso bajo 1	100
Vereda viso bajo 2	100
Vereda arenoso - sector subida finca buenos aires tramo 1	120
Vereda arenoso - sector la escuela	80
Vereda Arenoso	150
Vereda Vilu alto	200
Vereda Vilu bajo	100
Vereda la floresta	100
LONGITUD TOTAL PARA INTERVENIR (mt)	**1800**

- MUNICIPIO DE PALERMO, SANTA MARIA Y NEIVA

MUNICIPIO	VEREDA - SECTOR - TRAMO	LONGITUD (METROS)
PALERMO	Vereda Buenos Aires	200
PALERMO	Vereda San Gerardo	150
PALERMO	Vereda Porvenir	150

MUNICIPIO	VEREDA - SECTOR - TRAMO	LONGITUD (METROS)
PALERMO	Vereda Alto San Pedro	150
PALERMO	Vereda Bajo San Pedro T 1	90
PALERMO	Vereda Bajo San Pedro T 2	60
PALERMO	Vereda Alto Sardinata	150
PALERMO	Vereda Nazareth	150
PALERMO	Vereda El Carmen - Sector Dos Quebradas T2	75
PALERMO	Vereda El Mirador T1	75
PALERMO	Vereda El Mirador T2	75
NEIVA	Vereda Quebradon	150
	Vereda Quebradon	150
SANTA MARIA	Vereda El Carmen - Sector Dos Quebradas T1	75
LONG. TOTAL (mts)		**1700**

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	867 DE 2024		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	**NIT:**	901825668 - 9
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR ROJAS TORRES	**C.C:**	3.249.514 CUND.
FECHA DE SUSCRIPCION (D/M/A):	05 JULIO 2024		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	19 SEPTIEMBRE 2024		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO		
VALOR INCIAL:	$ 6.022.807.641.00 M/CTE		
	Valor en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
VALOR TOTAL:	$ 6.022.807.641.00 M/CTE		
	Valor en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE		

3.1 CONTROL DE POLIZAS

El contrato de Obra fue amparado con los seguros expedidos por la compañía SEGUROS MUNDIAL, las pólizas iniciales correspondientes fueron revisadas y aprobadas, por la Gobernación del Huila Departamento Administrativo Jurídico.

Póliza legalización del CONTRATO DE OBRA:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	0	11/07/2024	Cumplimiento del contrato	$ 1.204.561.528,20	10/07/2024	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.806.842.292,30	10/07/2024	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$602.280.764,10	10/07/2024	10/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$1.204.561.528,20	10/03/2025	10/03/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100083654	0	10/07/2024	$520.000.000,00	10/07/2024	10/03/2025

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	2	24/11/2024	Cumplimiento del contrato	$ 1.204.561.528,20	19/09/2024	19/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.806.842.292,30	19/09/2024	19/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$602.280.764,10	19/09/2024	20/05/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$1.204.561.528,20	20/05/2025	20/05/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100083654	2	24/11/2024	$520.000.000,00	19/09/2024	20/05/2025

HUILA 1905	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	3	14/05/2025	Cumplimiento del contrato	$ 1.204.561.528,20	24/02/2025	19/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.806.842.292,30	24/02/2025	19/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$602.280.764,10	24/02/2025	20/05/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$1.204.561.528,20	20/05/2025	20/05/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100083654	3	14/05/2025	$520.000.000,00	19/09/2024	20/05/2025

Póliza actualizada x CANCELACIÓN DE PÓLIZA POR CESIÓN PARCIAL DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	4	14/05/2025	Cumplimiento del contrato	$ 1.204.561.528,20	27/02/2025	19/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.806.842.292,30	27/02/2025	19/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$602.280.764,10	27/02/2025	20/05/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$1.204.561.528,20	20/05/2025	20/05/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100083654	4	14/05/2025	$520.000.000,00	19/09/2024	20/05/2025

Póliza actualizada x RECOMPOSICIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	5	14/05/2025	Cumplimiento del contrato	$ 1.204.561.528,20	27/02/2025	19/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.806.842.292,30	27/02/2025	19/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$602.280.764,10	27/02/2025	20/05/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$1.204.561.528,20	20/05/2025	20/05/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	NB-100083654	5	14/05/2025	$520.000.000,00	19/09/2024	20/05/2025

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
						DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	6	14/05/2025	Cumplimiento del contrato	$ 1.204.561.528,20	10/04/2025	04/11/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.806.842.292,30	10/04/2025	04/11/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$602.280.764,10	10/04/2025	04/07/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$1.204.561.528,20	04/07/2025	04/07/2030
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN		Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
						DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	NB-100083654	6	14/05/2025		$520.000.000,00	19/09/2024	04/07/2025


4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS OBRAS EJECUTADA

CONTRATO No. 867 DEL 2024			ELIAS-PALERMO-YAGUARA-SANTA MARIA - NEIVA
VALOR INICIAL	$	6,022,807,641.00	
VALOR MODIFICACIONES 1	$	-	% EJECUCION
VALOR ACTA PARCIAL N°1	$	2,074,761,242.00	67.59%
VALOR ACTA PARCIAL N°2	$	1,996,174,099.00	
VALOR ACUMULADO	$	4,070,935,341.00	
VALOR FINAL TOTAL	$	6,022,807,641.00	

Teniendo en cuenta el presente corte de obra que comprende desde el 11 de diciembre del 2024 al 24 de febrero del 2025 hasta el 10 de abril al 31 de mayo del 2025, hasta la fecha el avance de obra se encuentra dentro de las márgenes establecidas en el programa de trabajo, con una diferencia mínima entre lo programado y lo ejecutado. De acuerdo con la planificación inicial, se había proyectado completar para el presente mes un avance del **53,00%**, y un avance financiero hasta el 10 de diciembre del **34,45**% actualmente hemos logrado un avance acumulado del **67,59%**, lo que indica un cumplimiento cercano al **100%**. El porcentaje del avance para el periodo antes mencionado se discrimina de la siguiente manera como se evidencia en la siguiente tabla por cada municipio:

MUNICIPIO	% DE EJECUCIÓN		
	Acta parcial No. 1	Acta parcial No. 2	Acumulado de actas
Elías	36,38%	36,99%	73,37%
Palermo	34,55%	26,54%	61,09%
Yaguará	42,00%	44,32%	86,32%
Santa María	0%	0,29%	0,29%
Neiva	0%	0,15%	0,15%

A continuación, se presenta el avance de ejecución de los diferentes frentes de trabajo por cada municipio:

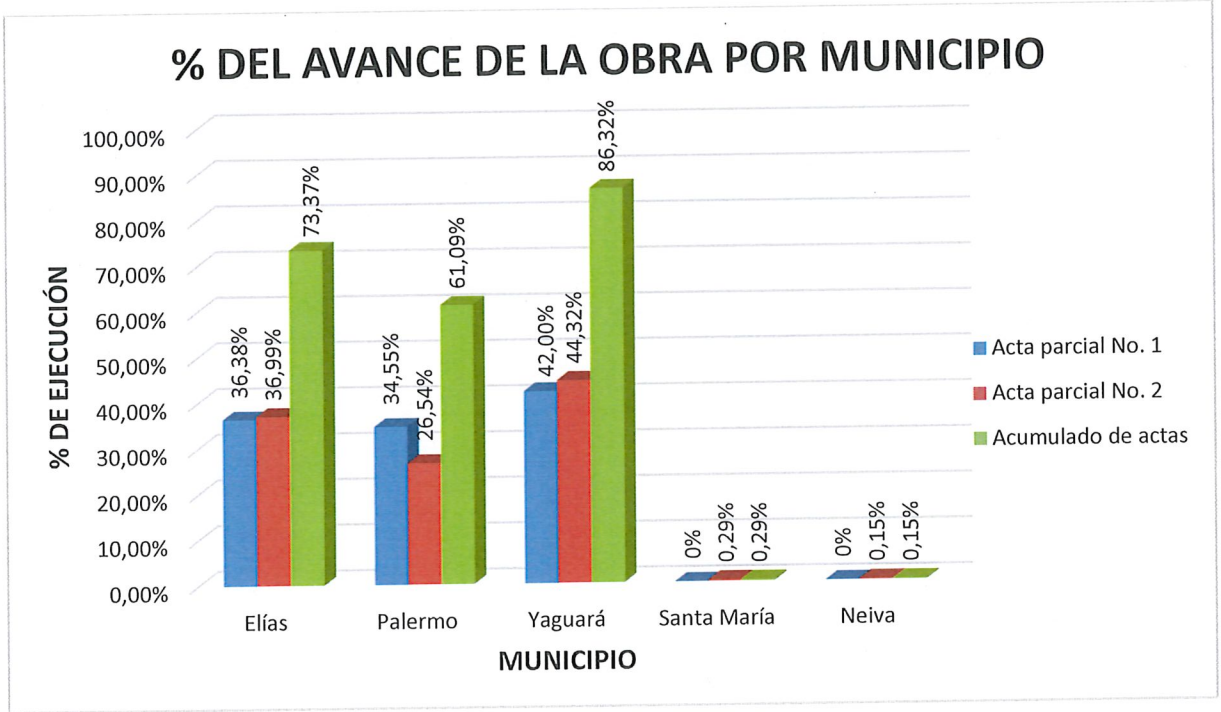


Para el 01 al 10 de diciembre se obtuvo un avance del **8,68%** y del 11 al 30 de diciembre de obtuvo un avance **6,63%,** para enero, hemos logrado un avance del **6,63%**, para febrero, se ha obtenido un avance del **6,63%,** abril un avance del **6,63%,** mayo un avance del **6,62%.** Para el presente mes, se realizaron las siguientes actividades:

DICIEMBRE DEL 2024

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.

- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó conformación del terreno, para instalación de sub-rasante
- Se realizó, nivelación, humedecimiento y compactación de mejoramiento de la sub-rasante mediante material granular clasificado como seleccionado.
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos
- Cumplimiento de las obligaciones de las partes.

CONTRATO DE OBRA 867 2024		
DICIEMBRE DEL 2024		
VALOR INCIAL	$ 6.022.807.641,00	% EJECUCIÓN
VALOR MODIFICACIONES	$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 424.005.658,00	**7,04%**
VALOR TOTAL	$ 6.022.807.641,00	

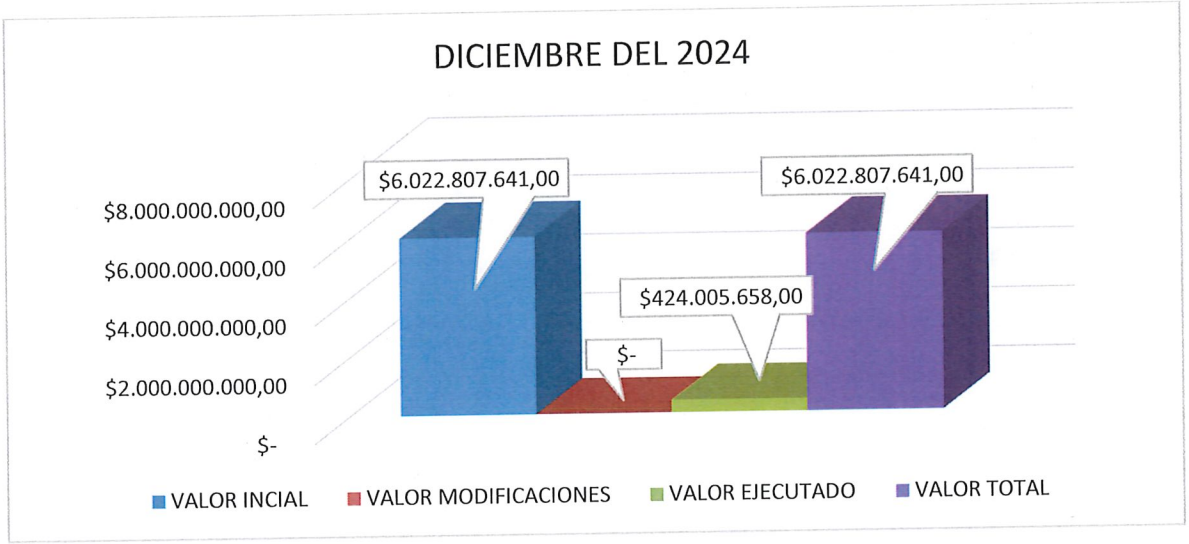

En el transcurso de estos 30 días de ejecución contractual, El presente informe hace referencia a las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo entre el 10 al 30 de diciembre de 2024.


Se realiza la visita para coordinar con los mandatarios y lideres sociales para realizar la socialización del proyecto y la conformación del acta de veeduría y tal como lo manifiesta la ley 850 de 2003, se

hace necesario realizar los respectivos tramites de socialización y constitución de veeduría para poder iniciar las actividades.

ENERO DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó, nivelación, humedecimiento y compactación de mejoramiento de la sub-rasante mediante material granular clasificado como seleccionado.
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos

CONTRATO DE OBRA 867 2024		
ENERO DEL 2025		
VALOR INCIAL	$ 6.022.807.641,00	% EJECUCIÓN
VALOR MODIFICACIONES	$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 424.005.658,00	**7,04%**
VALOR TOTAL	$ 6.022.807.641,00	

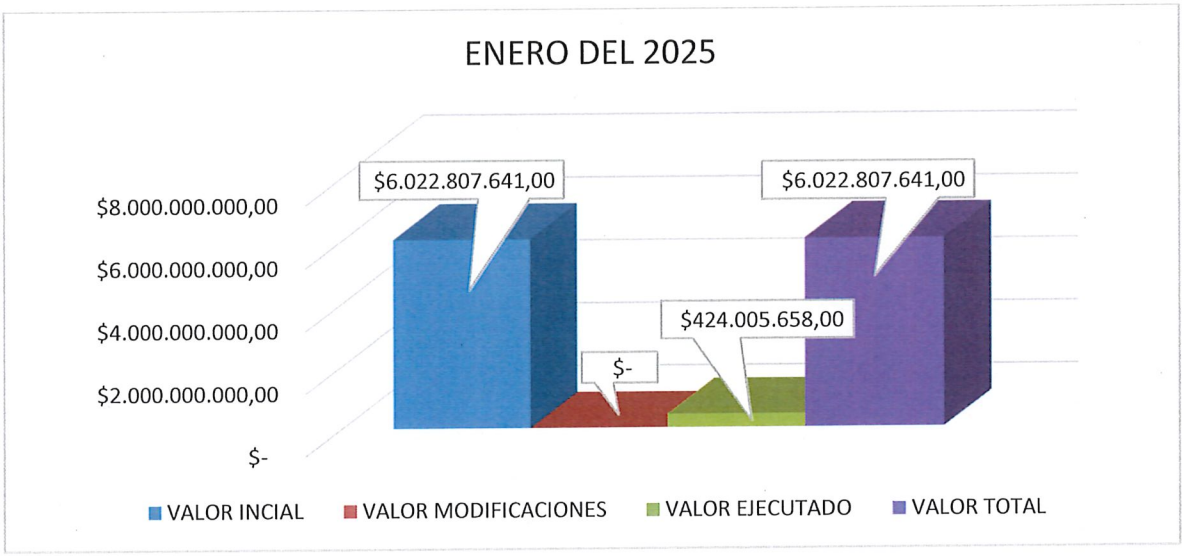


HUILA 1905	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila

En el transcurso de estos 30 días de ejecución contractual, El presente informe hace referencia a las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo entre el 01 al 30 de enero de 2025.

FEBRERO DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica.
- Se realizó excavación manual para viga riostra.
- Se realizó, nivelación, humedecimiento y compactación de mejoramiento de la sub-rasante mediante material granular clasificado como seleccionado.
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos.
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos.

CONTRATO DE OBRA 867 2024		
FEBRERO DEL 2025		
VALOR INCIAL	$ 6.022.807.641,00	% EJECUCIÓN
VALOR MODIFICACIONES	$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 424.005.658,00	**7,04%**
VALOR TOTAL	$ 6.022.807.641,00	

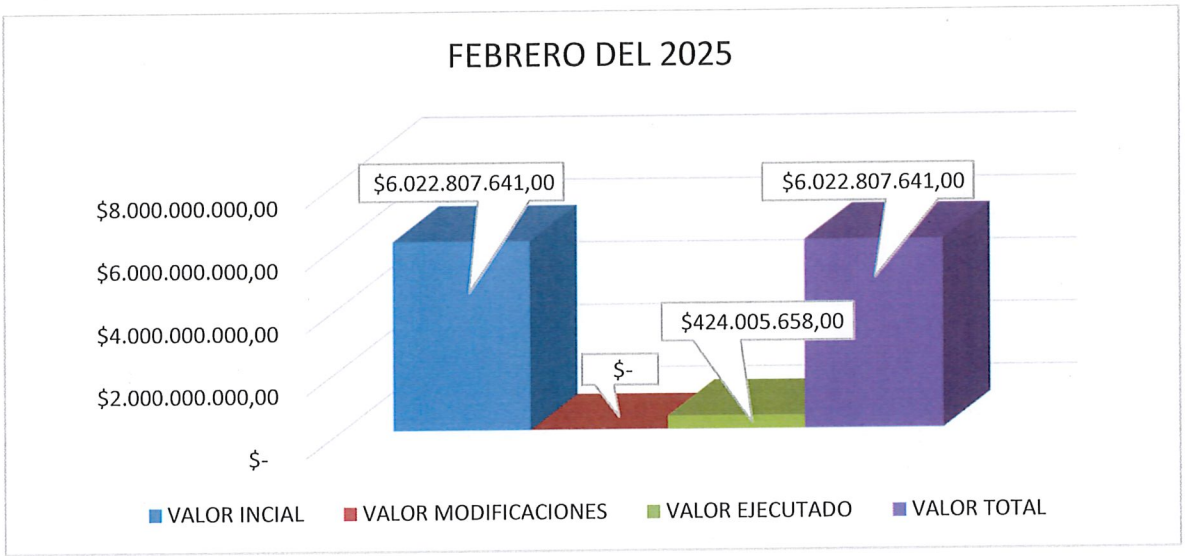


HUILA 1905	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila

En el transcurso de estos 30 días de ejecución contractual, El presente informe hace referencia a las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo entre el 01 al 24 de febrero de 2025.

ABRIL DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó, nivelación, humedecimiento y compactación de mejoramiento de la sub-rasante mediante material granular clasificado como seleccionado.
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos

CONTRATO DE OBRA 867 2024		
ABRIL DEL 2025		
VALOR INCIAL	$ 6.022.807.641,00	% EJECUCIÓN
VALOR MODIFICACIONES	$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 424.005.658,00	**7,04%**
VALOR TOTAL	$ 6.022.807.641,00	

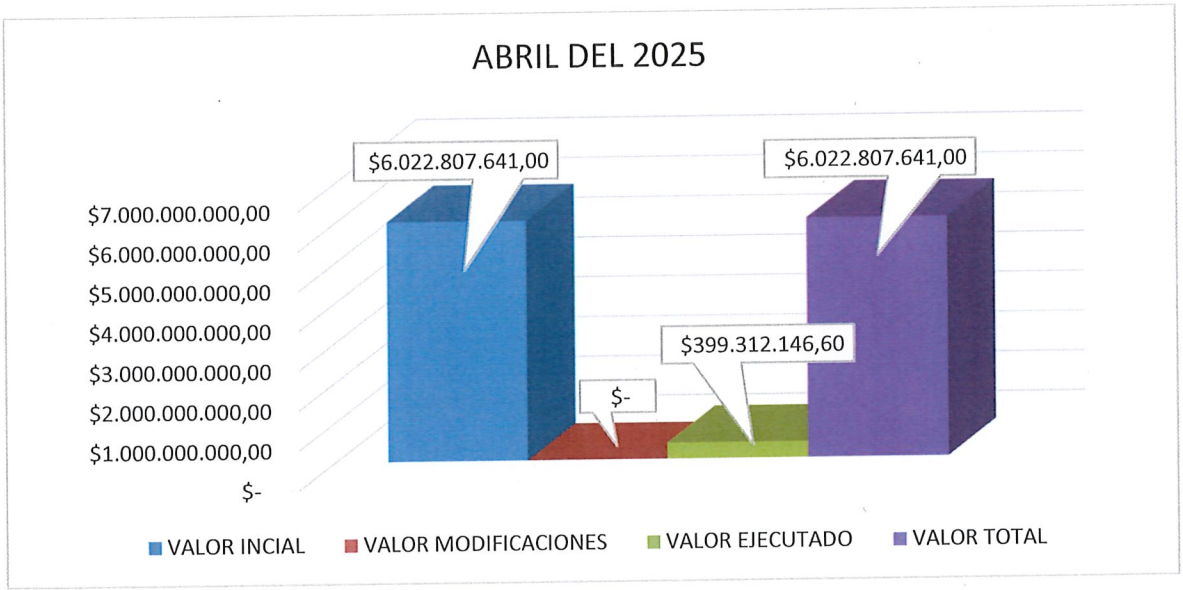


En el transcurso de estos días de ejecución contractual, El presente informe parcial hace referencia a las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo entre el 10 al 30 de abril de 2025.

MAYO DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó conformación del terreno, para instalación de sub-rasante
- mediante material granular clasificado como seleccionado.
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó, nivelación, humedecimiento y compactación de mejoramiento de la sub-base
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos.

CONTRATO DE OBRA 867 2024		
MAYO DEL 2025		
VALOR INCIAL	$ 6.022.807.641,00	% EJECUCIÓN
VALOR MODIFICACIONES	$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 300.151.467,00	4,98%
VALOR TOTAL	$ 6.022.807.641,00	

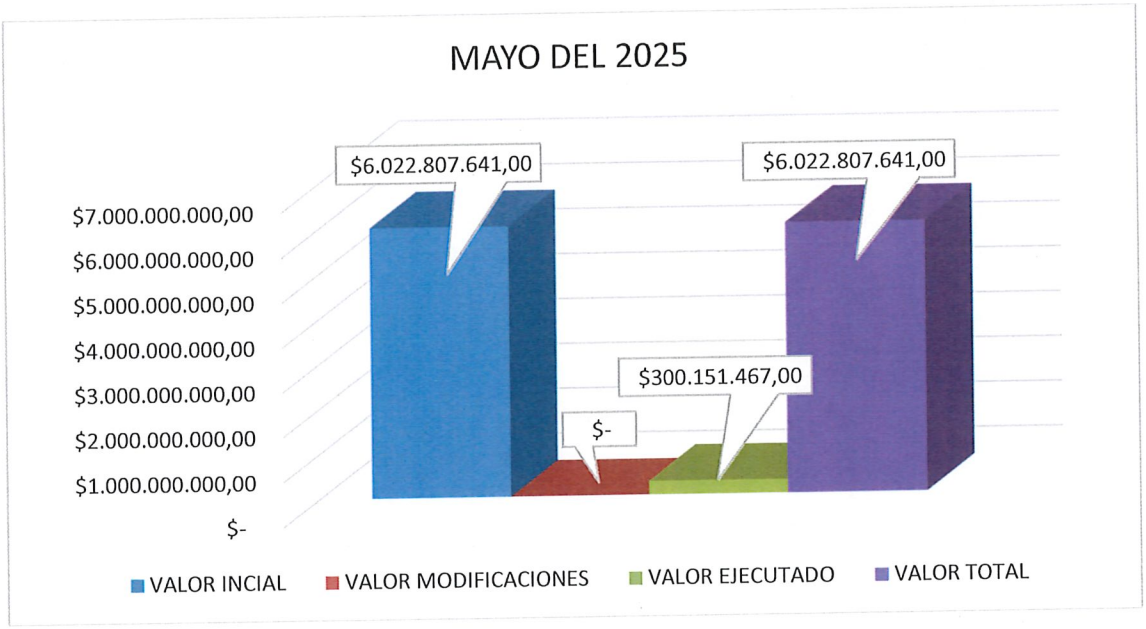

5. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NESTOR ROJAS TORRES	Director De Obra	Prestación de servicios
LUIS FERNANDO GARCIA PEÑA	Residente De Obra	Prestación de servicios
JHON EDINSON YAIME BORRERO	Profesional sisoma	Prestación de servicios
LEONARDO GONZALEZ RUIZ	Profesional ambiental	Prestación de servicios
ALFONSO RENDON VALENCIA	Especialista estructural	Prestación de servicios
RAUL EDUARDO ROJAS BORBON	Especialista geotécnico	Prestación de servicios
MILTON RAFAEL PAEZ GONZALEZ	Topografo	Prestación de servicios

6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

- Observar **Anexo N° 1**

7. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA


Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (30%)	26/12/2024	$ 1.806.842.292,00		$ 1.806.842.292,00
Acta Parcial No. 1	10/12/2024	$ 2.074.740.438,00	$ 622.422.131,00	$ 1.452.318.307,00
Acta Parcial No. 2	31/05/2025	$ 1.996.174.099,00	$ 598.852.230,00	$ 1.397.321.869,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 6.022.807.641,00	$ 0,00	$ 6.022.807.641,00	$ 4.070.914.537,00	$ 1.951.893.104,00

8. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA

- Observar **Anexo N° 2**

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN

CUADRO TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRATO			
TIEMPO TOTAL		TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO POR EJECUTAR
8	MES		
TIEMPO PRORROGA			
0	MESES		
TIEMPO TOTAL			
8	MESES	6.73	1.27

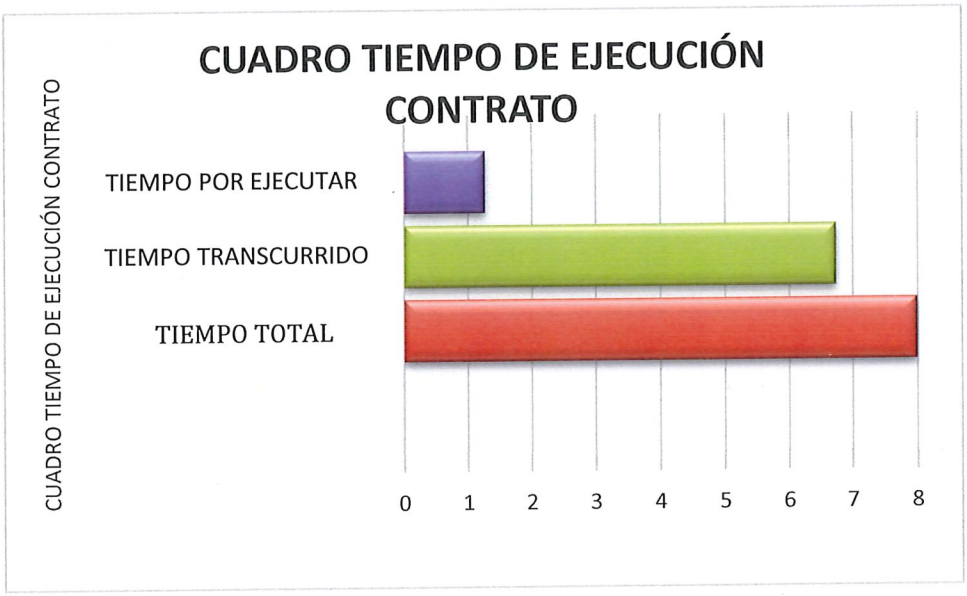

10. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA	**ENTIDAD**	GOBERNACIÓN DEL HUILA
INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	959 DE 2024		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	**NIT:**	901840107 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	**C.C:**	1.001.276.642 DE NEIVA (H)
FECHA DE INICIO (D/M/A):	19 SEPTIEMBRE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO CONTRATO TOTAL:	$ 443.156.000 M/CTE **Valor en Letras:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
INGENIERO DIRECTOR INTERVENTORIA	**AIDENI BOLAÑOS JIMENEZ**		
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	**NELSON VARGAS ALMARIO**		

10.1. CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

El contrato de Interventoría fue amparado con los seguros expedidos por la compañía SEGUROS MUNDIAL, las pólizas correspondientes fueron revisadas y aprobadas, por la Gobernación del Huila Departamento administrativo Jurídico.

HUILA 1905	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila

Póliza legalización del CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100026301	0	29/07/2024	Cumplimiento del contrato	$ 88.631.200,00	29/06/2024	28/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$132.946.800,00	29/06/2024	28/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 88.631.200,00	29/06/2024	28/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$ 88.631.200,00	29/06/2024	28/02/2028

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005514	0	19/09/2024	$260.000.000,00	29/06/2024	28/02/2025

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100026301	2	18/10/2024	Cumplimiento del contrato	$ 88.631.200,00	19/09/2024	18/11/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$132.946.800,00	19/09/2024	18/11/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 88.631.200,00	19/09/2024	20/05/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$ 88.631.200,00	19/09/2024	20/05/2028

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005514	2	18/10/2024	$260.000.000,00	19/09/2024	21/05/2025

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y ACTA REINICIO No.1 :

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	NB-100331946	3	08/05/2025	Cumplimiento del contrato	$ 88.631.200,00	24/02/2025	30/12/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$132.946.800,00	24/02/2025	30/12/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 88.631.200,00	24/02/2025	05/07/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$ 88.631.200,00	24/02/2025	05/07/2028

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005514	3	08/05/2025	$260.000.000,00	19/09/2024	05/07/2025

10.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

10.2.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Trámite ante la Gobernación del Huila – secretaria de Vías e Infraestructura de la documentación relacionada con el Proyecto, incluyendo todos los soportes exigidos por la entidad contratante.
- Dando cumplimiento a las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código sustantivo del trabajo, todo el personal a su cargo se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), así como el cumplimiento del pago de obligaciones Parafiscales.
- Adicionalmente permanentemente se ha realizado seguimiento al Contratista de Obra en este aspecto, con la solicitud inicial por medio de oficio con el fin de hacer cumplir lo estipulado por la Ley y las exigencias contractuales. Dicha documentación entregada respecto a afiliaciones de Director y residente se encuentran en el presente informe y hace parte de los soportes exigidos por la interventoría al contratista, pero también se le solicito la seguridad social planilla pagada pero no fue entregada por el Contratista de Obra.
- De igual forma solicitamos mediante su conducto, que los materiales de stock, que principalmente el material pétreo, sea previamente caracterizado – cumplimiento de licencias, así como también con las variables que determinan su idoneidad, la dosificación de estos para sus diferentes usos e hicimos énfasis en que el único responsable de la demostración y evidencia de la calidad de la obra en el contraste.
- Durante toda la ejecución del proyecto las inquietudes y sugerencias planteadas por el contratista fueron atendidas buscando de forma diligente solucionarlas para el bien del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico.
- Elaboración de Informes semanales de avance de obra, fundamentales para el control del estado financiero de la construcción.
- Inspección diaria a sitios de ejecución de obra verificando el cumplimiento frente a personal y equipo propuesto por el contratista. El Contratista se notificó los últimos días del mes de septiembre que fuera movilizada la maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto, pero hicieron caso omiso a este.
- Elaboración de registro fotográfico y registro en bitácora de las actividades en la obra.
- Elaboración del informe mensual, de actividades de construcción e interventoría según modelos de la Gobernación del Huila – secretaria de Vías e Infraestructura.
- Cuantificación, valoración semanal y mensual de obra ejecutada.

10.2.2. ACTIVIDADES GENERALES

- Localización y replanteo.

- Revisión de programación financiera del contrato de construcción y verificación cumplimiento del programa de obra
- Verificación cumplimiento normas de seguridad industrial.
- Control legal y administrativo de contrato de construcción.
- Registro diario de correspondencia y archivo.
- Registro diario de incidencias en bitácora de obra.
- Inspección diaria a sitios de ejecución de obra.
- Elaboración registro fotográfico.
- Elaboración del informe mensual, de actividades de construcción e Interventoría según modelos Gobernación del Huila – secretaria de Vías e Infraestructura.
- Cuantificación, valoración semanal y mensual de obra ejecutada.

10.2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Se exigió al contratista el PMT (Plan de Manejo de Transito) para su Control y seguimiento a la instalación de la señalización vertical y horizontal de acuerdo con las exigencias del manual.
- Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato, siguiendo siempre lo recomendado en la Especificaciones Técnicas de Carreteras.
- Cuantificación diaria de las actividades realizadas en la obra por el contrista, actividades que se relacionan en el libro de obra y se cuantifican en los informes semanales y mensuales entregados por la Interventoría.
- Apoyo permanente al trabajo social realizado por el contratista para adelantar los cierres de las actas de vecindad ante propietarios de predios intervenidos.

10.2.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS

- Revisar, controlar y supervisar el estado del buen desarrollo financiero del contrato.
- Controlar el manejo del Anticipo en cuanto sea entregado al Contratista.
- Cuantificación semanal de las actividades realizadas por el contratista en la obra para determinar avances y atrasos.

10.2.5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

DICIEMBRE DEL 2024

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó conformación del terreno, para instalación de sub-rasante

- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos
- cumplimiento de las obligaciones de las partes.

ENERO DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó conformación del terreno, para instalación de sub-rasante
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos

FEBRERO DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó conformación del terreno, para instalación de sub-rasante
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos

ABRIL DEL 2025

- Se realizó visita de campo por parte del contratista e interventoría y acompañamiento del presidente de junta de la vereda.
- Se realizó localización y replanteo.
- Se realizó excavación mecánica
- Se realizó excavación manual para viga riostra
- Se realizó conformación del terreno, para instalación de sub-rasante
- Se realizó la instalación de sub-base en los tramos intervenidos
- Se realizó figurado, amarre, e instalación de hierro para placas, cunetas y bordillos.
- Se realizó fundición de placas, cunetas, bordillos.

- Excavación mecánica para la instalación de la tubería de alcantarilla
- Solado de limpieza para los elementos de la alcantarilla
- Instalación de tubería de 36" en concreto según norma invias, para la alcantarilla
- Se suministra e instala material de relleno para dar nivel a la subrasante de las alcantarillas
- Se figura acero de cabezales, aletas y cajas de alcantarilla
- Se continua con fundida de placa de concreto
- Fundida de cuneta y bordillo
- Amarre de acero de refuerzo para los elementos
- Fundida de caja de alcantarillas
- Fundida de placa, cabezal y aletas de descole
- Se continua con excavaciones manuales
- Fundida de placa de concreto
- Fundida de cuneta y bordillo
- Fundida de concreto ciclópeo
- Amarre de acero de refuerzo

10.3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

- Observar **Anexo N° 3**

10.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NESTOR ROJAS TORRES	Director De Obra	Prestación de servicios
LUIS FERNANDO GARCIA PEÑA	Residente De Obra	Prestación de servicios
JHON EDINSON YAIME BORRERO	Profesional sisoma	Prestación de servicios
LEONARDO GONZALEZ RUIZ	Profesional ambiental	Prestación de servicios
ALFONSO RENDON VALENCIA	Especialista estructural	Prestación de servicios
RAUL EDUARDO ROJAS BORBON	Especialista geotécnico	Prestación de servicios
MILTON RAFAEL PAEZ GONZALEZ	Topógrafo	Prestación de servicios

10.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (30%)	26/12/2024	$ 132.946.800,00		$ 132.946.800,00
Acta Parcial No. 1	10/12/2024	$ 152.660.340,00	$ 45.798.102,00	$ 106.862.238,00
Acta Parcial No. 2	07/10/2025	$146.775.552,00	$ 44.032.665,60	$ 102.742.886,40
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 443.156.000.00	$ 0,00	$ 443.156.000.00	$ 299.435.892,00	$ 143.720.108,00

11. PLAN DE CALIDAD

11.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

Durante el transcurso del periodo 11 de diciembre al 30 de mayo se realizaron labores representativas en la Ejecución del Contrato, pero aun así en todo el proceso constructivo La interventoría realizó el seguimiento a cada etapa en la obra, basados en el Plan de Calidad del Constructor, y en el transcurso del proyecto se hará énfasis en la toma de muestras de materiales para la fabricación de concretos, mezclas, así como también de materiales utilizados para conformar las capas de la estructura la placa huella.

11.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL INTERVENTOR

Permanentemente el equipo humano encargado del control de calidad al contratista estará en actividad, realizando el seguimiento a los procesos constructivos para que estén acorde a las exigencias de la entidad contratante y tomando muestras tanto de materias primas como de productos terminados para verificar la calidad de estos; Es así como durante el mes de inicio de labores en el proyecto se realizaran las siguientes actividades:

Durante esta etapa se realizaron este tipo de ensayos, puesto que las actividades que se ejecutaron lo ameritaron, se hace un resumen del trabajo de campo y laboratorio que se ejerció permanentemente por el personal de la interventoría.

Como labores de oficina tanto en Neiva como en obra (Elias, Yaguara, Palermo), se llevan Carpetas independientes con la siguiente información: Documentación total del contrato de construcción,

Documentación total del contrato de Interventoría, Bitácora diaria de obra, correspondencia despachada y correspondencia recibida, Especificaciones Técnicas de Carreteras, Informes semanales.

12. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

- Observar **Anexo N° 4**

13. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Actualmente se encuentra ítem ejecutados en Obra, por lo que se ha obtenido un rendimiento considerable por parte del Contratista de Obra, ya que la actividad de obra se encuentra en un porcentaje de avance de obra del **67.59%.**

De acuerdo con conversaciones entre la obra y la interventoría, se tomarán en cuenta los documentos solicitados mediante oficios y el contratista se compromete a entregar estos en el menor tiempo posible. Para cumplir las obligaciones contractuales.

Se recomienda realizar la construccion de la placa huella de acuerdo a todas las especificaciones, secciones, pendientes y cotas indicadas en los planos, en caso de presentarse situaciones no previstas en los estudios y diseños que fueron entregados por la GOBERNACION DEL HUILA, deberam comunicarse a la interventoria.

El corredor vial definido para el proyecto se desarrolla en zona de montaña, por tal razón las vías poseen un buen drenaje, donde en época de lluvias abundantes no se genera inundación o encharcamiento de áreas representativas.

Juan Garcia R

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
R.L. JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
C.C 1.001.276.642 DE NEIVA

ANEXO 1

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DICIEMBRE 2024 A 31 DICIEMBRE 2024

DICIEMBRE

PALERMO

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
MAÑANA		LF	S	LF	S	LF	LF		LV	LV	LF	LV	S	LF		LF	S	LF	LV	S	S		S	S		LV	S	S		S	LV
TARDE		LV	LV	S		SC			S	S	S	S	S			S	S	S	S	LV	S		S	S		S	S	S		S	S
NOCHE			LF		LF			LF	LF				LF					LV													LF

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DICIEMBRE 2024 A 31 DICIEMBRE 2024

DICIEMBRE

YAGUARÁ

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
MAÑANA		S	S	S	LV	LV	LV		S	S	S	S	LV	LF		S	LV	S	S	S	S		S	S		S	S	S		LF	LF
TARDE		S	S	S	S	SC	S		S	S	S	S	S	LV		S	S	S	S	S	S		S	S		S	S	S		LV	LV
NOCHE		LF	SC	SC	LF	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC		LF	LF	LV		LV	LV

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DICIEMBRE 2024 A 31 DICIEMBRE 2024

DICIEMBRE

ELIAS

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
MAÑANA		S	S	S	LV	LV	LV		S	S	LV	S	LV	LF		S	LV	S	S	LV	S		S	S		S	LV	S		LF	LF
TARDE		S	LV	S	S	SC	S		S	S	LV	S	S	LV		S	S	S	S	LV	S		S	LV		S	S	S		LV	LV
NOCHE		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC		SC	SC	SC		SC	SC

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONVENCIONES: S SOLEADO LF LLUVIA FUERTE LV LLOVIZNA SC SECO

1346

37

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 ENERO 2025 A 31 ENERO 2024

ENERO

MUNICIPIO DE PALERMO

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
MAÑANA		S	S	S			S	S	S	S	LF		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	LV
TARDE		S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S
NOCHE													LF					LV													LF

MUNICIPIO DE YAGUARA

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
MAÑANA		LF	LF	LF			SC	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	LV	SC	S		S	S	S	S	S
TARDE		S	SC	SC			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	SC	SC	S		S	S	S	S	S
NOCHE		SC	SC	SC			SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC

MUNICIPIO DE ELIAS

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
MAÑANA		LF	LF	LF			SC	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	LV	SC	S		S	S	S	S	S
TARDE		S	SC	SC			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	SC	SC	S		S	S	S	S	S
NOCHE		SC	SC	SC			SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC	SC	SC

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONVENCIONES: S SOLEADO LF LLUVIA FUERTE LV LLOVIZNA SC SECO

1344

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 FEBRERO 2025 A 28 FEBRERO 2025

FEBRERO

MUNICIPIO DE PALERMO

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
MAÑANA	LV		LF	LF	LV	LF	LF	LV		LV	LF	LV	LF	LV	SC		SC	LV	LV	LV	LV	LV									
TARDE	S		S	LV	SC	SC	LV	LV		S	SC	LV	LV	LF	LV		LV	SC	S	S	S	S									
NOCHE	SC		SC	LV	SC	SC	LF	LF		SC	LV	LF	LF	SC	SC		LF	LF	LF	LF	LF	LF									

MUNICIPIO DE YAGUARA

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
MAÑANA	LV		LF	LF	LV	LF	LF	LV		LV	LF	LV	LF	LV	SC		SC	LV	LV	LV	LV	LV									
TARDE	S		S	LV	SC	SC	LV	LV		S	SC	LV	LV	LF	LV		LV	SC	S	S	S	S									
NOCHE	SC		SC	LV	SC	SC	LF	LF		SC	LV	LF	LF	SC	SC		LF	LF	LF	LF	LF	LF									

MUNICIPIO DE ELIAS

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
MAÑANA	LV		LF	LF	LV	LF	LF	LV		LV	LF	LV	LF	LV	SC		SC	LV	LV	LV	LV	LV									
TARDE	S		S	LV	SC	SC	LV	LV		S	SC	LV	LV	LF	LV		LV	SC	S	S	S	S									
NOCHE	SC		SC	LV	SC	SC	LF	LF		SC	LV	LF	LF	SC	SC		LF	LF	LF	LF	LF	LF									

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONVENCIONES: S SOLEADO LF LLUVIA FUERTE LV LLOVIZNA SC SECO

1348

40

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE EJECUCIÓN 10 A 30 ABRIL 2025

ABRIL 2025

MUNICIPIO DE PALERMO

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
MAÑANA	LV		LF	LF	LV	LF	LF	LV		LV	LF	LV	LF	LV	SC		SC	LV	LV	LV	LV	LV		SC	LV	LV	LV	LV	LV	
TARDE	S		S	LV	SC	SC	LV	LV		S	SC	LV	LV	LF	LV		LV	SC	S	S	S	S		LV	SC	S	S	S	S	
NOCHE	SC		SC	LV	SC	SC	LF	LF		SC	LV	LF	LF	SC	SC		LF	LF	LF	LF	LF	LF		LF	LF	LF	LF	LF	LF	

MUNICIPIO DE YAGUARA

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
MAÑANA	LV		LF	LF	LV	LF	LF	LV		LV	LF	LV	LF	LV	SC		SC	LV	LV	LV	LV	LV		SC	LV	LV	LV	LV	LV	
TARDE	S		S	LV	SC	SC	LV	LV		S	SC	LV	LV	LF	LV		LV	SC	S	S	S	S		LV	SC	S	S	S	S	
NOCHE	SC		SC	LV	SC	SC	LF	LF		SC	LV	LF	LF	SC	SC		LF	LF	LF	LF	LF	LF		LF	LF	LF	LF	LF	LF	

MUNICIPIO DE ELIAS

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
MAÑANA	LV		LF	LF	LV	LF	LF	LV		LV	LF	LV	LF	LV	SC		SC	LV	LV	LV	LV	LV		SC	LV	LV	LV	LV	LV	
TARDE	S		S	LV	SC	SC	LV	LV		S	SC	LV	LV	LF	LV		LV	SC	S	S	S	S		LV	SC	S	S	S	S	
NOCHE	SC		SC	LV	SC	SC	LF	LF		SC	LV	LF	LF	SC	SC		LF	LF	LF	LF	LF	LF		LF	LF	LF	LF	LF	LF	

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONVENCIONES: S SOLEADO LF LLUVIA FUERTE LV LLOVIZNA SC SECO

1349

47

ANEXO 2

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DICIEMBRE 2024 A 31 DICIEMBRE 2024

EQUIPO	DICIEMBRE																													
	PALERMO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	NO SE PRESENTAN EQUIPOS EN ESTE PERIODO, YA QUE NO ACTIVIDAD EN OBRA																														
	YAGUARÁ																													
EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
EQUIPO DE TOPOGRAFIA																															
VIBRO COMPACTADOR		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x							
MINI CARGADOR		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x							

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1351

43

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 ENERO 2025 A 31 ENERO 2024

ENERO

MUNICIPIO DE PALERMO

EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
MEZCLADORA							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
PLANTA ELECTRICA							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
VIBRO DE AGUJA							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
MINI CARGADOR							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

ENERO

MUNICIPIO DE YAGUARA

EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
EQUIPO DE TOPOGRAFIA																	X	X													
VIBRO COMPACTADOR													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
MINI CARGADOR													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1352

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN OBRA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 FEBRERO 2025 A 28 FEBRERO 2025																													
	FEBRERO																													
	MUNICIPIO DE PALERMO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
MEZCLADORA																															
PLANTA ELECTRICA																															
VIBRO DE AGUJA																															
MINI CARGADOR																															

EQUIPO	FEBRERO																													
	MUNICIPIO DE YAGUARA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
EQUIPO DE TOPOGRAFIA																	X	X	X	X	X										
VIBRO COMPACTADOR			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									
MINI CARGADOR			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN OBRA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 10 A 30 ABRIL 2025																														
	ABRIL DEL 2025																														
	YAGUARÁ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	SUSPENSIÓN																														
VIBRO COMPACTADOR											x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
MINI CARGADOR											x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL																														
Contrato Interven:	959 DE 2024																														
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI																														
Contrato Obra No.	867 DE 2024																														
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.																														

1354

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 2: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN OBRA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 1 A 31 MAYO 2025																														
	MAYO DEL 2025																														
	YAGUARÁ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
EQUIPO DE TOPOGRAFIA																															
VIBRO COMPACTADOR		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
MINI CARGADOR		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
Contrato Obra No.	867 DE 2024
Objeto de Obra:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1355

ANEXO 3

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 3: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN INTERVENTORIA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DICIEMBRE 2024 A 30 DICIEMBRE 2024																															
	DICIEMBRE																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA		X	X				X						X	X						X	X						X	X			
LABORATORIO DE DENSIDADES											X																				
LABORATORIO DE CONCRETOS											X									X											
ALQUILER DE VEHICULO		X		X			X						X	X						X	X						X				

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 5: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN INTERVENTORIA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 E NERO 2025 A 30 ENERO 2025																														
	ENERO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA				X						X	X				X	X					X							X	X	
LABORATORIO DE DENSIDADES			X	X				X	X									X												X	X
LABORATORIO DE CONCRETOS			X	X				X	X									X												X	X
ALQUILER DE VEHICULO		X		X						X	X						X	X				X	X				X	X		

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1356

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 6: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN INTERVENTORIA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 FEBRERO 2025 A 24 FEBRERO 2025

EQUIPO	FEBRERO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V		
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA			X					X		X	X						X		X											
LABORATORIO DE DENSIDADES				X	X	X					X			X																
LABORATORIO DE CONCRETOS				X	X	X					X			X																
ALQUILER DE VEHICULO			X		X		X				X		X					X		X										

SUSPENSIÓN

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1354

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 7: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN INTERVENTORIA

PERIODO DE EJECUCIÓN 10 ABRIL 2025 A 30 ABRIL 2025

EQUIPO	ABRIL																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA																			X							X			X		
LABORATORIO DE DENSIDADES															X		X		X			X		X		X				X	
LABORATORIO DE CONCRETOS														X		X		X				X		X		X				X	
ALQUILER DE VEHICULO												X				X	X						X	X					X		

REINICIO

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1360
52

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 6: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN INTERVENTORIA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 A 31 MAYO 2025																													
	MAYO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA	X		X					X		X	X						X		X					X		X				X
LABORATORIO DE DENSIDADES				X	X	X					X			X															X	
LABORATORIO DE CONCRETOS				X	X	X					X			X															X	
ALQUILER DE VEHICULO	X		X		X		X				X		X					X		X					X		X	X			

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ANEXO 4

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 4: CORRESPONDENCIA ENVIADA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DICIEMBRE 2024 A 30 DICIEMBRE 2024

N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
OFI-023-CO	PROGRAMACION COMITÉ N°6	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFI-024-CO	INFORME COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA E INTERVENTORIA	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFI-026-CO	PROGRAMACION COMITÉ N°7	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	ALVARO LIS ROJAS
OFI-025-CO	SOLICITUD DE BITACORA	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	CONSORCIO PLACAS HUILA CI

INFORME No 1: CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2024	GOB-HUILA-867/2024-OFC-016	REMISION INFORME MENSUAL N°3	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2024	GOB-HUILA-867/2024-OFC-018	REMISIÓN RESULTADOS DE LABORATORIOS	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024	GOB-HUILA-867/2024-OFC-019	REMISIÓN CORTE DE OBRA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 20 de Diciembre de 2024	GOB-HUILA-867/2024-OFC-020	RESPUESTA COMUNICADO OFI-025-CO	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 5: CORRESPONDENCIA ENVIADA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 ENERO 2025 A 30 ENERO 2025

N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
OFC-27-CO	PROGRAMACION COMITÉ N°8	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-28-CO	ACEPTACIÓN DE RECOMPOSICIÓN CONSORCIAL	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	ALVARO LIS ROJAS
OFC-29-CO	PROGRAMACION COMITÉ N°9	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-30-CO	PROGRAMACION COMITÉ PRESENCIAL	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI

INFORME No 5 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 6: CORRESPONDENCIA ENVIADA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 FEBRERO 2025 A 24 FEBRERO 2025

N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
OFC-31-CO	PROGRAMACION COMITÉ N°11	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-32-CO	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-33-CO	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PARCIAL	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	ALVARO LIS ROJAS

INFORME No 6 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
Bogotá D.C., 13 de Febrero de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-027	REPORTE CLIMA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogota 15 de Febrero de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-025	SOLICITUD DE SUSPENSION PARCIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 6: CORRESPONDENCIA ENVIADA

PERIODO DE EJECUCIÓN 10 ABRIL 2025 A 30 ABRIL 2025

N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
OFC-36-CO	SOLICITUD DE REINICIO N°1	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-37-CO	SOLICITUD DE REVISION DE PLACAS	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-38-CO	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN - ENTREGA DE INFORMES	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-39-CO	PROGRAMACIÓN DE COMITÉ N°12	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-41-CO	REPUESTA SOBRE ANCHOS - ALTO SAN PEDRO	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	LUZ MERY MUÑOZ-JAC ALTO SAN PEDRO

INFORME No 6 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
Bogotá D.C., 07 de Abril de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-028	SOLCITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogota D.C., 09 de Abril de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-029	SOLICITUD DE REACTIVACION DEL CONTRATO	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogota D.C., 22 de Abril de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-030	REMISION DE LABORATORIOS	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogota D.C., 25 de Abril de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-030B	SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogota D.C., 30 de Abril de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-031	REPUESTA OFI-37-CO SOLICITUD DE REVISION DE PLACAS	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1365

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 8: CORRESPONDENCIA ENVIADA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE MAYO 2025 AL 31 DE MAYO 2025

N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
OFC-41-CO	REPUESTA SOBRE LOS ANCHOS DE LA PLACA-HUELLA ALTO SAN PEDRO	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	Luz mer muñoz moreno (JAC)
INF-002-INTER	DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DAR TRAMITE AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDAD, Y ADICIÓN DE VALOR Y PLAZO	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	DESPACHO DE SECRETARIA VÍAS E INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL HUILA
OFC-42-CO		CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFC-43	SOLICITUD DE RETIRO DE BULTOS DE CEMENTO.	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	DESPACHO DE LA SECRETARIA VÍAS E INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL HUILA

INFORME No 8: CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
Bogotá D.C., 02 de Mayo de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-030	RESPUESTA OFI-37-CO SOLICITUD DE REVISIÓN DE PLACAS EN EL TRAMO VISO ALTO Y ENTREGA DE INFORME	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 06 de Mayo de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-032	SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE MAYORES VALOR Y PLAZO MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 08 de Mayo de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-034	SOLICITUD CONCPEPTO TÉCNICO Y REVISIÓN Y APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 14 de Mayo de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-035	RESPUESTA OFICIO OFI-43-CO	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 14 de Mayo de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-036	REMISIÓN PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Neiva, 20 de Mayo de 2025		OBSERVACIONES ESCTRUCTURALES	GOBERNACION DEL HUILA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Bogotá D.C., 21 de Mayo de 2025	GOB-HUILA-867/2024-OFC-037	IMPEDIMENTO DESCARGA SISTEMA DRENAJE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLA EXISTENTE-VERDA ALTO SARDINATA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1367

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

REGISTRO FOTOGRAFICO DICIEMBRE

1. LOCALIZACION Y REPLANTEO (ELIAS)









CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO).









CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

3 SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE MEDIANTE MATERIAL GRANULAR









CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

4 SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.

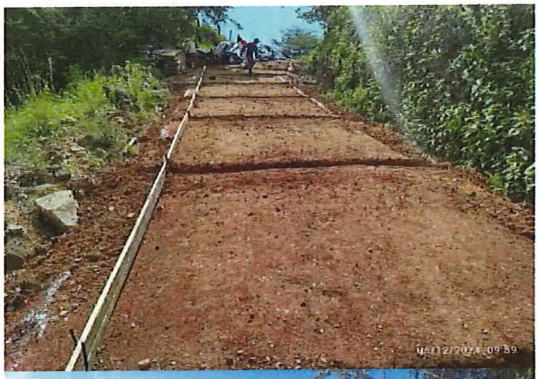












CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

5 ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES.

- **PLACA-HUELLAS**

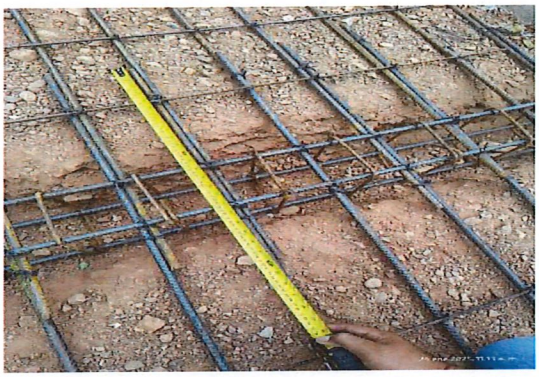



CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

- **FIGURADO Y AMARRE DE VIGAS RIOSTRAS, BORDILLO Y CUNETAS.**
-













CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

- **FIGURADO Y AMARRE DE VIGAS RIOSTRAS, BORDILLO Y CUNETAS.**









CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024	Gobernación del Huila POR UN HUILA ¡GRANDE!

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.



