	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-767-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/12/2024	**FECHA INICIO**	19/03/2025
	ICCU-232-2024 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	04/03/2025	**FECHA INICIO**	19/03/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO INCITECO IP	**NIT**	901.899.095-6
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO RED INFRANOVA	**NIT**	901.920.687-5
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – PASO ANCHO A LA INSPECCION DEL BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de Marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta 18 de noviembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000). 2. El valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo tecnico.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$10.363.640.754,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$899.994.620,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 1 DE JUNIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025				

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**101461107**	**19/03/2025**	**19/03/2026**	**$ 2.072.728.150,80**
Buen manejo del anticipo	**101461107**	**19/03/2025**	**19/03/2026**	**$ 2.000.000.000,00**
Pago de salarios, prestaciones sociales	**101461107**	**19/03/2025**	**17/11/2028**	**$ 518.182.037,70**
Estabilidad de la obra	**101461107**	**AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS**		**$ 3.109.092.226,20**
Responsabilidad civil	**101247126**	**19/03/2025**	**17/11/2025**	**$ 711.750.000,00**

Contrato de interventoria

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**101250431**	**19/03/2025**	**19/05/2026**	**$ 89.999.462,00**
Pago de salarios	**101250431**	**19/03/2025**	**19/11/2028**	**$ 44.999.731,00**
Calidad del servicio	**101250431**	**19/11/2025**	**19/11/2030**	**$ 269.999.386,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**101250431**	**19/03/2025**	**19/05/2026**	**$ 134.999.193,00**

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas Cruz**
	Fecha diligenciamiento	13/03/2025

4. DESCRIPCION DEL AVANCE

- Durante el mes de junio se da continuidad a las excavaciones varias sin clasificar en carril derecho de tramo A para estructura de vía hasta K6+880, K6+870 y K6+730
- Se realizó fresado en tramo A carril derecho hasta la abs K6+500
- Se realizaron mejoramientos con rajón en áreas específicas donde no se encuentra material remanente.
- Se realizaron labores de excavación para caja de vía en costado izquierdo del tramo A en el K7
- Se inició con la excavación para cunera en costado derecho del tramo A.

- Se realizó lleno con material granular con espesor de 0,2 m para estructura de vía desde el K7+760 a k7+000
- Se realizaron toma de densidades en material granular compactado obteniendo resultados que van desde 95,1% a 95,4%
- De igual manera se realizaron toma de densidades en material granular estabilizado con asfalto compactado obteniendo resultados que van desde 95% a 99%
- Se fundieron bordillos en concreto de 4000 PSI
- Se fundieron rampas en boca calles en concreto de 4000 PSI
- Se inició con la instalación de base estabilizada en carril derecho de vía tramo A hasta K6+690
- Se realizó instalación de base estabilizada en carril derecho segunda capa tramo A hasta K6+730
- Se inició con la instalación de base estabilizada en carril izquierdo de vía tramo A hasta K7+600
- Se realizó la instalación de imprimación hasta abs K6+690 y K7+600 de costado izquierdo de tramo A.
-Se realizó la instalación de sardinel para confinamiento de estructura de vía desde el K7+760 a K7+090

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Resumen de curva de avance fisico del contrato: Programado 29,57% vs. 27,07% Ejecutado a la fecha 25/06/2025, esto con un % de atraso de 2,50%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP	CONSORCIO RED INFRANOVA
Anticipo	$2.000.000.000,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$2.000.000.000,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$8.363.640.754,00	$899.994.620
Porcentaje de ejecución	19,30%	0,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas Cruz**
	Fecha diligenciamiento	**12/06/2025**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**NO**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: Transporte e instalación de rajón



Fotografía 2: Armado de acero



Fotografía 3: Toma de densidades




Fotografía 4: Conformación de la estructura vial



Fotografía 5: Instalación de imprimación



Fotografía 6: Compactación

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
- 26 DE JUNIO, VISITA AL PROYECTO JUNTO CON LA INGENIERA DANIELA NIETO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD		
10- ANEXOS		
- 4 DE JUNIO DE 2025 COMITE VIRTUAL DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO - 11 DE JUNIO DE 2025 COMITE VIRTUAL DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO - 18 DE JUNIO DE 2025 COMITE VIRTUAL DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO - 25 DE JUNIO DE 2025 COMITE VIRTUAL DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO		
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
Sandra Rocío Castillo González	SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 1 de julio de 2025	

ICCU	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	CÓDIGO	PR-DE-01-FO2
		VERSIÓN	4
		FECHA	12/09/2016

ACTA DE REUNIÓN

FECHA DE REUNIÓN :	4 Junio 2025	ACTA No.	Comité No 10.
HORA DE INICIO:	3:00 Pm.	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Nutal		
DEPENDENCIA:	ICCU - Inciteco SP - Rod Infranova		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar comité de obra No 10 para control y seguimiento del contrato No ICCU-167-2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
   - Se realiza la lectura del acta anteria y se da aprobación.
2. Compromisos comité anterior
   - Se relacionan los compromisos adquiridos en comité No 9.
3. Área técnica
   - Se relacona informe de interventoría No 11.
   - Comité de incorporación: El contratista manifiesta y presenta propuesta para corrección de la placa huella que conduce hacia barandillas. Sin embargo, la interventoría solicita revaluar el diseño para realizar la actividad todo vez que toda la estructura de la vía no es posible realizarla; esto debido a que los ejes equivalentes tenidos en cuenta para el diseño del comedor no corresponden a los de la placa huella

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Recomendaciones:

- Equipo y maquinaria: La interventoría solicita de manera formal al contratista. Para que toda maquinaria, equipo o personal que ingresara a la obra, deberá tener visto bueno por parte de la interventoría en su documentación inicial.
- La interventoría solicita la radicación de la programación ajustada al modificatorio No 1 del contrato.
- La interventoría presenta dentro de su informe semanal recomendaciones para el proceso constructivo, tanto de la base estabilizada como para fundido de concreto todo vez que estas presentan aspectos irregulares; El contratista realizará visita del proveedor y especialistas para evaluar la condición actual de las actividades.

Avance proyecto

Acumulado programado: 14,36%.
Acumulado ejecutado: 11,56%
Diferencia: -2,80%

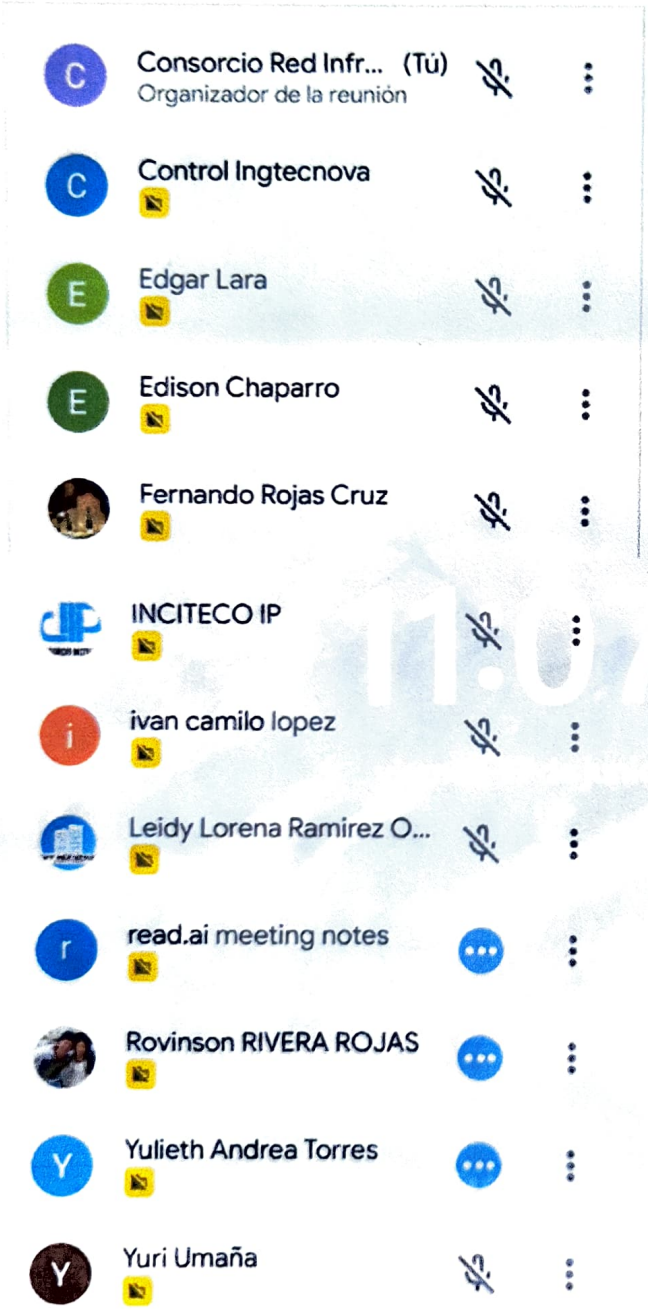
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Visita especialistas	Contratista/interve	9 Junio 2025
Programación Modif. 1	Contratista	9 Junio 2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Anexo 1				

ELABORÓ:


Consorcio Red Infr... (Tú)
Organizador de la reunión
Control Ingtecnova
Edgar Lara
Edison Chaparro
Fernando Rojas Cruz
INCITECO IP
ivan camilo lopez
Leidy Lorena Ramirez O...
read.ai meeting notes
Rovinson RIVERA ROJAS
Yulieth Andrea Torres
Yuri Umaña

ICCU	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	CÓDIGO	PR-DE-01-FO2
		VERSIÓN	4
		FECHA	12/09/2016

ACTA DE REUNIÓN

FECHA DE REUNIÓN :	11 Junio 2025	ACTA No.	Comité No 11
HORA DE INICIO:	3:00 PM.	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	ICCU - Inciteco JP - Red Infranova.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar comité de obra No 11 para control y seguimiento del contrato No. ICCU-767-2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

① Lectura y aprobación del acta anterior

- Se realiza la lectura del acta anterior y se da aprobación

② Compromisos comité anterior

- Se relacionan los compromisos de comité No 10 La programación se entregara día viernes 13 junio.

Área técnica:

- Se relaciona informe de interventoría No. 12.
- Caml de acceso: El contratista presentará la nueva propuesta para caml de acceso hacia barandillas
- Tramos en observación:

Tramo 1: Ya se cuenta con laboratorios; se entregarán para revisión el día 12 Junio 2025

Tramo 2 y 3: Se entregaran resultados el día 13 Junio de 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Balance: El día viernes se entregará a la interventoría balance ajustado a la fecha.

Avance Proyecto:

Programado a la fecha: 16,83 %
Ejecutado a la fecha 10,11 %.
Diferencia: 1,28 %

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Programación Mod 1	Contratista.	13 Junio.
Laboratorios tramo 1	Contratista	12 Junio.
Laboratorio tramo 2 y 3	Contratista	13 Junio.
Balance.	Contratista	13 Junio.

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Anexo 1				

ELABORÓ:

PARTICIPACIÓN

Ordenar por tiempo de habla

Consorcio Red Infranova	59%
Edison Chaparro	32%
Rovinson RIVERA ROJAS	6%
Yuri Umaña	2%
Edgar Lara	1%
ivan c	<1%
Control Ingtecnova	0%
German Lamprea	0%

9 personas ausentes

ICCU	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	CÓDIGO	PR-DE-01-F02
		VERSIÓN	4
		FECHA	12/09/2016

ACTA DE REUNIÓN

FECHA DE REUNIÓN :	18 Junio 2025	ACTA No.	Comité No 12.
HORA DE INICIO:	3:00 PM.	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	ICCU - Incateco IP - Red infranda.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar comité de obra No 12. para control y seguimiento del contrato No ICCU - 767 - 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) Lectura y aprobación del acta anterior

- Se realiza la lectura del acta anterior y se da aprobación.

(2) Compromisos comité anterior

- Se relacionan los compromisos adquiridos en comité No 11

(3) Aseo técnicos

- Se relacona informe de interventoría No 13
- Caseta de bombeo: EPZ realizará actividad durante esta semana.
- Canal de acceso: El contratista presentará alternativa para el siguiente comité.
- Tramos en observación. El día 1a de Julio de 2025 se entregarán resultados de laboratorio para obtener la liberación del tramo k7+864 a k7+780.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Conformación andenes: El contratista presentará alternativa para la conformación de andenes el día 25 Jun.
- Nota: dada la directriz de la entidad para la no intervención de accesos a placahuella el contratista reevaluará su planteamiento en esta zona de intervención.

Avance Proyecto

Programado acumulado 20,52%
Ejecutado acumulado 22,18%
Diferencia 1,66%

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Alternativa confinamiento.	Contratista	25 Junio 2025
Resultados tramo observa	contratista	19 Junio 2025
Alternativa conformación	Contratista	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Anexo 1.				

ELABORÓ:

Colaboradores 12

Consorcio Red Infr... (Tú)
Organizador de la reunión

ANTONIO MARIA LOPE...

Control Ingtecnova

Daniel Hernández

Edgar Lara

Edison Chaparro

Fernando Rojas Cruz

german lamprea vargas

INCITECO IP

INCITECO IP

Rovinson RIVERA ROJAS

Yuri Umaña

ICCU	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	CÓDIGO	PR-DE-01-F02
		VERSIÓN	4
		FECHA	12/09/2016

ACTA DE REUNIÓN

FECHA DE REUNIÓN :	25 Junio 2025	ACTA No.	Comité No. 13
HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	ICCU - Inteco SP - Red Infranova		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar comité de obra No 13 para control y seguimiento del contrato No ICCU-767-2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura y aprobación del acta anterior
   - Se realiza la lectura del acta anterior y de da la respectiva aprobación.
2. Cumplimiento del comité anterior
   - Se relacionan compromisos del comité anterior y su respectivo estado.
3. Area técnica:
   - Se relaciona informe de interventoría No. 14.
   - Andenes conformación: El día viernes se entregará propuesta de conformación de andenes.
   - Costado de cambeo: La entidad ultimará a elevar la consulta ante EPZ.
   - Canal de acceso: El contratista presentará propuesta de canal de incorporación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Tramos en observación - hundimientos: El contratista adelanta gestión ante EPZ para determinar el daño y proceder frente a las observaciones.

Varios:

La interventoría recomienda la implementación más rápida de PMT y adaptado a las condiciones especiales del fin de semana del 30 de Junio de 2025

Fresado: El contratista manifiesta que se realizó el día de ayer la devolución del material de fresado (60 m^3) 4 viajes de doble hoyo, en el sector del cadete. (Sino Solicitud por la alcaldía).

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Propuesta conformación andadores	Contratista	27 Junio
Propuesta control acceso	Contratista	27 Junio

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Anexo 1				



ANTONIO MARIA LOPE...

C Control Ingtecnova

E Edgar Lara

E Edison Chaparro

G German Lamprea

k kristian david ortega fa...

r read.ai meeting notes



Rovinson RIVERA ROJAS

Y Yuri Umaña

Y Yuri Umaña
