CONSORCIO INTER – HATO 2024



Yopal, 22 de septiembre de 2025

OFICIO HT - 050

Ingeniero
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

Yopal, 2025/09/23 09:42:03
RAD: 20250109408
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Asunto: Entrega de informes semanales 31 y 32.

Ref.: Contrato de consultoría 377 de 2024 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

N° INFORME SEMANAL	PERIODO	FOLIOS
31	Del 01/09/2025 al 06/09/2025	4
32	Del 07/09/2025 al 13/09/2025	4

Es de aclarar que las semanas reportadas van de acuerdo al flujo de caja semanal.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

AUDENAR FLOREZ SANABRIA
R/L CONSORCIO INTER-HATO 2024
Contrato de consultoría No 377 de 2024

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		8	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA: X — APOYO SUPERVISION:

Semana Número:	31	Del:	1/09/2025	Al:	6/09/2025	No:	31

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Meses y 4 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE						
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA N° 01 DE INICIO	1	$ 4.421.177.825,60	40,00%
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N° 02 PARCIAL N°1	2	$ 3.648.660.728,00	33,01%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 8.069.838.553,60	73,01%

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	2,09%	84,99%	OBRA EJECUTADA (%)	2,68%	81,73%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 231.090.715,16	$ 9.393.758.255,48	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 296.306.287,60	$ 9.033.480.525,29

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		8	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123	
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION			

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N°2 PARCIAL N°1	2	$ 322.144.629	29,04%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 322.144.629	29,04%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		8	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en el barrio Senderos de Nuestra Tierra, Senderos de manare y Merecure y en hato corozal en Villa Juliana y Libertadores y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la istalación de tuberia de 2" en la vereda La Manga y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con las excavaciones manuales en material común en la vereda Sarrapio, en los barrios Progreso, Villa Rosario, Villa Juliana y Esperanza de hato corozal.
Se continua con las conexiones domiciliarias en la los barrios Villa Rosario, Esperanza, Villa Juliana y Libertadores de Hato Corozal.
Se continua con la instalación de tubería de 1" en la vereda sarrapio y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la instalación de tubería de 3/4" en la vereda sarrapio y posterior relleno de las excavaciones.
Se realiza cruces aéreos tipo marco H de 2" en las veredas Santa Maria y San José.
Se realiza cruce encamisado de 2" en las veredas la Argentina y la Florida.
Se realiza la construcción de paso elevado sobre canales menores en la vereda La Argentina.
Se realiza la rotura y resposición de concreto en los cascos urbanos de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Excavación manual en material común.



Descripción: Relleno de excavación manual.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales en las veredas la Manga y Serrapio, continuar con la instalación de tuberia de 1/2" y 3/4" en las veredas Las Tapias y serrapio y en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo; ademas, posterior relleno de las excavaciones. Continuar con la instalación de conexiones domiciliarias en el casco urbano de Paz de Ariporo y de Hato Corozal.


CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		8	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X		APOYO SUPERVISION	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 3,26%. Por lo cual se ha solicitado en comités y mediante oficio al contratista de obra presentar un plan de choque para mitigar dicho atraso.

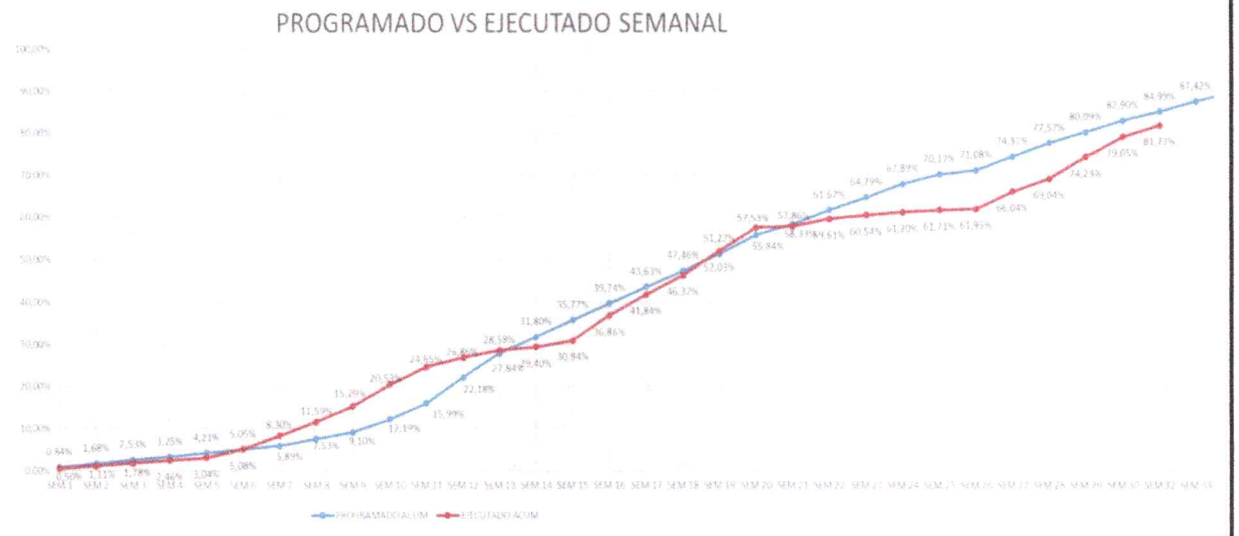

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER-HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		15	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850123

INTERVENTORIA X **APOYO SUPERVISION**

Semana Número:	32	Del:	7/09/2025	Al:	13/09/2025	No:	32

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Meses y 11 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE						
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA N° 01 DE INICIO	1	$ 4.421.177.825,60	40,00%
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N° 02 PARCIAL N°1	2	$ 3.648.660.728,00	33,01%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 8.069.838.553,60	73,01%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	2,43%	87,42%	OBRA EJECUTADA (%)	1,24%	82,97%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 268.776.231,67	$ 9.662.534.487,15	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 137.043.865,00	$ 9.170.524.390,29

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		15	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.**						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N°2 PARCIAL N°1	2	$ 322.144.629	29,04%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 322.144.629	29,04%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		15	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instalan poliválvulas de 2" en las veredas La Manga, San Jose de ariporo y La chapa de hato corozal.
Se instala poliválvulas de 3/4" en la vereda Santa Maria.
Se continúa con las excavaciones manuales en material común en las veredas Sarrapio y La Manga y en los barrios Progreso, Villa Rosario, Villa Juliana y Esperanza de hato corozal.
Se continua con las conexiones domiciliarias en la los barrios Senderos de manare, Esperanza, Progreso, el Bosque, Villa Juliana y Libertadores de Hato Corozal.
Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en las veredas Las Tapias y Sarrapio y en hato corozal en Villa Juliana, Esperanza y Libertadores y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la instalación de tubería de 3/4" en la vereda altamira y en el casco urbano de paz de ariporo en senderos del manare y senderos de nuestra tierra y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con la construcción de cruce encamisado de 2" en las veredas la Argentina y la Florida.
Se realiza la construcción de paso elevado sobre canales menores en la vereda La Argentina.
El dia 10 de septiembre el contratista de obra radica la solicitud de aprobacion de acta de modificación de mayores y menores cantidades de obra, la cual esta siendo revisada por esta interventoria.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Conexiones domiciliarias.



Descripción: Instalación de poliválvula

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales en las veredas la Manga y Serrapio, continuar con la instalaciòn de tuberia de 1/2" y 3/4" en las veredas Las Tapias y serrapio y en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo; ademas, posterior relleno de las excavaciones. Continuar con la instalación de conexiones domiciliarias en el casco urbano de Paz de Ariporo y de Hato Corozal.


CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		15	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR		CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 4,45%. Por lo cual se ha solicitado en comités y mediante oficio al contratista de obra presentar un plan de choque para mitigar dicho atraso.

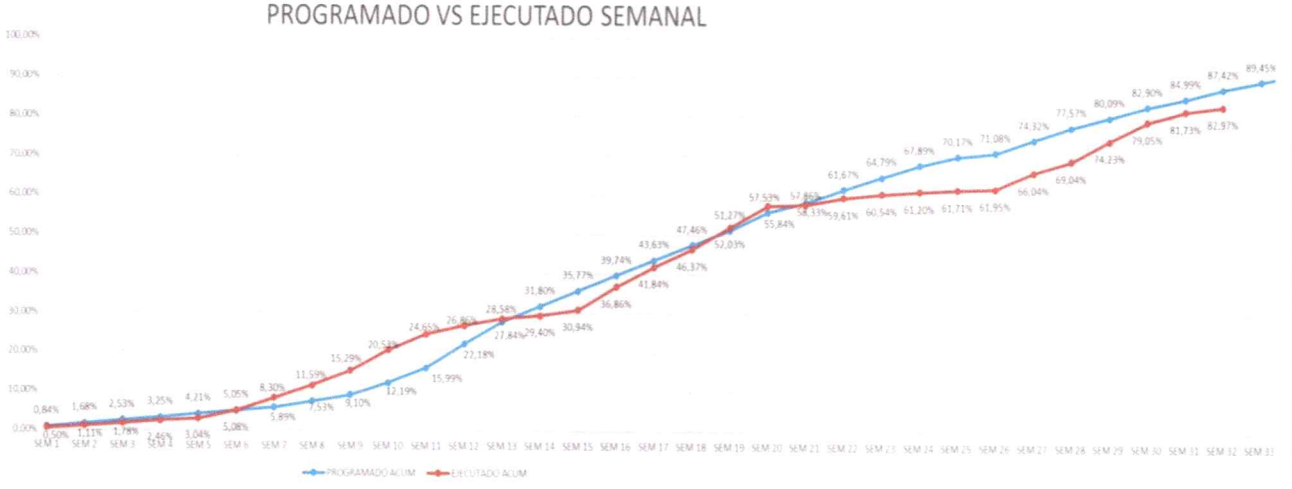

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
